



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
 ALCALDE MUNICIPAL
 E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Municipalidad de Cane, Departamento La Paz
Proyectos Municipales en Materia de Transparencia


Identificación del Proyecto				
1. Propietario del Proyecto:	Maestro de obra, Fernando Suazo			
2. Sector o Sub sector:	Barrio la violeta			
3. Nombre del Proyecto:	"REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ.			
4. Ubicación Geográfico del Proyecto:	Casco urbano del Municipio			
5. Objetivo General del Proyecto:	Con la ejecución de este proyecto se pretende mejorar las instalaciones del edificio que estaban en mal estado, para generar una cultura a los jóvenes como es la creación de la escuela de música, para prevenir la inclusión a malos hábitos.			
6. Objetivos Específicos del Proyecto	Construcción y reparación de la escuela Generar empleo Instalaciones en buen estado Inclusión de jóvenes en la parte de arte.			
7. Descripción del Proyecto:	El proyecto consiste en la construcción de paredes que están en mal estado, reparación de paredes existentes instalación de baños, instalación de cerámica, construcción de pila, repello y pulido.			
Elaboración del Proyecto				
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Beneficiar a 5190 personas que es la población de la comunidad del municipio de Cane.			
2. Impacto en las planificaciones institucionales	No aplica			
3. Detalles de Contacto:	el contrato se firmó el 12 de Septiembre, teniendo una vigencia de 109 días calendario a partir de la orden de inicio			
4. Fuente de Financiamiento:	Alcaldía municipal de Cane			
6. Costo del Proyecto (En caso de no tener un costo exacto, mostrar una proyección del mismo):	Lps. L. 896,220.30			
7. Fecha de Finalización:	31/12/2022			
Detalles del Proyecto				
Etapas del Proyecto	Descripción de la Etapa	Periodo de Implementación	Responsable	Indicador de Cumplimiento



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

EJECUCION	Se está en pulido de paredes.	en 02/12/2022 de 30/12/2022	al	Luis Fernando Martínez	Paredes culminadas y repelladas
Ejecución y Seguimiento del Proyecto					
1. Estado del Proyecto (Actual):	Ejecutado aproximadamente en un 100%				
2. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente:	NO APLICA				
3. Variación en el costo del Proyecto:	NO APLICA				
4. Variaciones en el alcance y durabilidad del Proyecto:	NO APLICA				
5. Razones de los cambios antes mencionados:	NO APLICA				




Luis Fernando Martínez
Desarrollo Comunitario Y Proyectos

ESTIMACION No 5
MUNICIPALIDAD DE CANE, LA PAZ
PROYECTO: "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE
UBICACIÓN: BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, DEPTO DE LA PAZ
EJECUTOR: M.O.FERNANDO SUAZO
PERIODO DEL: 02 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO BASE			EJECUTADO ANTERIOR			EJECUTADO ACTUAL			ACUMULADO FINAL		
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
TECHOS Y CIELO FALSO													
1	DESMONTAJE DE TIJERA	UNIDA	4	416.02	1,664.08	4.00	1,664.08			4.00	1,664.08		100
2	DESMONTAJE INST. ELECTR. (LAMP., VENT., TOMA E INT)	DIA	2	1,191.31	2,382.61	2.00	2,382.61			2.00	2,382.61		100
3	DESMONTAJE DE LAMINA TECHO (ESTRUC. EXISTENTE)	M2	108.3	54.09	5,857.46	108.30	5,857.46			108.30	5,857.46		100
4	SOLERA 15 X 15 4 No.3 Y No.2. CONCRETO 1:2:2	M.L.	62.41	461.41	28,796.33	62.41	28,796.33			62.41	28,796.33		100
5	CERCHA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 4X4 C 02	UND	4	13,103.30	52,413.20	4.00	52,413.20			4.00	52,413.20		100
6	TECHO DE CANALETA 4" LAMINA ALUZINC	M2	195.2	1,130.39	220,652.02	195.20	220,652.02	0.00	0.00	195.20	220,652.02		100
7	INSTALACION DE TUBERIA EMT ø	M.L.	35	135.59	4,745.70	35.00	4,745.70			35.00	4,745.70		100
	SUB TOTAL				316,511.40		316,511.40		0.00		316,511.40		100
MODULO DE NUEVO													
8	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	32.63	33.89	1,105.88	32.63	1,105.88			32.63	1,105.88		100
9	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	8.45	455.97	3,852.92	8.45	3,852.92			8.45	3,852.92		100
10	CIMENTACION DE MANPOSTERIA	M.L.	8.45	3,051.02	25,781.10	8.45	25,781.10			8.45	25,781.10		100
11	SOLERA 20X20 4 Nú3, Nú2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	61.41	582.21	35,753.34	61.41	35,753.34	0.00	0.00	61.41	35,753.34		100
12	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM.	M2	114.72	771.99	88,562.69	114.72	88,562.69			114.72	88,562.69		100
13	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	220.1	250.49	55,131.87	220.10	55,131.87			220.10	55,131.87		100
14	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM.	M2	31.85	362.76	11,554.00			31.85	11,554.00	31.85	11,554.00		100
15	CERAMICA EN PISO 30 X 30	M2	31.85	735.08	23,412.39			31.85	23,412.39	31.85	23,412.39		100
16	MOLDURA PARA PISO DE CERAMICA DE 0.30X0.30	M.L.	32.65	238.54	7,788.46			32.65	7,788.46	32.65	7,788.46		100
17	DEMOLICION DE PAREDES	M2	63.53	18.42	1,170.22	63.53	1,170.22			63.53	1,170.22		100
18	ENTAVICADO DE PARED	ML	19.3	41.74	805.57	19.30	805.57			19.30	805.57		100
19	MOCHETAS	ML	9.8	362.25	3,550.03	9.80	3,550.03			9.80	3,550.03		100

20	CASTILLO 15X15, 3 No.3 Y No.2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	ML	54.4	350.20	19,050.88	54.40	19,050.88	54.40	19,050.88	100
21	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO DE LA DEMOLICION)	M2	63.53	47.22	3,000.00	63.53	3,000.00	63.53	3,000.00	100
	SUB TOTAL			280,519.35	237,764.50	42,754.85	280,519.35	42,754.85	280,519.35	100
MEJORAS DE OBRAS										
21	PICADO DE PARED (LADRILLO RAFON)	M2	168	27.54	4,626.95	168.00	4,626.95	168.00	4,626.95	100
22	REPELLO 2.5 Cms./ZARANDA +"/MORTERO 1:5	M2	179.9	280.27	50,419.91	179.90	50,419.91	0.00	179.90	100
23	PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM.	M2	179.9	110.12	19,809.74	179.90	19,809.74	0.00	179.90	100
24	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO (8 - 10 CM.)	M2	96.6	109.79	10,605.72	96.60	10,605.72		96.60	100
25	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM	M2	110.1	355.51	39,141.59			110.10	39,141.59	100
26	CERAMICA EN PISO 30 X 30	M2	110.1	727.83	80,134.00			110.10	80,134.00	100
27	MOLDURA PARA PISO DE CERAMICA DE 0.30X0.30	M.L.	44.32	228.59	10,456.08			44.32	10,456.08	100
28	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	96.6	18.45	1,781.80			96.60	1,781.80	100
	SUB TOTAL			216,975.79	85,462.32	#####	216,975.79	#####	216,975.79	100
MODULO SANITARIO										
29	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	27.73	132.74	3,680.91	27.73	3,680.91		27.73	100
30	EXCAVACION MATERIAL TIPO 1 (MATERIAL COMUN)	M3	13.85	385.86	5,344.13	13.85	5,344.13		13.85	100
31	REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.)	M3	1.2	331.77	398.12	1.2	398.12		1.2	100
32	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	3.13	460.17	1,440.34	3.13	1,440.34		3.13	100
33	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	0.21	3163.05	664.24			0.21	664.24	100
34	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	0.93	2991.52	2,782.11	0.93	2,782.11		0.93	100
36	JAMBA VERTICAL 15X10, 2#3 Y #2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.	7	419.80	2,938.60	7	2,938.60		7	100
37	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	2.75	2,495.37	6,862.27			2.75	6,862.27	100
38	SUM. E INST. SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)	UNID	3	8392.85	25,178.54			3	25,178.54	100
39	INST. DE TUBERIA PVC 2" PVENTILACION M.S. W-96	UNID	2	448.18	1,221.42			2	1,221.42	100
40	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	4	150.75	603.00	4	603.00		4	100
41	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M.L.	4	229.92	919.69	4	919.69		4	100
42	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3"	M.L.	3	137.88	413.65	3	413.65		3	100
43	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-41	M.L.	3	175.24	525.72	3	525.72		3	100
44	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	M.L.	2	198.99	397.98	2	397.98		2	100
45	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M.L.	2	231.54	463.08	2	463.08		2	100

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicación del proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ

Municipalidad de CANE	Informe de estimación avalando estimación	Muni-2022
-----------------------	---	-----------

INFORME DE SUPERVICION DE OBRA

AVALANDO ESTIMACION

Proyecto: "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ."

Ubicación del proyecto: BARRIO LA VIOLETA, CANE, LA PAZ

Nombre del contratista: M.O. FERNANDO SUAZO

Nombre del supervisor: ing. LUIS FERNANDO MARTINEZ AVILA 'DC/P

Fecha de presentación del informe: 02 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

Datos:

1. Ordenes de cambio del periodo entre la anterior y la representación

Estimación:

A la fecha no ha existido ninguno orden de cambio

2. Días no trabajados por fuerza mayor:

Todos los días se trabajaron.

3. Contratista/ M.O. FERNANDO SUAZO

Responsable de obra: M.O. FERNANDO SUAZO

Permanencia en obra	Permanente		Eventuales	Ocasionalmente
Dirección de obra		X		
Relación con la supervisión		X		
Conocimiento de la obra		X		

4. PROGRESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO

Cronograma:

Porcentaje ejecutado durante el periodo24.94%

Porcentaje acumulado ejecutado.....100.00%

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicación del proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ

Estos porcentajes deberán necesariamente estar repartidos por el cronograma de avance de obras vigentes.

Estado financiero de la obra: expresado en avances de físico:

Avance físico previsto durante el periodo.....	24.94%
Porcentaje ejecutado durante el periodo.....	24.94%
Porcentaje acumulado ejecutado.....	100.00%

5. Calidad de los trabajos realizados

Los trabajos realizados se han realizado siguiendo los procedimientos estipulados en el contrato mediante el supervisor. El trabajos realizado por el maestro de obra sobre la EL PROYECTO REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS" se hace con lo mejor en calidad de materiales para garantizar un buen trabajo del contratista hacía en contratante.

6. Trabajos de supervisión y modificaciones introducidas al proyecto.

La supervisión a este proyecto se hace constante por lo menos una 3 veces durante la semana que se está ejecutando la obra de manera que el ejecutor cumpla con las actividades correspondientes a este proyecto estipuladas en el contrato entre el contratante y contratista.

Se verifica que no se encuentren desperdicios producto de los trabajos ejecutados por el ejecutor, que provoquen daños a las personas que transitan la calle.

En este periodo se han ejecutados los siguientes trabajos:

MODULO DE NUEVO

- PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM.
- CERAMICA EN PISO 30 X 30
- MOLDURA PARA PISO DE CERAMICA DE 0.30X0.30

MEJORAS DE OBRA

- PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM.
- CERAMICA EN PISO 30 X 30
- MOLDURA PARA PISO DE CERAMICA DE 0.30X0.30
- LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicación del proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ

MODULO SANITARIO

- RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)
- LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES
- SUM. E INST. SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)
- INST. DE TUBERIA PVC 2" P/VENTILACION M.S. W-96
- INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"
- SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41
- INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3"
- SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-41
- INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"
- SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41
- INSTALACION DE TUBERIA PVC ø"
- SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5
- ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)
- RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)
- PISO DE CONCRETO SIMPLE 8 CM. P/ACERA

La visita al proyecto por parte del supervisor se hace durante los días lunes a viernes, en un horario entre las 8am hasta las 5 pm.

Los trabajos inician desde la 6am hasta que finalizan aproximadamente a las 2 de la tarde.

7. Conclusiones y recomendaciones generales:

No hay ninguna recomendación

Firma del supervisor: _____

Lugar (municipio de Cane, departamento de la Paz)

Fecha de presentación: 30 de Diciembre del año 2022



Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicación del proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ

AVANCE FINANCIERO

INFORME DE SUPERVICION

Proyecto: "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ."

Ubicación del proyecto: BARRIO LA VIOLETA, CANE, LA PAZ

Fuente de financiamiento, fondos de transferencias del gobierno central, como aporte municipal, por medio de la alcaldía municipal de CANE.

En esta se detallan el avance financiero del proyecto en base a los pagos efectuados durante el periodo que comprende del 02/12/2022 - 30/12/2022 en base a la QUINTA ESTIMACION.

	Monto en Lps	porcentajes
Monto del contrato	896,220.30	100.00%
Deducción del 5% de calidad	11,176.84	24.94%
Estimación 5	223,536.89	24.94%
Deducción del 12.5%	4,191.32	24.94%
AVANCE FINANCIERA		24.94%

	MONTOS ACUMULADOS	% DE AVANCE MONETARIO
GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD	44811.02	100.00%
Deducción del 12.5%	16,804.13	100.00%
ESTIMACION 1,2,3,4,5	896,220.30	100.00%

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicación del proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ

RETENCIONES

RETENCIONES	
GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD	44,811.02
DEDUCCION DEL 12.5%	16,804.13

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicación del proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ


FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO

"REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ"


Ubicación del proyecto: BARRIO LA VIOLETA, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ

MUNICIPIO DE CANE DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicación del proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ

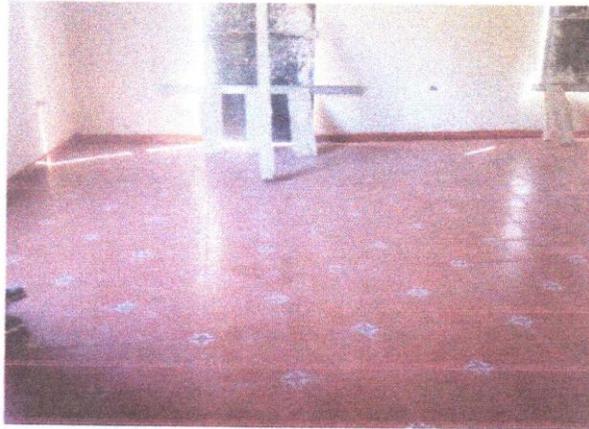

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicación del proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ

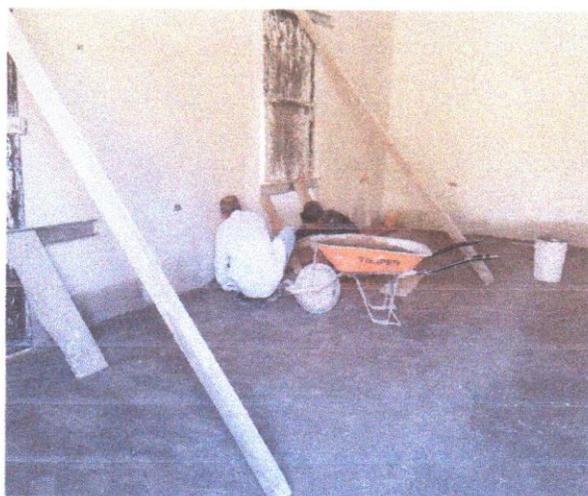




Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicación del proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ





Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicación del proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ





Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicación del proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ

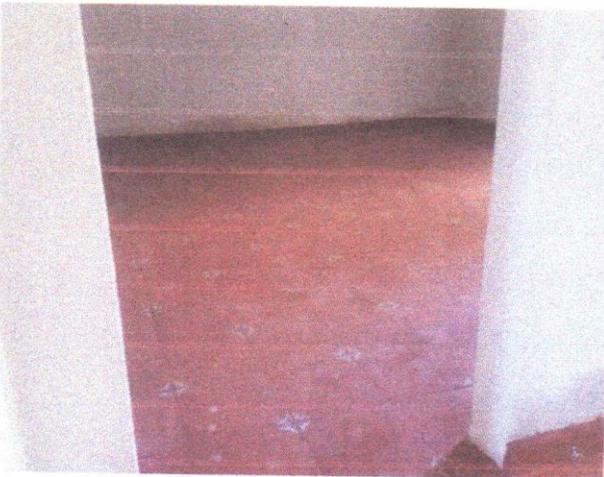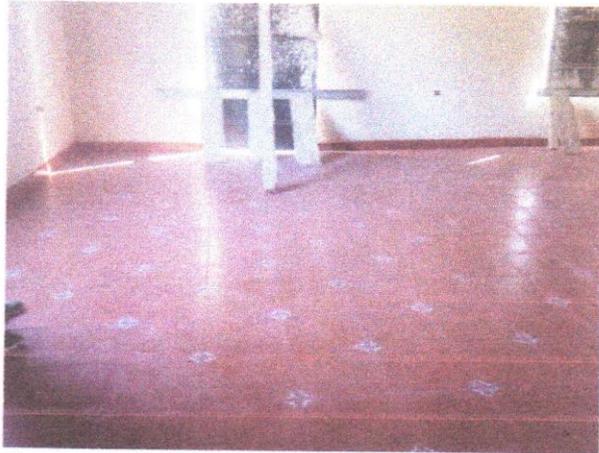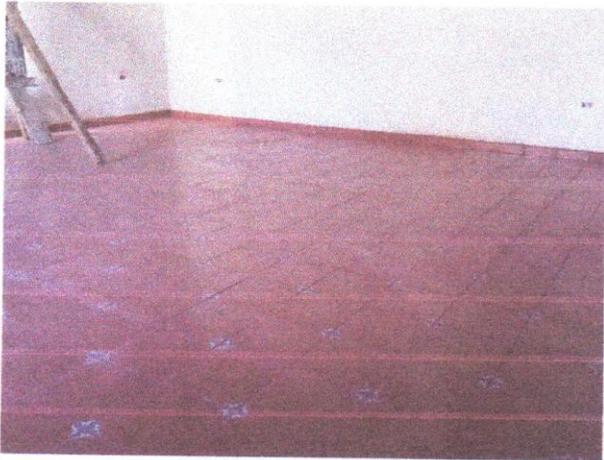



Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicación del proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ

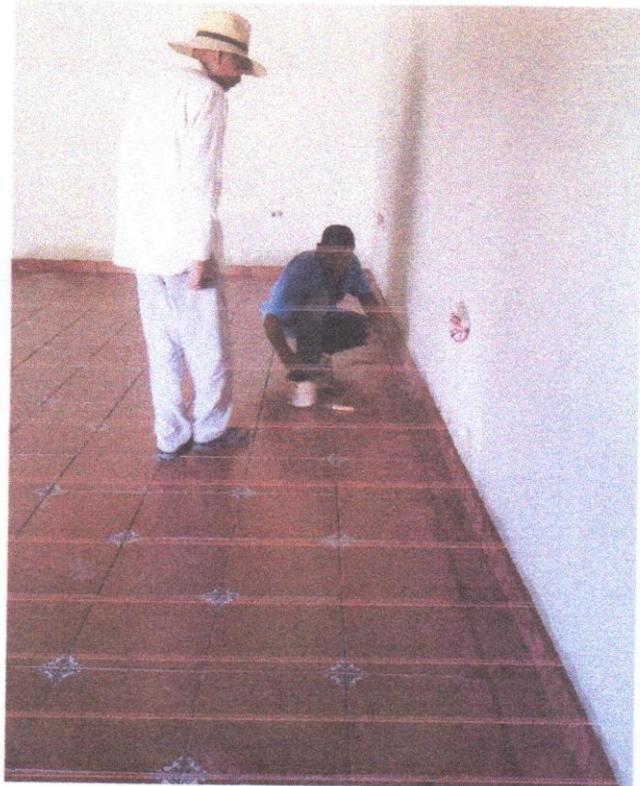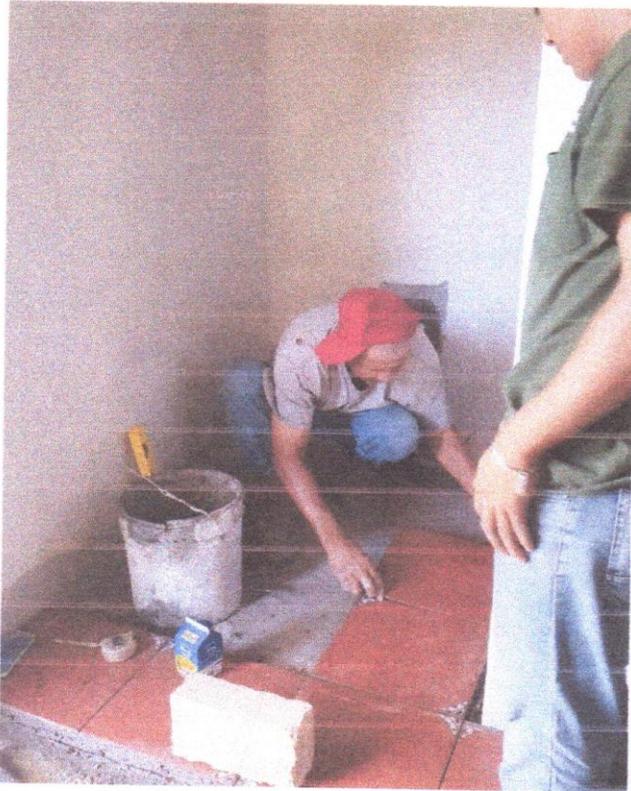

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicación del proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ

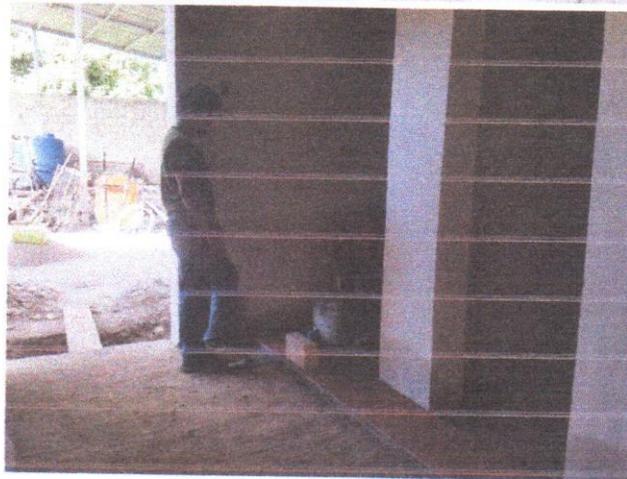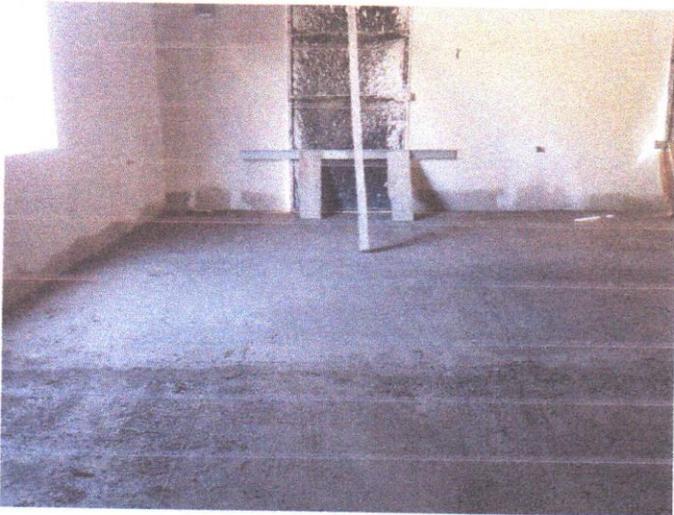

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicación del proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ

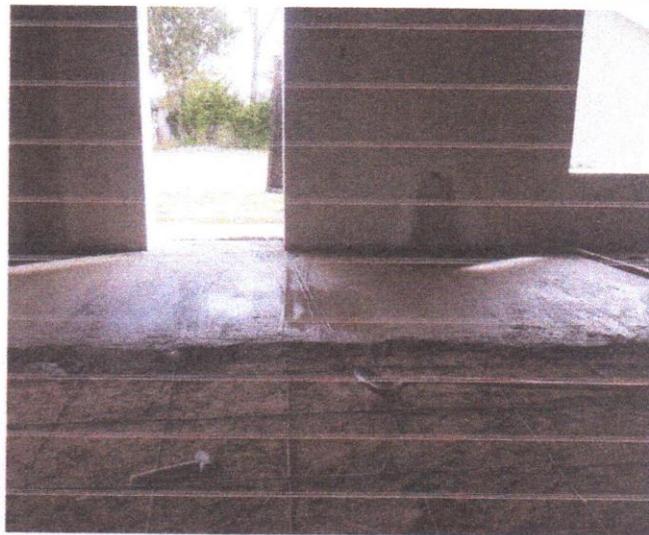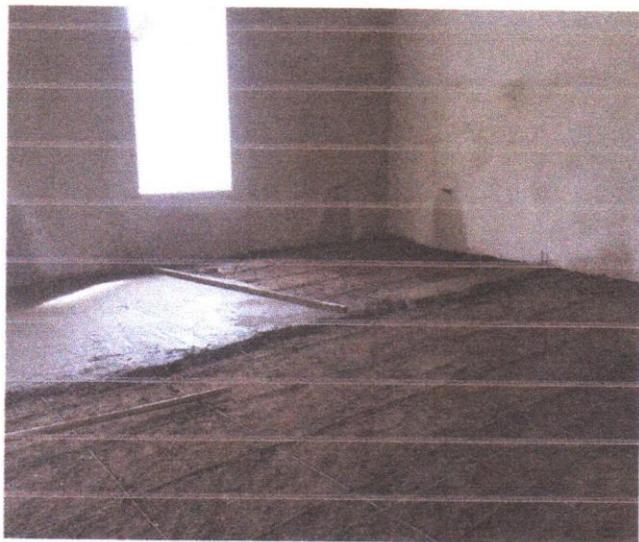

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicación del proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ

