



Municipalidad de Cane, Departamento La Paz
Proyectos Municipales en Materia de Transparencia

Identificación del Proyecto	
1. Propietario del Proyecto:	Maestro de obra, Fernando Suazo
2. Sector o Sub sector:	Barrio la violeta
3. Nombre del Proyecto:	"REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ.
4. Ubicación Geográfico del Proyecto:	Casco urbano del Municipio
5. Objetivo General del Proyecto:	Con la ejecución de este proyecto se pretende mejorar las instalaciones del edificio que estaban en mal estado, para generar una cultura a los jóvenes como es la creación de la escuela de música, para prevenir la inclusión a malos hábitos.
6. Objetivos Específicos del Proyecto	Construcción y reparación de la escuela Generar empleo Instalaciones en buen estado Inclusión de jóvenes en la parte de arte.
7. Descripción del Proyecto:	El proyecto consiste en la construcción de paredes que están en mal estado, reparación de paredes existentes instalación de baños, instalación de cerámica, construcción de pila, repello y pulido.
Elaboración del Proyecto	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Beneficiar a 5190 personas que es la población de la comunidad del municipio de Cane.
2. Impacto en las planificaciones institucionales	No aplica
3. Detalles de Contacto:	el contrato se firmó el 12 de Septiembre, teniendo una vigencia de 109 días calendario a partir de la orden de inicio
4. Fuente de Financiamiento:	Alcaldía municipal de Cane
6. Costo del Proyecto (En caso de no tener un costo exacto, mostrar una proyección del mismo):	Lps. L. 896,220.30
7. Fecha de Finalización:	31/12/2022
Detalles del Proyecto	



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Etapas del Proyecto	Descripción de la Etapa	Periodo de Implementación	Responsable	Indicador de Cumplimiento
EJECUCION	Se está en pulido de paredes.	04/11/2022 al 02/12/2022	Luis Fernando Martínez	Paredes culminadas y repelladas
Ejecución y Seguimiento del Proyecto				
1. Estado del Proyecto (Actual):	Ejecutado aproximadamente en un 74.53%			
2. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente:	NO APLICA			
3. Variación en el costo del Proyecto:	NO APLICA			
4. Variaciones en el alcance y durabilidad del Proyecto:	NO APLICA			
5. Razones de los cambios antes mencionados:	NO APLICA			


Luis Fernando Martínez
Desarrollo Comunitario Y Proyectos





Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022
Hora : 12:08 p.m.
USUARIO: REINA.ISCOA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15330

L.: 206,623.42

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 11640

Fecha de Emision: 2/12/2022

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERNANDO SUAZO GONSALEZ

Id/RTN: 1204195800002

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

Pago de la Cuarta Estimacion del Proyecto Reparacion y construccion del Edificio Antigua Escuela de Varones Jose Trinidad Cabañas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 005 000 001 47110 11-001-01	Reparación y Construcción del Edificio Antigua Escuela de Varones Jose Trinidad Cabañas.	206,623.42

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	206,623.42
Monto Total:		206,623.42

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	206,623.42
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	206,623.42



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por: Fernando Suazo Gonzalez
Identidad No.: 1204-1958 00002

0s+js;19Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1xOX5EYfahZyAlw/F++rWqK1SW0jR594Vdvmv+2cgC2ECde9S4z9ORXJaUd+j+66GNe05DHqKqHFZN0NtqniXrCpO87JJy/RJVEds06JabDuluYrqCZgiDuh

**ESTIMACION No 4
MUNICIPALIDAD DE CANE, LA PAZ**

**PROYECTO: ""REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE
UBICACIÓN: BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, DEPTO DE LA PAZ
EJECUTOR: M.O.FERNANDO SUAZO
PERIODO DEL: 04 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022**

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO BASE				EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
TECHOS Y CIELO FALSO												
1	DESMONTAJE DE TIJERA	UNIDA	4	416.02	1,664.08	4.00	1,664.08			4.00	1,664.08	100
2	DESMONTAJE INST. ELECTR. (LAMP., VENT., TOMA E INT)	DIA	2	1,191.31	2,382.61	2.00	2,382.61			2.00	2,382.61	100
3	DESMONTAJE DE LAMINA TECHO (ESTRUC. EXISTENTE)	M2	108.3	54.09	5,857.46	108.30	5,857.46			108.30	5,857.46	100
4	SOLERA 15 X 15 4No.3 Y No.2, CONCRETO 1:2:2	M.L.	62.41	461.41	28,796.33	62.41	28,796.33			62.41	28,796.33	100
5	CERCHA DE TUBO ESTRUCTURLA DE 4X4 C 02	UND	4	13,103.30	52,413.20	4.00	52,413.20			4.00	52,413.20	100
6	TECHO DE CANALETA 4" LAMINA ALUZINC	M2	195.2	1,130.39	220,652.02	44.23	50,000.00	150.97	170,652.02	195.20	220,652.02	100
7	INSTALACION DE TUBERIA EMT ø	M.L.	35	135.59	4,745.70	35.00	4,745.70			35.00	4,745.70	100
SUB TOTAL					316,511.40		145,859.38		170,652.02		316,511.40	100
MODULO DE NUEVO												
8	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	32.63	33.89	1,105.88	32.63	1,105.88			32.63	1,105.88	100
9	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	8.45	455.97	3,852.92	8.45	3,852.92			8.45	3,852.92	100
10	CIMENTACION DE MANPOSTERIA	M.L.	8.45	3,051.02	25,781.10	8.45	25,781.10			8.45	25,781.10	100
11	SOLERA 20X20 4 Nú3, Nú2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	61.41	582.21	35,753.34	61.41	35,753.34	0.00	0.00	61.41	35,753.34	100
12	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM.	M2	114.72	771.99	88,562.69	114.72	88,562.69			114.72	88,562.69	100
13	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	220.1	250.49	55,131.87	220.10	55,131.87			220.10	55,131.87	100
14	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM.	M2	31.85	362.76	11,554.00							
15	CERAMICA EN PISO 30 X 30	M2	31.85	735.08	23,412.39							
16	MOLDURA PARA PISO DE CERAMICA DE 0.30X0.30	M.L.	32.65	238.54	7,788.46							
17	DEMOLICION DE PAREDES	M2	63.53	18.42	1,170.22	63.53	1,170.22			63.53	1,170.22	100

18	ENTAVICADO DE PARED	ML	19.3	41.74	805.57			19.30	805.57	19.30	805.57	100
19	MOCHETAS	ML	9.8	362.25	3,550.03	9.80	3,550.03			9.80	3,550.03	100
20	CASTILLO 15X15, 3 No.3 Y No.2 @ 20,CONCRETO 1:2:2	ML	54.4	350.20	19,050.88	54.40	19,050.88			54.40	19,050.88	100
21	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO DE LA DEMOLICION)	M2	63.53	47.22	3,000.00	63.53	3,000.00			63.53	3,000.00	100
SUB TOTAL					280,519.35		236,958.93		805.57		237,764.50	84.76
MEJORAS DE OBRAS												
21	PICADO DE PARED (LADRILLO RAFON)	M2	168	27.54	4,626.95	168.00	4,626.95			168.00	4,626.95	100
22	REPELLO 2.5 Cms./ZARANDA +/-MORTERO 1:5	M2	179.9	280.27	50,419.91	90.00	25,223.97	89.90	25,195.94	179.90	50,419.91	100
23	PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM.	M2	179.9	110.12	19,809.74			90.00	25,223.97	90.00	25,223.97	50
24	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO (8 - 10 CM.)	M2	96.6	109.79	10,605.72	96.60	10,605.72			96.60	10,605.72	100
25	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM.	M2	110.1	355.51	39,141.59							
26	CERAMICA EN PISO 30 X 30	M2	110.1	727.83	80,134.00							
27	MOLDURA PARA PISO DE CERAMICA DE 0.30X0.30	M.L.	44.32	228.59	10,456.08							
28	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	96.6	18.45	1,781.80							
SUB TOTAL					216,975.79		40,456.64		50,419.91		90,876.55	41.88
MODULO SANITARIO												
29	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	27.73	132.74	3680.91	27.73	3680.91			27.73	3680.91	100
30	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	13.85	385.86	5344.13	13.85	5344.13			13.85	5344.13	100
31	REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.)	M3	1.2	331.77	398.12	1.2	398.12			1.2	398.12	100
32	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	3.13	460.17	1440.34	3.13	1440.34			3.13	1440.34	100
33	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	0.21	3163.05	664.24							
34	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	0.93	2991.52	2782.11	0.93	2782.11			0.93	2782.11	100
36	JAMBA VERTICAL 15X10, 2#3 Y #2 @ 20,CONCRETO 1:2:2	M.L.	7	419.80	2938.60	7	2938.6			7	2938.60	100
37	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	2.75	2495.37	6862.27							
38	SUM. E INST. SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)	UNID	3	8392.85	25178.54							
39	INST. DE TUBERIA PVC 2" P/VENTILACION M.S. W-96	UNID	2	448.18	1221.42							
40	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	4	150.75	603.00							

41	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M.L.	4	229.92	919.69						
42	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3"	M.L.	3	137.88	413.65						
43	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-41	M.L.	3	175.24	525.72						
44	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	M.L.	2	198.99	397.98						
45	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M.L.	2	231.54	463.08						
46	INSTALACION DE TUBERIA PVC ø"	M.L.	6	73.37	440.21						
47	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5	M.L.	6	130.84	785.06						
48	PILA CON RIVAL 1.30X0.90X1.00 EN MODULO SANITARIO	UNID	1	6201.05	6201.05	1	6201.05			1	6201.05 100
49	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	1.45	356.33	841.74						
50	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	18.49	952.50	17620.34						
51	PISO DE CONCRETO SIMPLE 8 CM. P/ACERA	M2	8.19	264.53	2491.56						
SUB TOTAL					82,213.76		22,785.26		0.00		22,785.26
TOTAL					896,220.30		446,060.21		221,877.50		667,937.71 74.53
TOTAL PRESUPUESTO COSTO DIRECTO					896,220.30		446,060.21		221,877.50		667,937.71 74.53

ESTIMACION 2	221,877.50
RETECION DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA	11,093.88
RETECION DEL 12.5%	4,160.20
TOTAL A PAGAR	206,623.42

CONTRATANTE

[Handwritten Signature]
CONTRATISTA

SUPERVISOR



Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicación del proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ

Municipalidad de CANE	Informe de estimación avalando estimación	Muni-2022
-----------------------	---	-----------

INFORME DE SUPERVICION DE OBRA

AVALANDO ESTIMACION

Proyecto: "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ."

Ubicación del proyecto: BARRIO LA VIOLETA, CANE, LA PAZ

Nombre del contratista: M.O. FERNANDO SUAZO

Nombre del supervisor: ing. LUIS FERNANDO MARTINEZ AVILA 'DC/P

Fecha de presentación del informe: 04 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022

Datos:

1. Ordenes de cambio del periodo entre la anterior y la representación Estimación:
A la fecha no ha existido ninguno orden de cambio
2. Días no trabajados por fuerza mayor:
Todos los días se trabajaron.
3. Contratista/ M.O. FERNANDO SUAZO
Responsable de obra: M.O. FERNANDO SUAZO

Permanencia en obra	Permanente	Eventuales	Ocasionalmente
Dirección de obra	X		
Relación con la supervisión	X		
Conocimiento de la obra	X		

4. PROGRESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO

Cronograma:

Porcentaje ejecutado durante el periodo24.76%
 Porcentaje acumulado ejecutado.....74.53%

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicación del proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ

Estos porcentajes deberán necesariamente estar repartidos por el cronograma de avance de obras vigentes.

Estado financiero de la obra: expresado en avances de físico:

Avance físico previsto durante el periodo.....	24.76%
Porcentaje ejecutado durante el periodo.....	24.76%
Porcentaje acumulado ejecutado.....	74.53%

5. Calidad de los trabajos realizados

Los trabajos realizados se han realizado siguiendo los procedimientos estipulados en el contrato mediante el supervisor. El trabajos realizado por el maestro de obra sobre la EL PROYECTO REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS" se hace con lo mejor en calidad de materiales para garantizar un buen trabajo del contratista hacia en contratante.

6. Trabajos de supervisión y modificaciones introducidas al proyecto.

La supervisión a este proyecto se hace constante por lo menos una 3 veces durante la semana que se está ejecutando la obra de manera que el ejecutor cumpla con las actividades correspondientes a este proyecto estipuladas en el contrato entre el contratante y contratista.

Se verifica que no se encuentren desperdicios producto de los trabajos ejecutados por el ejecutor, que provoquen daños a las personas que transitan la calle.

En este periodo se han ejecutados los siguientes trabajos:

TECHOS Y CIELO FALSO

- TECHO DE CANALETA 4" LAMINA ALUZINC

MODULO DE NUEVO

- ENTABICADO DE PARED

MEJORAS DE OBRAS

- REPELLO 2.5 Cms./ZARANDA ÷"/MORTERO 1:5
- PULIDO DE PAREDES

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicación del proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ

La visita al proyecto por parte del supervisor se hace durante los días lunes a viernes, en un horario entre las 8am hasta las 5 pm.

Los trabajos inician desde la 6am hasta que finalizan aproximadamente a las 2 de la tarde.

7. Conclusiones y recomendaciones generales:
No hay ninguna recomendación

Firma del supervisor: _____

Lugar (municipio de Cane, departamento de la Paz)

Fecha de presentación: 02 de Diciembre del año 2022

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicación del proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ

AVANCE FINANCIERO

INFORME DE SUPERVISION

Proyecto: "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ."

Ubicación del proyecto: BARRIO LA VIOLETA, CANE, LA PAZ

Fuente de financiamiento, fondos de transferencias del gobierno central, como aporte municipal, por medio de la alcaldía municipal de CANE.

En esta se detallan el avance financiero del proyecto en base a los pagos efectuados durante el periodo que comprende del 04/11/2022 - 02/12/2022 en base a la primera estimación.

	Monto en Lps	porcentajes
Monto del contrato	896,220.30	100.00%
Deducción del 5% de calidad	11,093.50	24.76%
Estimación 4	221877.50	24.76%
Deducción del 12.5%	4,160.20	24.76%
AVANCE FINANCIERA		24.76%

	MONTOS ACUMULADOS	% DE AVANCE MONETARIO
GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD	33,633.80	74.53%
Deducción del 12.5%	12,612.81	74.53%
ESTIMACION 1,2,3,4	667,937.71	74.53%

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicación del proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ

RETENCIONES

RETENCIONES	
GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD	33,633.80
DEDUCCION DEL 12.5%	12,612.81

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicación del proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ

FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO

"REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ"

Ubicación del proyecto: BARRIO LA VIOLETA, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ


MUNICIPIO DE CANE DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicación del proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ


pulido de paredes



Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicación del proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ

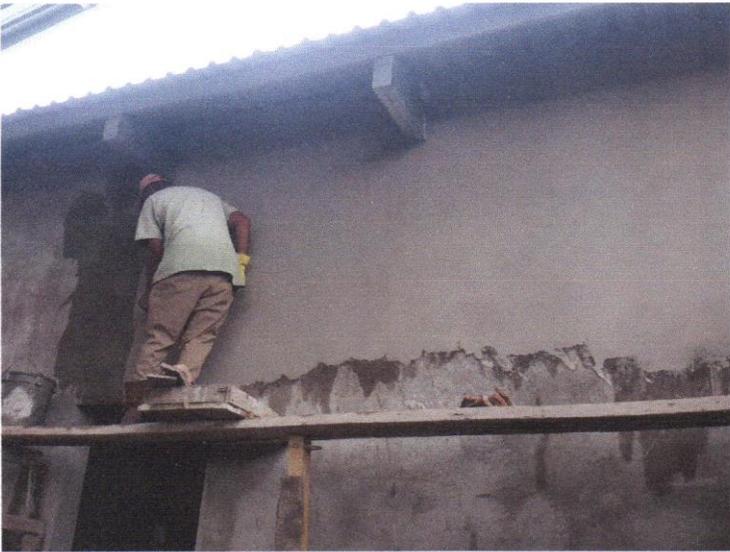

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicación del proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ

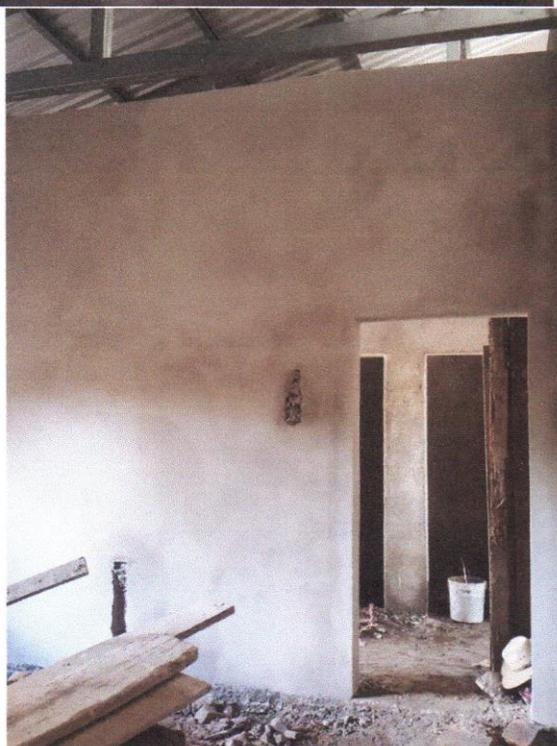

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicación del proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ

Instalación de techo



007614000012
ALCALDIA MUNICIPAL CANE, LA PAZ
MUNICIPIO CANE EN PRO. EL NORTE DE
PLAZA SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00010012

Cane, La Paz 2/12/2022
Lugar y Fecha


Páguese a la orden de Fernando Suroz Gonzales.

L 206,623.42

Cantidad en letras Doscientos Seis mil Seiscientos Veintitres 42/100

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.


Firma(s)



⑆0 100 1 14 2⑆0000 76 14000 2 18 ⑆000 100 1 2



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022

Hora : 12:10 p.m.

USUARIO: REINA.ISCOA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15331

L.: 4,160.20

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 11641

Fecha de Emisión: 2/12/2022

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Id/RTN: 08019017898978

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO SESENTA CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

Deducción del 12.5% de Impuesto sobre la renta por Pago de la Cuarta Estimacion del Proyecto Reparacion y construccion del Edificio Antiguo Escuela de Varones Jose Trinidad Cabañas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 005 000 001 47110 11-001-01	Reparación y Construcción del Edificio Antiguo Escuela de Varones Jose Trinidad Cabañas.	4,160.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,160.20
Monto Total:		4,160.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	4,160.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,160.20



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1xOX5EyfahZyAlw/F++rWqK1SW0jR594Vdmv+2cgC2ECde9S4z9ORXJaUd+j+68GNe05DHqKqHfZn0NtqnIXrCpO87JJy/RJVEds06JabDuluYrqCZgiDuh



RECIBO OFICIAL DE PAGO

IDENTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO N°	1	25278997545
	ALCALDIA MUNICIPAL CANE	PERIODO	2	MES AÑO 12 2022
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	4	12049995434017
	<i>Impuesto sobre renta</i>	CÓDIGO IMPUESTO	18	1112
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19	1

IMPUESTO A PAGAR	RESUMEN DE PAGO	82	4,360.20	2
MULTA		83		1
RECARGO		84		0
INTERESES		85		6

CON PAGO

CONTRIBUYENTE	FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL	SELLOS	BANCA HONDUREÑA DEL CAJERO S.A. BANHCAFE 12549	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
	LUGAR Y FECHA <i>Cane, 02/12/2022</i>			CÓDIGO BANCO 01309	FECHA DE PAGO DIA MES AÑO 02/12/2022

Original: SAR

1ra Copia: Banco

2da Copia: Contribuyente

"EJEMPLAR GRATUITO"

TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURÍDICA)	207	IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
102	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)	208	IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
103	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL	210	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS GASEOSAS
104	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURÍDICA	211	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
106	IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	214	APORTE PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL
107	CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	215	RETENCIÓN ISV POR TARJETAS DE DÉBITO O CRÉDITO
111	RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	217	RETENCIÓN ISV (ARTÍCULO 5)
112	RETENCIÓN 12.5% (ART. 56 I.S.R.)	219	RETENCIÓN ISV POR SERVICIOS PÚBLICOS
113	RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	253	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONCESIONADA
115	RETENCIÓN INTERESES (ART. III)	254	IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA. RIFAS Y SORTEOS
116	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	255	IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVIETE O AZAR
117	RETENCIÓN POR RENTA A CAPICULTORES	259	TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
118	RETENCIÓN POR BODIA	401	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
119	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	409	APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL
120	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL 20LITUR	501	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
122	RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 ISR)	502	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE TELEFONÍA MÓVIL
123	INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 5 ISR)	503	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
124	SUELDOS SALARIOS COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 ISR)	504	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CASINOS Y MÁQUINAS TRAGAMONEDA
125	REGALÍAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	506	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
126	INTERESES SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC. (ART. 5 ISR)	507	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (1%)
127	PELÍCULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC. (ART. 5 ISR)	508	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)
128	PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	509	CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
129	RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 ISR)	521	SANCIÓN POR DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES (SOMI)
130	RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 ISR)	522	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE CRÉDITOS ISV (DAC)
131	REGALÍAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	523	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO (ATC)
132	OPERACIONES DE NAVES AEREAAS, MARITIMAS Y AUTOS (ART. 5 ISR)	524	SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CONTRIBUCIÓN TRANSACCIONES FINANCIERAS
133	INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 ISR)	525	DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
134	OTROS INGRESOS DE OPERACIONES OPERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 5 ISR)	527	DECLARACIÓN MENSUAL DE CRÉDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
135	RETENCIÓN ANTIPOCO ISR (1%) (ART. 15 DEC. 17-2019)	545	SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
136	RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	546	SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
137	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27-2011 (10%)	547	SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
138	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (2%)	548	SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
139	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES	549	SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
151	IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	530	SANCIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DE DOCTOS. EN PROCESO DE ALEATORIA
152	IMPUESTO AL ACTIVO NETO	541	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
156	IMPUESTO DE REVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS	506	MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
157	IMPUESTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	510	MULTA INFORMACIÓN DE TERCEROS
158	ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	511	MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DECLARACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES
159	IMPUESTO SOBRE VENTAS	550	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
162	MULTA RÉGIMEN SIMPLIFICADO I S V	555	SANCIONES AUDITORIAS PREVENTIVAS
203	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	570	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA SUSCRIPCIÓN A FACTURACIÓN
284	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA	571	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA ACTIVACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRENTA
295	IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOL Y LICORES NACIONALES	572	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA INACTIVACIÓN DE DOCUMENTOS FISCALES

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 18 BANHCAFE
SUCURSAL: 5 COMAYAGUA, COMAYAGUA

FECHA: 06/12/2022 HORA: 09:26:45 a.m.

CAJA: 1

USUARIO: bhcdyr

TRANSACCIÓN: 01800501202212060926454

N° DE DECLARACIÓN: 25278997545

PERIODO:

12-2022

RTN:

12049995434017

IMPUESTO: RETENCION HONORARIOS (ART. 50)

112

CONCEPTO: Propio cómputo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 4,160.20

Multa

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 4,160.20

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja



CON PAGO

007614000213
ALCALDIA MUNICIPAL CANE LA PAZ
MUNICIPIO CANE LA PAZ - NI. NORTE DE
PLAZA SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00010013

Cane, La Paz 2/12/2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Servicio de Administración de Renta L 4,160.20

Cantidad en letras Cuatro mil Ciento Sesenta 20/100

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

[Signature]
Firma(s)



⑆01001142⑆00007614000218⑆00010013
