

COPIA

MEMORANDO

No. 0051-SGIMSG-2023

07 de enero de 2023

PARA: LIC. LORNA ELISA CALIX MEJIA
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: ING. VICTOR VILAFRANCA
SUBGERENTE NACIONAL DE ING. MANT. Y SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: ENVIO DE INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA



Se adjunta el informe de proyectos en ejecución por parte del IHSS para el mes de diciembre 2022


Información de Proyectos mes de diciembre 2023:

- 1- Memorando No. 09 SGIMSG-2023
- 2- Memorando No. 0013 SGIMSG-2023
- 3- Memorando No. SGMHRN-017-2023

Atentamente,

cc: Archivo

VV/ED



MEMORANDO

No. 09-SGIMSG-2023

ING 02

04 de Enero del 2023

PARA: **ING. VICTOR VILAFRANCA**
SUBGERENTE NACIONAL DE INGENIERÍA, MANTENIMIENTO, Y SERV. GENERALES

DE: **ING. ANGEL AMAYA**
COORDINADOR OBRAS ELÉCTRICAS

ASUNTO: **AVANCE DE PROYECTO**



En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al ítem N° 2 del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de DICIEMBRE del 2022:

1. **“Adquisición e Instalación de 286 Unidades de Aire Acondicionado a nivel nacional para el Instituto Hondureño de Seguridad Social” se informa lo siguiente:**

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “ Adquisición e Instalación de 286 Unidades de Aire Acondicionado a nivel nacional para el Instituto Hondureño de Seguridad Social”
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital de Especialidades y Hospital Regional del Norte.
5. **Propósito:** Climatizar área de Quirófanos en el Hospital Regional del Norte y Climatizar área de Emergencia de Adulto, Observaciones y UCIP para el Hospital de Especialidades.
6. **Descripción del Proyecto:** Desmontaje, Suministro e Instalación de Unidades de Aire Acondicionado Tipo Paquetes de 15,5 y 3 Toneladas, cabe hacer la observación que para este contrato solo se instalaron las 13 Unidades tipo Paquete Únicamente.

 INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	
SGIMSG	
RECIBIDO	
FECHA:	04/01/23
HORA:	08:16 a.m.
NOMBRE:	Ricardo Diaz

Nombre de su ciudad
Honduras C.A.

@IHSSHonduras

B. Elaboración del Proyecto:

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de los pacientes de Salas Quirúrgicas y Observaciones tanto para el Hospital de Especialidades y Hospital Regional del Norte.
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No representa ningún daño a los edificios de la Instituto.
4. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Víctor Villafranca
 - Tel: 9470-5964
 - villafranca9@gmail.com
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 15,000,000.00
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 09 de noviembre de 2021
8. **Estado del Proyecto:** El proyecto se encuentra en ejecución a la fecha.
9. **Costo de Finalización:** Se sigue en ejecución del proyecto.
10. **Fecha de Finalización:** Se sigue en ejecución del proyecto, el mismo tiene Orden de Inicio a la Firma de Contrato con Fecha 03 de Febrero 2022.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra aún en ejecución.



www.ihss.hn

Nombre de su ciudad
Honduras C.A.

@IHSSHonduras

2. **“Adquisición e Instalación de 4 Ascensores para el Edificio RSPS de Tegucigalpa, Hospital General de Especialidades y Hospital Regional del Norte en San Pedro Sula, del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS”**


Se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Adquisición e Instalación de 4 Ascensores para el Edificio RSPS de Tegucigalpa, Hospital General de Especialidades y Hospital Regional del Norte en San Pedro Sula, del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS”
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital de Especialidades en La Granja, Edificio de RSPS y Hospital Regional del Norte.
5. **Propósito:** Brindar una Mejor Atención a los Derechohabientes.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de Reemplazo de dos Ascensores en el Hospital de Especialidades, Instalación de Un Ascensor en el Edificio de RSPS e Instalación de Un Ascensor para el Hospital Regional del Norte.

B. Elaboración del Proyecto:

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de los Pacientes de Salas Quirúrgicas y Observaciones tanto para el Hospital de Especialidades y Hospital Regional del Norte.
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del Proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No representa ningún daño a los Edificios del Instituto.
4. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Víctor Villafranca
 - Tel: 9470-5964
 - villafranca9@gmail.com
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 15,500,000.00
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 16 de Marzo de 2022
8. **Estado del Proyecto:** El proyecto se encuentra en ejecución a la fecha



9. **Costo de Finalización:** El proyecto está en ejecución por lo que aún no se Tiene el precio final del proyecto.
10. **Fecha de Finalización:** Se sigue en ejecución del proyecto, el mismo tiene Orden de Inicio con fecha 15 de Marzo de 2022 y Fecha de Finalización 15 de Octubre de 2022

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra aún en ejecución, cabe hacer mención que en fecha viernes 02 de diciembre de 2022 fue concluida la instalación del ascensor del Hospital Regional del Norte.

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.

cc. Archivo

VV/AA

Nombre de su ciudad
Honduras C.A.

@IHSSHonduras



MEMORANDO

No. 0013-SGIMSG-2023

ING-04

04 de Enero de 2023

PARA: ING. VICTOR VILAFRANCA
SUBGERENTE NACIONAL DE INGENIERÍA, MANTENIMIENTO, Y SERV. GENERALES

DE: ING. REBECA RIVERA Por: 
COORD. Y SUPERVISORA DE OBRAS




ASUNTO: AVANCE DE PROYECTO

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al ítem N° 2 del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **DICIEMBRE del 2022:**

1. **“Construcción de los Edificios para los Servicios de Hemodiálisis en la Ciudad de La Ceiba y Choluteca del IHSS”** y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Construcción de los Edificios para los Servicios de Hemodiálisis en la Ciudad de La Ceiba y Choluteca del IHSS”
4. **Ubicación de Proyecto:** La Ceiba y Choluteca.
5. **Propósito:** Construcción de dos Edificios que puedan brindar los servicios de Hemodiálisis a los pacientes de estas dos ciudades, a fin de que se mejore la atención de los pacientes de esas zonas.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de nivelación de terrenos, cimentaciones, construcción de cimentaciones, paredes de bloque, colocación de pisos y firmes de concreto, paredes de tabla roca, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, cisterna, entre otros.



3. **Nombre del Proyecto:** "Pintado Exterior y Obras Menores del Hospital de Especialidades del IHSS"
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital de Especialidades en La Granja.
5. **Propósito:** Mantenimiento del Hospital de Especialidades.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizarán trabajos de reparación de paredes de bloque y pintado de paredes de bloque en su lado exterior. Así mismo se hará cambio de ventanas que requieran a la fecha.

B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Darle mantenimiento preventivo al Edificio del Hospital de Especialidades.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No representa ningún daño al terreno del Instituto.
10. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Víctor Villafranca
 - Tel: 9470-5964
 - villafranca9@gmail.com
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 3,901,330.24
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 12 de Abril de 2021
14. **Estado del Proyecto:** El proyecto se recepciono el 05 de diciembre del 2022.
15. **Costo de Finalización:** L. 3,989,824.24
16. **Fecha de Finalización:** El proyecto fue finalizado el 05 de diciembre del 2022.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra finalizado.

3. **"Servicios de Evaluó de los Bienes Inmuebles Propiedad del IHSS" y se informa lo siguiente:**

A. Identificación del Proyecto:

17. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
18. **Sector Subsector:** Salud
19. **Nombre del Proyecto:** "Servicios de evaluó de los Bienes Inmuebles Propiedad del IHSS"



MEMORANDO
No. SGMHRN-017-2023




Enero 06 del 2023.

PARA: ING. VICTOR VILLAFRANCA
Sub Gerente de Ing. Manto y Servicios Generales a Nivel Nacional
IHSS-Tegucigalpa

DE: ING. ALLAN ZAVALA
Subgerente de Mantenimiento H.R.N.

ASUNTO: Información de Proyecto Hospital regional del Norte IHSS-San Pedro Sula.

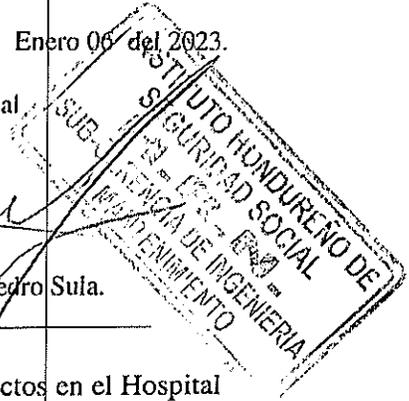

Por este medio se remite información en relación a la ejecución de proyectos en el Hospital Regional del Norte, correspondiente al mes de **DICIEMBRE 2022**:

El proyecto de **“REPARACIÓN DE TECHOS LOSAS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE ETAPA 1 DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)”**. Contrato No. 0129-2022” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “REPARACIÓN DE TECHOS LOSAS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE ETAPA 1 DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital Regional del Norte S.P.S. Col. Tara, San Pedro Sula.
5. **Propósito:** reparación de estructura y cubierta de techos, reemplazo de enclados e impermeabilización de losas del ala norte del HRN.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, desmontajes de aires acondicionado, montaje de las misma unidades colocación de láminas de aluzic, cielo falso, entre otros.

B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención en el servicio de Salas de Ginecología, Maternidad, Cirugía de Mujeres, Cirugía de Hombres, Medicina de Mujeres, Medicina de Hombres, Pediatría A, Pediatría B, Ortopedia y Almacén Regional del Hospital Regional del Norte, IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No aplica.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No aplica

Subgerencia de Mantenimiento Hospital Regional del Norte
www.ihss.hn

10. Detalles del contacto:

- Ing. Víctor Villa
- Tel: 9470-5964
- victor.villafranca@ihss.com

11. Fuentes de financiamiento: Fondos Propios


12. Presupuesto del Proyecto: L. 8,272,677.29

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en proceso de ejecución.

Sin más que agregar.

Atte.
cc. Archivo

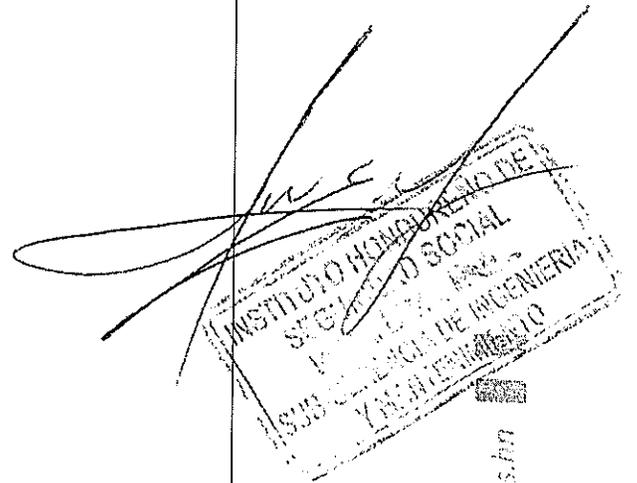

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURO SOCIAL
SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO
