



INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES AGUAS DE PUERTO CORTES

Correspondiente al mes de Marzo 2023



**Aguas de
Puerto Cortés**
Empresa de Agua y Saneamiento S.A de C.V

MEMORANDUM

Para: Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

De: Ing. Jorge Alberto Aguilera
Gerente General



Asunto: Informe Mensual del Portal de Transparencia

Fecha: 10 de abril del 2023

Por este medio le remito actividades del mes de Marzo con el presupuesto ejecutado para ser cargado en el Portal Único de Transparencia.



#	SECTOR	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCION	COMUNIDAD/BARRIO	FECHA	PRESUPUESTO EJECUTADO
1	Cienaguita	Ampliación	Red de Agua Potable	El Chorizo	22/02/2023	48,395.19
2	Cienaguita	Ampliación	Red de Agua Potable	El Zapotal	28/08/2023	95,404.61
3	Nuevos Horizontes	Ampliación	Red de Agua Potable	Col. La Esperanza	14/03/2023	79,817.48
4	Tulian	Compra de cilindros	Cilindros Para Cloro	Tulian	24/01/2023	201,250.00
				TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO		424,867.28

ANEXOS

Ampliación de Red Potable en El Chorizo, Cienaguita



Ampliación de Red en el Zapotal, B. Cienagueta



Ampliación de Red Potable, Col. Nueva Esperanza, Nuevos Horizontes.




Aguas de Puerto Cortes
AMPLIACION / MODIFICACION DE REDES DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

FECHA: 21-22 Febrero 2023

DIRECCION: Barrio Cienagueta, Callejon el chorizo a Salida
del 2 calle hacia la playa

CROQUIS

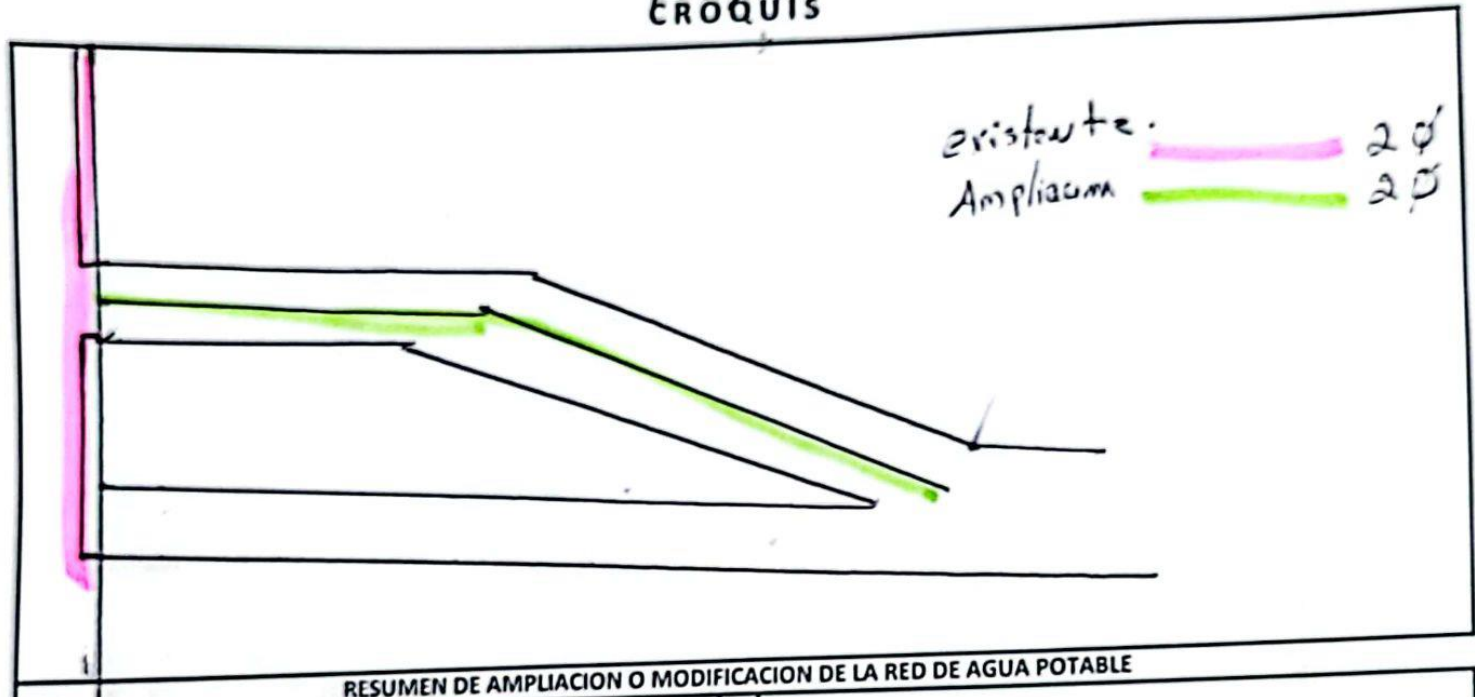

RESUMEN DE AMPLIACION O MODIFICACION DE LA RED DE AGUA POTABLE

Material Utilizado	Observaciones
1 70 tubos de 2 Ø	1 Juntura 2 Ø
2 21 tubos de 1/2	30 Adaptadores machos de 1/2
3 5 abrazaderas de 2 a 1/2	30 Adaptadores hembras de 1/2
4 3 tapones de 2 Ø	1 galon de pegamento
5 20 tapones de 1/2	3 seguetas
6 100 codos de 1/2	
7 2 tee de 2 Ø	
8 100 sellos de hule para medidor	

PERSONAL QUE REALIZO EL TRABAJO

1 Admin Orellana	6 Abel mejia
2 Luis gusman	7 pedro argueta
3 Valentin perel	8 Nauri hernandez
4 Kevin perello	9 Edgior Valle cio
5 Guillermo morales	10 Carlos claros

Luis gusman
Firma Fontanero

[Signature]
Firma Encargado de Cuadrillas

[Signature]
VdB

Aguas de Puerto Cortes
AMPLIACION / MODIFICACION DE REDES DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

FECHA: 21-22 febrero

DIRECCION: Casiquita, calle hacia la pita Ampliacion en Residencial el Zapotal.

CROQUIS



RESUMEN DE AMPLIACION O MODIFICACION DE LA RED DE AGUA POTABLE

Material Utilizado	Observaciones
1 29 tubos de 4 φ potables	4 abrazaderas de 1 1/2"
2 1 tubo de 4 φ de drenaje	30 tapones de 1/2"
3 5 tee de 4 φ 2 tapones de 4 φ	15 codos de 1/2" 15 adaptadores machos de 1/2"
4 6 tapones de 2 φ	15 adaptadores hembras de 1/2"
5 7 Reductores de 4 a 2 φ	2 adaptadores machos de 2 φ
6 1 Junta de 4 φ	2 soguetas
7 3 tee de 4 φ	1 galon de pegamento
8 11 tubos de 1/2"	

PERSONAL QUE REALIZO EL TRABAJO

1 Adm Orellana	6 Guillermo Morales
2 Luis Guzman	7 Nohue Hernandez
3 Valentin Perez	8 Edgar Vallecillo
4 Pedro Argueta	9
5 Abel Mejia	10

Luis Guzman
Firma Fontanero

[Signature]
Firma Encargado de Cuadrillas

[Signature]
Voto

**AGUAS DE PUERTO CORTES
COTIZACION DE PROYECTOS**

PROYECTO: AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE DE Ø2" EN COLONIA LA ESPERANZA DE PUERTO CORTES.

LUGAR Y FECHA: Puerto Cortes 14/03/2023

No.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
1	206.5	ml	Topografia	35.00	7,227.50
2	49.56	m3	Excavacion mecanizada	150.00	7,434.00
3	206.5	ml	Suministro de tuberia pvc de Ø2" sdr 26	50.00	10,325.00
4	147.5	ml	Suministro de tuberia pvc de Ø 1/2" sdr 26	25.00	3,687.50
5	100	Uni	Suministro ADAP-M PVC S40 12MM 1/2"	6.00	600.00
6	100	Uni	Suministro ADAP-H PVC S40 12MM 1/2"	6.00	600.00
7	30	und	Suministro Abrazadera PVC S40 50X12MM	160.00	4,800.00
8	120	und	Suministro Codo PRE 90 1/2 PVC - SCH 40	8.00	960.00
9	1	Gl	Suministro Pegamento p/pvc toda presion Tangit	2,500.00	2,500.00
10	206.5	ml	Instalacion de tuberia pvc de 2" sdr 26	42.00	8,673.00
11	147.5	ml	Instalacion de tuberia pvc de 1/2" sdr 26	25.00	3,687.50
12	1	glb	Instalacion accesorios de conexión de Ø 1/2, Ø2, Ø4, Ø6, Ø8, Ø12" (Incluye, Codos, Adaptadores, valvulas, juntas dresser, tapones)	9,000.00	9,000.00
13	49.56	m3	Relleno de zanja con material compactado del sitio	200.00	9,912.00

FORMA DE PAGO: **CONTADO** ☐ ☒ **CREDITO**

SUB-TOTAL	69,406.50
IMPTO. 15%	10,410.98
TOTAL	79,817.48

TIEMPO DE ENTREGA: 5 dias



CONTRATISTA.:

ID.:



SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

FACTURA N° 000-001-01-00021427

FECHA DE EMISION 24/01/2023


SOLQUINSA
SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
RTN: 05019005474595
Barrio: Carretera Villanueva, Casa No.: S/N,
Municipio: Villanueva, Departamento: Cortes.
Tel: (504) 2670-0496 / 0499 Cel: (504) 3193-4993
CAI : 566A97-4556E6-BE4893-4B1EE7-DBA42F-EF
Rango Autorizado : 000-001-01-00020501 al 000-001-01-00024000
Fecha Limite de Emision : 26/10/2023
contador.solquin@gmail.com

CLIENTE AGUAS DE PUERTO CORTES 214
RTN 05069999182490
DIRECCION: PRIMER NIVEL ESTADIO EXCELSIOR B. COPEN
VENDEDOR: 24
TIEMPO CREDITO: 12 CUOTAS MENSUALES
TASA CAMBIARIA 1.000000

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO.CONSTANCIA REG. EXONERADO:
NO. REGISTRO SAG:

Descripción	Cantidad	Unidad	I.S.V.	PRECIO UNI. L	TOTAL L
Cilindros para cloro	5.0000	pz	15	35,000.000000	175,000.00



ENTREGA DIRECTA

DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

Recibido por: Firma y Sello: Fecha de Recibido

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	0.00
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	175,000.00
Total Ventas 18%	L	0.00
Total Ventas	L	175,000.00
I.S.V S/Ventas al 15%	L	26,250.00
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	26,250.00
Total Factura	L	201,250.00

COPIA

1. Original: Cliente, 2. Copia: Obligado Tributario Emisor, 3. Copia: Archivo

