



**Aguas del Valle Villanueva**  
**Departamento de Cortés, Honduras, Centro America**  
**Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja**

Tel. 2670-4874, PAG. Web [www.aguasdelvallehn.com](http://www.aguasdelvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



## Actividades del mes de Febrero 2024

No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
1	Reparacion de tuberia de 2" Col. Villa Sol, 1 tubo de 2" y 1 valvula de 3/4 de aire, 1 reductor de 3/4 a 1/2 1 hembra de 3/4, 1 abrazadera de 2 a 1/2 y 1 union de 2" a 6"	1,450.50	
2	Reparacion de Tuberia de de 2 " en El Bo.El Centro se utilizo 1 tubo de 2"	478.00	
3	Reparacion de tubo de 6" en la Col.Orquidea #1, se utilizo 1 valvula de aire de 3/4 y 1valvula hembra de 3/4, 1 Reductor de 3/4 a 1/2", 1 dresser de 6 a 2, 1 hembra de 6"	2,723.36	
4	Instalacion de valvula de 6" flangeadas en Col. Primero de Mayo, se utilizo 2 flanges de 6" pvc, 2 empaques de hule de 6"	14,612.13	
5	Reparacion de tuberia de 6" en el Marañon camino hacia el cementerio se utilizo, 1 lance de 6"y 1 Dresser	3,662.06	
6	Reparacion de tuberia de 2" en los castaños se utiliza 1 lance de 2 ", y 1 Dresser de 2"	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
7	Electromecanica limpieza de pozo y cambio de 4 tubos dañados por corrosion en Km.71	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
8	Electromecanica aplomado en poste de la estacion de bombeo Pozo #1 Sector Cañera	-	
9	Electromecanica trabajos de revision de tuberia del pozo #3 de Real Del Puente	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
10	Electromecanica revision de caudal de agua en pozo de Apadrinados	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
11	Electromecanica instalacion de motor Pozo #3 Sector Cañeras e instalacion de lampara Pozo#5	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
12	Alcantarillado Sanitario realizando trabajos de limpieza y sacando obstrucciones en diferentes lugares del municipio	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle

**Nota :** Estas actividades realizadas solo son obras de mantenimiento de la red de los servicios de Aguas del Valle



  
 GERENTE TECNICO



# Aguas del Valle

Villanueva, Cortés  
05 de FEBRERO del 2024

Dirigida a:

Julio Morel  
Gerente General ADV

Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de FEBRERO del año 2024 los cuales le detallo a continuación:

## AGUA POTABLE

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 308
- Ordenes de trabajo realizadas en el mes: 238
- Ordenes de trabajo pendientes en el mes: 69
- RENDIMIENTO:  $\frac{238}{308} \times 100 = 77.2\%$

AGUA POTABLE		
1	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	8
2	RECONEXION POR CORTE DE AGUA	12
3	NO LE LLEGA EL AGUA	33
4	TUBERIA RIPIADA	35
5	TUBOS ROTOS DE AGUA POTABLE	3
6	FUGA DE AGUA	0
7	REPARACION POR DERRAME DE AGUA POTABLE	0
8	MALA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1
9	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	167
10	CAMBIO DE UBICACIÓN DE PEGUE	4
11	OTROS CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO	8
12	SERVICIO DE COMPRESOR	0
13	CORTE DE AGUA POR DERRAME	0
14	CASA SIN PEGUE DE AGUA	1
15	CORTE Y RECONEXION POR MORA	1
16	OP LIMPIEZA DE TUBERIA RIPIADA	33
	<b>TOTAL</b>	<b>308</b>



# Aguas del Valle

## ALCANTARILLADO SANITARIO

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 57
- Ordenes de Trabajo Realizadas en el mes: 33
- Ordenes de Trabajo Pendiente en el mes: 24

RENDIMIENTO:  $\frac{33}{57} \times 100 = 57.8 \%$

ALCANTARILLADO SANITARIO		
1	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2
2	CAJA DE AGUAS NEGRAS RIPIADAS	20
3	TUBO ROTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0
4	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	19
5	REUBICACION DE PEGUE DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0
6	SOLICITUD DE CAMION VACTOR	6
7	NO TIENE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	10
	<b>TOTAL</b>	<b>57</b>



# Aguas del Valle

## ELECTROMECHANICA

- **Fecha: 01 de FEBRERO 2023.**

- Revisión de y pruebas de arranque en pozo#3 sector cañeras (4horas).
- Revisión y limpieza de gabinete de control del pozo km 71 escuela Cabañas (4 horas).

- **Fecha: 02 de FEBRERO 2024**

- Trabajo en la bodega tanque rojo (1 hora).
- Revisión de pozo #6 y pozo#2 sector cañeras (4horas).
- Revisión de la bomba de Llanos de Canadá (3horas).

- **Fecha: 05 de FEBRERO de 2024**

- Realizando trabajo de aforo en pozo #3 sector cañeras (8hoas).

- **Fecha: 06 de FEBRERO de 2024**

- Se realizó trabajo de sopeteo a pozo #3 sector cañeras e instalando equipo sumergible y puesta en prueba de equipo (8horas).

- **Fecha 07 de FEBRERO 2024.**

- Trabajo de desmontar y revisión de bomba del Rebombeo tanque rojo y armado de bomba y Puesta en marcha y prueba de funcionalidad (8horas).

- **Fecha 08 de FEBRERO 2023.**

- En oficina realizando informe (2horas).
- Revisando bomba del rastro municipal (2horas).
- Revisión del pozo #4 sector cañeras(4horas)

- **Fecha 09 de FEBRERO 2023.**

- Revisión y puesta en marcha de bomba brisas del Rosario y bomba de km 71 bordo del rio(3horas).
- Revisando el pozo villas del rio y planta elevadora de desechos solidos en colonia villas del rio(5horas).



# Aguas del Valle

## Fecha 12 de FEBRERO 2024

- Se reviso y se puso en marcha el pozo#3 sector cañeras (3horas).
- Instalacion de monitor perdido de fajaes del pozo Linza Dos Caminos(2horas).
- Revisión del pozo altos de Santa Fe y pozo Shalon en Dos Caminos(3horas).

## Fecha 13 de FEBRERO 2024

- Revisión del pozo Apadrinados (2horas).
- Revisión de gabinete de control del pozo Sinai y pozo el Milagro(2horas).
- Revisión con contrantista del poste que sostiene banco de trasformadores en el tanque rojo Bº Martin Farjado y revisión en pozo #4 y pozo sector cañeras(4horas).

## Fecha 14 de FEBRERO 2024.

- Se reviso el pozo Linza de Dos Caminos y revisión de pozo Real del Puente#2(4horas).
- Revisión del pozo Real del puente#2 y pozo de Brisas del Calan atrás de Kimberly (4horas).

## Fecha 15 de FEBRERO 2024.

- Se reviso pozo de Vista Hermosa instalando temporizador para encendido automatico (4horas).
- Revisando el pozo de Villas del Rio y pozo km71(4horas).

## Fecha 16 de FEBRERO 2024.

- Instalando bomba de desechos solidos b en colonia Walter Perdomo(4horas).
- Aforando en pozo #4 sector cañeras.(4horas).

## FECHA 19 de FEBRERO 2024.

- Revisión de bombas sector cañeras ,victoria terraplen, bombas sector Milagros y bomba Linza Dos Caminos(8 hras).

## Fecha 20 de FEBRERO 2024.

- Se revisión de bomba de desechos solidos de colonia Villanova(3hoas).
- Revisión de bomba de Gran Villa ((2hoas).
- Revisión de bomba en Real del Puente (3horas).

## Fecha 21 de FEBRERO 2024.

- Se subio fusible en puesta en marcha bomba de Brisas del Calan atrás de Kimberly(4horas).
- Revisión de bomba en Real del Puente (4horas).



# Aguas del Valle

## **FECHA 22 de FEBRERO 2024**

- Se reviso el pozo del vivero municipal y el pozo de colonia la Orquidea#2(3horas).
- Revision del Pozo del rastro municipal(2 horas).
- Revision del del pozo del milagro por un keko se habia introducido en la bobina del contractor ,se limpio y se puso en marcha(3 horas).

## **Fecha 23 de FEBRERO 2024.**

- Se reviso la bomba de desechos solidos de la colonia Walter Perdomo ,instalacion (cambio de selector dañado en pared de contro))4 horas).
- Se reviso el pozo #3 sector cañeras( 2horas).
- Se reviso el pozo de Real del Puente (2horas).

## **Fecha 26 de FEBRERO 2024.**

- Se trabajo en La Bodega clasificando cable de segunda para aforo en pozo#3 en Real del Puente (2 horas).
- Se reviso el pozo#2 y #1 en colonia Gran Villa (2horas).
- Se reviso el pozo Llanos del Canada y se reviso la bomba de desechos solidos de Llanos de canada(4 horas).

## **Fecha 27 de FEBRERO 2024.**

- Se trabajo subiendo fusible y puesta en marcha la bomba Linza de Dos Caminos(3horas).
- Se reviso el pozo #3 de real del puente ,realizando inspeccion con camara de parte de inversiones Ochoa(3 hhoras).
- Revision del pozo#5 sector cañaeras(2 horas).

## **Fecha 28 de FEBRERO 2024**

- Se reviso la bomba de colonia de Monte Carmel(4 horas).
- Se reviso el pozo #3 colonia Real del puente (4 horas).

## **Fecha 29 de FEBRERO 2024**

- Intalacion de lampara en el pozo #5 sector cañeras (5 horas).
- No se realizo el trabajo en pozo #3 de Real del puente ,se hiba instalar equipo de aforo pero los vecinos de opusieron y no se llevo acabo dicho trabajo .




# Aguas del Valle

AGUA POTABLE

## ANEXOS

- Reparación de tubo de 2" Col. Villa Sol. Se usó 1 tubo de 2" y 1 válvula de 3/4 de aire, 1 reductor de 3/4 a 1/2", 1 hembra de 3/4", 1 abrazadera de 2 a 1/2" 1 unión de 2" de 6".

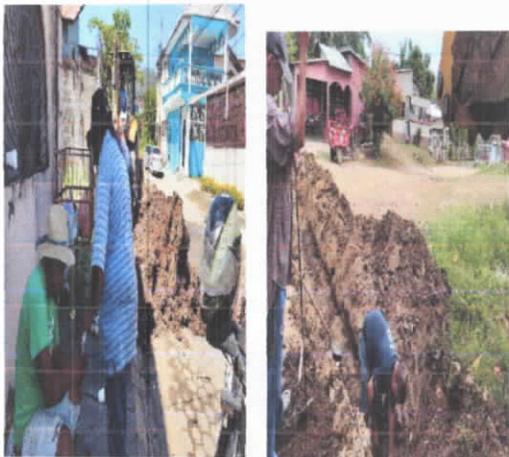

- Reparación de tubería de 62" en Bº el centro Se usó tubo de 2"



- Reparación de tubo PVC de 6" en la col. Orquidea #1. Se utilizó 1 válvula de aire de 3/4" 1 hembra de 3/4", 1 reductor de 3/4 a 1/2", 1 dreser de 62, 1 hembra de 6".



- Instalación de Válvula de 6" flangeadas En colonia 1 Mayo se utilizó: 2 flanges de 6" pvc, 2 empaques de hule de 6"





# Aguas del Valle

- Reparación de tubería de 6" en el Marañón camino hacia el cementerios se Utilizó 1 Lance de 6" ,1dreers de 6"



- Reparacion de tubería de 2" en el Castaños sector el Marañón se utilizo 1 Lance de 2" ,drees de 2"





# Aguas del Valle

## ELECTROMECHANICA

- Pozo km 71bordo del rio .limpieza de pozo y cambio de 4 tubos dañados por corrosion.



- Aplomado poste en estación de bombeo de pozo#1 sector cañeras.



- Trabajos de revisión de tubería del pozo #3 de Real del Puente.



- Revision de caudal de agua en pozo de Apadrinados.





# Aguas del Valle

- Instalacion de motor nuevo en Pozo #3 sector Cañeras.  
Instalacion de lampara del pozo #5 sector cañeras



PROCEDIMIENTO:  $\frac{336}{176} \times 100 = 52.38\%$



Sin otro Particular.
