



ALCALDIA MUNICIPAL MARCALA LA PAZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Informe de actividades mes de abril 2024

Jefe Unidad Técnica Municipal:
Arq. Josué David Serrano Alvarado

Alcalde Municipal
Ana Lucía Castro López

Márcala La Paz

01 de mayo de 2024

2024

UTM

ARO. JOSUÉ DAVID
SERRANO
UTM ALCALDIA MUNICIPAL
MARCALA, LA PAZ

A MUNICIPAL DE MARCALA
ciudad de la amistad y aroma de café



8/ABRIL/2024

[“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO CONCEPCIÓN, CUARTA CALLE ENTRE 1ERA Y 2DA AVENIDA FRENTE A LAS ESCUELAS PUBLICAS”]

El proyecto tiene como propósito mejorar las condiciones del centro de salud, mediante la construcción de un muro perimetral y el acondicionamiento de un parqueo para empleados.

Edificio Municipal, Barrio San Miguel, Frente a Plaza Soberanía, Márcala, La Paz, Honduras, C.A.

Tel. (504) 2764-5329/3975

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es
www.facebook.com/alcaldiademarcala1208



CONTENIDO

1. INTRODUCCION
2. DATOS DE LA COMUNIDAD
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS
4. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
5. UBICACIÓN DEL PROYECTO
6. PRESUPUESTO
7. ANEXOS



Introducción

En la Unidad Técnica Municipal (UTM) se realiza la formulación, ejecución y supervisión de proyectos que el alcalde Municipal delega. Es compromiso de la UTM que cada proyecto sea ejecutado de acuerdo a las normas técnicas especificadas para cada perfil.

El presente documento contiene información necesaria para mejorar las instalaciones de la planta de tratamiento, mediante la construcción de un muro de contención en el perímetro del terreno donde colinda con el río, de esta manera evitar la erosión del terreno y proteger la planta de tratamiento.

En este proyecto se pretenden realizar las siguientes actividades

1. MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA

- 1.1. Marcación y nivelación para muro
- 1.2. Excavación de terreno semiduro
- 1.3. Construcción de muro de contención
- 1.4. Relleno y compactado con material selecto para nivelación de terreno



Datos de la Comunidad

UBICACIÓN: Barrio el ciprés, Marcala, La Paz, atrás del rastro municipal.

COORDENADAS UTM.

EST. 0+000 16P 387735.28 m E 1565520.95 m N

POBLACION: La población beneficiada con este proyecto serán todos los habitantes de Marcala, La Paz.



Objetivos Específicos

- Mejorar la infraestructura de la planta de tratamiento
- Evitar el colapso parcial del terreno donde se ubica la planta de tratamiento
- Garantizar el funcionamiento adecuado de la planta de tratamiento
- Evitar una inversión significativa innecesaria a futuro.



Memoria Descriptiva del Proyecto

- 1.- Marcación.
- 2.- Excavación para la base del muro de contención.
- 3.- Construcción muro de contención.
- 4.- relleno y compactado con material selecto



Ubicación del proyecto



Foto Satelital del Sector, Marcala, La Paz.



Presupuesto

A continuación, se presentan las actividades a realizar para la construcción del muro de contención, cada actividad representa los costos de materiales, mano de obra, costos indirectos y utilidad.

Página: Pag. 1 de 1
Fecha: 9/4/2024 09:01:53
Proyecto: 1218-MURO MURO DE MAMPOSTERIA
Ubicación: F-1289 MURO MAMPOSTERIA

No. Item	Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad de Obra	Total
1	F021005	MURO DE MAMPOSTERIA	M3	2,318.15	70.30	162,965.95
2	F013003	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	33.70	19.00	640.30
3	F014006	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	275.00	17.10	4,702.50
4	F015003	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	561.60	42.00	23,587.20
	MP1214	MURO DE MAMPOSTERIA				191,895.95
Total Presupuesto :						191,895.95



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA
Márcala, ciudad de la amistad y aroma de café



Proyecto: 1218-MURO MURO DE MAMPOSTERIA
 Ubicación: F-1289 MURO MAMPOSTERIA

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
Aporte FHIS					
HM-F06002	HERRAMIENTA MENOR	%	5.25	400.00	2,099.74
	Subtotal en: Herramienta Menor				2,099.74
MI-F3803001	CRAYOLAS	UNID	0.95	1.00	0.95
MI-F3901001	CUERDA	YARDA	20.90	0.50	10.45
	Subtotal en: Material Importado				11.40
MN-F0101001	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	297.75	205.00	61,037.98
MN-F0201001	ARENA DE RIO LAVADA	M3	22.49	800.00	17,992.58
MN-F0401001	MATERIAL SELECTO	M3	56.91	300.00	17,073.00
MN-F0501002	PIEDRA RIPION	M3	91.39	500.00	45,695.00
MN-F0601001	AGUA	M3	13.50	150.00	2,024.48
MN-F2301001	CLAVOS	LB	3.36	30.00	100.78
MN-F2601034	TUBO DE PVC DE 3" X 20' RD-41	LANCE	11.74	500.00	5,870.05
MN-F2901001	MADERA RUSTICA DE PINO	PIE T	84.00	22.00	1,847.94
	Subtotal en: Material Nacional				151,641.81
OC-F01001	ALBAÑIL	JDR	35.72	500.00	17,860.00
	Subtotal en: Mano de Obra Calificada				17,860.00
ON-F01001	AYUDANTE	JDR	35.72	300.00	10,716.00
ON-F01003	PEON	JDR	47.84	200.00	9,567.00
	Subtotal en: Mano de Obra no Calificada				20,283.00
	Total: Aporte FHIS				191,895.95
			Total General.....:		191,895.95



Anexos

FOTOS ACTUALES DEL RIO ALEDAÑO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO





PROPUESTA DE DISEÑO DE MURO DE CONTENCIÓN

ARO. JOSUÉ SERRANO
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL MARCALA LA PAZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Informe
REPARACIÓN DE ALCANTARILLA DE AGUAS LLUVIAS,
COMUNIDAD DE EL PASTAL.

Jefe Unidad Técnica Municipal:
Arq. Josué David Serrano Alvarado

Días de ejecución:
5

Fecha De Presentación del proyecto:
1 de abril de 2024.

Alcaldesa Municipal
Ana Lucia Castro López

Márcala La Paz,
24 de febrero de 2024.



Memoria Descriptiva

La unidad técnica municipal realizó la supervisión de los trabajos realizados en la reparación la alcantarilla en la calle que conduce hacia la comunidad de El pastal, de este municipio. Dicho trabajo se ejecutó de acuerdo a las especificaciones y trabajos solicitados en el perfil.

A continuación, se enumeran Las actividades realizadas:

- Excavación y retirado de alcantarilla de PVC dañada
- Excavación para profundizar el zanja
- Instalación de nueva alcantarilla de 24"
- Relleno y compactado con material de sitio
- Reparación de cabezal existente
- Construcción de nuevo cabezal



IDENTIFICACION DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN: COMUNIDAD EL PASTAL	
BENEFICIARIOS	VISITANTES, CIUDADANOS Y RESIDENTES QUE TRANSITAN POR ESTA ZONA
INSTITUCIÓN SOLICITANTE O EJECUTORA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA
DURACIÓN DEL PROYECTO	1 SEMANA
SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	FINALIZADO
COSTO ESTIMADO SEGÚN PERFIL	L.11,770
FUENTE FINANCIERA	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA LA PAZ
EJECUTOR	JORGE GRACINIANO ARGUETA



SUPERVISIÓN DE TRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 18 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE CULMINACIÓN DE TRABAJOS: 24 DE ABRIL DE 2024







Arq. Josué David Serrano Alvarado
Jefe unidad Técnica Municipal

2024

UTM

ARO. JOSUÈ DAVID
SERRANO
UTM ALCALDIA MUNICIPAL
MARCALA, LA PAZ

A MUNICIPAL DE MARCALA
ciudad de la amistad y aroma de café



5/ABRIL/2024

["CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO CONCEPCIÓN, CUARTA CALLE ENTRE 1ERA Y 2DA AVENIDA FRENTE A LAS ESCUELAS PUBLICAS"]

El proyecto tiene como propósito mejorar las condiciones del centro de salud, mediante la construcción de un muro perimetral y el acondicionamiento de un parqueo para empleados.



CONTENIDO

- 8. INTRODUCCION
- 9. DATOS DE LA COMUNIDAD
- 10. OBJETIVOS ESPECIFICOS
- 11. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
- 12. UBICACIÓN DEL PROYECTO
- 13. PRESUPUESTO
- 14. ANEXOS



Introducción

En la Unidad Técnica Municipal (UTM) se realiza la formulación, ejecución y supervisión de proyectos que el alcalde Municipal delega. Es compromiso de la UTM que cada proyecto sea ejecutado de acuerdo a las normas técnicas especificadas para cada perfil.

El presente documento contiene información necesaria para mejorar el sistema hidrosanitario de la terminal de buses. Se realizarán cambios que brindarán mejor servicio a los ciudadanos y administradores del inmueble.

En este proyecto se pretende realizar las siguientes actividades

2. Mejoramientos del sistema hidrosanitario de la terminal de buses
 - 2.1. Demolición de pila en mal estado que se encuentra en la parte exterior norte del inmueble
 - 2.2. Suministro e instalación de llave de riego en donde se demolerá la pila
 - 2.3. Demolición de pileta en baño de hombres
 - 2.4. Construcción de pila con rival de 0.90x1.30 y 1.00 metro de alto.



Datos de la Comunidad

UBICACIÓN: Terminal de buses, Marcala, La Paz

COORDENADAS UTM.

EST. 0+000 16P 388362.55 m E 1565682.42 m N

POBLACION: La población beneficiada con este proyecto serán todos los visitantes de las comunidades aledañas y los pobladores de nuestra ciudad que utilizan el transporte urbano.



Objetivos Específicos

- Mejorar la infraestructura de la terminal de buses.
- Evitar que los visitantes realicen sus necesidades fisiológicas con la demolición de la pila existente en mal estado.
- Brindar un servicio eficiente de agua potable a las unidades mediante una llave de riego en caja metálica para controlar la misma.
- Evitar que los hombres orinen en la pileta donde se lavan los trapeadores mediante la actividad de la demolición de la misma.
- Con la demolición de la pila exterior y la pileta en el baño de hombres se necesitará una pila general, la cual se construirá en el baño de mujeres para tener mayor control e higiene.



Memoria Descriptiva del Proyecto

1.-Primeramente, se realizará la demolición de la pila que se encuentra en la parte norte del exterior del inmueble, dejando únicamente el rival que se encuentra ahí y se instalará una llave de riego de agua potable para las unidades.

2.- Se demolerá la pileta que se encuentra en el baño de hombres

3.- Se construirá una nueva pila en el baño de mujeres con las siguientes dimensiones; 0.90 metros de fondo, 1.30 metros de frente y 1.00 metro de alto.



Ubicación del proyecto

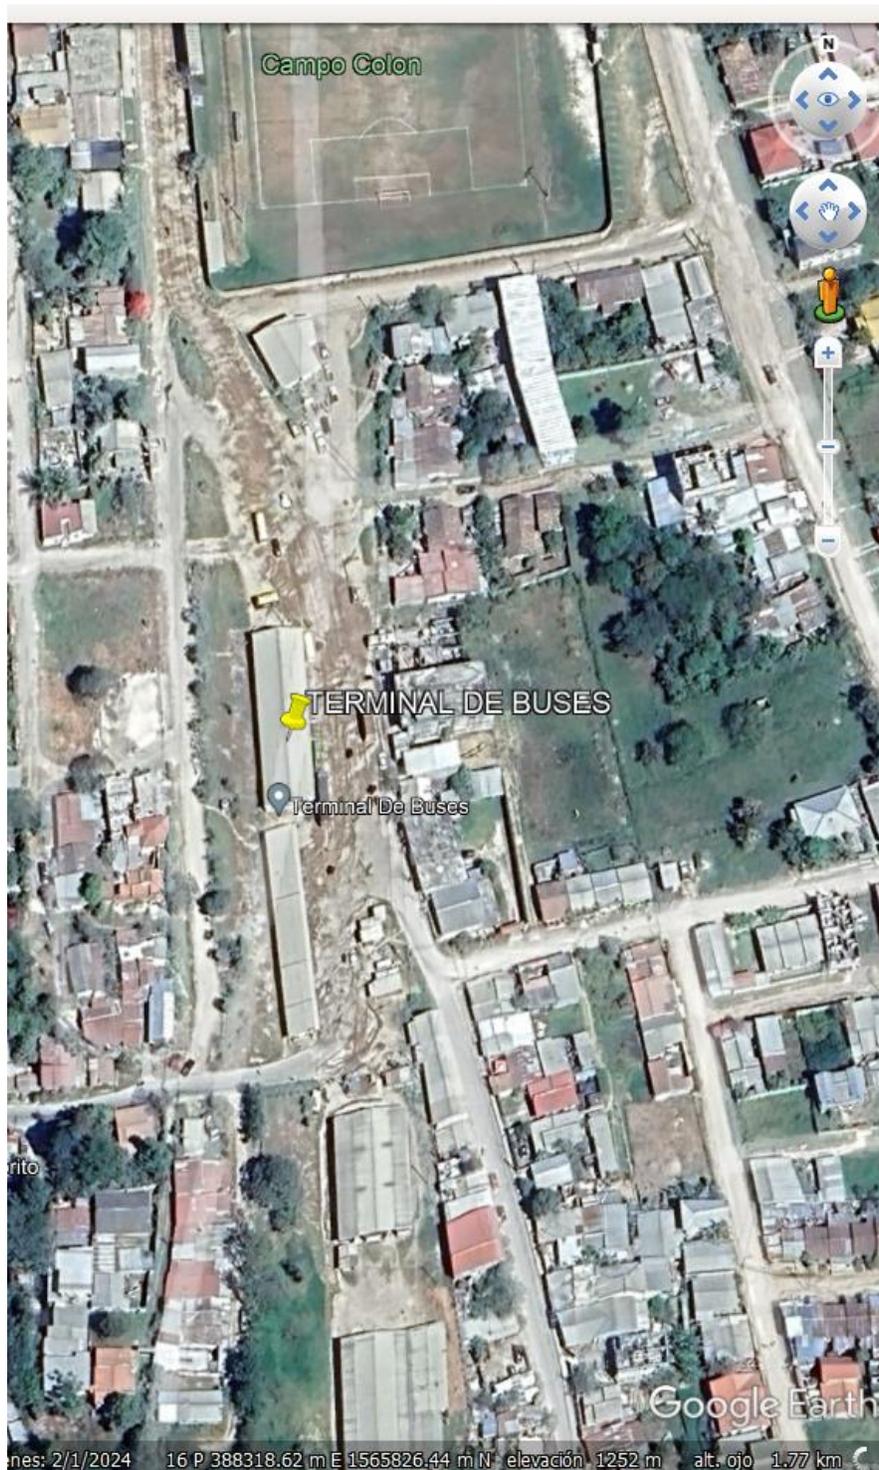


Foto Satelital del Sector, Marcala, La Paz.



Presupuesto

A continuación, se presentan las actividades a realizar para el mejoramiento de este inmueble, cada actividad representa los costos de materiales, mano de obra, costos indirectos y utilidad.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DE LA TERMINAL DE BUSES

UBICACIÓN: Marcala, La Paz

ELABORÓ: Arq. Josué Serrano

LUGAR Y FECHA: Marcala, La Paz, 05 de abril de 2024

ACTIVIDADES A REALIZAR

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO	COSTO
1 PRELIMINARES					
1.1	DEMOLICIÓN DE PILA EXISTENTE	GLOBAL	1	825	L. 825.00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE RIEGO CON TAPADERA	GLOBAL	1	1760	L. 1,760.00
1.3	DEMOLICIÓN DE PILETA EN BAÑO DE HOMBRES	GLOBAL	1	440	L. 440.00
1.4	PILA DE 0.90X1.30X1.00 CON RIVAL	GLOBAL	1	6380	L. 6,380.00
1.5	ACARREO Y BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	VIAJE	2	1650	L. 3,300.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO	L. 12,705.00
---------------------------------	---------------------



Anexos

FOTOS ACTUALES DEL INMUEBLE



Pila a demoler por fisuras en los 4 lados.



Se instalará llave de riego



Pileta a demoler para evitar que los hombres orinen en ella.



En esta esquina del baño de mujeres se construirá la nueva pila.

ARO. JOSUÉ SERRANO

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS



ENTREGA DE MATERIALES

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EL CHAPULÍN-SABANETAS

COMUNIDAD: EL CHAPULÍN-SABANETAS

FECHA: 16/04/2024

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE

N°	DESCRIPCCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Cemento argos	bolsa	150
2	Grava de ½"	M3	20
3	Alambre de amarre	Lb	20
4	Clavos de 3"	Lb	5
5	Clavos de 2"	Lb	5
6	Clavo de 4"	Lb	10

Crisantus Dominguez

NOMBRE

12084967-00193

IDENTIDAD

procient

CARGO

RECIBI CONFORME





FOTOS ACTUALES





ALCALDIA MUNICIPAL MARCALA LA PAZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Informe de entrega de materiales
Sistema de Agua Potable la Victoria

Jefe Unidad Técnica Municipal:
Arq. Josué David Serrano Alvarado

Alcalde Municipal
Ana Lucía Castro López

Márcala La Paz,

7 de mayo de 2024.



Memoria Descriptiva

La unidad técnica municipal realizo entrega de materiales para la construcción del sistema de agua potable en el barrio la Victoria Marcala La Paz proyecto que se está construyendo con aporte municipal y WFP.



IDENTIFICACION DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN: EDIFICIO MUNICIPAL	
BENEFICIARIOS	BARRIO LA VICTORIA
INSTITUCIÓN SOLICITANTE O EJECUTORA	JUNTA DE AGUA LA VICTORIA
DURACIÓN DEL PROYECTO	
SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	PROCESO
COSTO ESTIMADO MANO DE OBRA	L.200,000
FUENTE FINANCIERA	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA LA PAZ
EJECUTOR	



ENTREGA DE MATERIALES



Arq. Josué David Serrano Alvarado
Jefe unidad Técnica Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL MARCALA LA PAZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Informe
MAQUINARIA MUNICIPAL MES DE ENERO

Jefe Unidad Técnica Municipal:
Arq. Josué David Serrano Alvarado

Días de ejecución:
30 días

Fecha De Presentación del proyecto:
24 de Abril de 2024.

Alcaldesa Municipal
Sra, Ana Lucia Castro Lopez

Márcala La Paz,

24 de Abril
2024.



Memoria Descriptiva

La unidad técnica municipal realizó la supervisión de los trabajos realizados con maquinaria Diferentes lugares del municipio de Municipio de Marcala,

A continuación, se enumeran los lugares que se realizó la reparación de calle

- SABANETAS CAMPO DE FUTBOL
- CIPRES
- LOMA DE EN MEDIO
- CUEVA DEL MONTE



CUADRO RESUMEN DE HORAS

CUADRO RESUMEN HORAS MOTONIVELADORA				
Operador	YIMI MOISES TORREZ			
ENCRAGADO	BLADIMIR VENTURA			
fecha	horometro inicial	horometro final	total horas	LUGAR
26/03/2024	519.6	527.3	7.7	Sabanetas
27/03/2024	527.3	535.3	8	Sabanetas
28/03/2024	535.3	541.4	6.1	Sabanetas Campo de futbol
8/04/2024	541.4	549.8	8.4	Sabanetas Campo de futbol
9/04/2024	549.8	557.7	7.9	Sabanetas Campo de futbol
10/04/2024	557.7	562.2	9.5	Cipres
11/04/2024	562.2	569.6	7.4	Cipres
12/04/2024	569.6	576.3	6.7	Cueva del Monte
15/04/2024	576.3	582.9	6.6	Cueva del Monte
		TOTAL	76.3	



SUPERVISIÓN DE TRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA









Arq. Josué David Serrano Alvarado
Jefe unidad Técnica Municipal

2024

UTM

ARO. JOSUÉ DAVID
SERRANO
UTM ALCALDIA MUNICIPAL
MARCALA, LA PAZ

A MUNICIPAL DE MARCALA
ciudad de la amistad y aroma de café



7/mayo/2024

["CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO CONCEPCIÓN, CUARTA CALLE ENTRE 1ERA Y 2DA AVENIDA FRENTE A LAS ESCUELAS PUBLICAS"]

El proyecto tiene como propósito mejorar las condiciones del centro de salud, mediante la construcción de un muro perimetral y el acondicionamiento de un parqueo para empleados.

Edificio Municipal, Barrio San Miguel, Frente a Plaza Soberanía, Márcala, La Paz, Honduras, C.A.

Tel. (504) 2764-5329/3975

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es
www.facebook.com/alcaldiademarcala1208



CONTENIDO

- 15. INTRODUCCION
- 16. DATOS DE LA COMUNIDAD
- 17. OBJETIVOS ESPECIFICOS
- 18. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
- 19. UBICACIÓN DEL PROYECTO
- 20. PRESUPUESTO
- 21. ANEXOS



Introducción

En la Unidad Técnica Municipal (UTM) se realiza la formulación, ejecución y supervisión de proyectos que el alcalde Municipal delega. Es compromiso de la UTM que cada proyecto sea ejecutado de acuerdo a las normas técnicas especificadas para cada perfil.

El presente documento contiene información necesaria para la construcción de un muro de contención ubicado en el centro de salud de florida, de esta manera evitar la erosión del terreno y proteger la infraestructura existente

En este proyecto se pretenden realizar las siguientes actividades

3. MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA

- 3.1. Marcación y nivelación para muro
- 3.2. Excavación de terreno semiduro
- 3.3. Construcción de muro de contención
- 3.4. Relleno y compactado con material selecto para nivelación de terreno



Datos de la Comunidad

UBICACIÓN: Florida , Marcala, La Paz,

COORDENADAS UTM.

EST. 0+000 16P 390547.23 m E 1560912.84 m N

POBLACION: La población beneficiada con este proyecto serán todos los habitantes de Marcala, La Paz.



Objetivos Específicos

- Mejorar la infraestructura y evitar derrumbes y daños en la infraestructura existente
- Evitar el colapso parcial del terreno donde se ubica centro de salud
- Garantizar el funcionamiento adecuado del centro de salud
- Evitar una inversión significativa innecesaria a futuro.



Memoria Descriptiva del Proyecto

1.-EL proyecto consiste en la construcción de un muro de contención el cual costa de una longitud de 30 M y una altura promedio de 5 metros, en la parte inferior del terreno, se propone con una excavación de 1 metro x 3 metros de ancho, muro de mampostería con una sección de 3 metros de base por 5m de alto y una corona de 50cm, tubería de 4 pulgadas, relleno compactado cada 30 cm.



Ubicación del proyecto

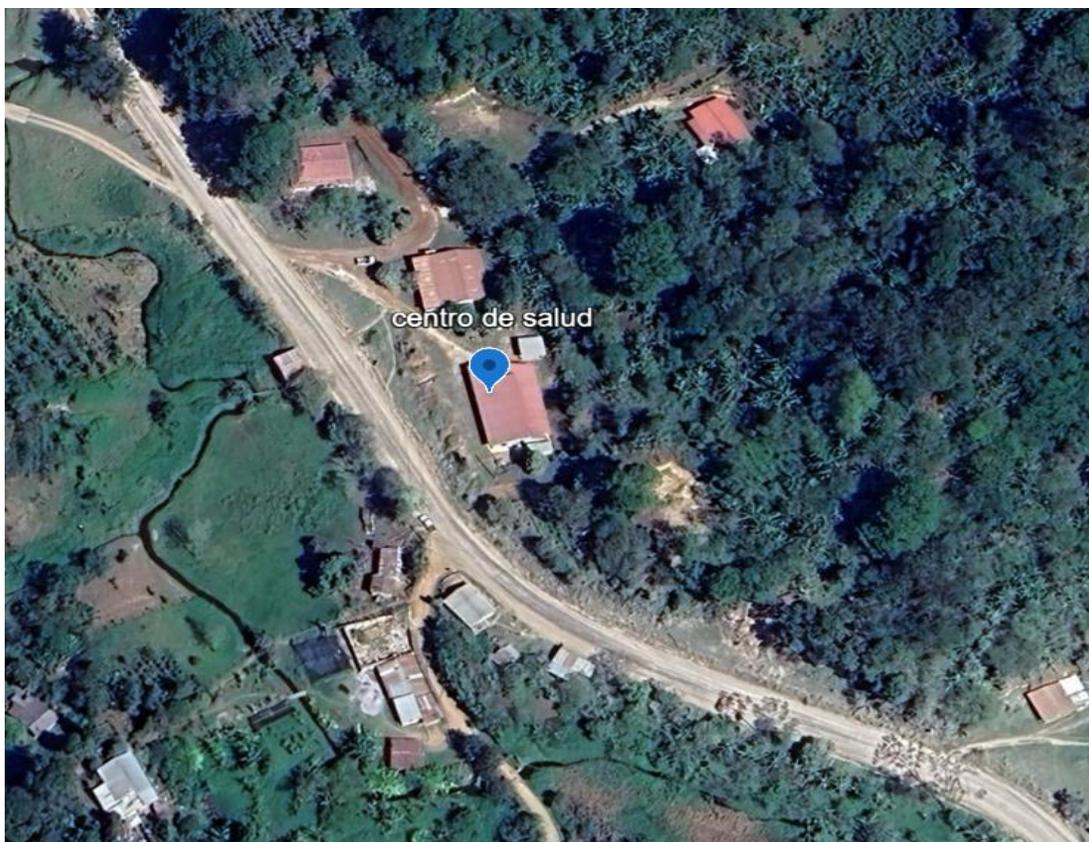


Foto Satelital del Sector, Florida, La Paz.



Presupuesto

A continuación, se presentan las actividades a realizar para la construcción del muro de contención, cada actividad representa los costos de materiales, mano de obra, costos indirectos.

PRESUPUESTOS POR ACTIVIDADES

APORTE COMUNITARIO

Página: Pag. 1 de 1
Fecha: 6/5/2024 13:36:07
Proyecto: 021208MA MURO CENTRO DE SALUD FLORIDA
Ubicación: F_1208CJP1 LA FLORIDA, MARCALA, LA PAZ.

No. Item	Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad de Obra	Total
1	F013003	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	33.02	30.00	990.60
2	F014005	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	184.25	115.00	21,188.75
3	F021005	MURO DE MAMPOSTERIA	M3	2,330.47	438.00	1,020,745.86
4	F015005	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	177.65	153.00	27,180.45
5	F013003	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	33.02	27.00	891.54
6	F014005	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	184.25	61.00	11,239.25
7	F021005	MURO DE MAMPOSTERIA	M3	2,330.47	149.00	347,240.03
8	F015005	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	177.65	37.80	6,715.17
	MR-0060	MURO DE CONTENCION				1,436,191.65
Total Presupuesto :						1,436,191.65



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA
Márcala, ciudad de la amistad y aroma de café"



PRESUPUESTO GENERAL POR INSUMOS

APORTE COMUNITARIO

Proyecto: 021208MA MURO CENTRO DE SALUD FLORIDA

Ubicación: F_1208CJP1 LA FLORIDA, MARCALA, LA PAZ.

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
Aporte FHIS					
HM-F06002	HERRAMIENTA MENOR	%	88.41	167.50	14,809.40
	Subtotal en: Herramienta Menor				14,809.40
MI-F3803001	CRAYOLAS	UNID	2.85	1.00	2.85
MI-F3901001	CUERDA	YARDA	62.70	0.40	25.08
	Subtotal en: Material Importado				27.93
MN-F0101001	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	2,486.15	215.00	534,522.20
MN-F0201001	ARENA DE RIO LAVADA	M3	187.80	900.00	169,020.78
MN-F0501002	PIEDRA RIPION	M3	763.10	500.00	381,550.00
MN-F0601001	AGUA	M3	95.10	40.00	3,803.87
MN-F2301001	CLAVOS	LB	26.63	25.00	665.65
MN-F2601034	TUBO DE PVC DE 3" X 20' RD-41	LANCE	98.02	349.00	34,210.36
MN-F2901001	MADERA RUSTICA DE PINO	PIE T	665.72	25.00	16,642.96
	Subtotal en: Material Nacional				1,140,415.82
OC-F01001	ALBAÑIL	JDR	295.21	500.00	147,605.00
	Subtotal en: Mano de Obra Calificada				147,605.00
ON-F01001	AYUDANTE	JDR	295.21	250.00	73,802.50
ON-F01003	PEON	JDR	238.12	250.00	59,531.00
	Subtotal en: Mano de Obra no Calificada				133,333.50
	Total: Aporte FHIS				1,436,191.65
			Total General.....:		1,436,191.65



Anexos

FOTOS ACTUALES





Arq. Josué David Serrano Alvarado
Jefe unidad Técnica Municipal
