

MEMORANDO ADUANAS-GNP-UCEP-003-2025.

PARA: **ABG. MITZI ALEJANDRA PÉREZ**
Encargada del Departamento de Transparencia y Anticorrupción

DE: **ARQ. GRETELL CÁLIX.**
Gerente Nacional de Proyectos



FECHA: 7 de enero de 2024

ASUNTO: **RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN**

En atención a su **MEMORANDO-ADUANAS-DTA-600-2024** recibido en fecha 18 de diciembre de 2024, referente a proporcionar información de la ejecución de proyectos del mes de diciembre de 2024.

Se remite la siguiente documentación:

1. Informe de transparencia del proyecto denominado "Mejoramiento de la infraestructura de las Aduanas de Guasaule y La Fraternidad, perteneciente a la Administración Aduanera de Honduras".
2. Informe de transparencia del proyecto denominado "Mejoramiento de la Infraestructura de las Aduanas El Florido, Agua Caliente, y El Poy, pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras".
3. Informe de transparencia del proyecto denominado "Contratación de servicios de reparación para la Aduana de Puerto Cortés".
4. Nota aclaratoria

Atentamente,

CC. Archivo
GC/KM

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ADUANAS DE GUASAULE Y LA FRATERNIDAD, PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS”

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO

- Administración Aduanera de Honduras/Gerencia Nacional de Proyectos.

SECTOR Y SUB-SECTOR

- Gobierno

NOMBRE DEL PROYECTO

- Contrato de obra No. ADUANAS-GNAF-008-2024 para el “Mejoramiento de la infraestructura de las Aduanas de Guasaule y la Fraternidad, pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras regido por la Licitación Pública Nacional LPN-Aduanas-Obras-001-2024.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

- Aldea San Juan, Municipio del Triunfo, Departamento de Choluteca, Aduana de Guasaule, Frontera entre Honduras y Nicaragua y Aldea San Diego, Municipio de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca, Aduana de la Fraternidad Frontera entre Honduras y Nicaragua.

PROPÓSITO

El propósito del proyecto es mejorar la infraestructura física del edificio de apartamentos de la Aduana de Guasaule y el mejoramiento de la infraestructura del edificio administrativo de la Aduana de la Fraternidad.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura de los apartamentos, que contempla la desinstalación puertas, ventanas, lamina de techos y cableado eléctrico en mal estado, demoliciones de paredes y sellado de boquetes, cimentación de paredes nuevas, elementos estructurales como vigas, columnas, cubierta de techo, pérgolas metálica, instalación de puertas y ventanas nuevas, repello y pulido de paredes,

“La presente información es de uso exclusivo, reservado y confidencial para la Administración Aduanera de Honduras, se prohíbe y sanciona su divulgación conforme al Régimen de la Carrera de los Funcionarios y Servidores de la Administración Aduanera de Honduras”

info@aduanas.gob.hn www.aduanas.gob.hn

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 3, 13, 14 y 15, Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

instalación de balcones, instalación de parades de tabla yeso, cielo falso de PVC, piso de cerámica y porcelanato, instalaciones hidrosanitarias, nueva instalación eléctrica y mobiliario y equipo, en la parte exterior del edificio se estará realizando la construcción de un muro perimetral, nivelación de calles, instalación de adoquines y recuperación de áreas verdes y definición de áreas de estacionamiento.

- En el caso de la Aduana de la Fraternidad se realizará el cambio de canales de agua lluvia y la construcción de plumas metálicas tanto en ingreso como en salida de la Aduana.

ELABORACION DEL PROYECTO

ALCANCE

Esta readecuación busca las mejoras en las instalaciones de los apartamentos de la Aduana de Guasaule para contar con instalaciones óptimas para todos los colaboradores en la Aduana.

- Entre ellas involucra:
- La infraestructura física (puertas, ventanas, pisos).
- Pintura y acabados.
- Mobiliario.
- Instalaciones Hidrosanitarias.
- Instalaciones Eléctricas.
- Construcción de muro perimetral.
- Recuperación del área verde.
- Adoquinado en área de parqueos.
- Equipamiento de cocina y áreas sociales para los colaboradores.
- Conformación de terracería para estacionamiento de los vehículos

En la Aduana de la Fraternidad se realizará el cambio de canales de agua lluvia y la construcción de plumas metálicas tanto en ingreso como en salida de la Aduana.

IMPACTO AMBIENTAL

- Tipo de impacto ambiental negativos:
Aire: Ruidos debido al uso de herramientas que se utilizan para las actividades de demolición.
Aire: Partículas de polvo generadas por actividades de demolición los cuales son de carácter temporal.

IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS.

- No implica ningún Impacto

DETALLE DE LOS CONTACTOS

- Gerente de Proyectos / Administración Aduanera de Honduras.
- Ingeniera Edis Corrales/ Constructora Corrales Ingenieros S. DE. R. L. DE C.V.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

- Fondos propios de la Institución, para la contratación de una empresa por medio de licitación pública para el desarrollo del proyecto.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

- El monto para la ejecución del proyecto es de **14.776.271,12 millones de lempiras.**

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

- Segundo Trimestre del 2024

ESTADO DEL PROYECTO

- En Ejecución de Infraestructura por el oferente **CONSTRUCTORA CORRALES INGENIEROS S. DE. R. L. DE C.V.**

COSTO DE FINALIZACIÓN

- El costo de finalización es de **14.776.271,12 millones de lempiras.**

Las inversiones realizadas son las siguientes:

Desmontajes de techos, ventanas, puertas, canales de agua lluvia, demoliciones, construcción de cimentaciones para paredes y muro perimetral, construcción de soleras y castillos, instalación de puertas y ventanas nuevas, instalación de pérgolas, balcones, instalación de cielo falso de PVC y tabla yeso, instalación de piso de porcelanato y cerámica en baños y cocina, repello, pulido de paredes, pintura en paredes, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, mejoramiento de áreas verdes, construcción y nivelación de áreas de estacionamiento.

Instalación de nuevos canales de agua lluvia en el edificio administrativo de la Aduana de La Fraternidad e instalación de canales de plumas metálicas tanto en salida como ingreso de la Aduana.

FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO

- 24 de febrero de 2025

PORCENTAJE DE AVANCE

- 63% (porcentaje validado al 30 de diciembre de 2024)

EJECUCION DEL PROYECTO

RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL

- Está en la fase de construcción por lo que no se ha hecho entrega de ningún producto en su totalidad.

VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO.

- Actualmente se hizo una adenda al contrato por el valor de **L. 3,620,217.89**, por lo tanto, el valor de contrato actual es de **L. 18,396,491.42**.

VARIACIÓN EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO.


- El proyecto sufrió una modificación en el alcance debido a que se realizara la construcción de 482.50 metros lineales de muro de bloque, así como también el resane del tanque de abastecimiento de agua potable para la Aduana de Guasaule, el tiempo de ejecución también sufrió una modificación en el tiempo de ejecución teniendo una ampliación de 3 meses siendo la nueva fecha de finalización del contrato el 24 de mayo de 2025.

RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS


- La construcción del muro perimetral surge de la necesidad de que las personas sigan invadiendo los terrenos que le pertenecen al Estado de Honduras en este caso a la Aduana de Guasaule, con eso se está evitando nuevas invasiones por parte de personas

ajenas a las actividades de la Aduana, en el caso del tanque de agua potable este tiene varios años sin mantenimiento por lo tanto se vio la necesidad de resanarlo en su totalidad y así evitar que se siga deteriorando, así como también presentando fugas en el mismo


ESQUEMA

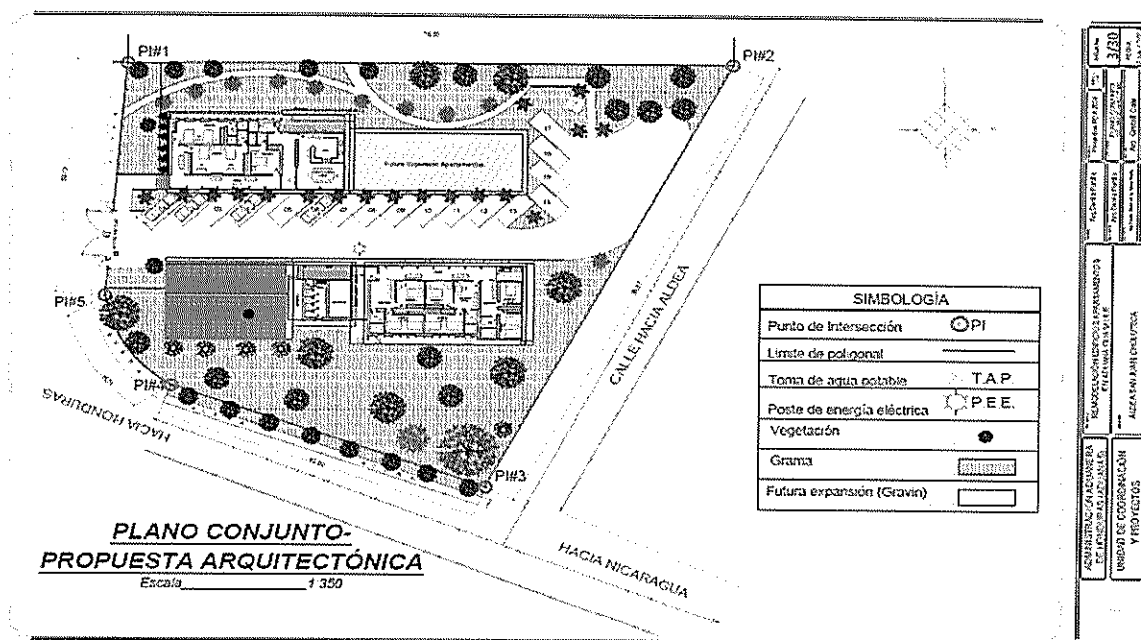


FOTOGRAFÍAS

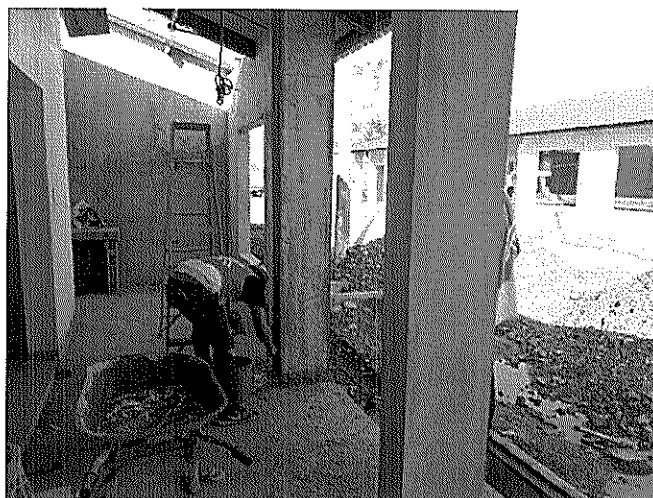

Repello de columnas edificio #1

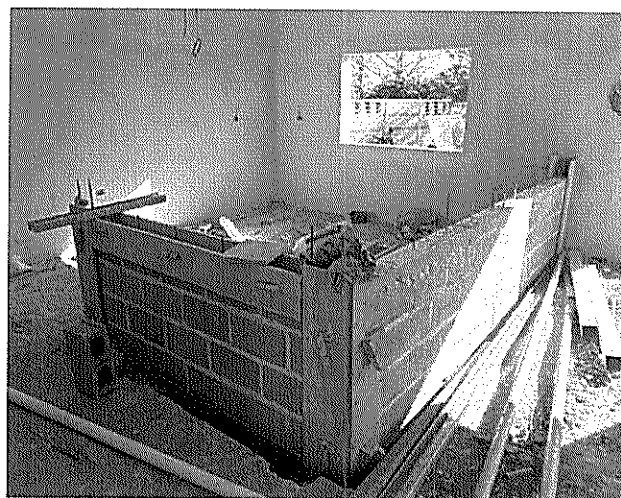

Construcción de base de mueble de cocina edificio #1

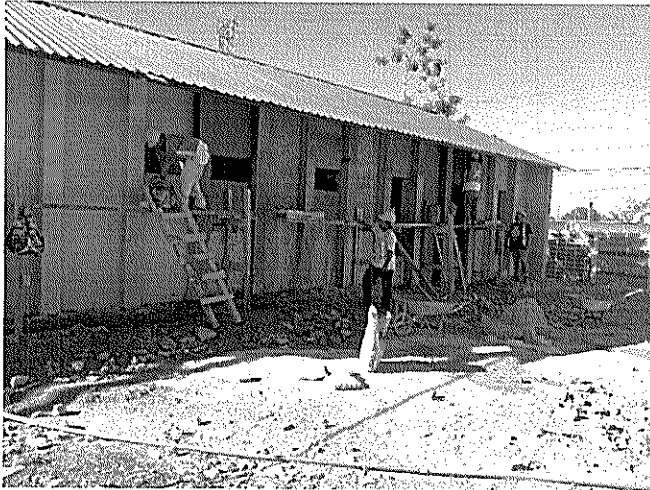


Repello de paredes edificio #1



Construcción de muro perimetral



Instalación de tuberías edificio #2

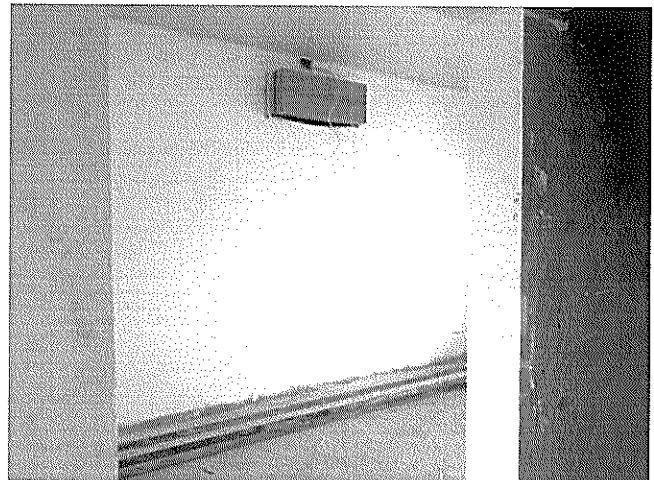

Pintura en paredes edificio #2



Construcción de mueble de cocina edificio #2

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ADUANAS EL FLORIDO, AGUA CALIENTE Y EL POY, PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS"

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO

- Administración Aduanera de Honduras/Gerencia Nacional de Proyectos.

SECTOR Y SUB-SECTOR

- Gobierno

NOMBRE DEL PROYECTO

- CONTRATO DE OBRA NO. ADUANAS -GNAF-020-2024 PARA EL "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ADUANAS EL FLORIDO, AGUA CALIENTE Y EL POY, PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS"

UBICACIÓN DEL PROYECTO

- ADUANA EL FLORIDO
Aldea el Saltiron, Municipio de Ruinas de Copán, Departamento de Copán.
- ADUANA AGUACALIENTE
Aldea Agua Caliente, Municipio de Santa Fe, Departamento de Ocotepeque.
- ADUANA EL POY
Aldea San Rafael, Municipio de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque.

PROPÓSITO

El objetivo de las obras de mejoramiento de la infraestructura en las Aduanas El Florido, Agua Caliente y El Poy es optimizar las instalaciones y condiciones operativas.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Aduana Agua Caliente.



El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del área de andenes, edificio administrativo y vivienda. esta obra contempla las siguientes actividades:

- Construcción de cunetas.
- Suministro e instalación de canal de aguas lluvias.
- Pintura general.
- Suministro e instalación de cielo falso.
- Pintura y señalización.
- Suministro e instalación de pluma eléctrica.
- Cerco malla ciclón.

Aduana El Florido

El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del área de andenes, edificio administrativo y obras exteriores. esta obra contempla las siguientes actividades:

- Readecuación de sanitarios en andén.
- Construcción de bodega.
- Suministro e instalación de estantería tipo rack.
- Pintura general.
- Suministro e instalación de puertas metálicas.
- Suministro e instalación de ventanas.
- Construcción de cerco de malla tipo reja.
- Pintura y señalización.
- Instalaciones eléctricas exteriores.
- Suministro de mobiliario (administrativa, apartamento).

Aduana El Poy.

El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del área de, edificio administrativo y obras exteriores. esta obra contempla las siguientes actividades:

- Mejoramiento de instalaciones hidrosanitarias.
- Suministro e instalaciones de puertas metálicas.
- Mejoramiento del área de atención.
- Suministro e instalación de pluma metálica.
- Suministro e instalación de asta para bandera.
- Suministro de señalización (conos reflectivos 36").



IMPACTO AMBIENTAL

- Tipo de impacto ambiental negativos:
Aire: Ruidos debido al uso de herramientas que se utilizan para las actividades de demolición e instalación.
Aire: Partículas de polvo generadas por actividades de demolición los cuales son de carácter temporal.

IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS.

- No implica ningún Impacto

DETALLE DE LOS CONTACTOS

- Gerente de Proyectos / Administración Aduanera de Honduras.
- Ingeniera Edis Corrales/ Constructora Corrales Ingenieros S. DE. R. L. DE C.V.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

- Fondos propios de la Institución, para la contratación de una empresa por medio de licitación pública para el desarrollo del proyecto.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

- El monto para la ejecución del proyecto es **Siete millones ochocientos noventa y un mil novecientos noventa 22/100. (L. 7,891,990.22)**

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

- Cuarto Trimestres del 2024

ESTADO DEL PROYECTO

- En Ejecución de Infraestructura por el oferente CONSTRUCTORA CORRALES INGENIEROS S. DE. R. L. DE C.V.

COSTO DE FINALIZACIÓN

- El costo de finalización es de **Siete millones ochocientos noventa y un mil novecientos noventa 22/100. (L. 7,891,990.22)**

FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO

- 26 abril de 2025

PORCENTAJE DE AVANCE

- 27.47 % (porcentaje validado al 16 de diciembre de 2024)

EJECUCION DEL PROYECTO

RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL

- Está en la fase de construcción por lo que no se ha hecho entrega de ningún producto en su totalidad.

VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO.

- No hay obras adicionales hasta la fecha.

VARIACIÓN EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO.

- No hay variación en el alcance ni tampoco variación en la duración del proyecto


RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS

- No hay cambios.


ESQUEMA

Aduana Agua Caliente.



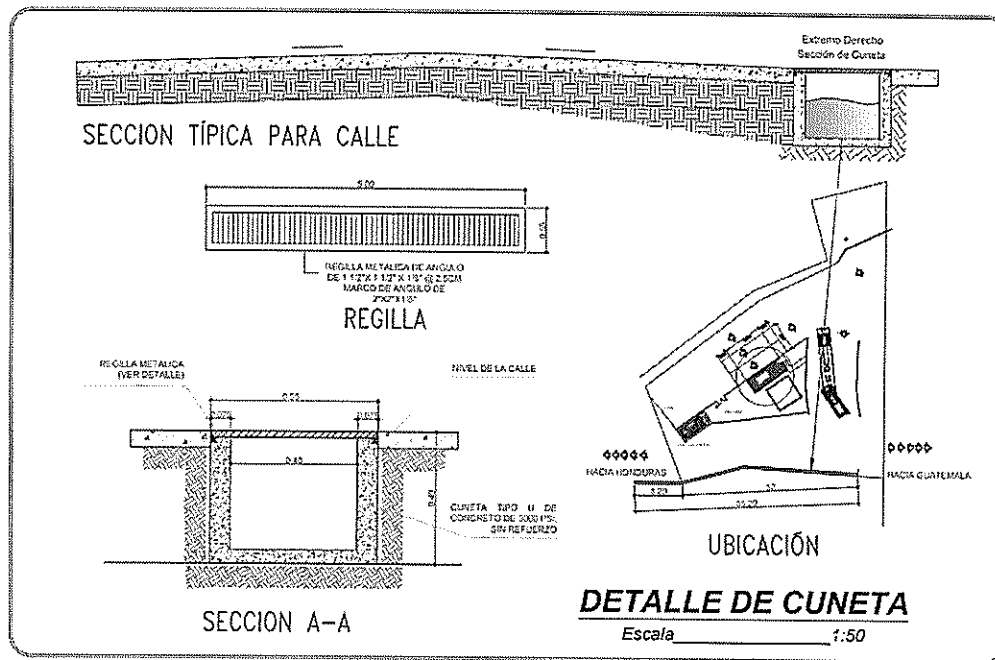


AGENCIA REGION AGUAFERRA DE HONOLULU (ADMINISTR.)	NO. DE FOLIO	177
UNIDAD DE COORDINACION Y PROYECTOS	FECHA DE ENTREGA	1-1-58
REVISOR (C) ALUMNA ACTUAL CALIFIC	NO. DE FOLIO	177
REVISOR (C) ALUMNA ACTUAL CALIFIC	FECHA DE ENTREGA	1-1-58

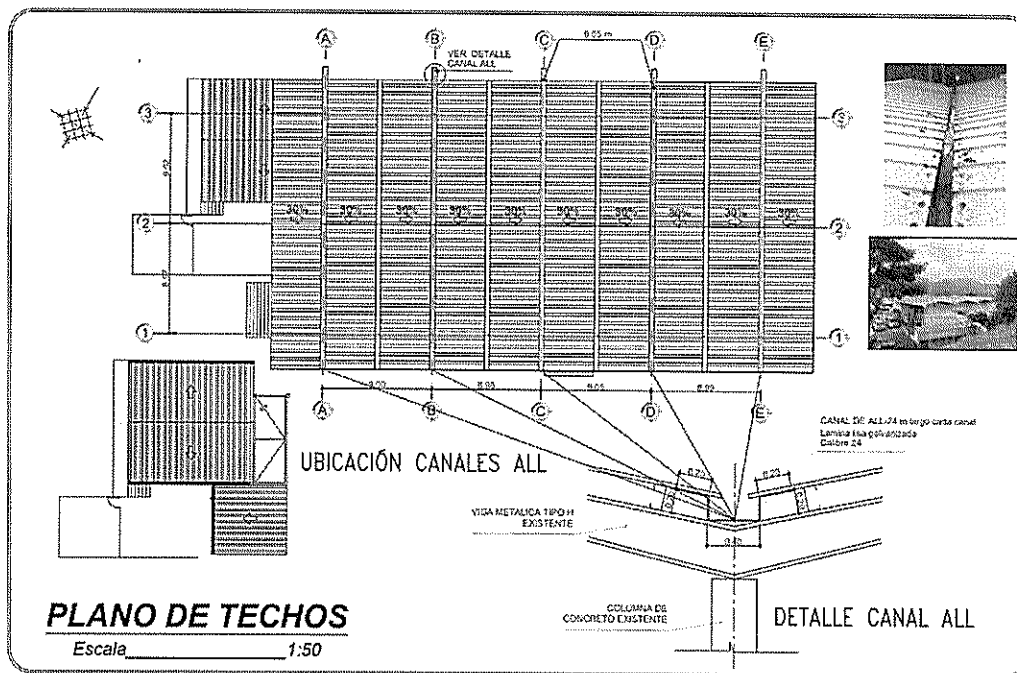[illegible]


"La presente información es de uso exclusivo, reservado y confidencial para la Administración Aduanera de Honduras, se prohíbe y sanciona su divulgación conforme al Régimen de la Carrera de los Funcionarios y Servidores de la Administración Aduanera de Honduras"

@aduanashonduras www.aduanas.gob.hn

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 3, 13, 14 y 15, Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

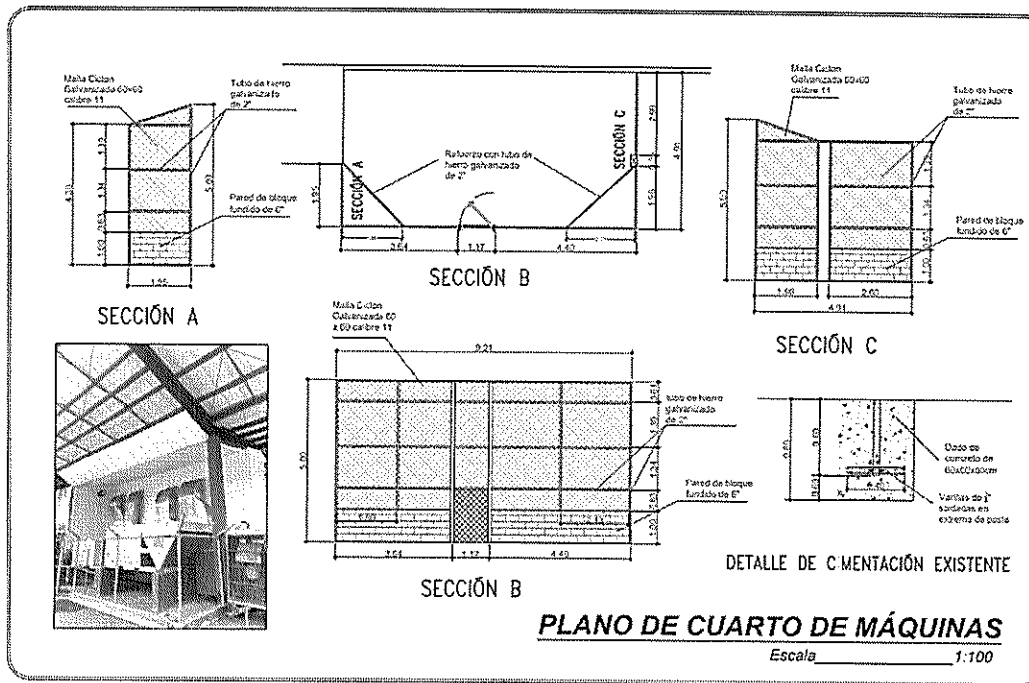

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA DE HONDURAS (SOPUNSA)	NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN MIEMBRO	SIGLA DEL PAÍS	FECHA DE FUNDACIÓN	TOTAL
	MUNICIPIO DE OCHUCULA COSTA SUR	SOL CAJALPÁN	NO SE CREA	3/7
UNIDAD DE COORDINACIÓN Y PROYECTOS				PÁG. 98

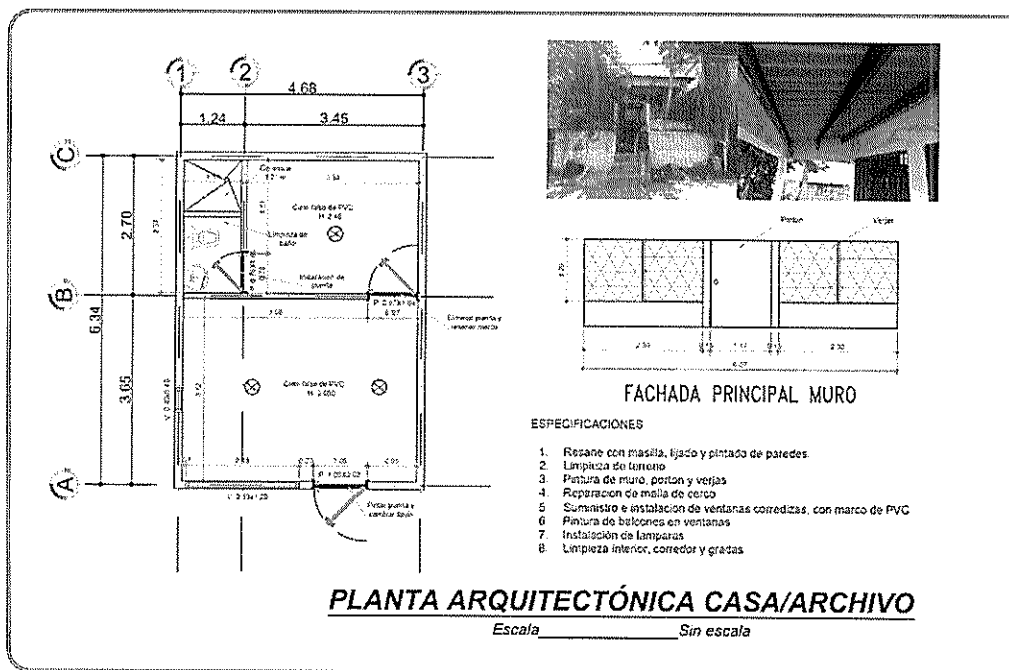[illegible]

"La presente información es de uso exclusivo, reservado y confidencial para la Administración Aduanera de Honduras, se prohíbe y sanciona su divulgación conforme al Régimen de la Carrera de los Funcionarios y Servidores de la Administración Aduanera de Honduras"


 info@aduanas.gob.hn

@aduanashonduras www.aduanas.gob.hn


Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 3, 13, 14 y 15, Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

ADMINISTRACIÓN AVANZADA DE EMPRESAS ASOCIADAS	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO NUEVO EN ADMINISTRATIVO	PROYECTO DE INICIACIÓN	2/10
UNIDAD DE COORDINACIÓN Y PROYECTOS	ADMINISTRATIVO	PROYECTO DE INICIACIÓN	2/10

1

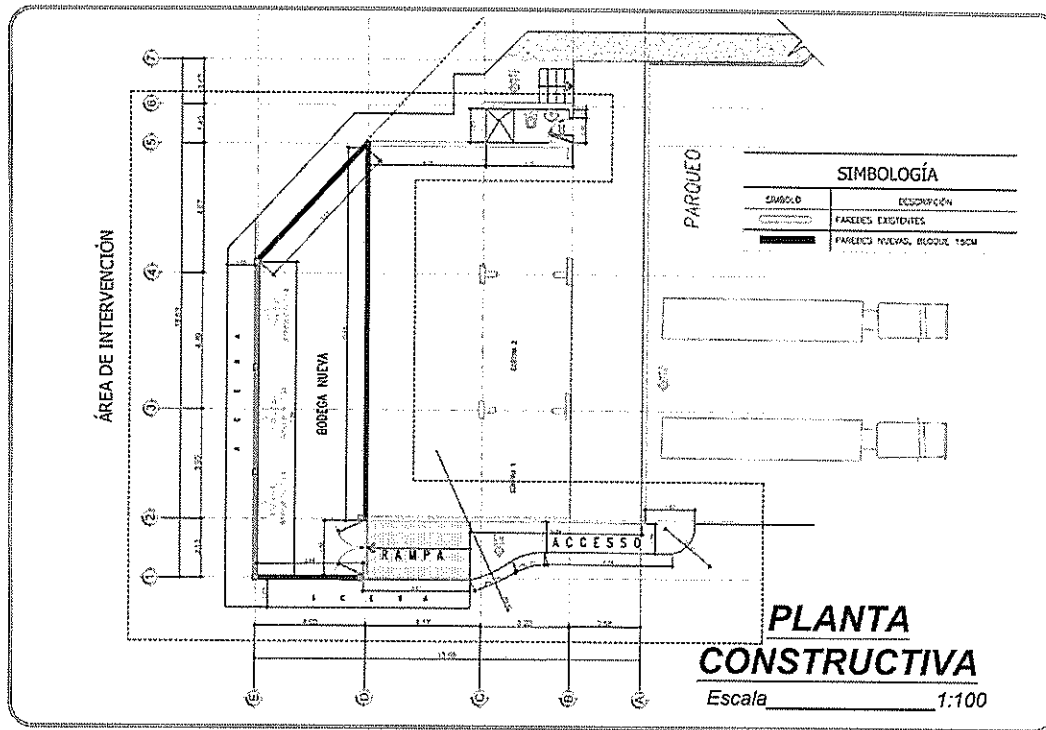

FECHA	5/10
PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LOS RIOS
UNIDAD DE COORDINACIÓN Y PROYECTO	UNIDAD DE COORDINACIÓN Y PROYECTO
UNIDAD DE COORDINACIÓN Y PROYECTO	UNIDAD DE COORDINACIÓN Y PROYECTO

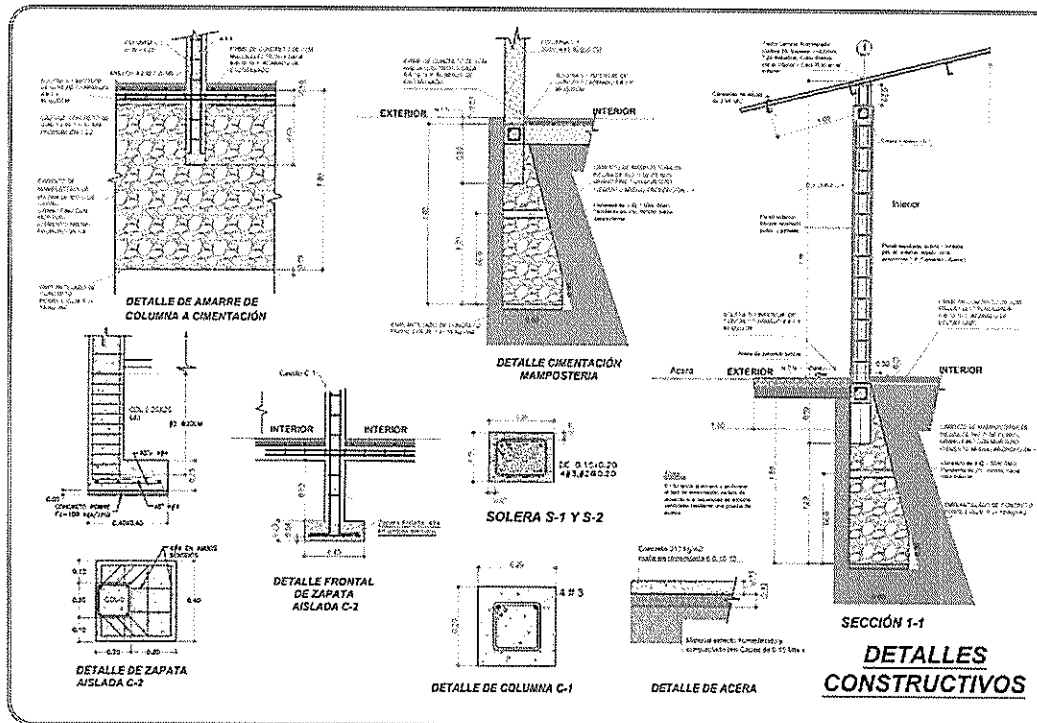

FECHA	5/10
PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LOS RIOS
UNIDAD DE COORDINACIÓN Y PROYECTO	UNIDAD DE COORDINACIÓN Y PROYECTO
UNIDAD DE COORDINACIÓN Y PROYECTO	UNIDAD DE COORDINACIÓN Y PROYECTO

Aduana El Poy


[Handwritten signature]

"La presente información es de uso exclusivo, reservado y confidencial para la Administración Aduanera de Honduras, se prohíbe y sanciona su divulgación conforme al Régimen de la Carrera de los Funcionarios y Servidores de la Administración Aduanera de Honduras"


@aduanashonduras www.aduanas.gob.hn

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 3, 13, 14 y 15, Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

info@aduanas.gob.hn

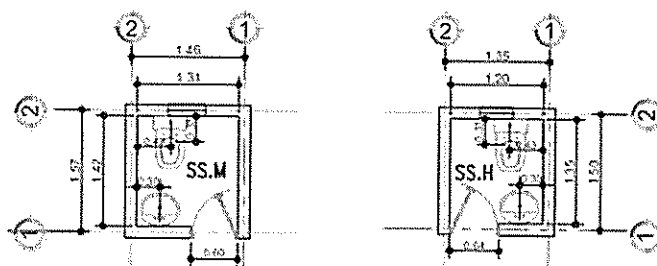

PLANO DE UBICACIÓN DE MOBILIARIO SANITARIO

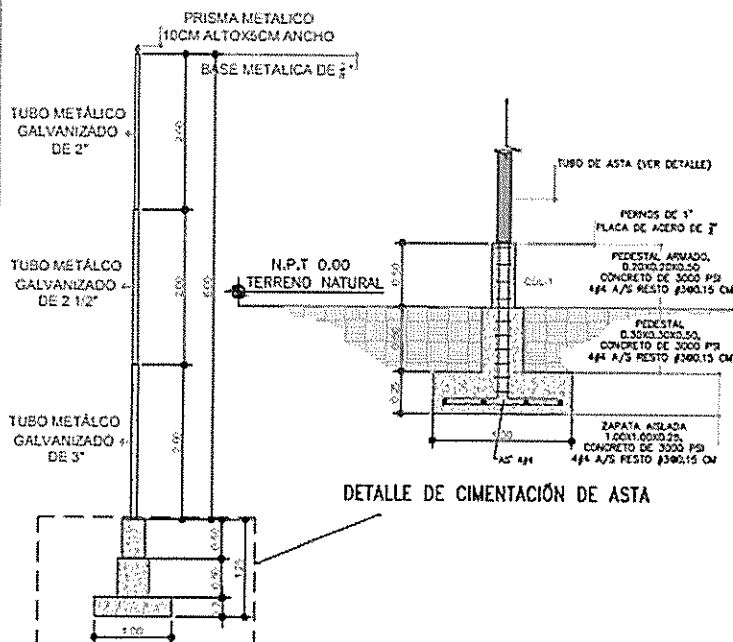

DETALLE DE CIMENTACIÓN DE ASTA

DETALLE DE TUBO DE ASTA

BAÑOS Y ASTA BANDERA


Escala Sin escala

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS (ADUANAS)	MEJORAS EN ADUANA EL POY	Proyecto: 1012-2-01	Hoja: 1/3
UNIDAD DE COORDINACIÓN Y PROYECTOS	MANCIMO BOGOTZQUE COATEQUE	Proyecto: 1012-2-01	Hoja: 1/3
		Proyecto: 1012-2-01	Hoja: 1/3
		Proyecto: 1012-2-01	Hoja: 1/3

"La presente información es de uso exclusivo, reservado y confidencial para la Administración Aduanera de Honduras, se prohíbe y sanciona su divulgación conforme al Régimen de la Carrera de los Funcionarios y Servidores de la Administración Aduanera de Honduras"

@aduanashonduras www.aduanas.gob.hn

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 3, 13, 14 y 15, Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

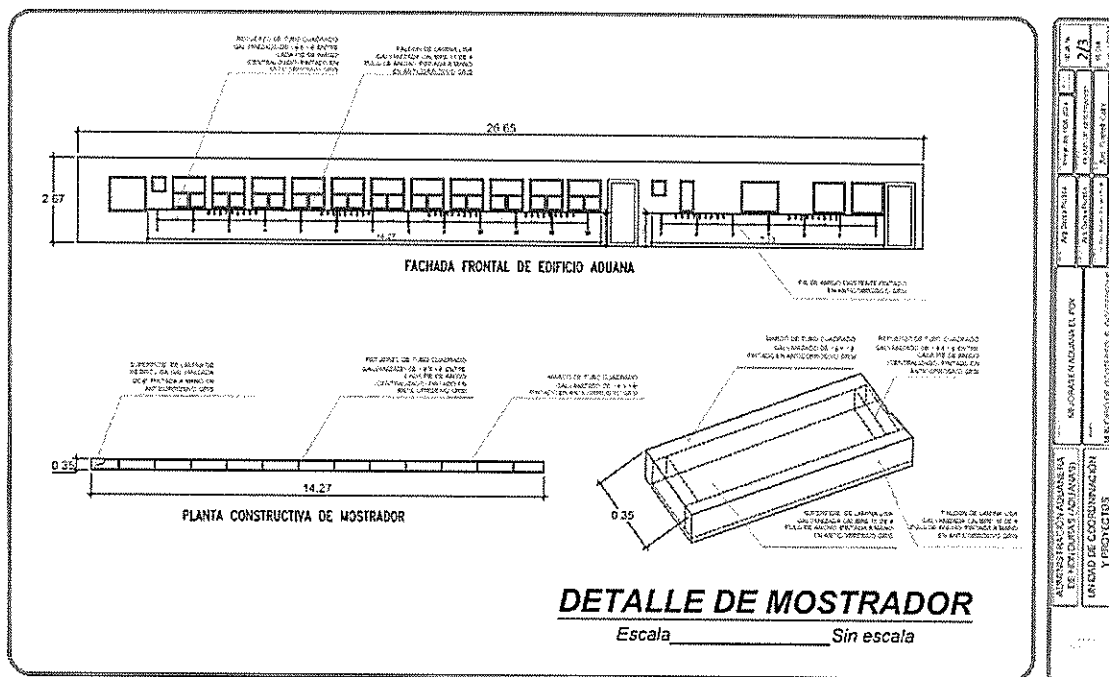


"La presente información es de uso exclusivo, reservado y confidencial para la Administración Aduanera de Honduras, se prohíbe y sanciona su divulgación conforme al Régimen de la Carrera de los Funcionarios y Servidores de la Administración Aduanera de Honduras"

info@aduanas.gob.hn


@aduanashonduras www.aduanas.gob.hn

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 3, 13, 14 y 15, Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.


FOTOGRAFÍAS

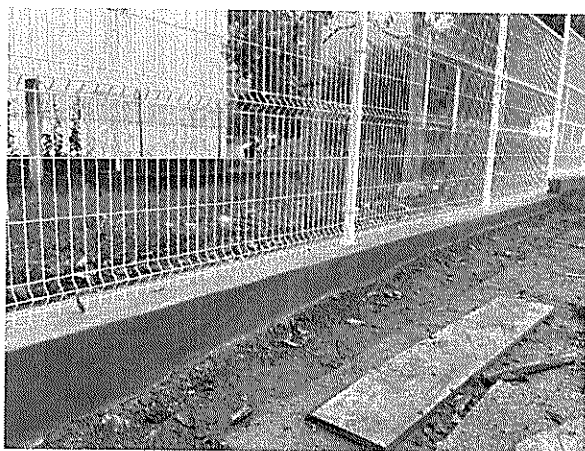

Aduana El Florido, cerco de malla

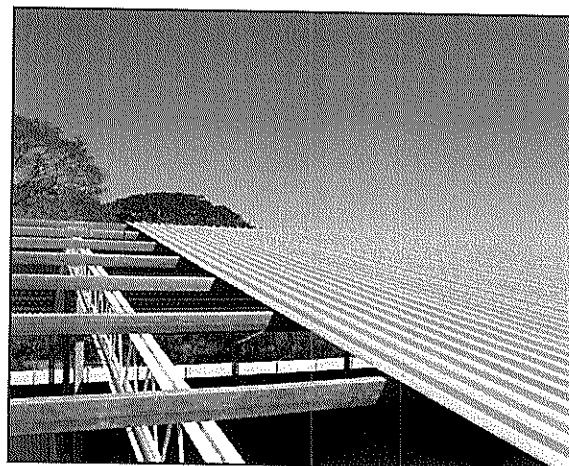

Aduana el florido, techo de bodega.

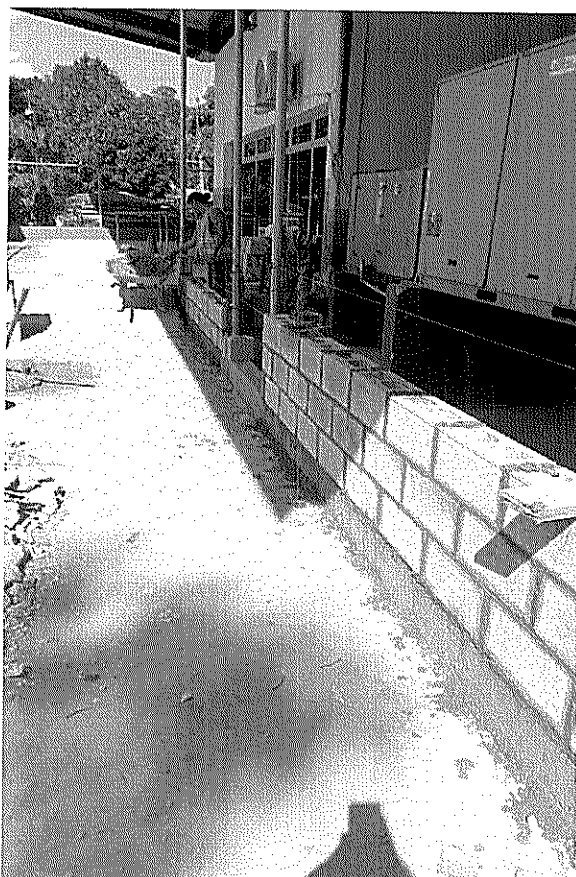

Aduana Agua caliente, área de máquinas.



Aduana agua caliente, tallado de boquetes.

[Handwritten signature]

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN PARA LA ADUANA DE PUERTO CORTÉS”

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO

- Administración Aduanera de Honduras/Gerencia Nacional de Proyectos.

SECTOR Y SUB-SECTOR

- Gobierno

NOMBRE DEL PROYECTO

- CONTRATO DE OBRA NO. ADUANAS-GNAF-011-2024 PARA LA “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN PARA LA ADUANA DE PUERTO CORTES”

UBICACIÓN DEL PROYECTO

- Municipio de Puerto Cortés, Departamento de Cortés. Barrio la Laguna, 15 calle.

PROPÓSITO

El propósito del proyecto es mejorar la infraestructura física de las oficinas administrativas y las bodegas del laboratorio de las Aduanas de Puerto Cortes.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura de las oficinas administrativas de la Aduana que contempla el desmontaje del cielo falso existente, limpieza de paredes, desmontaje de paredes de tabla yeso en mal estado, limpieza de bodega, retiro de lámina bituminosa de impermeabilizante, limpieza de canales de agua lluvia, instalación de nuevos tornillos en las láminas de techo, en las actividades nuevas realizadas se encuentra la impermeabilización de las losas de concreto, instalación de nuevo cielo falso tanto de PVC, como de cielo falso de fibra mineral, instalación de nuevas paredes de tabla yeso, pintado de las paredes de las oficinas administrativas y bodegas del laboratorio Aduanero, en el laboratorio se instalarán 13 estantes metálicos tipo Rack

ELABORACION DEL PROYECTO

ALCANCE

Esta readecuación busca las mejoras en las instalaciones de las oficinas administrativas y el laboratorio aduanero mediante las siguientes actividades.

- Pintura en paredes de oficinas.
- Instalación de nuevo cielo falso de fibra mineral.
- Instalación de cielo falso de PVC.
- Instalación lámparas led de 4 x 2 de 40 w.
- Instalación de nueva membrana asfáltica APP.
- Sellado de losa con impermeabilizante K1.
- Sellado de grietas con Poly Flex.
- Limpieza de bajante de agua lluvia.
- Instalación de flashing.
- Instalación de estantes metálicos.

IMPACTO AMBIENTAL

- Tipo de impacto ambiental negativos:
Aire: Ruidos debido al uso de herramientas que se utilizan para las actividades de demolición e instalación.
Aire: Partículas de polvo generadas por actividades de demolición los cuales son de carácter temporal.

IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS.

- No implica ningún Impacto

DETALLE DE LOS CONTACTOS

- Gerente de Proyectos / Administración Aduanera de Honduras.
- Ingeniera Edis Corrales/ Constructora Corrales Ingenieros S. DE. R. L. DE C.V.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

- Fondos propios de la Institución, para la contratación de una empresa por medio de licitación pública para el desarrollo del proyecto.



PRESUPUESTO DEL PROYECTO

- El monto para la ejecución del proyecto es de **Un Millón Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Cuarenta y Un lempiras con 44/100. (L. 1,432,041.44)**

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

- Cuarto Trimestres del 2024

ESTADO DEL PROYECTO

- En Ejecución de Infraestructura por el oferente **CONSTRUCTORA CORRALES INGENIEROS S. DE. R. L. DE C.V.**

COSTO DE FINALIZACIÓN

- El costo de finalización es de **Un Millón Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Cuarenta y Un lempiras con 44/100. (L. 1,432,041.44)**

Las inversiones realizadas son las siguientes:

limpieza de canales de agua lluvia, instalación de nuevos tornillos en las láminas de techo, impermeabilización de las losas de concreto con membrana APP, instalación de nuevo cielo falso tanto de PVC, como de cielo falso de fibra mineral, instalación de nuevas paredes de tabla yeso, pintado de las paredes de las oficinas administrativas y bodegas del laboratorio Aduanero, en el laboratorio se instalarán 13 estantes metálicos tipo Rack

FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO

- 16 de enero de 2025

PORCENTAJE DE AVANCE

- **100% (porcentaje validado al 30 de diciembre de 2024)**

EJECUCION DEL PROYECTO

RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL

- El proyecto se ejecuto en un 100% según lo planificado, se hizo una modificación en el contrato donde hubo una reducción en cantidades de obras de ciertas actividades y la incorporación de nuevas actividades, esto sin afectar el presupuesto del proyecto.

VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO.

- Actualmente el proyecto tiene una variación en el costo final del proyecto, teniendo una reducción de este por un valor de L. 11,623.89, por lo tanto, el valor del contrato final será de L. 1,420,517.84.


VARIACIÓN EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO.


- En lo que se refiere al alcance del proyecto este sufrió una modificación en las actividades reduciendo cantidades de obra, así como también la incorporación de nuevas actividades, se eliminaron actividades como la limpieza de losa con ácido muriático y también la impermeabilización de la losa con Admix K-1, se agregaron nuevas actividades como ser instalación de canales de agua lluvia metálico y de PVC, instalación de cielo falso de PVC, paredes nuevas de tabla yeso, reparación de válvulas de control de AP.

RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS


- Surgió la necesidad de incorporar actividades nuevas que permitieran que el proyecto se ejecutara de manera adecuada, dejando un espacio idóneo para el personal de Aduanas

ESQUEMA

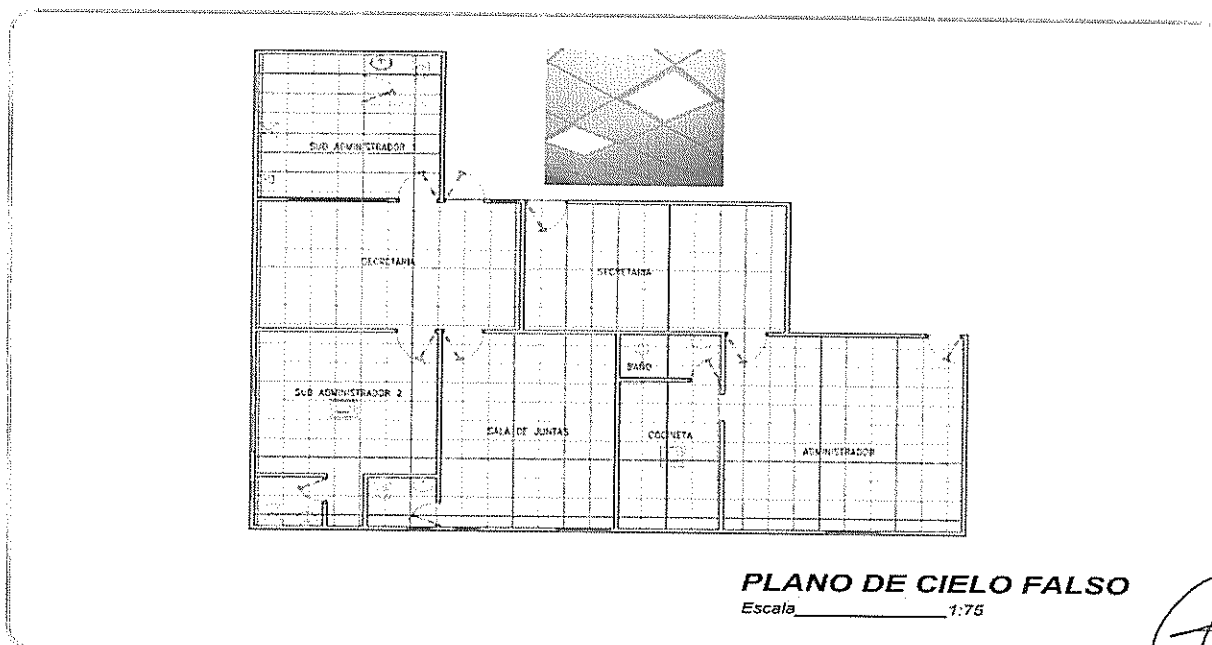

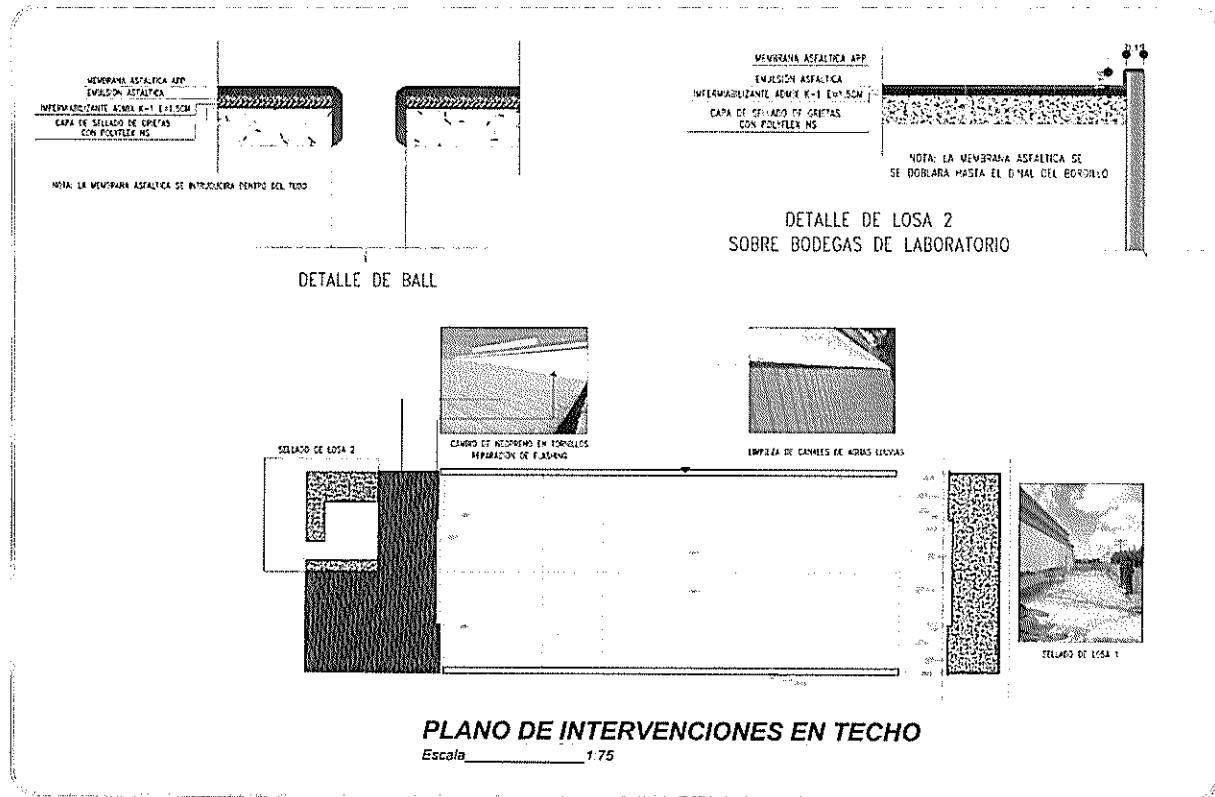

FOTOGRAFÍAS

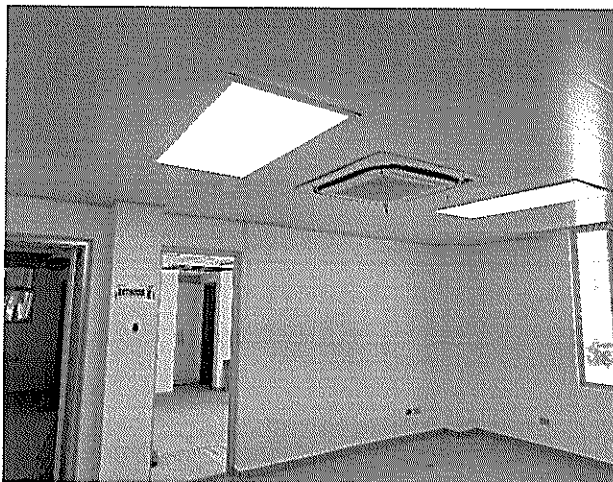

Instalación de cielo falso de PVC




Instalación de lámparas Led de 2x4




Instalación de canal de PVC



Instalación de cielos falso de tabla yeso

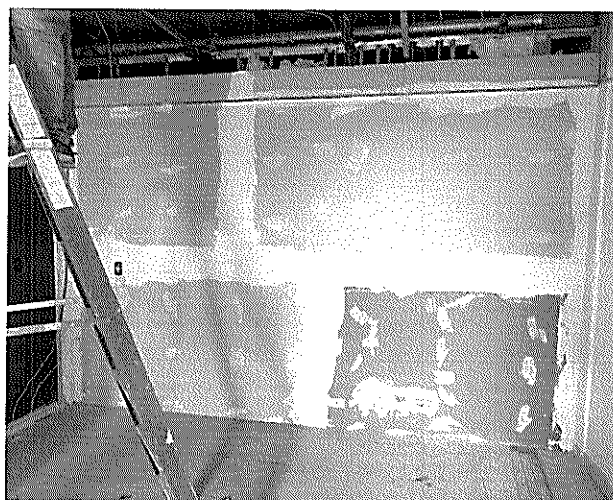

Instalación de pared de tabla yeso

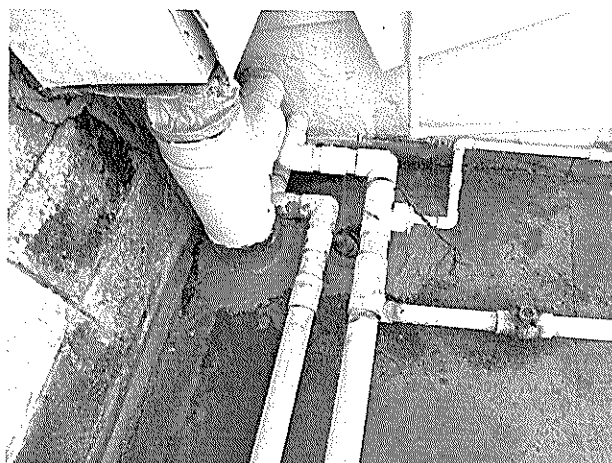

Sellado de grietas con impermeabilizante K-1



Instalación de lámina tipo Flashing

NOTA ACLARATORIA

La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS), por medio de la presente hace constar: Que según lo establecido en los lineamientos para la verificación de información pública en los portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada en el apartado Programas y proyectos instruye literalmente lo siguiente: **Adicionalmente se deberá incluir un documento el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la institución obligada según la fase del proyecto**, estos detalles se encuentran a continuación:

- 1) Identificación del proyecto.
- 2) Elaboración del proyecto.
- 3) Ejecución del proyecto.
- 4) Finalización del proyecto.

Se adjunta la constancia de avances de los proyectos que comenzaron en los meses de agosto, noviembre y diciembre de 2024.

A la vez se hace mención que dicha Unidad Administradora de Proyectos en esta institución es únicamente gestora de proyectos, la ejecución y manejo de fondos nacionales es directamente dirigida por la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera. Al momento de la ejecución de los proyectos asignados a nuestra Unidad es de nuestra responsabilidad dar el visto bueno de las actividades realizadas para proceder con el procedimiento de pago según estimaciones realizadas

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los **siete (7) días del mes de enero de 2025.**




Arq. Gretell Calix
Gerente Nacional de Proyectos
