

MEMORANDO ADUANAS-GNP-UCEP-063-2025.

PARA: **ABG. MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO**
Jefe del Departamento de Transparencia y Anticorrupción

DE: **ARQ. DANIA JULISSA PORTILLO DIAZ**
Jefa de la Unidad de Coordinación Externa y Proyectos

FECHA: 12 de mayo de 2025

ASUNTO: **RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN**



En atención a su **MEMORANDO-ADUANAS-DTA-125-2025** recibido en fecha 10 de abril de 2025, referente a proporcionar información de la ejecución de proyectos del mes de abril de 2025.

Se remite la siguiente documentación:

1. Informe de transparencia del proyecto denominado "Mejoramiento de la infraestructura de las Aduanas de Guasaule y La Fraternidad, perteneciente a la Administración Aduanera de Honduras".
2. Informe de transparencia del proyecto denominado "Mejoramiento de la Infraestructura de las Aduanas El Florido, Agua Caliente, y El Poy, pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras".
3. Nota aclaratoria

Atentamente,

CC. Archivo

ADUANAS Administración Aduanera de Honduras Unidad de Transparencia y Anticorrupción	
RECIBIDO	
FECHA:	12/5/25
HORA:	14:20
RECIBIDO POR:	[Firma]

NOTA ACLARATORIA

La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS), por medio de la presente hace constar: Que según lo establecido en los lineamientos para la verificación de información pública en los portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada en el apartado Programas y proyectos instruye literalmente lo siguiente: **Adicionalmente se deberá incluir un documento el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la institución obligada según la fase del proyecto**, estos detalles se encuentran a continuación:

- 1) Identificación del proyecto.
- 2) Elaboración del proyecto.
- 3) Ejecución del proyecto.
- 4) Finalización del proyecto.

Se adjunta la constancia de avances de los proyectos que comenzaron en los meses de agosto y noviembre de 2024.

A la vez se hace mención que dicha Unidad Administradora de Proyectos en esta institución es únicamente gestora de proyectos, la ejecución y manejo de fondos nacionales es directamente dirigida por la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera. Al momento de la ejecución de los proyectos asignados a nuestra Unidad es de nuestra responsabilidad dar el visto bueno de las actividades realizadas para proceder con el procedimiento de pago según estimaciones realizadas

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los **doce (12) días del mes de mayo de 2025.**



Arq. Dania Jhissa Portillo
Jefa de Unidad de Coordinación Externa y Proyectos.

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ADUANAS DE GUASAULE Y LA FRATERNIDAD, PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS”

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO

- Administración Aduanera de Honduras/Gerencia Nacional de Proyectos.

SECTOR Y SUB-SECTOR

- Gobierno

NOMBRE DEL PROYECTO

- Contrato de obra No. ADUANAS-GNAF-008-2024 para el “Mejoramiento de la infraestructura de las Aduanas de Guasaule y la Fraternidad, pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras regido por la Licitación Pública Nacional LPN-Aduanas-Obras-001-2024.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

- Aldea San Juan, Municipio del Triunfo, Departamento de Choluteca, Aduana de Guasaule, Frontera entre Honduras y Nicaragua y Aldea San Diego, Municipio de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca, Aduana de la Fraternidad Frontera entre Honduras y Nicaragua.

PROPÓSITO

El propósito del proyecto es mejorar la infraestructura física de la zona habitacional y muro perimetral de la Aduana de Guasaule y el mejoramiento de la infraestructura del edificio administrativo de la Aduana de la Fraternidad.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura de los edificios de apartamentos, que contempla la desinstalación puertas, ventanas, lamina de techos y cableado eléctrico en mal estado, demoliciones de paredes y sellado de boquetes, cimentación de paredes nuevas, elementos estructurales como vigas, columnas, cubierta de techo, pérgolas metálica, instalación de puertas y ventanas nuevas, repello y pulido de paredes, instalación de balcones, instalación de parades de tabla yeso, cielo

- falso de PVC, piso de cerámica y porcelanato, instalaciones hidrosanitarias, nueva instalación eléctrica y mobiliario y equipo, en la parte exterior del edificio se estará realizando la construcción de un muro perimetral, nivelación de calles, instalación de adoquines, recuperación de áreas verdes y definición de áreas de estacionamiento.
- En la Aduana de la Fraternidad se realizará el cambio de canales de agua lluvia y la construcción de plumas metálicas tanto en el ingreso como en la salida de la Aduana.

ELABORACION DEL PROYECTO

ALCANCE

El proyecto de readecuación de los edificios de apartamentos de la Aduana de Guasaule tiene como propósito principal contar con instalaciones optimas y funcionales para todos los colaboradores.

Entre ellas involucra:

- La infraestructura física (puertas, ventanas, pisos).
- Pintura y acabados.
- Mobiliario.
- Instalaciones Hidrosanitarias.
- Instalaciones Eléctricas.
- Construcción de muro perimetral.
- Recuperación del área verde.
- Adoquinado en área de parqueos.
- Equipamiento de cocina y áreas sociales para los colaboradores.
- Conformación de terracería para estacionamiento de los vehículos

En la Aduana de la Fraternidad se realizará el cambio de canales de agua lluvia y la construcción de plumas metálicas tanto en el ingreso como en la salida de la Aduana.

IMPACTO AMBIENTAL

- Tipo de impacto ambiental negativos:
Aire: Ruidos debido al uso de herramientas que se utilizan para las actividades de demolición.
Aire: Partículas de polvo generadas por actividades de demolición los cuales son de carácter temporal.

IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS

- No implica ningún Impacto

DETALLE DE LOS CONTACTOS

- Gerente de Proyectos / Administración Aduanera de Honduras.
- Ingeniera Edis Corrales/ Constructora Corrales Ingenieros S. DE. R. L. DE C.V.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

- Fondos propios de la Institución, para la contratación de una empresa por medio de licitación pública para el desarrollo del proyecto.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

- El monto para la ejecución del proyecto es de **14.776.273.53 millones de lempiras.**

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

- Segundo Trimestre del 2024

ESTADO DEL PROYECTO

- En Ejecución de Infraestructura por el oferente CONSTRUCTORA CORRALES INGENIEROS S. DE. R. L. DE C.V.

COSTO DE FINALIZACIÓN

- El costo de finalización es de **14.776.273.53 millones de lempiras.**

Las inversiones realizadas son las siguientes:

Desmontajes de techos, ventanas, puertas, canales de agua lluvia, demoliciones, construcción de cimentaciones para paredes y muro perimetral, construcción de soleras y castillos, instalación de puertas y ventanas nuevas, instalación de pérgolas, balcones, instalación de cielo falso de PVC y tabla yeso, instalación de piso de porcelanato y cerámica en baños y cocina, repello, pulido de paredes, pintura en paredes, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, mejoramiento de áreas verdes, construcción y nivelación de áreas de estacionamiento.

Instalación de nuevos canales de agua lluvia en el edificio administrativo de la Aduana de La Fraternidad e instalación de plumas metálicas tanto en salida como ingreso de la Aduana.

FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO

- 24 de febrero de 2025

PORCENTAJE DE AVANCE

- **95% (porcentaje validado al 30 de abril de 2025)**

EJECUCION DEL PROYECTO

RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL

- Está en la fase de construcción por lo que no se ha hecho entrega de ningún producto en su totalidad.

VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO.

- Actualmente se hizo una adenda al contrato por el valor de **L. 3,620,187.01**, por lo tanto, el valor de contrato actual es de **L. 18,396,460.54**.


VARIACIÓN EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO.

- El proyecto tubo una variación en el alcance debido a que se realizará la construcción de **482.50 metros lineales de muro de bloque**, así como también el resane del tanque se abastecimiento de agua potable para la Aduana de Guasaule. La duración del proyecto también sufrió una modificación en el tiempo de ejecución con una ampliación de 3 meses siendo la nueva fecha de finalización del contrato el **23 de mayo de 2025**.


RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS

- La construcción del muro perimetral surge de la necesidad de frenar a la invasión del predio por personas ajenas al mismo y así evitar que se sigan realizando actividades distintas a las funciones de la Aduana. En el caso del tanque de agua potable, este tiene varios años sin mantenimiento, por lo tanto, se vio la necesidad de resanar las paredes en su totalidad y evitar que se siga deteriorando o presente fugas.

ESQUEMA

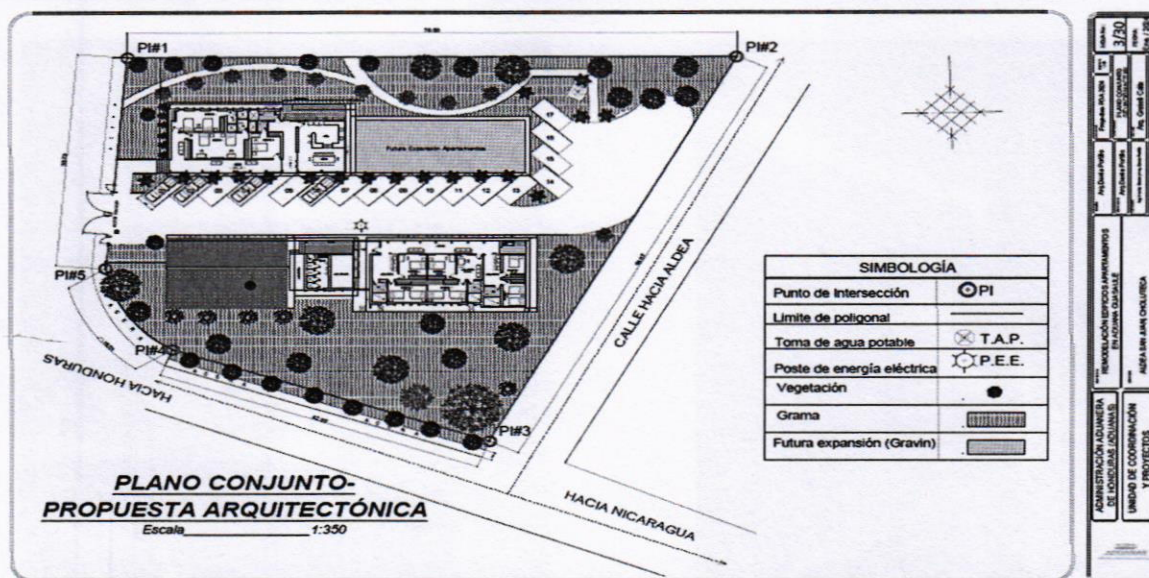

ANEXOS FOTOGRÁFICOS

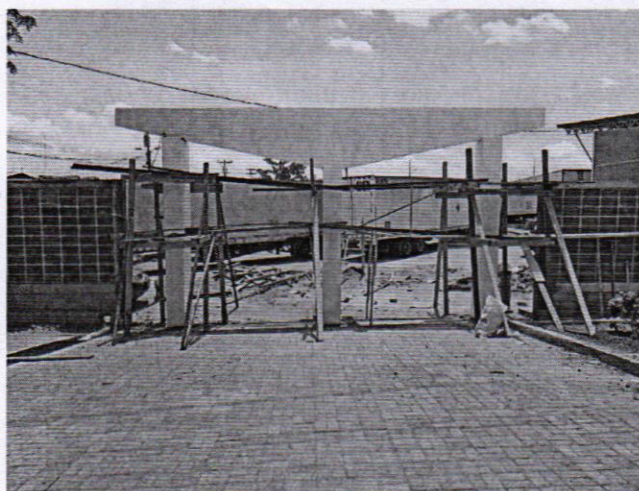

Pórtico de acceso principal – Aduana Guasaule



Enchape en pared, cocina edificio #2 – Aduana Guasaule




Instalación de adoquines en área de estacionamiento – Aduana Guasaule


"La presente información es de uso exclusivo, reservado y confidencial para la Administración Aduanera de Honduras, se prohíbe y sanciona su divulgación conforme al Régimen de la Carrera de los Funcionarios y Servidores de la Administración Aduanera de Honduras"




Instalación de luminarias exteriores edificio #2 – Aduana Guasaule

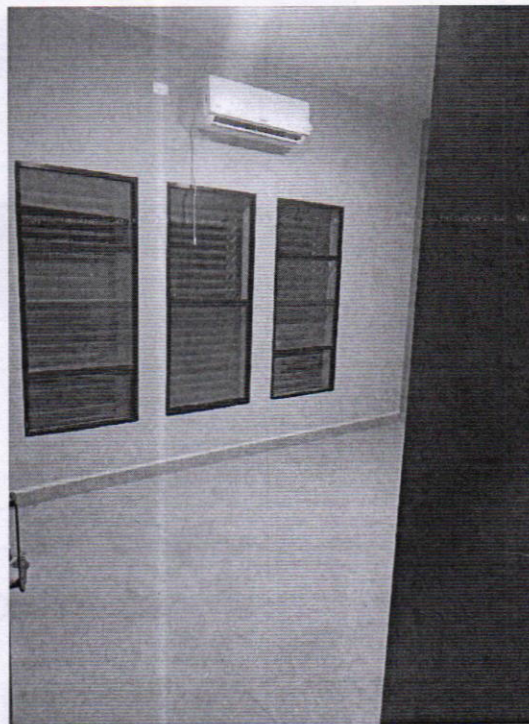

Instalación de aires acondicionados en el edificio #1 y #2 – Aduana Guasaule

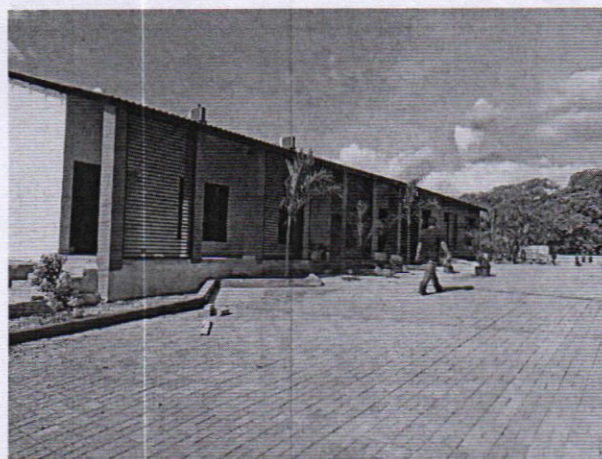

Instalación de plantas en áreas de estacionamientos.

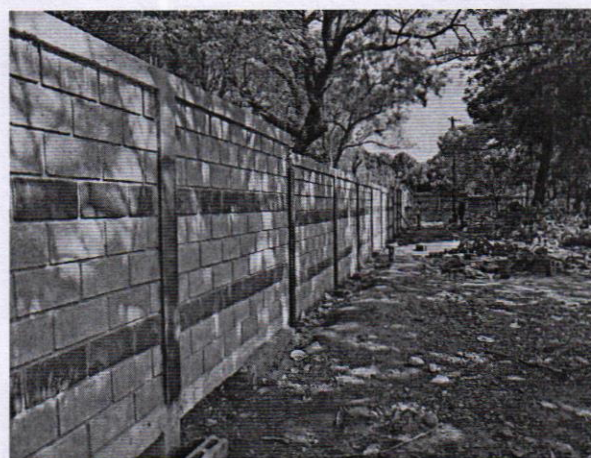

Tallado y pulido de castillos y vigas muro perimetral - Aduana Guasaule.

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ADUANAS EL FLORIDO, AGUA CALIENTE Y EL POY, PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS"

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO

- Administración Aduanera de Honduras/Gerencia Nacional de Proyectos.

SECTOR Y SUB-SECTOR

- Gobierno

NOMBRE DEL PROYECTO

- CONTRATO DE OBRA NO. ADUANAS -GNAF-020-2024 PARA EL "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ADUANAS EL FLORIDO, AGUA CALIENTE Y EL POY, PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS"

UBICACIÓN DEL PROYECTO

- ADUANA EL FLORIDO
Aldea el Saltiron, Municipio de Ruinas de Copán, Departamento de Copán.
- ADUANA AGUA CALIENTE
Aldea Agua Caliente, Municipio de Santa Fe, Departamento de Ocotepeque.
- ADUANA EL POY
Aldea San Rafael, Municipio de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque.

PROPÓSITO

El objetivo de las obras de mejoramiento de la infraestructura en las Aduanas El Florido, Agua Caliente y El Poy es optimizar las instalaciones y condiciones operativas.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Aduana Agua Caliente

El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del área de andenes, el edificio administrativo y una vivienda recuperada como propiedad de la Aduana. Esta obra contempla las siguientes actividades:

- Construcción de cuneta.
- Suministro e instalación de canales de aguas lluvias.
- Pintura general.
- Suministro e instalación de cielo falso.
- Pintura y señalización.
- Suministro e instalación de pluma electrónica.
- Cerco malla ciclón.

Aduana El Florido

El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del área de andenes, el edificio administrativo y obras exteriores. Esta obra contempla las siguientes actividades:

- Readecuación de sanitarios en andén.
- Construcción de bodega.
- Suministro e instalación de estantería tipo rack.
- Pintura general.
- Suministro e instalación de puertas metálicas.
- Suministro e instalación de ventanas.
- Construcción de cerco de malla tipo reja.
- Pintura y señalización.
- Instalaciones eléctricas exteriores.
- Suministro de mobiliario (área administrativa y habitacional).

El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del edificio administrativo y las obras exteriores. Esta obra contempla las siguientes actividades:

- Mejoramiento de instalaciones hidrosanitarias (losa sanitaria)
- Suministro e instalaciones de puertas metálicas.
- Mejoramiento del área de atención (mostrador de apoyo)
- Suministro e instalación de pluma metálica.
- Suministro e instalación de asta para bandera.
- Suministro de señalización (conos reflectivos 36").

IMPACTO AMBIENTAL

- Tipo de impacto ambiental negativos:

Aire:

Ruidos y partículas de polvo debido al uso de herramientas que se utilizan para las actividades de instalación, demolición y materiales de construcción. Las cuales son de carácter temporal.

IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS

- No implica ningún Impacto

DETALLE DE LOS CONTACTOS

- Gerente de Proyectos / Administración Aduanera de Honduras.
- Ingeniero Edis Alberto Corrales/ Constructora Corrales Ingenieros S. DE. R. L. DE C.V.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

- Fondos propios de la institución para la contratación de una empresa por medio de licitación pública para el desarrollo del proyecto.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

- El monto para la ejecución del proyecto es **Siete millones ochocientos noventa y un mil novecientos noventa 22/100. (L. 7,891,990.22)**

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

- Cuarto Trimestre del 2024

ESTADO DEL PROYECTO

- **Todas las obras de la Infraestructura finalizadas** por la CONSTRUCTORA CORRALES INGENIEROS S. DE. R. L. DE C.V.

COSTO DE FINALIZACIÓN

- El costo de finalización es de **Siete millones trescientos cuarenta y seis mil quinientos noventa y cuatro 62/100. (L. 7,346,594.62)**

FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO

- 26 abril de 2025

PORCENTAJE DE AVANCE

- **100 % (porcentaje validado al 26 de 2025 abril)**

EJECUCION DEL PROYECTO

RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL

- El proyecto se encuentra físicamente finalizado según lo solicitado en el contrato y la orden de cambio No. 1.
- El proyecto se ha construido según el diseño requerido y a satisfacción de la Administración Aduanera de Honduras.

VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO

- El costo de finalización es de **Siete millones trescientos cuarenta y seis mil quinientos noventa y cuatro 62/100. (L. 7,346,594.62)**, con una variación de L. 5,395.60 a favor de la administración Aduanera de Honduras.

VARIACIÓN EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO



- Se realizó orden de cambio N°1. con un monto de **L. 545,395.60** a favor de la Administración Aduanera de Honduras, por lo que el valor del contrato actual es de **Siete millones trescientos cuarenta y seis mil quinientos noventa y cuatro 62/100. (L. 7,346,594.62)**


RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS

- Los cambios generados en el proyecto se deben a que algunas de las obras inicialmente previstas no se ejecutaron en su totalidad. Por ejemplo, en la Aduana El Florido, el cerco de malla perimetral se redujo de 108 metros lineales a 54 metros lineales, debido a que fue reubicado. De igual manera, en la aduana de Agua Caliente, por trabajos de pavimentación que está desarrollando la SIT, se canceló la actividad de señalización con pintura termoplástica. Situaciones similares ocurrieron con otras actividades, las cuales se encuentran especificadas en la Orden de Cambio N.º 1. Esta situación obligó a ajustar el alcance del proyecto y los recursos asignados, lo cual se refleja en las modificaciones actuales.


ESQUEMA


Aduana Agua Caliente

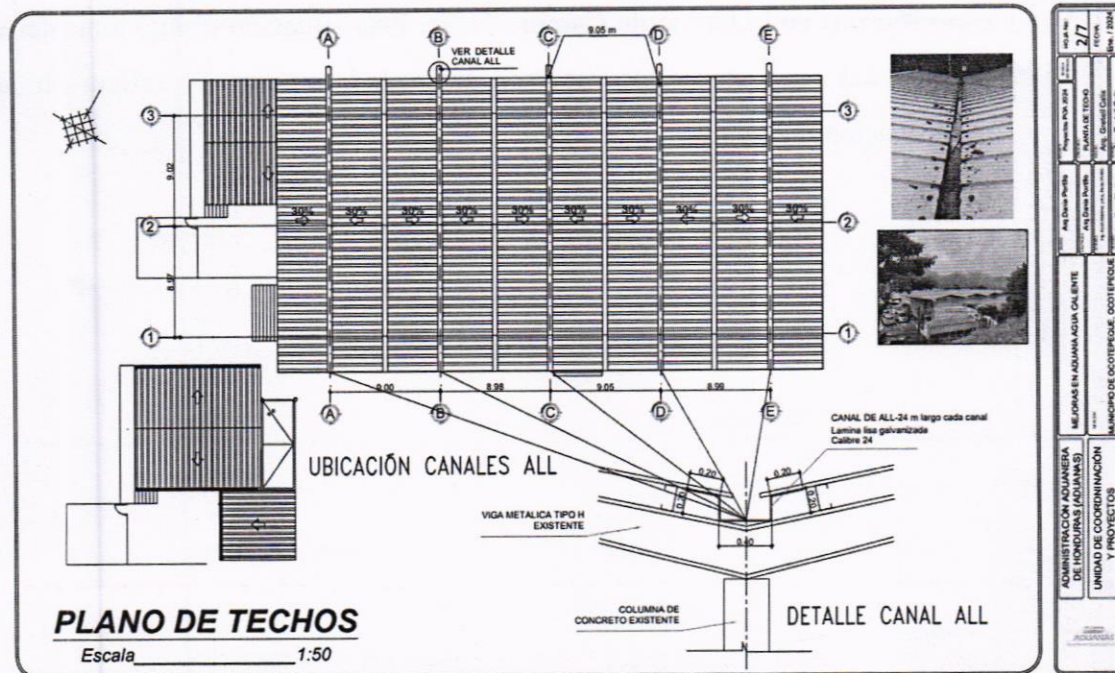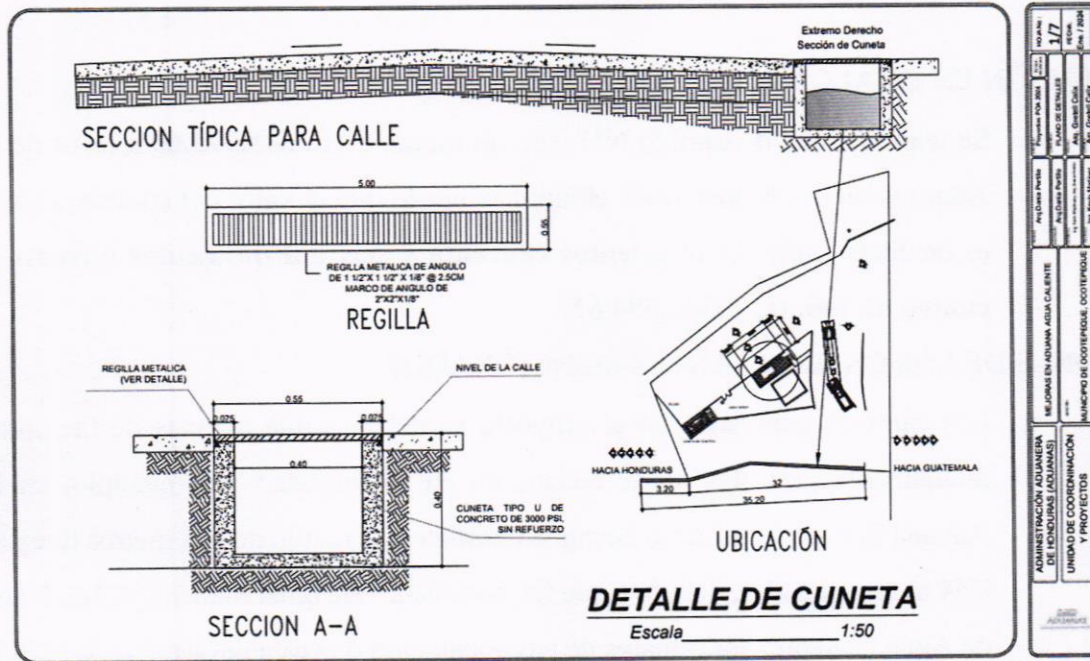

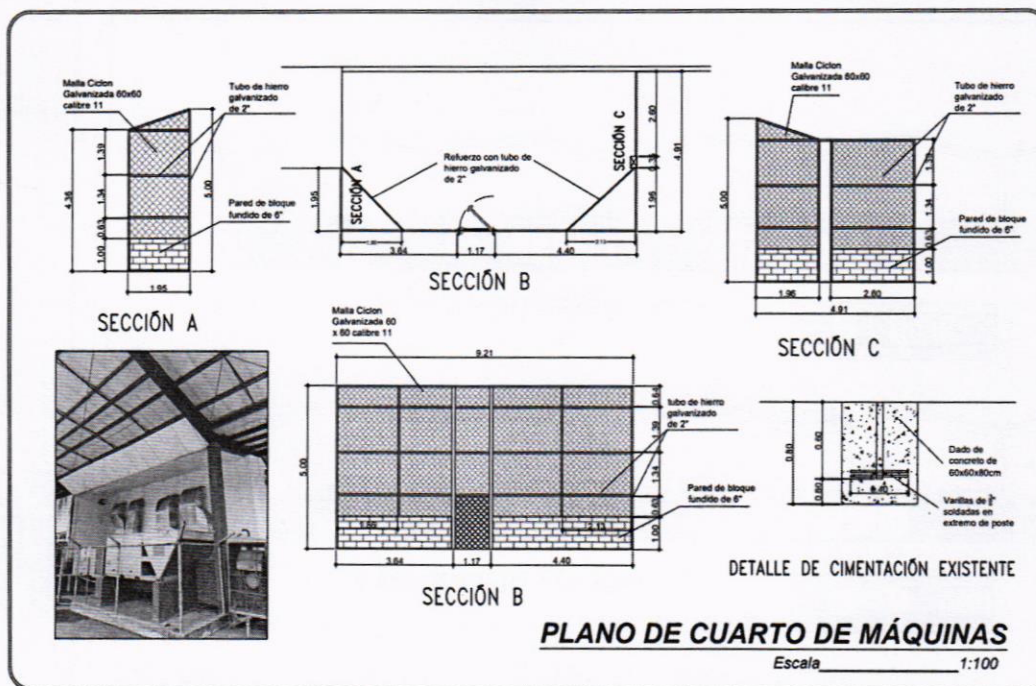


ADMINISTRACIÓN ACUAFERIA DE HONDURAS (ADH)		MUNICIPIO DE COATEQUE, COATEQUE		Mejoras en Acueducto Agua Caliente 14 de mayo del 2008 14 de mayo del 2008 14 de mayo del 2008	
UNIDAD DE COORDINACIÓN Y PROYECTOS		MUNICIPIO DE COATEQUE, COATEQUE		Mejoras en Acueducto Agua Caliente 14 de mayo del 2008 14 de mayo del 2008 14 de mayo del 2008	

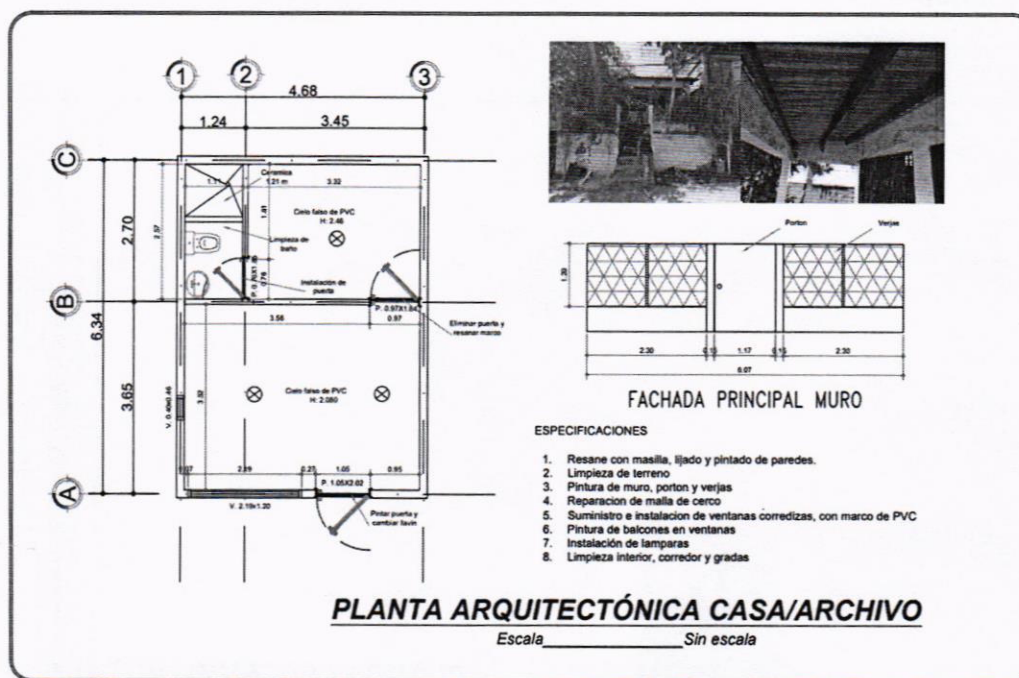[illegible]

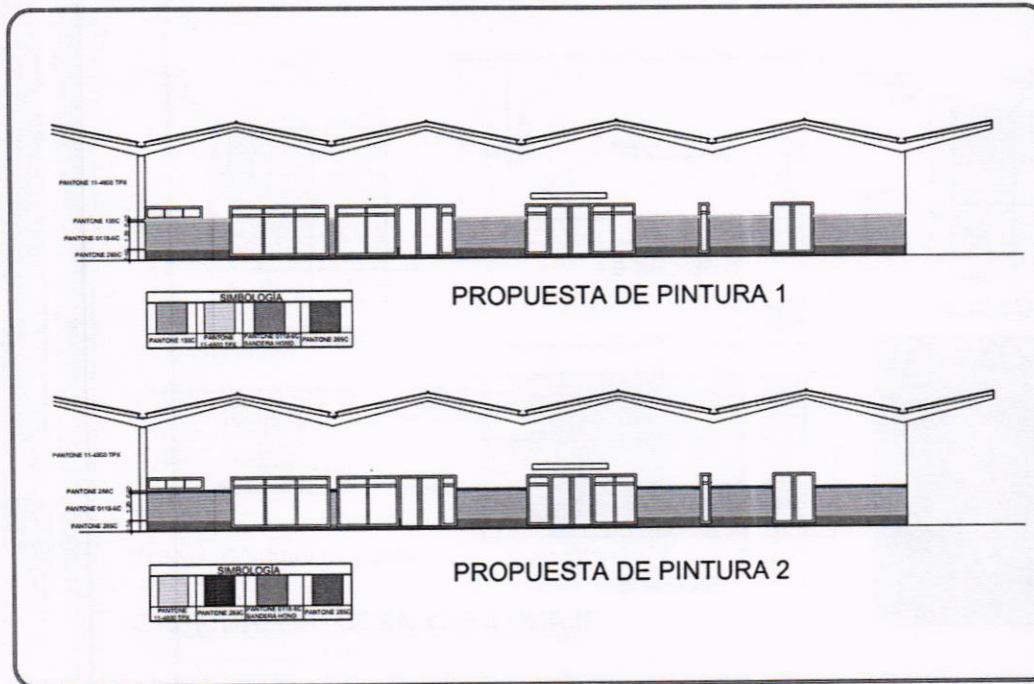

ADMINISTRACIÓN ADJUNTA EN DI HONORARIAS (ADJUNTS) UNIDAD DE COORDINACIÓN Y PROYECTOS	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Aduana el Florido

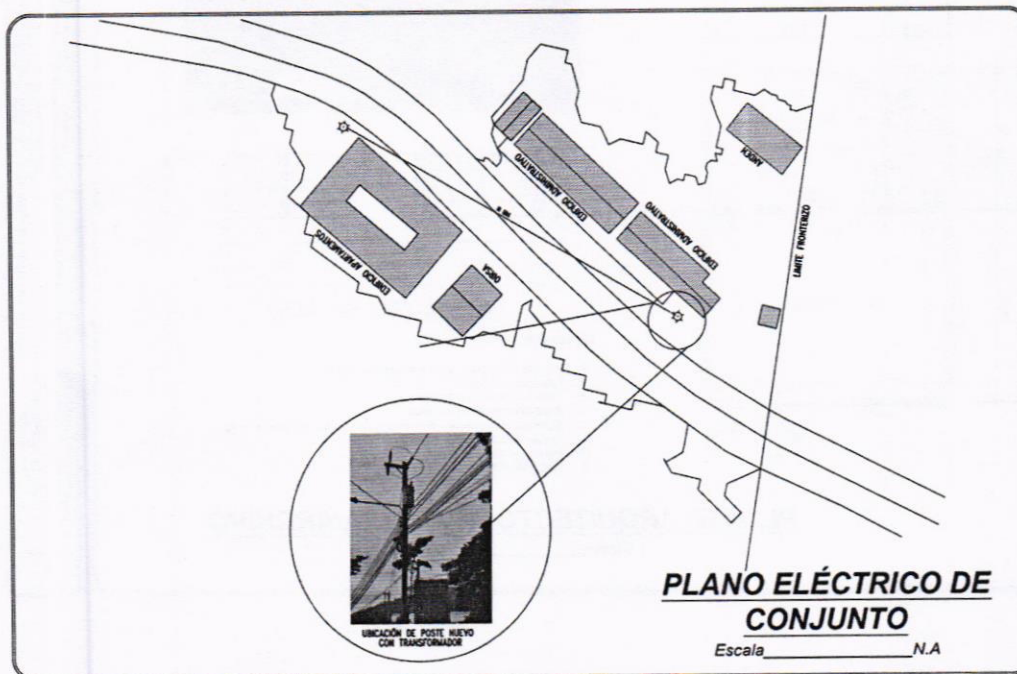[illegible]

"La presente información es de uso exclusivo, reservado y confidencial para la Administración Aduanera de Honduras, se prohíbe y sanciona su divulgación conforme al Régimen de la Carrera de los Funcionarios y Servidores de la Administración Aduanera de Honduras"


@aduanashonduras




www.aduanas.gob.hn

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 3, 13, 14 y 15, Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. 14


14

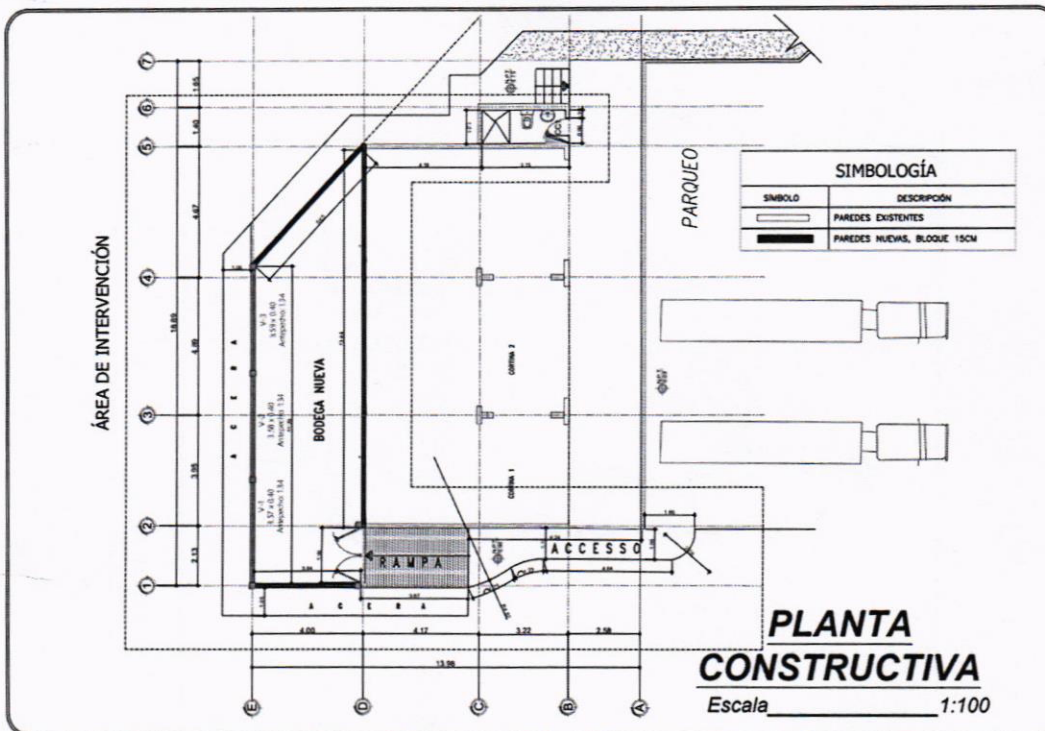


Hoja No.	5/10
Proyecto No.	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO
Ant. Deline. Proyecto	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO
Ant. Deline. Plano	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO
Ant. Deline. Sección	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO
Ant. Deline. Detalle	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO
Ant. Deline. Estructura	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO
Ant. Deline. Paisaje	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO
Ant. Deline. Iluminación	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO
Ant. Deline. Mobiliario	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO
Ant. Deline. Vegetación	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO
Ant. Deline. Otros	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO
Ant. Deline. Total	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO
Ant. Deline. Estructura	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO
Ant. Deline. Paisaje	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO
Ant. Deline. Iluminación	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO
Ant. Deline. Mobiliario	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO
Ant. Deline. Vegetación	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO
Ant. Deline. Otros	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO
Ant. Deline. Total	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO

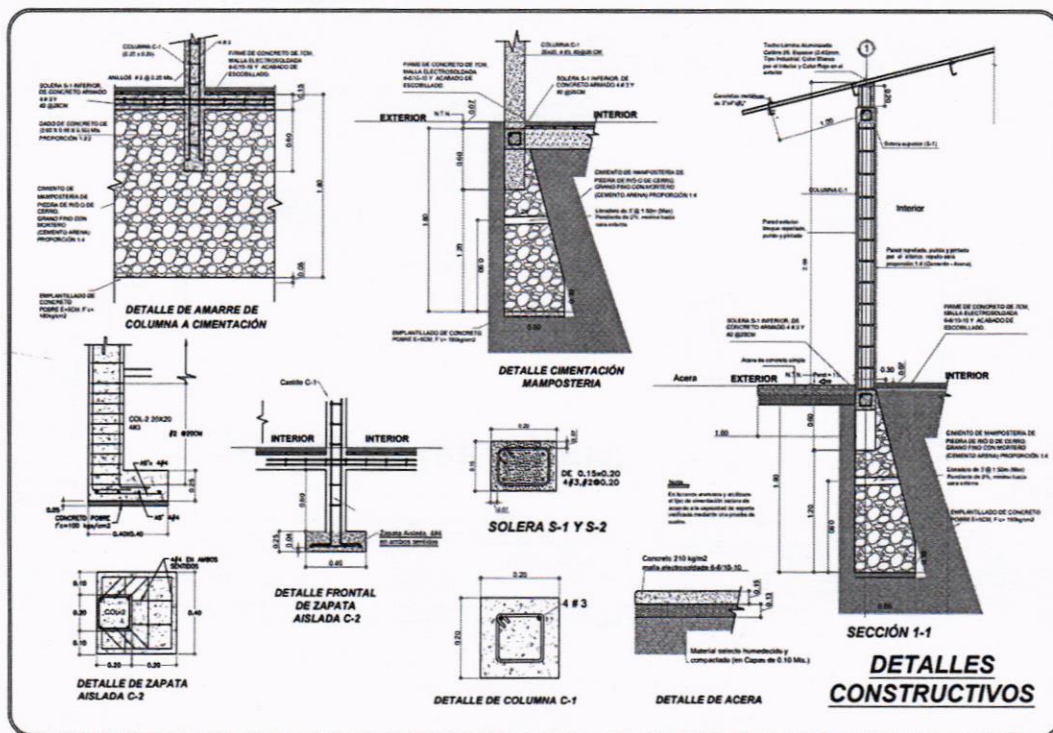

Hoja No.	8/10
Proyecto No.	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO
Ant. Deline. Proyecto	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO
Ant. Deline. Plano	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO
Ant. Deline. Sección	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO
Ant. Deline. Detalle	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO
Ant. Deline. Estructura	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO
Ant. Deline. Paisaje	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO
Ant. Deline. Iluminación	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO
Ant. Deline. Mobiliario	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO
Ant. Deline. Vegetación	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO
Ant. Deline. Otros	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO
Ant. Deline. Total	MEJORA EN ADUANAS EL FLUJO

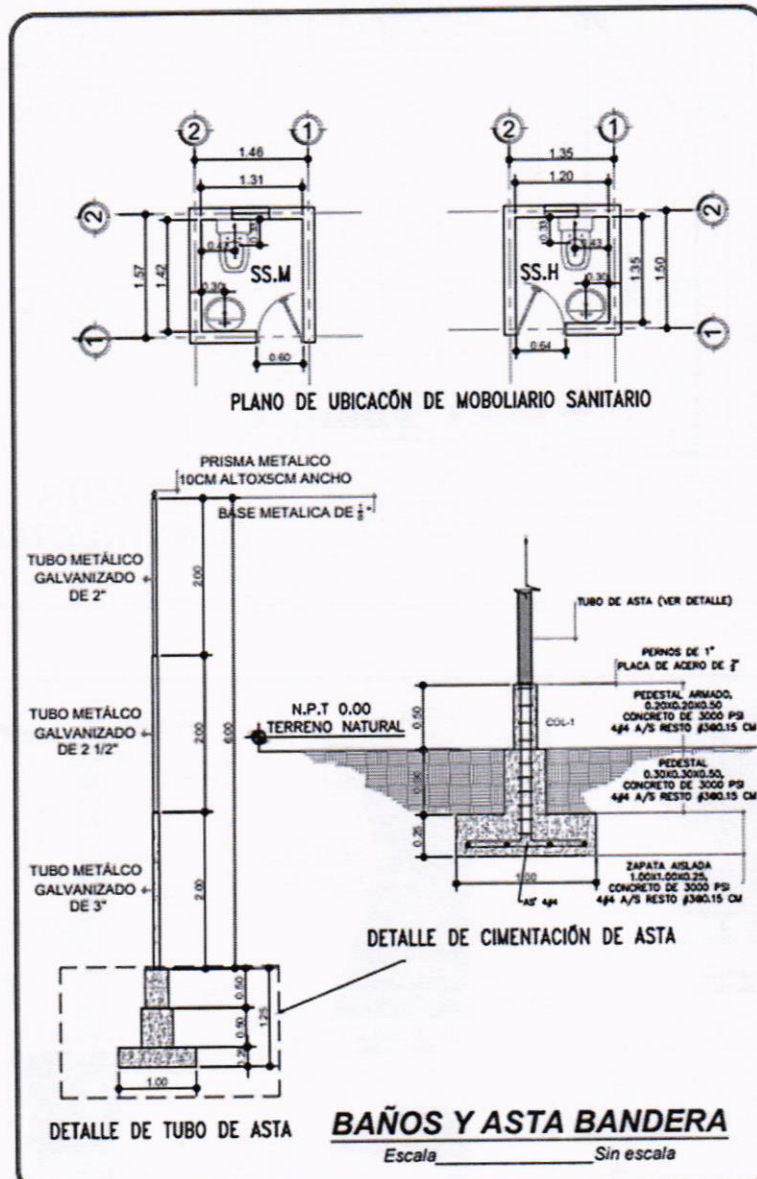


ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS (ADUANAS)	MEJORAS EN ADUANA EL POY	Arg. Carlos Pineda	Proyecto POMA 2024	Hoja No. 1/3
UNIDAD DE COORDINACIÓN Y PROYECTOS	MUNICIPIO OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE	Arg. Carlos Pineda	PLANO BAÑOS Y ASTA B.	ADUNA
		Arg. Graciela Cede	Arg. Graciela Cede	Ene / 2024

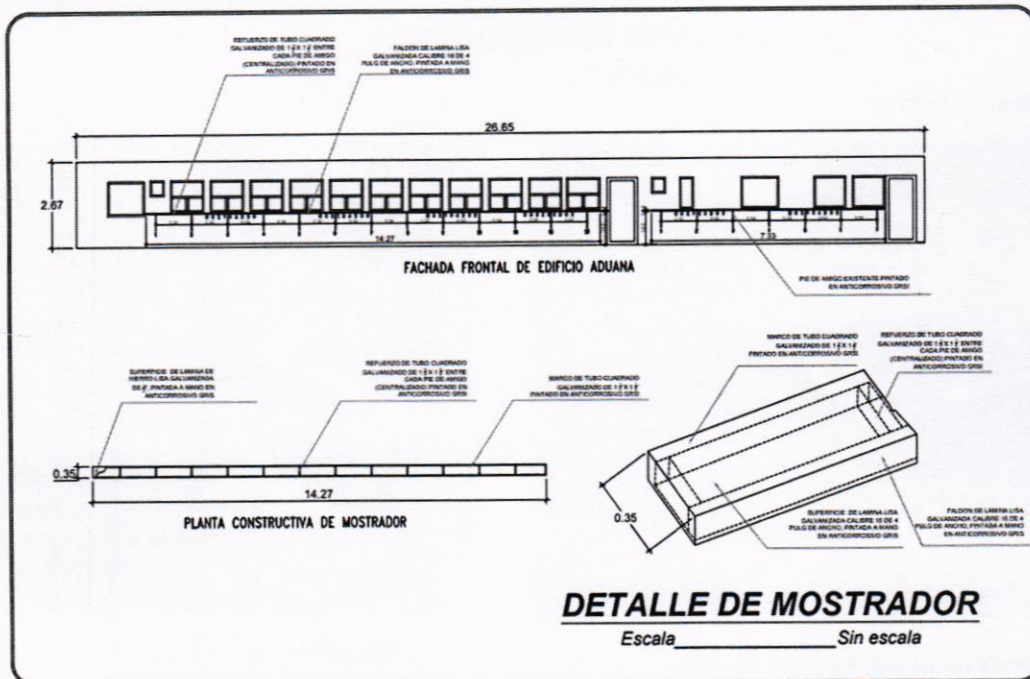
[illegible]

ANEXOS FOTOGRÁFICOS


Aduana Agua Caliente

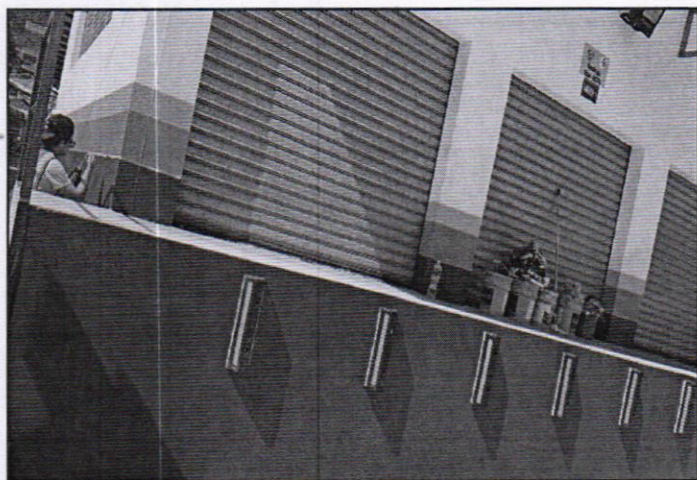

Instalación de topes de polietileno en Anden.

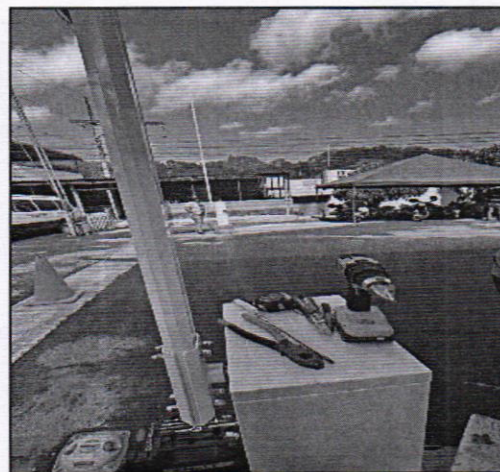

Plumas eléctricas en 4 puntos de la empresa.

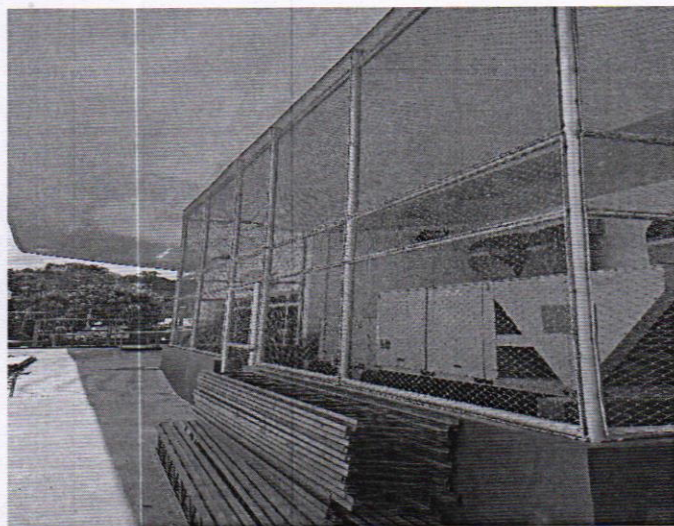

Pintura y limpieza de área de máquinas



Cielo falso en exterior de la aduana.



Rehabilitación de vivienda.



Pintura en módulos TIM.


Aduana El Florido




Fachada trasera con canal de aguas lluvias



Portón de acceso a bodega.

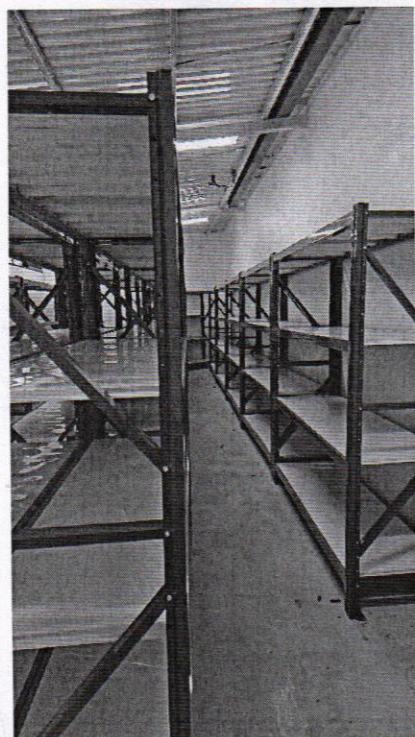

Instalación de racks en interior de bodega.

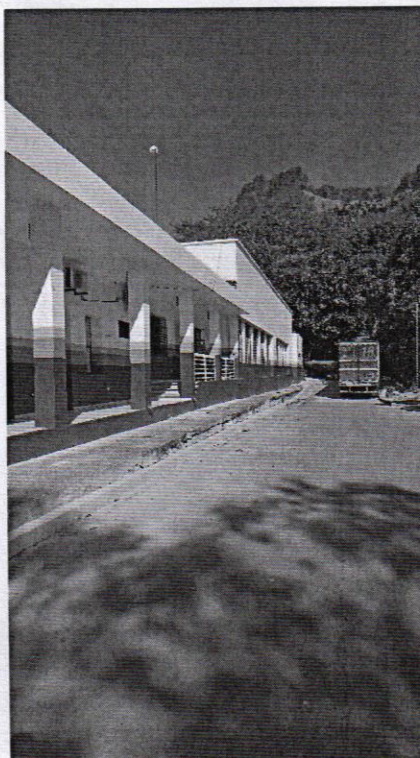


Pintura de paredes exteriores.



Cerco perimetral.


Aduana El Poy

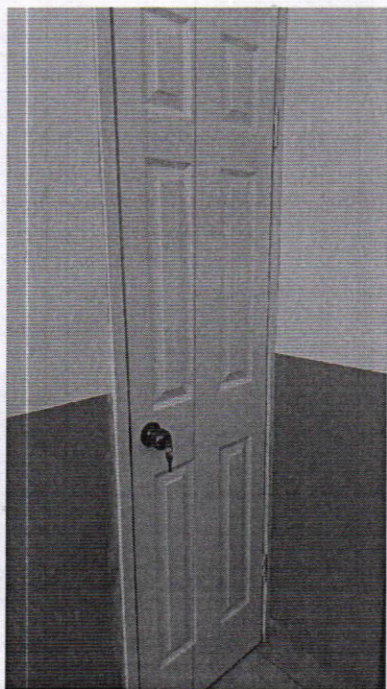

Instalación de puerta termoformada en sanitarios.



Instalación de sanitarios de hombres y mujeres.

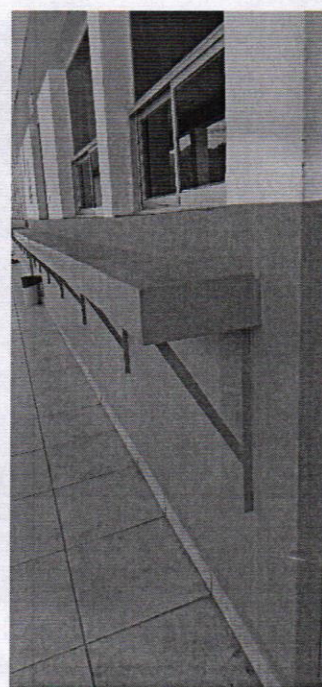

Instalación de mostrador.



Instalación de pluma metálica.



Instalación de asta de Bandera.
