


# ACTIVIDADES DICIEMBRE 2024

Vida Saludable, con Agua Segura





**Diciembre, se realizaron actividades para el funcionamiento del prestador de servicios aguas de la sierra de montecillos, desde actividades técnicas administrativas, donde se trabajo con los avances de aprobación de presupuesto, reunión de Junta Directiva, en actividades comerciales, desde atención al usuario, facturación y cobro, operación y mantenimiento.**



**Ing. Jelsy Marysol Delcid**  
**Gerente General**  
**Aguas de la Sierra de Montecillos**



## Datos estadísticos de Catastro Comercial de Aguas de la Sierra de Montecillos diciembre 2024

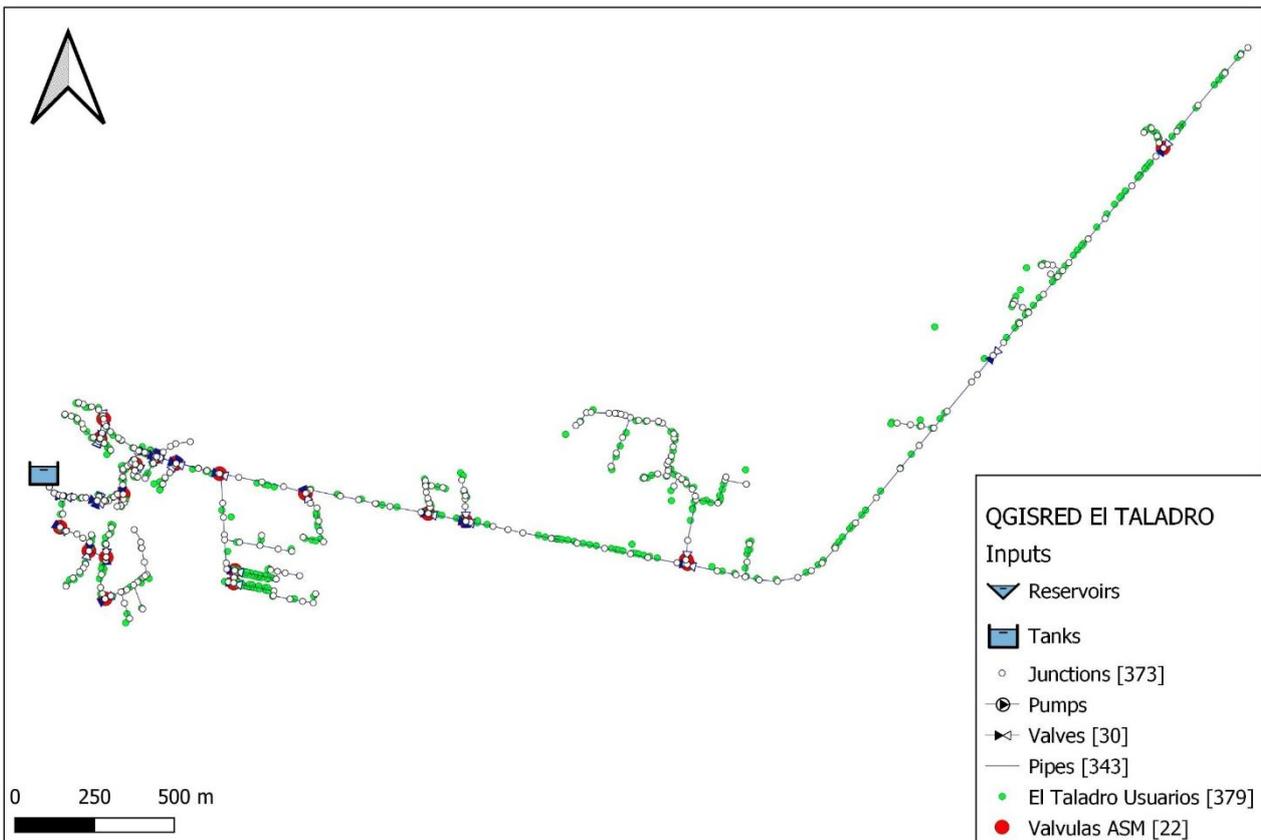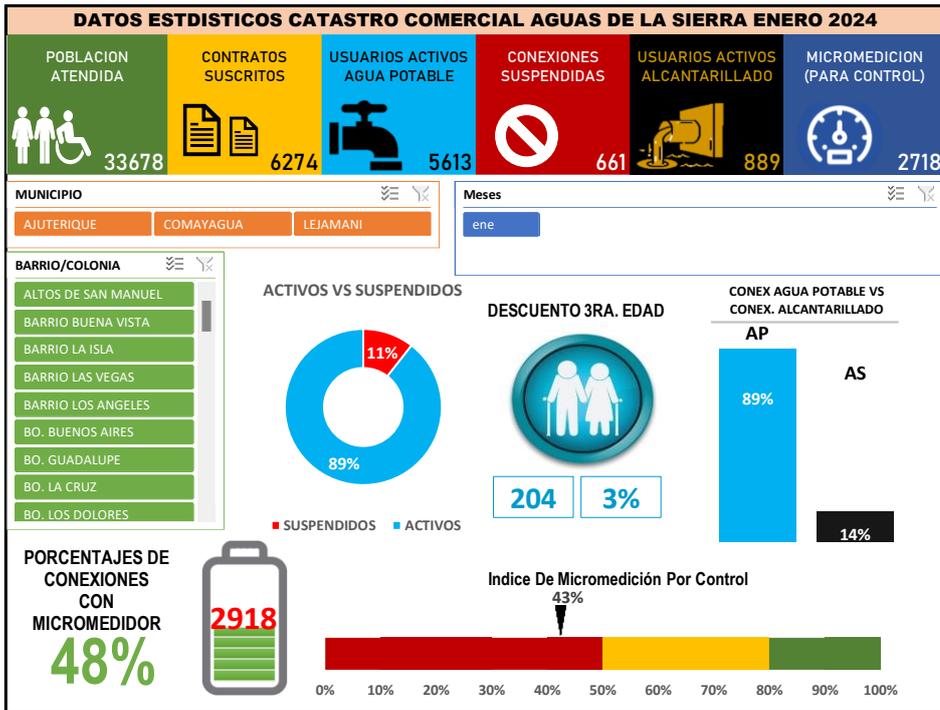

## Reunión Junta Directiva diciembre 2024





### FICHA DE ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RECURSO HUMANO	COORDINACION
Limpieza de rejillas en obra toma, Tratamiento de Agua en La Planta Potabilizadora	1/12/2024	31/12/2024	PERSONAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	GERENTE GENERAL



DESCRIPCION: Mantenimiento diario en la obra toma, haciendo limpieza de rejillas para que el agua pueda ingresar al sistema y seguir su curso hasta la Planta Potabilizadora en el Taladro.



RESULTADO; Tratamiento de agua potable en La Planta Potabilizadora en el Taladro siguiendo los estándares de calidad exigidos por la Ley Marco de agua.



**FICHA DE ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO**

ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RECURSO HUMANO	COORDINACION
Instalacion de nueva tuberia por pavimentacion en Barrio La Canechera, Ajuterique. Reparacion de fugas en Ajuterique producto de la reparacion de calles en el Municipio.	1/12/2024	31/12/2024	PERSONAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	GERENTE GENERAL



**DESCRIPCION:** Debido a la pavimentacion de la calle de la canechera en el Municipio de Ajuterique fue necesario realizar la instalacion de tuberias en ambos sentidos para evitar posibles problemas en las acometidas domiciliarias. Se excavaron un total de 170 metro.



**RESULTADO:** En el mes de diciembre se hicieron varias reparaciones de tuberias en el municipio de Ajuterique que fueron dañados producto de la reparacion de calles, se movilizó personal de Operación y Mantenimiento para poder hacer todas las reparaciones pertinentes.

FICHA DE ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RECURSO HUMANO	COORDINACION
Lectura de Macromedidores en Tanque de Ojo de Agua, y Taladro	1/12/2024	31/12/2024	PERSONAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	GERENTE GENERAL



DESCRIPCION: Diariamente se hace lectura de los 3 macromedidores instalados en las salidas del Tanque de Ojo de Agua para su analisis y digitalizacion en Oficina por parte del Jefe de Operación y Mantenimiento.



RESULTADO: En el tanque de Taladro se hace la misma actividad lectura diaria de Macromedidor instalado en este tanque.



**FICHA DE ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO**

ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RECURSO HUMANO	COORDINACION
Limpieza de tubería de aAgua Negra Municipio de Lejamani. Mejoras en obra de captacion en la Comunidad del Tule.	1/12/2024	31/12/2024	PERSONAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	GERENTE GENERAL



**DESCRIPCION:**El personal de Operación y Mantenimiento realiza los trabajos de limpieza de pozos cuando se presentan obstrucciones en los mismos.



**RESULTADO:** Se realizaron algunas mejoras en la obra en la Comunidad del Tule, Comayagua, buscando la seguridad del personal asignado a estas labores de limpieza en la Presa.

FICHA DE ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RECURSO HUMANO	COORDINACION
Reparación de tubería de Línea de Conduccion de 12" en el sector del Zapote.	1/12/2024	31/12/2024	PERSONAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	GERENTE GENERAL



DESCRIPCION: Se tuvo un daño en la tubería de HFD de 12" en La línea de Conduccion principal en el sector del Zapote, se desplazo equipo de Operación y Mantenimiento y al contratista para la realizacion de dicha actividad.



RESULTADO: Al llegar al sitio se comprobo que una roca golpeo la tubería lo que provovo que la misma se dañara , se procedio a la soldadura de la misma con un electrodo NIQUEL 99 para poder reestablecer el servicio.



FICHA DE ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RECURSO HUMANO	COORDINACION
Limpieza de Desarenador en Obra Toma	1/12/2024	31/12/2024	PERSONAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	GERENTE GENERAL



**DESCRIPCION:** Debido a las fuertes precipitaciones en la obra toma el desarenador se asolvo por lo que fue necesario programar la limpieza del mismo.



**RESULTADO:** Se contrato personal para realizar la limpieza del desarenador y poder enviar agua a las Comunidades el mismo día.



**FICHA DE ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO**

ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RECURSO HUMANO	COORDINACION
Realizacion de pegues nuevos	1/12/2024	31/12/2024	PERSONAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	GERENTE GENERAL



**DESCRIPCION:** Diariamente se reciben solicitudes para la aprobacion de pegues nuevos en las redes del Proyecto, el Departamento de Operación y Mantenimiento realiza las inspecciones y se decide si se aprueba o no el pegue, luego se pasa al Departamento Comercial.



**RESULTADO:** Una vez que es aprobado y se tiene la orden de conexión se procede a la conexión del usuario al sistema para luego ser facturado .

FICHA DE ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RECURSO HUMANO	COORDINACION
Finalizacion de trabajos en La Colonia Canada, Comayagua	1/12/2024	31/12/2024	PERSONAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	GERENTE GENERAL



**DESCRIPCION:**En este sector de La Colonia Canada se esta construyendo un pavimento por lo que Alcaldia Municipal de Comayagua, pobladores de La Colonia y El Prestador realizaron el cambio de toda la tuberia de las calles a pavimentar, esto con el objetivo de que no hayan conexiones que crucen las callesy que puedan generar posibles problemas en el futuro.



**RESULTADO:**Durante el trabajo se hizo la instalacion de tuberia de 1", ademas de las conexiones domiciliarias y las respectivas cajas y sus medidores por cada usuario.
