


**Municipio de Lepaera  
Departamento de Lempira**

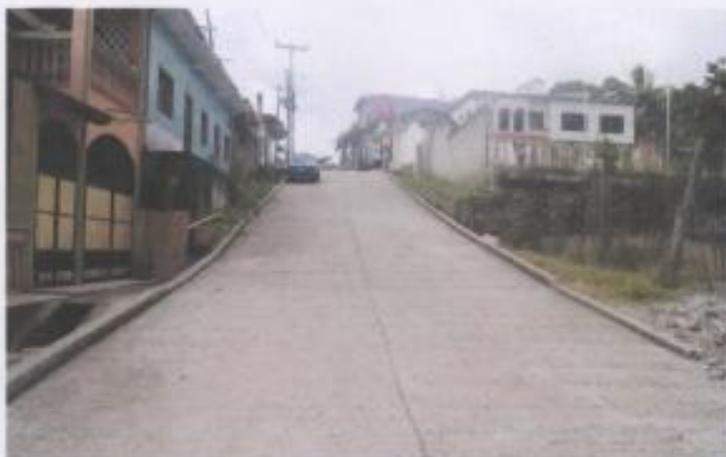

**NOMBRE DEL PROYECTO:**  
Pavimentación de Calles en Casco Urbano del Municipio de  
Lepaera en el Dpto. de Lempira

**UBICACIÓN DEL PROYECTO:**  
Barrio El Centro y Barrio San Juan del Municipio de Lepaera,  
Lempira.

**ORGANIZACIÓN PROPONENTE Y RESPONSABLE:**  
La Municipalidad de Lepaera, Lempira  
Email: [lepaera2006@yahoo.com](mailto:lepaera2006@yahoo.com)



Lepaera Lempira

Mayo de 2016.

## Ficha de Proyecto

### 1. Identificación del Proyecto:

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Pavimentación de Calles en Casco Urbano de Lepaera. Lepaera.

#### 1.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal

Edgar Antonio Murillo Cruz

#### 2.- Sector o Sub sector

Sector: Infraestructura Social( componente Vial)

#### 3.- Nombre del Proyecto

**Pavimentación de Calles del Casco Urbano del Municipio de Lepaera**

#### 4.- Ubicación del Proyecto.

El municipio de Lepaera se encuentra ubicado al norte del departamento de Lempira en el occidente de Honduras C. A. El proyecto se pretende realizar en 3 sectores del municipio de Lepaera las cuales son las siguientes:

Barrió Centro, Barrio San Juan y salida a Tejeras los cuales se encuentran ubicados en el casco Urbano del municipio de Lepaera.

#### 5.- Propósito

Mejorar las condiciones del municipio a través de la pavimentación de **2,605.79** mtrs de calle del casco urbano mismas que comunican el Barrio el centro con el Barrio San Juan, barrio El Calvario y Barrio Las Delicias del municipio Lepaera, dpto. De Lempira.

#### 6.- Descripción del Proyecto.

Este proyecto consiste en la construcción de **2,605.79** metros de pavimento desarrollado de la siguiente manera : construcción de **476.35** metros cuadrados de pavimentación, construcción de 94 metros lineales de bordillo ,construcción de 7.74 metros cúbicos de cabezal en alcantarilla ubicada frente a casa de la Sra. Delmy Pineda, Relleno de **100mtrs** cuadrados de **0.30** centímetros de grosor compactados de material selecto para nivelación de calle, Construcción de 415,80 metros cuadrados en la pavimentación, construcción de 154 metros lineales de bordillo ,iniciando frente a

casa del sr. Metodio Cortez y concluyendo y concluyendo en casa del sr. Concepción Portillo ,construcción de 326.25 metros cuadrados de pavimentación ,construcción de 104.40 de metros lineales de bordillo desde la casa de la señora Carmen Portillo y concluye frente a casa del sr. Concepción Portillo construcción de 270.90 metros cuadrados de pavimentación ,construcción de 86 metros lineales de bordillo desde la jefatura de policía a casa dela sra .Karla Morales. Dicha calle que servirá para mejorar la comunicación de barrio centro con barrio San Juan, Barrio El Calvario y Barrio Las Delicias este proyecto se necesita porque en invierno se dificulta el tránsito y el acceso de estos cuatro Barrios, con esta obra los pobladores podrán tener un mejor comunicación y acceso en el municipio los barrios más beneficiados son el Barrio El Centro y Barrio San Juan quedando pendiente los otros dos barrios que son Barrio Las Delicias y Barrio El Calvario este último ya cuenta con un buen porcentaje de calles pavimentadas en este año 2016. Y ya se tiene BV de la Corporación Municipal para darle seguimiento en el 2017 a este tipo de proyecto.

En la actualidad urge la pavimentación de estas carreteras para poder restablecer la comunicación - con la ejecución de este proyecto se estarán beneficiando unos **1,000 familias directamente y 16,000.00 habitantes** que indirectamente usan diariamente estas vías de comunicación para el traslado de sus bienes de consumo y los productos que ellos producen. La modalidad para la reparación de este proyecto será con mano de obra comunitaria y así beneficiar a **20** Familias por un espacio de 4 meses o según sea la duración del proyecto en mención., ya que cada ruta tiene su duración respectiva eso depende la cantidad de metros a ejecutar y así mismo se realizan los pagos

## **7. Elaboración del Proyecto**

### **Alcance del Proyecto.**

La mayoría de municipios de lempira enfrentan problemas de infraestructura de las calles municipales debido a las fuertes tormentas, y los barrios y colonias son los que sufren las consecuencias debido a que no puede haber comunicación, el invierno copioso causo severo daños a red vial de la zona urbana el cual destruye dicha calles.

Con esta modalidad **Pavimentación de calles** buscamos mejorar la comunicación del Barrio el centro Barrio, Barrio el Calvario, barrio Las

Delicias y el barrio San Juan del municipio de Lepaera lempira el cual incorporaremos a la población a las actividades de mejora y rehabilitación de sus vías de acceso además generar empleo temporal para aquellas familias que se encuentran en rango de pobreza.

Para iniciar el proceso de llenado de perfil de Proyecto, que conlleva seguidamente a la ejecución de una serie de acciones como ser Recolección de información para llevar a cabo el presente proyecto, una vez recibida la notificación de aprobación del proyecto se procede a informar a la población de Lepaera como ser: beneficiarios directos para que comiencen a organizarse y a la vez realizar las obras preliminares. Pero el ejecutor directo es la Municipalidad que es quien contrata el personal especializado para este tipo de proyecto.

### **8. Impacto Ambiental.**

El presente proyecto por ser un proyecto de infraestructura por parte de la municipalidad, a través del dpto. De catastro y de la unidad de Medio ambiente se hace una inspección de la zona donde se ejecutara el proyecto de pavimentación para verificar que no sean destruida las áreas verdes esto para que no sea dañado el medio ambiente y a la vez para verificar que la pavimentación no se haga en una zona de riesgo sea donde hayan viviendas que puedan quedar a la deriva o donde ya está el proyecto de alcantarillado. Ya que si no existe un alcantarillado Sanitario no es posible ejecutar el proyecto.

### **Impacto en terreno y asentamientos.**

Para la ejecución del presente ya se cuenta con la supervisión directa del Ing. de la Mancomunidad Puca en donde se define claramente que no hay problemas con alguna propiedad ya que la ruta a pavimentar son calles establecidas y bien definidas por el dpto. De catastro. Y a la vez ya se cuenta con los permisos respectivos, en caso de que fuese necesario.

### **9. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros**

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara,  
Jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

**Correo Electrónico:** [lara.gestion2016@yahoo.com](mailto:lara.gestion2016@yahoo.com)

**Sede:** **Municipalidad de Lepaera**, Lempira

**Ing. Francisco Lara.**

Gerente de la Mancomunidad Puca

Cel. 9451-4754

### **Fuentes de Financiamiento.**

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: FHIS, SOPTRAVI Municipalidad, Fondo Vial y FONDO CAFETERO NACIONAL.

De las Fuentes financieras antes mencionada hasta el momento solo el principal financiador es FHIS y la Municipalidad, ya sea con fondos propios o fondos provenientes de las transferencias ya que cuenta con su propia maquinaria, a la vez brinda su aporte El Fondo Cafetero, el comité de desarrollo Comunal **CODECO** y beneficiarios apoyan con el cuneteo y con la alimentación de las personas que operan la maquinaria a utilizar.

### **10. Presupuesto del Proyecto.**

El presente proyecto fue presentado a la corporación municipal

El proyecto fue aprobado en reunión de Corporación Municipal con la presencia de representantes de la comisión Ciudadana de Transparencia, que siempre están presentes en cualquier reunión que se realiza en la municipalidad.

### **Estado del Proyecto actual.**

En este momento el proyecto ya está ejecutado en un **99.96% en barrio Centro, en un 97.86% en Barrio San Juan, Barrio El Calvario en un 99.38%** . Se espera su continuidad para los que están en menos de un para llegar al porcentaje máximo de un 100%. Es necesario mencionar que falta pavimentar varias calles pero por

falta del sistema de Alcantarillado por el momento no se realizó conforme a lo aprobado.

### **Costo de finalización Proyectado**

Costo Total: **Lps.443,983.29**

Costo Asignado: Barrio San Juan: **Lps. : Lps.443,983.29**

Transferido: Lps.443,983.29

Vigente: Lps.443,983.29

Devengado;Lps.434,464.00

Ejecutado: L. **434,464.00**

**Pendiente a ejecutar: Lps.9,519.29**

Costo Asignado: Barrio El Centro: **Lps. 768,068.17**

Costo Total: **Lps.63,066.50**

**Transferencia Positiva: Lps. 520,000.00**

**Devengado: Lps.767,739.00**

**Ejecutado: Lps.767,739.00**

**Pendiente a Ejecutar: Lps.329.17**

**Costo Asignado Barrio Calvario: Lps. 600,000.00 según Transferencia Positiva**

**Vigente: Lps. 600,000.00**

**Devengado: 596,285.00**

**Pagado: 596,285.00**

**Pendiente a Ejecutar: Lps. 3,715.00**

Fecha de finalización proyectada

26 de Mayo de 2016

### **11. Ejecución Del Proyecto**

### **12. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de 4 meses , por ser un proyecto que no es muy complicado realizarse en el proyecto y por los trabajos previos a ejecutarse y a la vez para cumplir con los requisitos solicitador por la **Municipalidad**. Podemos mencionar que en las rutas ejecutadas fueron pocos los detalles restantes, es decir que

el proyecto está acorde a lo planteado en el contrato mpal, lógicamente existen variaciones pero no de mucha relevancia, el proyecto en mención quedo a ser concluido en el primer semestre del **2016**. Y se logró y lógicamente el presupuesto ya estaba aprobado. Pero no se puede entregar el informe a la fecha porque los materiales se pagan en las ferreterías al crédito y hasta que es pagado el último fondo se puede dar un reporte claro de lo invertido.

### **Variación en el costo total del Proyecto.**

Las variaciones han existido como en todo proyecto, en cuanto a lo solicitado con lo ejecutado, en este tipo de proyecto la diferencia no es muy grande ya que se tenía que ejecutar **Lps. 1,812,051.46** según lo asignado y se ejecutó **:Lps.1,798,488.00** que dando pendiente de ejecutar **Lps: 13,563.46** este es de acuerdo al avance el cuales muy significativo. Pero los pagos se seguirán dando hasta llegar al aporte acordado en reunión de Corporación Municipal. Ya que es un proyecto que continúa. Y el costo es muy elevado.

#### **Monto Solicitado:**

Total del proyecto Pavimentación de Calles de Lepaera:

Total: Lps.1,812,051.46

Transferencias: Lps. 1,812,051.46

Ejecutado: Lps.1,798,488.00

#### **Fecha de finalización proyectada**

**26 de Mayo de 2016**

### **13. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.**

Existieron algunas variaciones en cuanto a la parte técnica, como ser en grosor de rodillos pero fueron resueltas de manera satisfactoria entre el maestro de obra e ing. a cargo del proyecto, en cuanto a la duración hubo variaciones ya que la exigencia era que se debía terminar unos tramos en un periodo de un mes ,otros en cuatro meses pero si se cumplió en 2 tramos por ser de menor magnitud, podemos decir que si se cumplió en periodo todas las actividades relacionadas

con el proyecto, algo que afecto un poco fueron las condiciones climáticas de la zona.

Al final se le dio un avance significativo al proyecto lo que es de mucha satisfacción para la municipalidad como para los habitantes del casco urbano, y es necesario mencionar que la municipalidad cumplió con los pagos hasta la etapa en que el proyecto se encuentra actualmente. , porque aunque bien es cierto de la lentitud en los pagos estos no se retrasan mucho porque de ello depende la continuidad del proyecto.

### **Razones de los cambios antes mencionados.**

Como mencione anteriormente hubieron algunos cambios pero que no se consideran muy relevante como ser: El Clima que es un factor que no se puede evitar que afecto en el sentido que al haber lluvia se detienen los proyectos., pero fue en un tiempo corto. Ya que no se puede posponer mucho tiempo.

## **ANEXOS**

### **-- Fotografías Proyecto Pavimentación de Calles en Casco Urbano. Lepaera**

#### **Barrió El Calvario**























