

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE CIUDAD MUJER



INFORME SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA y PROYECTO



MONITOREO Y EVALUACIÓN




Tabla de Contenido

1. OBJETIVO:.....	2
2. EVALUACIÓN FÍSICA Y TÉCNICA DEL PROGRAMA.....	2
3. CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY	6
4. PRODUCTOS DEL PROGRAMA Y PROYECTO	8
5. PROBLEMAS ENCONTRADOS DURANTE EL PERÍODO	9
A. PROGRAMA.....	9
B. PROYECTO	9
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	9
A. CONCLUSIONES	9
B. RECOMENDACIONES	10
C. ANEXOS	10



INFORME DE EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

2

1. OBJETIVO:

El presente informe tiene como objetivo presentar la situación actual del Programa Ciudad Mujer, (el Programa) y del Proyecto Ciudad Mujer 3771 BL-HO, (el Proyecto), éste último a ejecutarse con Fondos del BID. El Programa se encuentra adscrito a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y es coordinado por la Dirección Nacional (DNPPCM). El Convenio de Financiamiento del Proyecto fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 26 de enero del 2017, el día 17 de mayo de 2017 se extendió la elegibilidad y actualmente se encuentra en la etapa de gestión del primer desembolso. En tal sentido, cumpliendo con lo establecido en el Manual Operativo, este documento recoge las acciones realizadas por el Programa y proyecto, como parte del seguimiento y monitoreo de los indicadores, actividades y productos, para garantizar una gestión transparente de los recursos que permitan lograr los objetivos del Programa, velando por un adecuado sistema de control interno que implica el cumplimiento de los procedimientos, tiempos y formas establecidas. El período a evaluar es del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017.

2. EVALUACIÓN FÍSICA Y TÉCNICA DEL PROGRAMA

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2017 la DNPPCM ha enfocado sus esfuerzos en:

Físicos y Técnicos del Programa:

- ✓ Se realizan supervisiones y monitoreos al Centro Ciudad Mujer Kennedy a fin de que tanto la operación técnica como la administrativa se realice conforme lo estipulado en el Manual Operativo del Programa y Protocolos estipulados para cada módulo.
- ✓ Se realizaron visitas de seguimiento al proyecto de construcción del CCM-Choloma, para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los documentos del proyecto que aseguren la calidad de la construcción. El avance de la obra en este proyecto es del 95%.
- ✓ Se realizó la socialización Centro Ciudad Choloma – 23 de agosto del 2017.
- ✓ Se han realizado reuniones periódicas del Comité Operativo de Proyecto (SEDENA/EMC-Programa Ciudad Mujer) para dar seguimiento y aprobar las actividades relacionadas a los proyectos CCM-Kennedy y Choloma.
- ✓ Se realizaron reuniones periódicas con Equipo País para informar sobre avances del Programa y determinar acciones para su fortalecimiento.

- ✓ Se realizó la reunión del Consejo Directivo Nacional para informar sobre avances del Programa, solicitar la aprobación del Plan Estratégico del Programa Ciudad Mujer, aprobación del POA – 2018 que incluye las instituciones prestadoras de servicios, también se discutieron acciones para su fortalecimiento.
- ✓ En proceso permanente la implementación de la estrategia de comunicación del Programa.
- ✓ Se realizaron gestiones con la Secretaría de Defensa Nacional para reforzar la seguridad del CCM-Kennedy.
- ✓ Finalizada la evaluación del desempeño del personal del CCM-K, contemplado en el Manual Operativo del Programa.
- ✓ Ingresado el POA – 2018 del Programa Ciudad Mujer al Sistema SIAFI – GES.
- ✓ Se realizaron gestiones de definición de esquemas para la adquisición del CCM Móvil para posicionar el Programa en las áreas aledañas donde se construirá el CCM tanto Choloma como SPS, actividad que se está llevando a cabo a través de SEDENA.
- ✓ Socialización con toda la población beneficiada, incluyendo los entes sector público, privado, el Centro Ciudad Mujer Choloma.
- ✓ Se realizó la capacitación a las funcionarias del Centro Ciudad Mujer Choloma, realizados ejercicios de atención a beneficiarias.

Físicos y Técnicos del Proyecto BID:

- ✓ Se realizó gira con una misión del BID, encabezada por la sectorialista a cargo del proyecto, para conocer las acciones que las municipalidades de San Pedro Sula, Cortés y Choloma están realizando en beneficio de las mujeres, así como para identificar el apoyo logístico y técnico que podrían proporcionar mientras se construyen los Centros Ciudad Mujer contemplados en el alcance de ese proyecto (San Pedro Sula, La Ceiba y posiblemente Choluteca), específicamente para la conceptualización y puesta en marcha del modelo Ciudad Mujer Móvil, con el objetivo de extender la capacidad de acción del programa Ciudad Mujer en Honduras mediante la entrega de servicios de calidad con nulo o limitado acceso a los servicios esenciales para el empoderamiento de las mujeres.
- ✓ Ingreso del POA – 2018 del Proyecto Ciudad Mujer al Sistema SIAFI – GES.
- ✓ Se realizó la socialización del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula
- ✓ Obtenido el primer desembolso del proyecto en julio del 2017.
- ✓ Se realizó la presentación de avances del proyecto para la revisión de cartera del Proyecto con la SEFIN y representantes del BID.
- ✓ El 25 de agosto se realizó la apertura de ofertas para la construcción del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula, se recibieron 9 ofertas de 32 que retiraron documentos.



- ✓ Se reestructuraron los instrumentos de monitoreo y seguimiento del Proyecto, de acuerdo a las últimas recomendaciones del BID.
- ✓ Se realizaron reuniones periódicas del Comité Operativo del Proyecto (INVEST-H y Programa Ciudad Mujer) para dar seguimiento y aprobar las actividades relacionadas al mismo.
- ✓ Se tiene identificado un terreno en Siguatepeque y otro en Choluteca donde se construirá el CCM que podría sustituir al de Juticalpa. Se está recopilando toda la información referente a obtención de servicios básicos, tenencia del terreno, y revisando aspectos ambientales a fin de no tener problemas con aprobación del BID.
- ✓ Estructuración e implementación, con apoyo de asistencia técnica del BID, la estrategia de Cuidado, Autocuidado y Seguridad (CAS) de las funcionarias del CCM-Kennedy.
- ✓ En proceso de contratación la construcción del CCM San Pedro Sula.
- ✓ Contratada la Supervisión para la construcción del CCM SPS
- ✓ Publicada inicio de proceso de la construcción del CCM La Ceiba
- ✓ Estructurados y revisados con el BID los siguientes TdRs:
 1. Estudio de Demanda y Oferta Productiva-Laboral y Desarrollo de una metodología para el establecimiento de alianzas de Ciudad Mujer con el Sector Privado en los territorios de los Centros Ciudad Mujer.
 2. Diseño de un sistema de seguimiento a mujeres usuarias del MAE insertadas laboralmente o cuyos negocios reciben asistencia técnica/empresarial.

Adquisiciones del Programa:

- ✓ En proceso la adquisición de mobiliario de oficina y médico del Centro Ciudad Mujer Choloma.
- ✓ Se realizaron los procesos para llevar a cabo la socialización de CCM Choloma y SPS, en los cuales se requirió: bifolios, refrigerios.
- ✓ Finalizado proceso de adquisición de carnet para personal que trabaja en los CCM Kennedy.
- ✓ Finalizado proceso la adquisición camisas para el personal que trabajará en el CCM Choloma.
- ✓ Finalizado la adquisición del equipo médico para el CCM Choloma.
- ✓ En proceso la adquisición de Mobiliario Infantil para el CCM Choloma.
- ✓ En proceso la adquisición de electrodomésticos para el CCM Choloma.
- ✓ Finalizado proceso de adquisición de equipo de cómputo para el CCM Choloma
- ✓ Se realizan procesos para inauguración del CCM Choloma: adquisición de toldos, escenario, audio, rotulación, sillas.
- ✓ En proceso la adquisición de materiales promocionales para evento de inauguración.

Adquisiciones del Proyecto:

- ✓ Se recibieron 9 ofertas de 30 documentos bases entregados de la construcción del CCM San Pedro Sula.
- ✓ Se envió a No Objeción del BID el proceso de supervisión para el CCM Ceiba.
- ✓ Adjudicado el proceso de contratación del Gerente de Programas y Proyectos para el Programa Ciudad Mujer.
- ✓ En proceso de adquisición la contratación el Especialista de Adquisiciones para el Programa Ciudad Mujer.
- ✓ Se realizan los procesos de adquisición de:
 1. Consultoría sobre estudios de Demanda y Oferta productiva-laboral y desarrollo de metodología para el establecimiento de alianzas de Ciudad Mujer con el sector privado en los territorios de Ciudad Mujer.

5

Legales del Programa y Proyecto:

- ✓ En proceso trámite licencia sanitaria del Módulo de Salud CCM-K, dado que falta el cumplimiento de dos requerimientos: contratación del transporte de los desechos bio-infecciosos.
- ✓ En trámite solicitud de autorización en radiología de Mi Ambiente para utilizar el mamógrafo.
- ✓ En trámite el licenciamiento ambiental y sanitaria del CCM Choloma.
- ✓ En elaboración la escritura del terreno de Choloma.
- ✓ En proceso de finalización el Reglamento para elección el cargo de miembro representante de Organizaciones No Gubernamentales, ante el Consejo Directivo del Programa Presidencial de Ciudad Mujer.
- ✓ Se elaboraron contratos de suministros de bienes que fueron adjudicados durante está trimestre.
- ✓ Se elaboraron los protocolos de farmacia y mamografía los cuales tienen pendiente el visto bueno de la Secretaría de Salud.
- ✓ Seguimiento en coordinación con INVEST-H de las gestiones con la Alcaldía Municipal de La Ceiba y la Dirección de Bienes del Estado para la formalización de la resolución de esa Corporación Municipal de donar el terreno para construir el CCM-La Ceiba que adquirirá de parte de la Standard Fruit Company mediante crédito de tasas e impuestos municipales.




3. CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY

Como primer Centro Ciudad Mujer en Honduras ha sido un gran reto el inicio de las operaciones en consideración a las dificultades que implica un proyecto innovador e integrado por 16 instituciones del Estado. Cabe destacar la aceptación y respuesta positiva que se ha tenido por parte de las usuarias que han sido beneficiadas, en cuatro meses de operación del centro (abril a septiembre) se atendieron un total de 28,537 mujeres, de las cuales 10,316 fueron nuevos ingresos (36%) del total y 18,221 (64%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 219 visitas.

Durante este período se realizaron las siguientes actividades:

1. Realizado recorrido a la Delegación del BID para mostrar el funcionamiento del CCM Kennedy
2. Firmado convenio de cooperación y coordinación con la empresa telefónica TIGO – Honduras, se recibió donación de 25 tablets para el Módulo de Atención a las Adolescentes para ser utilizados por el CCM Kennedy.
3. Firmado convenio con el Fondo de Población de Naciones Unidas en Honduras (UNFPA), para modernizar con insumos tecnológicos para el Módulo de Atención a las Adolescentes, con el fin de mejorar la toma de decisiones.
4. Clausura del taller ABC de Género y de DDHH - Derechos Humanos de las Mujeres el cual fue un proyecto piloto de formación dirigido a alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes.




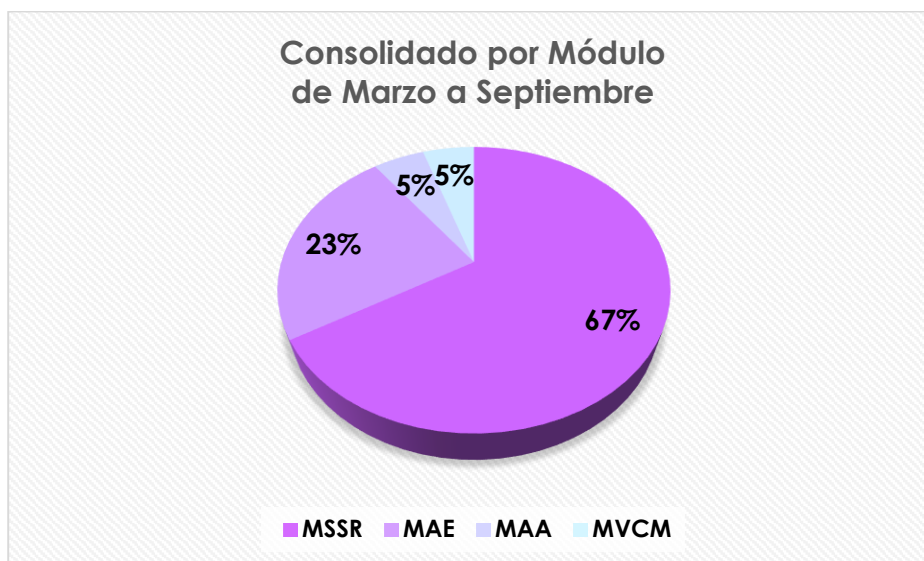


EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA

La ejecución presupuestaria de la Dirección Nacional del Programa del 1 de enero al 30 de Septiembre del 2017 asciende a L. 5,637,590.04 que representa el 54.21% del presupuesto aprobado. Es importante indicar que los gastos presupuestados en personal representan el 55.54% del total del presupuesto y la diferencia corresponde al gasto operativo. Los gastos del proyecto por parte de la DNCM ascendieron a Lps. 812,652.02 que corresponden a pagos de los consultores, dado que recién se inician los procesos de consultoría puntual.

**Dirección Nacional de Ciudad Mujer
Presupuestado Vrs. ejecutado
Miles de Lempiras
al 30 de Septiembre del 2017**

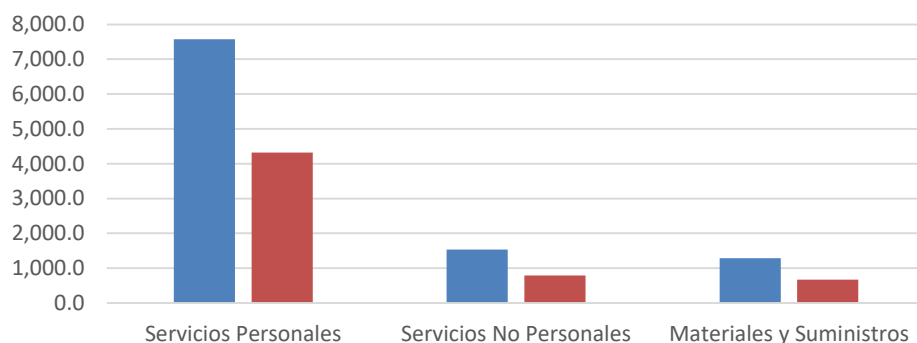

**Dirección Nacional de Ciudad Mujer
% de ejecución a Septiembre 2017**

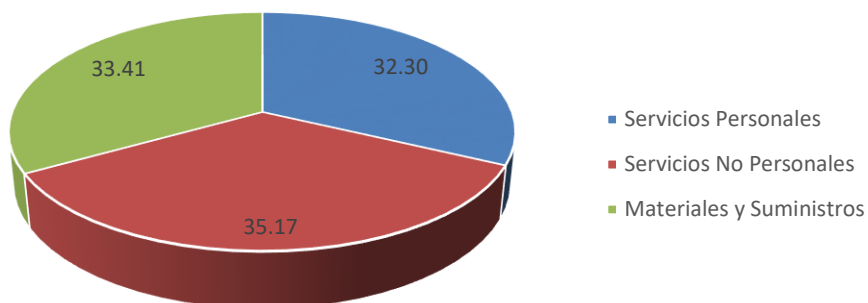

4. PRODUCTOS DEL PROGRAMA Y PROYECTO

- ✓ Elaborados y concluidos 11 procesos de licitación para adquisición de servicios.
- ✓ Realizado la socialización para los Centros Ciudad Mujer Choloma
- ✓ Incorporado el POA – Presupuesto 2018 del Programa y Proyecto al sistema SIAFI – GES
- ✓ Realizada la capacitación a las funcionarias que laboraran en el CCM Choloma
- ✓ Contratación la supervisión para la construcción CCM Ceiba
- ✓ Publicado el inicio de proceso de construcción de obras para el CCM La Ceiba

5. PROBLEMAS ENCONTRADOS DURANTE EL PERÍODO

A. PROGRAMA

- ✓ El Presupuesto 2018 asignado al Programa Ciudad Mujer en lo que respecta al gasto operativo es menor en un 80.3% con respecto al obtenido en el 2017, lo que pone en precario el funcionamiento del Programa, ya que aparte de tener gastos de servicios básicos, se necesitan gastos de capacitación a las funcionarias que operaran en CCM y de traslado a los diferentes lugares en los cuales se tiene en operación los CCM.
- ✓ Las asignaciones presupuestarias aprobadas para las prestadoras de servicios para el 2018, están muy por debajo de lo solicitado sobre todo para SEDIS la parte administrativa y SESAL (módulos de Salud Sexual y Reproductiva).

B. PROYECTO

- ✓ Se identifican retrasos en la construcción de los CCM SPS y La Ceiba que disparan los indicadores y programaciones trazadas inicialmente.
- ✓ Se tenían identificados dos sitios para la construcción de los CCM: Siguatepeque y Choluteca, a la fecha Siguatepeque se ha descartado porque dentro del terreno se encuentra un centro experimental forestal, por lo cual no es viable según políticas BID; con el terreno de Choluteca, se están haciendo investigaciones sobre los servicios básicos, principalmente obtención de agua, ya que este departamento carece de este líquido, y si identifican afluentes hídricos para hacer los estudios correspondiente y asegurar la calidad del vital líquido.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. CONCLUSIONES

1. Durante este período se han ejecutado L. 5,637,590.04 en la DNCM que representa el 54.2% del presupuesto total asignado.
2. Durante este período se obtuvo el primer desembolso del Proyecto CM, Financiado con fondos de préstamo BID que corresponde a la DNCM y a INVEST – H
3. Realizadas todas las actividades planificadas para este trimestre.

B. RECOMENDACIONES

1. Se está en la búsqueda de otro terreno para sustituir el terreno del CCM de Juticalpa que cumpla con los requisitos sanitarios establecidos por BID.

10

C. ANEXOS

1. Fotografías del período.



Anexo No. 1

FOTOMEMORIA DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017

PROGRAMA CIUDAD MUJER

MONITOREO PROYECTOS



Módulo de Salud Sexual y Reproductiva de Centro Ciudad Mujer Kennedy

CCM Choloma



Módulo SS y R Cirugía Menor



Módulo Cirugía y Colposcopia



Módulo Atención Infantil



Socialización del CCM San Pedro Sula



Socialización del CCM SPS llevada a cabo en la Escuela Froylan Turcios el 22 de agosto a las 2pm

Socialización del CCM Choloma



Socialización del CCM Choloma en el Centro Comunal de la Colonia López Arellano a las 2pm

Recepción de ofertas para construcción del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula



Recepción de ofertas para construcción del CCM
SPS en la Colonia Municipal el 25 de agosto a las
10am

Firma de Convenios



Firma convenios de cooperación con TIGO-
Honduras y Fondo de Población de Naciones Unidas
- UNFPA para el fortalecimiento de las actividades
que realizan el CCM Kennedy

Avance en la construcción del Centro Ciudad Mujer Choloma



Se tiene un avance del 95% en la construcción del CCM Choloma
