

MEMO

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

MPLG0004-02-2018

Para: Lic. Dilia Martínez
Jefe de relaciones Publicas

De: Ing. Juan José Alvarado
Jefe de Planificación

Fecha: 02/02/2018



ASUNTO: REMISION INFORME DE LOGROS 2014-2017 Y MEMORIA INSTITUCIONAL CCIVS 2018

Por medio de la presente estoy Remitiéndole la Memoria Institucional 2017 y el Informe de Logros de la CCIVS 2014-2018 para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

CC: DIRECCIÓN EJECUTIVA
CC: ARCHIVO.



COMISIÓN PARA EL CONTROL DE
INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
INSEP

MEMORIA INSTITUCIONAL CCIVS 2017

Diciembre
2017

MISIÓN

Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las acciones necesarias con participación del sector público y privado, para lograr el desarrollo integral del Valle de Sula y las cuencas de los Ríos Ulúa y Chamelecón dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

VISIÓN

Fortalecer el desarrollo integral del Valle de Sula a través del manejo adecuado de las cuencas Ulúa y Chamelecón, contando con un equipo multidisciplinario de alto nivel técnico y administrativo, capaz de propiciar procesos efectivos para el desarrollo integral y sostenible de la región .

PROYECTOS FINALIZADOS 2017



Obras de Protección margen derecha rio Chamelecón, Sector Colonia km la 71 II etapa.

Monto de Contrato L.1,879,860.00



Proyecto de Reconstrucción de Vado sobre el rio el Coco, Aldea El Coco, El Progreso, Yoro.

Monto de Contrato L. 2,600,413.57



Retiro de Bordo y Obras de Protección margen Derecha del Rio Chamelecón, Aldea San Juan Viejo-Copen Viejo

Monto de Contrato: L. 4,815,366.91



Construcción de caja puente, Sector Finca La Siete, Aldea La Sarrosa.

Monto de Contrato: L. 1355,428.07



Sobreelevacion de bordo margen derecha del rio Blanco, Sector Campo Olivo.

Monto de Contrato: L. 1106,754.01



Mejoramiento Canales de Drenaje Agricola, Sector San Jose de la Tarrera-Finca 4.

Monto de Contrato: L. 2228,772.13



“Mejoramiento de drenaje
Agrícola, Sector Los Catrachos”

Monto de Contrato: L. 1,964,000.00



Obras de Protección en márgenes de
Río Choloma, aguas abajo de puente
Ferroviario II Etapa.

Monto de Contrato: L. 26,214,000.00



Construcción de escollera de piedra margen izquierda del río Uluá, aguas arriba del Vertedor Nola, Sector Nola.

Monto de Contrato: L. 4,629,860.32



Construcción de espigones de gavión margen izquierda del río Uluá, aguas abajo del Vertedor Nola, Sector Ticamaya Remolino.

Monto de Contrato: L. 3,090,940.00



Obras de Protección en margen izquierda del río Pelo, Colonia Sitraterco.

Monto de Contrato: L. 3,172,263.00



Construcción de espigones de gavión margen derecha de río Ulua, Sector Finca 11.

Monto de Contrato: L. 2373,950.00



Obras de Protección, Quebrada Las Golondrinas, Col. Juan Ramon Morales, Flor de Mayo, Las Golondrinas, El Progreso, Yoro.

Monto de Contrato: L. 2, 159, 625.23



“Construcción de Muro de Gaviones Margen Izquierda del Rio Plátano, Sector la Ica”

Monto de Contrato: L. 1,941,094.99



Reconstrucción de alcantarilla triple de 48" de diámetro, margen derecha del Río Chamelecón, col Nueva Chamelecón.

Monto de Contrato: L. 1, 561, 232.67



Reconstrucción de bordo margen izquierda de rio Chamelecón ,colonia Las Morales , sector Chamelecón , San Pedro Sula, Cortes

Monto de Contrato: L. 3,225,306.04



Construcción de Escollera de Piedra Margen Derecha del Rio Guaymon, Sector Cooperativa la Conquista.

Monto de Contrato: L. 1,668,257.49



Construcción de alcantarilla de paso doble de 60" pulgadas de diámetro en tramo carretero, sector Tapón de Los Oros-La Puntilla.

Monto de Contrato: L. 1,280,941.22







Canalización Río Potrero, sector San Luis Zacatales, municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés.

Monto de Contrato: L. 1,965,692.42



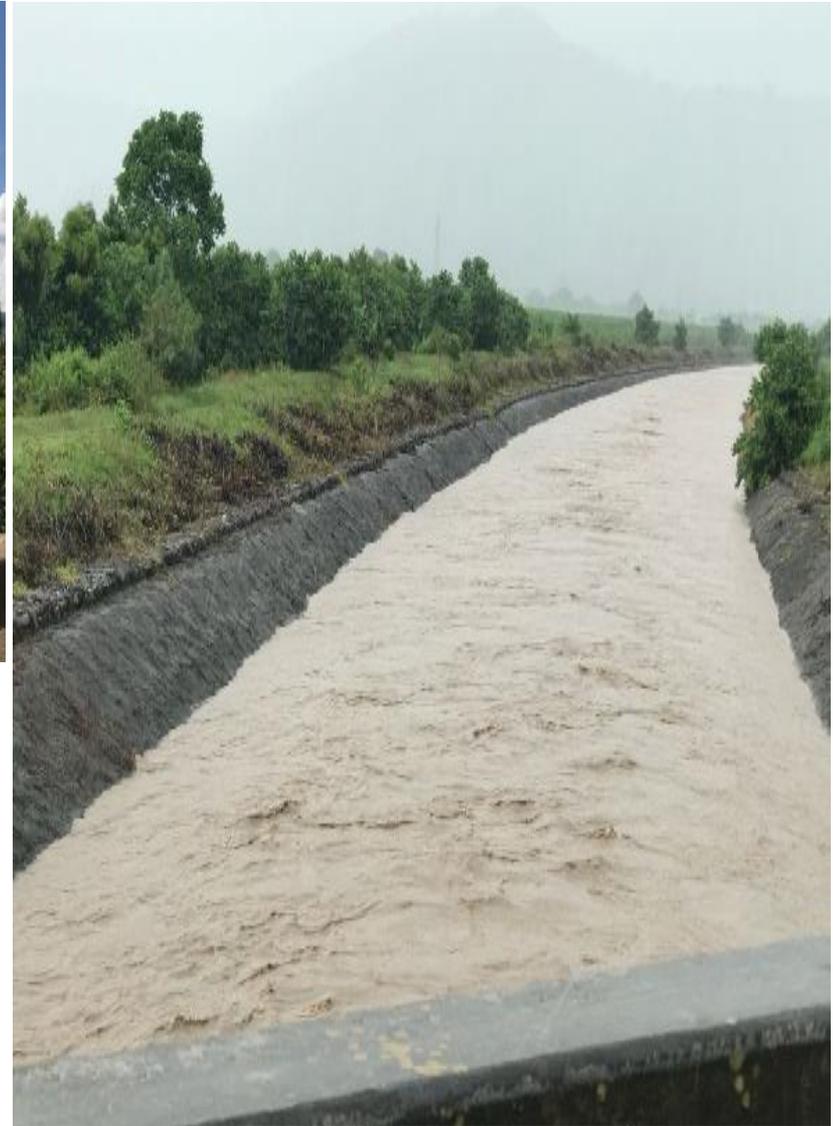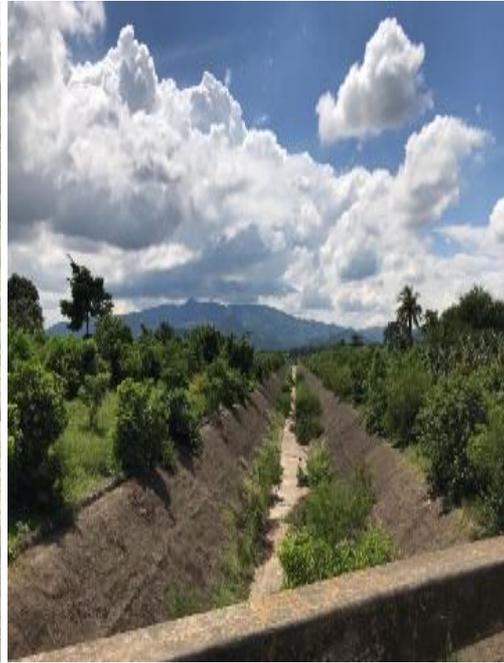

Remocion de la Capa vegetal y control de arbusto en seccion hidraulica del Canal Chotepe .

Monto de Contrato: L. 813,528.32

PROYECTOS EN EJECUCION – ARRASTRE 2018



Construcción de espigones de gavión margen derecha del río Ulúa, sector Solutepe II Etapa.

Monto de Contrato: L. 2264,787.99



Obras de protección en M.I. del río Ulúa, sector Omonita, San Manuel.

Monto de Contrato: L. 8,448,500.00



Obras de protección, Quebrada
Comunidad Guaymon.

Monto de Contrato: L. 2,194,850.96





Construcción de bordo margen izquierda del Río Choloma, sector Barrio Concepción.

Monto de Contrato: L. 3,098,813.97



Construcción de Canales de drenaje pluvial Bo. El Tanque II Etapa.

Monto de Contrato: L. 383,780.39



Construcción de Canales de drenaje pluvial Costa Rica

Monto de Contrato: L. 4,132,040.45



Construcción de vado en Quebrada La Ruidosa, Sector El Filón.

Monto de Contrato: L. 3,645,422.67



Construcción de Caja Puente Aldea La Twana, Sector Quebrada Seca

Monto de Contrato: L. 1,768,939.86



Sobreelevación de bordo, margen izquierda del Rio Ulúa, Sector Tapón Los Oro.

Monto de Contrato: L. 1,311,423.71



Reconstrucción de bordo, margen derecha del Rio Omoa.

Monto de Contrato: L. 2,113,038.03

PROYECTOS CANCELADOS 2017

LISTADO DE PROYECTOS CANCELADOS

1

Reconstrucción de bordo margen derecha del Río Blanco, sector Campo Olivo

PROYECTOS DE EMERGENCIA
FRENTE FRIO # 1
AÑO 2017



Cierre y reconstrucción de boquete margen derecha del canal Maya, sector Colonia El Buen Samaritano, La Lima, Cortes.

Monto: Lps. 1,089,756.02



Mejoramiento de sitio para reubicación de damnificados, sector Colonia Vida Mejor, La Lima, Cortes.

Monto: Lps. 226,572.80





Cierre de boquetes, reconstrucción y sobreelevación de bordo margen derecha del Río Chamelecón, sector Guarumas II, Villanueva, Cortes.

Monto: Lps. 3,413,190.78





Cierre de boquete margen izquierda del Canal Marimba, sector Aldea Liberación Campesina, San Manuel, Cortes.

Monto: Lps. 3,322,703.24



Cierre provisional de boquete margen izquierda del Canal Maya, sector Colonias Pineda N°1 y N°2, San Manuel, Cortes.

Monto: Lps. 651,650.34



Cierre y reconstrucción de boquete margen izquierda del Río Chamelecón sector El Zapote, La Lima, Cortes.

Monto: Lps. 445,489.35



Cierre de boquetes margen izquierda y rectificación de cauce en Acequia Chotepe, sector Colonia Jerusalén - San Cristobal - Valle Escondido, La Lima, Cortes.

Monto: Lps. 1,690,478.75



Reconstrucción de Table Estacado, en
margen derecha del Rio Chamelecón, La
Lima, Cortes.

Monto: Lps. 4,202,001.49

RESUMEN DE INVERSION PROYECTOS CCIVS 2017

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA – INSEP
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION AÑO 2017



No	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIZACION		MONTO CONTRATO	ESTATUS
		DEPTO.	MUNICIPIO		
I CONSTRUCCION CANALIZACIONES					
1	Mejoramiento canales de drenaje agrícola, sector San José de La Tarrera, Finca 4.	Yoro	El Progreso	1,262,023.66	Finalizado
	Supervisión			36,447.32	
2	Mejoramiento drenaje agrícola Sector Los Catrachos	Yoro	El Negrito	2,067,642.97	Finalizado
	Supervisión			-	
3	Canalización Río Potrero sector San Luis Zacatales.	Cortés	Santa Cruz de Yojoa	2,278,500.78	Finalizado
	Supervisión			104,115.00	
4	Construcción de canales de drenaje pluvial, Barrio El Tanque II Etapa	Cortés	Pimienta	1,720,000.00	Arrastre 2018
	Supervisión			70,000.00	
5	Remoción de la capa vegetal y control de arbustos en sección hidráulica del Canal Chotepe	Cortés	San Pedro Sula	2,000,000.00	Finalizado
	Supervisión			80,000.00	
6	Construcción de canales de drenaje pluvial, Col. Costa Rica	Cortés	Omoa	4,600,000.00	Arrastre 2018
	Supervisión			180,000.00	
SUB TOTAL CONSTRUCCION CANALIZACIONES CONTRATADO				13,928,167.41	
SUB TOTAL SUPERVISION CANALIZACIONES CONTRATADO				470,562.32	
TOTAL CANALIZACIONES				14,398,729.73	
II CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE CONTROL					
7	Obras de protección en márgenes de Río Choloma, aguas abajo de Puente Ferroviario II Etapa.	Cortés	Choloma	21,332,175.64	Finalizado
	Supervisión			911,941.00	
8	Construcción de espigones de gavión margen izquierda de Río Ulúa, aguas abajo de bocatomá de vertedor Nola.	Cortés	Puerto Cortés.	2,337,226.00	Finalizado
	Supervisión			179,285.00	
9	Construcción de escollera de piedra margen izquierda del río Ulúa, aguas arriba del vertedor Nola; sector Nola	Cortés	Puerto Cortés.	826,605.35	Finalizado
	Supervisión			34,990.00	
10	Obras de protección margen izquierda del Río Pelo, sector Colonia Sitraterco.	Yoro	El Progreso	3,172,263.00	Finalizado
	Supervisión			82,508.00	
11	Espigones de gavión margen derecha del Río Ulúa, sector Finca 11.	Yoro	El Progreso	369,850.00	Finalizado
	Supervisión			80,030.00	
12	Obras de protección en Quebrada Las Golondrinas, Colonias Juan Ramón Morales, Flor de Mayo y Las Golondrinas.	Yoro	El Progreso	864,298.43	Finalizado
	Supervisión			30,090.80	
13	Construcción de Muro de gavión margen izquierda del río platano, sector Aldea La ICA	Atlántida	Tela	1,341,094.99	Finalizado
	Supervisión			65,666.66	
14	Obras de protección margen derecha Río Chameleón, sector Km 71, Segunda etapa.	Cortés	Villanueva	1,879,860.00	Finalizado
	Supervisión			66,935.00	
15	Construcción de Espigones de gavión margen derecha del Río Ulúa sector Solutepe, II Etapa	Yoro	El Progreso	2,264,787.99	Arrastre 2018
	Supervisión			92,935.00	
16	Construcción de Escollera de piedra margen derecha del río Guaymon, sector Cooperativa La Conquista	Yoro	El Negrito	1,668,257.49	Finalizado
	Supervisión			73,175.00	
17	Obras de protección en margen izquierda del Río Ulúa, sector Omonita.	Cortés	San Manuel	8,448,500.00	Arrastre 2018
	Supervisión			153,905.00	
18	Obras de protección quebrada comunidad Guaymon.	Yoro	El Negrito	2,194,850.96	Arrastre 2018
	Supervisión			105,000.00	
SUB TOTAL CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE CONTROL CONTRATADO				46,699,569.85	
SUB TOTAL SUPERVISION ESTRUCTURAS DE CONTROL CONTRATADO				1,876,461.46	
TOTAL ESTRUCTURAS DE CONTROL				48,576,031.31	

No	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIZACION		MONTO CONTRATO	ESTATUS
		DEPTO.	MUNICIPIO		
III CONSTRUCCION ALCANTARILLAS					
19	Reconstrucción de vado sobre Río Coco, Aldea El Coco.	Yoro	El Progreso	2,738,895.88	Finalizado
	Supervisión			135,058.00	
20	Construcción de caja puente, sector Finca La Siete, Aldea La Sarrosa.	Yoro	El Progreso	877,104.55	Finalizado
	Supervisión			61,800.00	
21	Reconstrucción de alcantarilla triple de 48" de diámetro, margen derecha del Río Chameleón, col Nueva Chameleón.	Cortés	Villanueva	1,513,105.36	Finalizado
	Supervisión			102,900.00	
22	Construcción de alcantarilla de paso doble de 60 pulgadas de diámetro en tramo carretero Tapon de Los Oro- La Puntilla.	Cortés	Puerto Cortés	1,280,941.22	Finalizado
	Supervisión			101,500.00	
23	Construcción de Vado en quebrada La Ruidosa, sector El Filón	Yoro	El Negrito	4,455,000.00	Arrastre 2018
	Supervisión			180,000.00	
24	Construcción de Caja Puente Aldea La Twana, sector Quebrada seca	Cortés	Choloma	1,800,000.00	Arrastre 2018
	Supervisión			70,000.00	
SUB - TOTAL CONSTRUCCION ALCANTARILLAS CONTRATADO				12,665,047.01	
SUB - TOTAL SUPERVISION ALCANTARILLAS CONTRATADO				651,258.00	
TOTAL ALCANTARILLAS				13,316,305.01	
IV CONSTRUCCION BORDOS					
25	Retiro y sobreelevación de bordo margen derecha del Río Chameleón, San Juan Viejo - Copen Viejo.	Cortés	La Lima	5,737,242.38	Finalizado
	Supervisión			194,650.00	
26	Sobre elevación de bordo margen derecha de Río Blanco, sector Campo Olivo.	Cortés	Santa Cruz de Yojoa	282,553.22	Finalizado
	Supervisión			53,500.00	
27	Retiro de bordo y Obras de protección margen izquierda del río Chameleón Col. Las Morales, sector Chameleón.	Cortés	Villanueva	3,495,306.04	Finalizado
	Supervisión			87,735.00	
28	Reconstrucción de bordo margen derecha del Río Blanco, sector Campo Olivo	Cortés	Santa Cruz de Yojoa	1,900,000.00	Canelado
	Supervisión			75,000.00	
29	Sobre elevación de bordo margen izquierda del Río Ulúa, sector Tapón de Los Oro.	Cortés	Puerto Cortés	1,800,000.00	Arrastre 2018
	Supervisión			60,000.00	
30	Reconstrucción de bordo margen derecha del río Omoa	Cortés	Omoa	3,593,137.39	Arrastre 2018
	Supervisión			112,000.00	
31	Construcción de bordo margen izquierda del Río Choloma, sector Barrio Concepción.	Cortés	Choloma	3,098,813.97	Arrastre 2018
	Supervisión			200,000.00	
SUB - TOTAL CONSTRUCCION BORDOS CONTRATADO				19,907,053.00	
SUB - TOTAL SUPERVISION BORDOS CONTRATADO				782,885.00	
TOTAL BORDOS				20,689,938.00	
TOTAL DE INVERSION CONTRATADA AÑO 2017					
				96,981,004.05	
REGULARIZACION DE FONDOS OBRAR PRIORITARIAS				1,133,839.00	
GRAN TOTAL FONDOS DE INVERSION 2017				98,114,843.05	
TOTAL FONDOS DE INVERSION DISPONIBLES PRESUPUESTO 2017				98,290,325.00	

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA – INSEP
FONDOS DE INVERSION – PROYECTOS DE EMERGENCIA AÑO 2017



No	ACT/OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIZACION		TIPO DE PROCESO DE	No CONTRATO	VOLUMEN DE OBRA CONTRATADA (M3)	CONTRATISTA	MONTO CONTRATO VIGENTE	OSERVACIONES
			DEPTO.	MUNICIPIO						
1	Bordo	Cierre y reconstrucción de boquete margen izquierda del Río Chamelecón sector El Zapote	Cortés	La Lima	CD-002-2017 CCIVS	P8-018-2017 CCIVS	1,447	CONSTRUCTORA OSORIO BRIZUELA S DE RL	422,209.35	Gerson Proyecto Finalizado
		Supervisión			CD-003-2017 CCIVS	S9-17-11-2017		Osman Mejía Ochoa	23,280.00	
2	Bordo	Mejoramiento de sitio para reubicación de damnificados, sector Colonia Vida Mejor	Cortés	La Lima	CD-002-2017 CCIVS	P8-019-2017 CCIVS	540	INVERSIONES CARBAJAL S DE RL DE CV	216,172.80	Reynaldo Majano Proyecto Finalizado
		Supervisión			CD-003-2017 CCIVS	S9-18-11-2017		Osman Mejía Ochoa	10,400.00	
3	Bordo	Cierre y reconstrucción de boquete margen derecha del canal Maya, sector Colonia El Buen Samaritano	Cortés	La Lima	CD-002-2017 CCIVS	P8-020-2017 CCIVS	1,487	INVERSIONES CARBAJAL S DE RL DE CV	1,062,556.02	Reynaldo Majano Proyecto Finalizado
		Supervisión			CD-003-2017 CCIVS	S9-19-11-2017		Osman Mejía Ochoa	27,200.00	
4	Bordo	Cierre provisional de boquete margen izquierda del Canal Maya, sector Colonias Pineda N°1 y N°2	Cortés	San Manuel	CD-002-2017 CCIVS	P8-021-2017 CCIVS	1,109	INVERSIONES CARBAJAL S DE RL DE CV	637,330.34	Gerson Proyecto Finalizado
		Supervisión			CD-003-2017 CCIVS	S9-20-11-2017		Osman Mejía Ochoa	14,320.00	
5	Bordo	Cierre de boquetes, reconstrucción y sobre elevación de bordo margen derecha del Río Chamelecón, sector Guarumas II	Cortés	Villanueva	CD-002-2017 CCIVS	P8-022-2017 CCIVS	17,865	CONSTRUCTORA UNIVERSAL S DE RL DE CV	3,341,390.78	Gerson Proyecto Finalizado
		Supervisión			CD-003-2017 CCIVS	S9-21-11-2017		Mayra Carolina Oliva	71,800.00	
6	Bordo	Cierre de boquete margen izquierda del Canal Marimba, sector Aklea Liberación Campesina	Cortés	San Manuel	CD-002-2017 CCIVS	P8-023-2017 CCIVS	7,520	INVERSIONES CARBAJAL S DE RL DE CV	3,287,403.24	Gerson Proyecto Finalizado
		Supervisión			CD-003-2017 CCIVS	S9-22-11-2017		Luis Armando Henríquez	35,300.00	
7	Bordo	Cierre de boquetes margen izquierda y rectificación de cauce en Acequia Chotepe, sector Colonia Jerusalen - San Cristobal - Valle Escondido	Cortés	La Lima / San Pedro Sula	CD-002-2017 CCIVS	P8-024-2017 CCIVS	14,975	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	1,640,808.75	Harry Lobo Proyecto Finalizado
		Supervisión			CD-003-2017 CCIVS	S9-23-11-2017		Mirian Aracely Varela	49,670.00	
8	Espigones	Obras de protección margen derecha río chamelecon, Lima Centro	Cortés	La Lima	CD-004-2017 CCIVS	P4-025-2017 CCIVS	33,173	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	4,125,001.49	Gerson Proyecto Finalizado
		Supervisión			CD-005-2017 CCIVS	S5-24-12-2017		Candido Osbaldo Rivera	77,000.00	
		SUB - TOTAL CONSTRUCCION PROYECTOS DE EMERGENCIA							14,732,872.77	
		SUB - TOTAL SUPERVISION PROYECTOS DE EMERGENCIA							308,970.00	
		TOTAL PROYECTOS DE EMERGENCIA					78,116.00		15,041,842.77	

RESUMEN DE INVERSION CCIVS AL 30 DE **NOVIEMBRE** 2017

EJECUCION DE OBRA

ACT / OBRA	VOLUMEN PROGRAMADO	VOLUMEN EJECUTADO	% EJECUTADO
CANALIZACION	70,592	91,188	129.18
ESTRUCTURA DE GAVION	110,537	86,894	78.61
ALCANTARILLA	172	106	61.63
BORDO	114,435	87,227	76.22
TOTALES	295,736	265,415	89.75

EJECUCION FINANCIERA

ACT / OBRA	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO
CANALIZACION	LPS. 14,546,946.00	LPS. 6,059,201.60	41.65
ESTRUCTURA DE GAVION	53,020,419.00	43,805,356.40	82.62
ALCANTARILLA	12,657,824.00	6,786,346.17	53.61
BORDO	16,931,297.00	11,117,592.39	65.66
DIRECCION Y COORDINACION	16,161,306.00	12,575,299.24	77.81
REGULARIZACION	1,133,839.00	0.00	0
TOTALES	LPS. 114,451,631.00	LPS. 80,343,795.80	70.20

RESUMEN DE INVERSION CCIVS AL 30 DE DICIEMBRE 2017

EJECUCION DE OBRA

ACT / OBRA	VOLUMEN PROGRAMADO	VOLUMEN EJECUTADO	% EJECUTADO
CANALIZACION	70,592	91,188	129.18
ESTRUCTURA DE GAVION	110,537	86,894	78.61
ALCANTARILLA	172	106	61.63
BORDO	114,435	87,227	76.22
TOTALES	295,736	265,415	89.75

EJECUCION FINANCIERA

ACT / OBRA	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO
CANALIZACION	LPS. 14,546,946.00	LPS. 9,549,038.06	65.64
ESTRUCTURA DE GAVION	53,020,419.00	45,206,633.07	85.26
ALCANTARILLA	12,657,824.00	7,960,973.91	62.89
BORDO	16,931,297.00	11,720,489.19	69.22
DIRECCION Y COORDINACION	16,161,306.00	14,746,192.46	91.24
REGULARIZACION	1,133,839.00	1,133,839.00	100.00
TOTALES	LPS. 114,451,631.00	LPS. 90,317,165.69	78.91

RESUMEN DE INVERSION CCIVS PROYECTOS DE EMERGENCIA 2017

EJECUCION DE OBRA

ACT / OBRA	VOLUMEN PROGRAMADO	VOLUMEN EJECUTADO	% EJECUTADO
ESTRUCTURA DE GAVION	33,173	33,173	100
BORDO	44,943	44,943	100
TOTALES	78,116	78,116	100

EJECUCION FINANCIERA

ACT / OBRA	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO
ESTRUCTURA DE GAVION	LPS. 4,202,001.49	LPS. 4,202,001.49	100
BORDO	10,839,841.28	10,839,841.28	100
TOTALES	LPS. 15,041,842.77	LPS. 15,041,842.77	100

RESUMEN DE INVERSION GENERAL CCIVS 2017

EJECUCION DE OBRA


ACT / OBRA	VOLUMEN PROGRAMADO	VOLUMEN EJECUTADO	% EJECUTADO
CANALIZACION	70,592	91,188	129.18
ESTRUCTURA DE GAVION	143,710	120,067	83.55
ALCANTARILLA	172	106	61.63
BORDO	159,378	132,170	82.93
TOTALES	373,852	343,531	91.89

EJECUCION FINANCIERA

ACT / OBRA	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO
CANALIZACION	LPS. 14,546,946.00	LPS. 9,549,038.06	65.64
ESTRUCTURA DE GAVION	53,020,419.00	49,408,634.56	93.19
ALCANTARILLA	12,657,824.00	7,960,973.91	62.89
BORDO	16,931,297.00	22,560,330.47	133.25
DIRECCION Y COORDINACION	16,161,306.00	14,746,192.46	91.24
REGULARIZACION	1,133,839.00	1,133,839.00	100.00
TOTALES	LPS. 114,451,631.00	LPS. 105,359,008.46	92.06

GRAFICO DE INVERSION CCIVS AL 30 DE **NOVIEMBRE** 2017

EJECUCION DE OBRA

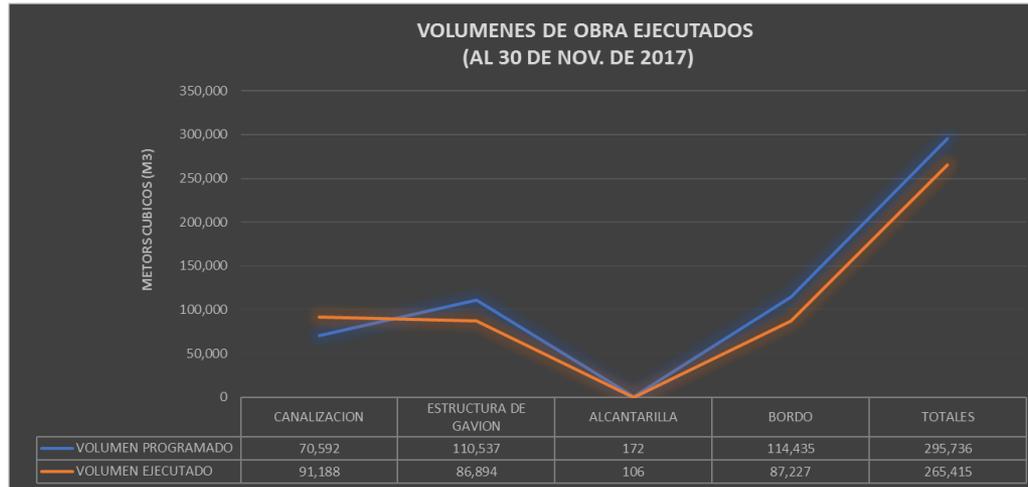

EJECUCION FINANCIERA


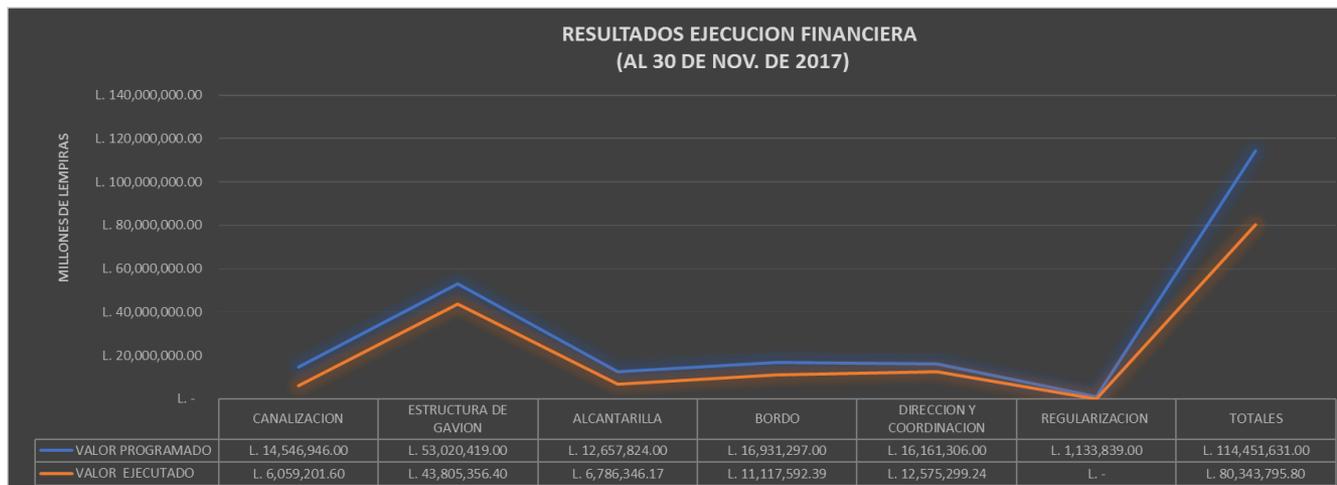


GRAFICO DE INVERSION CCIVS AL 30 DE DICIEMBRE 2017

EJECUCION DE OBRA

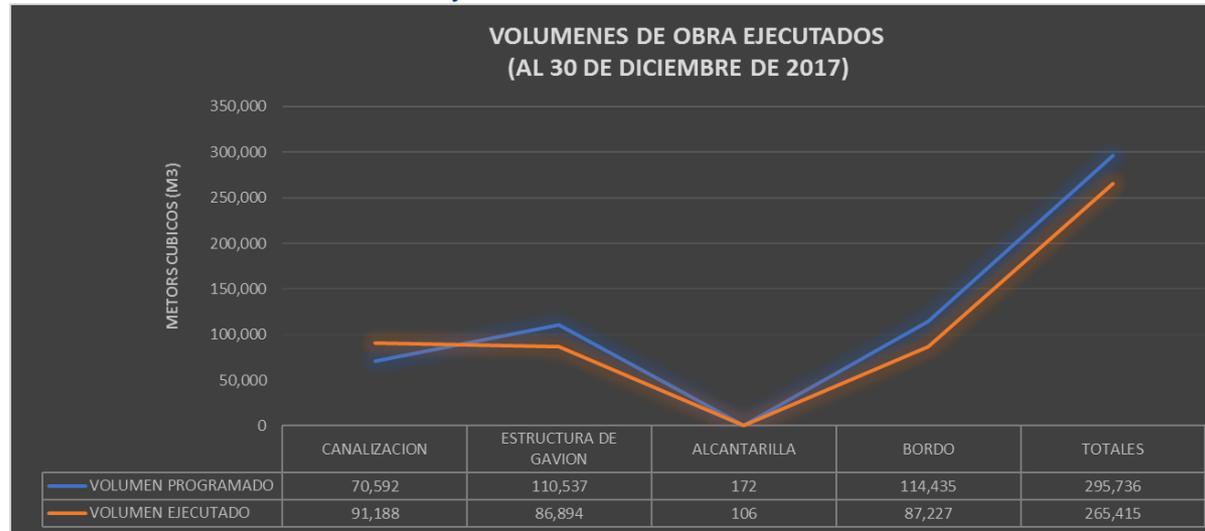

EJECUCION FINANCIERA

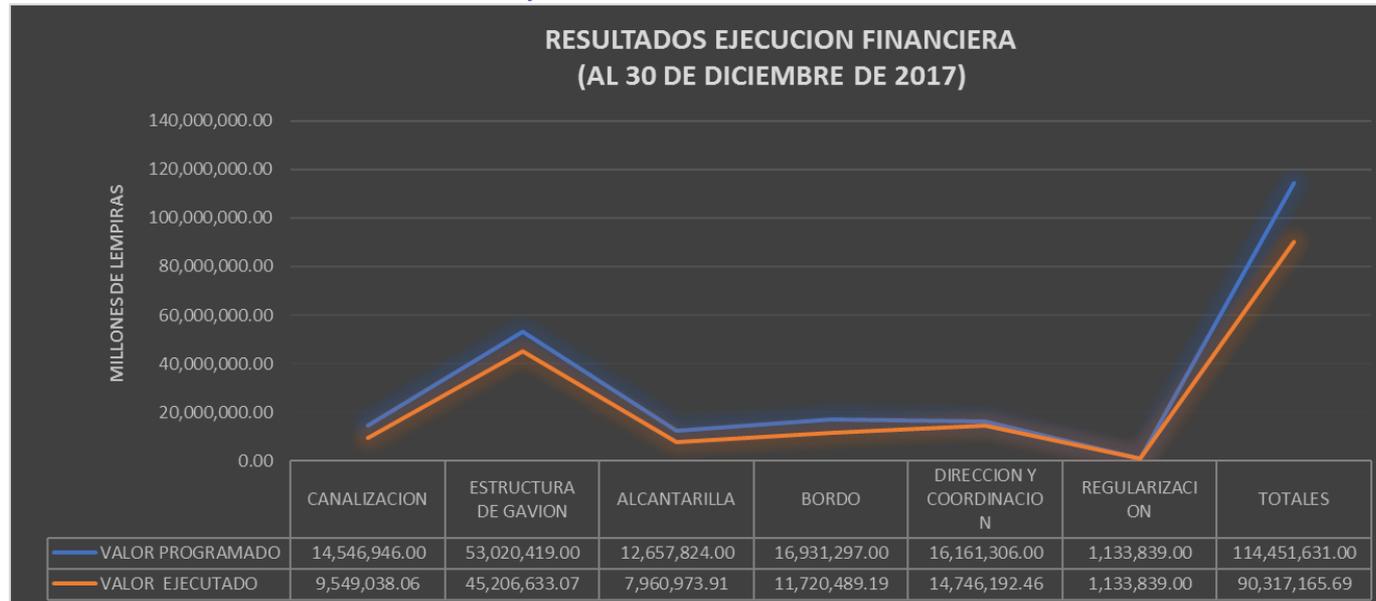


GRAFICO DE INVERSION CCIVS – PROYECTOS DE EMERGENCIA AÑO 2017

EJECUCION DE OBRA



EJECUCION FINANCIERA


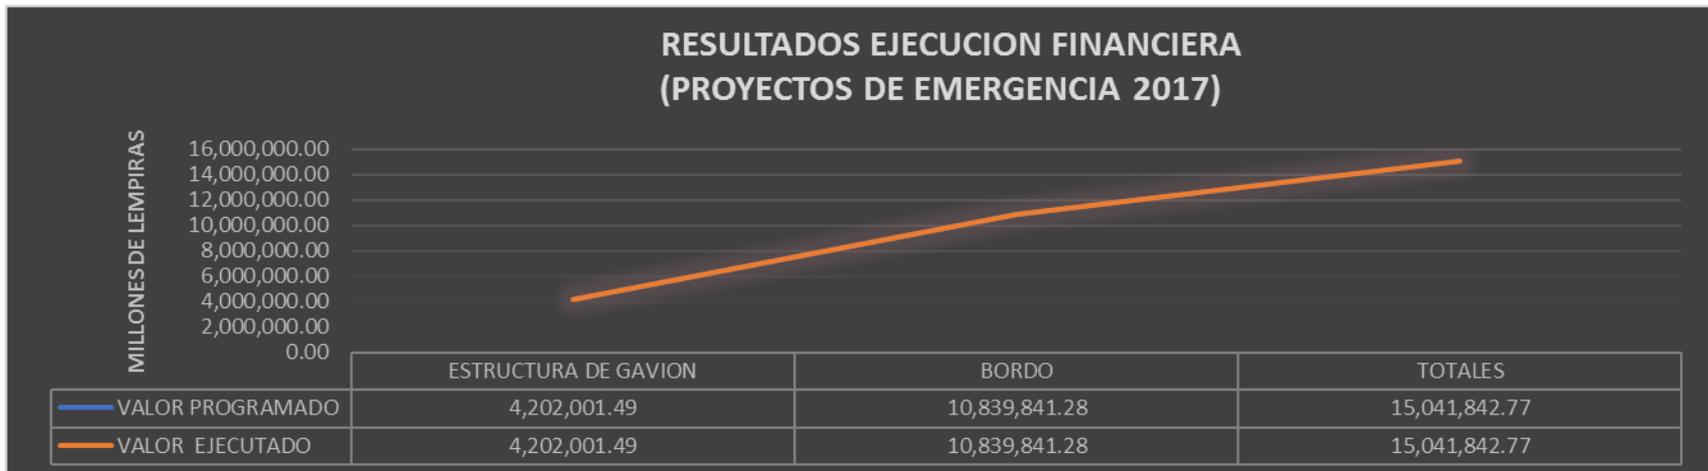


GRAFICO DE INVERSION GENERAL CCIVS 2017

EJECUCION DE OBRA



EJECUCION FINANCIERA

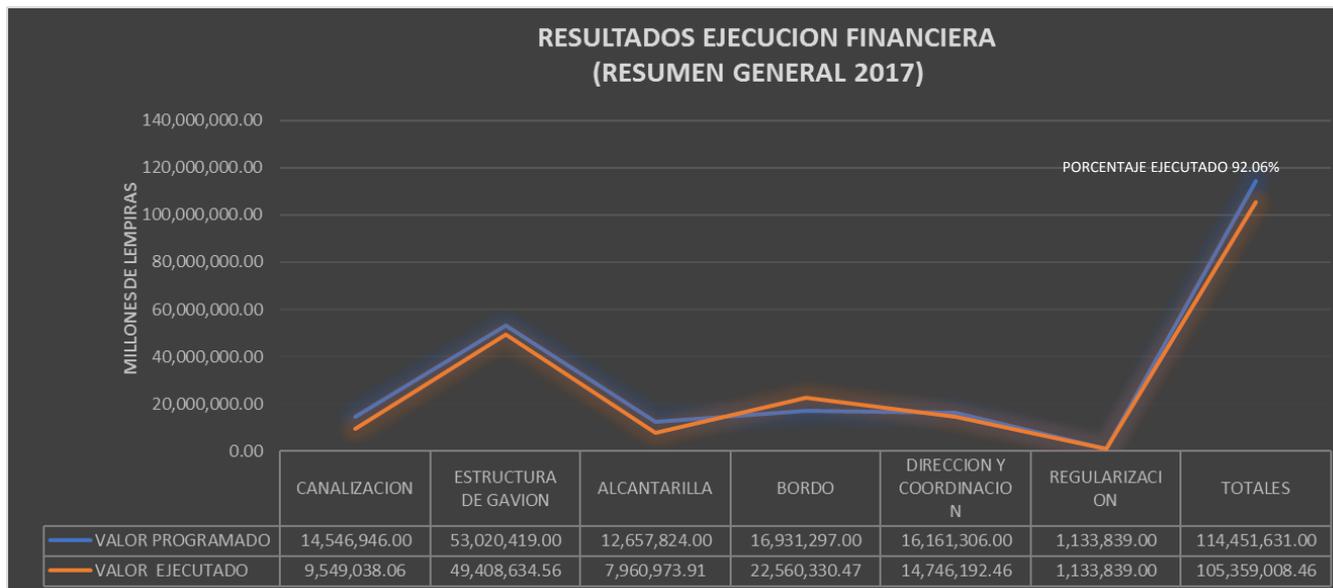

CONCLUSIONES

- ❑ El escenario de los fondos destinados para inversión en el año 2017, es el siguiente:
 - 7 Proyectos de arrastre 2016 (Congelamiento de fondos SEFIN).....LPS. 39,331,639.49
 - 24 Proyectos licitados 2017 LPS. 58,783,203.56
 - 31 Proyectos a ejecutar en el 2017 con un monto de inversión de LPS. 98,114,843.05

- ❑ La distribución de los Proyectos por Actividad Obra en el POA 2017, es el siguiente:
 - Canalizaciones 6 Proyectos
 - Estructuras de gavión12 Proyectos
 - Alcantarillas 6 Proyectos
 - Bordos 7 Proyectos
 - **Total Proyectos a Ejecutar 31 Proyectos**

- ❑ Los Proyectos de Emergencia Ejecutados durante Octubre – Noviembre fueron:
 - Estructuras de gavión 1 Proyectos
 - Bordos 7 Proyectos
 - **Total Proyectos Ejecutados 8 Proyectos**

- ❑ El Plazo de ejecución o ciclo de vida de los proyectos es el siguiente:
 - 28 Proyectos Finalizados (Diciembre 2017)
 - 10 Proyectos en ejecución y arrastre 2018 (A finalizar en Enero de 2018)
 - 01 Proyecto Cancelado
 - **39 Proyectos en total**

- ❑ El resumen de ejecución presupuestaria a la fecha es el siguiente:
 - **Volumen Programado Volumen Ejecutado Porcentaje Ejecutado**
373,852 M3 343,531 M3 91.89%
 - **Valor Programado Valor Ejecutado Porcentaje Ejecutado**
LPS. 114,451,631.00 LPS. 105,359,008.46 92.06%

JUSTIFICACIONES

- ❑ De los 39 Proyectos en cartera que se manejaron para el año 2017, solo se lograron finalizar 28 proyectos, 10 pasaron como proyectos de arrastre para el año 2018 y 1 proyecto se canceló, debido a las siguientes justificaciones:
- Debido a las severas condiciones climatológicas que se manifestaron, en el periodo comprendido entre los meses de octubre y diciembre del 2017, diez de los proyectos originalmente programados en el POA tuvieron que suspenderse a causa de las fuertes lluvias y las altas crecidas de los ríos, teniendo que extenderse el plazo de ejecución hasta el mes de febrero del año 2018.
- Como parte de los daños que ocasionó en la Costa Norte durante el mes de octubre el Frente Frio #1, se tuvieron que adicionar 8 proyectos de emergencia para poder salvar la infraestructura hidráulica que colapso debido a esos eventos climatológicos, los cuales se ejecutaron en el periodo de octubre a diciembre del presente año.
- Sumados a estas dos circunstancias anteriores podemos mencionar los disturbios ocasionados por las manifestaciones políticas, quienes paralizaron la circulación del personal y el equipo en varios puntos del Valle de Sula, por lo cual se paralizaron la mayoría de los proyectos en ejecución por un lapso de 3 semanas.


Ing. Juan José Alvarado
Jefe Dpto de Planificación
CCIVS

