



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: alcaldia_ojojona@yahoo.es



Estimados Srs.

Reciban un cordial saludo, así mismo les deseo el mayor de los éxitos en el desarrollo de sus funciones. El motivo de la presente es para reportar de la información solicitada con respecto al rubro de **Inversión Física en Infraestructura** que fue requerida por parte de la Oficina de Acceso a la Información Pública, en el que solicita las obras de infraestructura y mejoras de infraestructura. Se hace entrega de la información correspondiente al mes de Diciembre de **2017**.

Por lo que se adjunta:

- Matriz de información del proyecto.
- Perfil de Identificación del proyecto.

Esta Documentación corresponde a:

- ✓ CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN EL BARRIO AGUA DULCE, MUNICIPIO DE OJOJONA.

Como también se adjunta el cronograma de actividades realizadas en:

- ✓ EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN EL BARRIO AGUA DULCE, MUNICIPIO DE OJOJONA.

Agradeciendo de antemano por su tiempo, le doy a conocer mi mayor y más alta consideración y estima.

Carlos Mauricio Caballero

Unidad Técnica Municipal de San Juan de Ojojona

Agua Dulce


NOMBRE DEL PROYECTO

Niñez y juventud en Acción

PRESENTADO POR:

Organización: REDES DE NNAJ

PRESENTADO A:

Municipalidad San Juan de Ojojona

y

Visión Mundial

LUGAR Y FECHA

Ojojona Francisco Morazán

Proyecto " _____ "

I. Nombre del Proyecto: Niñez y Juventud en Acción

II. Tipo de proyecto:

Desarrollo humano Infraestructura social Producción

Gestión y mitigación del riesgo Prevención de la violencia y cultura de paz

III. Ubicación (Lugar donde se realizará el proyecto) El Proyecto se desarrollara en el Barrio Agua Dulce del Municipio de Ojojona

IV. Responsables de la implementación (Organización):
REDES DE NNAJ

V. Personas responsable:

Nombre Completo	Cargo	Teléfonos
Joel Napoleón Sierra	Presidente del patronato	9764-7842
José Armando Rodríguez	Secretario del patronato	8791 90 16
Cristian Armando Rodríguez	Coordinador de las REDES	8824 15 81
Freddy Daniel Hernández Ramos	Sub coordinador de las REDES	3219 78 16

VI. Tiempo de duración de la ejecución del proyecto:

Fecha de inicio: 15 de junio de 2017

Fecha de finalización: 30 de septiembre de 2017

VII. Población total beneficiaria: 168

Población patrocinada	Total A	Población no Patrocinada	Total B	Gran Total A+B
Niñas	7	Niñas	24	31
Niños	6	Niños	36	42
Mujeres	0	Mujeres	48	48
Hombres	0	Hombres	47	47

VIII. Antecedentes: ¿Cómo surge la iniciativa del proyecto? ¿Desde cuando surge la iniciativa del proyecto? ¿Avances existentes?

La iniciativa del proyecto surge por la carencia de espacios para los niños y jóvenes, sintiendo la necesidad de contar con un lugar para reunirnos por las tardes después de nuestras jornadas de trabajo para recrearnos y para que los niños acompañados por sus padres puedan recrearse.

La iniciativa surge en marzo de este año 2017 ya que antes contábamos con un campito donde jugábamos fútbol en un terreno privado pero cuando el dueño de la propiedad le colocó la cerca ya no tuvimos donde jugar.

Avances contamos con el predio para la construcción de la cancha de futbolito.

IX. Análisis del problema

(Presente aquí los resultados del trabajo realizado por la comunidad u organización al momento de definir este perfil de proyecto)

El ahora (problema identificado)	El después (situación deseada)	Lo que haremos para que la situación cambie.
No existe en el barrio un Área de recreación para los niños y los jóvenes.	Contar con espacio adecuado para la recreación de los niños las niñas y los jóvenes después de nuestros estudios y trabajos.	Gestionar apoyo a Visión Mundial y a la corporación Municipal con materiales de construcción.

X. Justificación del Proyecto (Explique las razones por las que este proyecto es necesario e importante para la comunidad y para el bienestar de la niñez, adolescencia y juventud)

Es muy importante porque jugar es un derecho y los jovenes pueden fomentar la amistad de los niños y jovenes del barrio, prevenir rriezgos al jugar en la calle, que los padres y madres esten mas pendientes de sus hijos y que este sea un espacio para que se practiquen o desarrollen actividades positivas y que la niñez no caigan en los visios.

XI. Objetivos:

Objetivo general: ¿Qué contribución e impacto pretende lograr el proyecto para bienestar de la comunidad, de la niñez, adolescencia y juventud?

Contribuir en el rescate de valores y por ende en la prevención de la violencia formando niños y jóvenes como verdaderos ciudadanos que contribuyan en el desarrollo de la comunidad y de nuestro país

Objetivos específicos (mencione máximo tres acciones puntuales para alcanzar el objetivo general):

1. Adolescentes y jóvenes organizados y capacitados en diferentes temas de desarrollo personal.
2. Construcción de una cancha de futbolito para que los niños y jóvenes puedan recrearse.
3. Darle mantenimiento al proyecto desarrollado y que este sea un inicio para la gestión y ejecución de más proyectos de beneficio para la comunidad y en especial para la niñez.

XII. Explique la manera en que los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes han participado en la priorización y definición de este perfil de proyecto.

Este proyecto es una iniciativa de los jóvenes, gestionando el predio a la Corporación Municipal y patronato de la comunidad, gestión de los recursos (materiales de construcción) gestión de los permisos de construcción y la elaboración del perfil del proyecto.

XIII. Acceso e integración de personas con discapacidad ¿Qué medidas contempla el proyecto para asegurar el acceso, circulación y beneficio para personas con discapacidad?

En este caso permitir la integración de los niños y jóvenes que presentan alguna discapacidad brindándoles la amistad y el respeto que como toda persona tiene.

XIV. Participación de la mujer: en la toma de decisiones y en todo el proceso de diseño, gestión e implementación del proyecto.

Los jóvenes hemos contado con el apoyo de una líder en el barrio como también con la opinión positiva en la toma de decisión para la construcción de este proyecto.

XV. Impacto ambiental del proyecto ¿Qué medidas de mitigación del impacto ambiental realizará el proyecto?

Como jóvenes estamos apoyando las campañas de reforestación y limpieza del barrio, y con este proyecto no se estaría afectando negativamente el ambiente.

XVI. ¿De qué manera este proyecto será sostenible?

Los jóvenes en redes serán los responsables de darle el mantenimiento a este proyecto para la sostenibilidad, con el uso adecuado y su debido cuidado.

XVII. Plan de ejecución del proyecto

Etapa	Actividad	Fecha	Responsable (s)	Observaciones
Inicial	Organización de las Redes Solicitud y gestión del predio	15 de junio de 2017	Redes de NNAJ	
	Asamblea comunitaria donde se aprobó el proyecto. Elaboración del perfil de proyecto	16/07/2017 17/07/2017	Redes de NNAJ y patronato del barrio.	
	Elaboración de presupuesto	17/07/2017	Redes de NNAJ	
Intermedia	Gestión de materiales a Visión Mundial y a la corporación Municipal	21/7/2017	Jóvenes de REDES	
	Preparación del terreno (como avances)	18 /7/2017	Jóvenes de REDES	
Final	Construcción de la cancha.	1/08/2017	Jóvenes de REDES y patronato	
	Inauguración del proyecto.	30/09/2017	Comunidad.	

XVIII. Resumen del costo total del proyecto: L. 232,584

Organización	Lempiras
A. Monto solicitado a World Visión Honduras	L. 126,447
B. Contraparte comunitaria	L. 30,227
C. Contraparte de otros socios	L. 75,910
Costo total (A+B+C)	L. 232,584

XIX. Fuentes de financiamiento:

Aporte comunitario: ✦

Descripción	Cantida d.	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total	¿Quién aporta? (Patronato, familias, junta de agua y otros)
Arena	39	M3	430	16,770	Patronato y Jóvenes
Madera rustica	239	Pie T	15	3,585	Patronato y Jóvenes
Alambre de amarre	10	Lbs.	17	170	Patronato y Jóvenes
Seguetas	10	unidad	28	280	Patronato y Jóvenes
Clavos 2" a 3"	16	Lbs.	17	272	Patronato y Jóvenes
Electrodo	5	Lbs.	30	150	Patronato y Jóvenes
Mano de obra no calificada	60	días hombre	150	9,000	
Gran total				30,227	


Aporte WVH:

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
Cemento	bolsa	522	201	104,922
Varilla de 3/8 corrugada	unidad	78	95	7,410
Varilla de 3/8 lisa	unidad	1	140	140
Angulo 2"	unidad	2	360	720
Logos	unidad	2		
Platina I	unidad	1	100	100
Tubos PVC de 2 drenaje	unidad	6	110	660
Varilla de 1/4	unidad	15	43	645
Galones anticorrosivo	galones	5	270	1,350
Malla ciclón 8"	Pie L	3	3,500	10,500
Total				126,447

Otros aportantes: *7.1/6 Transporte, piedra*

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Aportante
Grava	metros	25	500	12,500	Municipalidad de Ojojona
Tabla cepillada 1"x4" x4	unidad	20			Municipalidad de Ojojona
Tubos H N I 1/2	unidad	26	785	20,410	Municipalidad de Ojojona
Tubos HG de 3	unidad	4	2000	8,000	Municipalidad de Ojojona
Mano de obra calificada	días hombre	60	500	30,000	Municipalidad de Ojojona
Elaboración de metas	unidad	2	2,500	5,000	Municipalidad de Ojojona
			Total	75,910	

XVIII. ANEXOS (Otros documentos que sustenten el proceso del proyecto como: Diagnóstico, Planes de negocios, Planos, Diseños, Acta de aprobación en asamblea, fotografías, listado de beneficiarios y beneficiarias, constancias de apoyo entre otros como los consideren necesarios).

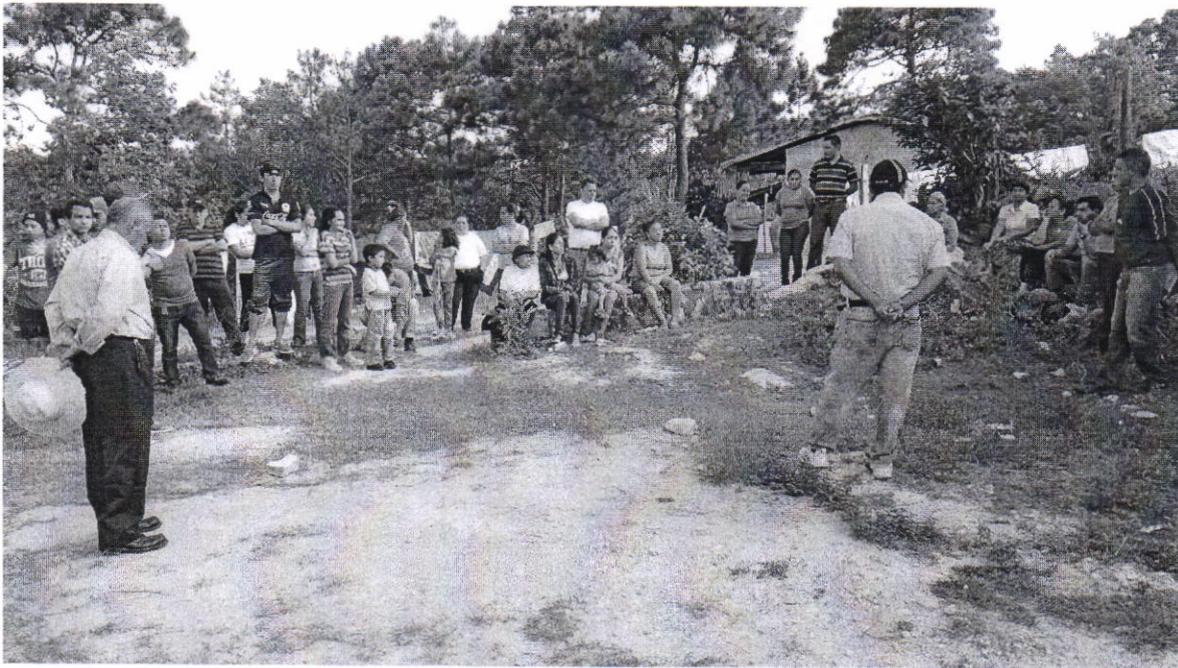

Barrio Agua Dulce San Juan de Ojojona Francisco Morazán
Presupuesto Cancha Multiusos Área 20X15 mts.

Losa monolítica, 10 cms. Esp., Pasajuntas# 3 @ 0.20

Insumo	Unidad de Medida	Cantidad
Cemento	Bolsa	287
Arena	M3	17
Grava	M3	25
Agua	M3	7.107
Varilla 3/8" corrugada	Unidad	58
Madera Rústica	Pie T.	226.8
Alambre de amarre	Lb	5
Seguetas	Unidad	3
Clavos 2" a 3"	Lb	10
Tubo HG de 3"	Unidad	4
Angulo 2"	Unidad	2
Varilla 3/8" Lisa	Unidad	1
Material Selecto	Unidad	25.2
Electrodo	Lb	5
Logos	Unidad	2
Platina 1"	Unidad	1
Tabla cepillada 1"X4"X4'	Unidad	

Muro de Mampostería, ligado con mortero 1:3, drenajes con PVC 2"

Materiales	UND	Cantidad
Cemento	Bolsa	235
Arena	M ³	22
Piedra Ripión	M ³	83
Agua	M ³	6
Tubo PVC 2" drenaje	Unidad	6
Madera Rústica	Pie T.	3
Clavos 3"	Lb	5

Cerco de Malla ciclón 8' + postes tubo H.N. 1 1/2" @ 2.00m.

Materiales	UND	Cantidad
Varilla 3/8"	Unidad	19.66476
Varilla 1/4"	Unidad	14.43854
Tubo H.N. 1 1/2"	Unidad	25.3098
Malla Ciclón 8'	Pie L.	290.9853
Madera Rústica	Pie T.	8.6
Alambre de amarre	Lb	4.3
Electrodos	Lb	4.3
Anticorrosivo	Gal.	4.3
Seguetas	Unidad	6.88
Clavos	Lb	0.344



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2017 a: 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2018
Hora: 01:36 p.m.
Pagina: 1 de 3

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programatica: 14 04 001 000 00147210 11-001-01 20 7		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO						Asignado:		0.00	
							Ampliación:		0.00		
							Disminuciones:		0.00		
							Transferencias: +/-		100,000.00		
							Vigente:		100,000.00		
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS											
Expediente: 274											
25/10/2017	Trasaso de fondos de gastos de funcionamiento con valor de L.150,774.13 y de Inversión con valor de L.1,838,250.35 para un total de L.1,989,024.48	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 7635											
15/11/2017	Orden de pago 23601 por planilla de jornales en construcción de cancha polideportiva del barrio Agua Dulce, semana del 13 al 25 de noviembre, valor L.15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15/11/2017	Orden de pago 23601 por planilla de jornales en construcción de cancha polideportiva del barrio Agua Dulce, semana del 13 al 25 de noviembre, valor L.15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	
15/11/2017	Orden de pago 23601 por planilla de jornales en construcción de cancha polideportiva del barrio Agua Dulce, semana del 13 al 25 de noviembre, valor L.15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	
15/11/2017	Orden de pago 23601 por planilla de jornales en construcción de cancha polideportiva del barrio Agua Dulce, semana del 13 al 25 de noviembre, valor L.15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15/11/2017	PAGO DE Orden de pago 23601 por planilla de jornales en construcción de cancha polideportiva del barrio Agua Dulce, semana del 13 al 25 de noviembre, valor L.15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	
Expediente: 7748											
21/11/2017	ORDEN DE PAGO 23681 POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO AGUA DULCE POR VALOR DE L. 28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21/11/2017	ORDEN DE PAGO 23681 POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO AGUA DULCE POR VALOR DE L. 28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,100.00	0.00	0.00	0.00	
21/11/2017	ORDEN DE PAGO 23681 POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO AGUA DULCE POR VALOR DE L. 28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,100.00	0.00	0.00	
21/11/2017	ORDEN DE PAGO 23681 POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO AGUA DULCE POR VALOR DE L. 28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21/11/2017	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23681 POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO AGUA DULCE POR VALOR DE L. 28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,100.00	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,100.00	-28,100.00	-28,100.00	0.00	
Expediente: 7779											



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2017 a: 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/11/2017	ORDEN DE PAGO 23712 POR PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES EN CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA AGUA DULCE, SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE POR VALOR DE L. 7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2017	ORDEN DE PAGO 23712 POR PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES EN CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA AGUA DULCE, SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE POR VALOR DE L. 7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2017	ORDEN DE PAGO 23712 POR PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES EN CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA AGUA DULCE, SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE POR VALOR DE L. 7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00
30/11/2017	ORDEN DE PAGO 23712 POR PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES EN CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA AGUA DULCE, SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE POR VALOR DE L. 7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2017	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23712 POR PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES EN CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA AGUA DULCE, SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE POR VALOR DE L. 7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	-7,500.00	-7,500.00	0.00
Expediente: 7806										
06/12/2017	Orden de pago 23743 por planilla de jornales en construccion de aula en kinder Teofilo Martel, semana del 04 al 09 de diciembre, valor L.9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2017	Orden de pago 23743 por planilla de jornales en construccion de aula en kinder Teofilo Martel, semana del 04 al 09 de diciembre, valor L.9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 7807										
06/12/2017	Orden de pago 23744 por planilla de jornales en construccion de cancha deportiva de barrio Agua Dulce, semana del 04 al 09 de diciembre, valor L.7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2017	Orden de pago 23744 por planilla de jornales en construccion de cancha deportiva de barrio Agua Dulce, semana del 04 al 09 de diciembre, valor L.7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2017	Orden de pago 23744 por planilla de jornales en construccion de cancha deportiva de barrio Agua Dulce, semana del 04 al 09 de diciembre, valor L.7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00
06/12/2017	Orden de pago 23744 por planilla de jornales en construccion de cancha deportiva de barrio Agua Dulce, semana del 04 al 09 de diciembre, valor L.7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/12/2017	PAGO DE Orden de pago 23744 por planilla de jornales en construccion de cancha deportiva de barrio Agua Dulce, semana del 04 al 09 de diciembre, valor L.7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	-7,500.00	-7,500.00	0.00
Expediente: 7893										
13/12/2017	ORDEN DE PAGO 23797 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO AGUA DULCE POR VALOR DE L. 1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/12/2017	ORDEN DE PAGO 23797 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO AGUA DULCE POR VALOR DE L. 1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00
13/12/2017	ORDEN DE PAGO 23797 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO AGUA DULCE POR VALOR DE L. 1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00
13/12/2017	ORDEN DE PAGO 23797 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO AGUA DULCE POR VALOR DE L. 1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/12/2017	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23797 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO AGUA DULCE POR VALOR DE L. 1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,680.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,680.00	-1,680.00	-1,680.00	0.00
Expediente: 8031										
27/12/2017	Orden de pago 23907 por compra de materiales para el proyecto de construccion de cancha polideportiva barrio Agua Dulce, valor L.25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2017 a: 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/12/2017	Orden de pago 23907 por compra de materiales para el proyecto de construccion de cancha polideportiva barrio Agua Dulce, valor L.25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2017	Orden de pago 23907 por compra de materiales para el proyecto de construccion de cancha polideportiva barrio Agua Dulce, valor L.25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,600.00	0.00	0.00
27/12/2017	Orden de pago 23907 por compra de materiales para el proyecto de construccion de cancha polideportiva barrio Agua Dulce, valor L.25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2017	PAGO DE Orden de pago 23907 por compra de materiales para el proyecto de construccion de cancha polideportiva barrio Agua Dulce, valor L.25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,600.00	-25,600.00	-25,600.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,380.00	-85,380.00	-85,380.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-85,380.00	-85,380.00	-85,380.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - CERRADO
PROGRAMA: 14 - DESARROLLO SOCIAL
SUBPROGRAMA: 04 - DEPORTES.
PROYECTO: 001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA BARRIO AGUA DULCE
ACTIVIDAD: 000 - SIN ACTIVIDAD
OBRA: 001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA BARRIO AGUA DULCE
OBJETO GASTO: 47210 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 183 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA BARRIO AGUA DULCE
FINALIDAD: 7 - EDUCACION
FUNCION: 50 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN
FECHA INICIO: 1/6/2017
FECHA FINAL: 31/12/2017

Presupuesto Vigente: (L)100,000.00

Disponibilidad: (L)14,620.00

0s+js/j9JmCVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHO7wwZ6xNsubST9H2Ha5aLf2zE2vJceH1p/KnSUqMDprkn5yQtjL4qSs/7++n8h0NR3vgAUcNVIETs6OIcfJNkDXyBsG9/FT8

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
DEPTO DE PROYECTOS

PROYECTO: construccion de cancha multideportiva

LUGAR: Barrio Agua Dulce, municipio de San Juan de Ojojona

Matriz de informacion de proyectos

Identificacion del proyecto

No	Encargado de la ejecucion del proyecto.	Sector	Sub-sector	Proposito	Descripcion
1	Municipalidad de San Juan de Ojojona/unidad tecnica municipal	Infraestructura municipal	Educacion y deportes	ver Perfil de proyecto	Ver perfil de proyecto

Elaboracion del proyecto

No.	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto terrenos y asentamientos	Detalles del encargado del proyecto	Fuente de financiamiento	presupuesto del proyecto.	Fecha de aprobacion del proyecto
1	Ver perfil del proyecto	Ninguno	Ninguno	Carlos Mauricio Caballero Rosales, No de tel. 96131313, correo electronico alcaldia_ojojona@yahoo.es	presupuesto municipal	Ver perfil del proyecto	31 de diciembre de 2015 (fecha de aprobacion de presupuesto de ingresos y egresos)

Ejecucion del proyecto

No.	Planificacion Vrs ejecucion	Variacion del costo total del proyecto	variacion del alcance y duracion del proyecto.	Justificacion de cambios mencionados
1	Ejecutado el 100% de lo planificado(parte presupuestaria)	ninguna	ninguna	No aplica



estado del proyecto.	costo de finalizacion	fecha de finalizacion
en construccion	L. 75,910.00	La finalizacion del proyecto estaba previsto para el 31 de diciembre sin embargo por renuencia de la comunidad aun no ha finalizado




Municipalidad de San Juan de Ojojona F.M.

Unidad Tecnica Municipal

Cronograma de Actividades Realizadas (construccion de cancha polideportiva)

Semana 48							% de ejecucion	Valor
Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado			
28	29	30	1	2	3			
Actividad								
excavacion de material comun (terreno duro)							15%	
Semana 49								
Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado			
5	6	7	8	9	10			
Actividad								
Cimentacion (concreto ciclopeo; 70 % piedra 30% concreto)							0%	
Semana 50								L. 75,910.00
Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado			
12	13	14	15	16	17			
Actividad								
armado de hierro de losa							0%	
Semana 51								
lunes	martes	miercoles	jueves	viernes	sabado			
19	20	21	22	23	24			
Actividad								
fundicion de losa							0%	
Semana 52								

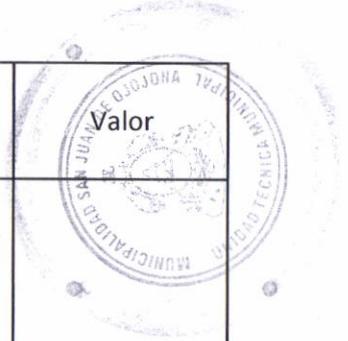

	lunes	martes	miercoles	jueves	viernes	sabado
	26	27	28	29	30	31
Actividad						
instalacion de porterias						
Levantado de muro de bloques y malla ciclon						

0%

0%

