



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: alcaldia_ojojona@yahoo.es



Estimados Srs.

Reciban un cordial saludo, así mismo les deseo el mayor de los éxitos en el desarrollo de sus funciones. El motivo de la presente es para reportar de la información solicitada con respecto al rubro de **Inversión Física en Infraestructura** que fue requerida por parte de la Oficina de Acceso a la Información Pública, en el que solicita las obras de infraestructura y mejoras de infraestructura. Se hace entrega de la información correspondiente al mes de Febrero de **2017**.

Por lo que se adjunta:

- Matriz de información del proyecto.
- Perfil de Identificación del proyecto.

Esta Documentación corresponde a:


- ✓ CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE CENICERAS, ALDEA DE SURCOS DE CAÑA MUNICIPIO DE OJOJONA.

Como también se adjunta el cronograma de actividades realizadas en:

- ✓ EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE CENICERAS, ALDEA DE SURCOS DE CAÑA MUNICIPIO DE OJOJONA.

✓

Agradeciendo de antemano por su tiempo, le doy a conocer mi mayor y más alta consideración y estima.



Carlos Mauricio Caballero

Unidad Técnica Municipal de San Juan de Ojojona



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: alcaldia_ojojona@yahoo.es



Estimados Srs.

Reciban un cordial saludo, así mismo les deseo el mayor de los éxitos en el desarrollo de sus funciones. El motivo de la presente es para reportar de la información solicitada con respecto al rubro de **Inversión Física en Infraestructura** que fue requerida por parte de la Oficina de Acceso a la Información Pública, en el que solicita las obras de infraestructura y mejoras de infraestructura. Se hace entrega de la información correspondiente al mes de Febrero de **2017**.

Por lo que se adjunta:

- Matriz de información del proyecto.
- Perfil de Identificación del proyecto.

Esta Documentación corresponde a:

- ✓ CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN, ALDEA DE SURCOS DE CAÑA MUNICIPIO DE OJOJONA.

Como también se adjunta el cronograma de actividades realizadas en:

- ✓ EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN, ALDEA DE SURCOS DE CAÑA MUNICIPIO DE OJOJONA.

Agradeciendo de antemano por su tiempo, le doy a conocer mi mayor y más alta consideración y estima.



Carlos Mauricio Caballero

Unidad Técnica Municipal de San Juan de Ojojona



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

SAN JUAN DE OJOJONA, F.M., HONDURAS C.A.

TELES.: 2767-0173, 2767-0035, FAX: 2767-0491

E-mail: alcaldia_ojojona@yahoo.es



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DEPTO. DE PROYECTOS

Proyecto: Construcción de circuito eléctrico de las comunidades de Ceniceras, San Sebastián.

Ubicación: Comunidades de San Sebastián, Ceniceras, aldea de Surcos de Caña Municipio de San Juan de Ojojona.

Beneficiarios: 69 familias del municipio de San Juan de Ojojona.

Actividad:

- Realización de inspección de los agujeros donde se aplomarán los postes

Fechas de la actividad: 02 de Marzo 2018

Lugar: Comunidades de Ceniceras, San Sebastián, municipio de San Juan de Ojojona Francisco Morazán, Honduras.

Participantes en la visita y/o reunión:

Carlos Caballero (UTM), José Gabriel Rodas (Control Urbano), Juan Pablo Cerrato (Representante de Asodeco) y Wilson Hernández (liniero)

Objetivo de la actividad:

- Realizar la inspección de campo para verificar que los agujeros donde se aplomaran los postes del circuito eléctrico de la comunidad de Ceniceras y San Sebastián tengan la profundidad correcta de acuerdo a las especificaciones técnicas de la ENEE.

Actividades desarrolladas durante la actividad :

- Se realizó el recorrido en la comunidad de San Sebastián exactamente frente a la casa de habitación del Srs. Arnulfo Ramírez, se procedió a medir la profundidad del agujero y el diámetro; se siguió el recorrido hasta la casa del Srs. Juan Martínez.
- Medición de las distancias establecidas en el plano.
- Verificación de lugar de las estacas y si concuerda con la posición del agujero.

Resultados:

- **Identificación del problema:** se pudo constatar que en el recorrido que los agujeros aun no tienen la profundidad establecida por las normas técnicas de la ENEE; algunos presentan profundidades de 1.20 metros cuando debería ser de 1.50 metros y en los postes de 40 pies que debería ser de 1.80 metros apenas tienen 1.30 metros.





MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
SAN JUAN DE OJOJONA, F.M., HONDURAS C.A.
TELES.: 2767-0173, 2767-0035, FAX: 2767-0491
E-mail: alcaldia_ojojona@yahoo.es



Recomendación:

- Solicitar una inspección de la ENEE para verificar y dar un dictamen del avance del proyecto
- Realizar una reunión con la comunidad para retroalimentar las especificaciones técnicas brindadas por la ENEE

Álbum fotográfico de la visita






MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

SAN JUAN DE OJOJONA, F.M., HONDURAS C.A.

TELES.: 2767-0173, 2767-0035, FAX: 2767-0491

E-mail: alcaldia_ojojona@yahoo.es

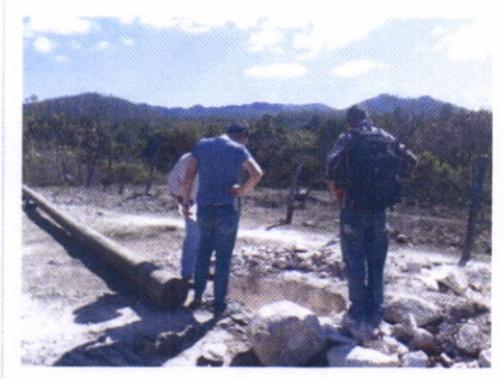

[Handwritten signature]





MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

SAN JUAN DE OJOJONA, F.M., HONDURAS C.A.

TELES.: 2767-0173, 2767-0035, FAX: 2767-0491

E-mail: alcaldia_ojojona@yahoo.es

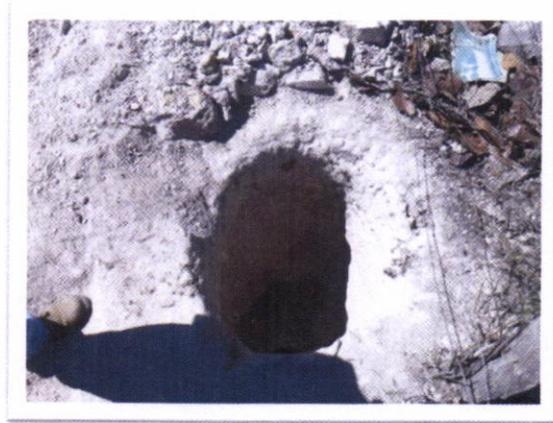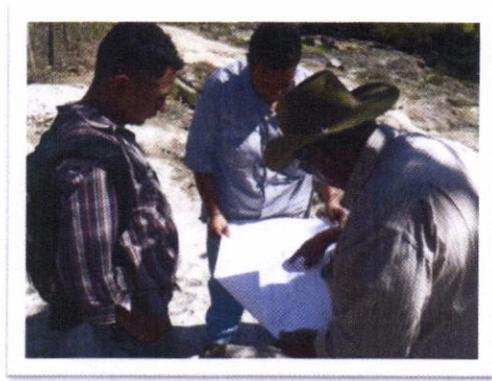

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA**UNIDAD TECNICA MUNICIPAL****DEPTO DE PROYECTOS****PROYECTO:** construccion de electrificacion del caserio de Cenicerias**LUGAR:** caserio de Cenicerias, municipio de San Juan de Ojojona.**Matriz de informacion de proyectos****Identificacion del proyecto**

No	Encargado de la ejecucion del proyecto.	Sector	Sub-sector	Proposito	Descripcion
1	Municipalidad de San Juan de Ojojona/unidad tecnica municipal	Infraestructura municipal	electrificacion	ver Perfil de proyecto	Ver perfil de proyecto

Elaboracion del proyecto

No.	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto terrenos y asentamientos	Detalles del encargado del proyecto	Fuente de financiamiento	presupuesto del proyecto.	Fecha de aprobacion del proyecto
1	Ver perfil del proyecto	Ninguno	Ninguno	Carlos Mauricio Caballero Rosales, No de tel. 96131313, correo electronico alcaldia_ojojona@yahoo.es	presupuesto municipal	Ver perfil del proyecto	31 de diciembre de 2016 (fecha de aprobacion de presupuesto de ingresos y egresos)

Ejecucion del proyecto

No.	Planificacion Vrs ejecucion	Variacion del costo total del proyecto	variacion del alcance y duracion del proyecto.	Justificacion de cambios mencionados
1	0%	ninguna	ninguna	No aplica

estado del proyecto.	costo de finalizacion	fecha de finalizacion
se adjunta informe respaldando el atraso de la obra	172,500.00 lps. (corresponde a primer desembolso hecho a la ONG que ejecutara el proyecto)	a espera de inspeccion de la ENEE y compra de materiales.

Municipalidad de San Juan de Ojojona F.M.

Unidad Tecnica Municipal

Cronograma de Actividades Realizadas (proyecto de electrificación de el caserio de Ceniceras)

Semana 9							% de ejecución	Valor
Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado			
5	6	7	8	9	10			
Actividad							0%(El proyecto aun no ha iniciado y se entrega	172,000.500 lps (este monto corresponde al primer desembolso realizado a la ONG que ejecutara el proyecto)
Trazado de linea y marcado de agujeros								
Semana 9							0%	
Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado			
12	13	14	15	16	17			
Actividad							0%	
aplomado de postes								
Semana 32							0%	
Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado			
19	20	21	22	23	24			
Actividad							0%	
Instalacion de retenidas								
Instalacion de estructuras							0%	
Semana 32								
lunes	martes	miercoles	jueves	viernes	sabado			
26	27	28	29	30	31			
Actividad								

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA**UNIDAD TECNICA MUNICIPAL****DEPTO DE PROYECTOS****PROYECTO:** construccion de electrificacion del caserio de San Sebastian**LUGAR:** caserio de San Sebastian, municipio de San Juan de Ojojona.**Matriz de informacion de proyectos****Identificacion del proyecto**

No	Encargado de la ejecucion del proyecto.	Sector	Sub-sector	Proposito	Descripcion
1	Municipalidad de San Juan de Ojojona/unidad tecnica municipal	Infraestructura municipal	electrificacion	ver Perfil de proyecto	Ver perfil de proyecto

Elaboracion del proyecto

No.	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto terrenos y asentamientos	Detalles del encargado del proyecto	Fuente de financiamiento	presupuesto del proyecto.
1	Ver perfil del proyecto	Ninguno	Ninguno	Carlos Mauricio Caballero Rosales, No de tel. 96131313, correo electronico alcaldia_ojojona@yahoo.es	presupuesto municipal	Ver perfil del proyecto

Ejecucion del proyecto

No.	Planificacion Vrs ejecucion	Variacion del costo total del proyecto	variacion del alcance y duracion del proyecto.	Justificacion de cambios mencionados
1	0%	ninguna	ninguna	No aplica

Fecha de aprobacion del proyecto	estado del proyecto.	costo de finalizacion	fecha de finalizacion
31 de diciembre de 2016 (fecha de aprobacion de presupuesto de ingresos y egresos)	se adjunta informe respaldando el atraso de la obra	115,000.00 lps. (corresponde a primer desembolso hecho a la ONG que ejecutara el proyecto)	a espera de inspeccion de la ENEE y compra de materiales.

Municipalidad de San Juan de Ojojona F.M.

Unidad Tecnica Municipal

Cronograma de Actividades Realizadas (proyecto de elctricfacion de el caserio de San Sebastian)

Semana 9							% de ejecucion	Valor
Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado			
5	6	7	8	9	10			
Actividad							0%(El proyecto aun no ha iniciado y se entrega informe de inspeccion como respaldo)	115,000 lps (este monto corresponde al primer desembolso realizado a la ONG que ejecutara el proyecto)
Trazado de linea y marcado de agujeros								
Semana 9							0%	
Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado			
12	13	14	15	16	17			
Actividad							0%	
aplomado de postes								
Semana 32							0%	
Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado			
19	20	21	22	23	24			
Actividad							0%	
Instalacion de retenidas								
Instalacion de estructuras								
Semana 32								
lunes	martes	miercoles	jueves	viernes	sabado			
26	27	28	29	30	31			
Actividad								

