




PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Mes Mayo de 2018

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing. Jose Emanuel Cacerez Hernandez	Infraestructura	Construccion de Biblioteca Publica	Barrio El San Juan Lepaera Lempira	Mejorar las condiciones para que los niños, niñas y jóvenes aumenten los niveles de lectura dentro del municipio a través de la adquisición de una Biblioteca Publica para la consulta de informacion	El Proyecto ,consiste en la construccion de modulo para biblioteca de 308.14 mtrs cuadrados por 4.85 mtrs de altura ,ubicado en el casco urbano del Municipio de Dpto. de Lempira.	devido al mal estado de las calles del municipio de Lepaera, lo que afecta tanto a los transeuntes como a los vehiculos mas en epoca de invierno	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la Infraestructura, apertura de zanjas, levantamiento de capa vegetativa.	En esta área no ha sufrido ningún impacto según datos del Ing. que lidera el proyecto.	Fondos Municipales, Fhis	L.1,299,049.65	Diciembre de 2017	En Proceso 60.72% en este mes se agraga el 3.05%	L.1,299,049.65	Julio de 2018	en estos momentos solo se lleva un porcentaje de ejecucion de un 60.72 % en lo que va del mes de enero y febrero y en el mes de Mayo hay un avance de un 3.05% mas de acuerdo a lo planificado lleva un avance significativo.	No existe ninguna variacion por el momento.	hasta el momento no hay cambios verificables.
2	Auditora Waldina Orellana Sola, Jefe de UTM	Infraestructura	Mejoras y Adiciones al Edificio Municipal	Casco Urbano, Lepaera Lempira	Mejorar la estructura del edificio municipal a través de la remodelacion de la parte interna como externa, dandole una presentacion que reuna las condiciones adecuadas tando para el personal municipal como para las personas que nos visitan y los contribuyentes del municipio).	El Proyecto consiste en reparar diferentes areas del edificio municipal ,especificament e el salon municipal, la parte externa como ser paredes que estan dañadas, las oficinas, para darle un mejor aspecto al edificio municipal.	el presente proyecto esta en ejecucion, según reporte lleva un buen avance fisico.	Se esta causando mucho contaminacion (polvo) estan quitando estructura vieja y colocando material en cielo razo, se estan pintando paredes externas e internas	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Lps.499,803.52	Diciembre de 2017	En Proceso 10.73% mas 10.73 del mes de Mayo	Lps.499,803.52	Mayo de 2018	Se esta avanzando significativamente con la ejecucion del proyecto en lo que corresponde a la parte fisica, en lo financiero va muy lento. es por eso el porcentaje tan bajo de ejecucion.	Por el momento la unica variacion en lo que va del mes de Mayo es en cuanto a la ejecucion financiera es que solo va en un 10.73% mas un 10.73% del mes de Mayo y la ejecucion fisica que es de un 100% del area planificada	no hay cambio reportados por el momento


Rosandra Lara
Jefe Unidad Tecnica de Gestion Municipal





MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA



NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción de Biblioteca Pública Virtual

BENEFICIARIOS.

HABITANTES DE LEPAERA, LEMPIRA

Solicitado A:

LEPAERA, LEMPIRA Febrero de 2018

HONDURAS C.A

Mansueto Coronel Castro

FICHA DE PROYECTO

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PÚBLICA VIRTUAL EN LEPAERA, LEMPIRA

1. Identificación del Proyecto

Encargado de la ejecución del proyecto
Alcalde Municipal
Edgar Antonio Murillo

2. Sector o Sub sector

Sector: Infraestructura Social

3. Nombre del Proyecto

Construcción de Proyecto de Construcción de Biblioteca Pública Virtual en Lepaera, Lempira

4. Ubicación del Proyecto.

Barrió San Juan, Municipio de Lepaera

5. Propósito

Mejorar las condiciones para que los niños, niñas y jóvenes aumenten los niveles de lectura dentro del municipio través de la adquisición de una Biblioteca Pública para la consulta de información

Descripción del Proyecto.

El presente proyecto consiste en la construcción de una Biblioteca Publica Virtual en el Municipio de Lepaera Dpto. de Lempira, para los pobladores del municipio de Lepaera es un avance en infraestructura y elevar el grado de cultura en los pobladores para que no pierdan el habito a la lectura tanto para los visitantes como para los vecinos de Lepaera.

Es necesario mencionar que el proyecto se está ejecutando con fondos de Plan en Honduras y con fondos municipales mediante transferencia a la municipalidad, la misma aporta la mano de obra calificada y el terreno,.

El presente proyecto consta de sala principal, recepción, sala de cómputo, sala para biblioteca, jardines, área de recreación. Estos proyectos no son posibles sin el apoyo de la municipalidad, obteniendo los materiales y mano de obra del municipio. Dicho proyecto se desarrollara de la siguiente manera, construcción de:

General .. Módulo de biblioteca de 308.14 mtrs cuadrados x 4.85 metros de altura.

Realizando las siguientes actividades:

- 1.- Adecuación de terreno, trazar, marcar y nivelar.
- 2.-Excavacion, cimentación y dados de concreto.
- 3.-Construccion de columnas, castillos, soleras inferiores y superiores.
- 4.-Contruccion de paredes de bloque y vigas reforzado con tabiques
- 5.-Contruccion de contrafuerte de concreto armados de 0.15 x0.50 centímetros.
- 6.- Construcción de loza de loza de concreto y canal perimetral de 0.15x0.50 centímetros.
- 7.- Colocación de techo de alucín según plano.
- 8.-Contruccion de Redes hidrosanitarias, fluviales, griferías y accesorios.
- 9.- Instalación eléctrica, iluminación y estructurado
- 10.- acabado de elementos, soleras, vigas y columnas.
11. Acabado de Contrafuertes y Jardín según planos.
- 12.-Repellos, pulidos y pintado en general.
- 13.-Nivelacion y firmes de concreto
- 14.- Pegado de cerámica y molduras, según plano.
- 15.- acabado interiores, divisiones y sanitarios.
- 16.-exteriores, fundición de aceras y cerámicas antiderrapantes.
17. limpieza general.

Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto.

Para poder llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza, es necesario el involucramiento de toda la población del Casco Urbano, que son aproximadamente 1,200 hogares que son los beneficiarios directos del proyecto. Se realizaron varias reuniones para hacer conciencia a la población que el Municipio necesita promover la mejora educativa y cultural contando a la vez con áreas de recreación y para realizar labores meramente educativas para los visitantes y mismos habitantes de la ciudad.

El Gobierno mediante transferencia y la municipalidad de Lepaera ha sido la que brinda el terreno y otros fondos tanto municipales como transferencias del gob.central..

8. Impacto Ambiental.

Con el presente proyecto se ha levantado una ficha de Registro Biofísica y Socioeconómica de la localidad, en donde se describen características del medio como ser: Tipo de suelo, Pendientes del Terreno, Vulnerabilidad del terreno, cantidad de árboles etc. Esto para asegurar que el proyecto se construirá en una zona que reúna las características ambientales de calidad. A la vez mantener la zona limpia contando con sus respectivos depósitos de basura, vigilancia permanente para que no se dañe la vegetación.

9. Impacto en terreno y asentamientos.

Para la ejecución del presente Proyecto la Municipalidad a través de la Oficina de Dpto. Municipal de Catastro y La UMA de Lepaera Hizo verificación de terrenos, en vista que para llevar a cabo el proyecto se tiene que comprobar a través de las visitas si no se daña Terrenos, Viviendas y bosque natural

En la parte legal ya se hizo los tramites respectivos los beneficiarios se les solicita su apoyo para visitar a los dueños de terrenos por donde pasara el proyecto, en este caso servicio de servidumbre.

10. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara Castro, Jefe de la Unidad Técnica de Gestión. Teléfono No. 9807-2593, 2655-50-90 Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com, Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira.

Fuentes de Financiamiento.

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: Plan en Honduras, Gobierno de la Republica, Municipalidad.

11.Presupuesto del Proyecto.

El Año 2017 se inició por medio de la Municipalidad.

12.Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.

Diciembre de 2017

13. Estado del Proyecto actual.

El proyecto Construcción de Biblioteca Pública Municipal está en proceso.

14.Costo de finalización Proyectado

Costo Total Primera Etapa:

Aporte Municipal:

Presupuestado: Lps. 200,000.00

Ampliación: 1,099.049.65

Vigente: Lps.1,299,049.65

Con material Local:

Arena, grava piedra

Fecha de finalización proyectada:

31 de Julio de 2018.

15.Ejecución Del Proyecto

16.Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de 6 meses por la dimensión del proyecto a ejecutar.

De lo planificado apenas se ha ejecutado en un 3.05%.

En cuanto a la inversión financiera la Municipalidad en su presupuesto tenía la cantidad de **Lps. 200,000.00** pero según transferencias asciende a la **cantidad de Lps.1,299.049.65.**

17.Variación en el costo total del Proyecto.

No ha existido variación en cuanto a la ejecución del proyecto, ya que se está realizando bien todo de acuerdo a lo planificado.

Costo Total Primera Etapa:

Aporte Municipal:

Presupuestado: Lps. 200,000.00

Ampliación: 1,099.049.65

Vigente: Lps.1,299,049.65

Con material Local:

Arena, grava piedra

Fecha de finalización programada

31 de Julio de 2018



18.Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.



No hubo variaciones en cuanto al alcance y duración del proyecto ya que se cumplió en seis meses, tiempo máximo; ya que todos los materiales y mano de obra estaban a disposición inmediata en el municipio. La etapa ya tiene un avance considerable de manera satisfactoria tanto para la municipalidad como para la fuentes financieras externas, ambas partes se portaron a la altura cumpliendo cada organización participante con los que se les encomendó hasta la etapa donde se encuentra el proyecto en este momento.

19.Razones de los cambios antes mencionados.

No hubo cambios porque todo el proyecto se está ejecutando de acuerdo a lo planificado.

Anexos

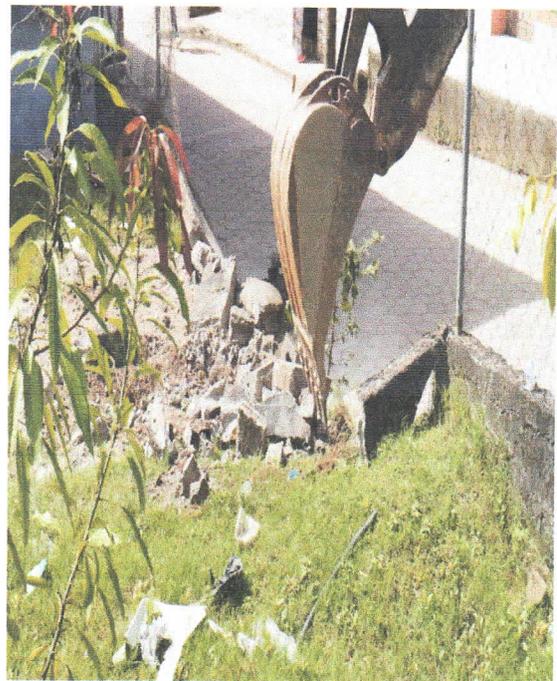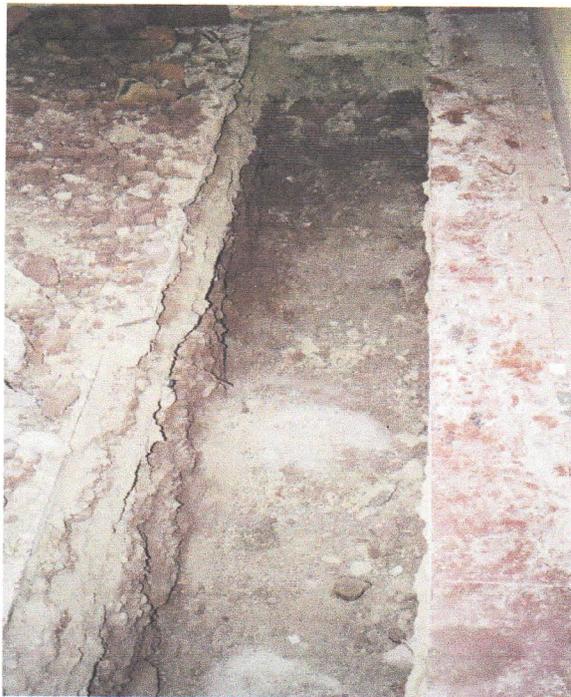

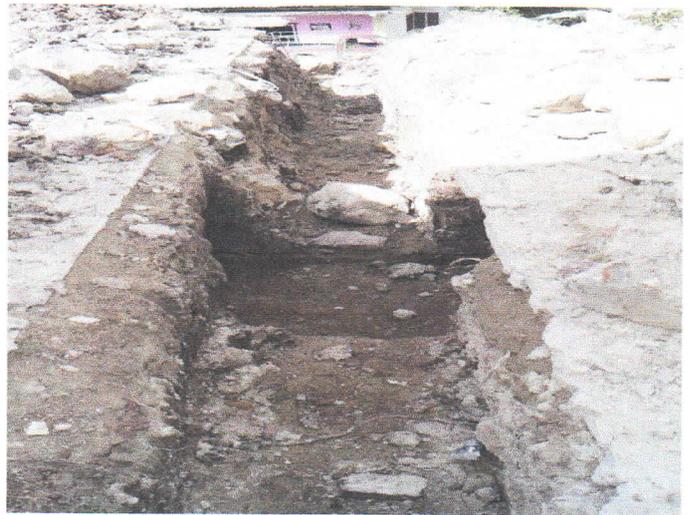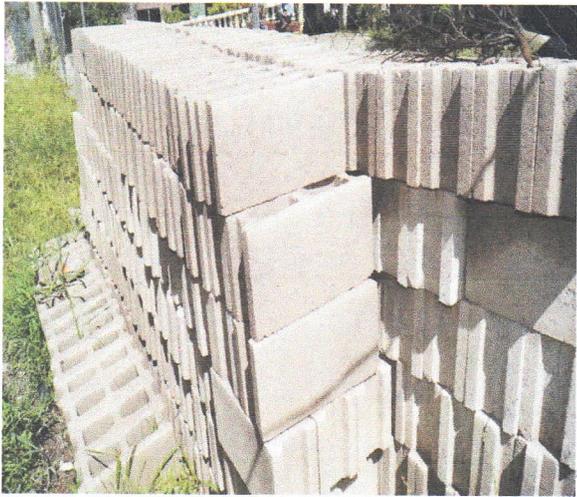



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA



NOMBRE DEL PROYECTO

**CONSTRUCCION DE
"Mejoras y Adiciones al Edificio Municipal"**

BENEFICIARIOS.

HABITANTES DE LEPAERA, LEMPIRA

Solicitado A:

LEPAERA, LEMPIRA

HONDURAS C.A Febrero de 2018


Mano Rosales
Carbo

FICHA DE PROYECTO

MEJORAS Y ADICIONES AL EDIFICIO MUNICIPAL

1. Identificación del Proyecto

Encargado de la ejecución del proyecto
Alcalde Municipal
Edgar Antonio Murillo

2. Sector o Sub sector

Sector: Infraestructura Social

3. Nombre del Proyecto

Construcción de Proyecto de: Mejoras y Adiciones al Edificio Municipal” en Lepaera, Lempira.

4. Ubicación del Proyecto.

Barrió San Juan, Municipio de Lepaera

5. Propósito

Mejorar la infraestructura del edificio municipal, contribuyendo de esa manera a brindar un mejor aspecto a las instalaciones físicas de este inmueble y a la vez para brindar una mejor atención a los habitantes del casco urbano de Lepaera y personas que visitan el municipio

6. Descripción del Proyecto.

El presente proyecto consiste en la realización de adiciones y mejoras del edificio de la municipalidad de Lepaera, se reparan cielo raso, repello de paredes, se construye el cielo raso del centro Cultural Municipal, en donde se hizo por completo de la estructura quedando el acabado de acuerdo al lugar y se pintó dándole un toque moderno, además de eso se pintaron otras áreas de la cancha multiusos que está dentro del edificio municipal. Se adecuaron oficinas municipales, podríamos mencionar que dentro de este proyecto tan

necesario se incluyen reparación de tuberías internas, filtraciones de agua por la terraza y otros.

Es necesario mencionar que el proyecto se ejecutó con fondos del gobierno de la república mediante transferencia a la municipalidad y fondos propios de la municipalidad. El presente proyecto se le dará seguimiento ya que siempre surgen problemas de infraestructura dentro del edificio. Los materiales que más se utilizaron para hacer las adiciones y mejoras del edificio fueron los siguientes:

Repello y pulido de paredes
Pintura para pintado de paredes de salón Cultural.

7. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto.

Para poder llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza, es necesario el involucramiento de toda la población del Casco Urbano, que son aproximadamente **1,200** hogares que son los beneficiarios directos del proyecto. Se realizaron varias reuniones para hacer conciencia a la población que el Municipio necesita promover el turismo contando con áreas de recreación para los visitantes y mismos habitantes de la ciudad.

El Gobierno mediante transferencia y la municipalidad de Lepaera ha sido la que ha brindado el aporte principal.

8. Impacto Ambiental.

Con el presente proyecto se ha levantado una ficha de Registro Biofísica y Socioeconómica de la localidad, en donde se describen características del medio como ser: Tipo de suelo, Pendientes del Terreno, Vulnerabilidad del terreno, cantidad de árboles etc. Esto para asegurar que el proyecto se construirá en una zona que reúna las características ambientales de calidad. A la vez mantener la zona limpia contando con sus respectivos depósitos de basura, vigilancia permanente para que no se dañe la vegetación ni la fuente de agua.

9.-Impacto en terreno y asentamientos.

Para la ejecución del presente Proyecto la Municipalidad a través de la Oficina de Dirección de municipal de Justicia y La UMA de Lepaera Hizo verificación de terrenos, en vista que para llevar a cabo el proyecto se tiene que comprobar a través de las visitas si no se daña Terrenos, Viviendas y bosque natural

A los beneficiarios se les solicita su apoyo para visitar a los dueños de terrenos por donde pasara el proyecto, en este caso servicio de servidumbre.

9. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara Castro, Jefe de la Unidad Técnica de Gestión. Teléfono No. 9807-2593, 2655-50-90 Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com, Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira.

Fuentes de Financiamiento.

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: Plan Internacional en Honduras, Gobierno de la Republica, Municipalidad.

10.Presupuesto del Proyecto.

El Año 2017 se inició por medio de la Municipalidad.

11.Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.

Diciembre de 2018

12.Estado del Proyecto actual.

El proyecto Adiciones y Mejoras del Edificio Municipal.

13.Costo de finalización Proyectado

Costo Total Primera Etapa:

Aporte Municipal:

Presupuestado: **Lps. 499,803.52**

Con material Local:

Arena, grava piedra

Fecha de finalización proyectada:

Diciembre de 2018.

14. Ejecución Del Proyecto

15. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de 12 meses pero este tipo de proyecto es continuo ya que a la municipalidad permanentemente se le está dando mantenimiento.

De lo planificado ya se ha ejecutado en un **100%**. en lo que corresponde a la parte de física, en la parte financiera en un **10.73%**

En cuanto a la inversión financiera la Municipalidad en su presupuesto tenía la cantidad de **Lps. 499,803.00** y se ha pagado la cantidad de **Lps. 53,640.00** quedando pendiente de ejecutar la cantidad de **Lps. 446,163.00**

16. Variación en el costo total del Proyecto.

No hubo variación en cuanto a la ejecución del proyecto, ya que se realizó bien todo lo planificado solo en la parte financiera falta por ejecutar, pero estos pagos se seguirán dando conforme lo planificado.

Monto Solicitado:

Costo Total: **Lps. 499,803.00**

Aporte Municipal: **Lps. 499,803.00**

Ejecutado: **Lps. 53,640.00**

Pendiente a Ejecutar: **Lps. 446,163.00**

Fecha de finalización proyectada: Mes de Diciembre del año 2018

17. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

No hubo variaciones en cuanto al alcance y duración del proyecto ya que se cumplió en seis meses, tiempo máximo en lo que corresponde al Centro Cultural y las oficinas quedan para los otros seis meses restantes; ya que todos los materiales y mano de obra estaban a disposición inmediata en el municipio. La presente etapa ya está concluida, de una manera satisfactoria tanto para la municipalidad como para los beneficiarios, ambas partes se portaron a la altura cumpliendo cada organización participante con los que se les encomendó desde el inicio hasta la finalización.

18. Razones de los cambios antes mencionados.

No hubo cambios porque todo el proyecto se ejecutó de acuerdo a lo planificado.

Anexos

