



### **NOTIFICACION DEL PROYECTO**

En respuesta a la solicitud No OIP-005-03-01-2019 enviada el día 03 de Enero del presente año sobre la ejecución de proyectos y las diferentes licitaciones le doy a conocer por medio de esta tabla el avance del proyecto de pavimentación ciclópea.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del proyecto	Ing. Yessica Medina Claros
Sector	Sur del municipio de Cane.
Nombre del proyecto	Pavimentación ciclópea calle de acceso al cristo el mirador.
Ubicación del proyecto	Barrió san francisco, calle principal hacia el cristo el cerrito.
Descripción del proyecto	Este proyecto se lleva acabo para mejorar el sistema de vida de las personas vecinas, mejorar la vía de acceso, y también promocionar el turismo en el municipio.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcance del proyecto( principal de proyecto)	Preveer el deterioro de la sub rasante de las calles y la provocación de charcos e en las calles que provocan el criadero de zancudos y posteriormente las enfermedades en las personas del municipio.
Impacto ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamiento	No aplica
Detalle del encargado del proyecto	Ing. Yessica medina claros
Fuente de financiamiento	Alcaldía municipal.
Presupuesto del proyecto	Lps. 1,969,276.78
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Junio 2017
Estado actual del proyecto	Ejecutado aproximadamente en un 100%
Costo de finalización del proyecto	2,048,879.06
Fecha de finalización	29 Diciembre 2018
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	NO APLICA
Variación en el costo total del proyecto	79,602.28, 4% de variación del proyecto
Variación en el alcance de duración del proyecto.	NO APLICA



LIC. FRANCISCO BUSTILLO GONZALEZ  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [murricane@yahoo.com](mailto:murricane@yahoo.com)  
[www.murricane.org](http://www.murricane.org)

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente notificación a los 11 días del mes de Enero del año 2019




Fuente Fernando Martínez Ávila  
Desarrollo Comunitario/Proyectos

9. Sello de junta con asfalto.




10. Pintura de alto tráfico en bordillos.

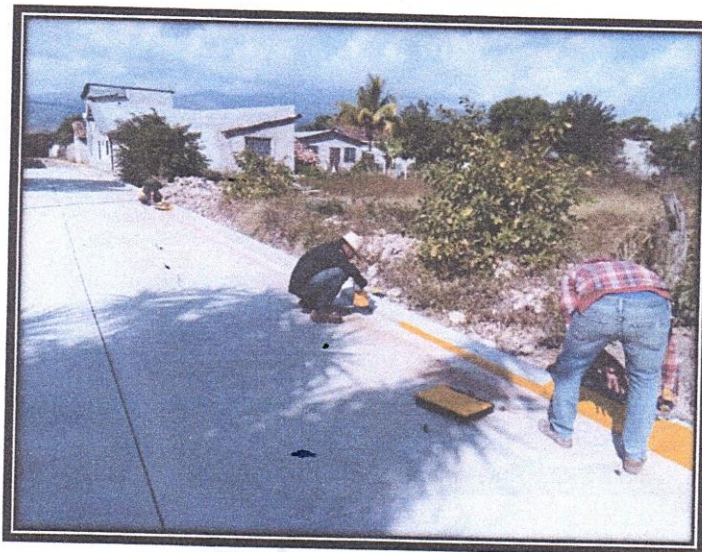


WALTER DAVID GUZMÁN LEAL  
INGENIERO CIVIL  
12-10-12  
22-10-12  
C.H., No. 5



7. Limpieza de calles.

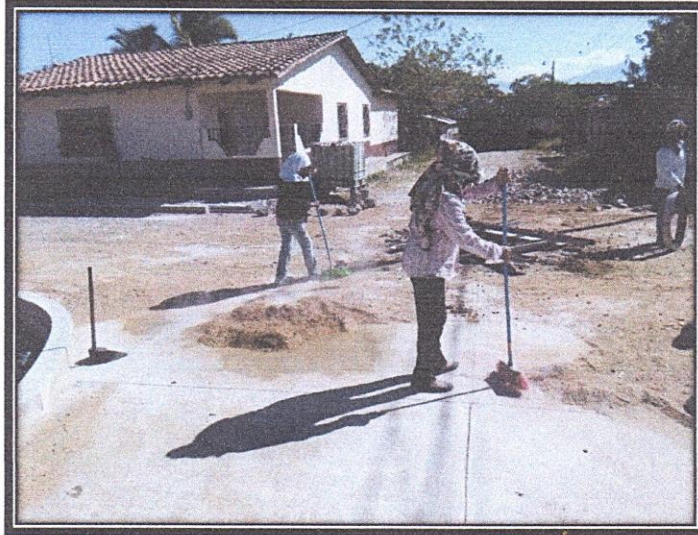


8. Corte de concreto en junta longitudinal.

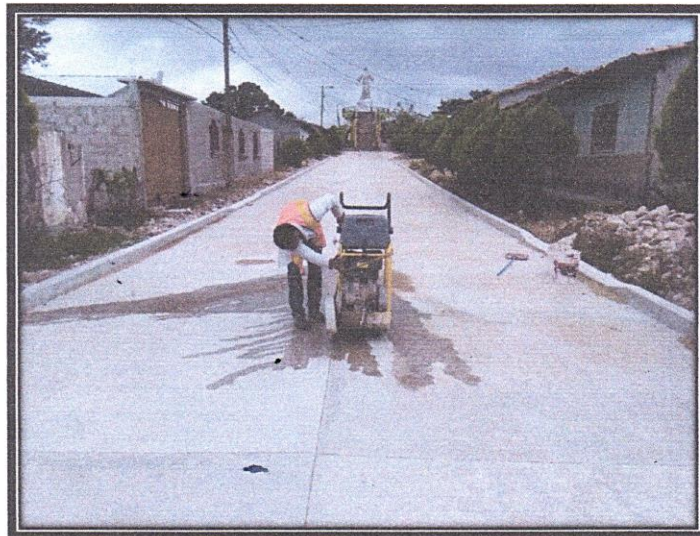


WALTER DAVID GUZMAN SALINAS  
INGENIERO CIVIL  
19-10-30  
24-10-30  
C.R. No. 6282

**Capturas fotográficas de los trabajos realizados en el periodo**

1. Colocación de piedra.

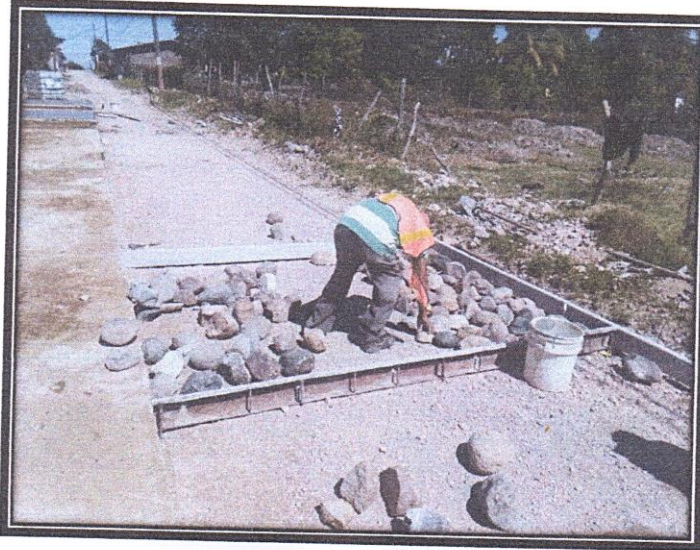

2. Acabado de pavimento.

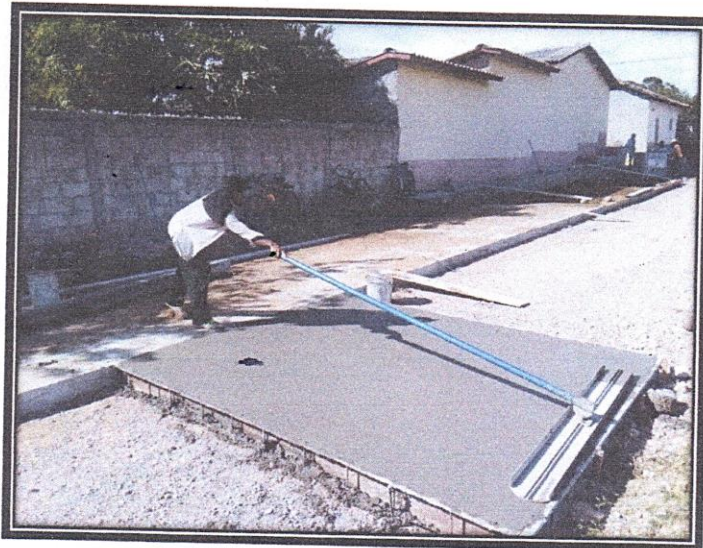

INGENIERO  
CIVIL  
19-10-12  
24-10-12

*[Handwritten signature]*





LIC. FRANCISCO BUSTILLO GONZALES

ALCALDE MUNICIPAL

E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)

[Www.municane.org](http://www.municane.org)

## CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA

La Infrascrita Secretaria Municipal y encargada del Registro que obra en el archivo de ésta Alcaldía CERTIFICA: Que en el folio **313**, Punto No. **6**, del tomo **24**, del libro de Actas Municipales correspondientes al año 2018, se encuentra el preámbulo y punto de acta que literalmente dice: Acta número **435** de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de Cane, La Paz, a los **CATORCE** días del mes de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL DIECIOCHO**, en el salón de sesiones, presidida por el señor **Alcalde Municipal Lic. Francisco Bustillo Gonzales** y contando con la presencia de los siguientes los miembros: Regidores por su orden, **Alex Omar Martínez Suazo** Regidor Primero, **Boris Alejandro Salinas Martinez** Regidor Segundo, **Tito Jehovany Contreras Villatoro** Regidor Tercero, **María Mercedes Romero Corea** Regidor Cuarto, Así mismo se contó con la asistencia de los miembros de la Comisión Ciudadana de Transparencia, miembros del Consejo de Desarrollo Municipal (CODEM); Hipólito Chavarría Moran Alcalde Auxiliar de las Calabazas, Cristian David Aguilar Alcalde Auxiliar El Carrizal. Desarrollándose la agenda de la siguiente manera: 1...2...3...4...5...6 **LOS HONORABLES MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL POR EL VOTO UNANIME DE TODOS SUS MIEMBROS ACORDARON: APROBAR LA ORDEN DE CAMBIO DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL CRISTO DEL CERRITO, POR LA CANTIDAD DE L. 79,602.28.**

Y, para los fines que se estimen conveniente certifico la presente en el municipio de Cane, Departamento de La Paz a los **ONCE** días del mes de **ENERO** del año **DOS MIL DIECINUEVE**.

  
Lidia Anel Orellana

Secretaria Municipal

*Municipalidad de Cane*
