



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.
corp.municolomoncagua@gmail.com



CONSTANCIA

De: María Maricela Hernández López
Unidad Técnica Ambiental

Edwin Alexander Sánchez Argueta
Técnico de Proyectos

Para: Nelson Alfredo Gonzales Yánez
Oficial de Acceso a la Información Pública

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido a la ley de transparencia y Acceso a la Información Pública, remito constancia de movimientos de fondos ejecutados en Proyectos durante el mes de Diciembre para que sea cargada a la plataforma del Portal Único de Transparencia.

Y para los fines legales que al interesado estime conveniente se extiende la presente constancia en el Municipio de Colomoncagua departamento de Intibucá a los 03 días del mes de Enero del 2019


Unidad Técnica Municipal




Técnico de Proyectos



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.
corp.municolomoncagua@gmail.com



Gastos Ejecutados en Proyectos en el mes de Diciembre

N.	Nombre de Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Fuente de Financiamiento	Monto Presupuestado de Proyecto	Ampliación de Proyecto	Monto ejecutado en el mes	Estado del proyecto	Observaciones
1	Construcción de cerca y mejoramiento de centro de salud	Santa Ana	Que el centro de salud de dicha comunidad tenga una buena infraestructura	compra de materiales de construcción para poder continuar la ejecución de este proyecto	Municipal	100,000.00	60,000.00	8,400.00	en ejecución	
2	Mejoramiento de carretera	Los Amates	tener una mejor carretera y con alcantarillas en buen estado	Compra de materiales para poder instalar alcantarillas.	Municipal	175,000.00		18,040.00	en ejecución	
3	Ampliación de Proyecto de agua potable	Las Lomas centro	Mejorar el sistema de agua de esta comunidad y así brindar una mejor calidad de vida a los habitantes de esta comunidad.	compra de materiales para mejoramiento de sistema de agua potable	Municipal	50,000.00		49,990.00	ejecutado	
4	Mejoramiento de campo de fútbol	Los Amates	Mejorar el campo de fútbol a través de una construcción de baños	compra de materiales de construcción	Municipal		20,000.00	3,164.00	en ejecución	fase final del proyecto
5	Construcción de muro para nuevo kinder	Los Amates	Mejorar la infraestructura del centro educativo	compra de materiales de construcción	Municipal		20,000.00	8,500.00	ejecutado	
6	Mejoramiento de vivienda	todo el municipio	Contribuir a que las personas tengan una mejor calidad de vida.	compra de materiales para que personas de escasos recursos económicos puedan mejorar sus viviendas	Municipal	636,057.06	163,745.69	4,356.00	en ejecución	fase final del proyecto

7	Mejoramiento de carretera	El castaño a San Antonio vados	tener un mejor acceso con una carretera en buen estado	Pago de maquinaria que trabajo en el mejoramiento de dicha carretera	Municipal	150,000.00		150,000.00	ejecutado	Proyecto ejecutado (queda horas maquina por pagar)
8	Mejoramiento de carretera y construccion de cerca perimetral	El Castaño	Tener una carretera en buen estado para que sea transitable	pago de maquinaria por horas maquina trabajadas	Municipal	120,000.00		52,860.00	ejecutado	
9	Mejoramiento de sistema de agua potable	san Marcos	Mejorar el sistema de agua de esta comunidad y así brindar una mejor calidad de vida a los habitantes de esta comunidad.	compra de materiales para mejoramiento de sistema de agua potable	Municipal	100,000.00		100,000.00	ejecutado	
10	sistema de bombeo de agua Proyecto Los Mangos	Llano Grande	Que los estudiantes que asisten al CEB y habitantes de este sector de la aldea del llano se beneficien con el agua potable	Compra de materiales de electricidad	Municipal	100,000.00	28,660.68	22,000.00	en ejecucion	
11	Mejoramiento de sistema de electrificacion	El Almendro	Mejorar la calidad de vida de varios habitantes de la comunidad que no cuentan con energia electrica en sus viviendas	compra de materiales electricos para instalacion electrica en viviendas	Municipal	150,000.00		55,835.00	ejecucion	
12	Apertura de carretera	El picacho	contribuir al desarrollo de esta comunidad a traves de la Aperura una carretera para que los habitantes de esta comunidad tengan vias de comunicacion	Pago de maquinaria que esta trabajando en la apertura de carretera	Municipal	250,000.00		250,000.00	en ejecucion	

13	Mejoramiento de Parque municipal	Ba. San Pedro	Mejorar el parque municipal, para que sea un lugar de recreacion para la poblacion	compra de pintura para mejorar el parque	Municipal	100,000.00		4,137.00	en ejecucion	
14	Mejoramiento y reparacion de centro educativo	San Miguelito	Contribuir a mejorar la infraestructura de Centro de Educacion Basica	Pago de maquina ria ya que se trabajó enplanel para construccion de cancha multiuso	Municipal	100,000.00		9,600.00	en ejecucion	
15	Muro de constension en la casa de oracion	Limoncillo	construir un muro para seguridad de los feligreses que asisten a la casa de oracion ya que esta ubicado en un lugar de riesgo	compra de materiales de construccion para poder construir el muro	Municipal	100,000.00		71,280.00	en ejecucion	esta en la fase final del proyecto
16	Mejoramiento de carretera	Santo Domingo	Mejorar la carretera en las partes mas inaccesibles, con un enchapado de tramos de carretera	pago de mano de obra y traslado de material por trabajo en el proyecto	Municipal	80,000.00	23,491.38	82,067.33	en ejecucion	fase final del proyecto
17	muro de constension	La Travesia	construir un muro para que no se lave la carretera y para seguridad de los habitantes del Barrio	Pago por compra de materiales de construccion	Municipal	100,000.00	50,000.00	68,500.00	en ejecucion	
18	Mejoramiento de carretera	El Cpinol	Mejorar las condiciones de lacarretera que han sido dañados por las lluvias	Pago por traslado de balastro	Municipal	75,000.00	40,000.00	7,400.00	en ejecucion	
19	Mantenimiento y reparacion de edificio municipal	Barrio San Pedro	Mejorar la infraestructura del edificio municipal y otras reparaciones del mismo	pago por compra de material para poder mejorar y reparar el edificio municipal	Municipal	300,000.00		6,458.00	en ejecucion	

[illegible]



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.
corp.municolomoncagua@gmail.com




Municipalidad de Colomoncagua departamento de Intibucá

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Yo Daniel Hernández Presidente de Patronato de
la comunidad de Santo Domingo con tarjeta de Identidad:
1003-1951-00122 hago constar que recibí de conformidad los
materiales según detalle o/factura comercial., Adjunta No _____
Los cuales que serán utilizados en el Proyecto:
Mejoramiento De Carretera


Cantidad	Descripción
200	Bolsas de Cemento

Para lo cual doy fe a los 04 días de Diciembre de 2017




Encargado de Proyectos




presidente de Patronato

Fotos de la carretera de la comunidad de Santo Domingo

Mejoramiento de Carretera

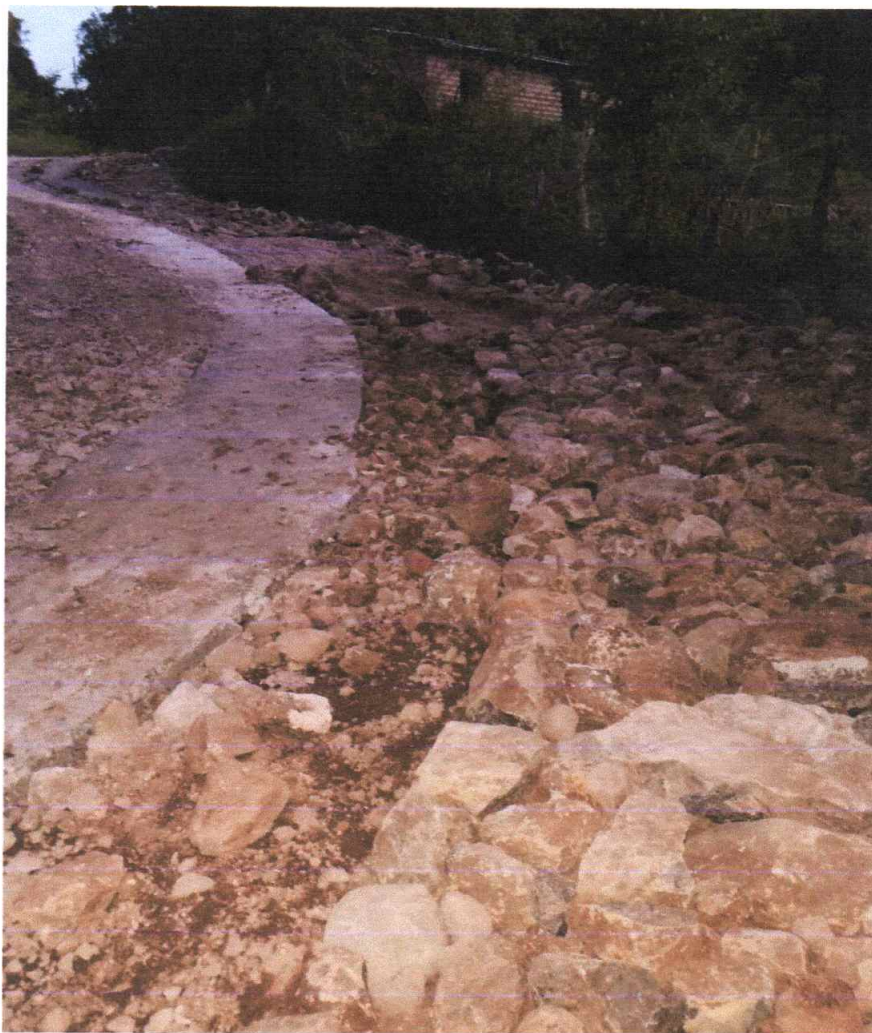





Municipalidad de Colomoncagua

Informe de Supervisión

Fecha de Supervisión: Miércoles 05 de Diciembre de 2018

Hora de llegada al proyecto 11:00 am Hora de salida 12:20 PM

Nombre del proyecto: Construcción de Cerca y mejoramiento de Centro de Salud

Ubicación: Santa Ana.

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución ☒ Abandono ☐ Terminada ☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Se supervisó este proyecto encontrando en el lugar, que si se está empezando a trabajar, comenzaron el día de ayer. Se lograron organizar para que personas de las distintas comunidades y caseríos beneficiarios del centro de salud salgan a trabajar en diferentes días. Se encontraron 7 personas trabajando en la sangradura para los arranques de la cerca del centro de salud según comentó el presidente de patronato y presidente de la junta de agua aun faltan materiales por recibir. Se adjuntan fotografías a la ficha de supervisión.


Firma del supervisor Asignado


Contratista

José Amilcar Sánchez

Visto bueno

De Presidente de Patronato

Supervision de Proyecto Construcción de Cerca y Mejoramiento de Centro de Salud

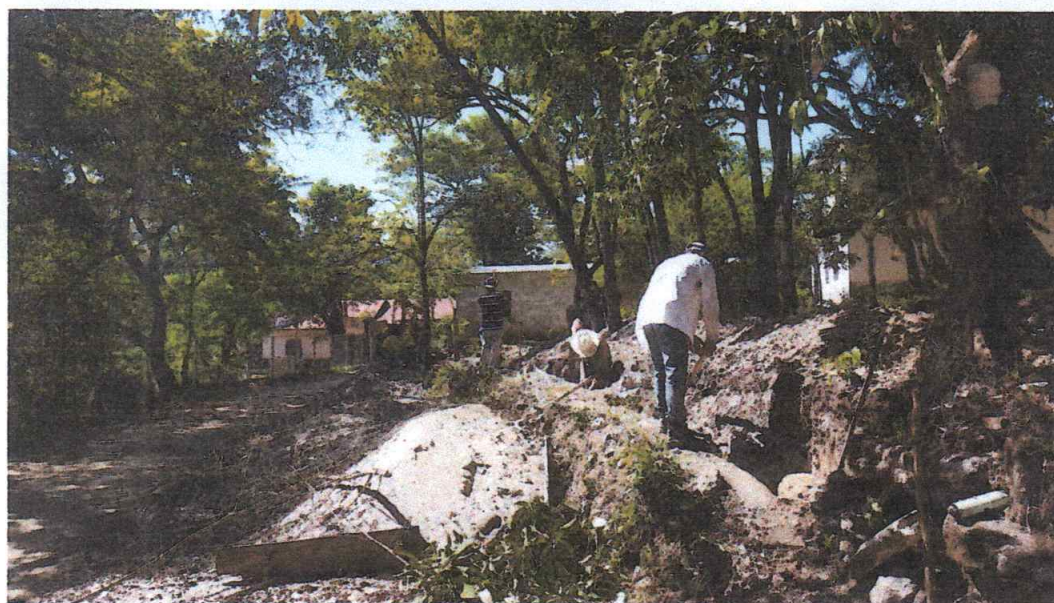





Municipalidad de Colomoncagua

Informe de Supervisión

Fecha de Supervisión: - Lunes 3 de Diciembre

Hora de llegada al proyecto 9:15am Hora de salida 9:58am

Nombre del proyecto: Cerca de Pedra Escolar.

Ubicación: Piedra Parada.

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución ☐ Abandono ☐ Terminada ☒

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Se supervisó este proyecto y se verificó que el proyecto está ejecutado en un 99%. por lo que es la última ficha de supervisión el día de ahora no se encontró trabajando los habitantes ya que según me comenta, la señora Benara estuvieron trabajando el día Miércoles y Jueves. Aproximadamente con un día más se termina en su totalidad el proyecto. Se toman fotografías para hacer constar la supervisión de este proyecto.


Firma del supervisor Asignado

Contratista

Maria Benara Amaya

Visto bueno

De Habitante de la comunidad



