



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE EJECUCION DE COMPRAS PARA PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019



Fecha	RTN Proveedor	Nombre de proveedor	Descripcion	Proyecto	Valor	Comunidad beneficiada
12/0572019	05019003184700	Ferreteria Peña Blanca	compra de cuadrado estructural de 1x1y tubo cuadrado de 2x2 galvanizado, tubo hg de 3/4 y tubo hg de 1/2	construccion de cerco perimetral en escuela Francisco Morazan y jardin francisco reyes arias	L. 3,585.40	El Vallecito



Ing. Josue Roberto Zuniga
Jefe de Unidad Tecnica

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

CAI:66E375-79569F-074ABE-47EF8A-9A22CE-D6

Cliente: C21-12571- MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Dirección de Entrega: 80. EL CENTRO, FTE AL PARQUE CENTRAL 9964-4987

RTN:
Referencia: 202659

Vendedor: 13 JAVIER SABILLON

Enviar a:

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito Tel: 2627-0610
comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700

Tienda: TIENDA PRINCIPAL
Fecha: 12-05-2019 10:58:49 AM

Pag 1 de 1

Orden de Compra:
Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:
No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripcion del artículo	Garantia	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio	Descuento	Total
TUBO ESTRUCT CUAD GALV 1X1 6MTS CH-14			2101 7192	4.00	321.0000	0,00	1.284,00
TUBO CUADRADO GALV. 2X2 CH 14			2101 7137	2.00	590.0000	0,00	1.180,00

ULTIMA LINEA



Cantidad en Letras

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 60 CTVS

Factura No: 000-002-01-00095335 CREDITO 30 DIAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00094001 000-002-01-00112000

Fecha Limite de Emisión: 07/01/2020

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE: _____

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2.464,00
Importe Gravado 18% L.	0,00
Desuento Otorgado L.	0,00
I.S.V. 15% L.	369.60
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	2,833.60

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

CA1166E375-79569F-074ABE-47EF8A-9A22CE-D6

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito Tel: 2627-0610
comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700

Cliente: C21-12571 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Tienda: TIENDA PRINCIPAL
Fecha: 25-04-2019 11:55:51 AM

Pag. 1 de 1

Dirección: BO. EL CENTRO, FTE AL PARQUE CENTRAL 9964-4967

de Entrega: RTN: Orden de Compra:

Referencia: 202076 Orden de Compra Exenta:

Vendedor: 13 JAVIER SABILLON No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:	Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Total
	TUBO HG TICO 3/4X6MTS.			2101 070203	1.00	380.0000	0,00	380,00
	TUBO HG TICO 1/2X6MTS.			2101 070202	1.00	273.7467	0,00	273,75

ULTIMA LINEA



Cantidad en Letras: **SETECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 81 CTVS**
Factura No: **000-002-01-00094752 CREDITO 30 DIAS**
Rango Autorizado: 000-002-01-00094001 000-002-01-00112000
Fecha Limite de Emisión: **07/01/2020**

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	653,75
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	98.06
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	751.81

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!! NOMBRE DE CLIENTE: _____



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTÉS
Departamento de Secretaría Municipal
San Antonio de Cortés, Depto. de Cortés
Honduras C.A

CERTIFICACION

La Suscrita Secretaría Municipal de este Municipio **CERTIFICA** Que: En el Libro de Actas que lleva esta Municipalidad, correspondiente al año **2018** Se encuentra el punto de acta que literalmente dice: **Acta N° 16º** Sesión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal de San Antonio de Cortés, el día viernes 03 de Agosto del año dos mil dieciocho, a las 9:30. a.m. en el Salón de Conferencia de la Municipalidad.- Presidio la Sesión el Sr. Alcalde Municipal Santos Antonio Murillo Rivera, con la asistencia de la Vice Alcaldesa Flor de Liz Fernández. **Reg.2º** José Fernando Mejía R. **Reg.3º** Miguel Ángel Quiroz Pérez.-**Reg.4º** Lourdes Suyapa Rivera García.-**Reg.5º** Erika Senovia Madrid Fernández.-**Reg.6º** Luis Fernando Sabillon Gómez.-**Reg.7º** Jesús Escalante.-**Reg.8º** Nolvía Rosibel Madrid Fernández, Secretaría que da fe, dejando de asistir el **Reg.1º** Amner Mendoza Motiño.-asistiendo el Representante de Water For People Ing. Henry Gudiel, el Tecnico Municipal Ivís Rolando Rivera Ayala, el Asistente Ismael Antonio Hernández la Asistente de Secretaría Jessica Carolina Hernández Barrera, los representantes de la Junta Central de Agua Casco Urbano Prof. Edwin Moreno, el Bachiller Tecnico en Computación Eriko Cruz, la Representante de la Junta de Agua Barrio Plan de la Cruz Sra. Carla Medina, el Representante de la Junta de Agua Barrio Coronel García Oscar Orlando Alvarenga se procedió a lo siguiente: **1º....2º....3º....4º....5º....6º....7º....8º....9º....10º....11º....12º....13º....14º....15º....16º....17º....18º....19º....20º....21º....22º** El Alcalde Municipal Santos Antonio Murillo informo a la Corporación Municipal de los proyectos ejecutados y en proceso de estudio y ejecución los que a continuación se describen:

- 1º) Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable Colonia Harris.
- 2º) Construcción de Aula en kínder Víctor García Aldea El Encanto.
- 3º) Construcción de Caja Puente Barrio Las Americas.
- 4º) Proyecto Electrificación con Paneles Solares Aldea la Providencia, Las Margaritas, Perdices, El Picacho, El Golfo, Candungo, La Chachona, Agua Sarca, Las Crucitas, Nueva Union, Quebrada Seca.
- 5º) Mejoramiento de Tanque de Agua Potable Aldea El Sitio.
- 6º) Construcción de Proyecto línea de conducción de Agua Potable Aldea Nueva Granada.
- 7º) Construcción de Represa, Reconstrucción de línea de Conducción de Agua Potable y Rompe Cargas Aldea El Encanto.
- 8º) Construcción de Proyecto Canopy Aldea El Encanto.
- 9º) Construcción de Cerca Perimetral en kínder Ing. Jack Arévalo Fuentes, Aldea El Sitio.
- 10º) Mejoramientos de Viviendas paredes construcción de pisos, techos, varias Aldeas.

11ª) Mejoramientos de viviendas construcción de gallineros varias Aldeas.

12ª) Remodelación de Aula vieja en Kinder Víctor García Aldea El Encanto.

13ª) Proyecto Reparación Carretero Nueva Granada, San Antonio de Cortes (desde la quebradona desvió Candungo, Nueva Unión, El Encanto, Santa Rita, Buenos Aires, La Chachona, Corredor San Luis, El Golfo, Vallecito, Picacho, Por Venir, Perdices y Ceibita, calles principales Casco Urbano.

14ª) Proyecto Red de Distribución Agua Potable Cordoncillos.

15ª) Construcción de Cerco Perimetral y Portones de accesos Escuela Rural Mixta Francisco Morazán y Kinder Francisco Reyes Arias del Vallecito.

16ª) Finalización de una Aula Escuela Soberanía Colonia San Juan.

17ª) Construcción de rejillas aguas lluvias frente a la Iglesia Católica.

Informes que fueron del conocimiento y aprobado por la Corporación Municipal. 23ª...24ª...25ª...26ª...27ª...28ª...29ª...30ª...31ª...32ª...33ª...34ª...35ª No habiendo más que tratar se levantó la sesión, Sello Santos Antonio Murillo Rivera Alcalde Municipal, Vice Alcaldesa Flor de Liz Fernández, José Fernando Mejía, Miguel Ángel Quiroz Pérez, Lourdes Suyapa Rivera García, Erika Senovia Madrid Fernández, Luis Fernando Sabillon Gómez, Jesús Escalante, Nolvía Rosibel Madrid Fernández, Sello. Ana Gertrudis Hernández Secretaria Municipal.

Extendida en San Antonio de Cortes, Departamento de Cortes, a los seis días del mes de Agosto del año dos mil dieciocho.


Ana Gertrudis Hernández
Secretaria Municipal



El Vallecito, San Antonio de Cortés 2 de junio del 2018

Dr. Santos Antonio Murillo Rivera
Alcalde Municipal
Corporación Municipal

Reciban un cordial saludo de parte de nuestra comunidad a la vez esperamos se encuentren cosechando éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio les estamos solicitando la construcción de la cerca perimetral de la escuela "Francisco Morazán" juntamente con el Jardín de Niños "Francisco Reyes Arias", el cual esta en muy malas condiciones y para evitar perjuicios a nuestras instalaciones, lo necesitamos. La obra consiste en 166.76 mts. Alrededor y una división entre la escuela y el jardín de niños de 40 metros lo cual hacen un total de 206.76 mts. Lineales de cerco.


Nos despedimos agradeciendo la atención prestada y esperamos que nuestra petición sea tomada en cuenta y resuelta en forma positiva.



Presidente de Patronato



Presidente A.P.F. Escuela



Directora de la Escuela

TITULO DEL PROYECTO

“Fortaleciendo la Integridad Física de los niños y niñas de nuestra comunidad”

ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA

Patronato pro mejoramiento de la aldea El Vallecito, Asociación de Padres de Familia, Director del Jardín de Niños “Francisco Reyes Arias” y Directora de la Escuela

“Francisco Morazán”

PRESENTADO A:

Municipalidad de San Antonio de Cortés


LUGAR Y FECHA:

El Vallecito, San Antonio de Cortes, Julio del 2018



INSTITUTO
COFE

2/4

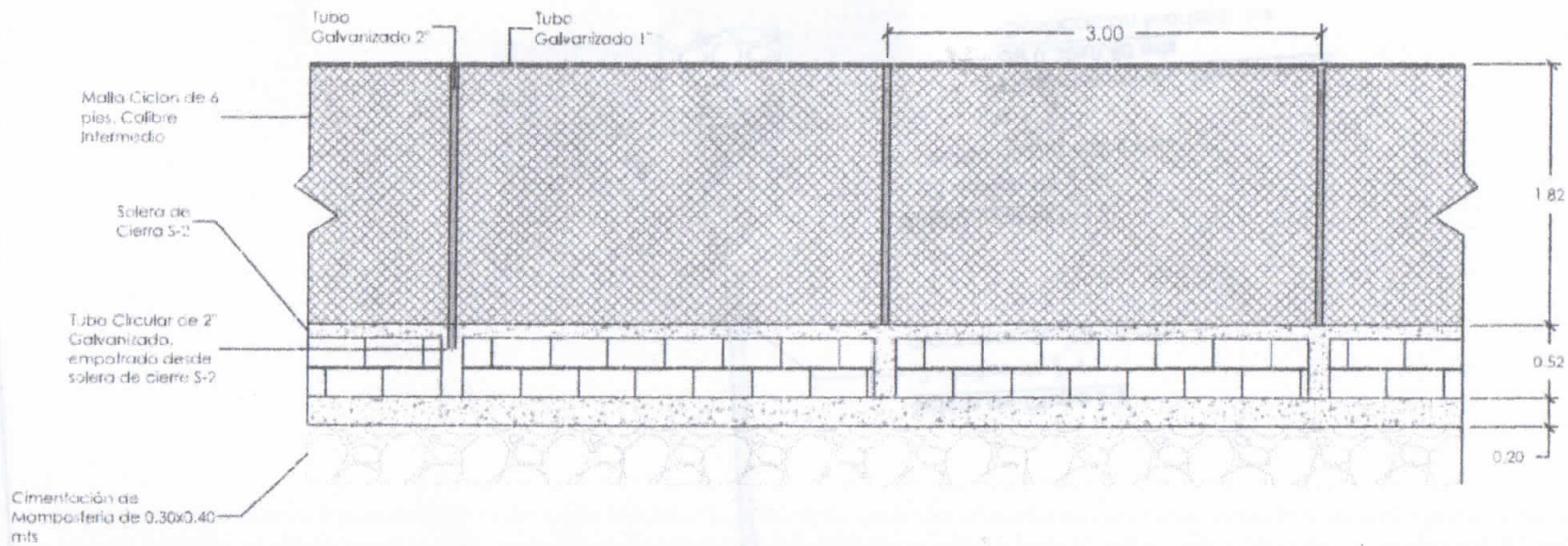

Contenido:

Fachada
Constructiva

Escala:

S/E


Fecha:

Dibujó:

Ing. Josue Zunga

Plano:

2/4

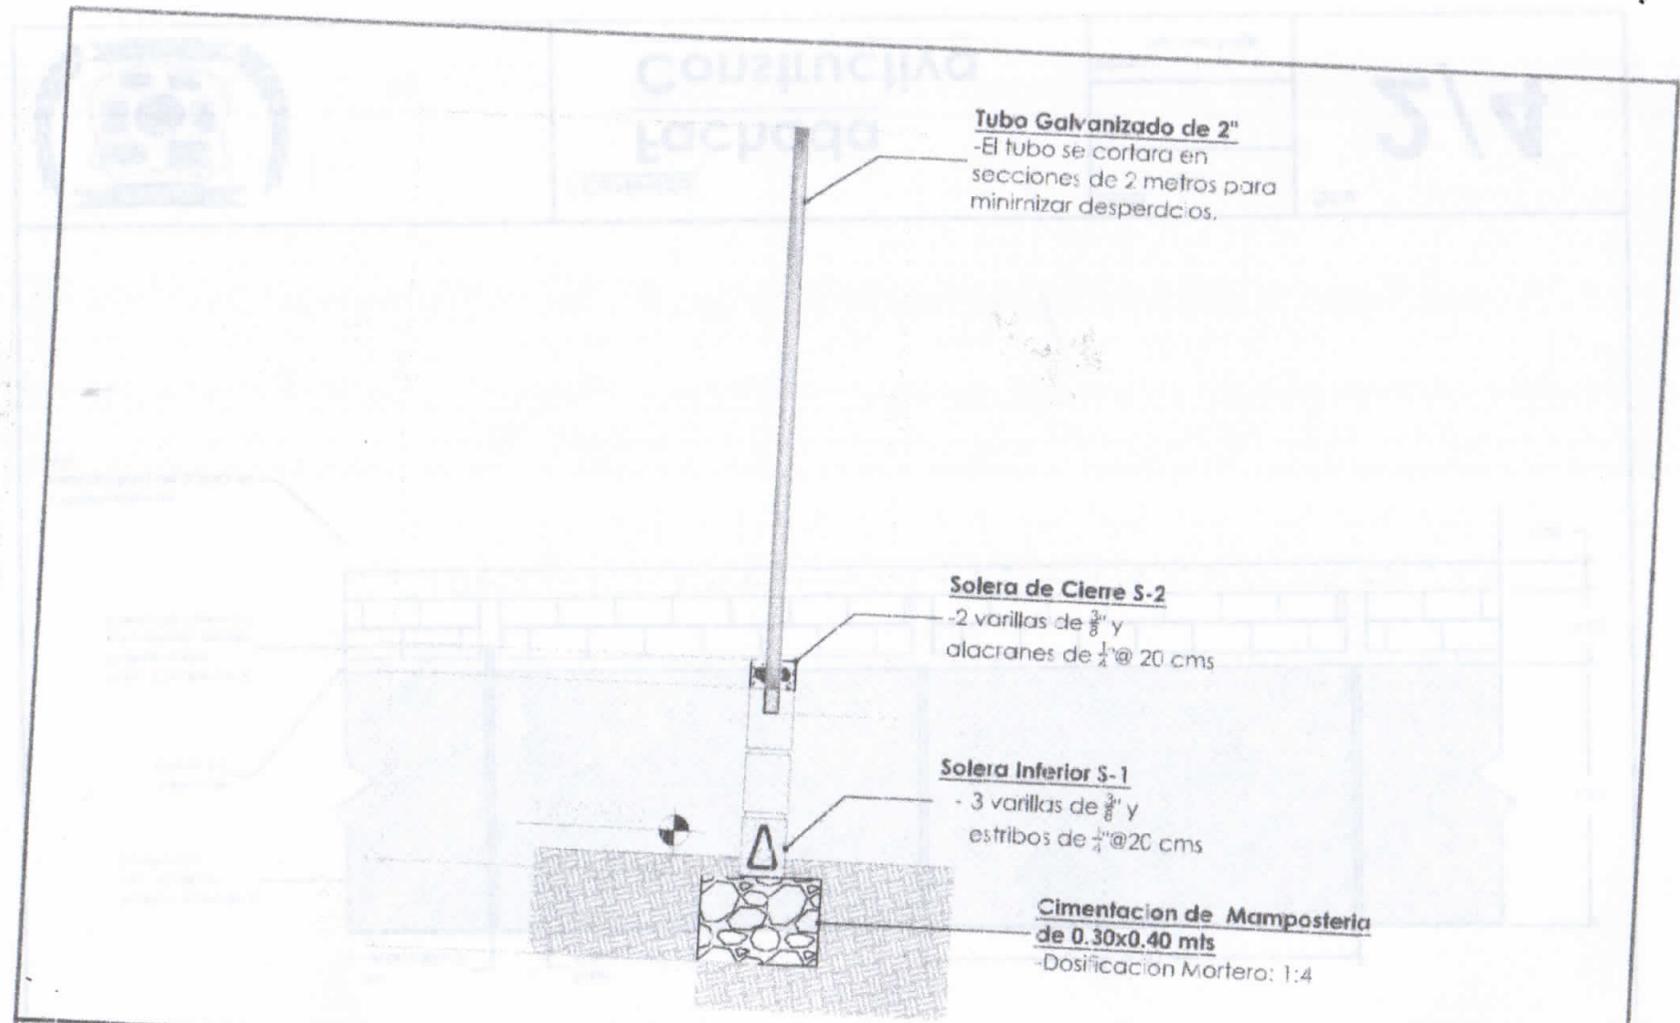

Tubo Galvanizado de 2"

-El tubo se cortara en secciones de 2 metros para minimizar desperdicios.

Solera de Cierre S-2


-2 varillas de $\frac{3}{8}$ " y alacranes de $\frac{1}{4}$ "@ 20 cms

Solera Inferior S-1

- 3 varillas de $\frac{3}{8}$ " y estribos de $\frac{1}{4}$ "@20 cms

Cimentacion de Mamposteria de 0.30x0.40 mts

-Dosificacion Mortero: 1:4



Contenido:

Corte Transversal

Escala:

S/E

Fecha:

Dibujó:

Ing. Josue Zuniga

Plano:

4/4

Nombre del Proyecto: "Fortaleciendo la Integridad Física de los niños y niñas de nuestra comunidad"

Ubicación: Aldea El Vallecito, Municipio de San Antonio de Cortes, Departamento Cortés.

Responsables de la implementación:

- ✓ Patronato El Vallecito, Edwin Tofee Peralta Presidente de Patronato Cel. 95044605
- ✓ Directora y Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Francisco Morazan, Esteban Peralta Limas Presidente Soc. Padres de Fam. 97981978, Liliana Yolibeth Montoya Directora de la Escuela 94851948
- ✓ Director y Asociación de Padres de Familia Jardin de Niños Francisco Reyes Arias, Rudy Viloney Peralta García Cel. 97569393
- ✓ Municipalidad

Tiempo de duración del proyecto: 1 de agosto al 30 de septiembre del 2018

Población Participante H 50 M 50 Niños 43 Niñas45

Costo TOTAL DEL PROYECTO: Es de L. 288,489

APORTE LOCAL: L. 50,322.00

APORTE SOLICITADO: L. 238,167.00

I. Justificación del Proyecto

El Jardín de niños y la Escuela de la aldea del Vallecito tiene como prioridad realizar la construcción de la cerca perimetral de dichos centros educativos, ya que es una necesidad latente por que limita con la calle principal donde transitan muchos vehículos y nos pueden golpear cualquier niño que en horas de recreo salen a consumir sus alimentos, y por deterior a la infraestructura de los centros educativos, es por ello que hemos elaborado dicho perfil para que se nos brinde una ayuda.

II. Antecedentes

La escuela como primer centro educativo contaba con una cerca perimetral construida con malla ciclón y postes de concreto en la actualidad está deteriorado y no hay seguridad para poder entrar a las instalaciones y luego en el año 2015 se construyó el edificio del jardín de niños por una ONG'S y de la misma manera quedo expuesto a que cualquier persona y animal puedan entrar y deteriorar las instalaciones físicas de estos centro educativos y en el peor de los casos ocasionarles daños a los alumnos.

Objetivos.

Objetivo general: Que los niños y niñas convivan en un lugar sano y seguro donde puedan recibir la enseñanza que los ayude a desarrollarse como ser humano.

Objetivo específico:

- Brindar a los niños y niñas un ambiente agradable y seguro sin que tengan que preocuparse de peligros del entorno.
- Velar por que cada niño tenga una mejor seguridad.
- Despertar en la sociedad el interés por cuidar el ambiente en que se desenvuelven los niños y niñas.

III. Problema a Solucionar análisis causas y efectos:
SE PUEDEN ORIENTAR POR EL CUADRO SIGUIENTE

El ahora (problema priorizado)	El después (objetivo priorizado)	Factores que deben atenderse para que la situación cambie.
Inseguridad: Estan expuestos	Seguridad Niños y Niñas gozan en un ambiente seguro	Concientizar a los padres sobre la importancia de los proyectos que vienen a mejorar las instalaciones de la Institución,

IV. Productos/resultados esperados

Producto/ Resultado	Indicador/Unidad de Medida	Intervención / Actividad / Proceso	Observaciones
Menos Inseguridad.	100% de seguridad	Directores Maestros Padres Alumnos Fuerzas Vivas	Se cuenta a que los NN gozan de un ambiente digno, ya que les permite a que puedan adquirir una mejor aprendizaje.

V. Plan de Ejecución de Actividades

Actividad	Presupuesto	Fecha	Responsable	Observación
Sanjeadura, fundición y acarreo de piedra	L. 22,500.00	15 Días	Padre de Familia Albañil	10 Padres por día
Pegado de Bloque y instalación del tubo	L. 9,000.00	12 Días	Padres de Familia Albañil	5 padres de familia por día
Instalación del Malla Ciclón	L. 900.00	3 Días	Padres de Familia Albañil	2 padres por día
Elaboración de tres portones	L. 1,500.00	5 Días	Padres de Familia Albañil	2 padres por día
Total	L. 33,900.00	35 Días		

Observaciones	Intervención / Actividad / Ejes	Indicador / Meta de Resultado	Producto / Resultado
Se cuenta a que los niños gozan de un ambiente digno ya que los portones a que puedan adquirir una mejor aprendizaje.	Padres Alumnos Familia Vives	100% de seguridad	Menos Inseguridad




VI. Fuentes de financiamiento:

7.1 Aporte comunitario: La comunidad está dispuesta a aportar la cantidad de L. 50,322.00 para culminar la cerca y otros espacios que carece nuestro jardín de niños.

Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total	Procedencia
- Piedra	6	Volquetadas	L. 1,500.00	L. 9,000.00	
- madera	500	Pies cuadrado	L. 10.00	L. 5,000.00	
- Clavos de 3 pulg.	20	Libras	L. 18.00	L. 360.00	
- Discos de cortar hierro	10	Unidad	L. 30.00	L. 300.00	
- Electrodo	2	Cajas	L. 305.00	L. 610.00	
- Pulido	6	Sacos	L. 117.00	L. 702.00	
- Alambre de amarre	25	libras	L. 18.00	L. 450.00	
- Mano de obra no calificada	35	días	L. 150.00	L. 33,900.00	
Total				L. 50,322.00	

7.2 Aporte Institucional Solicitado: a la municipalidad

Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total	Procedencia
Bloque	1400	Unidad	L. 12.00	L. 16,800.00	
Arena	6	Volquetada	L. 2500.00	L. 15,000.00	
Tubo galvanizado de 2 pulg.	36	unidad	L. 1,011.00	L. 36,396.00	
Malla Ciclon calibre 11 de 6 pies	8	Rollo	L. 4,463.00	L. 35,704.00	
Varilla 3/8	50	unidad	L. 123.50	L. 6,175.00	
Varilla 1/4	30	Unidades	L. 46.00	L. 1,380.00	
Cemento	200	bolsa	L. 191.00	L. 38,200.00	
Tubo redondo 1 pulg. Chapa 14	16	unidad	L. 235.00	L. 3,760.00	
Varilla lisa de 1/2	24	unidad	L. 198.03	L. 4,752.00	
Mano de Obra Calificada		Contratista	L. 80,000.00	L. 80,000.00	
Total				L. 238,167.00	

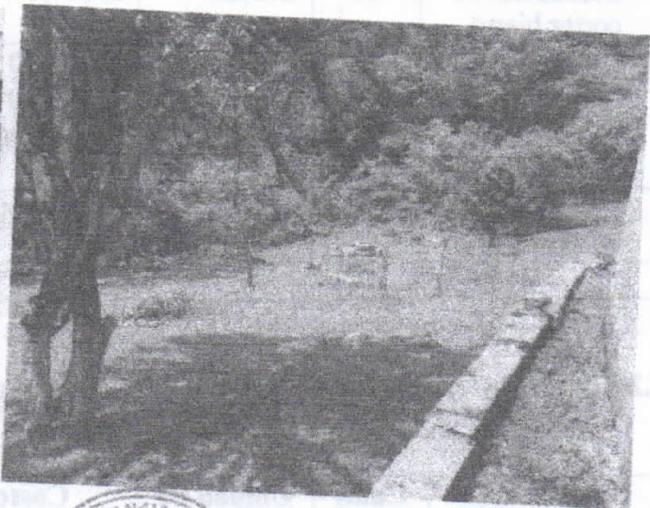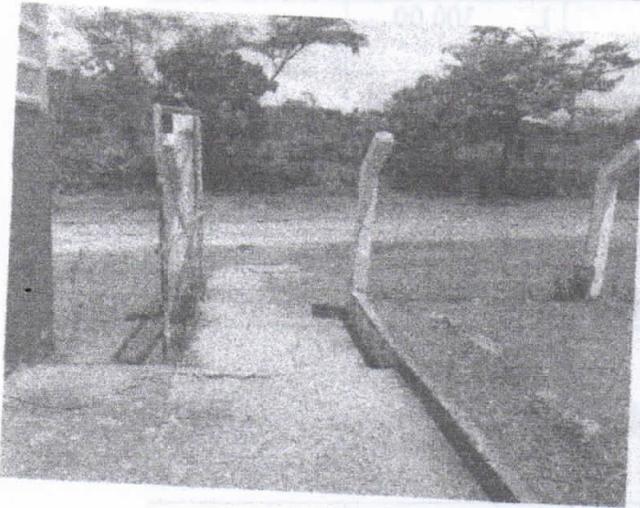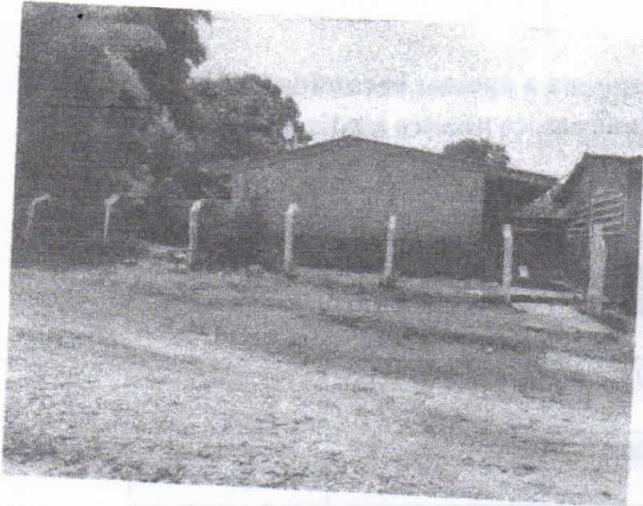

Esteban Rosalto Lima
Presidente de Asociación de Padres de Fam.

[Signature]
Directora de la Escuela Francisco Morazán

Rudy B. Rosalto
Presidente de Asociación de Padres de Fam.

[Signature]
Director del Jardín Francisco Reyes Arias

[Signature]
Presidente Patronato



[Signature]
Sujeto a
Técnica

revisión por unido
