



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

NOTIFICACION DEL PROYECTO

En respuesta a la solicitud No OIP-005-03-06-2019 enviada el día 03 de Junio del presente año sobre la ejecución de proyectos y las diferentes licitaciones le doy a conocer por medio de esta tabla el avance del proyecto de "mejoramiento de calle de acceso hacia las partidas "zona productiva" del casco urbano del municipio de Cane".

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del proyecto	Colindres constructora S DE R.L.
Sector	Casco urbano.
Nombre del proyecto	"mejoramiento de calle de acceso hacia las partidas "zona productiva" "
Ubicación del proyecto	Casco urbano del municipio
Descripción del proyecto	Este proyecto consiste en mejorar 1.7 km de calle con material selecto, utilizando patrol, volquetas vibro, para realizar un trabajo de calidad y así beneficiar a pequeñas emprendedores con negocio productivo.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcance del proyecto(principal de proyecto)	Este proyecto se priorizo en el plan de inversión municipal para mejorar el bienestar de las familias por medio de la producción de las tierras a productores.
Impacto ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamiento	No aplica
Detalle del encargado del proyecto	Colindres constructora S DE R.L.
Fuente de financiamiento	Alcaldía municipal.
Presupuesto del proyecto	Lps. 275,201.50
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Junio 2018
Estado actual del proyecto	Ejecutado en un 100.00%
Costo de finalización del proyecto	NO APLICA
Fecha de finalización	22 junio 2019
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	




LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	NO APLICA
Variación en el costo total del proyecto	NO APLICA
Variación en el alcance de duración del proyecto.	NO APLICA


Para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente notificación a los 07 días del mes de Mayo del año 2019




Fernando Martínez Ávila
Desarrollo comunitario/proyectos



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

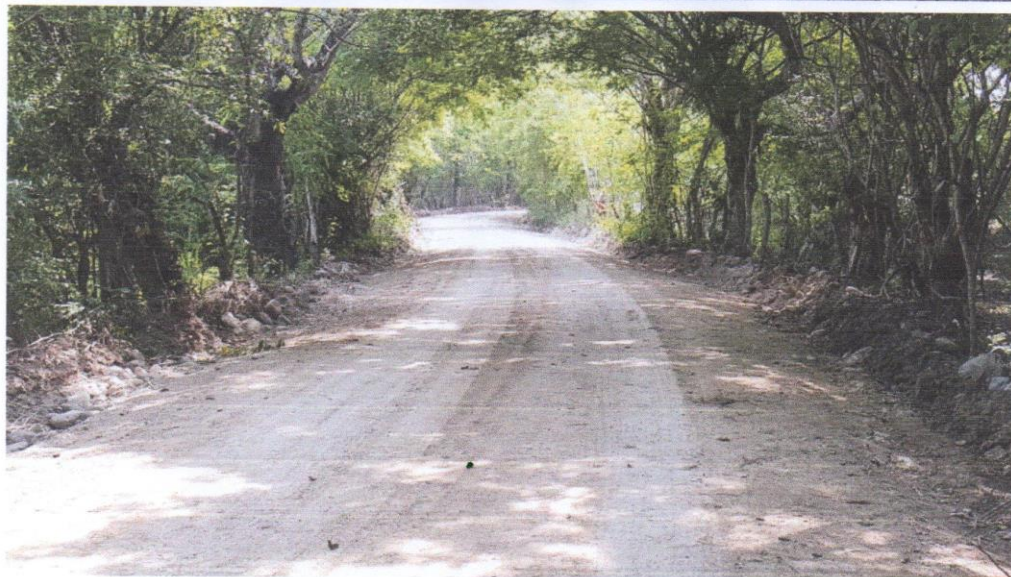



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org





ESTIMACION No 1
MUNICIPALIDAD DE CANE
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO HACIA LAS
PARTIDAS "ZONA PRODUCTIVA" "
UBICACIÓN: COMUNIDAD DE CANE, LA PAZ
EJECTOR: COLINDRES CONTRUCTORA
PERIODO DEL: 25 DE ABRIL DEL 2019 AL 15 DE MAYO DEL 2019

N	DESCRIPCION	PRESUPUESTO BASE			EJECUTADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD		TOTAL
1	Conformacion Tipo II	KM	1.70	18,500.00	31,450.00	0.00	0.00	1.70	31,450.00	1.70	31,450.00	100%
	Acarreo de Material											
3	Selecto	M3-KM	13,218.75	18.00	237,937.50	0.00	0.00	13,218.75	237,937.50	13,218.75	237,937.50	100%
4	Acarreo de Agua	GL-KM	34,200.00	0.17	5,814.00	0.00	0.00	34,200.00	5,814.00	34,200.00	5,814.00	100%
	TOTAL				275,201.50	0.00	0.00					
	TOTAL PRESUPUESTO COSTO DIRECTO				275,201.50	0.00	0.00	275,201.50		275,201.50	100.00	

ESTIMACION 1	275,201.50
RETECION DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA	13,760.08
RETECION DEL 12.5%	0.00
TOTAL A PAGAR	261,441.43

ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CANE, LA PAZ
CONTRATANTE

COLINDRES CONTRUCTORA S DE RL
CALLE 1204-GRUPO 08614
9540-6324
CONTRATISTA

DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE CANE, LA PAZ
SUPERVISOR



MUNICIPALIDAD DE CANE
LA PAZ, HONDURAS C.A.
FRANCISCO BUSTILLO GONZALES
ALCALDE MUNICIPAL

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Código: COT-CANE-03-2019

Nombre del proyecto **"MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO HACIA LAS
PARTIDAS "ZONA PRODUCTIVA"."**

Ubicación **MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO, LA PAZ.**

Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales.

A partir de la fecha abajo señalada, el solicitante asume la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida y entregada al mismo, por lo que deberá contactar con la comunidad beneficiada y/o la(s) institución (es) del estado relacionada (s) con la obra ejecutada, para que asuman la responsabilidad que les corresponde.

En fe de lo anterior se firma esta Acta, dando por concluido y recibido el proyecto.

CANE, LA PAZ 30/05/2019

Lugar y fecha



COMUNIDAD




ALCALDE MUNICIPAL



SUPERVISOR



TESORERA MUNICIPAL



JEFE DE PRESUPUESTOS

Municipalidad de Cane
