

Proyecto de reparación y mejoramiento de calles



**JULIO
2019**

PIMIENTA, CORTES

DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA

Extensión Territorial: 39.34 km²

Población: 26,084 personas

Ubicación geográfica

El Municipio de Pimienta se encuentra ubicado en el departamento de Cortés, al noreste del país. Se desarrolla principalmente a lo largo de la carretera CA-5 Norte que conecta a esa zona con el centro del país.

Ubicación: Geográficamente se localiza en las siguientes coordenadas:

desde	87°	58'	hasta	87°	58'	Longitud
		06"			40"	Oeste

desde	15°	16'	hasta	15°	17'	Latitud Norte
		49"			08"	

Colindancias:

Norte: Municipios de San Manuel y Villanueva

Sur: Municipio de Potrerillos

Este: Municipio de El Progreso, Depto. de Yoro

Oeste: Municipio de Villanueva



Altura: 60 msnm (promedio)

Relieve: La conformación de la superficie terrestre del municipio es plana ya que se encuentra, en su totalidad en un valle, con pendientes características que van de 0 a 5% de inclinación.

Acceso: El acceso al municipio se hace por la carretera CA-5 Norte, la cual cruza el municipio de norte a sur y conecta a las ciudades de Tegucigalpa con San Pedro Sula. Pimienta se ubica a escasos 26 km de San Pedro Sula.



Historia del municipio

El municipio de Pimienta se ubica en el Valle de Sula, en la parte sur del departamento de Cortés y es bañado por el caudaloso Río Ulúa. A sólo 3 km río abajo se localiza la unidad maya de Cerro Palenque, habitada hace más de 200 años y que, como parte del Patrimonio Cultural Tangible, es un sitio arqueológico actualmente reconocido como Monumento Arqueológico. Históricamente una considerable colonia de ciudadanos árabes, palestinos y centroamericanos instalaron sus negocios y empresas en Pimienta, dedicándose en su mayoría a la distribución de mercadería para el occidente de Honduras por la vía fluvial, lo mismo que como intermediarios en la explotación de varios productos provenientes del occidente. La zona de explotación del



ferrocarril nacional representa una parte muy importante del desarrollo de Pimienta, con una sección de línea, patios de acopio y fuentes de empleo para muchos ferrocarrileros.

En 1914, con la inauguración del puente ferroviario, queda totalmente comunicada la zona de Potrerillos, ocupando Pimienta el lugar comercial de mayor crecimiento, pues las compañías bananeras instalaron allí la pagaduría de fruta de San Manuel, Villanueva y Potrerillos.



El 7 de junio de 1934, siendo alcalde municipal don Alfonso Pineda Torres, el río Ulúa en una enorme crecida arrasó con el poblado de Pimienta causando daños incalculables, por lo cual en 1936 la población es trasladada al nuevo sitio, conocido como Nueva Pimienta.

Aldeas	Aldea Santiago Aldea La Venta
	Total de Viviendas Urbano: 4,172 Rural: 1,110
Recursos Naturales	Cerro el Palenque Río Ulúa
Infraestructura Principal	<u>RED VIAL</u> Carretera Interoceánica Carretera Secundaria
	<u>CENTROS EDUCATIVOS</u> Pre-escolares: 9 Escuelas: 9 Centro Básico 1 Colegios: 4
	<u>CENTROS DE ASISTENCIA MEDICA</u> Cesamo en Santiago Cesamo en Pimienta Filial Cruz Roja Hondureña Clínica de Odontología
	<u>PARQUES RECREATIVOS</u> Parque Central en Santiago Parque Central en Pimienta Parquecito en Bo. Suyapa Parquecito de Col. Jordán
	<u>CENTROS SOCIALES</u> Centro Cívico Municipal
	<u>CENTROS DEPORTIVOS</u> Cancha Fútbol Col. Esquipulas con Graderías Estadio Municipal Santiagueño Rosendo Dubon

ALDEA SANTIAGO	
1	Bo. Las Flores
2	Bo. Los Almendros
3	Bo. La Escuela
4	Bo. El Palenque
5	Bo. La Zona
6	Bo. La Bomba
7	Bo. Las Guaras
8	Bo. Abajo
9	Col. Velásquez Cabrera
10	Col. Marvin Umaña N 2
11	Sector La Bomba
12	Col. Izaguirre
13	Caserío Maranatha
PIMIENTA	
1	Bo. Suyapa
2	Bo. El Playón
3	Bo. El Terraplén
4	Bo. El Rastro
5	Bo. El Plantel
6	Bo. Las Acacias
7	Bo. El Bosque No. 1
8	Bo. El Bosque No. 2
9	Bo. El Tanque No. 1
10	Bo. El Tanque No. 2
11	Bo. El Centro
12	Col Esquipulas
13	Col. El Jordán
14	Col. Villas del Carmen
15	Col. San Ramón
16	Col. Alemania No. 1
17	Col. Alemania No. 2
18	Col. Episcopal
19	Col. Cruz Roja
20	Col. La Promesa
21	Col. KM 86
22	Col. Buena Vista
ALDEA LA VENTA	
1	Caratasca
2	Ulúa
3	San Antonio


JUSTIFICACION

18 de Junio 2019

Debido a las lluvias que ocurrieron en los recientes días, quedaron dañadas las calles del Municipio, obstaculizando el paso en algunos sectores con vehículos livianos. Por lo que han solicitado los habitantes de los diferentes barrios y colonias la reparación inmediata de las calles, ya que les impide conducirse con facilidad a los diferentes puntos del Municipio, al igual se han pronunciado con la demanda el personal de los centros educativos, centros de salud y otras instituciones.

Posteriormente se realizó el recorrido para identificar los sectores más dañados, para darle prioridad a los accesos de los centros educativos y calles que conducen a las aldeas y colonias más alejados del Municipio.

Considerando que se cuenta actualmente con la ayuda de la retroexcavadora de Copeco, se contratará los servicios de una Motoniveladora y volquetas para acarrear el material selecto que va ser donado por el señor el abogado Julio Cesar Orellana, y conformarlos.



Henry Rodas
Unidad de Proyectos

SECTORES QUE SE INTERVENDRAN CON LA REPARACION DE CALLES

LUGAR	SECTOR	DISTANCIA	SELECTO M ³	HORAS DE PATROL
La Venta	Acceso a la aldea	3,000 metros	280	22
El Rastro	del Juzgado - salida a Santiago	400 metros	42	6
El Platel	Pavimento - Salida a Santiago	300 metros	84	4
Villas del Carmen	Esquipulas - Bo. El Tanque #2	350 metros	70	8
La Hacienda	Casa verde - La Hacienda	130 metros	56	4
Buenavista	Pavimento - canchitas	300 metros	56	4
Alemania #1	Canchita buenavista - Escuela	250 metros	56	6
Episcopal y Alemania #2	canchita - ref. Doña Berta	600 metros	112	12
San Ramón	Esquipulas - Esc. Virgilio B.	400 metros	60	8
Bo. Suyapa	La Linea y sector del campo	500 metros	60	10
Bo. El Centro	Posta, Kinder lidia Handal y otros	300 metros	112	6
Tanque #2	Tanque las acacias - parquesito	300 metros	60	8
Bosque #1 y #2	El Centro, la linea - La Champona	300 metros	60	10
Esquipulas	Tres calles	200 metros	60	18
Santiago	Las Guaras, Almendros, Las flores y la Zona	1200 metros	264	18
Total		8,530 metros	1432	144

PRESUPUESTO INICIAL

**CONTRAPARTE A LIMPIEZA DE DRENAJES, CARGADO DE RESIDUOS Y
CONFORMACION DE CALLEJONES CON LA MAQUINARIA
RETROEXCAVADORA DE COPECO.**

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
126	Horas de Motoniveladora	1500	189,000.00
56	Acarreo de 14 m ³ de material selecto	800	45,000.00
100	Acarreo de 5 m ³ de material selecto	0	0.00
60	Horas de retroexcavadora de copeco	0	0.00
Total Materiales			234,000.00

*****TOTAL GENERAL	234,000.00
---------------------------	-------------------



CONTRATO

SERVICIOS PRESTADOS DE LA MAQUINARIA MOTONIVELADORA Y VOLQUETAS PARA LA REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTÉS.

NOSOTROS DR. RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO, Mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Medicina y Cirugía de este vecindario con Tarjeta de Identidad # 0501-1960-01209, RTN #05011960012095 Extraordinaria, por una parte quien actúa en carácter de representante legal de la Municipalidad de Pimienta, con facultades suficientes para ejercer la representación de la municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos, facultad que le otorga la ley de Municipalidades en sus artículos No.10 y 40 numeral 3 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, y por otra parte el Señor **RAUL HERIBERTO DUARTE SOSA** quien se denomina EL CONTRATISTA con domicilio en la Ciudad de Villanueva, Cortes, con Identidad # # 1508-1970-00090 hemos convenido celebrar el presente contrato.

CLAUSULA No... 1 OBJETO DEL CONTRATO:

Consiste en la reparación de varias calles con material selecto con la siguiente maquinaria:

CANT	DESCRIPCION
126	Horas de Motoniveladora
56	Acarreo de 14 m ³ de material selecto

CLAUSULA No... 2 ALCANCE DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato, en la fecha inicio de 18 de Junio hasta 27 de Julio del año 2019. La fecha de finalización está sujeta a cambio si se presentara cambios en el estado del tiempo

CLAUSULA No... 3 VALOR DEL CONTRATO:

El contrato tendrá un valor por servicio de reparación de calles de **L. 234,000.00** (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) los que se cancelaran en desembolsos periódicos mediante avances en las reparaciones de calle y en base a horas trabajadas según horómetros los cuales serán supervisadas por el inspector de campo. No se le hará la retención del Impuesto sobre la Renta ya que posee Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a cuenta No. 201-19-10500-10027.

CLAUSULA No... 4 INICIO DEL PLAZO DE MULTA:

En caso que no cumpliera en la fecha establecida, se aplicara una multa de Lps. 2,000.00 por día de retraso por incumplimiento de la obra, siempre y cuando el atraso sea únicamente por parte del contratista.

CLAUSULA No... 5 COMPROMISO DEL CONTRATISTA:

El Contratista deberá utilizar la maquinaria Motoniveladora y volquetas para la ejecución del mantenimiento de calles en el Municipio de Pimienta.

CLAUSULA No.... 6 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Quedando el Sr. Henry Javier Rodas Jefe de Proyectos, encargado de la supervisión y el departamento de auditoría o cualquier institución contralor del estado podrá supervisar las reparaciones hechas en las diferentes calles del municipio de Pimienta durante su ejecución en cualquier momento.

CLAUSULA No.... 8 TRIBUNAL COMPETENTE:


Cualquier controversia derivada del presente contrato, se resolverá por la negociación directa entre el contratante y el contratista, de no llegar a un arreglo se resolverá por la vía judicial, para lo cual las partes se someterán a la jurisdicción del Juzgado de Paz del Municipio de Pimienta, Cortés y/o Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo así mismo para todo lo no previsto en este contrato, las partes estarán sujetas a lo preceptuado en las leyes vigentes en Honduras.

CLAUSULA No....9 RATIFICACIÓN:


Ambas partes Contratante y Contratista, manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este Contrato y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos Ejemplares Originales, quedando uno en poder del Contratante y otro será entregado al Contratista, Pimienta Cortés, 18 de Junio del año 2019.


Dr. Raúl Alfredo Ugarte
Identidad. # 0501-1960-01209
Contratante




Henry Javier Rodas
Identidad # 0612-1982-00120
Supervisor de la Obra




Ing. Raul Heriberto Duarte Sosa
Identidad. # 1508-1970-00090
Contratista



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RAUL HERIBERTO / DUARTE SOSA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 27 JUNIO 2012


1508-1970-00090



01987802-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular, puede arrebatar a una persona de su territorio de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

R. Sosa
DIRECCION RNP



SOLICITADA EN 0501

RAUL HERIBERTO / DUARTE SOSA

1508-1970-00090

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 15081870000900

RAUL HERIBERTO DUARTE SOSA
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Practicante	

Fecha de Emisión: 20150626

Decreto Central Art. 2, 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 de Decreto N° 245 del 10 de Agosto de 2005, Art. 10 del Decreto N° 25 del 12 de Agosto de 2005, Art. 96 del Decreto 22-97, Art. 38 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de Producción Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20840 y el Reglamento de Recaudación No. Remane-Acuerdo 43 publicada en el 12 de Enero de 1973.






Miembros Directores
Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente: Se le informa de que usted a la DGI cualquier cambio en sus datos en el RTN, debe comunicarlo al personal de la Oficina de Registro Tributario Nacional, para que se actualice en sus obligaciones tributarias.

Fecha de Emisión: 20150626 Transacción: CDF462



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-10027

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón **DUARTE SOSA RAUL HERIBERTO**

Con Registro Tributario Nacional: **15081970000900**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-10027 en fecha 15/03/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25710543494 de fecha 04/02/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.


Luego de revisar las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.


Por lo expuesto se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 201901, según declaración 27716851005, presentada el 02/05/2018, la presente Constancia vence el 01/07/2019.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



Para la verificación del contenido de la presente Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, se puede acceder a la Dirección: <http://constancias.sar.gub.uy/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-10027 o mediante el siguiente código QR.





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
TELEFONO: (504) 2650-2180



Pimienta Cortes.
28 de Junio 2019

Sr. Jesús Dubón
Tesorero Municipal
Su Oficina

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación le solicito el pago de VENTIOCHO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS **L.28,800.00** como avance del contrato con el Sr. **Raúl Heriberto Duarte Sosa** con **Identidad No. 1508-1970-00090** Por servicios prestados de Volquetas para la reparación de calles en el Municipio de Pimienta.

DETALLE:

Como avance se ha trabajado un total de 36 viajes de acarreo de material selecto a distintos lugares del Municipio.

Se adjunta el desglose de los viajes en sus respectivos lugares.

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:


Henry Javier Rodas
Jefe de Proyectos





MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
CONTROL VIAJES VOLQUETAS



Reporte
No.

FECHA 19/06/2019.
PROYECTO / ACTIVIDAD: Arreglo de calles y balastro
PROPIETARIO: Raul Herberth Duarte Sosa

ACTIVIDAD	VIAJES	CANT.
<u>Acarreo de Material selecto</u>	<u>16</u>	<u>16</u>
<u>Para la Abta la Venta</u>		

José Luis...
FIRMA SUPERVISOR DEL TRABAJO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
CONTROL VIAJES VOLQUETAS



Reporte
No.

FECHA 20/06/2019

PROYECTO / ACTIVIDAD: balastro de calles

PROPIETARIO: Ruel Heriberto Duarte Sosa

ACTIVIDAD	VIAJES	CANT.
<u>Acarreo de Material selecto para la Aldea la venta</u>	<u>6</u>	<u>6</u>

Jacobo B. Garza
FIRMA SUPERVISOR DEL TRABAJO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
CONTROL VIAJES VOLQUETAS



Reporte
No.

FECHA 20/06/2019

PROYECTO / ACTIVIDAD: balasto de calles

PROPIETARIO: Raul Heriberto Duarte Sosa

ACTIVIDAD	VIAJES	CANT.
#Carrero de material sekato		
Dava colonia Alemania #02	2	2

Jacobo Benicio
FIRMA SUPERVISOR DEL TRABAJO



MUNICIPALIDAD DE PIMENTA CORTES
CONTROL VIAJES VOLQUETAS



Reporte
No.

FECHA 20/06/2019

PROYECTO / ACTIVIDAD: balastro de calles

PROPIETARIO: Raul Humberto Duarte Sosa

ACTIVIDAD	VIAJES	CANT.
Acaireo de Material selecto para Colonia villas Del Carmen	2	2

Joselo Bizarro
FIRMA SUPERVISOR DEL TRABAJO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
CONTROL VIAJES VOLQUETAS



Reporte
No.

FECHA 20/06/2019

PROYECTO / ACTIVIDAD: balasteo de calles

PROPIETARIO: Raúl Hernández Duarte Sosa

ACTIVIDAD	VIAJES	CANT.
Acarreo de Material selecto		
Para Barrio el Tonque # 2	4	4

Roberto Bejarano
FIRMA SUPERVISOR DEL TRABAJO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
CONTROL VIAJES VOLQUETAS



Reporte
No.

FECHA 21/06/2019

PROYECTO / ACTIVIDAD: balastro de calles

PROPIETARIO: Rocel Heriberto Duarte Sosa

ACTIVIDAD

VIAJES

CANT.

ACTIVIDAD	VIAJES	CANT.
<u>Acarreo de material selecto para Barrio el centro</u>	<u>6</u>	<u>6</u>

Jacobo Bejarano
FIRMA SUPERVISOR DEL TRABAJO


REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
REPORTE DE TRABAJO MAQUINARIA

ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA BALASTREO DE CALLES

PROVEEDOR: Raúl Heriberto Duarte Sosa

RTN: 1508-1970-000900

NO.	FECHA	TRABAJO-LUGAR	TOTAL	PRECIO HORA	TOTAL LPS
1	19/06/2019	ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA ALDEA LA VENTA	16	L. 800.00	L. 12,800.00
2	20/06/2019	ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA ALDEA LA VENTA	6	L. 800.00	L. 4,800.00
3	20/06/2019	ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA VILLAS DEL CARMEN	2	L. 800.00	L. 1,600.00
4	20/06/2019	ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA COL. ALEMANIA #2	2	L. 800.00	L. 1,600.00
5	20/06/2019	ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA BO. EL TANQUE #2	4	L. 800.00	L. 3,200.00
6	21/06/2019	ACARREO DE MATERIAL SELECTO BO. EL CENTRO	6	L. 800.00	L. 4,800.00
TOTAL			36		L. 28,800.00



Henry Rodas
Jefe de Proyectos



ACARREO DE MATERIAL SELECTO

Aldea La Venta



Villas del Carmen



Bo. El Tanque #2



Col. Alemania #2





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
TELEFONO: (504) 2650-2180



Pimienta Cortes.
18 de Julio 2019

Sr. Jesús Dubón
Tesorero Municipal
Su Oficina

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación le solicito el pago de CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS **L.150,500.00** como avance del contrato con el Sr. **Raúl Heriberto Duarte Sosa** con **Identidad No. 1508-1970-00090** Por servicios prestados de Volquetas para la reparación de calles en el Municipio de Pimienta.

DETALLE:

Como avance se ha trabajado un total:

* 95 Horas de Patrol y de 46 viajes de acarreo de material selecto a distintos lugares del Municipio.

Se adjunta el desglose de las horas trabajadas y los viajes en sus respectivos lugares.

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:

Henry Javier Rodas
Jefe de Proyectos



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
CONTROL DE MOTONIVELADORA



Reporte No. _____

PROPIETARIO: _____ #IDENT. _____

FECHA: Día Miércoles 19 / Mes Junio / Año 2019

PROYECTO / ACTIVIDAD DE TRABAJO: Conformación y Regado de Material selecto en la Alda la Venta

HOROMETRO INICIO: 2243.7

HOROMETRO FINALIZACION: 2251.7

TOTAL HORAS 8

HORA DE INICIO: 8:00 AM HORA FINAL: 4:30 PM / PERDIDO _____

TOTAL HORAS TRABAJADAS:

OBSERVACION: _____

Jacobo Bejarano

Nombre

Supervisor del Traba-

Firma 



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
CONTROL DE MOTONIVELADORA



PROPIETARIO: _____ #IDENT. _____

FECHA: Día Jueves 20 / Mes Junio / Año 2019

PROYECTO / ACTIVIDAD DE TRABAJO: Conformación y Pegado de
Material selecto en la aldea la Venta

HOROMETRO INICIO: 2257.7

HOROMETRO FINALIZACION: 2258.9

TOTAL HORAS 7.2

HORA DE INICIO: 7:00 AM HORA FINAL: 4:00 PM T/PERDIDO _____

TOTAL HORAS TRABAJADAS:

OBSERVACION: _____

Jacobo Berrudo
Nombre

Firma

Supervisor del Traba-



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
CONTROL DE MOTONIVELADORA



Reporte No. _____

PROPIETARIO: _____ #IDENT. _____

FECHA: Día Domingo 23 / Mes Junio Año 2019

PROYECTO / ACTIVIDAD DE TRABAJO: Conformación y Regado de Material Selecto en barrio El Centro

HOROMETRO INICIO: 2258.9

HOROMETRO FINALIZACION: 2266.4

TOTAL HORAS 7.5

HORA DE INICIO: 8:00 AM HORA FINAL: 4:30 pm T/PERDIDO _____

TOTAL HORAS TRABAJADAS:

OBSERVACION: _____

Torobó Bejarano

Nombre

Supervisor del Traba-

[Firma]

Firma



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
CONTROL DE MOTONIVELADORA



Reporte No
.....

PROPIETARIO: _____ #IDENT. _____

FECHA: Día Sabado [6] / Mes Julio / Año 2019

PROYECTO / ACTIVIDAD DE TRABAJO: Conformación y Regado de Material Selecto en barra el tanque #02

HOROMETRO INICIO: [2266.4]

HOROMETRO FINALIZACION: [2274.7] TOTAL HORAS [8.3]

HORA DE INICIO: 8:00 AM HORA FINAL: 4:00 PM T/PERDIDO _____

TOTAL HORAS TRABAJADAS: []

OBSERVACION: _____

Jacobo Bejarano
Nombre

[Firma]
Firma

Supervisor del Traba-



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
CONTROL DE MOTONIVELADORA



PROPIETARIO: _____

#IDENT. _____

FECHA: Día Lunes

8 / Mes Julio

Año 2019

PROYECTO / ACTIVIDAD DE TRABAJO: Conformacion y Regado de Moterand
Selecto en Colonia Esquepelas

HOROMETRO INICIO: 2274.7

HOROMETRO FINALIZACION: 2281.2

TOTAL HORAS 6.5

HORA DE INICIO: 7:30 AM HORA FINAL: 3:00 PM / PERDIDO _____

TOTAL HORAS TRABAJADAS:

OBSERVACION: _____

Jacobo Bayaraco

Nombre

Supervisor del Traba-


Firma



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
CONTROL DE MOTONIVELADORA



Reporte No.
.....

PROPIETARIO: _____ #IDENT. _____

FECHA: Día Martes 9 / Mes Julio / Año 2019

PROYECTO / ACTIVIDAD DE TRABAJO: Conformación y Regado de Material Seleccionado en barrio el tanque # 2

HOROMETRO INICIO: 2281.2

HOROMETRO FINALIZACION: 2289.0

TOTAL HORAS 7.8

HORA DE INICIO: 7:00 AM HORA FINAL: 3:00 PM / PERDIDO _____

TOTAL HORAS TRABAJADAS:

OBSERVACION: _____

Jacobo Beyarao
Nombre

[Firma]
Firma

Supervisor del Traba-



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
CONTROL DE MOTONIVELADORA



Reporte No.

PROPIETARIO: _____ #IDENT. _____

FECHA: Día Miercoles 10 / Mes Julio / Año 2019

PROYECTO / ACTIVIDAD DE TRABAJO: Conformación y Regado de Material selecto en cobrios: Villas Del Carmen

HOROMETRO INICIO: 2289.0

HOROMETRO FINALIZACION: 2297.8

TOTAL HORAS 8.8

HORA DE INICIO: 8:00 AM HORA FINAL: 5:00 PM T/PERDIDO _____

TOTAL HORAS TRABAJADAS:

OBSERVACION: _____

Jacobo Bejarano
Nombre

Supervisor del Traba-

[Signature]
Firma



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
CONTROL DE MOTONIVELADORA



Reporte No

PROPIETARIO: _____ #IDENT. _____

FECHA: Día 10 Mes JULIO Año 2019

PROYECTO / ACTIVIDAD DE TRABAJO: Conformando y Regando material selecto en Colonias la hacienda y km 86

HOROMETRO INICIO: 2297.8

HOROMETRO FINALIZACION: 2306.3

TOTAL HORAS 8.5

HORA DE INICIO: 8:00 AM HORA FINAL: 4:00 PM / PERDIDO _____

TOTAL HORAS TRABAJADAS:

OBSERVACION: _____

Jacobo Bermejo
Nombre

[Signature]
Firma

Supervisor del Traba-



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
CONTROL DE MOTONIVELADORA



Reporte No. _____

PROPIETARIO: _____

#IDENT. _____

FECHA: Día Viernes

12 / Mes Julio

Año 2019

PROYECTO / ACTIVIDAD DE TRABAJO: Confirmacion y Regado de Material Selecto en colonia Alemanias # 01 y # 02

HOROMETRO INICIO: 2306.3

HOROMETRO FINALIZACION: 2314.4

TOTAL HORAS 8.1

HORA DE INICIO: 7:00 AM HORA FINAL: 4:30 PM / PERDIDO _____

TOTAL HORAS TRABAJADAS:

OBSERVACION: _____

Jacobo Bazarow

Nombre

Supervisor del Traba-

Firma



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
CONTROL DE MOTONIVELADORA



Reporte No. _____

PROPIETARIO: _____ #IDENT. _____
 FECHA: Día Sábado / Mes Julio / Año 2019
 PROYECTO / ACTIVIDAD DE TRABAJO: Conformación y Pegado de Material Selecto en Colonia: Buena Vista y 10 de Mayo

HOROMETRO INICIO: 2314.4
 HOROMETRO FINALIZACION: 2322.8 TOTAL HORAS 8.4
 HORA DE INICIO: 8:00 AM HORA FINAL: 4:30 PM MULT/PERDIDO _____
 TOTAL HORAS TRABAJADAS:
 OBSERVACION: _____

Jacobo Bejarano
 Nombre

Supervisor del Traba-

[Signature]
 Firma



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
CONTROL DE MOTONIVELADORA



Reporte No. _____

PROPIETARIO: _____

#IDENT. _____

FECHA: Día Lunes

15 / Mes Julio

Año 2019

PROYECTO / ACTIVIDAD DE TRABAJO: Conformación y Pegado de Material Selecto en Colonia las Acodas y Espapuelas

HOROMETRO INICIO: 2322.8

HOROMETRO FINALIZACION: 2330.8

TOTAL HORAS 8.0

HORA DE INICIO: 7:00 AM HORA FINAL: 4:00 PM / PERDIDO _____

TOTAL HORAS TRABAJADAS:

OBSERVACION: _____

Jacobo Bejrone

Nombre

Supervisor del Traba-

[Firma]

Firma



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
CONTROL DE MOTONIVELADORA



Reporte No

PROPIETARIO: _____ #IDENT. _____

FECHA: Día Martes 16 / Mes Julio Año 2019

PROYECTO / ACTIVIDAD DE TRABAJO: Conformación y Regado de Material Selecto en Colonia Km 86 salida a Villanueva y parte de arriba

HOROMETRO INICIO: 2330.8

HOROMETRO FINALIZACION: 2338.7 TOTAL HORAS 7.9

HORA DE INICIO: 7:00 AM HORA FINAL: 4:00 PM / PERDIDO _____

TOTAL HORAS TRABAJADAS:

OBSERVACION: _____

Tacobo Bejarano
Nombre

Firma

Supervisor del Traba-


REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
REPORTE DE TRABAJO MAQUINARIA

ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA BALASTREO DE CALLES

PROVEEDOR: Raúl Heriberto Duarte Sosa

RTN: 1508-1970-000900

NO.	FECHA	TRABAJO-LUGAR	HORO. INICIO	HORO. FINAL	TOTAL	PRECIO HORA	TOTAL LPS
1	19/06/2019	CONFORMACION Y REGADO DE MATERIAL SELECTO EN ALDEA LA VENTA	2243.7	2251.7	8	L. 1,500.00	L. 12,000.00
2	20/06/2019	CONFORMACION Y REGADO DE MATERIAL SELECTO EN ALDEA LA VENTA	2251.7	2258.9	7.2	L. 1,500.00	L. 10,800.00
3	23/06/2019	CONFORMACION Y REGADO DE MATERIAL SELECTO EN BO. EL CENTRO	2258.9	2266.4	7.5	L. 1,500.00	L. 11,250.00
4	06/07/2019	CONFORMACION Y REGADO DE MATERIAL SELECTO EN BO. EL TANQUE #2	2266.4	2274.7	8.3	L. 1,500.00	L. 12,450.00
5	08/07/2019	CONFORMACION Y REGADO DE MATERIAL SELECTO EN COL. ESQUIPULAS	2274.7	2281.2	6.5	L. 1,500.00	L. 9,750.00
6	09/07/2019	CONFORMACION Y REGADO DE MATERIAL SELECTO EN BO. EL TANQUE #2	2281.2	2289	7.8	L. 1,500.00	L. 11,700.00
7	10/07/2019	CONFORMACION Y REGADO DE MATERIAL SELECTO EN VILLAS DEL CARMEN	2289	2297.8	8.8	L. 1,500.00	L. 13,200.00
8	11/07/2019	CONFORMACION Y REGADO DE MATERIAL SELECTO EN COL. LA HACIENDA Y KM 86	2297.8	2306.3	8.5	L. 1,500.00	L. 12,750.00
9	12/07/2019	CONFORMACION Y REGADO DE MATERIAL SELECTO EN COL. ALEMANIA #1 Y #2	2306.3	2314.4	8.1	L. 1,500.00	L. 12,150.00
10	13/07/2019	CONFORMACION Y REGADO DE MATERIAL SELECTO EN COL. 10 DE MAYO Y BUENAVISTA	2314.4	2322.8	8.4	L. 1,500.00	L. 12,600.00
11	15/07/2019	CONFORMACION Y REGADO DE MATERIAL SELECTO EN COL. BO. LAS ACACIAS Y COL. ESQUIPULAS	2322.8	2330.8	8	L. 1,500.00	L. 12,000.00
12	16/07/2019	CONFORMACION Y REGADO DE MATERIAL SELECTO EN COL. KM 86 SALIDA A VILLANUEVA Y PARTE DE ARRIBA	2330.8	2338.7	7.9	L. 1,500.00	L. 11,850.00
TOTAL					95		L. 142,500.00


Henry Rodas
Jefe de Proyectos





MUNICIPALIDAD DE PIMENTA CORTES
CONTROL VIAJES VOLQUETAS



Reporte
No.

FECHA: 08/07/2019

PROYECTO / ACTIVIDAD: balastro de calles

PROPIETARIO: Raul Heriberto Duarte Sosa

ACTIVIDAD

VIAJES

CANT.

Acarreo de Material Selecto
para colonia Esmeraldas

3

3

José Roberto Benavente
FIRMA SUPERVISOR DEL TRABAJO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
CONTROL VIAJES VOLQUETAS



Reporte
No.

FECHA: 09/07/2019

PROYECTO / ACTIVIDAD: Balastro de calles

PROPIETARIO: Raul Heriberto Duarte Sosa

ACTIVIDAD	VIAJES	CANT.
Acarreo de Material selecto para Barrio El Tonque # 2	3	3

José Benarón
FIRMA SUPERVISOR DEL TRABAJO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
CONTROL VIAJES VOLQUETAS



Reporte
No.

FECHA 10/07/2019

PROYECTO / ACTIVIDAD: balastreo de calles

PROPIETARIO: Rosal Heriberto Duarte Sosa

ACTIVIDAD	VIAJES	CANT.
<u>Acarreo de Material selecto</u>		
<u>para Colonia Villas Del Carme</u>	<u>2</u>	<u>2</u>

Jacobo Bejarano
FIRMA SUPERVISOR DEL TRABAJO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
CONTROL VIAJES VOLQUETAS



Reporte
No.

FECHA: 16/07/2019

PROYECTO / ACTIVIDAD: balastro de calles

PROPIETARIO: Rael Humberto Duarte Sosa

ACTIVIDAD	VIAJES	CANT.
Acarreo de Material selecto para colonia Km 86	2	2

Jacobo Baborido
FIRMA SUPERVISOR DEL TRABAJO


REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
REPORTE DE TRABAJO MAQUINARIA

ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA BALASTREO DE CALLES


PROVEEDOR: Raúl Heriberto Duarte Sosa

RTN: 1508-1970-000900


NO.	FECHA	TRABAJO-LUGAR	TOTAL	PRECIO HORA	TOTAL LPS
1	08/07/2019	ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA COL. ESQUIPULAS	3	L. 800.00	L. 2,400.00
2	09/07/2019	ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA BO. EL TANQUE #2	3	L. 800.00	L. 2,400.00
3	10/07/2019	ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA COL. VILLAS DEL CARMEN	2	L. 800.00	L. 1,600.00
5	16/07/2019	ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA COL. KM 86	2	L. 800.00	L. 1,600.00
TOTAL			10		L. 8,000.00


Henry Rodas
Jefe de Proyectos



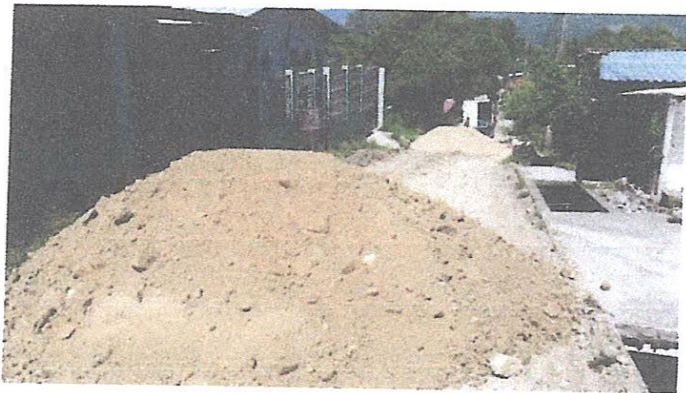



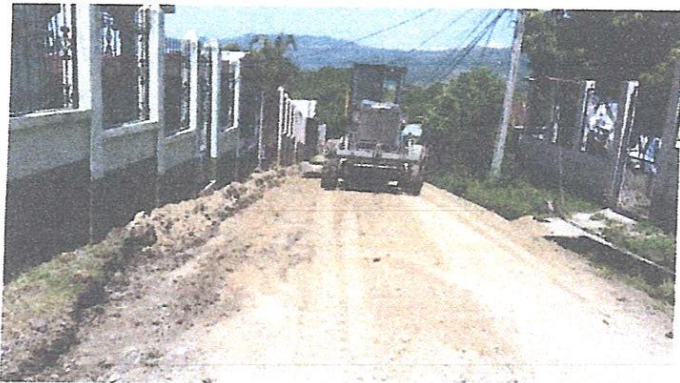



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
TELEFONO: (504) 2650-2180



Pimienta Cortes.
25 de Julio 2019

Sr. Jesús Dubón
Tesorero Municipal
Su Oficina

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación le solicito el pago de CINCUENTA YCUATRO MIL SETECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS **L.54,700.00** como avance del contrato con el Sr. **Raúl Heriberto Duarte Sosa** con **Identidad No. 1508-1970-00090** Por servicios prestados de Volquetas para la reparación de calles en el Municipio de Pimienta.

DETALLE:

Como finalización de contrato un total:

* 126.1333 Horas de Patrol y de 56 viajes de acarreo de material selecto a distintos lugares del Municipio.

Se adjunta el desglose de las horas trabajadas y los viajes en sus respectivos lugares.

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:

Henry Javier Rodas
Jefe de Proyectos





MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
CONTROL DE MOTONIVELADORA



Reporte No. _____

PROPIETARIO: _____ #IDENT. _____

FECHA: Día Miercoles 17 / Mes Julio Año 2019

PROYECTO / ACTIVIDAD DE TRABAJO: Conformacion y Regado de Material Selecto en Colonia San Ramon

HOROMETRO INICIO: 2338.7

HOROMETRO FINALIZACION: 2346.5

TOTAL HORAS 7.8

HORA DE INICIO: 7:00 AM HORA FINAL: 4:00 PM T/PERDIDO _____

TOTAL HORAS TRABAJADAS:

OBSERVACION: _____

Toroberto Barrantes

Nombre

Supervisor del Traba-

Firma



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
CONTROL DE MOTONIVELADORA



Reporte No
.....

PROPIETARIO: _____ #IDENT. _____

FECHA: Día Jueves 18 Mes Julio Año 2019

PROYECTO / ACTIVIDAD DE TRABAJO: Conformacion y Regado de Material Selecto en colonia el Jordan

HOROMETRO INICIO: 2346.5

HOROMETRO FINALIZACION: 2353.2

TOTAL HORAS 6.7

HORA DE INICIO: 7:30 AM HORA FINAL: 3:00 pm PERDIDO

TOTAL HORAS TRABAJADAS:

OBSERVACION: _____

Jacobo Bejarano

Nombre

Supervisor del Traba-

Firma



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
CONTROL DE MOTONIVELADORA



Reporte No. _____

PROPIETARIO: _____ #IDENT. _____

FECHA: Día Viernes 19 / Mes Julio / Año 2019

PROYECTO / ACTIVIDAD DE TRABAJO: Conformacion y Regado de Material Selecto en colonia Hesbon

HOROMETRO INICIO: 2353.2

HOROMETRO FINALIZACION: 2360.5

TOTAL HORAS 73

HORA DE INICIO: 7:00 AM HORA FINAL: 4:00 PM T/PERDIDO _____

TOTAL HORAS TRABAJADAS:

OBSERVACION: _____

Jacobo Benavente

Nombre

Supervisor del Traba-

Firma



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
CONTROL DE MOTONIVELADORA



Reporte No

PROPIETARIO: _____ #IDENT. _____

FECHA: Día Sabado [20] / Mes Julio / Año 2019

PROYECTO / ACTIVIDAD DE TRABAJO: Conformacion y Riego de Material Selecto en colonia km 86 Salida a Villanueva Calle pavimentada y colonia Barabara

HOROMETRO INICIO: 2360.5

HOROMETRO FINALIZACION: 2366.7

TOTAL HORAS 6.2

HORA DE INICIO: 7:30 AM HORA FINAL: 3:00 PM PERDIDO _____

TOTAL HORAS TRABAJADAS:

OBSERVACION: _____

Jacobo Bejarano

Nombre

Supervisor del Traba-

Firma



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
CONTROL DE MOTONIVELADORA



Reporte No. _____

PROPIETARIO: _____ #IDENT. _____

FECHA: Día Lunes 22 / Mes Julio / Año 2019

PROYECTO / ACTIVIDAD DE TRABAJO: Conformación y Riego de Material Selecto en Barrio el Centro

HOROMETRO INICIO: 2366.7

HOROMETRO FINALIZACION: 2369.8

TOTAL HORAS 3.1

HORA DE INICIO: 10:30 AM HORA FINAL: 3:00 PM / PERDIDO _____

TOTAL HORAS TRABAJADAS:

OBSERVACION: _____

Isidoro Bejarano

Nombre

Supervisor del Traba-

Firma

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
REPORTE DE TRABAJO MAQUINARIA
ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA BALASTREO DE CALLES

PROVEEDOR: Raúl Heriberto Duarte Sosa

RTN: 1508-1970-000900

NO.	FECHA	TRABAJO-LUGAR	HORO. INICIO	HORO. FINAL	TOTAL	PRECIO HORA	TOTAL LPS
1	17/07/2019	CONFORMACION Y REGADO DE MATERIAL SELECTO EN COL. SAN RAMON	2338.7	2346.5	7.8	L. 1,500.00	L. 11,700.00
2	18/07/2019	CONFORMACION Y REGADO DE MATERIAL SELECTO EN COL. EL JORDAN	2346.5	2353.2	6.7	L. 1,500.00	L. 10,050.00
3	19/07/2019	CONFORMACION Y REGADO DE MATERIAL SELECTO EN COL. HESBON	2346.5	2353.8	7.3	L. 1,500.00	L. 10,950.00
4	20/07/2019	CONFORMACION Y REGADO DE MATERIAL SELECTO EN COL. KM 86 SALIDA A VILLANUEVA CALLE PAVIMENTADA Y COL. BARAHONA	2346.5	2352.7	6.2	L. 1,500.00	L. 9,300.00
5	22/07/2019	CONFORMACION Y REGADO DE MATERIAL SELECTO EN BO. EL CENTRO	2353.2	2356.333	3.13333	L. 1,500.00	L. 4,700.00
TOTAL					31.13333		L. 46,700.00

Henry Rodas

Henry Rodas
Jefe de Proyectos





MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
CONTROL VIAJES VOLQUETAS



Reporte
No.

FECHA 17/07/2019

PROYECTO / ACTIVIDAD: balastro de calles

PROPIETARIO: Raul Heriberto Duarte Sosa

ACTIVIDAD	VIAJES	CANT.
<u>Acarreo de material selecto</u>		
<u>Para la colonia San Ramon</u>	<u>3</u>	<u>3</u>

Tecobo Dejarano
FIRMA SUPERVISOR DEL TRABAJO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
CONTROL VIAJES VOLQUETAS



Reporte
No.

FECHA 18/07/2019

PROYECTO / ACTIVIDAD: Balastreo de calles

PROPIETARIO: Raul Heriberto Duarte Sosa

ACTIVIDAD	VIAJES	CANT.
<u>Acarreo de material selecto</u>		
<u>para colonia El Tordan</u>	<u>3</u>	<u>3</u>

Jacobo Bejarano
FIRMA SUPERVISOR DEL TRABAJO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
CONTROL VIAJES VOLQUETAS



Reporte
No.

FECHA: 19/07/2019
PROYECTO / ACTIVIDAD: balastro de calles
PROPIETARIO: Raúl Heriberto Duarte Sosa

ACTIVIDAD	VIAJES	CANT.
<u>Acarron de material selecto</u>		
<u>para colonia Heshon</u>	<u>2</u>	<u>2</u>

Jacobo Bayarano
FIRMA SUPERVISOR DEL TRABAJO



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
CONTROL VIAJES VOLQUETAS



Reporte
No.

FECHA 20/07/2019

PROYECTO / ACTIVIDAD: bolastico de calles

PROPIETARIO: Raul Heriberto Duarte zosa

ACTIVIDAD	VIAJES	CANT.
<u>Acarreo de material selecto</u>		<u>2</u>
<u>para colonia Km 86 y Barabona</u>		
<u>Salido a Villanueva</u>		

Jacobo Bejarano
FIRMA SUPERVISOR DEL TRABAJO


REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
REPORTE DE TRABAJO MAQUINARIA

ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA BALASTREO DE CALLES

PROVEEDOR: Raúl Heriberto Duarte Sosa

RTN: 1508-1970-000900

NO.	FECHA	TRABAJO-LUGAR	TOTAL	PRECIO HORA	TOTAL LPS
1	17/07/2019	ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA BALASTREAR EN COL. SAN RAMON	3	L. 800.00	L. 2,400.00
2	18/07/2019	ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA BALASTREAR EN COL. EL JORDAN	3	L. 800.00	L. 2,400.00
3	19/07/2019	ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA BALASTREAR EN COL. HESBÓN	2	L. 800.00	L. 1,600.00
4	20/07/2019	ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA BALASTREAR EN COL. KM 86 SALIDA A VILLANUEVA CALLE PAVIMENTADA Y COL. BARAHONA	2	L. 800.00	L. 1,600.00
TOTAL			10		L. 8,000.00



Henry Rodas
Jefe de Proyectos



MEJORAMIENTO DE CALLES EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO



