



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

NOTIFICACION DEL PROYECTO

En respuesta a la solicitud No OIP-005-08-10-2019 enviada el día 08 de octubre del presente año sobre la ejecución de proyectos y las diferentes licitaciones le doy a conocer por medio de esta tabla la información

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del proyecto	AIC. ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES
Sector	Oeste del municipio de Cane.
Nombre del proyecto	Construcción de plaza el ángel, barrió el porvenir.
Ubicación del proyecto	BARRIO LA VIOLETA
Descripción del proyecto	Este proyecto está comprendido por una construcción de una plaza llamada el ángel, donde se pretende demoler lo existente para luego construir un parque donde niños, familias podrán deleitar de un lindo ambiente y poder mantener esa armonía entre miembros familiares
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcance del proyecto(principal de proyecto)	Atracción turística del municipio hacia las personas así como eliminar el estrés y mejorar el ambiente familiar.
Impacto ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamiento	No aplica
Detalle del encargado del proyecto	AIC, ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES
Fuente de financiamiento	Alcaldía municipal.
Presupuesto del proyecto	Lps. 997,999.77
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Junio 2018
Estado actual del proyecto	100.00%
Costo de finalización del proyecto	NO APLICA
Fecha de finalización	08 DICIEMBRE 2019
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	NO APLICA



ALCALDIA MUNICIPAL
CANE LA PAZ

LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Variación en el costo total del proyecto	NO APLICA
Variación en el alcance de duración del proyecto.	NO APLICA

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente notificación a los 14 días del mes de Octubre del año 2019


Luis Fernando Martínez
Desarrollo comunitario y proyectos





ALCALDIA MUNICIPAL
CANE LA PAZ

LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Variación en el costo total del proyecto	NO APLICA
Variación en el alcance de duración del proyecto.	NO APLICA

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente notificación a los 14 días del mes de Octubre del año 2019


Luis Fernando Martínez
Desarrollo comunitario y proyectos





Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019
Hora : 03:18 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11470

L: 70,656.04

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7738
Fecha de Emisión: 10/10/2019
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: KENNY VELIMIR BANEGAS MEJIA Id/RTN: 1201198200300
La Cantidad en Letras: SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Pago de la cuarta y ultima Estimación del Proyecto denominado Plaza del Angel en el Barrio El Porvenir, este Proyecto es financiado con los fondos del 35% Vida Mejor sector de Niñez y Adolescencia.





CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción del Parque Infantil Barrio El Porvenir	70,656.04

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	70,656.04
Monto Total:		70,656.04

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70,656.04
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,656.04

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por
Identidad por
KENNY VELIMIR BANEGAS MEJIA
1201198200300

ARQUITECTO E INGENIERO CONSTRUCTORES
RTN: 12011982003000

ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES

Arq. Kenny Banegas
CAH-1415

Profesion u Oficio ARQUITECTO, EDIFICIOS

Bo. La Concepcion Esquina
Opuesta al CRIP La Paz, La Paz
E-mail: aicstudio3@gmail.com
Cel: 9780-7341 / 2774-2485
CAI: CE332E-E2EF6A-874FA4-ABCF01-3ECBDA-CB



RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES

No.000-001-04-00000107

R.T.N. 12011982003000

Fecha: 11 de OCTUBRE del 2019 Por Lps. 70,656.04

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE R.T.N.1204995434017

Cantidad: SETENTA MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA
Y SEIS CON 04/100 LEMPICAS.

Por Concepto:	<u>PAGO DE CUARTA ESTIMACION</u>
	<u>DEL PROYECTO " PLAZA DEL ANGEL " EN EL</u>
	<u>MUNICIPIO DE CANE, BARRIO EL PORVENIR</u>

Imprenta del Valle Comayagua R.T.N. 03011953001874 Cel: 9817-2423 9830-3011 CERTIFICADO 9231-14-10500-147



Total por Honorarios	L.	<u>70,656.04</u>
Total Neto Recibido	L.	
Retencion ISR	L.	<u>0.00</u>

007614000218
ALCALDIA MUNICIPAL CANE, LA PAZ
AL NORTE DE PLAZA SAN FRANCISCO
TEL.27744067

CHEQUE No. 00005639

Cane, 15/10/2019

Lugar y Fecha

Kenny Velimir Baneegas Mejia L 70,656.04

Páguese a la orden de

Setenta mil seiscientos cincuenta y seis con 04/100 Lempiras

Cantidad en letras



[Handwritten signature]

Firma(s)



⑆01001142⑆00007614000218⑆00005639

Informe


Proyecto: PLAZA DEL ANGEL

Alcaldía Municipal de Cane


Supervisor: Nahúm Ortega Trochez

Cane, La Paz 10 de Octubre del 2019

3.05	Columna decorativa (0.45x0.45m) 10 var # 4 anillos # 3@0.18M	La actividad consiste en el encofrado y previa fundición de las columnas	5.40MI
------	--	--	--------

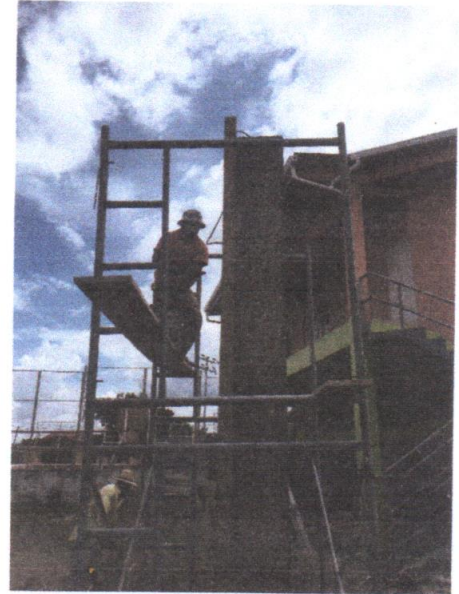

4.02	Piso de granito antiderrapante	La actividad consiste en la colocación de granito de 30x30 cm, sobre el firme de concreto.	300.00M ²
------	--------------------------------	--	----------------------

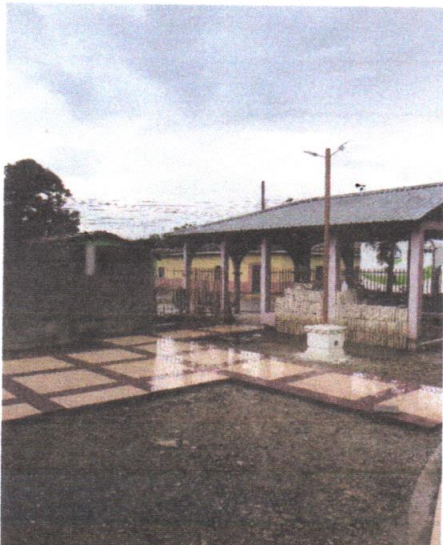



5.03	Circuito de Fuerza bomba centrifuga	La actividad consiste en desarrollar el circuito de la bomba con cable #10	29.50 MI
------	-------------------------------------	--	----------






6.01	Pared de Bloque de 6" x 8" x 20"	La actividad consiste en levantar las paredes de la fuente a base de bloque de 6"	1.05M ²
------	----------------------------------	---	--------------------



6.04	Piso de fuentes / Afinado E=0.10M	La actividad consiste en fundir el piso de las fuentes y afinarlo	15.60M ²
------	--------------------------------------	--	---------------------

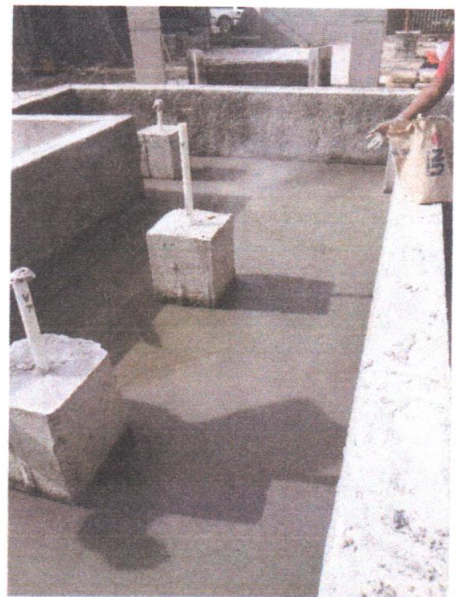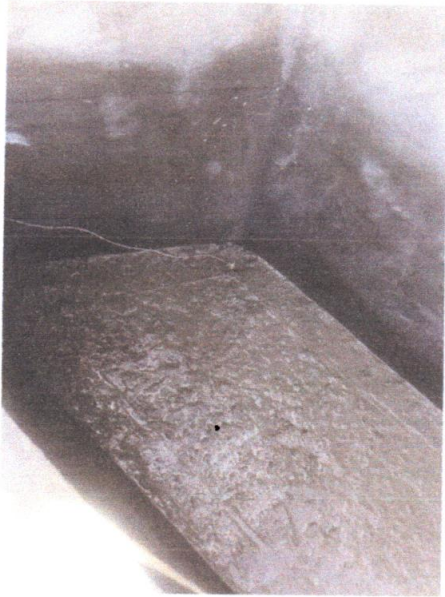

7.01	Suministro e Instalacion de bomba centrifuga de 2hp + Centro de Carga	La actividad consiste en suministrar e instalar la bomba que hará funcionar los chorros de agua y la cascada en las diferentes fuentes	1.00Global
------	---	--	------------

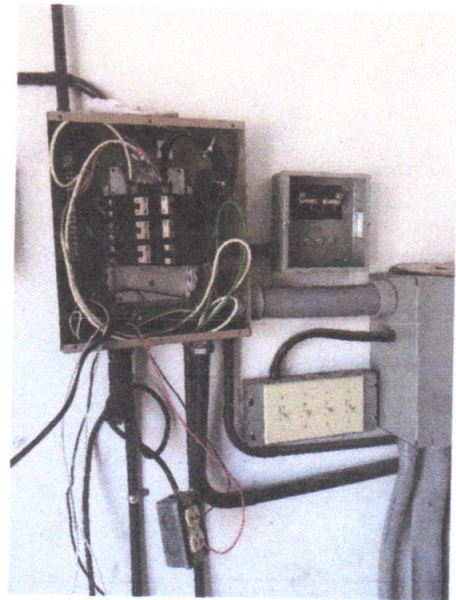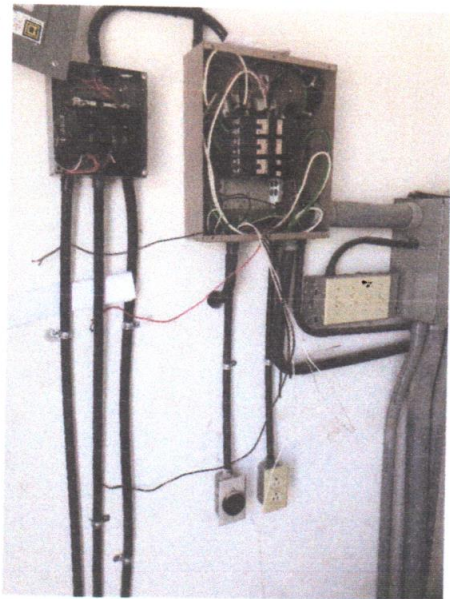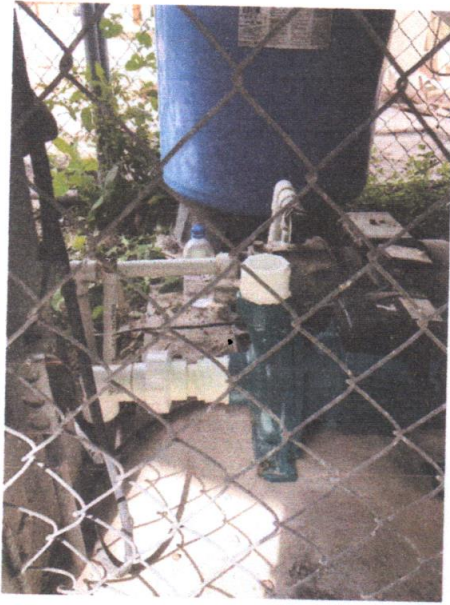

ESTIMACION No.4

Proyecto: Plaza del Angel
 Propietario: Municipalidad de Cané
 Ubicación: Bo. El Porvenir Cané, La Paz.
 Periodo: Del 12 septiembre al 09 de octubre del 2019

Ítem	Concepto	unidad	CONTRATADO			EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO		% AVANCE
			Cantidad	Precio Unif.	Precio Total	Cantidad	Precio Unif.	Cantidad	Precio Unif.	
1.00	Demolicon y Desmontaje									
1.01	Desmontaje de verja lateral donde se ubicaran letras	MI	10.20	L. 80.00	L. 816.00			10.20	L. 816.00	100%
1.02	Desmontaje de lampara de poste	unidad	5.00	L. 150.00	L. 750.00			5.00	L. 750.00	100%
1.03	Demolicion de bases para lamparas de poste	unidad	5.00	L. 250.00	L. 1,250.00			5.00	L. 1,250.00	100%
1.04	Demolicion de acera Interior	M ²	55.60	L. 85.00	L. 4,726.00			55.60	L. 4,726.00	100%
1.05	Demolicion de bordillo interior	MI	9.00	L. 85.00	L. 765.00			9.00	L. 765.00	100%
1.06	Acarreo de desperdicion	M ³	15.00	L. 250.00	L. 3,750.00			15.00	L. 3,750.00	100%
			Sub-Total		L. 12,057.00		L. 0.00		L. 12,057.00	100%
2.00	Marcado Y Nivelacion									
2.01	Marcado de avenidas internas en plaza	MI	88.50	L. 120.00	L. 10,620.00			88.50	L. 10,620.00	100%
2.02	Nivelacion de piso material selecto cernido E=15CM	M ²	350.50	L. 125.00	L. 43,812.50			350.50	L. 43,812.50	100%
			Sub-Total		L. 54,432.50		L. 0.00		L. 54,432.50	100%
3.00	Excavacion Cimentacion									
3.01	Excavacion para zapatas aisladas	M ³	20.25	L. 140.00	L. 2,835.00			20.25	L. 2,835.00	100%
3.02	Excavacion para tensor	M ³	2.24	L. 140.00	L. 313.60			2.24	L. 313.60	100%
3.03	Zapata de 1.5x1.5m, E= 0.30M Var # 4 @ 0.15m A.S	unidad	6.00	L. 5,213.60	L. 31,281.60			6.00	L. 31,281.60	100%
3.04	Tensor T-1(0.20x0.30m), 6 var # 4, anillo #2 @ 0.20m	MI	14.00	L. 620.85	L. 8,691.90			14.00	L. 8,691.90	100%
3.05	Columna decorativa (0.45x0.45m) 10 var # 4 anillos # 3@0.18M	MI	40.20	L. 1,416.25	L. 56,933.25	5.40	L. 7,647.75	40.20	L. 56,933.25	100%
3.06	Pedestal decorativo prefabricado para lampara de poste	unidad	5.00	L. 1,400.00	L. 7,000.00			5.00	L. 7,000.00	100%
3.07	Fundicion de lamparas para poste	unidad	5.00	L. 850.00	L. 4,250.00			5.00	L. 4,250.00	100%
3.08	Fundicion de piso donde se montaran las letras	M ²	7.68	L. 750.00	L. 5,760.00			7.68	L. 5,760.00	100%
3.09	Fundicion de bordillo para colocacion de verja	MI	5.55	L. 450.00	L. 2,497.50			5.55	L. 2,497.50	100%
			Sub-Total		L. 119,562.85		L. 7,647.75		L. 119,562.85	100%

4.00	Pisos/ Letras/Pergolas/ Mobiliario									
4.01	Letras Decorativas	unidad	4.00	L. 18,000.00	L. 72,000.00			4.00	L. 72,000.00	100%
4.02	Piso de granito antiderrapante	M ²	350.50	L. 800.00	L. 280,400.00	50.50	L. 40,400.00	350.50	L. 280,400.00	100%
4.03	Firme de concreto	M ²	350.50	L. 420.00	L. 147,210.00			350.50	L. 147,210.00	100%
4.04	Pergola	MI	18.40	L. 5,258.30	L. 96,752.72			18.40	L. 96,752.72	100%
4.05	Bancas Prefabricadas	unidad	7.00	L. 7,000.00	L. 49,000.00			7.00	L. 49,000.00	100%
4.05	Colocacion de verja y restructuracion	MI	5.55	L. 650.00	L. 3,607.50			5.55	L. 3,607.50	100%
			Sub-Total		L. 648,970.22		L. 40,400.00		L. 648,970.22	100%
5.00	Instalaciones Electricas									
5.01	Circuito de Iluminacion Lamparas de poste	MI	65.05	L. 210.00	L. 13,660.50			65.05	L. 13,660.50	100%
5.02	Circuito de Iluminacion reflectores en letras	MI	35.00	L. 210.00	L. 7,350.00			35.00	L. 7,350.00	100%
5.03	Circuito de fuerza bombas sumergibles	MI	29.50	L. 210.00	L. 6,195.00	29.50	L. 6,195.00	29.50	L. 6,195.00	100%
5.04	Suministro e Instalacion de Lamparas de poste	unidad	5.00	L. 8,761.00	L. 43,805.00			5.00	L. 43,805.00	100%
5.05	Suministro e Instalacion de reflectores en letras	unidad	2.00	L. 4,000.00	L. 8,000.00			2.00	L. 8,000.00	100%
			Sub-Total		L. 79,010.50		L. 6,195.00		L. 79,010.50	100%
6.00	Fuentes									
6.01	Pared de bloque de 6"	M ²	30.05	L. 750.00	L. 22,537.50	1.05	L. 787.50	30.05	L. 22,537.50	100%
6.02	Repello / Afinado / pintura	M ²	22.42	L. 310.00	L. 6,950.20			22.42	L. 6,950.20	100%
6.03	Solera de cierre en fuente 0.10x0.15m	MI	20.05	L. 380.00	L. 7,619.00			20.05	L. 7,619.00	100%
6.04	Piso de fuente / Afinado. E=0.10m	M ²	15.60	L. 900.00	L. 14,040.00	15.60	L. 14,040.00	15.60	L. 14,040.00	100%
6.05	Suministro e instalacion Tuberia Pvc de 1/2" para abastecer fuentes	MI	20.00	L. 160.00	L. 3,200.00			20.00	L. 3,200.00	100%
6.06	Suministro E instalacion Tuberia de pvc 2" de retorno	MI	6.00	L. 300.00	L. 1,800.00			6.00	L. 1,800.00	100%
6.07	Suministro e Instalacion Tuberia de pvc de 1" salida de fuentes	MI	3.40	L. 200.00	L. 680.00			3.40	L. 680.00	100%
6.08	Suministro e Instalacion de bomba sumergible	unidad								
6.09	Detalle decorativo en fuente	MI	8.40	L. 850.00	L. 7,140.00			8.40	L. 7,140.00	100%
			Sub-Total		L. 63,966.70		L. 14,827.50		L. 63,966.70	100%
7.00	Actividad nueva Orden de cambio									
7.01	Suministro e instalacion Bomba Centrifuga 2 hp+ Centro de Carga	Global	1.00	L. 20,000.00	L. 20,000.00	1.00	L. 20,000.00	1.00	L. 20,000.00	100%
			Sub-Total		L. 20,000.00		L. 20,000.00		L. 20,000.00	100%
8.00	COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTOS	GLB	L. 997,999.77	1	L. 997,999.77		L. 89,070.25		L. 997,999.77	
9.00	COSTOS TOTALES DEL PROYECTO	GLB	L. 997,999.77	1.00	L. 997,999.77		L. 89,070.25		L. 997,999.77	100%

SUBTOTAL ESTIMACION	L. 89,070.25
RETENCION DE EXCEDENTE EN ACTIVIDAD 6.02 EN ESTIMACION #3. SE COBRARON 12.42 M ² Y SOLO SE TENIAN QUE COBRAR 10.00 M ²	L. 750.20
SUBTOTAL ESTIMACION - EXCEDENTE ESTIMACION #3	L. 88,320.05
DEDUCCION DEL 15% ANTICIPO	L. 13,248.01
RETENCION DEL 5% CALIDAD DE OBRA	L. 4,416.00
TOTAL A PAGAR	L. 70,656.04



KENNY VELIMIR BANEGAS MEJIA
AIC

CONTRATANTE
FRANCISCO BUSTILLO GONZALES
ALCALDE MUNICIPAL



SUPERVISOR
NAHUM ORTEGA TROCHEZ
INGENIERA CIVIL

TESORERA
CARMEN MARIA NOLASCO

ORDEN DE CAMBIO # 1

Proyecto: Plaza del Angel

Propietario: Municipalidad de Cané

Ubicación: Bo. El Porvenir Cané, La Paz.

Fecha de presentación: 20 de septiembre del 2019

Ítem	Concepto	unidad	CONTRATADO			ORDEN DE CAMBIO # 1	
			Cantidad	Precio Unit.	Precio Total	Cantidad	Precio Unit.
1.00	Demolicion y Desmontaje						
1.01	Desmontaje de verja lateral donde se ubicaran letras	MI	10.20	L. 80.00	L. 816.00		
1.02	Desmontaje de lampara de poste	unidad	5.00	L. 150.00	L. 750.00		
1.03	Demolicion de bases para lamparas de poste	unidad	5.00	L. 250.00	L. 1,250.00		
1.04	Demolicion de acera Interior	M ²	55.60	L. 85.00	L. 4,726.00		
1.05	Demolicion de bordillo interior	MI	9.00	L. 85.00	L. 765.00		
1.06	Acarreo de desperdicion	M ³	15.00	L. 250.00	L. 3,750.00		
			Sub-Total		L. 12,057.00		L. 0.00
2.00	Marcado Y Nivelacion						
2.01	Marcado de avenidas internas en plaza	MI	88.50	L. 120.00	L. 10,620.00		
2.02	Nivelacion de piso material selecto cernido E=15CM	M ²	350.50	L. 125.00	L. 43,812.50		
			Sub-Total		L. 54,432.50		L. 0.00
3.00	Excavacion Cimentacion						
3.01	Excavacion para zapatas aisladas	M ³	20.25	L. 140.00	L. 2,835.00		
3.02	Excavacion para tensor	M ³	2.24	L. 140.00	L. 313.60		
3.03	Zapata de 1.5x1.5m, E= 0.30M Var # 4 @ 0.15m A.S	unidad	6.00	L. 5,213.60	L. 31,281.60		
3.04	Tensor T-1(0.20x0.30m), 6 var # 4, anillo #2 @ 0.20m	MI	14.00	L. 620.85	L. 8,691.90		
3.05	Columna decorativa (0.45x0.45m) 10 var # 4 ânillos # 3@0.18M	MI	40.20	L. 1,416.25	L. 56,933.25		
3.06	Pedestal decorativo prefabricado para lampara de poste	unidad	5.00	L. 1,400.00	L. 7,000.00		
3.07	Fundicion de lamparas para poste	unidad	5.00	L. 850.00	L. 4,250.00		
3.08	Fundicion de piso donde se montaran las letras	M ²	7.68	L. 750.00	L. 5,760.00		
3.09	Fundicion de bordillo para colocacion de verja	MI	5.55	L. 450.00	L. 2,497.50		


			Sub-Total		L. 119,562.85		L.0.00
4.00	Pisos/ Letras/Pergolas/Mobiliario						
4.01	Letras Decorativas	unidad	4.00	L. 18,000.00	L. 72,000.00		
4.02	Piso de granito antiderrapante	M ²	350.50	L. 800.00	L. 280,400.00		
4.03	Firme de concreto	M ²	350.50	L. 420.00	L. 147,210.00		
4.04	Pergola	MI	18.40	L. 5,258.30	L. 96,752.72		
4.05	Bancas Prefabricadas	unidad	7.00	L. 7,000.00	L. 49,000.00		
4.06	Colocacion de verja y restructuracion	MI	5.55	L. 650.00	L. 3,607.50		
			Sub-Total		L. 648,970.22		L.0.00
5.00	Instalaciones Electricas						
5.01	Circuito de Iluminacion Lamparas de poste	MI	65.05	L. 210.00	L. 13,660.50		
5.02	Circuito de Iluminacion reflectores en letras	MI	35.00	L. 210.00	L. 7,350.00		
5.03	Circuito de fuerza bombas sumergibles	MI	29.50	L. 210.00	L. 6,195.00		
5.04	Suministro e Instalacion de Lamparas de poste	unidad	5.00	L. 8,761.00	L. 43,805.00		
5.05	Suministro e Instalacion de reflectores en letras	unidad	2.00	L. 4,000.00	L. 8,000.00		
			Sub-Total		L. 79,010.50		L.0.00
6.00	Fuentes						
6.01	Pared de bloque de 6"	M ²	30.05	L. 750.00	L. 22,537.50		
6.02	Repello / Afinado / pintura	M ²	22.42	L. 310.00	L. 6,950.20		
6.03	Solera de cierre en fuente 0.10 x0.15m	MI	20.05	L. 380.00	L. 7,619.00		
6.04	Piso de fuente / Afinado. E=0.10m	M ²	15.60	L. 900.00	L. 14,040.00		
6.05	Suministro e instalacion Tuberia Pvc de 1/2" para abastecer fuentes	MI	20.00	L. 160.00	L. 3,200.00		
6.06	Suministro E instalacion Tuberia de pvc 2" de retorno	MI	6.00	L. 300.00	L. 1,800.00		
6.07	Suministro e Instalacion Tuberia de pvc de 1" salida de fuentes	MI	3.40	L. 200.00	L. 680.00		
6.08	Suministro e Instalacion de bomba sumergible	unidad	2.00	L. 10,000.00	L. 20,000.00	-2.00	L. -20,000.00
6.09	Detalle decorativo en fuente	MI	8.40	L. 850.00	L. 7,140.00		
			Sub-Total		L. 83,966.70		-L. 20,000.00
7.00							
8.00	COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTOS + ORDEN DE CAMBIO	GLB	L. 977,999.77	1	L. 977,999.77		-L. 20,000.00

9.00	Actividad Nueva						
9.01	Suministro e instalacion Bomba Centrifuga 2 hp+ Centro de Carga	Global	1.00	L. 20,000.00	L. 20,000.00	1.00	L. 20,000.00

10.00	COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTOS	GLB	L.	977,999.77	1	L. 997,999.77	L. 20,000.00
11.00	COSTOS TOTAL DEL PROYECTOS + ORDEN DE CAMBIO	GLB	L.	977,999.77	1	L. 997,999.77	L. 20,000.00

Costo Total del proyecto	L. 977,999.77
Orden de cambio	L. 20,000.00
TOTAL A PAGAR	L. 997,999.77

[Handwritten Signature]
AIC CONTRATISTA
 KENNY VELMIR BANEGAS MEJIA
 S E INGENIEROS CONSTRUCTORES AIC
 12011982003000

[Handwritten Signature]

CONTRATANTE
 FRANCISCO BUSTILLO GONZALES
 ALCALDE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

SUPERVISOR
 NAHUM ORTEGA TROCHEZ
 INGENIERA CIVIL
