



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

Reporte de Actividades Realizadas

Febrero 2020



www.facebook.com/municipalidadlaceiba/



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

LA CEIBA, ATLANTIDA; HONDURAS CA.



Memorándum 02-23-2020

Para: Lic. Ángela Williams
Oficial de Acceso a La Información Pública

De: Ing. Luis Armando Mejía
Ingeniero Municipal



Asunto: Lo Descrito

Fecha: 03 marzo del 2020.

El motivo de la presente es para Remitirle el informe de Proyectos Ejecutados correspondientes al mes de febrero 2020.

Sin más que adicionar.

Me despido de usted.

Atentamente

CC. Archivo Ingeniería/mhv

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - MES DE FEBRERO DEL 2020

N°	Sector	Nombre de Proyecto	Ubicación Proyecto	Alcance	Costo del Proyecto	Descripción Obra	Impacto Ambiental	Fuente Financiamiento	Monto Ejecutado Acumulado	Orden de Cambio			Fecha de Finalización	% de Avance
										Si	No	Justificación		
1		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LA CEIBA (TERRACERIA)	BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE LA CEIBA	BENEFICIARA TODA LA POBLACION DE LA CEIBA.	L. 249,000.00	PERFILADO DE CUNETAS Y MEJORAMIENTO DE CALZADA		FONDOS MUNICIPALES	L. 249,000.00		X		29-feb-20	100%
2		Sobrealcho del Boulevard del Este	La Cieba Atlántida	BENEFICIARA TODA LA POBLACION DE LA CEIBA.	L. 450,000.00	Sobrealcho de 3m para generar un carril de facil acceso hacia la Col. Pizzaty		FONDOS MUNICIPALES	L. 112,500.00		X		18-mar-20	25%
3		Prolongacion del Boulevard del Este (Villa Neem hacia Satuye)	La Cieba Atlántida	BENEFICIARA TODA LA POBLACION DE LA CEIBA.	L. 120,000.00	Habilitacion 1.5km de calle de terraceria desde Villa Neem 2 hasta el sector de Satuye		FONDOS MUNICIPALES	L. 72,000.00		X		18-mar-20	60%






MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA



FOTOGRAFÍAS

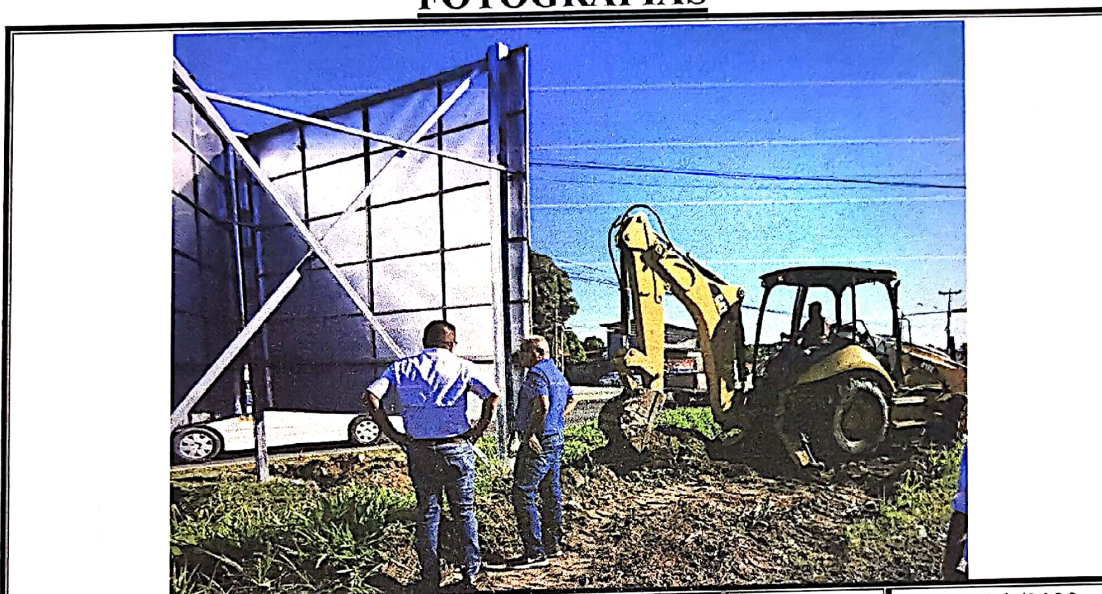

No. 1	Limpieza del área verde donde se construirá el sobreancho	Fecha: Feb/2020
	Proyecto: Sobreancho Boulevard del Este	



No. 2	Excavación para la instalación del alcantarillado	Fecha: Feb/2020
	Proyecto: Sobreancho Boulevard del Este	





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA



No.	Remoción de la capa vegetal del terraplén	Fecha: Feb/2020
3	Proyecto: Prolongación del Boulevard del este	



No.	Apertura de la calle previo a la conformación de la misma	Fecha: Feb/2020
4	Proyecto: Prolongación del Boulevard del este	





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA



No. 5	Conformación de la calle y perfilado de la cuneta en La Cuenca	Fecha: Feb/2020
	Proyecto: Mantenimiento de Red Vial No Pavimentada	



No. 6	Conformación de la calle y perfilado de la cuneta en La Cuenca	Fecha: Feb/2020
	Proyecto: Mantenimiento de Red Vial No Pavimentada	

