

# **FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

## **FHIS**

**INFORME IV TRIMESTRE**

**FHIS 2015**

**MBA. MARIO RENÉ PINEDA VALLE**

**Diciembre, 2015**

## Contenido

Introducción .....	4
Antecedentes .....	4
Misión: .....	5
Visión: .....	5
Valores: .....	5
Resumen Ejecutivo.....	6
Programas FHIS .....	10
Ejecución Presupuestaria 2015.....	11
CARTERA BANCO MUNDIAL .....	17
• Proyecto Donación de Generación de Empleo Temporal TF097916.....	17
• Proyecto Municipios más Seguros .....	20
• Proyecto de Infraestructura Rural 4099/HO.....	24
• Crédito Banco Mundial 5289-0 HN .....	26
CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.....	30
• Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC) .....	30
• Programa de Integración y Convivencia Urbana .....	35
• Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO .....	40
CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA .....	46
• Proyecto de Infraestructura Rural BCIE .....	46
CARTERA KfW Entwicklungsbank .....	48
• Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local SE-FHIS KFW VIII (PROMINE) FASE I .....	48
• Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local SE-FHIS KFW VIII (PROMINE) FASE II.....	52
• Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local SE-FHIS KFW VIII (PROMINE) FASE III.....	55
• Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR).....	58
CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID).....	65
• Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP) .....	65
• Programa de Infraestructura de Educativa (FHIS/EIP) .....	71

- Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a Través de las Energías Renovables (PODER) ..... 74
- COOPERACIÓN SUIZA EN AMÉRICA CENTRAL..... 76
- Mejora del Acceso a Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Urbanas, Periurbanas y Rurales de Honduras. .... 76

## Introducción



El presente informe es la recopilación de las actividades e inversiones realizadas por el IDECOAS/FHIS durante el Tercer Trimestre del 2015.

## Antecedentes

De acuerdo al Artículo 3, Numeral 4, Artículo 13 y 20 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-001-2014 se crea el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, mismo que se encuentra integrado por el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), que fue creado mediante el Decreto Ejecutivo PCM-013-2014 publicado el 30 de Mayo del 2014 y tiene como propósito la integración institucional del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y del Servicio Autónomo Nacional de Acueducto y Alcantarillados (SANAA) y demás afinas al sector, en el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS). Independiente de su integración estas instituciones continúan cumpliendo los objetivos establecidos en sus leyes constitutivas. A partir de la aprobación del Decreto PCM-013-2014 queda establecida la nueva estructura y funcionamiento del IDECOAS con las entidades que lo integran.

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es un organismo Desconcentrado de la Presidencia de la República, creado el 22 de febrero de 1990 y extendida su vida legal hasta el año 2022 según decreto No. 222-2010 cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados, en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social y/o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Asimismo, asesorará a los gobiernos locales con respecto a los procesos de captación de recursos de las fuentes de financiamiento nacionales y/o externas y las asiste en la transferencia de las capacidades

técnicas y administrativas, para convertir a estos gobiernos locales en administradores eficientes de sus programas y proyectos, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Nación en aplicación del principio de Descentralización.

**Misión:**

“Somos una Institución estatal, desconcentrada, técnica y captadora de recursos que promueve el desarrollo local sostenible, participativo e incluyente mediante el fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, en alianza con socios estratégicos para desarrollar obras de infraestructura y proyectos de orientación social de acuerdo al plan de nación y visión de país de forma transparente y eficiente, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable de Honduras”.

**Visión:**

“Ser para el año 2022, la Institución líder en gestión y fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, para la ejecución de proyectos, que contribuya equitativamente al desarrollo sustentable nacional”.

**Valores:**

- ❖ Ética: Ejercicio de las funciones con sujeción a las normas morales que promuevan la confianza de la población hondureña.
- ❖ Integridad: Actuación sustentada en la honradez, prudencia, entereza, rectitud y firmeza.
- ❖ Compromiso: Ejecución de proyectos que coadyuven al desarrollo local.
- ❖ Transparencia: Amplia difusión de información sobre nuestras actuaciones. Rendición de cuentas ante la sociedad.
- ❖ Lealtad: Actuar con fidelidad y rectitud hacia el FHIS y compañeros de trabajo, con el objetivo de identificarse con la institución.
- ❖ Equidad: El FHIS no hace distinción de credo, raza, de ninguna otra forma de discriminación humana.

## Resumen Ejecutivo


El IDECOAS/FHIS, llega hasta los lugares más recónditos del país, para contribuir a mitigar las necesidades de la población más pobre y vulnerable a través de respuestas rápidas y concretas con proyectos de Agua y Saneamiento, Educación, Electrificación Rural, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural.

El presupuesto del FHIS del 2015 al 31 de diciembre asciende a 1,098 Millones de Lempiras:

Fuente	Monto Presupuesto (Lps.)	% de Participación Presupuesto
<b>BID</b>	358197,287.00	32.60%
<b>BCIE</b>	32683,893.00	2.97%
<b>BM</b>	290480,363.00	26.44%
<b>GOH*</b>	114448,577.00	10.42%
<b>USAID</b>	60248,010.00	5.48%
<b>Cooperación Suiza</b>	49033,341.00	4.46%
<b>KfW</b>	193690,456.00	17.63%
<b>TOTAL</b>	<b>1098781,927.00</b>	<b>100.00%</b>

\* Incluye costo Operativo del FHIS

### Contribución por Fuente en el Presupuesto 2015.

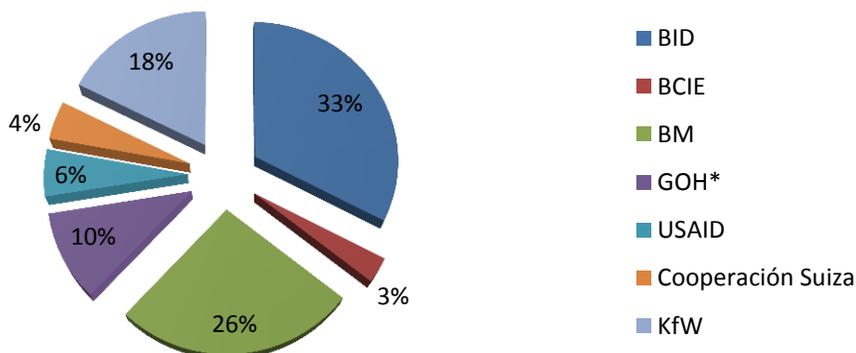

#### Situación Actual de los Programas:

- ❖ Proyecto Municipios Más Seguros, concluyó el sub-proyecto CEPREV. Se inició el proceso de levantamiento de información para la evaluación de impacto del sub-proyecto de la metodología de prevención CEPREV. Para lo cual se gestionaron y se suscribieron convenios con las municipalidades de Choloma, El Progreso y La Ceiba, para un total de tres convenios. En los municipios de El Progreso y La Ceiba ha concluido el levantamiento y digitación de datos, pendiente la municipalidad de Choloma.
- ❖ Proyecto de Infraestructura Rural (Crédito BM 4099), durante el 4to. Trimestre se finalizó el sub proyecto de agua y saneamiento de la Comunidad de Llano Largo, municipio de La Labor, departamento de Ocotepeque, beneficiando a 1,623 beneficiarios o sean 283 familias.
- ❖ Proyecto de Infraestructura Rural (Crédito Banco Mundial 5289-0 HN), en el sector caminos se finalizaron 3 sub proyectos de pavimentación de kilómetros municipales en el casco urbano del Municipio de Dolores Merendón, departamento de Ocotepeque, Pavimentación en el Casco Urbano del Municipio de Morolica, departamento de Choluteca y la Rehabilitación de Caminos Rurales Los Vados-Joconales, municipio de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, beneficiando a más de 1,600 familias.
- ❖ Programa de Integración y Convivencia Urbana, para el Proyecto de Integración Urbana Zona 1, Lote 1 (San Juan del norte 1 y 2, Buenas Nuevas) el proyecto presenta una ejecución física de 95%, Proyecto de Integración Urbana Zona 1, Lote 2 (Brisas de la Laguna, Las Pavas, Alemania) el proyecto presenta una ejecución física de 94% y para el Proyecto de Integración urbana en Zona 2 (Colonias David Betancourt, Arcieri, Ramón Amaya Amador y Montes de Bendición) el proyecto presenta una ejecución física de 74.25%.
- ❖ Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO, se hizo el proceso de adquisición de Kits para Cosecha de Aguas Lluvias, el total de la compra es L. 3364,012.51, se beneficiarán 112 hogares del Departamento de Ocotepeque con la donación de los Kits, la cual se realizará en el mes de enero de 2016. Cada Kit Consiste en un sistema para Cosecha de Agua Lluvia de 15,000 lts., los cuales se adaptan fácilmente a las necesidades de los usuarios, es un método sencillo y económico para la recolección y almacenamiento de agua lluvia, con el fin de ser usada en actividades domésticas o para el consumo humano previo

tratamiento, así como para sistemas de micro riego en huertos familiares. Cada Kit está compuesto por una bolsa de Geomembrana de 1 mm, kit de reparación (cinta tapagoteras-hilo soldadura 3m geotextil para protección/suelo), kit de captación de aguas lluvias (canales-tuberías-accesorios PVC), kit de riego (manguera-válvulas-filtro), tanque de agua y Filtro domiciliar.

- ❖ Programa Infraestructura Rural (BCIE), están en ejecución 2 sub proyectos de electrificación rural por extensión de red en la comunidad del Volcán, municipio de Piraera, departamento de Lempira beneficiando a 198 personas y Las Comunidades del Sombrillo, Cerro Verde, Municipio de Colomoncagua, departamento de Intibucá, beneficiando a 426 personas.
- ❖ Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión local SE-FHIS KFW VIII (PROMINE) FASE I, Se cuenta con los 125 proyectos en cierre físico y financiero de los 131 proyectos que comprende la fase lo que representa el 95.41%
- ❖ Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión local SE-FHIS KFW VIII (PROMINE) FASE II, Se cuenta con los 33 proyectos en cierre físico y financiero de los 40 proyectos que comprende la fase lo que representa el 82.50%
- ❖ Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión local SE-FHIS KFW VIII (PROMINE) FASE III, se contempla 80 proyectos los cuales han ingresado al ciclo de proyectos del FHIS, 10 proyectos (en formulación y formulados), el resto está pendiente la priorización de la Secretaria de Educación.
- ❖ Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR), se han ejecutado los primeros 3 proyectos y se está por desembolsar a 4 proyectos más en enero 2016 y se encuentran en fase de diseño aproximadamente 10 proyectos. La fase de formulación concluye en junio del 2016, fecha para la cual el programa estará en plena ejecución de obras de infraestructura.
- ❖ Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP), se han capacitado y certificado a 222 en 12 comunidades, en diferentes oficios técnicos y capacitaciones de emprendedurismo y habilidades para la vida. Se inició talleres en Choloma y San Pedro Sula.


- ❖ Programa de Infraestructura Educativa (FHIS/EIP), en conjunto con la Secretaría de Educación y el FHIS, fueron terminados 21 proyectos de infraestructura escolar y se encuentra 7 proyectos en ejecución.
- ❖ Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a través de las Energías Renovables (Poder), De los 23 perfiles de proyectos presentados fueron aprobados 4 con fondos asignados y 19 aprobados con fondos por asignar (entre febrero y marzo 2016).
- ❖ Mejora del Acceso a Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Urbanas, Periurbanas y Rurales de Honduras, se finalizaron los 17 proyectos con fondos de la Cooperación Suiza.

## Programas FHIS

Fuente	Nombre de Proyecto	Nombre Corto	Sector	Modalidad de Ejecucion
<b>BID</b>	Complemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Sanamiento	1793/SF-HO	Agua y Saneamiento	Centralizados
	Programa de Integración y Convivencia Urbana	2895/SF-HO	Infraestructura Social	Centralizados
	Programa de Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático	ATN NV-13535-HO-1	Proyectos de Adaptación y Mitigación de Riesgos	PEC
<b>Banco Mundial</b>	Proyecto de Infraestructura Rural	Credito 4099-HO y 5289-HN	Agua y Saneamiento, Electrificación y Caminos Rurales	Descentralizados/ Centralizados
	Proyecto Generación de Empleo Temporal	TF097916	Infraestructura Social, Seguridad Ciudadana	Centralizados
	Proyecto Municipios más Seguros	5192-HN	Infraestructura Social, Seguridad Ciudadana	Descentralizados/ Centralizados
<b>BCIE</b>	Proyecto de Infraestructura Rural	BCIE 1736	Agua y Saneamiento, Electrificación y Caminos	Descentralizados/ Centralizados
<b>KFW</b>	Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de	KFW VIII	Infraestructura Escolar	Descentralizados
	Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)	CONVIVIR	Infraestructura Social y Fortalecimiento de las Capacidades de los Jóvenes.	Descentralizados
<b>Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación</b>	Programa COSUDE FASE VI	COSUDE	Agua y Saneamiento	Centralizados
<b>USAID</b>	Programa de Infraestructura Educativa (FHIS/EIP)	Mérida/CARSI	Reparación de centros educativos (escuelas y jardines de niños) en la	Centralizados
	Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP)	Mérida/CARSI	Proyectos de Seguridad en las comunidades que se puedan construir en menos de un año.	Descentralizados
<b>Fondos Nacionales</b>	Construcción Primera Etapa del	Gob-Hn	Educación	Centralizados
	DECRETO 045-2013	Gob-Hn	Proyectos de Infraestructura	Centralizados

## Ejecución Presupuestaria 2015

PROGRAMA	PRESUPUESTO 2015	Ejecución al 31 de Diciembre 2015	%
Gasto Operativo	114448,577.00	112473,287.99	98%
Proyecto de Infraestructura Rural 4099-BM	7586,586.00	7573,560.10	100%
Proyecto de Infraestructura Rural 5289-HN	199719,678.00	199347,761.68	100%
Proyecto de Infraestructura Rural 1736-BCIE	32683,893.00	32295,225.85	99%
Programa de Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestion Local, KfW VIII (Fase I)	69904,692.00	68984,604.67	99%
Programa de Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestion Local, KfW VIII (Fase II)	62922,433.00	62272,727.56	99%
Programa de Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestion Local, KfW VIII (Fase III)	21990,172.00	19575,047.54	89%
Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento 1793-BID	233233,922.00	233171,435.68	100%
Mejora del Acceso a Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Urbanas, Periurbanas y Rurales de Honduras.	49033,341.00	49029,485.54	100%
Proyecto Generación de Empleo Temporal	28951,680.00	28515,148.27	98%
Programa de Integración y Convivencia Urbana	120882,736.00	106545,487.78	88%
Proyecto Municipios mas Seguros	54222,419.00	51468,890.89	95%
Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jovenes CONVIVIR	38873,159.00	34024,198.74	88%
Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP)	24579,983.00	23604,345.43	96%
Programa de Infraestructura Educativa (FHIS/EIP)	24807,145.00	24651,657.63	99%
Programa de Pueblos Indigenas y Afrohondureños y Cambio Climatico	2881,429.00	2191,439.90	76%
Programa de Pueblos Indigenas y Afrohondureños y Cambio Climatico 2	1199,200.00	430,199.33	36%
Programa de Oportunidades para el Desarrollo a través de Energía Renovable	10860,882.00	9750,284.62	90%
<b>TOTAL</b>	<b>1098781,927.00</b>	<b>1065904,789.20</b>	<b>97%</b>

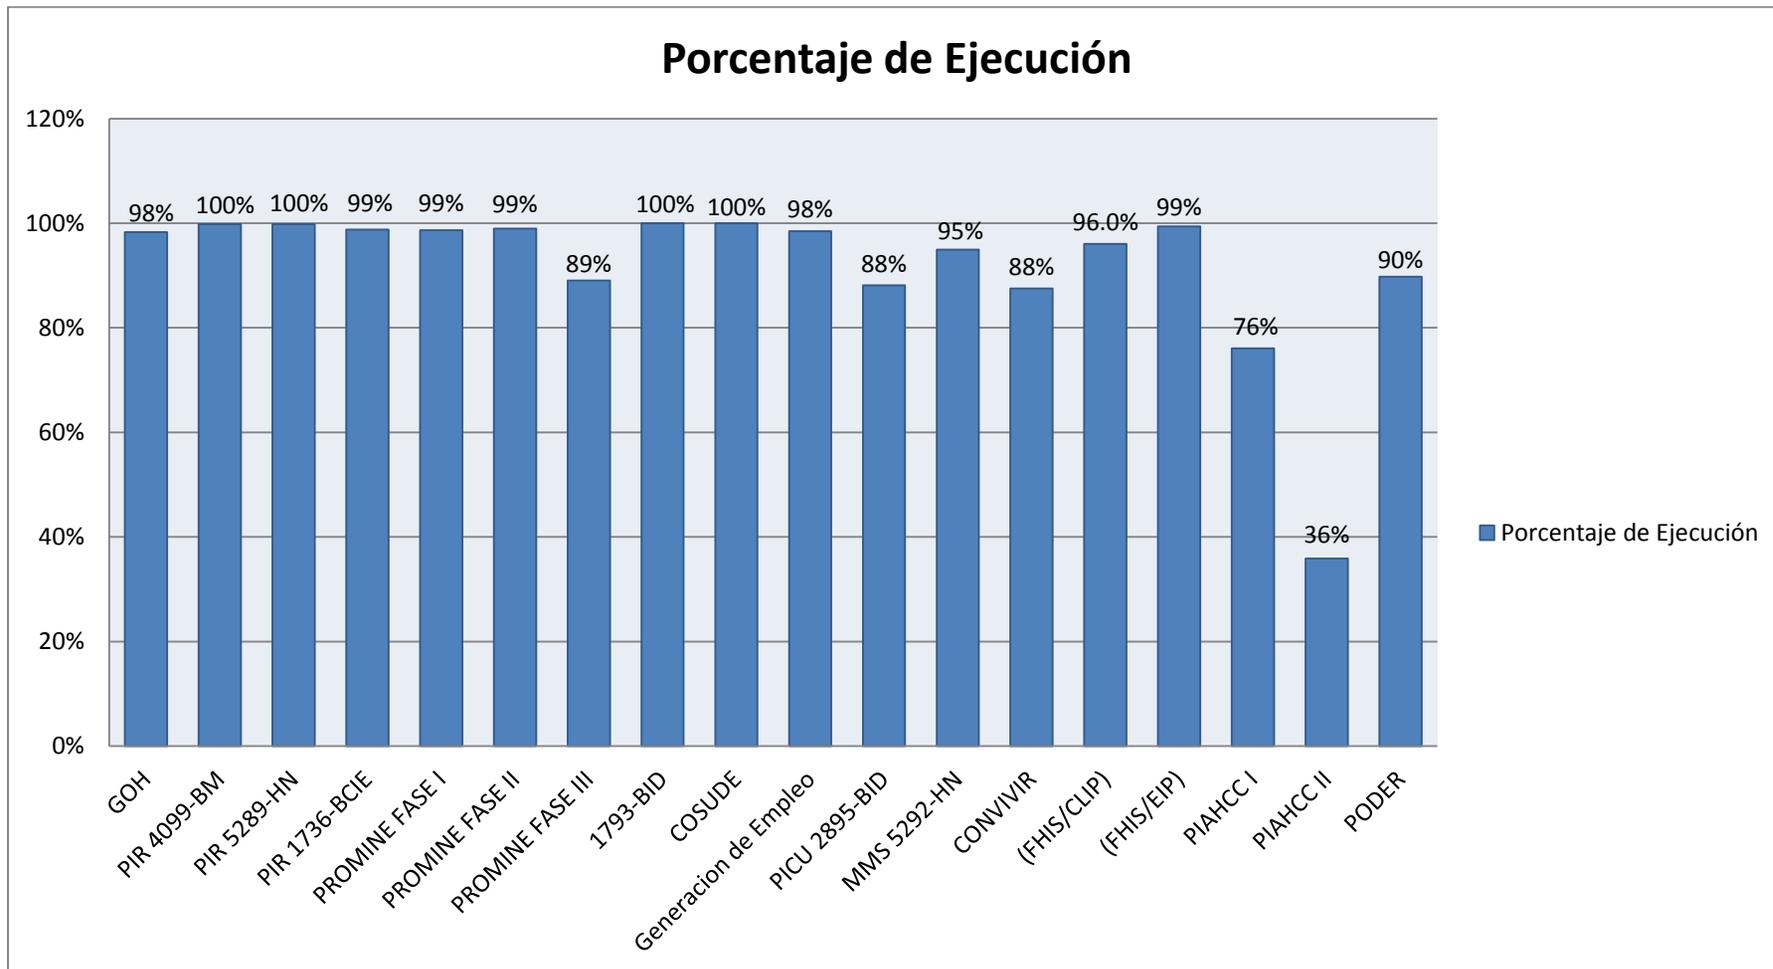

## Ejecución Gasto Operativo al Cuarto Trimestre del 2015

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES			
110	PERSONAL PERMANENTE			
11100	Sueldos Básicos	57621012.00	57621012.00	0.00
11400	Adicionales	3739,043.00	3739,043.00	0.00
11510	Decimotercer Mes	4801,750.00	4801,750.00	0.00
11520	Decimocuarto Mes	4801,749.00	4801,749.00	0.00
11600	Complementos	4561,749.00	4561,749.00	0.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	8278,383.00	8278,383.00	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	2656,825.00	2656,825.00	0.00
<b>SubTotal:</b>		<b>86460,511.00</b>	<b>86460,511.00</b>	<b>0.00</b>
160	Beneficios y Compensaciones			
16000	Beneficios y Compensaciones	1608,301.00	1608,301.00	0.00
<b>SubTotal:</b>		<b>1608,301.00</b>	<b>1608,301.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>88068,812.00</b>	<b>88068,812.00</b>	<b>0.00</b>
200	SERVICIOS NO PERSONALES			
210	SERVICIOS BASICOS			
21100	Energía Eléctrica	3240,000.00	3240,000.00	0.00
21200	Agua	388,838.00	388,838.00	0.00
21420	Telefonía Fija	780,000.00	780,000.00	0.00
21490	Otros Servicios Básicos	6,914.00	5,850.00	1064.00
<b>SubTotal:</b>		<b>4415,752.00</b>	<b>4414,688.00</b>	<b>1064.00</b>
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES			
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	6806,129.00	6806,129.00	0.00
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00
22900	Otros Alquileres	22,800.00	18,630.00	4,170.00
<b>SubTotal:</b>		<b>6838,929.00</b>	<b>6824,759.00</b>	<b>14170.00</b>
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA			
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	152,000.00	100,554.58	51,445.42
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de	1048,486.00	991,771.79	56,714.21
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	228,000.00	218,553.91	9,446.09
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	79,040.00	52,976.93	26,063.07
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	68,400.00	25,900.00	42,500.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	118,000.00	103,893.50	14,106.50
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	121,600.00	87,236.80	34,363.20
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	159,600.00	159,504.08	95.92
<b>SubTotal:</b>		<b>1975,126.00</b>	<b>1740,391.59</b>	<b>234734.41</b>

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
240	SERVICIOS PROFESIONALES			
24300	Servicios Jurídicos	91,200.00	90,976.25	223.75
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	144,820.00	144,820.00	0.00
24500	Servicios de Capacitación	86,600.00	83,300.00	3,300.00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	365,496.00	365,496.00	0.00
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1565,980.00	1552,680.00	13,300.00
<b>SubTotal:</b>		<b>2254,096.00</b>	<b>2237,272.25</b>	<b>16823.75</b>
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			
25100	Servicio de Transporte	1,500.00	1,490.00	10.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1633,698.00	1631,189.19	2,508.81
25400	Primas y Gastos de Seguro	1393,848.00	1239,328.53	154,519.47
25700	Servicio de Internet	196,284.00	196,284.00	0.00
25800	Diferencial Cambiario	400,000.00	349,354.73	50,645.27
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	137,700.00	106,130.86	31,569.14
<b>SubTotal:</b>		<b>3763,030.00</b>	<b>3523,777.31</b>	<b>239252.69</b>
260	PASAJES Y VIATICOS			
26100	Pasajes Nacionales	79,800.00	79,800.00	0.00
26200	Viáticos Nacionales	2441,245.00	2441,244.64	0.36
<b>SubTotal:</b>		<b>2521,045.00</b>	<b>2521,044.64</b>	<b>0.36</b>
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES			
27200	Tasas	668,800.00	102,100.00	566,700.00
<b>SubTotal:</b>		<b>668,800.00</b>	<b>102,100.00</b>	<b>566700.00</b>
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			
29100	Ceremonial y Protocolo	391,200.00	390,026.96	1,173.04
<b>SubTotal:</b>		<b>391,200.00</b>	<b>390,026.96</b>	<b>1173.04</b>
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>22827,978.00</b>	<b>21754,059.75</b>	<b>1073918.25</b>
300	MATERIALES Y SUMINISTROS			
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	390,196.00	324,354.32	65,841.68
<b>SubTotal:</b>		<b>390,196.00</b>	<b>324,354.32</b>	<b>65841.68</b>
320	TEXTILES Y VESTUARIO			
32300	Prendas de Vestir	53,200.00	53,158.75	41.25
<b>SubTotal:</b>		<b>53,200.00</b>	<b>53,158.75</b>	<b>41.25</b>
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
33100	Papel de Escritorio	227,237.00	172,400.83	54,836.17
33300	Productos de Artes Gráficas	35,669.00	35,493.00	176.00
33400	Productos de Papel y Cartón	30,810.00	1,060.25	29,749.75
33500	Libros, Revistas y Periódicos	27,664.00	510.00	27,154.00
33700	Especies Timbradas y Valores	38,030.00	5,220.00	32,810.00
<b>SubTotal:</b>		<b>359,410.00</b>	<b>214,684.08</b>	<b>144725.92</b>

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
340	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS			
34400	Lantas y Cámaras de Aire	456,000.00	364,320.00	91,680.00
<b>SubTotal:</b>		<b>456,000.00</b>	<b>364,320.00</b>	<b>91,680.00</b>
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
35100	Productos Químicos	11,400.00	989.00	10,411.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	15,200.00	12,466.92	2,733.08
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	17,100.00	14,150.92	2,949.08
35610	Gasolina	15,200.00	0.00	15,200.00
35620	Diesel	371,520.00	370,736.00	784.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	152,000.00	147,366.00	4,634.00
<b>SubTotal:</b>		<b>582,420.00</b>	<b>545,708.84</b>	<b>36,711.16</b>
360	PRODUCTOS METALICOS			
36400	Herramientas Menores	5,700.00	1,899.80	3,800.20
36930	Elementos de Ferretería	20,520.00	18,904.69	1,615.31
<b>SubTotal:</b>		<b>26,220.00</b>	<b>20,804.49</b>	<b>5,415.51</b>
380	MINERALES VARIOS			
38400	Piedra, Arcilla y Arena	11,400.00	1,041.00	10,359.00
<b>SubTotal:</b>		<b>11,400.00</b>	<b>1,041.00</b>	<b>10,359.00</b>
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	79,800.00	78,596.14	1,203.86
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	420,279.00	273,312.80	146,966.20
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	147,800.00	144,229.32	3,570.68
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	3,800.00	0.00	3,800.00
39600	Repuestos y Accesorios	790,662.00	475,431.18	315,230.82
<b>SubTotal:</b>		<b>1,442,341.00</b>	<b>971,569.44</b>	<b>470,771.56</b>
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>3,321,187.00</b>	<b>2,495,640.92</b>	<b>825,546.08</b>
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			
51220	Ayuda Social a Personas	226,000.00	154,775.32	71,224.68
51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,600.00	0.00	4,600.00
<b>SubTotal:</b>		<b>230,600.00</b>	<b>154,775.32</b>	<b>75,824.68</b>
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>230,600.00</b>	<b>154,775.32</b>	<b>75,824.68</b>
<b>TOTAL GENERAL :</b>		<b>11,448,577.00</b>	<b>11,247,287.99</b>	<b>197,289.01</b>

### Cuadro por Sector 2015 (Ejecutado)

SECTOR	PROYECTOS	EJECUTADO	EMPLEOS	BENEFICIARIOS
AGUA Y ALCANTARILLADO	57	312269,310.61	2,077	232,166
ASISTENCIA TÉCNICAS	1	300,000.00	3	90
CAMINOS	20	56372,274.83	412	22,513
EDUCACIÓN	183	163426,532.08	4,265	27,314
ENERGIA	28	49305,397.61	137	5,754
MUNICIPAL	86	80835,565.61	3,818	55,215
PROYECTO INTEGRAL	9	95715,207.60	768	14,015
SISTEMAS DE RIEGO	3	5387,930.34	0	168
SISTEMAS SOLARES	61	8980,902.04	183	9,366
<b>Total</b>	<b>448</b>	<b>772593,120.72</b>	<b>11,663</b>	<b>366,601</b>

### Cuadro por Departamento 2015 (Ejecutado)

DEPARTAMENTO	PROYECTOS	EJECUTADO	EMPLEOS	BENEFICIARIOS
ATLÁNTIDA	32	28500,020.51	748	16,243
CHOLUTECA	12	27441,249.64	164	4,688
COLÓN	5	62249,411.16	198	16,735
COMAYAGUA	14	27448,497.49	846	14,110
COPAN	29	38483,506.38	881	17,738
CORTÉS	40	57275,529.65	1,518	87,715
EL PARAISO	17	20687,320.96	471	5,379
FRANCISCO MORAZÁN	36	127953,860.13	1,109	30,042
GRACIAS A DIOS	1	75,961.24	3	78
INTIBUCÁ	60	67422,374.12	1,225	8,232
LA PAZ	51	90910,598.79	1,162	25,606
LEMPIRA	41	52325,648.66	661	5,437
OCOTEPEQUE	20	23757,573.98	351	7,995
OLANCHO	15	34308,018.34	654	79,532
SANTA BARBARA	47	52202,405.42	1,050	5,194
VARIOS DEPARTAMENTOS	1	300,000.00	3	90
YORO	27	61251,144.25	619	41,787
<b>Total</b>	<b>448</b>	<b>772593,120.72</b>	<b>11,663</b>	<b>366,601</b>

OTRAS INVERSIONES	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	112473,287.99
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	180838,380.49
<b>Total</b>	<b>293311,668.48</b>

## **CARTERA BANCO MUNDIAL**

- **Proyecto Donación de Generación de Empleo Temporal TF097916**

- i. Objetivo General**

Mitigar el impacto que ha tenido la crisis económica global sobre la población, especialmente en las áreas urbanas de los municipios más vulnerables y pobres en Honduras, con altos niveles de violencia y desocupación, a través del pago en moneda corriente de una suma determinada, denominada “compensación social” por la participación de la población objetivo, en la construcción y/o desarrollo de sub proyectos en dichos barrios.

- ii. Focalización:**

Población desocupada residente de los barrios más pobres con altos índices de incidencia criminal de los municipios elegibles, dando prioridad a dos grupos:

- Jóvenes entre 18 y 24 años de edad, desocupados (los cuales se considera como una población con alta probabilidad de presentar situación de riesgo social).
- Jefes (Hombres o Mujeres) de hogar con hijos menores de edad.

- iii. Tipología de Proyectos**

- El proyecto consiste en la financiación de una “Compensación Social”, por la participación en la mano de obra no calificada para la construcción de pequeños sub proyectos de interés comunitario o en la participación regular en actividades de servicios comunitarios.
- Desarrollo de actividades grupales: Dos (2) horas por semana que estarán orientadas al reforzamiento de la autoestima, trabajo en equipo, acciones de convivencia ciudadana y cohesión social, diálogos de reflexión, comunicación efectiva, resolución de conflictos de manera cooperativa, liderazgo, valores y promoción de una cultura de paz, mi barrio un lugar seguro (metodología CPTED); con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana a nivel individual y colectivo.

**Monto del Convenio:** Esta donación corresponde a un monto de US\$ 2,545,000.00 que será invertidos en una estrategia de generación de empleo temporal, a través de la financiación de la mano de obra de sub proyectos de interés comunitario.

La fecha de cierre del proyecto según convenio es el 15 de Marzo 2015, pero el proyecto finalizó el 15 de Julio del 2015, por periodo de gracia.

#### iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2013	25000,000.00	1179,874.32	4.72%
2014	24000,000.00	22756,114.73	94.82%
2015	28951,680.00	28515,148.27	98.49%

#### v. Avance Físico por Departamento

Departamento	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
ATLANTIDA	20	7673,944.72	7673,944.72	7673,944.72	0.00	475	475
COMAYAGUA	13	11679,936.50	11679,936.50	11679,936.50	0.00	722	722
COPAN	24	4846,138.26	4846,138.26	4785,561.34	60,576.92	300	300
CORTES	44	17727,015.73	18067,079.11	17690,982.36	376,096.75	1,118	1,118
EL PARAISO	8	4889,115.01	4889,115.01	4826,430.00	62,685.01	300	300
FRANCISCO MORAZAN	2	308,035.00	476,619.25	476,619.25	0.00	0	0
YORO	12	5198,959.18	5198,959.18	5193,027.93	5,931.25	347	347
<b>Total</b>	<b>123</b>	<b>52323,144.40</b>	<b>52831,792.03</b>	<b>52326,502.10</b>	<b>505,289.93</b>	<b>3,262</b>	<b>3,262</b>

nota: Esta información es de toda la vida del proyecto, ya que finalizó en julio 2015.

#### vi. Otras Inversiones

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	123	52323,144.40	52831,792.03	52326,502.10	505,289.93
	<b>123</b>	<b>52323,144.40</b>	<b>52831,792.03</b>	<b>52326,502.10</b>	<b>505,289.93</b>

#### vii. Principales Logros

A continuación, se presenta los sub-proyectos ejecutados en el Marco del Proyecto de Generación de Empleo Temporal. La cartera de sub-proyectos asciende a un total de 36 sub-proyectos, como se detalla a continuación:

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	BARRIO
1	Adecuación de Espacios Públicos para una mejor Convivencia Recreación Familiar y Práctica Deportiva en la Colonia Santa Eduvigis.	104859	Copán	Santa Rosa de Copán	Santa Eduvigis
2	Mejoramiento de la Infraestructura Vial para la Prevención de Accidentes en la Colonia Santa Eduvigis.	105110	Copán	Santa Rosa de Copán	Santa Eduvigis
3	Implementación de Medidas de Prevención Ambiental para una Mejora de la Calidad de Vida de los Habitantes de la Colonia Santa Eduvigis.	104861	Copán	Santa Rosa de Copán	Santa Eduvigis
4	Mejoramiento del Entorno Comunitario para una Mejor Convivencia Familiar y la Prevención de Violencia en la Colonia Santa Eduvigis.	104798	Copán	Santa Rosa de Copán	Santa Eduvigis
5	Mejoramiento de los Espacios de Recreación Comunitaria de la Colonia Santa Eduvigis.	104799	Copán	Santa Rosa de Copán	Santa Eduvigis

6	Mejoramiento de la Infraestructura Sanitaria y Mantenimiento de Fuente de Agua y Áreas Verdes.	104800	Copán	Santa Rosa de Copán	Santa Eduviges
7	Sub proyecto de limpieza "Generando Empleabilidad a través de Barrios Limpios y Verdes " Miguel Yáñez Ríos y Anexo Las Flores	103045	Cortes	Villanueva	Miguel Yáñez Ríos
8	Sub proyecto de Limpieza "Generando Empleabilidad a través de Barrios Limpios y Verdes" Bo. La independencia, Acacia y La Victoria.	103046	Cortes	Villanueva	Miguel Yáñez Ríos
9	Sub proyecto de Ornamentación "Juventud y Medio Ambiente Sano" Miguel Yáñez Ríos y Las Flores.	103047	Cortes	Villanueva	Miguel Yáñez Ríos
10	Sub proyecto de Ornamentación "Juventud y Medio Ambiente Sano" Bo. La independencia, Acacia y La Victoria.	103048	Cortes	Villanueva	Miguel Yáñez Ríos
11	Sub proyecto "Mantenimiento de Pasamanos"	103049	Cortes	Villanueva	Miguel Yáñez Ríos
12	"Señalización Vertical y Nomenclaturización de los Barrios del Anexo las Flores y la Miguel Yáñez Ríos"	103050	Cortes	Villanueva	Miguel Yáñez Ríos
13	Mejoramiento Vial de la Colonia 2 de Marzo	104715	Yoro	El Progreso	2 de Marzo
14	Mejoramiento del Sistema de Cunetas de la Colonia 02 de Marzo	105108	Yoro	El Progreso	2 de Marzo
15	Mejoramiento de Protección de Corredor de Invierno Manejo de Quebrada y Ornamentación Área Recreativa en la Col. 02 de Marzo	104719	Yoro	El Progreso	2 de Marzo
16	Estaciones de Espera de Transporte Público en la Ciudad de El Progreso	105136	Yoro	El Progreso	2 de Marzo
17	Recuperación de Espacios Públicos y Reforzamiento Territorial del Barrio La Independencia y Las Colonias Valladolid y Fiallos	104716	Comayagua	Comayagua	Independencia
18	Mejoramiento de Infraestructura Básica de Calles y Cunetas, para el Reforzamiento Territorial de la Colonia Fiallos	105109	Comayagua	Comayagua	Independencia
19	Mejoramiento de Espacio Deportivo y Recreativo del Barrio El Parnaso y Campo Alegre	105015	Comayagua	Siguetepeque	El Parnaso
20	Mejoramiento del Sistema de Cunetas de El Parnaso Centro	105016	Comayagua	Siguetepeque	El Parnaso
21	Recuperación de Espacios Públicos de la Circunvalación de la ciudad de Danlí	104717	El Paraíso	Danlí	Danli
22	Recuperación de Espacios Públicos de la Circunvalación de la ciudad de Danlí	104718	El Paraíso	Danlí	Danli
23	Empedrado Calle Frente a Centro Comunal	105119	Atlántida	La Ceiba	Danto, Melgar 1 y Melgar 2
24	Empedrado Redondel Los Mangos	105120	Atlántida	La Ceiba	Danto, Melgar 1 y Melgar 3
25	Empedrado Calle Entrada Col. Jerusalén	105121	Atlántida	La Ceiba	Danto, Melgar 1 y Melgar 4
26	Señalización Horizontal Casco Histórico de la Ceiba	105122	Atlántida	La Ceiba	Danto, Melgar 1 y Melgar 5
27	Recuperación Ambiental de La Ceiba	105123	Atlántida	La Ceiba	Danto, Melgar 1 y Melgar 6
28	Recreovias por la Paz	105124	Atlántida	La Ceiba	Danto, Melgar 1 y Melgar 7
29	Desarrollando Capacidades y Generando Empleo a través de Infraestructura Vial a Jóvenes de la Colonia 11 de Abril	104990	Cortes	Choloma	11 de Abril
30	Desarrollando Capacidades y Generando Empleo a través de Infraestructura Vial a Jóvenes de la Colonia INFOP	104991	Cortes	Choloma	INFOP

- **Proyecto Municipios más Seguros**

- i. **Objetivo**

Los objetivos de desarrollo del Proyecto son apoyar a Honduras para (i) mejorar las capacidades del gobierno central y de los gobiernos locales en la prevención de la violencia; (ii) abordar factores de riesgo de crimen y violencia en las Municipalidades Seleccionadas; y (iii) mejorar su capacidad de responder de manera rápida y efectiva ante una emergencia elegible.

- ii. **Focalización:**

El Proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región Norte: La Ceiba, Choloma y El Progreso. Esto refleja la selección realizada por el Programa Municipios más Seguros que prioriza acciones en zonas con alta concentración de delincuencia y violencia. Para este Proyecto, los municipios fueron seleccionados por la clasificación en orden decreciente, tomando aquellos con poblaciones urbanas menores a 250.000 habitantes y con una tasa de homicidios mayor a 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual es aproximadamente el promedio nacional.

- iii. **Tipología de Proyectos**

**Componente 1 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención de Violencia a Nivel Nacional:**

Subcomponente 1.1 Fortalecimiento de las capacidades de la Secretaría de Seguridad para orientar, coordinar y supervisar actividades de prevención de la violencia a nivel municipal; Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de las capacidades de la Secretaría de Seguridad y de las Municipalidades Seleccionadas para recolectar y procesar datos sobre violencia para la formulación de políticas basadas en la evidencia.

**Componente 2 – Prevención Integrada de Crimen y Violencia a nivel Municipal y Comunitario**

Intervenciones de prevención social dirigidos a las poblaciones en riesgo, incluyendo aquellas:

- Orientadas a la familia (por ejemplo, capacitación para padres, programas de desarrollo para niños víctimas de maltrato en edad preescolar (0-5 años) y proveerán capacitación para estilos de crianza, disciplina y comunicación padre-niño, habilidades para manejo sin violencia de situaciones familiares, supervisión de padres de familia y actividades de desarrollo para preparación de la escuela y mejoramiento de capacidades cognitivas);
- Basadas en género (por ejemplo, consejerías y remisiones de mujeres víctimas de violencia interpersonal, doméstica y/o sexual, educación sobre salud reproductiva y salud sexual,

masculinidad y el rol de los géneros, y fortalecimiento de redes locales de prevención de violencia de género);

- Basadas en la prevención de violencia escolar (por ejemplo, programas para después de clase que involucren deportes, música y arte, además de habilidades para la vida, y promoción de conductas pro-positivas; la promoción de habilidades para la resolución de conflictos y promoción de relaciones positivas entre estudiantes; intervenciones para estudiantes con problemas de aprendizaje o conducta; prevención y reducción del “bullying” y desarrollo de espacios escolares)
- Orientadas a los jóvenes (por ejemplo, Sub proyectos de mentoría (contacto sostenido con un adulto para proveer aprendizaje, acompañamiento y establecimiento de roles positivos a seguir) para jóvenes en situación de riesgo; servicios integrados para jóvenes de (15 -34 años) que cubran desarrollo de capacidades para obtención de trabajos incluyendo una mezcla de habilidades para la vida (auto-control, manejo de ira, mejora a la auto-estima y toma de decisiones así como pasantías laborables. También se prevé educación técnica vocacional, mediación en el mercado laboral y programas de rehabilitación de drogas.

#### Intervenciones de prevención situacional incluyendo:

- La construcción de infraestructura comunitaria en pequeña escala que reduce las oportunidades de cometer delitos o crea espacios seguros comunitarios (parques, jardines comunitarios, parques infantiles, alumbrado público y pavimentación de algunas calles);
- La construcción y/o rehabilitación de espacios que podrían servir como centro para la entrega de los servicios sociales para acciones de prevención de violencia.

#### Acceso a servicios básicos incluyendo:

- Intervenciones de mejoramiento urbano tales como conexiones de agua y saneamiento, alumbrado público, calles de acceso y obras de mitigación de riesgos.

#### Resolución alternativa de conflictos para ampliar los sistemas municipales de resolución de conflictos, incluyendo:

- La formación de mediadores municipales;
- Fortalecimiento de sistemas de registro de casos;
- Expansión de redes de mediadores voluntarios.

### **Componente 3 - Administración del Proyecto y Monitoreo y Evaluación**

Subcomponente 3.1. Apoyo a la Administración del Proyecto; Subcomponente 3.2. Monitoreo y

Evaluación del Proyecto, incluyendo (a) el establecimiento de sistemas y capacidades para el proceso de monitoreo de las actividades del Proyecto, (b) la recopilación de datos de línea de base y de seguimiento para la evaluación de impacto del Proyecto, y (c) el desarrollo de la evaluación de impacto de al menos dos tipos de intervenciones.

#### **Componente 4: Mecanismo de Respuesta Inmediata (MRI) para Contingencias por Emergencias**

Este componente incluye la entrega de apoyo para responder de forma inmediata ante una Emergencia Elegible.

El Monto del convenio original fue de \$15, 000,000.00, pero el 22 de septiembre del 2015 la sub secretaria de Inversión Publica notificó al Ministro Director de IDECOAS, mediante oficio DGIP-212-2015, la reestructuración de los fondos de financiamiento, que significó una disminución de 2.3 millones de Dólares, siendo el nuevo monto del convenio de US\$ 12, 700,000.00.

**Fecha de Firma del Convenio:** 18 de Diciembre de 2012

**Fecha de Finalización:** 31 de Agosto de 2018

#### **iv. Avance Financiero**

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2013	19288,000.00	11605,763.23	60.17%
2014	43046,050.00	22346,049.32	51.91%
2015	54222,419.00	51468,890.89	94.92%

#### **v. Avance Físico por Sector**

Sector	Proyectos	Mto. Ejecutado	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
EDUCACION	10	9798,697.37	5,000	165
MUNICIPAL	22	19318,626.55	25,000	390
<b>Grand Total</b>	<b>32</b>	<b>29117,323.92</b>	<b>30,000</b>	<b>555</b>

#### **vi. Avance Físico por Departamento**

Departamento	Proyectos	Mto. Ejecutado	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
ATLANTIDA	11	9387,076.45	8,000	210
CORTES	10	12497,163.08	10,000	180
YORO	11	7233,084.39	12,000	165
<b>Grand Total</b>	<b>32</b>	<b>29117,323.92</b>	<b>30,000</b>	<b>555</b>

**vii. Otras Inversiones**

Sector	Mto. Ejecutado
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	22351,566.97

**viii. Principales Logros**

-Se prepararon los TDRs para el sub-proyecto de Empleabilidad con NINIs para Asistencia Técnica e Implementación del Modelo de Jóvenes Constructores, los mismos fueron remitidos a Banco Mundial para su respectiva No Objeción.

-Se preparó y remitió la solicitud para suscribir un convenio de cooperación interinstitucional con el INE para el proceso de levantamiento de datos par evaluación de impacto del sub-proyecto de empleabilidad con NINIs.

-Se desarrollaron tres foros educativos del 16 al 18 de noviembre de 2015, donde se trataron los temas de prevención de embarazo en adolescentes y participaron 1,200 personas pertenecientes a la comunidad educativa (maestros, alumnos, padres de familia) de los Municipios de Choloma, El Progreso y La Ceiba.

-Se desarrollaron tres las Ferias de Salud, Ambiente Y Seguridad (SAS) en los municipio Choloma, El Progreso y La Ceiba en donde participaron aproximadamente 250 miembros de la comunidad en cada municipio.

-Se desarrolló el tercer taller de resolución de conflictos en donde participaron funcionarios municipales y los equipos locales de los tres municipios.

-Contratación de la consultoría para el sub-proyecto de Arte por Mi Comunidad.

-Concluyó el sub-proyecto CEPREV. Se inició el proceso de levantamiento de información para la evaluación de impacto del sub-proyecto de la metodología de prevención CEPREV. Para lo cual se gestionaron y se suscribieron convenios con las municipalidades de Choloma, El Progreso y La Ceiba para un total de tres convenios. En los municipios de El Progreso y La Ceiba ha concluido el levantamiento y digitación de datos, pendiente la municipalidad de Choloma.

-Finalizó el proceso de contratación de los 16 sub-proyectos de prevención situacional. 2 sub-proyectos de mejoras en centros educativos, 9 de rutas seguras, 3 iluminación, 1 recuperación de espacios y 1 de obras de mitigación.

-Se cuenta con un borrador de los TDRs para el sub-proyecto de prevención de violencia basada en género y generando empleabilidad para mi comunidad.

-Se realizaron las publicaciones de las expresiones de interés para las consultorías del IUDPAS: Experto en GIS, Técnico en Sistemas de Información.

-Realización de la Jornada de Cierre de manera conjunta con los tres municipios.

- **Proyecto de Infraestructura Rural 4099/HO**



- i. Objetivo General**

Mejorar el acceso cualitativa y sustancialmente a los servicios de infraestructura (carreteras, agua y saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local. Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son de L. 888.0 millones de Lempiras aproximadamente.

- ii. Focalización:**

El Programa se ejecuta a través de seis mancomunidades localizadas en los siguientes departamentos y municipios:

- Choluteca (MAMBOCAURE): San Marcos de Colón, Orocuina, Apacilagua, El Corpus, Santa Ana de Yusguare, Concepción de María, Duyure, Liure y Morolica.
- Santa Bárbara (CRA): San Marcos, Concepción del Norte, Trinidad, San Luis, Chinda, Petoa.
- Copán (CHORTI): Nueva Arcadia, La Jigua, El Paraíso, San Antonio, Copán Ruinas, San Nicolás, San Jerónimo, Cabañas, Santa Rita y Florida.
- Olancho (MAMNO): Guata, La Unión, Mangulile, Jano, Yocón, El Rosario, Salamá, Guayape, Silca, Concordia, Campamento y Esquipulas del Norte
- La Paz (MAMCEPAZ): Santa María, San Pedro Tutule, San José, Marcala, Chinacla, Santiago de Puringla, Cane y La Paz.
- Ocotepeque (GUISAYOTE): Fraternidad, Sensenti, Dolores Merendón, La Labor y Lucerna
- Lempira (MANCOSOL): Tomalá, Tambla, Guarita, San Juan Guarita, Valladolid, Cololaca

- iii. Tipología de Proyectos**

- **Electrificación Rural:** Proyectos para habilitar o mejorar el acceso a electricidad teniendo los beneficiarios que aportar el 15% del monto total del proyecto.
- **Agua y Saneamiento:** Proyectos de rehabilitación, expansión y construcción de sistemas comunales de agua y saneamiento y facilidades en áreas rurales, de las mancomunidades previamente seleccionadas. Las comunidades beneficiadas deben contribuir con el 40% del costo del proyecto en mano de obra no calificada y en materiales de la localidad.

- **Caminos Rurales:** Proyectos de rehabilitación y mejoramiento de los caminos municipales eficientemente y utilizando métodos de empleo masivo de mano de obra aportando, las comunidades beneficiadas el 5% del total del proyecto.

**Monto del Convenio:** L.888.0 millones de Lempiras aproximadamente, fecha de finalización 30 de Junio 2013, sin embargo el Banco otorgo un financiamiento adicional por 13.3 SDR equivalentes a US\$20 Millones. Con la aprobación del financiamiento adicional, la nueva fecha de cierre del proyecto se ha extendido al 30 de Junio del 2016.

#### iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2007	167290,500.00	59744,834.07	35.71%
2008	190004,000.00	91100,924.09	47.95%
2009	145441,200.00	69813,688.01	48.00%
2010	158646,770.82	155949,500.52	98.30%
2011	311782,078.00	262462,877.87	84.18%
2012	192032,459.00	167467,694.03	87.21%
2013	93068,267.00	80599,989.31	86.60%
2014	40058,068.00	33856,088.27	84.52%
2015	7586,586.00	7573,560.10	99.83%

#### v. Avance Físico por Sector

SECTOR	PROYECTOS EJECUTADO	EMPLEOS	BENEFICIARIOS	
AGUA Y ALCANTARILLADO	1	2532,671.47	18	1,680
ENERGIA	1	1007,513.42	27	660
SISTEMAS SOLARES	2	380,118.43	6	396
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>3920,303.32</b>	<b>51</b>	<b>2,736</b>

#### vi. Avance Físico por Departamento

DEPARTAMENTO	PROYECTOS EJECUTADO	EMPLEOS	BENEFICIARIOS	
COPAN	1	1891,130.08	27	660
LEMPIRA	0	612,612.48	0	0
COMAYAGUA	1	320,406.35	3	330
ATLANTIDA	1	59,712.08	3	66
OCOTEPEQUE	1	1036,442.33	18	1,680
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>3920,303.32</b>	<b>51</b>	<b>2,736</b>

#### vii. Otras Inversiones

	EJECUTADO
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	3653,256.80
<b>TOTAL</b>	<b>3653,256.80</b>

### viii. Principales Logros

Durante el 4to. Trimestre se finalizó el sub proyecto de agua y saneamiento de la Comunidad de Llano Largo, municipio de La Labor, departamento de Ocotepeque, beneficiando a 1,623 beneficiarios o sean 283 familias.

Se instalaron 66 sistemas fotovoltaicos domiciliarios beneficiando a 1,224 personas.

Se continúa con la consultoría de evaluación de impacto del Proyecto PIR, que está siendo desarrollada por una firma consultora nacional.

- **Crédito Banco Mundial 5289-0 HN**



- i. **Objetivo**

- a) Mejorar el acceso, la calidad y la sostenibilidad de los servicios de infraestructura (camino, agua, saneamiento y electricidad) para los habitantes pobres de las zonas rurales del territorio del Receptor.
    - b) Desarrollar capacidades y crea en el ámbito del Receptor condiciones propicias para el suministro y la planificación de servicios de infraestructura impulsados a nivel local.
    - c) Mejorar la capacidad del Receptor para responder con prontitud y eficacia ante una Emergencia Elegible.

- ii. **Focalización:**

El Programa se ejecuta a través de seis mancomunidades localizadas en los siguientes departamentos y municipios:

- Choluteca (MAMBOCAURE): San Marcos de Colón, Orocuina, Apacilagua, El Corpus, Santa Ana de Yusguare, Concepción de María, Duyure, Liure y Morolica.
- Santa Bárbara (CRA): San Marcos, Concepción del Norte, Trinidad, San Luis, Chinda, Petoa.
- Copán (CHORTI): Nueva Arcadia, La Jigua, El Paraíso, San Antonio, Copán Ruinas, San Nicolás, San Jerónimo, Cabañas, Santa Rita y Florida.
- Olancho (MAMNO): Guata, La Unión, Mangulile, Jano, Yocón, El Rosario, Salamá, Guayape, Silca, Concordia, Campamento y Esquipulas del Norte

- La Paz (MAMCEPAZ): Santa María, San Pedro Tutule, San José, Marcala, Chinacla, Santiago de Puringla, Cane y La Paz.
- Ocotepeque (GUISAYOTE): Fraternidad, Sensenti, Dolores Merendón, La Labor y Lucerna
- Lempira (MANCOSOL): Tomalá, Tambla, Guarita, San Juan Guarita, Valladolid, Cololaca

### iii. Tipología de Proyectos

- **Electrificación Rural:** Proyectos para habilitar o mejorar el acceso a electricidad.
- **Agua y Saneamiento:** Proyectos de rehabilitación, expansión y construcción de sistemas comunales de agua y saneamiento y facilidades en áreas rurales, de las mancomunidades previamente seleccionadas.
- **Caminos Rurales:** Proyectos de rehabilitación y mejoramiento de los caminos municipales eficientemente y utilizando métodos de empleo masivo de mano de obra aportando.

**Monto del Convenio:** El convenio suscrito el 12 de Julio del 2013 entre el Banco Mundial y el Gobierno de la Republica de Honduras, es de hasta un monto de Trece Millones Trescientos Mil Derechos Especiales de Giro (DEG. 13, 300,000.00), fondos destinados a financiar la ejecución del “Financiamiento Adicional al Proyecto de Infraestructura Rural”. Pero el 22 de septiembre del 2015 la sub secretaria de Inversión Publica notificó al Ministro Director de IDECOAS, mediante oficio DGIP-212-2015, la reestructuración de los fondos de financiamiento al Crédito IDA 5289-HN, que significó una disminución de 6.8 millones de Dólares, siendo el nuevo monto del convenio de SDR. 8, 459,281 equivalente a US\$ 13, 200,000.00.

### iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2014	70067,696.00	19391,807.50	27.68%
2015	199719,678.00	199347,761.68	99.81%

### v. Avance Físico por Sector

SECTOR	PROYECTOS EJECUTADO	EMPLEOS	BENEFICIARIOS
AGUA Y ALCANTARILLADO	24	71898,750.03	399
ENERGIA	24	41419,851.27	100
SISTEMAS SOLARES	59	8600,783.63	177
CAMINOS	20	55820,840.26	412
<b>TOTAL</b>	<b>127</b>	<b>177740,225.19</b>	<b>1,088</b>

**vi. Avance Físico por Departamento**

DEPARTAMENTO	PROYECTOS	EJECUTADO	EMPLEOS	BENEFICIARIOS
ATLANTIDA	3	304,698.00	9	282
CHOLUTECA	12	27441,249.64	164	4,688
COLON	4	841,482.52	12	954
COMAYAGUA	4	1171,927.82	12	1,212
COPAN	13	27831,872.35	314	12,970
CORTES	3	637,379.64	9	678
EL PARAISO	12	6617,456.40	70	2,266
FRANCISCO MORAZAN	12	1564,477.30	36	1,674
GRACIAS A DIOS	1	75,961.24	3	78
LA PAZ	12	32568,145.81	140	5,235
LEMPIRA	12	31691,600.71	23	408
OCOTEPEQUE	10	17496,604.39	134	2,000
OLANCHO	11	1910,682.33	33	1,722
SANTA BARBARA	8	26743,240.91	99	508
YORO	10	843,446.13	30	942
<b>TOTAL</b>	<b>127</b>	<b>177740225.19</b>	<b>1,088</b>	<b>35,617</b>

**vii. Otras Inversiones**

	EJECUTADO
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	21607,536.49
<b>TOTAL</b>	<b>21607,536.49</b>

**viii. Modificaciones Presupuestarias**

El 22 de septiembre la sub secretaria de Inversión Publica notificó al Ministro Director de IDECOAS, mediante oficio DGIP-129-2015, la reestructuración de los fondos de financiamiento al Crédito IDA 5289-HN, que significó una disminución de 6.8 millones de Dólares.

Durante el mes de septiembre del 2015, se solicitó a la Secretaria de Finanzas ampliación presupuestaria para ejecución del año 2015, por un monto de L.89, 621,175.00 para el Convenio de Crédito IDA5289-HN, que financia el proyecto de Infraestructura Rural –PIR. La SEFIN autorizo el incremento al presupuesto vigente en el SIAFI a través del Acuerdo Ejecutivo No. 518-2015 de fecha 6 de octubre del 2015, según oficio 303-DGP-AE de Nota Técnica No. 9, el cual fue aprobado en SIAFI hasta el 1 de octubre del 2015. Este convenio tiene como fecha de cierre el 30 de junio del 2016, operación que no está sujeta a ampliaciones de plazo.

Durante el mes de diciembre del 2015, se solicitó una disminución presupuestaria asignado al Crédito 5289-HN por L. 12,169,795.00, dado que el presupuesto no estuvo disponible oportunamente (01-oct-2015), siendo posible comprometer los fondos (adjudicar contratos) una vez que el presupuesto estuviera disponible, por otra parte falta de definición de cláusula arbitral y aprobación por parte del Comité de Operaciones de FHIS de la unificación de códigos para desarrollar el proceso de forma centralizada mediante LPN a las obras remediaciones ambientales, situaciones que impidieron la ejecución de dicho valor del presupuesto aprobado.

#### **ix. Principales Logros**

Se concluyó la electrificación Rural por extensión de red de las siguientes comunidades:

- 1) Comunidad El Fragoso, Municipio de San Jerónimo, Copan, beneficiando 102 personas.
- 2) Comunidad Los Ejidos, El Quequesque, y Nueva Esperanza, Las Aradas, Rancho Rey, Barrial, Municipio de Dolores Merendón, Ocotepeque, beneficiando a 564 personas.
- 3) Comunidad de Guanijiquil, Municipio de San Marcos de Colon, Choluteca, beneficiando a 198 personas.
- 4) Comunidad de San Martin, Municipio de San Jose, La Paz, beneficiando a 402 personas.
- 5) Comunidad Buenos Aires, municipio de San Pedro de Tutule, La Paz, beneficiando a 228 personas.
- 6) Comunidad de El Mangal de la Barandilla, Quebrada Onda, Cuyapa, municipio de Tambla, Lempira, beneficiando 144 personas.
- 7) Comunidad de El Cerron, Aldea Nueva, La Montañita, San Cristobal, Aceitunito, municipio de Tomala, Lempira, beneficiando a 264 personas.

Por su parte en el sector caminos se finalizaron 3 sub proyectos de pavimentación de kilómetros municipales en el casco urbano del Municipio de Dolores Merendón, departamento de Ocotepeque, Pavimentación en el Casco Urbano del Municipio de Morolica, departamento de Choluteca y la Rehabilitación de Caminos Rurales Los Vados-Joconales, municipio de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, beneficiando a más de 1,600 familias.

De igual forma se finalizó la construcción del Sistema de Agua Potable en la comunidad de Finca Vieja y Purgatorio, municipio de Morolica, beneficiando a 24 familias.

## **CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO**



- **Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC)**

**i. Antecedentes**

En fecha 28 de febrero de 2013 se firmó el Convenio de Financiamiento No Reembolsable de Inversión ATN/NV-13535-HO, Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC), el monto total del convenio es de US\$ 4, 535,382.00 financiado con recursos provenientes de la Cooperación Técnica No Reembolsable de los Fondos Nórdicos para el Desarrollo, administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Siendo US\$2,409,380.00 el monto asignado al componente I, para ejecución de Proyectos bajo la categoría de Soluciones de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (AMCC), para el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios cuyas inversiones elegibles correspondan al menú pre-establecido que consta en el Manual Operativo del Programa, incluyendo, sin limitarse a, muros de contención, protección de taludes pequeños sistemas de riego, vados, puentes colgantes y soluciones de energía renovable.

Las inversiones elegibles deben responder a dos criterios: i) efectividad de las intervenciones en Honduras, o en otros países; o ii) un resultado favorable en el análisis costo-beneficio ex-ante realizado para el proyecto respectivo.

El monto de US\$ 2,126,002.00 para el componente II Fortalecimiento del Capital Humano en Materia de Cambio Climático y Sistematización de Buenas Prácticas financiará: (i) la contratación de servicios de asistencia técnica para desarrollar e implementar talleres sobre AMCC para líderes pertenecientes a las comunidades beneficiarias del Programa; (ii) formación de jóvenes en el tercer ciclo de educación básica; y (iii) sistematización y difusión de buenas prácticas de los pueblos indígenas y Afrohondureños (PIAH) en AMCC.

Según el LMS del BID, el Convenio entró en vigencia el 28 de Febrero de 2013 con la firma del mismo y el plazo para financiar los desembolsos tendrá una duración de 3,5 años para el componente I, y en el caso de componente II será de 5 años. El periodo de cierre según el Convenio indica que dentro de un plazo no mayor a 90 días contados a partir de la fecha del último desembolso de la contribución deberá presentarse a satisfacción del Banco la documentación de respaldo de los gastos efectuados con cargo a la contribución.

Originalmente el Programa estaba conformado por dos Unidades Ejecutoras, una en la Secretaría de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH) para ejecutar el Componente II de la Operación, y la otra en el Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento /Fondo Hondureño de Inversión Social (IDECOAS/ FHIS), ejecutor del Componente I “Soluciones de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático”.

En fecha 31 de Julio de 2014 se remitió de parte de IDECOAS/FHIS a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Oficio No. MD-101/2014 solicitando trasladar el componente II de la DINAFFROH, antes SEDINAFROH, al IDECOAS/FHIS, según lo acordado en ayuda memoria de visita de la misión especial para el Programa PIAHCC de fecha 11 de Julio de 2014, que literalmente dice <<*para hacer expedita la implementación, se conformará una sola unidad ejecutora del Programa, de IDECOAS/FHIS, como responsable de la ejecución de toda la operación*>>. A partir de esa fecha se han girado comunicaciones a las distintas entidades para concretar el traslado del componente II.

## **ii. Objetivo General**

El Programa tiene por objetivo aumentar la capacidad de adaptación y mitigación de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (PIAH) al Cambio Climático y reducir la vulnerabilidad ante los riesgos climáticos que afectan su bienestar y cultura, así como aprovechar cualquier oportunidad positiva que se presente en relación a la adaptación y mitigación al cambio climático.

## **iii. Descripción del Proyecto**

***El Componente I. Soluciones de adaptación y mitigación al cambio climático.*** Que financiará pequeños proyectos comunitarios, de adaptación y mitigación al cambio climático hasta US\$ 100.000.00 cada proyecto, e incluirá los costos de pre-inversión, inversión y capacitación en la gestión del proyecto. Las comunidades a ser beneficiadas serán seleccionadas de la lista de 32 municipios elegibles que consta en el Manual Operativo (En varios municipios se localizan más de dos pueblos haciendo que el total de municipios aumente de 32 a 35).

***El Componente II. Fortalecimiento de capital humano en materia de cambio climático y sistematización de buenas prácticas:*** según los acuerdos a los que se llegó en reunión del 22 de septiembre de 2015, quedará limitado a implementar la iniciativa “súbete” de educación sobre cambio climático, consensuada ya con la Secretaría de Educación del Gobierno de Honduras para inclusión en la curricula nacional básica en comunidades PIAH.

Por lo anteriormente mencionado el proyecto PIAHCC se limitara a la ejecución del componente I Soluciones de adaptación y mitigación al cambio climático. Por un monto de **UN MILLON DE DOLARES (US\$1,000.000.00)**

#### iv. Focalización

Los recursos para los proyectos de AMCC, se asignarán entre los pueblos más afectados o más vulnerables al cambio climático: Lenca y Maya Chortí, a ellos se les está asignando más o menos US\$ 350,000.00, y para priorizar el resto de los recursos se analizará la factibilidad de los proyectos ya presentados al programa.

- v. **Estructura del Convenio:** El monto Total Actual Aprobado que es de US\$ **4,535,382.00** y su estructura es la siguiente<sup>1</sup>:

CATEGORÍA	Presupuesto Actual Aprobado en US\$	programación de gtos 01.01.16 al 30.09.17	%
<b>COMPONENTE I</b>	<b>1,957,000.00</b>	<b>757,070.50</b>	<b>76%</b>
<b>01 SOLUCIONES DE AMCC</b>			
1.01 Propuesta	1,867,000.00	707,070.50	
1.02 Acompañamiento Técnico	90,000.00	50,000.00	
<b>03 GESTION DEL PROGRAMA</b>	<b>279,000.00</b>	<b>202,811.36</b>	<b>20%</b>
3.01 Gestión FHS	279,000.00	202,811.36	
<b>04 EVALUACION EXTERNA Y AUDITORIA</b>	<b>30,000.00</b>	<b>12,845.40</b>	<b>1%</b>
4.2 Auditoría	30,000.00	12,845.40	
<b>05 IMPREVISTOS</b>	<b>23,192.00</b>	<b>27,272.73</b>	<b>3%</b>
5.01 Imprevistos del FHS	23,192.00	27,272.73	
<b>total Componente I</b>	<b>2,289,192.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1.00</b>

#### i. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
<b>2013</b>	1907,838.00	676,800.22	35%
<b>2014</b>	16341,372.00	4853,382.71	30%
<b>2015</b>	4080,629.00	2621,639.23	64%

<sup>1</sup> Plan Financiero según Convenio ATN/NV-13535-HO

## ii. Otras Inversiones

SECTOR	MONTO TOTAL EJECUTADO
ATN/NV-13535-HO	
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	2191,439.90
ATN/NV-13535-HO-2	
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	430,199.33
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2621639.23</b>

## iii. Principales Logros

El 28 de abril de 2015 el Gobierno de Honduras suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la Carta Modificación No. 1 al Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/NV-13535-HO, para realizar cambio de Organismo Ejecutor de la operación COMPONENTE II- solicitado mediante comunicación No. DGCP-DEN-543/2014 de fecha 19 de septiembre de 2014, Siendo el IDECOAS/FHIS el ejecutor de los dos COMPONENTES, el uso de los recursos según la Carta Modificatoria I, estaba condicionado a que se cumplan a satisfacción del Banco, los siguientes requisitos:

- a. Que se haya suscrito un convenio subsidiarios entre el Beneficiario, representados por la Secretaria de Estado de Finanzas, e IDECOAS/FHIS para la transferencia, en forma No Reembolsable de los recursos del Programa;
  - b. Que se haya modificado el Manual Operativo del Programa, el cual incluye un manual administrativo fiduciario y de control interno para que refleje la nueva estructura de ejecución del Programa;
  - c. Que se haya revisado y modificado el Manual PEC del Programa, el cual incluye la participación comunitaria, el estudio socioeconómico de la comunidad, la línea de base, la identificación de actores y un énfasis en proyectos únicamente de adaptación y mitigación de cambio climático;
  - d. Que se haya conformado la UCP con, al menos, el coordinador y el especialista administrativo/financiero a que se refiere el párrafo 4.02 anterior.
- Al mes de octubre de 2015, se cumplieron con todos los requisitos estipulados en carta modificatoria No. 1.

- Ya se cuenta con un Manual Operativo y el manual PEC aprobado por BID, con esto se supera el mayor retraso que se había tenido en la ejecución del programa. Al mes de noviembre ya se cuenta con el Plan de Adquisiciones del Programa por los US\$ 1, 000,000.00 aprobados para la ejecución del programa.
- Se han sostenido reuniones con Organizaciones No Gubernamentales para promover su participación en el proceso de Licitación de los cinco proyectos de seguridad alimentaria con adaptación y mitigación en cambio climático.
- Se solicitó a la Dirección de Contrataciones del IDECOAS/FHIS el inicio del proceso de contratación de la Organización No Gubernamental que Ejecutara los Primeros 5 Proyectos Productivos. Se dará seguimiento a la publicación del Llamado de Licitación de los primeros cinco proyectos para que sea publicado el 4 de enero de 2016.
- Se avanzó en el análisis e identificación de 4 nuevas propuestas de proyecto.

#### **iv. Problemática**

- De parte de SEFIN se remitieron a BID en fecha 01 de Diciembre de 2015 las observaciones a la carta modificatoria No. 2, a la fecha SEFIN por medio de Crédito Público está investigando si ya llegó a ellos nuevamente la Carta con las correcciones solicitadas.
- En este momento se nos presenta la dificultad de poder cerrar el componente 2, ya que tenemos un saldo de efectivo sobrante equivalente a US\$ 28.17 el cual no podemos devolver ya que según nos explican en Crédito Público, la Contaduría General de la República no cuenta con un procedimiento definido para devolución de fondos recibidos en el mismo período, lo que nos obliga a realizar un gasto no programado, y necesitamos primero efectuar una modificación presupuestaria entre objetos del gasto por L 700.00 para poder realizar una compra de útiles de oficina.
- La definición del Documento de Licitación por tratarse de un proceso de contratación diferente a los que comúnmente se han realizado en los proyectos.



- **Programa de Integración y Convivencia Urbana**

**i. Objetivo**

El objetivo general del Proyecto es contribuir a la integración y convivencia social en los barrios urbanos marginales del Distrito Central del Departamento de Francisco Morazán (Distrito Central).

**ii. Objetivos específicos**

- I. Mejorar el acceso de estos barrios a los servicios urbanos básicos;
- II. Aumentar las capacidades laborales, especialmente de los grupos en riesgo;
- III. Fortalecer el capital social de estas comunidades.

**iii. Descripción**

Para el logro de los objetivos descritos en la Sección I anterior, se apoyarán los siguientes componentes:

**Componente 1. Mejora en la convivencia social**

- Este componente busca apoyar acciones de capacitación y asistencia técnica destinadas a fortalecer las organizaciones comunitarias y apoyar a los grupos más vulnerables. Se busca desarrollar capacidades y valores individuales, familiares y comunitarios, dimensionados de acuerdo a las necesidades identificadas en cada barrio seleccionado de acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en el ROP. Para ello, se financiarán: (i) talleres de capacitación sobre valores, liderazgo, convivencia comunitaria, salud reproductiva y prevención de violencia bajo un enfoque de género; (ii) talleres y cursos de capacitación laboral para incrementar las posibilidades de inserción de jóvenes, y mujeres en el mercado de trabajo de acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en el ROP ; (iii) actividades recreativas para niños; (iv) el personal técnico que ejecuta los trabajos sociales; y (v) una consultoría para la sistematización de las intervenciones sociales.

**Componente 2. Proyectos de integración urbana**

- Este componente busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios urbanos entre los más pobres del Distrito Central, seleccionados de acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en el ROP. Previo a las intervenciones de cada barrio se preparará un

Plan Integral de Mejoramiento de Barrios (PIMB), el cual incluirá los correspondientes diseños urbanísticos, de ingeniería y la programación y presupuestos de los trabajos sociales. Este instrumento permitirá la adecuada programación de las inversiones y facilitará el dialogo con la comunidad sobre las actividades a desarrollar. Este componente financiará: (i) la contratación de consultorías para la preparación de los PIMBs; y (ii) las contrataciones para las inversiones en obras de infraestructura básica de agua y saneamiento, alumbrado público, vialidad, drenaje pluvial, plazas y parques, equipamientos sociales y otras necesidades detectadas en los PIMBs. De ser necesario, se promoverá la recuperación de centros educativos y centros de salud públicos, operados por las entidades estatales competentes.

- Los barrios beneficiarios del Proyecto han sido seleccionados en base a tres criterios básicos: (i) pobreza (medido por el Índice de Marginación publicado por la Secretaria de Desarrollo Social); (ii) densidad demográfica (favoreciendo los barrios de mayor densidad); y (iii) déficit de infraestructura de saneamiento (con posibilidad de conexión a la red de alcantarillado existente). Los criterios de elegibilidad y de priorización de los barrios se describen con más detalle en el ROP.

#### Gestión del Proyecto y Evaluación

- Se financiarán los gastos operativos de la ejecución del Proyecto y su evaluación, además de estudios específicos. Las actividades específicas que serán financiadas incluyen: (i) los gastos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP); (ii) los materiales y equipos requeridos para la ejecución; (iii) el personal técnico que apoya, en campo, el monitoreo de los trabajos sociales, a cargo de los Enlaces Técnicos Comunitarios (ETEC); (iv) la estrategia de comunicación del Proyecto; (v) las consultorías de evaluación intermedia y final, además de la consultoría de impacto del Proyecto; y (vi) la auditoría financiera.

#### **iv. Costo del Proyecto y plan de financiamiento**

- El costo estimado del Proyecto es el equivalente de diecisiete millones doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$17.200.000), que serán financiados por el Banco de la siguiente forma: doce millones cuarenta mil dólares (US\$12.040.000) con cargo a los recursos del Capital Ordinario (CO) y cinco millones ciento sesenta mil dólares (US\$5.160.000) con cargo a los recursos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE). El presupuesto consolidado

por componente se muestra en el siguiente cuadro, el cual presenta la distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento. Los costos del Proyecto incluyen los impuestos, tasas y derechos arancelarios aplicables a las adquisiciones y contrataciones del Proyecto, según la legislación nacional. Los intereses podrán ser financiados con recursos del Financiamiento.

La fecha de cierre del proyecto es el 17 de Junio del 2017.

**v. Avance Financiero**

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2013	4922,920.00	2773,999.51	56.35%
2014	136221,739.00	112190,571.97	82.36%
2015	120882,736.00	106545,487.78	88.14%

**vi. Avance Físico por Sector**

SECTOR	PROYECTOS	EJECUTADO	EMPLEOS	BENEFICIARIOS
PROYECTO INTEGRAL	9	95715,207.60	768	14015
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>95715,207.60</b>	<b>768</b>	<b>14015</b>

**vii. Avance Físico por Departamento**

DEPARTAMENTO	PROYECTOS	EJECUTADO	EMPLEOS	BENEFICIARIOS
FRANCISCO MORAZAN	9	95715,207.60	768	14015
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>95715,207.60</b>	<b>768</b>	<b>14015</b>

**viii. Otras Inversiones**

	EJECUTADO
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	10830,280.18
<b>TOTAL</b>	<b>10830,280.18</b>

**ix. Principales Logros**

<i>Avances Programa</i>		
<b>Componente 1: Mejora en la convivencia social y comunitaria</b>		
<b>1.0</b>	<b>Talleres de capacitación laboral</b>	
<b>1.1</b>	<i>Capacitaciones en Emprendimiento</i>	Se impartieron 18 módulos de emprendimiento donde se capacitaron 4,872 personas, quienes aprendieron a realizar diversos tipos de alimentos, elementos para decoración, productos de aseo y bisutería.
<b>2.0</b>	<b>Capacitaciones sobre valores, liderazgo, convivencia comunitaria y prevención de violencia</b>	
<b>1.1</b>	<i>Capacitaciones en Valores</i>	Se impartieron 18 módulos de capacitación sobre: Desarrollo Humano, Desarrollo Comunitario, Prevención (2 módulos), Valores, Salud, Salud Mental, Ambiente (3 módulos), Potabilización, Motivación, Género, Sostenibilidad de Proyectos (2 módulos), Fortalecimiento Comunitario, Articulación Comunitaria, y Escuela Para Padres.

		Se registró una asistencia de 14, 559 personas.
<b>3.0</b>	<b>Convivencias Integración y Eventos Recreativos</b>	
<b>3.1</b>	<i>Taller de Convivencia</i>	<p>Se realizaron 6 eventos recreativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dos talleres de capacitación para jóvenes donde participaron 189 jóvenes de las colonias beneficiadas.</li> <li>✓ Celebración del día del niño donde asistieron 1,506 niños de las colonias: San Juan del Norte, Alemania, Buenas Nuevas, Brisas de la Laguna y las Pavas.</li> <li>✓ Celebración del día del niño en donde asistieron 2,340 niños de las colonias: Ramón Amaya Amador, Arcieri 1 y 2, David Betancourt y Montes de Bendición.</li> <li>✓ Campeonato de fútbol en las 9 colonias beneficiadas con la participación de 1,120 personas entre niños, jóvenes y adultos con el fin de propiciar la convivencia y brindar recreación a la comunidad.</li> <li>✓ Taller de capacitación de líderes con 80 participantes de las colonias: Ramón Amaya Amador, David Betancourt y Montes de Bendición.</li> </ul>
<b>Componente 2: Proyecto de Integración urbana</b>		
<b>1.0</b>	<b>Proyecto de Integración Urbana Zona 1, Lote 1 (San Juan del norte 1 y 2, Buenas Nuevas) 688 Viviendas</b>	
<b>1.1</b>	<i>Ejecución de obras, que incluye la construcción de los siguientes sistemas: Alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y mitigación de riesgos.</i>	95% de Avance Físico.
<b>2.0</b>	<b>Proyecto de Integración Urbana Zona 1, Lote 2 (Brisas de la Laguna, Las Pavas, Alemania) 725 Viviendas</b>	
<b>2.1</b>	<i>Ejecución de obras, que incluye la construcción de los siguientes sistemas: Alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y mitigación de riesgos.</i>	94% de Avance Físico.
<b>3.0</b>	<b>Proyecto de Integración urbana en Zona 2 (Colonias David Betancourt, Arcieri, Ramón Amaya Amador y Montes de Bendición)</b>	
<b>3.1</b>	<i>Ejecución de obras, que incluye la construcción de los siguientes sistemas: Alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y mitigación de riesgos.</i>	74.25% de Avance Físico.
<b>4.0</b>	<b>Supervisión Proyecto de Integración Urbana Zona 1, Lote 1 (San Juan del norte 1 y 2, Buenas Nuevas) 688 Viviendas</b>	
<b>4.1</b>	<i>Ejecución de la consultoría</i>	<i>La firma supervisa la ejecución de las obras y a la fecha ha entregado el doceavo informe de supervisión.</i>
<b>5.0</b>	<b>Supervisión Proyecto de Integración Urbana Zona 1, Lote 2 (Brisas de la Laguna, Las Pavas, Alemania) 725 Viviendas</b>	
<b>5.1</b>	<i>Ejecución de la consultoría</i>	<i>La firma supervisa la ejecución de las obras y a la fecha ha entregado el onceavo informe de supervisión.</i>
<b>6.0</b>	<b>Supervisión Proyecto de Integración urbana en Zona 2 (Colonias David Betancourt, Arcieri 1 y 2, Ramón Amaya Amador y Montes de Bendición)</b>	
<b>6.1</b>	<i>Ejecución de la consultoría</i>	<i>La firma supervisa la ejecución de las obras y a la fecha ha entregado el doceavo informe de supervisión.</i>

**x. Problemática:**

- La ejecución física de las obras en la zona 2 presenta un desfase en relación a la programación inicial, sin embargo el Contratista esta realizando notables esfuerzos con el fin de reducir el porcentaje de desfase. Se espera que haga una reprogramación de obras y que continúe aumentando su ejecución.
- El proyecto de la zona 2 incluye alcantarillado sanitario para 2,115 lotes. La Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario avanza según lo planificado viéndose afectado el funcionamiento del sistema por problemas de servidumbre de pasos y el pegue al colector que en este momento pertenece a un operador privado con el que el SANAA ha hecho negociaciones de tal forma que los habitantes de las cinco colonias de la zona 2 puedan efectivamente adherirse a la red del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado SANAA en enero del próximo año pendiente de firmar acuerdos.
- Para el mes de octubre habían pagos pendientes por obra, se solicitó a SEFIN la ampliación presupuestaria misma que fue aprobada el 28 de noviembre lo cual produjo un retraso en el pago de obra ejecutada que afectó la ejecución física de obras en el 2015.

**xi. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

- Se pretende la finalización de las obras de infraestructura en el segundo trimestre del año 2016.
- El contrato de préstamo finaliza el 17 de julio del año 2017, sin embargo se tienen actividades programadas para finalizar en Diciembre del 2016, que incluyen en el Componente 1. Programa deportivo con niños para la enseñanza de valores a través del deporte. En el Componente 2 se considera el diseño de obras de infraestructura para equipamiento social y mejoras en el sistema de alumbrado público las cuales se estima adjudicar a finales del mes de mayo del año 2016.

- **Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento**  
**1793/SF-HO**



**i. Objetivo General**

Contribuir a la provisión de servicios de agua potable y saneamiento de manera eficiente y sostenible, mediante la promoción y la consolidación de reformas a nivel local.

Se alcanzará este objetivo estableciendo:

1. La obligatoriedad de crear un ente prestador del servicio con autonomía administrativa y financiera.
2. La obligatoriedad de establecer y aprobar, por parte de la Corporación Municipal, el Pliego Tarifario según normas de ERSAPS.
3. Las acciones de apoyo a la implementación de la Ley Marco del Servicio.
- 4.

Fortalecer la capacidad de las municipalidades como entidades responsables de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, y promover las relaciones formales con otros actores importantes del sector, tales como operadores, clientes de los servicios y organizaciones financieras.

Este objetivo se alcanzará mediante:

1. El apoyo a la descentralización del servicio en los casos en que aún estos sean prestados por el SANAA (Servicio autónomo nacional de acueductos y alcantarillados), y complementando el objetivo de la descentralización al establecer operadores independientes del municipio.
2. La obligatoriedad de dar participación a la comunidad a través de las COMAS (Comités Municipales de Agua y Saneamiento) y la USCL (Unidad de supervisión y control local).
3. La implementación de las normas reguladoras del servicio establecidas por el ERSAPS.
4. La capacitación de operadores, Técnicos en Regulación y Control (TRC).

Poner en práctica un conjunto de procedimientos comprobados para la preparación y financiamiento de proyectos de agua potable y saneamiento.

Esto se logrará:


1. Incorporando las lecciones aprendidas con la ejecución del Programa 1048 y adecuando los procedimientos según la viabilidad de su ejecución y del éxito en su implementación.

2. Con el apoyo a ERSAPS para ejercer sus funciones reguladoras.

## ii. Focalización

El universo del programa abarca 23 Municipalidades intermedias y grandes con capacidad de gestión de sus propios proyectos. Están ubicados en los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Atlántida, Olancho, Francisco Morazán, Yoro, Ocotepeque, Copán, Cortes y Colón.

Mapa de inversiones 1793-HO

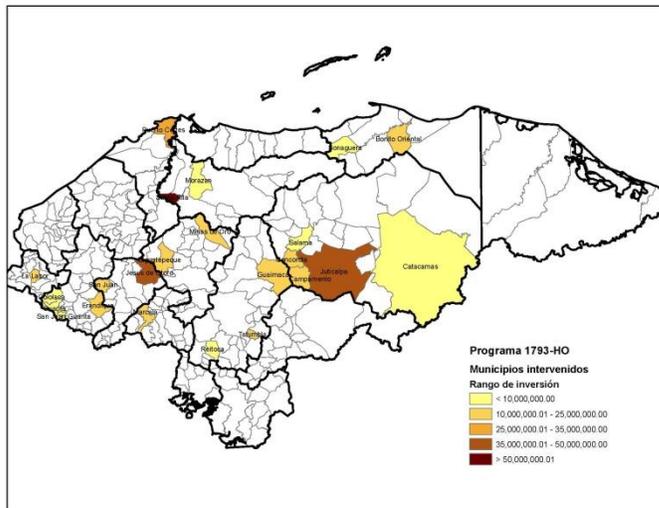

El programa incluye la implementación de sub proyectos individuales para el mejoramiento y expansión de sistemas de agua y saneamiento en áreas urbanas y rurales. Los sub proyectos apoyarán la consolidación del programa de reforma del sector. Se dará alta prioridad a sub proyectos para entes descentralizados (especialmente municipalidades) que han avanzado en la introducción de reformas, específicamente aquellos con altas

posibilidades de participación del sector privado. La modalidad de desembolso es financiamiento No Reembolsable con aportación de las Municipalidades por en 10% del monto de las inversiones en obras.

El Programa tiene como principios básicos los siguientes:

- Enfoque basado en la demanda y participación comunitaria. Los proyectos deben generarse a partir de la identificación de una necesidad de las comunidades. La estrategia de ejecución estará basada en la participación activa de la comunidad durante todo el ciclo del proyecto, a fin de asegurar su apropiación por parte de los beneficiarios y fortalecer la sostenibilidad y el control social en la prestación de los servicios.
- Circunscripción al marco legal e institucional del sector. El esquema del Programa promoverá, que las instituciones y actores involucrados en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento gestionen los mismos bajo un marco legal establecido, sumando esfuerzos para fortalecer la capacidad de gestión de la comunidad y para mejorar la calidad de los servicios.

- Integralidad y efectividad de las soluciones. Los proyectos se orientarán a brindar soluciones integrales (agua y saneamiento) en cada comunidad. Los sistemas de acueducto y saneamiento nuevos se implementarán completos en todos sus módulos para su correcto funcionamiento, de manera que el proyecto responda efectivamente a los objetivos para los que fue concebido.
- Eficiencia económica en el uso y asignación de recursos. Las inversiones en infraestructura responderán a un criterio de mínimo costo económico, en el que la alternativa técnica responderá a un equilibrio entre el nivel de servicio que los beneficiarios deseen y su capacidad y disponibilidad de pago.
- Sostenibilidad de las inversiones. La estrategia de ejecución incluirá la conformación y el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones prestadoras de los servicios de agua y saneamiento durante todo el ciclo del proyecto. De esta manera se pretende sentar las bases para su sostenibilidad y eficiencia económica. El Programa promoverá la formación de entidades prestadoras de servicios, respetando la voluntad y las formas de organización de las comunidades, en el marco del Programa.
- Disponibilidad de fuente sostenible de recursos hídricos y protección del medio ambiente. El Programa enfocará las soluciones a proyectos que demuestren que cuentan con fuentes sostenibles en calidad y cantidad para la demanda requerida (en caso de acueductos) y que fomenten la sostenibilidad ambiental de los cuerpos receptores (en caso de alcantarillados). De igual manera, se adoptará un enfoque ambiental esencialmente preventivo, orientado a dar una respuesta eficaz y oportuna, con el menor grado de incertidumbre posible, a la solución de problemas ambientales identificados en las diversas etapas del ciclo de proyectos a través de: i) la aplicación de criterios de elegibilidad y viabilidad ambientales; ii) la inclusión de medidas de mitigación ambiental en los presupuestos de obra y especificaciones técnicas correspondientes para la etapa de ejecución; iii) la definición de responsabilidades concretas en los términos de referencia del interventor y del supervisor para el control de la aplicación de medidas de mitigación ambiental; y iv) procesos de capacitación a las unidades municipales ambientales (UMA) para fortalecer la gestión ambiental local.
- Complementariedad y concurrencia de las inversiones. El Programa promoverá la coordinación interinstitucional y la concurrencia de inversión con el nivel municipal.

### iii. Tipología de Proyectos.

El programa incluye la implementación de sub proyectos individuales para el mejoramiento y expansión de sistemas de agua y saneamiento en áreas urbanas y rurales. Los sub proyectos apoyaran la consolidación del programa de reforma del sector. Se dará alta prioridad a sub proyectos para entes descentralizados (especialmente municipalidades) que han avanzado en la introducción de reformas, específicamente aquellos con altas posibilidades de participación del sector privado. La modalidad de desembolso es financiamiento No Reembolsable con aportación de las Municipalidades por en 10% del monto de las inversiones en obras.

**Monto del Convenio:** L. 600 Millones de Lempiras aproximadamente, fecha de finalización 31 de Octubre de 2015.

### iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2009	79470,000.00	2240,000.00	2.82%
2010	66471,000.00	2684,672.32	4.04%
2011	86000,000.00	33057,387.08	38.44%
2012	92162,887.00	86194,028.16	93.52%
2013	164331,650.00	153792,912.49	93.59%
2014	202612,229.00	136518,344.01	67.38%
2015	233233,922.00	233171,435.68	100%

### v. Avance Físico por Sector

Sector	Proyectos	Mto. Total Ejecutado	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
AGUA Y ALCANTARILLADO	11	171653,497.53	211986	1073

### vi. Avance Físico por Departamento

Sector	Proyectos	Mto. Total Ejecutado	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
OLANCHO	4	32397,336.01	77810	621
COLÓN	1	61407,928.64	15781	186
COMAYAGUA	1	3188,512.16	5959	35
CORTÉS	1	12519,906.03	66096	35
YORO	1	48940,801.90	27546	50
LA PAZ	1	12984,656.76	13766	79
LEMPIRA	1	117,908.79	1638	45
OCOTEPEQUE	1	96,447.24	3390	22
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11</b>	<b>171653,497.53</b>	<b>211986</b>	<b>1073</b>

**vii. Otras Inversiones**

Sector	Mto. Total Ejecutado
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	61517,938.15

**viii. Principales Logros**

**I. Se hizo el proceso de adquisición de Kits para Cosecha de Aguas Lluvias**

El total de la compra es L. 3364,012.51, se beneficiarán 112 hogares del Departamento de Ocotepeque con la donación de los Kits, la cual se realizará en el mes de enero de 2016. Cada Kit Consiste en un sistema para Cosecha de Agua Lluvia de 15,000 lts., los cuales se adaptan fácilmente a las necesidades de los usuarios, es un método sencillo y económico para la recolección y almacenamiento de agua lluvia, con el fin de ser usada en actividades domésticas o para el consumo humano previo tratamiento, así como para sistemas de micro riego en huertos familiares. Cada Kit está compuesto por una bolsa de Geomembrana de 1 mm, kit de reparación (cinta tapagoterias-hilo soldadura 3m geotextil para protección/suelo), kit de captación de aguas lluvias (canales-tuberías-accesorios PVC), kit de riego (manguera-válvulas-filtro), tanque de agua y Filtro domiciliar.

**II. Donación de equipo de oficina y bombas achicadoras a prestadores de servicios de Agua Potable y Saneamiento**

El total de la donación es L. 868,603.10, consiste en la donación de 6 bombas achicadoras para la operación y mantenimiento de 6 plantas de tratamiento de los municipios de Juticalpa, Concordia, Marcala, Tatumbula, Reitoca y el SANAA del Distrito Central, esto como parte de la asistencia técnica brindada por el Programa en el tema de operación y mantenimiento. También se donaron 5 fotocopiadoras, 11 impresoras matriciales, 11 impresoras multifuncionales de flujo continuo, 11 sumadoras de escritorio y 15 computadoras de escritorio, para 11 municipios del País beneficiados por el Programa con asistencia técnica a prestadores de servicios, estos son: Concordia, Juticalpa, Marcala, Morazán, Guaimaca, Trujillo, Tatumbula, Catacamas, Reitoca, Sonaguera y Santa Rita.

**ix. Problemática:**

- En este trimestre se da por cerrado el Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Préstamo BID 1793/SF-HO; en vista que la mayoría de los contratos fueron

suscritos en la moneda nacional (lempira), hubo una variación de los montos por pagar por tasa cambiaria en relación al monto disponible en la cuenta especial en dólares del Programa.

- Acciones tomadas para resolverlo: se hizo una actualización constante de los montos por pagar, así mismo se tuvo el apoyo oportuno de los actores claves para poder cerrar el Programa.
- La fecha de inicio de la fase de puesta en marcha del proyecto de Trujillo, a solicitud del contratista se aprobó ampliación de plazo, en vista de cambios en la normativa de importación de reactivos peligrosos, los cuales son parte del equipo y suministros del laboratorio.
- Acciones tomadas para resolverlo: se tuvieron constantes reuniones con el personal clave de la empresa contratista, con el prestador de servicios Aguas de Trujillo, IDECOAS-FHIS, y BID para exigir se agilice con las labores de puesta en marcha; en las reuniones se han levantado ayudas memorias en las que las partes han adquirido compromisos para el cumplimiento de las actividades. A la fecha ya se tiene un avance significativo en cuanto al equipo de laboratorio y reactivos.

## **CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA**



- **Proyecto de Infraestructura Rural BCIE**

- i. Objetivo General**

Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local. Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son de L. 283 millones aproximadamente.

- ii. Focalización:**

- En base a la metodología de selección de la mancomunidades ejecutado por PIR, que toma en consideración el índice de desarrollo humano, la capacidad de gerenciamiento de la Unidades técnicas Municipales en cada mancomunidad y no más de una mancomunidad por departamento, fueron seleccionadas las mancomunidades de los departamentos de Lempira (CAFEG), Intibucá (AMFI) y Francisco Morazán (MANOFM).

- iii. Tipología de Proyectos**

- Electrificación Rural: proyectos para habilitar o mejorar el acceso a electricidad teniendo los beneficiarios que aportar el 15% del monto total del proyecto.
          - Agua y Saneamiento: proyectos de rehabilitación, expansión y construcción de sistemas comunales de agua y saneamiento y facilidades en áreas rurales, de las mancomunidades previamente seleccionadas.
          - Caminos Rurales: proyectos de rehabilitación y mejoramiento de los caminos municipales eficientemente y utilizando métodos de empleo masivo de mano de obra aportando las comunidades beneficiadas el 15% del total del proyecto.

**Monto del Convenio:** L.285.0 Millones de Lempiras aproximadamente, según convenio de préstamo el tiempo de ejecución del proyecto es de 60 meses.

#### iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2011	37790,000.00	0.00	0.00%
2012	6393,674.00	0.00	0.00%
2013	33774,273.00	33771,086.72	99.99%
2014	42465,271.00	32714,051.57	77.04%
2015	32683,893.00	32295,225.85	98.81%

#### v. Avance por Sector

SECTOR	PROYECTOS EJECUTADO	EMPLEOS	BENEFICIARIOS	
AGUA Y ALCANTARILLADO	4	17730,068.58	104	2,436
ENERGIA	3	6878,032.92	10	984
CAMINOS	0	551,434.57	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>25159,536.07</b>	<b>114</b>	<b>3,420</b>

#### vi. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	PROYECTOS EJECUTADO	EMPLEOS	BENEFICIARIOS	
FRANCISCO MORAZAN	3	16159,355.11	73	3,144
INTIBUCA	3	7282,348.78	41	276
LEMPIRA	1	1717,832.18	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>25159536.07</b>	<b>114</b>	<b>3,420</b>

#### vii. Otras Inversiones

	EJECUTADO
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	7135,689.78
<b>TOTAL</b>	<b>7135,689.78</b>

#### viii. Principales Logros

- Durante el trimestre están en ejecución 2 sub proyectos de electrificación rural por extensión de red en la comunidad del Volcán, municipio de Piraera, departamento de Lempira beneficiando a 198 personas y Las Comunidades del Sombrillo, Cerro Verde, Municipio de Colomocagua, departamento de Intibucá, beneficiando a 426 personas.
- En proceso de contratación se encuentran 6 sub proyectos de electrificación rural, 3 en el departamento de Lempira y 3 en el departamento de Intibucá, que beneficiaran a 333 familias.
- En el sector de agua y saneamiento se finalizaron 3 sub proyectos de la comunidad de Guatemalita, Municipio de Orica beneficiando a 360 familias, comunidad del Barrio el Campo, municipio de Camasca, Intibucá beneficiando a 46 familias, Sistema de alcantarillado sanitario de Barrosa, Municipio de San Ignacio beneficiando a 360 familias.
- En el sector de caminos se ha continuado en la preparación de los expedientes para la respectiva aprobación del Comité de Operaciones del FHIS.

## **CARTERA KfW Entwicklungsbank**

- **Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local SE-FHIS KFW VIII (PROMINE) FASE I**



### **i. Objetivo General**

Fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la SE y la gestión local participativa así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico).

### **ii. Focalización**

Este Programa se ubica en los departamentos de Lempira, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Intibucá, La Paz.

**Nota:** La selección de los municipios de estos departamentos se realizarán en base al análisis de la contratación de consultoría solicitada por el KFW quien juntamente con la Secretaría de Educación emitirán una resolución de las escuelas seleccionadas.

### **iii. Descripción del Proyecto**

El programa se enmarca en el área de educación básica con un componente de infraestructura que complementa al Plan EFA-ETI (Education for All/Fast Track Initiative) y contribuye a las metas del milenio en Educación en la República de Honduras. El programa presenta la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado por el Programa FHIS-KFW VI-VII, con un enfoque temático: se financiará infraestructura educativa en estrecha articulación con el sector. La ejecución del programa será responsabilidad de la SE como ente rector y del FHIS como ente ejecutor. Los recursos del programa se utilizarán principalmente para financiar la construcción, ampliación y/o mejoramiento de los Centros Educativos (CE) así como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizarán mediante la modalidad descentralizada con énfasis en la ejecución comunitaria (PEC, Proyectos Ejecutados por la Comunidad).

El programa trabajará y fortalecerá el concepto de Redes Educativas (RE) como modelo de gestión, enmarcándose en esa política financiando – en la manera de lo posible- las necesidades de inversión

alrededor de las RE existentes en los departamentos a intervenir, lo que se espera la disponibilidad de redes educativas mejoradas de punto de vista funcional.

**Monto del Proyecto:** Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son Euros 18,500,000.00. El tipo de financiamiento es una donación.

**Fecha de Firma de convenio:** 25/06/2009

**Fecha de Finalización de convenio:** Abril 2014 según acuerdo separado. Se solicitó no objeción a la ampliación de cierre hasta Marzo del 2016.

#### iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2012	22229,994.00	18335,600.24	82.48%
2013	195183,150.00	90219,352.47	46.22%
2014	237660,022.00	227867,845.69	95.88%
2015	69904,692.00	68984,604.67	98.68%

#### v. Avance por Sector

Sector	Proyectos	Mto. Ejecutado	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
EDUCACION	121	59424,257.96	13,934	2,847
<b>Grand Total</b>	<b>121</b>	<b>59424,257.96</b>	<b>13,934</b>	<b>2,847</b>

#### vi. Avance por Departamento

Departamento	Proyectos	Mto. Ejecutado	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
COPAN	7	1515,046.18	1,338	151
FRANCISCO MORAZAN	3	527,958.44	1,050	91
INTIBUCA	40	30919,184.77	3,686	846
LA PAZ	19	9980,711.82	1,224	461
LEMPIRA	18	1623,919.06	1,732	435
OCOTEPEQUE	7	728,466.01	724	128
SANTA BARBARA	27	14128,971.68	4,180	735
<b>Grand Total</b>	<b>121</b>	<b>59424,257.96</b>	<b>13,934.00</b>	<b>2,847.00</b>

#### vii. Otras Inversiones


Sector	Mto. Ejecutado
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	9560,346.71

#### viii. Principales Logros

En el año 2015 se ejecutó el 99.82% de los recursos de fondos nacionales y el 98.59% de fondos externos según el presupuesto asignado.

Fase / Presupuesto	Fase I		
	Presupuesto	Ejecutado	%
Fondos Nacionales	L. 5,238,744.00	L. 5,229,282.94	99.82%
Fondos Externos	L. 64,665,948.00	L. 63,752,321.70	98.59%
<b>Total</b>	<b>L. 69,904,692.00</b>	<b>L. 68,981,604.67</b>	<b>98.68%</b>

A continuación se presenta un detalle del estatus de los proyectos para fase I:

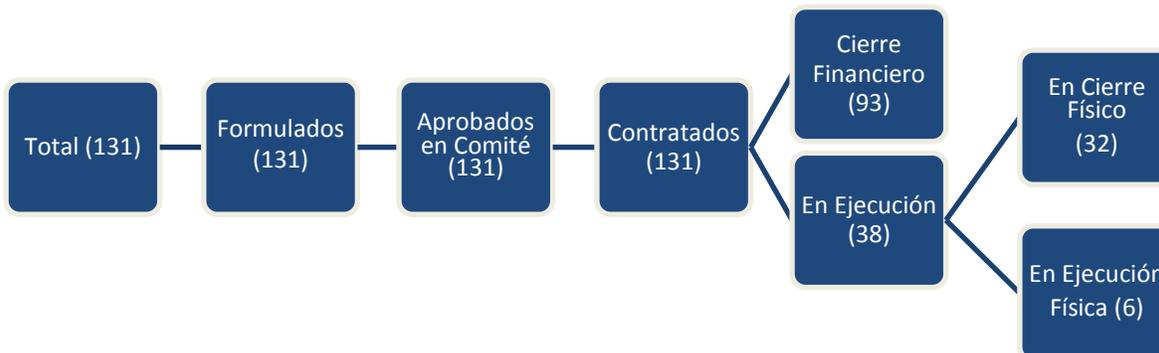

El PROMINE fase I contempla 131 proyectos los cuales han ingresado al ciclo de proyectos del FHIS. El 71 % se encuentran en cierre financiero, 24.43 % en fase de cierre físico (avance físico entre 90 - 100%) y otro 4.58% se encuentran en plena ejecución. Con estos 131 proyectos que han ingresado al ciclo de proyectos se comprometieron los recursos del componente de Infraestructura y Equipamiento que establece el convenio.

Como principales logros al finalizar el periodo:

1. Se cuenta con los 125 proyectos en cierre físico y financiero de los 131 proyectos que comprende la fase lo que representa el 95.41%
2. De los fondos asignados al presupuesto, la ejecución de fondos nacionales es de 99.82%; fondos externos 98.59% para un total de 98.68%.

#### ix. Retos Próximos

Entre los principales retos que enfrenta el PROMINE-KfW se mantienen los indicados en el informe anterior entre otros:

- **Cierre del PROMINE fase I.** El PROMINE fase I ha ampliado su cierre al 31 de marzo 2016, considerando que el Programa ha sufrido un desfase en la ejecución de los proyectos por diversas circunstancias entre ellas cumplimiento de contrapartes municipales, comunitarios y el ultimo desembolso del KfW, por lo cual es necesario realizar la incorporación presupuestaria para el 2016.
- **Incremento de capacidad operativa.** Dado el número de proyectos que están en el ciclo es necesario fortalecer la capacidad de sobretodo de inspección de los proyectos tanto de infraestructura como social y la Unidad Técnica de Capacitación.
- **Viáticos y Combustible.** La acreditación de los gastos de viáticos y combustible a través del SIAFI está tomando un tiempo de aproximado de cuatro (2) semanas, dificultando las visitas oportunas a los proyectos en ejecución.
- **Incorporación Presupuestaria FASE I:** Se estará presentando la solicitud de incorporación presupuestaria para el PROMINE fase I en enero 2016, la cual es necesaria para completar la ejecución y cierre de la fase.

- **Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local SE-FHIS KFW VIII (PROMINE) FASE II**



**i. Objetivo General**

Fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la SE y la gestión local participativa así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico).

**ii. Focalización**

Este Programa se ubica en los departamentos de Lempira, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Intibucá, La Paz.

**Nota:** La selección de los municipios de estos departamentos se realizarán en base al análisis de la contratación de consultoría solicitada por el KFW quien juntamente con la Secretaría de Educación emitirán una resolución de las escuelas seleccionadas.

**iii. Descripción del Proyecto**

El programa es continuación del Programa de Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local SE/FHIS VIII y se enmarca en el área de educación básica con un componente de infraestructura que complementa al Plan EFA-ETI (Education for All/Fast Track Initiative) y contribuye a las metas del milenio en Educación en la República de Honduras. El programa presenta la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado por el Programa FHIS-KFW VI-VII, con un enfoque temático: se financiará infraestructura educativa en estrecha articulación con el sector. La ejecución del programa será responsabilidad de la SE como ente rector y del FHIS como ente ejecutor. Los recursos del programa se utilizarán principalmente para financiar la construcción, ampliación y/o mejoramiento de los Centros Educativos (CE) así como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizarán mediante la modalidad descentralizada con énfasis en la ejecución comunitaria (PEC, Proyectos Ejecutados por la Comunidad).

El programa trabajará y fortalecerá el concepto de Redes Educativas (RE) como modelo de gestión, enmarcándose en esa política financiando – en la manera de lo posible- las necesidades de inversión alrededor de las RE existentes en los departamentos a intervenir, lo que se espera la disponibilidad de redes educativas mejoradas de punto de vista funcional.

**Monto del Proyecto:** Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son Euros 6, 157,000.00. El tipo de financiamiento es un contrato de Préstamo.

**Fecha de Firma de convenio:** 19/12/2012

**Fecha de Finalización de convenio:** Junio 2016

**iv. Avance Financiero**

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2014	69200,933.00	57187,807.84	82.64%
2015	62922,433.00	62272,727.56	98.97%

**v. Avance por Sector**

Sector	Proyectos	Mto. Ejecutado	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
EDUCACION	40	54681,277.52	2,408	928
<b>Grand Total</b>	<b>40</b>	<b>54681,277.52</b>	<b>2,408</b>	<b>928</b>

**vi. Avance por Departamento**

Departamento	Proyectos	Mto. Ejecutado	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
COPAN	1	1534,228.40	176.00	31.00
INTIBUCA	13	20645,421.40	700	297
LA PAZ	10	13596,740.39	769	269
LEMPIRA	4	6454,739.61	219	97
OCOTEPEQUE	1	4399,614.03	201	49
SANTA BARBARA	11	8050,533.69	343	185
<b>Grand Total</b>	<b>40</b>	<b>54681,277.52</b>	<b>2,408</b>	<b>928</b>

**vii. Otras Inversiones**


Sector	Mto. Ejecutado
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	7591,450.04

**i. Principales Logros**

En el año 2015 se ejecutó el 97.72% de los recursos de fondos nacionales y el 99.04% de fondos externos según el presupuesto asignado.

Fase / Presupuesto	Fase II		
	Presupuesto	Ejecutado	%
Fondos Nacionales	L. 3,446,720.00	L. 3,367,970.00	97.72%
Fondos Externos	L. 59,475,713.00	L. 58,904,757.56	99.04%
<b>Total</b>	<b>L. 62,922,433.00</b>	<b>L. 62,272,727.56</b>	<b>98.97%</b>

A continuación se presenta un detalle del estatus de los proyectos para fase II:

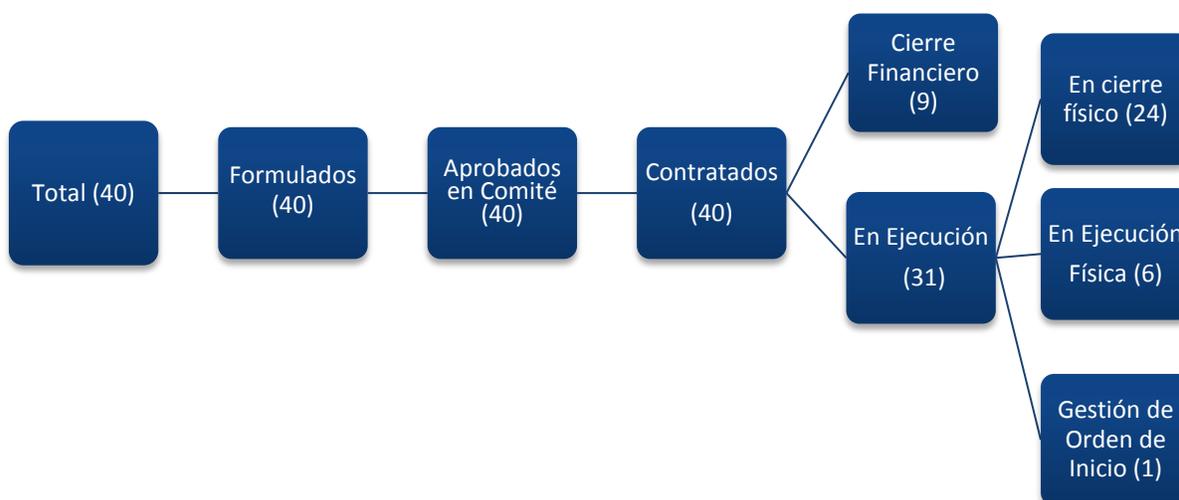

Fase II contempla 40 proyectos los cuales han ingresado al ciclo de proyectos del FHIS. El 22.50 % se encuentran en cierre financiero, 60.00 % en fase de cierre físico (avance físico entre 90 - 100%) y otro 15.00% se encuentran en plena ejecución. Con estos 40 proyectos que han ingresado al ciclo de proyectos se comprometieron los recursos del componente de Infraestructura y Equipamiento que establece el convenio.

Como principales logros al finalizar el periodo destacan:

1. Se cuenta con los 33 proyectos en cierre físico y financiero de los 40 proyectos que comprende la fase lo que representa el 82.50%
2. De los fondos asignados al presupuesto, la ejecución de fondos nacionales es de 97.71%; fondos externos 99.04% para un total de 98.97%

- **Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local SE-FHIS KFW VIII (PROMINE) FASE III**



**i. Objetivo General**

Fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la SE y la gestión local participativa así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico).

**ii. Focalización**

El área de intervención del Programa comprende principalmente los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara. El Programa PROEFA de la GIZ apoya actualmente al sector educativo en Honduras. Al igual que en las fases I y II del Programa se buscará la coordinación con el Programa PROEFA de la GIZ o en su debido caso con el Programa que le siga, siempre y cuando existan medidas complementarias entre ambos programas.

**iii. Descripción del Proyecto**

El Programa comprende la tercera fase del Programa PROMINE que se enmarca en el área de educación básica con un componente de infraestructura que complementa al Plan EfA-FTI (Education for All / Fast Track Initiative) y contribuye al logro de las Metas del Milenio en Educación en la República de Honduras y por lo tanto en general se rige por los acuerdos ya definidos para la ejecución de la primera y segunda fase. Se financiará infraestructura educativa en estrecha articulación con el Sector. La ejecución del Programa será responsabilidad de la Secretaría de Educación (SE) como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) como ente ejecutor. Los recursos del Programa se utilizarán principalmente para financiar la construcción, ampliación y/o el mejoramiento de los Centros Educativos (CE) así como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizarán mediante la modalidad descentralizada con énfasis en la ejecución comunitaria (Proyectos Ejecutados por la Comunidad – PEC-FHIS) empleada con éxito en el programa FHIS VI y VII, aplicada de forma general en todos los proyectos, indistinto de su monto financiero, excepto los altamente complejos.

**Monto del Proyecto:** Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son EUR 11, 945,000.00. El tipo de financiamiento es un contrato de Préstamo.

**Fecha de Firma de convenio:** 30/12/2013

**Fecha de Finalización de convenio:** 31/03/2017

**iv. Avance Financiero**

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2015	21990,172.00	19575,047.54	89.02%

**v. Avance por Sector**

Sector	Proyectos	Mto. Ejecutado	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
EDUCACION	5	19575,047.54	3,400	150
<b>Grand Total</b>	<b>5</b>	<b>19575,047.54</b>	<b>3,400</b>	<b>150</b>

**vi. Avance por Departamento**


COPAN	Proyectos	Mto. Ejecutado	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
COPAN	1	950,388.75	55	14
INTIBUCA	1	4178,927.42	147	23
LA PAZ	2	11166,072.25	3,035	82
SANTA BARBARA	1	3279,659.12	163	31
<b>Grand Total</b>	<b>5</b>	<b>19575,047.54</b>	<b>3,400</b>	<b>150</b>

**vii. Principales Logros**

En el año 2015 se ejecutó el 89.02% de fondos externos según el presupuesto asignado.

Fase / Presupuesto	Fase III		
	Presupuesto	Ejecutado	%
Fondos Nacionales	L. -	L. -	0
Fondos Externos	L. 21,990,172.00	L. 19,575,047.54	89.02%
<b>Total</b>	<b>L. 21,990,172.00</b>	<b>L. 19,575,047.54</b>	<b>89.02%</b>

A continuación se presenta un detalle del estatus de los proyectos para fase III:

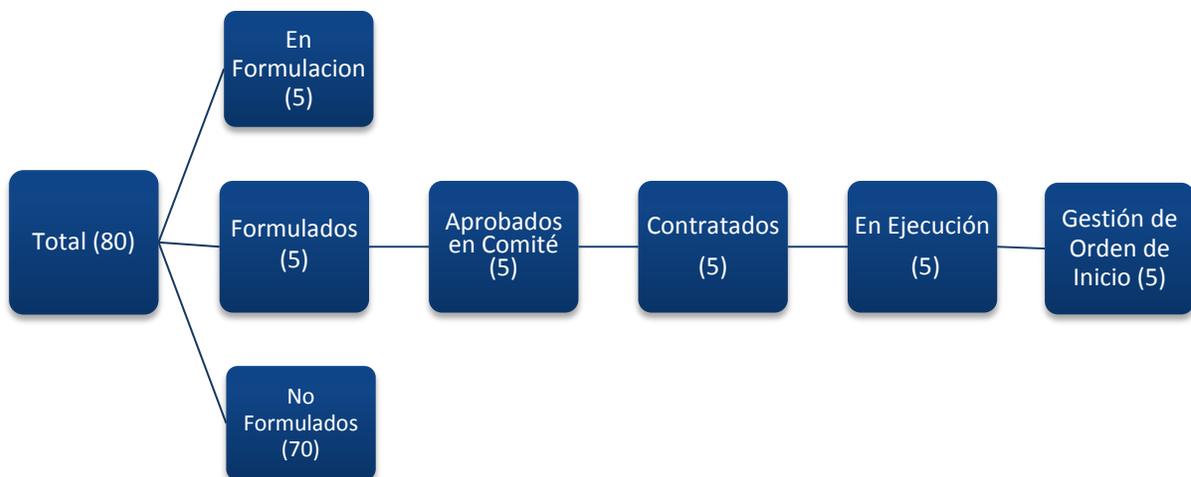

Fase III contempla 80 proyectos los cuales han ingresado al ciclo de proyectos del FHIS, 10 proyectos (en formulación y formulados), el resto está pendiente la priorización de la Secretaria de Educación.

Este número de proyectos podrá variar según el costo de los mismos y la disponibilidad de recursos.

Como principales logros al finalizar el periodo destacan:

1. Se concluyó el cumplimiento de condiciones previas.
2. Se dio inicio a la ejecución financiera del Programa.
3. De los fondos asignados al presupuesto, la ejecución de fondos externos fue de 89%.

#### Próximos retos

- **Incorporación Presupuestaria FASE III:** Se estará presentando la solicitud de incorporación presupuestaria para el PROMINE fase III en enero 2016, considerando que los recursos asignados en el presupuesto vigente se encuentra comprometidos y no se cuenta con más recursos a nivel de presupuesto para nuevas intervenciones

- **Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)**



**i. Objetivo General**

Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).

**ii. Focalización**

A través de un proceso de concurso con criterios de selección predefinidos en el acuerdo separado y evaluación de propuestas técnicas alineadas a los componentes del programa fueron seleccionados 3 municipios en donde se está realizando la intervención del CONVIVIR a través de obras de infraestructura y medidas de alcance social para beneficio enfocado en la juventud. Así mismo se definieron los barrios, colonias o comunidades urbanas en donde se focaliza las acciones y en donde ya se ha realizado una labor de socialización de los alcances, compromisos y beneficios para la población. Los municipios seleccionados son:

- Municipio de Gracias, departamento de Lempira
- Municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua
- Municipio de La Lima, departamento de Cortes.

**iii. Descripción del Proyecto**

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

**Monto del Proyecto:** Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son Euros 12, 200,000.00. El tipo de financiamiento es un contrato de Préstamo.

**Fecha de Firma de convenio:** 08/11/2012

**Fecha de Finalización de convenio:** Diciembre 2016

**iv. Avance Financiero**

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2014	21289,204.00	18316,427.97	86.04%
2015	55285,883.00	12932,846.66	23.39%

**v. Avance por Sector**

SECTOR	PROYECTO	MONTO TOTAL EJECUTADO	BENEFICIARIOS DIRECTOS	EMPLEOS GENERADOS
ASISTENCIA TECNICAS	1	300,000.00	90	3
MUNICIPAL	9	17671,285.87	3225	39
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10</b>	<b>17971,285.87</b>	<b>3315</b>	<b>42</b>

**vi. Avance por Departamento**

SECTOR	PROYECTO	MONTO TOTAL EJECUTADO	BENEFICIARIOS DIRECTOS	EMPLEOS GENERADOS
COMAYAGUA	2	4456,779.89	2060	13
CORTES	3	6006,735.34	445	13
LEMPIRA	4	7207,770.64	720	13
VARIOS DEPARTAMENTOS	1	300,000.00	90	3
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10</b>	<b>17971285.87</b>	<b>3315</b>	<b>42</b>

**vii. Otras Inversiones**

SECTOR	MONTO TOTAL EJECUTADO
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	16052,912.87

**viii. Principales Logros**

- En el componente de Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura el programa CONVIVIR tiene en cartera actualmente 29 proyectos de infraestructura para ejecutar con el monto del convenio, de los cuales se han ejecutado los primeros 3 proyectos completamente, se está por desembolsar a 4 proyectos más en enero 2016 y se encuentran en fase de diseño aproximadamente 10 proyectos. La fase de formulación concluye en junio del 2016, fecha para la cual el programa estará en plena ejecución de obras de infraestructura.

**Obras priorizadas en el municipio de Siguatepeque, Comayagua**

Proyecto	Inversión Estimada* (millones de Lempiras)	Estado
1. Obra de Confianza	3.9	100% de ejecución
2. Cancha de Fútbol Col. Mata	3.5	Por aprobar Comité de Operaciones
3. Centro Comunal y Cancha Col. Noé Cruz	3.5	Formulación factibilidad (50%)
4. Casa de la Cultura	8	Para contratación externa (0%)
5. Centro de Educación Digital	1	Pre factibilidad (0%)
6. Otros	22.5	Por identificar (0%)
<b>Total</b>	<b>42.4</b>	

**Obras priorizadas en el municipio de Gracias, Lempira**

Proyecto	Inversión Estimada* (millones de Lempiras)	Estado
1. Obra de Confianza	4	100% ejecutado (cierre)
2. Casa de la Juventud	8.5	No Objeción KfW
3. Campo de Pelota Bella Vista y Pinalito	3.5	Formulación factibilidad (90%)
3. Centro Social Col. Hércules y Moreno	3.5	Formulación factibilidad (30%)
4. Polideportivo El Rosario	9	Formulación factibilidad (50%)
5. Plaza San Sebastián	7	Formulación factibilidad (45%)
6. Equipamiento social deportivo Col. Bella Vista y Pinalito	2.5	Formulación factibilidad (15%)
7. Casa de la Cultura	8	Contratación externa (5%)
8. Plaza Marco Tulio Rodríguez	2	Formulación factibilidad (0%)
9. Plazas del Fuerte San Cristóbal	5	Para contratación externa (0%)
10. Centro de Educación Digital	0.5	Formulación Factibilidad (50%)
11. Escuela de Música	2.5	Pre factibilidad (0%)
<b>TOTAL</b>	<b>56</b>	

**Obras priorizadas en el municipio de La Lima, Cortés**

Proyecto	Inversión Estimada* (millones de Lempiras)	Estado
1. Obra de Confianza	4	100% de ejecución (cierre)
2. Plaza de la Juventud	8.5	No Objeción KFW
3. Parques de Col. Sitraterco (Etapa 1)	3.5	Formulación factibilidad (40%)
4. Cancha Col. Los Maestros	2.5	Formulación factibilidad (30%)
5. Cancha Col. Dilcia Fernández	2.5	Formulación factibilidad (20%)
6. Parque Los Pinos	2.5	Formulación factibilidad (10%)
7. Casa de la Cultura	8	Contratación externa (5%)
8. Paseo Peatonal de los Gatos	2	Formulación factibilidad (40%)
9. Complejo Deportivo Atenas	5	Pre factibilidad (5%)
10. Polideportivo Chula Vista	7	Pre factibilidad (0%)
11. Centro de Educación Digital	0.5	Formulación Factibilidad (50%)
12. Parques Col. Sitraterco (Etapa 2)	3.5	Formulación Factibilidad (10%)
<b>TOTAL</b>	<b>49.5</b>	

- En el componente de Fortalecimiento de Habilidades de Jóvenes el programa CONVIVIR ejecuta una serie de capacitaciones y acciones tendientes a mejorar las habilidades sociales y de empleabilidad de los jóvenes en los municipios de intervención. Entre las acciones que se han dado inicio están:

Tema de Capacitación o Proceso	Jóvenes a Capacitar	Estado
1. Habilidades para la Vida	90	Contratación
2. Formación Técnica Certificada	600	Contratación
3. Campamento en Liderazgo Juvenil	90	Ejecutado 100%
4. Taller en comunicación y Video	60	Ejecutado (100%)
5. Talleres de Arte	180	En ejecución (50%)
6. Formación Técnica INFOP	750	Convenio firmado
7. Deportes por la Paz y la Convivencia	300	Formulación

8. Diplomado en Gestión Cultural	30	Formulación
<b>Total</b>	<b>2,100</b>	

- En el componente de Mejoramiento de Capacidades de Actores Relevantes el programa CONVIVIR, ha dado inicio a una serie de acciones tendientes a incrementar las habilidades técnicas y sociales de los funcionarios involucrados pertenecientes a 9 instituciones diferentes, mejorar la capacidad de logística para responder a la necesidad de prevención de la violencia en la juventud. Entre las acciones en implementación se encuentran:

<b>Proceso</b>	<b>Instituciones a fortalecer</b>	<b>Empleados a capacitar</b>	<b>Estado</b>
1. Equipamiento de Instituciones ejecutoras	5	- -	70% de ejecución, pendiente proceso de entrega
2. Habilidades para la vida	9	120	En contratación
3. Diplomado en Prevención Intersectorial de la Violencia	6	15	Ejecutado (100%)
4. Diplomado en Juventud y Políticas Públicas	7	30	En formulación
5. Metodología Miles de Manos	4	60	Ejecutado (100%)
6. Transversalización del Enfoque de Equidad de Género	5	120	Formulación
7. Energía fotovoltaica en proyectos FHIS	1	30	Formulación
8. Ética, transparencia y rendición de cuentas	4	90	Ejecutado
9. Gestión e Implementación de los Sistemas Municipales de Juventud	4	90	Ejecutado (100%)
10. Itinerario en Formación, Liderazgo y Participación Juvenil	4	90	Ejecutado (100%)
11. Formulación Social de Proyectos CONVIVIR	4	80	Formulación

12. Certificación en Metodología PEC	3	80	Ejecutado (100%)
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>805</b>	

#### **ix. Desembolsos Financieros del KfW**

Como se indicó en el informe anterior las cuentas bancarias del programa mantuvo suficientes recursos en efectivo para las necesidades del tercer trimestre; sin embargo se previó la necesidad de un nuevo desembolso por el orden de \$1,056,451.40 para hacer frente al cierre contable del año 2015 e inicio de un nuevo periodo en 2016. El desembolso del KfW se recibió el 14 de diciembre permitiendo cumplir con los compromisos adquiridos, que como ya se ha explicado abarca a todos los nuevos desembolsos para proyectos de infraestructura, así como los pagos de los proveedores de bienes y servicios durante el año 2015.

#### **x. Retos Del Programa Para 2016**

En la ejecución del 2015 ha habido retos que superar, en los que se ha demandado mucha gestión para salir avante con la programación. En 2016 se tienen retos mayores debido a la mayor ejecución presupuestaria y física programada para el periodo, el programa CONVIVIR se ha preparado para enfrentar la programación de proyectos de infraestructura como sociales, por lo que los retos para el 2016 serán:

- Lograr la conformación de la Unidad Ejecutora para el programa CONVIVIR, es de alta importancia dada la cantidad de procesos de adquisiciones, financieros, administrativos, contrataciones, informes de ejecución, capacitaciones, consultorías, etc. Procesos que tendrán un volumen mayor en 2016. En este caso se deberán mejorar las condiciones físicas (espacio físico) donde funcionaría la UCP.
- Fortalecer la gestión de las instituciones co-ejecutoras del programa CONVIVIR, dada la poca capacidad de respuesta y gestión que se ha tenido hasta el momento por parte de las municipalidades y el INJ se hace necesario diseñar un plan completo para el fortalecimiento institucional.

- Alcanzar la aprobación de los proyectos de infraestructura que se encuentran en fase de formulación para poder desembolsar los recursos financieros disponibles en el POA 2016. Se deben aprobar al menos 9 proyectos de infraestructura antes de finalizar el mes de febrero para poder hacer efectivos los desembolsos a los municipios antes de finalizar el trimestre y que puedan reflejarse como ejecución financiera del periodo.
- De las 6 consultorías privadas realizadas a finales del 2015, hay 2 de ellas que deberán ser retomadas en 2016 e incluso realizar un nuevo proceso ante la alta posibilidad de fracaso. Se deberá tomar lecciones aprendidas que permita desarrollar TDR acorde a la realidad de las organizaciones nacionales registradas en la base de contratistas de FHIS, a la vez que motivar a nuevas organizaciones a realizar su proceso de inscripción.
- Definir un nuevo proceso para la contratación de servicios de capacitación para manejar de manera eficiente y ágil los procesos de adquisición de servicios de salones, hospedaje, alimentación y facilitación de los talleres en los componentes de Fortalecimiento de Habilidades de Jóvenes y de Mejoramiento de Capacidades de Actores Relevantes.

## CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)

- **Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP)**



- i. Objetivo General**

El Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP), tiene como objetivo principal, la construcción de proyectos sociales que mejoren la calidad de vida de la población, los cuales promueven la seguridad local e incorporan diseños del entorno para prevención del crimen y la violencia.

De esta manera, se contribuye a la mejora de las condiciones de vida de la población, se construye cohesión social y se impulsa la convivencia ciudadana. Algunos de los proyectos se han ejecutado bajo la modalidad PEC (Proyecto Ejecutado por la Comunidad).

- ii. Focalización**

Todos los sub proyectos seleccionados serán ejecutados en zonas “calientes” urbanas y rurales y en comunidades remotas amenazadas por las maras y el narcotráfico. Unos proyectos son modalidad PEC y otros con contratista individual o firma constructora. Estos proyectos se están ejecutando actualmente.

Nota: La elegibilidad de los proyectos: Comunidades urbanas identificadas por la USAID bajo Mérida/CARSI. Se elegirán los sub proyectos que ayuden a mejorar la seguridad en las comunidades y que puedan construirse en menos de un año. El Programa está orientado a beneficiar a los habitantes de barrios y colonias con alto índice de violencia ubicados en los municipios de: La Ceiba, Atlántida; Tela, Atlántida; San Pedro Sula, Cortés; Choloma, Cortés; Comayagua, Comayagua; Nueva Arcadia, Copán; San Agustín, Copán; Cane, La Paz; Distrito Central; Puerto Lempira, Gracias a Dios.

- iii. Descripción del Proyecto**

Ejecución de obras de infraestructura a través de la implementación de metodologías altamente participativas con el objetivo de utilizar principios de prevención de la violencia situacional, transformando el espacio físico de las comunidades beneficiadas e involucrando activamente a los miembros de la comunidad en la identificación, selección y ejecución de los subproyectos. Se ejecutan diferentes tipos de proyectos tales como instalaciones educativas, centros de salud, iluminación de

calles, proyectos de agua, espacios comunitarios más seguros, centros de alcance, centros vocacionales y capacitación juvenil.

**Monto del Convenio:** Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son de 97.01 millones de lempiras. Estos fondos son donación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La fecha de finalización es en Diciembre 2015.

**iv. Avance Financiero**

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2014	70145,453.00	68995,453.00	98.36%
2015	24579,983.00	23604,345.43	96.03%

**v. Principales Logros (Octubre a Diciembre de 2015)**

**A. IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CPTED EN LAS COMUNIDADES PILOTO**

- Implementada la metodología CPTED en 12 comunidades con fondos PNUD

No.	COMUNIDAD	CAMINATA EXPLORATORIA	TALLER DE DIBUJO	DIAGNÓSTICO CPTED
1	Col. Grant, Tela	✓	✓	✓
2	Col. Victoria, Choloma	✓	✓	REVISION
3	Col. Villanueva, Distrito Central	✓	✓	✓
4	Col. Rivera Hernández Centro, S.P.S	✓	✓	REVISION
5	Col. Chamelecón Centro, S.P.S	✓	✓	
6	Col. Las Delicias, La Ceiba	✓	✓	✓
7	Col. La Isla, La Ceiba	✓	✓	✓
8	Col. 15 de Septiembre, Tela	✓	✓	✓
9	Col. El Retiro, Tela	✓	✓	✓
10	Col. Gale, Choloma	✓	✓	✓
11	Col. Chamelecón Centro, S.P.S	✓	✓	✓

12	Col. Los Pinos, Distrito Central	✓	✓	✓
----	----------------------------------	---	---	---

## B. CAPACITACIONES TÉCNICAS BAJO EL COMPONENTE DE INCENTIVO JUVENIL

- A la fecha, se han capacitado y certificado a 222 en 12 comunidades, en diferentes oficios técnicos y capacitaciones de emprendedurismo y habilidades para la vida. Se inició talleres en Choloma y San Pedro Sula.

No.	COMUNIDAD	NOMBRE DEL TALLER DE CAPACITACIÓN	NO. DE JÓVENES	ESTATUS ACTUAL
1	Col. Éxitos de Anach, Choloma	Taller de Máquinas Industriales	13	Terminado
2	Col. Lempira, San Pedro Sula	Taller de Electricidad	18	Terminado
3	Col. Morales II, San Pedro Sula	Taller de Máquinas Industriales	18	Terminado
4	Col. Morales III, San Pedro Sula	Taller de Electricidad	17	Terminado
5	Col. Sierra Pina, La Ceiba	Taller de Albañilería	9	Terminado
6	Col. Melgar, La Ceiba	Taller de Electricidad	17	Terminado
7	Col. Las Torres, Distrito Central	Taller de Electricidad	23	Terminado
8	Col. San Francisco, Distrito Central	Taller de Electricidad	29	Terminado
9	Col. Nueva Capital, Distrito Central	Taller de Albañilería	22	Terminado
10	Col. San Vicente de Paul, San Pedro Sula	Taller de Operador de Computadoras Personales	22	Terminado/Espera Certificación
11	Col. El Japón, Choloma	Taller de Belleza y Cosmetología	17	Terminado/Espera Certificación
12	Col. Rubí, Choloma	Taller de Artesanía en Metal	17	Terminado/Espera Certificación

## C. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

### PROYECTOS TERMINADOS

- Terminados 61 proyectos de infraestructura

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Status	% de Avance Físico
1	Completion Centro de Alcance	Col. San José, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
2	Pavimentación Concreto Hidráulico - 400 m de calle	Col. San José, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
3	Construcción / Expansión Centro de Alcance	Armenia Bonito, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
4	Construcción Centro de Alcance	Búfalo, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
5	Reparación Centro de Alcance Los Ángeles Sector El Carmen	Col. Los Ángeles, San Pedro Sula, Cortés	Finalizado	100%
6	Construcción Escuela 29 de Noviembre	Col. Suazo Córdova, San Pedro Sula, Cortés	Finalizado	100%
7	Iluminación de Calle de Acceso al Centro de Alcance	Col. López Arellano, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
8	Reparación Cancha Multiusos frente a Centro de Alcance	Col. López Arellano, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
9	Reparación Escuela Augusto C. Coello	Col. Las Pilas, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
10	Construcción de Acceso Peatonal e Iluminación	Col. Las Pilas, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
11	Construcción de Centro de Alcance	Col. Las Pilas, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
12	Construcción de cancha multiusos en Parque Pawanka	Puerto Lempira, Gracias a Dios	Finalizado	100%
13	Construcción Centro de Alcance	Puerto Lempira, Gracias a Dios	Finalizado	100%
14	Estudio Drenaje de Aguas Lluvias	Col. Primero de Mayo, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
15	Diseño Muro de Contención y Pavimentación de Calle en Sector Los Pozos - CPTED Anexo H	Col. San Francisco, Distrito Central, Francisco Morazán	Finalizado	100%
16	Extensión de Red Secundaria para Iluminación de Bordos y Mejoras al Sistema de Iluminación de Calles	Col. Primero de Mayo, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
17	Ampliación Estudio Drenaje de Aguas Lluvias	Col. Armenia Bonito, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
18	Pavimentación de Calles	Col. Flor del Campo, Distrito Central, Francisco Morazán	Finalizado	100%
19	Diseño de Techo de cancha multiusos	Puerto Lempira, Gracias a Dios	Finalizado	100%
20	Mejoras a Puente, Drenajes, Aceras y Bordillos	Col. San José, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
21	Mejoras a kínder San José y Área Recreativa	Col. San José, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%

22	Pavimentación Concreto Hidráulico	Col. San Judas, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
23	Construcción Centro de Alcance	Col. Zapote Norte, Distrito Central, Francisco Morazán	Finalizado	100%
24	Mejoras al Sistema de Iluminación de calles	Col. El Japón, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
25	Construcción de parque infantil	Col. El Japón, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
26	Construcción de cancha multiusos	Col. Éxitos de ANACH, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
27	Ampliación Jardín de Niños Marcelino Pineda López	Col. Sierra Pina, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
28	Reparación Jardín de Niños Nuevo Amanecer	Col. Melgar 2, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
29	Construcción de contenedores para basura	Col. Armenia Bonito, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
30	Construcción de parada de buses	Col. Armenia Bonito, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
31	Pavimentación / Electrificación Colonia San Alejo	Col. San Alejo, Tela, Atlántida	Finalizado	100%
32	Construcción de parada de buses	Col. El Japón, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
33	Mejoras al Sistema de Iluminación de calles	Col. Rubí, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
34	Parada de buses	Col. Rubí, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
35	Ampliación Centro de Salud	Comayagua, Comayagua	Finalizado	100%
36	Construcción Cancha Multiusos	Aldea Las Calabazas, Cane, La Paz	Finalizado	100%
37	Mejoras a cancha de futbol	Barrio San Agustín, San Agustín, Copán	Finalizado	100%
38	Construcción Cancha Polideportivo	Barrio El Dorado, Nueva Arcadia, Copán	Finalizado	100%
39	Reparación Escuela María Elena de Santamaría	Col. Nueva Capital, Distrito Central	Finalizado	100%
40	Mejoras a Centro de Alcance	Col. Nueva Capital, Distrito Central	Finalizado	100%
41	Reparación cancha multiusos	Col. Nueva Capital, Distrito Central	Finalizado	100%
42	Pavimentación de Calles	Col. El Japón, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
43	Construcción Drenaje de Aguas Lluvias	Col. El Japón, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
44	Iluminación y mejoras a cancha multiusos	Col. El Japón, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
45	Pavimentación de calles y drenaje superficial	Col. Rubí, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
46	Muralismo	Col. Rubí, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
47	Contenedores de Basura	Col. Rubí, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
48	Poda de árboles (Capacitación - equipamiento - implementación)	Col. Armenia Bonito, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%

49	Proyecto de señalización comunitaria	Col. Rubí, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
50	Mejoras al sistema de iluminación de calles	Col. Éxitos de Anach No. 1 y 2, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
51	Mejoras al Sistema de Iluminación de Calles	Col. Nueva Capital, Distrito Central, Francisco Morazán	Finalizado	100%
52	Pavimentación de Calles	Col. Las Torres, Distrito Central, Francisco Morazán	Finalizado	100%
53	Mejoras al sistema de iluminación de calles	Col. Armenia Bonito, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
54	Iluminación campo de fútbol	Col. Armenia Bonito, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
55	Mejoramiento de calles en Sector Cabañas Elite	Col. San Francisco, Distrito Central	Finalizado	100%
56	Ampliación y mejoramiento espacio recreativo en Sector La Popular	Col. San Francisco, Distrito Central	Finalizado	100%
57	Construcción Parque Infantil y Mejoras a Kinder Mauricio Campagne- Fase I	Colonia Armenia Bonito, La Ceiba	Finalizado	100%
58	Iluminación de calles	Colonia Rodas, La Ceiba	Finalizado	100%
59	Mejoras Sistema de Iluminación de calles	Colonia Sierra Pina, La Ceiba	Finalizado	100%
60	Construcción Cerco Escuela Roberto Larios Silva - CPTED Anexo H	Colonia Morales III, San Pedro Sula	Finalizado	100%
61	Pavimentación Tramo Calle Principal-Cancha	Col. Éxitos de Anach No.1 y 2, Choloma	Finalizado	100%

## PROYECTOS EN EJECUCIÓN

No.	Nombre del Proyecto	Modalidad de ejecución	Ubicación	Fondos USAID L.	Status	% de Ejecución
1	Construcción Centro de Alcance y Mejoras a Jardín de Niños	PEC	Col. Primero de Mayo, La Ceiba	<b>2,150,000.00</b>	En ejecución	80%
2	Reparación CEB Lempira	PEC	Colonia Lempira, San Pedro Sula	<b>1,700,000.00</b>	En ejecución	95%
3	Reparación Puente Peatonal y Ruta Segura	PEC	Colonia Lempira, San Pedro Sula	<b>1,400,000.00</b>	En ejecución	83%
4	Reparación Escuela Esteban Pineda	PEC	Colonia Morales II, San Pedro Sula	<b>1,800,000.00</b>	En ejecución	24%
5	Reparación CDA/IHER/Kínder	PEC	Colonia Morales III, San Pedro Sula	<b>2,266,816.69</b>	En ejecución	22%
6	Mejoras a calle principal	PEC	Colonia Melgar 2, La Ceiba	<b>900,000.00</b>	En ejecución	39%
7	Pavimentación de Calles – Fase II	PEC	Colonia El Japón, Choloma	<b>1,000,000.00</b>	En ejecución	85%
8	Reparación Escuela Lempira	PEC	Col. Sierra Pina, La Ceiba	<b>1,000,000.00</b>	En ejecución	38%

- **Programa de Infraestructura de Educativa (FHIS/EIP)**



- i. **Objetivo General**

El Programa de Infraestructura Educativa (FHIS/EIP), tiene como objetivo principal, la mejora de la infraestructura de centros educativos en las comunidades bajo el convenio MERIDA/CARSI. Con este programa, se financian las actividades de pre-construcción, diseños, suministros de equipo/mobiliario, así como reparaciones y mejoras de infraestructura de centros educativos. Asimismo, a través de la metodología CPTED aplicada a los centros educativos, se incluirán elementos que reduzcan la oportunidad de crimen y violencia y mejoran la percepción de temor en las escuelas. En la fase II del programa, se espera la mejora de la demanda educativa al ampliar los centros educativos a centros básicos (hasta 9° grado), con la construcción de las aulas y dotación de mobiliario para este fin, con acuerdo de nombramiento de plazas provistas por la Secretaría de Educación.

- ii. **Focalización**

Todos los sub proyectos seleccionados serán ejecutados en zonas “calientes” urbanas y rurales y en comunidades remotas amenazadas por las maras y el narcotráfico. Unos proyectos son modalidad PEC y otros con contratista individual o firma constructora. Estos proyectos se están ejecutando actualmente.

Nota: La elegibilidad de los proyectos: Comunidades urbanas identificadas por la USAID bajo Mérida/CARSI y escuelas priorizadas por la Secretaría de Educación dentro de estas mismas comunidades. Se elegirán los sub proyectos que ayuden a mejorar la infraestructura física educativa, a través de reparaciones a centros educativos y ampliaciones de escuelas a centro básico. El Programa está orientado a beneficiar a los niños y niñas de las comunidades de: La Ceiba, Atlántida; San Pedro Sula, Cortés; Choloma, Cortés; Cane, La Paz; Distrito Central.

- iii. **Descripción del Proyecto**

Reparación de centros educativos (escuelas y jardines de niños) en la primera fase del programa. Ampliación de escuelas a Centro Educativo Básico, según los criterios de selección realizados en conjunto con la Secretaría de Educación y la Oficina de Educación de la USAID, en la segunda fase del programa.

**Monto del Convenio:** Los fondos destinados para la ejecución de este Programa es de 80.91 millones de lempiras para la ejecución del programa. Estos fondos son donación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La fecha de finalización es en Diciembre de 2015.

#### iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2014	20000,000.00	20000,000.00	100.00%
2015	24807,145.00	24651,657.63	99%

#### v. Principales Logros (Octubre a Diciembre de 2015)

##### PROYECTOS TERMINADOS

- Terminados 21 proyectos de infraestructura escolar.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Status	% de Avance Físico
1	Reparación en Escuela Manuel Francisco Vélez	Cane, La Paz	Terminado	100%
2	Reparación Jardín de Niños El Japón	Col. El Japón, Choloma, Cortés	Terminado	100%
3	Reparación Escuela Enrique Ortez Pinel	Col. Primero de Mayo, La Ceiba, Atlántida	Terminado	100%
4	Reparación Escuela Policarpo Paz García	Col. Melgar N.1, La Ceiba, Atlántida	Terminado	100%
5	Reparación Escuela Francisco Regis Benedith Fase I	Col. San José, La Ceiba, Atlántida	Terminado	100%
6	Reparación Escuela General Gustavo Alvarez Martínez	Col. Armenia Bonito, La Ceiba, Atlántida	Terminado	100%
7	Reparación Jardín de Niños Club de Leones	Col. Suyapa, La Ceiba, Atlántida	Terminado	100%
8	Reparación Jardín de Niños Brazos de Amor	Col. Las Pilas, Choloma, Cortés	Terminado	100%
9	Reparación Jardín de Niños Buen Samaritano	Col. Rubí, Choloma, Cortés	Terminado	100%
10	Reparaciones en CEB Juan Ramón Molina (Fase I)	Col. San Miguel, Distrito Central, Francisco Morazán	Terminado	100%
11	Reparación Escuela Jesús Aguilar Paz	Col. San Francisco, Distrito Central, Francisco Morazán	Terminado	100%
12	Reparación Escuela Ibrahím Gamero Idiáquez	Col. Zapote Norte, Distrito Central, Francisco Morazán	Terminado	100%
13	Reparación Escuela Francisco Regis Benedith Fase II	Col. San José, La Ceiba, Atlántida	Terminado	100%
14	Reparación Centro de Educación Básica Estado de Israel	Col. Flor del Campo, Distrito Central, Francisco Morazán	Terminado	100%

15	Reparación Jardín de Niños Sagrado Corazón	Col. Las Torres, Distrito Central, Francisco Morazán	Terminado	100%
16	Reparación y Mejoras a Centro de Educación Básica (CEB) Justo Rufino Spilbury	Colonia Bufalo, La Ceiba	Terminado	100%
17	Ampliación a Centro de Educación Básica (CEB) y Reparación de Escuela Éxitos de Anach	Col. Éxitos de Anach, Choloma	Terminado	100%
18	Reparación de Escuela María Elena de Santa María y Ampliación a Centro de Educación Básica (CEB)	Col. Nueva Capital, D.C.	Terminado	100%
19	Ampliación a Centro de Educación Básica (CEB) y Reparación de Escuela Oswaldo López Arellano	Col. López Arellano, Choloma	Terminado	100%
20	Reparación Escuela José Arturo Santos Delgado	Colonia Modesto Rodas Alvarado, La Ceiba	Terminado	100%
21	Reparación Escuela Lempira	Col. Sierra Pina, La Ceiba	Terminado	100%

### PROYECTOS EN EJECUCIÓN

No.	Nombre del Proyecto	Modalidad de ejecución	Ubicación	Fondos USAID L.	Status	% de Ejecución
1	Reparaciones en Centro de Educación Básica (CEB) Juan Ramón Molina (Fase II)	PEC	Colonia San Miguel, D.C.	<b>3,071,540.00</b>	En ejecución	68%
2	Reparación Escuela El Japón	PEC	Colonia El Japón, Choloma	<b>2,771,690.00</b>	En ejecución	93%
3	Reparación de Escuela Miguel Andonie Fernandez y Ampliación a Centro de Educación Básica (CEB)	PEC	Col. La Era, D.C.	<b>3,500,000.00</b>	En ejecución	80%
4	Reparación de Escuela Jose Maria Casco y Ampliación a Centro de Educación Básica (CEB)	PEC	Col. La Sosa, D.C.	<b>3,500,000.00</b>	En ejecución	65%
5	Ampliación y Reparación de Centro de Educación Básica (CEB) Rafael Pineda Ponce	PEC	Col. Unidad y Fuerza, D.C.	<b>4,000,000.00</b>	En ejecución	52%
6	Ampliación y Reparación Instituto Polivalente Las Brisas	PEC	Col. Las Brisas, San Pedro Sula	<b>3,100,000.00</b>	En ejecución	45%
7	Ampliación y Reparación de Centro de Educación Básica (CEB) Rubén Antúnez Castillo	PEC	Col. San Jorge, Sector Cofradía, San Pedro Sula	<b>3,000,000.00</b>	En ejecución	32%

- **Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a Través de las Energías Renovables (PODER)**

**i. Objetivo General**



El Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a través de las Energías Renovables (PODER), tiene como objetivo principal, mejorar las condiciones de vida del sector rural de Honduras más pobre del país. La falta de energía limita las oportunidades económicas y las opciones alimenticias disponibles en los hogares hondureños. Sin energía, familias rurales no tienen la capacidad de refrigerar y almacenar alimentos nutritivos, operar sistemas de irrigación y llevar a cabo procesos que les de valor agregado para generar ingresos adicionales, o incluso que les permita finalizar las tareas escolares por la noche. La meta de esta Actividad es proporcionar acceso a energías renovables (incluyendo las tecnologías que pueden resultar en la entrega de energía eléctrica) a por lo menos 10,000 familias rurales de Honduras, aproximadamente 50,000 beneficiarios en el occidente de Honduras en comunidades de la iniciativa de Alimentando el Futuro del Gobierno de Estados Unidos, a través de los proyectos, y de esta manera abordar algunas de las causas fundamentales de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición.

**ii. Focalización**

Proyectos que mejoran la posibilidad para generar el ingreso de los residentes de las comunidades del área de influencia en los departamentos de La Paz, Lempira, Intibucá, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque.

**iii. Descripción del Proyecto**

Soluciones y tecnologías haciendo uso de las energías renovables orientados a la mejora de los procesos productivos logrando atacar las causas de pobreza e inseguridad alimentaria.

**Monto del Convenio:** Los fondos destinados para la ejecución de este Programa es de 20.82 millones de lempiras para la ejecución del programa. Estos fondos son donación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La fecha de finalización de la primera etapa es en junio de 2015.

#### iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2015	10860,882.00	9750,284.62	89.77%

#### v. Principales Logros (Octubre a Diciembre de 2015)


- En ejecución de proyectos:

No.	Tipo de Proyecto	Ubicación	Fondos USAID L.	Status	% de Ejecución
1	Sistema de riego	San Antonio del Norte, San Antonio del Norte, La Paz	<b>1,089,250.00</b>	En ejecución	70%
2	Sistema de riego	Azacualpa, Yamaranguila, Intibucá	<b>720,000.00</b>	En ejecución	70%
3	Sistema de riego	Togopala, Intibucá, Intibucá	<b>800,000.00</b>	En ejecución	70%
4	Sistema de riego	Las Mesas, Yamaranguila, Intibucá	<b>1,026,360.00</b>	En ejecución	70%
5	Sistema de Riego	El Tablón, Yamaranguila, Intibuca	<b>650,000.00</b>	Excavación de línea de Conducción	70%
6	Sistema de Riego	Los Olivos, Yamaranguila, Intibbuca	<b>759,065.00</b>	Excavación de línea de Conducción	70%

- En evaluación de status proceso ambiental de los proyectos de Sistema de Riego de Bailadero.
- Licenciamiento ambiental de los proyectos de Sistema de Riego de El Cerrón y Panina.
- Proceso de implementación e instalación de sistemas parcelarios para los Sistemas de Riego de Belén, Las Quebradas, Las Lagunas y La Rinconada.
- En revisión por la junta Directiva del IHCAFE para el proyecto de secadoras solares y eco estufas en La Paz e Intibucá.
- Revisión final del informe de factibilidad para el proyecto de Micro Central Hidroeléctrica de San José Intibucá.
- De los 23 perfiles de proyectos presentados fueron aprobados 4 con fondos asignados y 19 aprobados con fondos por asignar (entre febrero y marzo 2016).

## COOPERACIÓN SUIZA EN AMÉRICA CENTRAL

- **Mejora del Acceso a Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Urbanas, Periurbanas y Rurales de Honduras.**



**i. Localización Geográfica:**

Principalmente en los Departamentos de Intibucá, La Paz, Comayagua, El Paraíso, Sur de Francisco Morazán, Copán, Santa Bárbara y Lempira.

**ii. Duración:**

27 meses (agosto 2013 a octubre del 2015).

**iii. Beneficiarios:**

Beneficiando aproximadamente a 13,000 habitantes.

**iv. Financiamiento Total:**

El monto solicitado a la Cooperación Suiza es de USD 2,463,160 el monto total del proyecto es de USD 3,498,791

El FHIS tiene como uno de sus objetivos “Mejorar las condiciones de vida de la población pobre brindándole mayor acceso a los servicios sociales básicos”; siendo congruente con el objetivo 1 de la “Ley para el Establecimiento de una Visión se País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras”. Las comunidades han venido priorizando en los planes de desarrollo municipal proyectos de agua potable y saneamiento, algunas municipalidades incluso han realizado un gran esfuerzo para ejecutar estudios preliminares de pre inversión de obras identificadas en sus planes de inversión; no obstante por la dimensión de los proyectos y la capacidad técnica y financiera de los municipios no se han podido ejecutar, por lo que han solicitado al FHIS, como institución ejecutora descentralizada apoyo para la ejecución de los mismos.

Según la Encuesta Permanente de Hogares de Mayo 2011, el acceso a servicio de agua proveniente de sistemas públicos y privados o de pozos está en el área urbana en un 97% de las viviendas y en el área rural en un 83% de las mismas. En tanto, en el área urbana el servicio de saneamiento por alcantarillado sanitario y pozo séptico es de 90%; y, en el área rural el saneamiento con servicio de alcantarillado, pozos sépticos o letrinas secas es de 83%. Las coberturas muestran trecho alto para alcanzar las metas de desarrollo del milenio.

El Proyecto con financiamiento de la Cooperación Suiza se manejará bajo el ciclo de proyectos del FHIS; promoviendo la participación comunitaria y municipal en la ejecución de los subproyectos bajo una metodología de trabajo de atención a la demanda y el fortalecimiento a las comunidades.

**v. Descripción del Proyecto**

El Proyecto ampliará y mejorará el acceso a agua y saneamiento con un enfoque integral a una población meta de 13,000 personas, unas 2160 familias. La región de trabajo es principalmente los Departamentos de Comayagua, Francisco Morazán, El Paraíso, Intibucá y La Paz, así como Copán, Lempira y Yoro (ver el Mapa de la Región de trabajo en el Anexo 3.)

Para optimizar la inversión se revisarán los diseños preliminares existentes. Con el fin de fortalecer al personal y consultores del FHIS mediante talleres se realizará la transferencia de experiencias y lecciones aprendidas a diseñadores, revisores e inspectores.

**vi. Objetivo General**

Se ha contribuido a la mejora de las condiciones de vida de comunidades pobres de Honduras, en el marco de los principios de equidad y sostenibilidad.

**vii. Objetivo de Proyecto**

Se ha incrementado el acceso a servicios sostenibles de agua potable y saneamiento en los municipios atendidos.

**viii. Objetivos Específicos**

1. Construidas obras de agua potable y saneamiento integral acorde a la estructura espacial (urbano, periurbano y rural) de las comunidades
2. Fortalecidas las capacidades comunitarias para brindar servicios eficientes con mejora del entorno ambiental y sanitario.
3. Agilizados los procesos del FHIS para lograr eficiencia en procedimientos y gestión.

**ix. Productos**

1. Producto 1.1 Diseñados 16 proyectos y sus expedientes examinados
2. Producto 1.2 Construidos 9 sistemas de agua potable
3. Producto 1.3 Construidos seis (6) sistemas de alcantarillado sanitario y cuatro (4) de saneamiento básico integrales
4. Producto 1.4 Construida una (1) planta potabilizadora FIME

5. Producto 1.5 Construidos seis (6) módulos sanitarios escolares
6. Producto 1.6 Construida una (1) Planta de tratamiento de Aguas Residuales
7. Producto 2.1 Capacitadas para la sostenibilidad 15 comunidades
8. Producto 2.2 Capacitadas en higiene y saneamiento 15 Escuelas
9. Producto 3.1 Fortalecido el FHIS en la ejecución de Proyectos APS
10. Producto 3.2 Equipadas las Unidades de Diseño y Capacitación del FHIS

**x. Avance Financiero**

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2014	12649,188.47	1114,942.70	8.81%
2015	49033,341.00	49029,485.54	99.99%

**xi. Avance por Sector**

SECTOR	PROYECTOS EJECUTADO	EMPLEOS	BENEFICIARI
AGUA Y ALCANTARILLADO	17	48454,323.00	483
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>48454,323.00</b>	<b>483</b>

**xii. Avance por Departamento**

DEPARTAMENTO	PROYECTOS EJECUTADO	EMPLEOS	BENEFICIARI
COMAYAGUA	2	11779,871.27	61
COPAN	1	4235,840.62	44
EL PARAISO	3	13019,864.56	101
FRANCISCO MORAZAN	2	4962,336.34	53
INTIBUCA	1	786,578.42	18
LA PAZ	6	8836,254.77	131
LEMPIRA	1	2899,265.19	48
YORO	1	1934,311.83	27
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>48454,323.00</b>	<b>483</b>

**xiii. Otras Inversiones**

	EJECUTADO
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	575,162.54
<b>TOTAL</b>	<b>575,162.54</b>

**xiv. Logros y Avances:**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ALDEA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO ACTUAL
El Paraiso	El Paraiso	Santa Cruz	Construccion de Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento	FINALIZADO
Comayagua	Lejamani	Casco Urbano	Construccion Alcantarillado Sanitario	FINALIZADO
Yoro	Yorito	Casco Urbano	Ampliacion Alcantarillado Sanitario	FINALIZADO
Comayagua	Ajuterique	Casco Urbano	Construccion Alcantarillado Sanitario	FINALIZADO
La Paz	Cane	Casco Urbano	Construccion de Sistema de Alcantarillado	FINALIZADO
Lempira	La Union	Casco Urbano	Construccion de Sistema de Alcantarillado y Planta Tratamiento	FINALIZADO
El Paraiso	El Paraiso	Cuyali	Construccion Sistema Agua Potable	FINALIZADO
Intibuca	Intibuca	Llano La Virgen	Construccion Sistema de Agua Potable	FINALIZADO
Copan	Dulce Nombre de Copan	Casco Urbano	Construccion Planta Potabilizadora	FINALIZADO
Francisco Morazan	Reitoca	Cerro del Señor	Construccion Sistema de Agua Potable	FINALIZADO
Francisco Morazan	Sabanagrande	La Jagua	Construccion Sistema de Agua Potable	FINALIZADO
El Paraiso	Teupacenti	Cerro Grande	Construccion Sistema de Agua Potable	FINALIZADO
La Paz	Santa Ana	Juniguara	Construcción Letrinas de Cierre Hidráulico	FINALIZADO
La Paz	Santa Ana	Juniguara	Construccion Sistema de Agua Potable	FINALIZADO
La Paz	Santa Ana	El Tizate	Construccion Sistema de Agua Potable	FINALIZADO
La Paz	Santa Ana	El Oregano	Construccion Sistema de Agua Potable	FINALIZADO
La Paz	Santa Ana	Los Ranchos	Construccion Sistema de Agua Potable	FINALIZADO
La Paz	Santa Ana	Matazano	Construccion Sistema de Agua Potable	FINALIZADO
El Paraiso	El Paraiso	El Sillón e Higueros	Mejoramiento Linea de Conducción	FINALIZADO
