



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
(SEDECOAS/FHIS)

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan
Operativo Anual POA-Presupuesto

III Trimestre 2020



Indicé

Introducción	3
Antecedentes	3
Misión:	4
Visión:	4
Valores:	4
Resumen Ejecutivo	5
Situación Actual de los Programas:	6
Proyectos FHIS	8
Ejecución Presupuestaria por Programas 2020	9
Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2020	10
Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Tercer Trimestre 2020	11
Ejecución Gasto Operativo Tercer Trimestre del 2020	12
Cuadro por Sector 2020 (Ejecutado)	14
CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	15
✓ Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)	15
CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	23
✓ Proyecto de Infraestructura Rural BCIE	23
CARTERA KfW Entwicklungsbank	30
✓ Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V	30
✓ Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) ..	35
CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)	45
✓ Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)	45
✓ Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)	49



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS

Introducción



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS

El presente informe es la recopilación de las actividades e inversiones realizadas por el SEDECOAS/FHIS durante el tercer trimestre de 2020.

Antecedentes

De acuerdo al Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-056-2019 se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), la cual debe de promover el Desarrollo Comunitario por medio de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos, en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerables de Honduras quien para el desarrollo de sus funciones debe contar con una Subsecretaría de Estado.

Se adscribe a dicha Secretaría de Estado, El Instituto Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS).

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es un organismo Desconcentrado de la Presidencia de la República, creado el 22 de febrero de 1990 y extendida su vida legal hasta el año 2022 según decreto No. 222-2010 cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados, en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social y/o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Asimismo, asesorará a los gobiernos locales con respecto a los procesos de captación de recursos de las fuentes de financiamiento nacionales y/o externas y las asiste en la transferencia de las capacidades técnicas y administrativas, para convertir a estos gobiernos locales en administradores eficientes de sus programas y proyectos, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Nación en aplicación del principio de Descentralización.

Misión:

“Somos una Institución estatal, desconcentrada, técnica y captadora de recursos que promueve el desarrollo local sostenible, participativo e incluyente mediante el fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, en alianza con socios estratégicos para desarrollar obras de infraestructura y proyectos de orientación social de acuerdo al plan de nación y visión de país de forma transparente y eficiente, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable de Honduras”.

Visión:

“Ser para el año 2022, la Institución líder en gestión y fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, para la ejecución de proyectos, que contribuya equitativamente al desarrollo sustentable nacional”.

Valores:

- **Ética:** Ejercicio de las funciones con sujeción a las normas morales que promuevan la confianza de la población hondureña.
- **Integridad:** Actuación sustentada en la honradez, prudencia, entereza, rectitud y firmeza.
- **Compromiso:** Ejecución de proyectos que coadyuven al desarrollo local.
- **Transparencia:** Amplia difusión de información sobre nuestras actuaciones. Rendición de cuentas ante la sociedad.
- **Lealtad:** Actuar con fidelidad y rectitud hacia el FHIS y compañeros de trabajo, con el objetivo de identificarse con la institución.
- **Equidad:** El FHIS no hace distinción de credo, raza, de ninguna otra forma de discriminación humana.




Resumen Ejecutivo

SEDECOAS/FHIS, llega hasta los lugares más recónditos del país, para contribuir a mitigar las necesidades de la población más pobre y vulnerable a través de respuestas rápidas y concretas con proyectos de Agua y Saneamiento, Educación, Electrificación Rural, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural.

El presupuesto del FHIS para la gestión 2020 al 30 de septiembre asciende a 848.1 Millones de Lempiras:

Fuente	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	% de Participación en el Presupuesto Vigente
BID	L. 134.871.251,00	L. 117.948.550,00	14%
BCIE	L. -	L. 5.000.000,00	1%
USAID	L. 210.905.387,00	L. 210.905.387,00	25%
GOH*	L. 525.792.513,00	L. 354.712.612,00	42%
KfW	L. 158.382.933,00	L. 157.580.933,00	19%
TOTAL	L. 1.029.952.084,00	L. 846.147.482,00	100%

* Incluye costo Operativo del FHIS

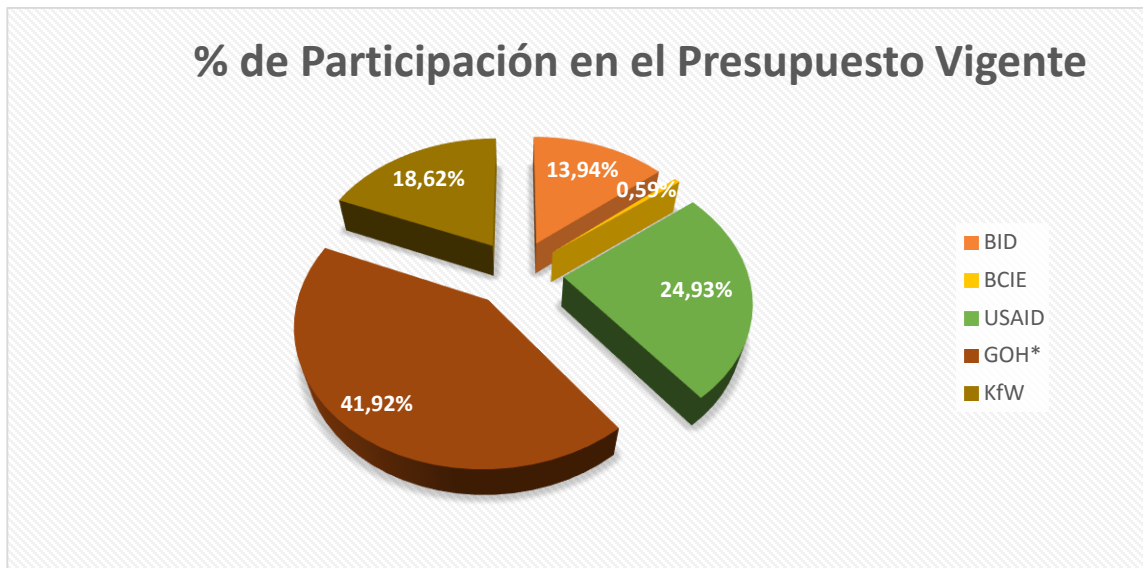

Situación Actual de los Programas:

1. Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), Los Proyectos de integración urbana el cual incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y obras de mitigación de riesgos, colonias 25 de Enero, Australia, Nueva España, Nueva Galilea, inicio la ejecución de obras el día 20 de Diciembre de 2019. La duración prevista del proyecto es al mes de junio del año 2021 (período ampliado debido a la pandemia por el COVID-19). Al mes de SEPTIEMBRE de 2020 se tiene la instalación de servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y pavimentación de calles en sectores de los barrios beneficiados; el porcentaje de avance físico de este producto es de un 20% y tiene un avance financiero de 50% en relación al monto contratado que es de L. 128,592,322.09.
2. Programa Infraestructura Rural (BCIE), De los fondos del préstamo BCIE No. 1736 se ha ejecutado un monto de US\$ 15.146 Millones, hasta el 30 de septiembre del 2020, lo que representa el 100.98% de monto total de US\$ 15.00 Millones. Para fines de presentación de la ejecución real del PGI, se incluyen – rebajando la ejecución- las multas aplicadas, de conformidad a la política financiera del BCIE de reinvertir estos valores.
3. Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE III y IV: Se han avanzado en los procesos de contratación de proyectos esto con la finalidad de avanzar en la ejecución y poder solicitar la ampliación de tiempo
4. Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR), Al cierre del período del periodo de Julio a Septiembre del año 2020 la ejecución financiera del programa alcanza a un **30.7%** Entre las razones más importantes para este porcentaje (%) de ejecución, es debido a que todo lo programado para el tercer trimestre no culminó al final del periodo debido a la situación actual de la Pandemia del COVID-19, por lo que los procesos y proyectos se suspendieron su ejecución y se reactivaron en el mes de julio.
Los procesos de resolución de contrato de los proyectos “Casa de la Cultura” y “mediana Sitraterco” aún se encuentran en proceso para la recuperación de los fondos a la cuenta del programa CONVIVIR, a finales del mes de diciembre del año 2019 se recibió la noticia y el F01 del depósito y a finales de febrero del año en curso de una parte de estos fondos a las cuentas del SEDECOAS/FHIS, restando un monto de L. 8,139,334.38. Actualmente está en proceso una incorporación de presupuesto en la SEFIN, fondos que son necesarios para la culminación del programa.

5. Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS), Por el estado de emergencia a nivel nacional emitido mediante Decreto, se suspendió la ejecución de proyectos, lo que conllevó a una reprogramación de las actividades a partir del 01 de septiembre.

La Dirección DIM envió solicitud de disminución de cuota a SEFIN por la reprogramación de los proyectos mediante oficio y se está a la espera de la aprobación de la solicitud.

Así mismo se incorporaron 3 nuevos proyectos para apoyar la pandemia, de los cuales uno ha finalizado y 2 están en ejecución y programados para finalizar este año 2020.

6. Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH): Las actividades de capacitación, ejecución física y financiera fueron suspendidas, por el toque de queda absoluto decretado por el Gobierno de la República por la Pandemia del COVID-19, desde el mes de marzo y reactivadas nuevamente hasta el 01 de septiembre del 2020.


La Directiva DIM está realizando seguimiento vía teléfono con los CEPS por medio del personal de campo para ir informando sobre las medidas dictadas por el Gobierno de la República de Honduras (durante la pandemia), actualmente con la reactivación de proyectos de septiembre, el personal se ha reintegrado a las labores de seguimiento en campo.

Proyectos FHIS

Fuente	Nombre del Proyecto	Nombre Corto	Sector	Modalidad Ejecucion
BID	Programa Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	PCCMB 4518/BL-HO	Infraestructura Social	Centralizados
BCIE	Proyectos de Infraestructura Rural	PIR BCIE 1736	Agua y Sanemiento, Eletrificacion y Caminos Rurales	Descentralizados/ Centralizados
KFW	Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar SE-FHIS FASE III y IV	PROMINE	Infraestructura Escolar	Descentralizados
	Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras	CONVIVIR	Infraestructura Social y Fortalecimiento de las Capacidades de los Jóvenes	Descentralizados
USAID	Programa de Infreestructura para la Seguridad Ciudadana	ICS	Recuperacion de espacio públicos e infraestructura escolar para la mejora de la seguridad ciudadana	PEC/Centralizados
	Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras	PIOH	Mejorar las condiciones de Infraestructura Básica para contribuir al desarrollo en el Occidente de Honduras.	PEC/Centralizados


Ejecución Presupuestaria por Programas 2020

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Monto Planificado III Trimestre	Devengado del III Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% Ejecución III Trimestre/ Planificado III Trimestre	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
Programa 1: Actividades Centrales	L. 525.792.513,00	L. 354.712.612,00	L. 113.512.554,16	L. 66.508.769,88	L. 177.289.363,80	L. 177.423.248,20	59%	50%
Programa 11: Infraestructura Rural	L. 65.583.096,00	L. 70.583.096,00	L. 19.713.269,00	L. 4.744.016,95	L. 13.330.703,53	L. 57.252.392,47	24%	19%
Programa 12: Infraestructura Escolar	L. 135.907.777,00	L. 135.907.777,00	L. 35.943.709,00	L. 1.537.000,36	L. 24.768.632,74	L. 111.139.144,26	4%	18%
Programa 14: Fomento al Desarrollo Local	L. 302.668.698,00	L. 284.943.997,00	L. 46.312.459,00	L. 24.590.501,43	L. 88.759.469,76	L. 196.184.527,24	53%	31%
TOTAL	L. 1.029.952.084,00	L. 846.147.482,00	L. 215.481.991,16	L. 97.380.288,62	L. 304.148.169,83	L. 541.999.312,17	45%	36%

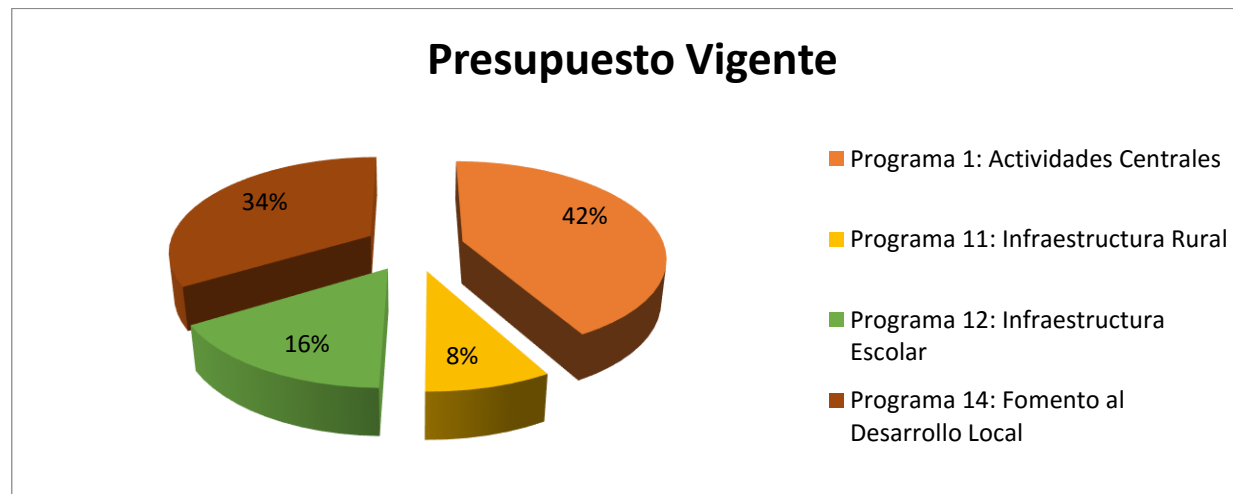


Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2020

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente 2020	Devengado del III Trimestre	Devengado Acumulado 2020	% Ejecución al III Trimestre / Presupuesto Vigente
Gasto Operativo/Gobierno	L. 525.792.513,00	L. 354.712.612,00	L. 66.508.769,88	L. 177.289.363,80	50%
Proyecto de Infraestructura Rural 1736-BCIE PIR	L. -	L. 5.000.000,00	L. 2.658.602,58	L. 4.184.495,22	84%
Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras PIOH	L. 65.583.096,00	L. 65.583.096,00	L. 2.085.414,37	L. 9.146.208,31	14%
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar, KfW VIII PROMINE	L. 135.907.777,00	L. 135.907.777,00	L. 1.537.000,36	L. 24.768.632,74	18%
Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jovenes CONVIVIR	L. 22.475.156,00	L. 21.673.156,00	L. 3.079.652,29	L. 6.660.962,30	31%
Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS	L. 145.322.291,00	L. 145.322.291,00	L. 4.911.125,37	L. 46.273.981,48	32%
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios PCCMB	L. 134.871.251,00	L. 117.948.550,00	L. 16.599.723,77	L. 35.824.525,98	30%
TOTAL	L. 1.029.952.084,00	L. 846.147.482,00	L. 97.380.288,62	L304.148.169,83	36%

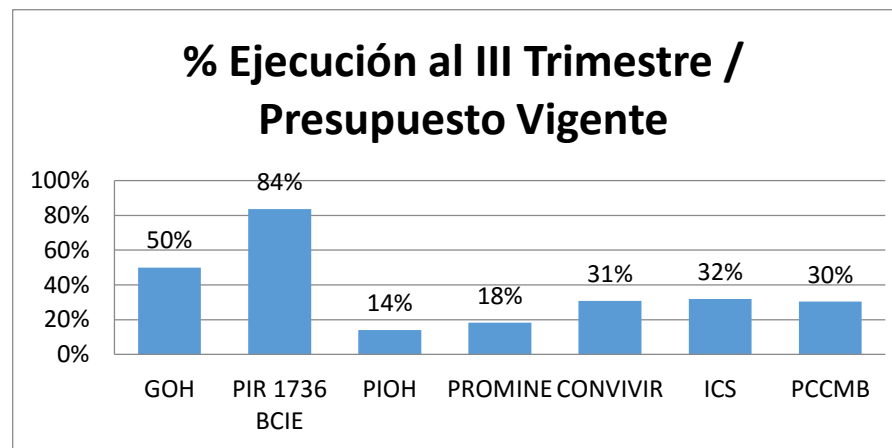

Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Tercer Trimestre 2020

Grupo	Aprobado	Presupuesto Vigente por Grupo	Devengado III Trimestre	Devengado Acumulado al III Trimestre	Disponible	% Ejecución III Trimestre/ Presupuesto Vigente	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
SERVICIOS PERSONALES	L. 192.891.707,00	L. 153.715.094,00	L. 28.752.574,05	L. 88.857.290,72	L. 64.857.803,28	19%	58%
SERVICIOS NO PERSONALES	L. 121.548.289,00	L. 192.114.737,00	L. 48.033.079,69	L. 112.496.647,30	L. 79.618.089,70	25%	59%
MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 17.766.434,00	L. 5.734.915,00	L. 61.844,08	L. 572.534,15	L. 5.162.380,85	1%	10%
BIENES CAPITALIZABLES	L. 635.701.536,00	L. 483.179.027,00	L. 15.103.859,50	L. 93.558.365,70	L. 389.620.661,30	3%	19%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. 62.044.118,00	L. 9.512.709,00	L. 5.428.931,30	L. 6.776.934,85	L. 2.735.774,15	57%	71%
OTROS GASTOS		L. 1.891.000,00	L. -	L. 1.886.397,11	L. 4.602,89	0%	100%
Total	L. 1.029.952.084,00	L. 846.147.482,00	L. 97.380.288,62	L. 304.148.169,83	L. 541.999.312,17	12%	36%

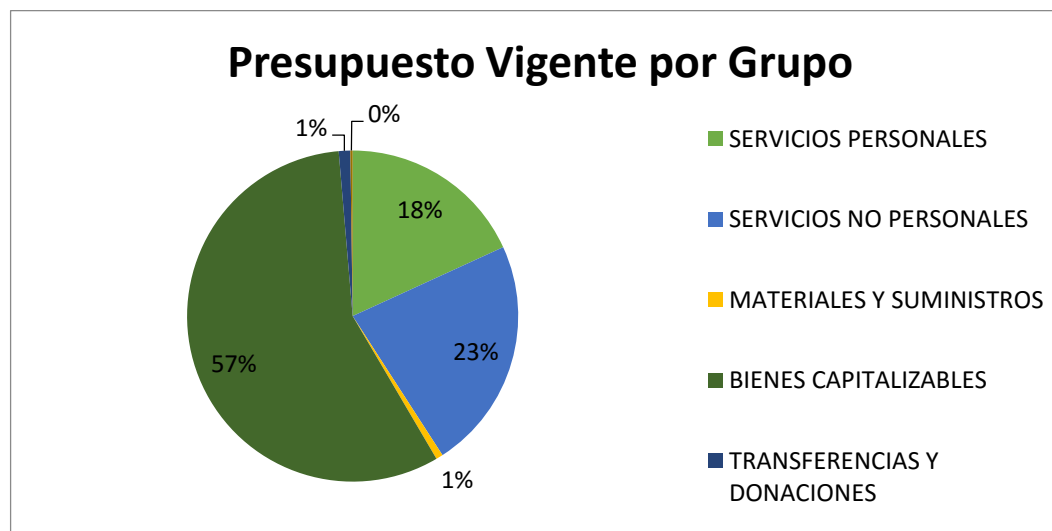



Ejecución Gasto Operativo Tercer Trimestre del 2020

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
11100	Sueldos Básicos	18.480.936,00	13.630.177,21	139138
11400	Adicionales	1540.078,00	990.573,65	24.900,77
11510	Decimotercer Mes	1540.078,00	4.909,17	0,44
11520	Decimocuarto Mes	1540.078,00	1503.370,50	0,50
11600	Complementos	1245.043,00	1145.892,84	99.150,16
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	2.679.737,00	1947.539,44	0,82
11750	Contribuciones para Seguro Social	669.713,00	500.477,30	332,50
12100	Sueldos Básicos	37.800.485,00	15.281.574,32	0,00
12410	Decimotercer Mes	3.150.041,00	375.607,85	0,48
12420	Decimocuarto Mes	3.150.041,00	1.599.835,05	0,80
12550	Contribuciones para Seguro Social	2.274.110,00	806.367,74	22,52
16200	Compensaciones	1951987,00	0,00	1951987,00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	7.000.000,00	1.655.975,65	0,00
26110	Pasajes Nacionales	6.162,00	750,00	0,61
27500	Gastos Judiciales	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
29100	Ceremonial y Protocolo	148.300,00	148.300,00	0,00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100.000.000,00	9.624.316,54	82.682.197,56
99720	Para Erogaciones de Capital por Devolución de Prestamos	1.891.000,00	1.886.397,11	4.602,89
11100	Sueldos Básicos	19.836.384,00	13.278.587,67	11765,07
11400	Adicionales	1.653.032,00	739.878,27	0,00
11510	Decimotercer Mes	1.653.032,00	6.222,07	0,08
11520	Decimocuarto Mes	1.653.032,00	1.614.709,84	0,00
11600	Complementos	1.343.986,00	909.241,24	230.646,76
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	2.876.279,00	1.929.460,24	0,80
11750	Contribuciones para Seguro Social	1.146.758,00	840.340,10	1.292,80
21200	Agua	37.009,00	3.200,00	33.809,00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	178.027,00	178.026,50	0,50
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	300.000,00	278.077,11	21.922,89
24300	Servicios Jurídicos	50.000,00	0,00	28.500,00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	2.452.800,00	730.333,33	1.440,00,00
24500	Servicios de Capacitación	86.600,00	0,00	25.980,00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	75.000,00	0,00	45.000,00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	15.500.000,00	2.175.013,09	622.214,24
25100	Servicio de Transporte	1.820,00	1.820,00	0,00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	316.048,00	313.047,25	3.000,75
25400	Primas y Gastos de Seguro	999.601,00	403.683,02	570.917,98
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	33.810,00	33.810,00	0,00
27210	Tasas	77.130,00	0,00	38.565,00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	95.474,00	56.068,63	189,37
33100	Productos De Papel Y Cartón	60.449,00	32.148,48	0,16
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	75.000,00	56.000,00	19.000,00
35620	Diesel	59.215,00	38.414,10	0,90
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	41.110,00	1.109,22	40.000,78
39100	Elemento de Limpieza y Aseo Personal	20.238,00	238,00	0,75



OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	691.00	690.93	0.07
39600	Repuestos y Accesorios	179.524.00	29.970.32	149.553.68
11100	Sueldos Básicos	4.198.800.00	3.018.617.11	346.39
11400	Adicionales	349.900.00	261.000.00	0.00
11510	Decimotercer Mes	349.900.00	0.00	0.00
11520	Decimocuarto Mes	349.900.00	349.900.00	0.00
11600	Complementos	283.000.00	224.676.00	0.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	608.826.00	435.739.50	0.50
11750	Contribuciones para Seguro Social	140.309.00	108.610.60	20.087.40
11100	Sueldos Básicos	2.566.800.00	1.716.850.42	675.78
11400	Adicionales	213.900.00	108.500.00	0.00
11510	Decimotercer Mes	213.900.00	0.00	0.67
11520	Decimocuarto Mes	213.900.00	207.816.67	0.00
11600	Complementos	173.100.00	94.143.00	0.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	372.186.00	248.675.00	0.50
11750	Contribuciones para Seguro Social	125.324.00	75.277.60	205.50
11100	Sueldos Básicos	2.544.000.00	1.911.194.47	343.51
11400	Adicionales	212.000.00	80.493.61	0.39
11510	Decimotercer Mes	212.000.00	16.559.72	0.00
11520	Decimocuarto Mes	212.000.00	212.000.00	0.00
11600	Complementos	171.800.00	122.839.24	32.046.76
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	368.880.00	276.660.00	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	102.893.00	85.336.90	425.60
11100	Sueldos Básicos	22.336.512.00	15.429.043.51	80.36
11400	Adicionales	1.861.376.00	1.184.412.35	0.00
11510	Decimotercer Mes	1.861.376.00	17.919.71	0.16
11520	Decimocuarto Mes	1.861.376.00	1.409.850.25	0.08
11600	Complementos	1.508.241.00	1.148.424.31	140.299.69
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	3.238.796.00	2.294.437.96	0.92
11750	Contribuciones para Seguro Social	879.269.00	713.548.29	845.31
26210	Viáticos Nacionales	13.125.10.00	784.683.80	389.428.99
TOTAL PROGRAMA:		354.712.612,00	177.289.363,80	87.335.738,52

Cuadro por Sector 2020 (Ejecutado)

SECTOR	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios directos 2020
AGUA Y SANEAMIENTO	3	2.348.475,54	24	1.212
INFRAESTRUCTURA VIAL	2	6.822.254,67	41	9.506
EMPENDIMIENTO Y VALORES	0	13.095.649,29	27	1.262
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	0	16.721.073,02	235	5.039
PREVENCION SITUACIONAL/CONVIVENCIA	3	21.568.864,45	212	76.882
EDUCACION	4	40.139.622,54	188	9.352
TOTAL	12	100.695.939,51	727	103.253

Cuadro por Departamento 2020 (Ejecutado)

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios directos 2020
ATLANTIDA	5	20.909.690,00	192	70.185
COMAYAGUA	1	1.997.746,84	31	3.500
COPAN	0	5.163.417,74	0	0
CORTES	0	7.696.689,84	70	14.182
FRANCISCO MORAZAN	1	39.193.359,29	303	11.811
GRACIAS A DIOS	0	376.668,00	0	0
INTIBUCÁ	4	10.666.135,64	72	1.647
LA PAZ	0	1.565.751,26	25	76
LEMPIRA	1	2.427.832,49	24	1.708
OCOTEPEQUE	0	10.698.648,41	10	144
TOTAL	12	100.695.939,51	727	103.253

Cuadro por Otras Inversiones 2020 (Ejecutado)

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2020
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	20.895.705,52
GASTO OPERATIVO DE PROGRAMAS	5.267.161,00
ACTIVIDADES CENTRALES FHIS	177.289.363,80
TOTAL	203.452.230,32

CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO



✓ Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)



i. Antecedentes

Actualmente el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y la Secretaría de Seguridad ejecutan conjuntamente la operación BID 4518/BL-HO denominada “Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios” el cual es un préstamo por un monto total de US\$60,000,000.00 la operación fue aprobada por el Banco Interamericano de Desarrollo en el mes de abril de 2018, posteriormente aprobada por el Congreso Nacional en el mes de octubre de 2018, y fue efectivo a partir del 28 de noviembre de 2018, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta

ii. Objetivo

Contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

iii. Componentes

Componente 1. Mejoramiento del hábitat de barrios urbanos vulnerables (US\$18.219 millones). El propósito de este componente es mejorar el acceso a servicios de infraestructura urbana y generar espacios con condiciones de seguridad, para incentivar una mejor convivencia y aumentar la capacidad de los ciudadanos para el cumplimiento pacífico de normas. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Infraestructura básica: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios en los siguientes barrios del Distrito Central: Monte de los Olivos, Nueva Jerusalén; Australia; 25 de Enero; Nueva

España; Brisas del Mogote y Nueva Galilea teniendo como marco para las intervenciones el Plan Integral de Mejoramiento de Barrios, el cual incluye los correspondientes diseños urbanísticos, de ingeniería, la programación y presupuestos. Este instrumento es crítico para la adecuada programación de las inversiones y para facilitar el diálogo con la comunidad sobre las actividades a desarrollar. Se financiará consultorías y contratación de obras para: (i) la preparación de los Planes Integrales de Mejoramiento de Barrios (PIMB); y (ii) las inversiones en obras de infraestructura básica de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, pavimentación, drenaje pluvial, plazas y parques, equipamientos sociales y otras necesidades detectadas en los PIMB. Se promoverá la recuperación de escuelas públicas y centros de salud (operados por las entidades estatales específicas).

Convivencia y Emprendimiento a nivel barrial: promueve la participación de los vecinos en el mejoramiento de las condiciones de su entorno, así como el fortalecimiento de sus redes sociales y vecinales para mejorar el tejido social en los barrios. Se financiará: (i) capacitación de líderes, programa de deportes y valores, apoyado por el Comité Olímpico Internacional; (ii) capacitación de vecinos en áreas de empleabilidad dentro y fuera del barrio mediante la asistencia técnica de las Universidades y su vinculación con el sector empresarial, (iii) organización para utilización de sistemas de alerta temprana para desastres naturales. Todas las actividades tendrán enfoque de género.

Componente 2: Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios (US\$22.130 millones). Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios de prevención social de la violencia al ciudadano y brindar una atención oportuna a las víctimas de violencias y delitos, fortaleciendo la gestión local. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Fortalecimiento de capacidades de actores municipales. Se financiará: (i) capacitación y asistencia técnica a las autoridades locales para promover la participación ciudadana en la preparación de planes locales de prevención social de la violencia; (ii) fortalecimiento de las capacidades de los responsables de los observatorios locales, para el análisis estratégico de estadísticas del crimen y delito -incluyendo la desagregación por género-; y (iii) estrategia de comunicación a través de campañas y consultas sociales para promover medidas y valores para la reducción de violencias, respeto por las normas legales, morales, culturales y el uso de la oferta de servicios disponibles de prevención y atención a víctimas.

Intervenciones de prevención social de la violencia a nivel municipal. Se financiará: (i) programas para la atención a víctimas de VIF a través del módulo de Atención Integral Especializado (MAIE); (ii) desarrollo de protocolos para homologar la actuación de primeros respondientes para atención a víctimas, (iii) programa de prevención social de la violencia para jóvenes en situación de riesgo; (iii) modelo innovador de policía comunitaria y patrullaje policial sistemático -Hot Spots-; y (iv) mejoramiento de la infraestructura de las Jefaturas Departamentales, para ofrecer servicios policiales a la comunidad.

Componente 3: Efectividad policial. (US\$16 millones). Con el propósito de mejorar el desempeño y la calidad en la prestación de los servicios policiales, se apoyará la consolidación del sistema nacional de formación y profesionalización, así como su sistema de integridad. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Consolidación del sistema educativo policial basado en la filosofía de Policía Comunitaria. Se financiará: (i) diseño del modelo de Sistema de Formación y Profesionalización Policial, articulando sus diferentes instancias de formación (Instituto Técnico Policial -ITP-, ANAPO, Universidad y educación continua y entrenamiento), incluye mecanismos de evaluación continua del personal. Lo anterior, deberá estar sujeto a promover principios de meritocracia y transparencia en el desarrollo de la carrera policial; (ii) modernización del currículum académico para los medios y altos mandos policiales, certificado bajo la filosofía de policía comunitaria y orientando la formación a competencias para la toma de decisiones operativas. Lo anterior, incluyendo la redefinición del perfil de ingreso de candidatos a la ANAPO. Esto considerará la incorporación de nuevos cadetes, provenientes del ITP y otros candidatos que ya hayan cursado licenciaturas y tecnicaturas en otras universidades; modernizar el régimen de formación de oficiales en el nuevo campus universitario y generar una nueva estructura de gobierno y planta de profesores-investigadores de tiempo completo (teóricos y prácticos) (iii) fortalecimiento de las capacidades pedagógicas para docentes; (iv) fortalecimiento de la integridad policial a través de la consolidación de un sistema de evaluación y rendición de cuentas; y (v) modernización de la infraestructura física y tecnológica de la Academia Nacional de Policía y el Centro de Investigación y Desarrollo Policial.

Fortalecimiento de las capacidades en investigación criminal. Se financiará: (i) programa de capacitación y especialización continua en investigación criminal en coordinación con el MP; (ii) capacitación técnica en el uso de tecnologías de la información para análisis estratégicos delictuales; e (iii) implementación de un sistema integrado de información delictiva y criminal para mejorar la resolución del delito -integrando estadísticas por categoría de género.

iv. Mecanismo de Ejecución.

Se propone contar con dos organismos ejecutores independientes, pero con responsabilidades compartidas en el diseño, implementación y evaluación de iniciativas que se realicen en la misma área geográfica. El componente 1 de esta operación será ejecutado por SEDECOAS-FHIS y el componente 2 y 3 por la Secretaría de Seguridad.

v. Monto del Convenio:

US\$ 60,000,000.00 Millones de Dólares, según convenio de préstamo el cual se desglosa de la siguiente manera: SEDECOAS- FHS le corresponde US\$ 20, 000,000.00 Millones de Dólares y a la Secretaria de Seguridad le corresponde US\$ 40,000,000.00 Millones de Dólares.

La duración del convenio es por 5 años después de la publicación de diario La Gaceta Acuerdo Ejecutivo No. 114-2018.

vi. Avance financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	17.749.164,00	14.959.784,44	84%
2019	84.562.822,00	75.678.087,16	89%
2020	117.948.550,00	35.824.525,98	30%

vii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios Directos 2020
EMPREDIMIENTO Y VALORES	0	12.838.749,29	27	1.262
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	0	16.721.073,02	235	5.039
EDUCACION	0	645.834,89	0	0
TOTAL	0	30.205.657,20	262	6.301

viii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios directos 2020
FRANCISCO MORAZAN	0	30.205.657,20	262	6.301
TOTAL	0	30.205.657,20	262	6.301

ix. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2020
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	1.905.745,92
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	3.713.122,86
TOTAL	5.618.868,78

x. AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

<i>Avances Programa</i>	
COMPONENTE 1 MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES	
1.0	PRODUCTO 1.1 NUEVE PROYECTOS INTEGRALES DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS (RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PÚBLICO, EQUIPAMIENTO SOCIAL Y PAVIMENTACIÓN), COMPLETADOS Y SIENDO UTILIZADOS
1.1	<p><i>Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Los Proyectos de integración urbana el cual incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y obras de mitigación de riesgos, colonias 25 de Enero, Australia, Nueva España, Nueva Galilea, inicio la ejecución de obras el día 20 de Diciembre de 2019. La duración prevista del proyecto es al mes de junio del año 2021 (período ampliado debido a la pandemia por el COVID-19). Al mes de SEPTIEMBRE de 2020 se tiene la instalación de servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y pavimentación de calles en sectores de los barrios beneficiados; el porcentaje de avance físico de este producto es de un 20% y tiene un avance financiero de 50% en relación al monto contratado que es de L. 128,592,322.09. • Debido a la pandemia del COVID-19 en este proyecto se han implementado los protocolos de bio-seguridad establecidos por: la Secretaría del Trabajo, SEDECOAS FHS y el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras; en este sentido se ha tenido muy poco avance en comparación al trimestre anterior debido a que el personal se ha ido incorporando hasta en un 30% y previo a la contratación de personal se realizan pruebas para la detección de COVID-19 encontrándose resultados positivos de hasta un 20% lo cual ha mermado el trabajo de construcción . • La consultoría de supervisión de estas obras, inició el día 06 de octubre de 2019. Se recibió el primer producto, informe inicial, en cual se revisó técnicamente el diseño de obras. La firma consultora concluyó que los diseños y cantidades de obras estaban correctos y que no era necesario incorporar correcciones para iniciar la etapa de supervisión de obras, a la fecha la consultoría de supervisión tiene un avance financiero del 20.61% en relación al monto contratado que es de L. 12, 326,842.75. • El proyecto de equipamiento social el cual incluye, Reparación de Cancha Polideportiva, Colonia Nueva Galilea, Construcción de Centro Comunal, Colonia Nueva Galilea, Ampliación de Jardín de Niños; Colonia Nueva España, Ampliación Escuela David Corea Sánchez, Colonia Australia, Construcción Centro Comunal, Colonia Australia y Construcción Centro Comunal, Colonia 25 de Enero, inició el día 23 de noviembre de 2019. Al mes de junio de 2020 se tiene un avance físico promedio del 65% y un avance financiero del 42.5% en relación al monto contratado que es de L. 10, 967,584.51. En comparación al avance físico del trimestre anterior el proyecto no ha tenido un avance notorio, debido al paro de labores establecidas por la emergencia nacional ante el COVID-19. • Los servicios de consultoría para supervisión de obras se iniciaron día 11 de noviembre de 2019. Se espera finalizar en el segundo semestre del año 2020 al mes de junio de 2020 se tiene un avance financiero de 30 %. En relación al monto contratado que es de L. 602,493.06. • La consultoría para el diseño de obras del Proyecto de Integración Urbana en colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén No. 2, Brisas del Mogote Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador, ha entregado los tres productos de la consultoría que consisten en: <ol style="list-style-type: none"> 1. Diagnóstico urbano de las redes de servicios públicos y equipamiento social existentes. 2. Informe Intermedio: Diseño preliminar de redes de servicios públicos y equipamiento social; en esta actividad se realizaron múltiples reuniones comunitarias en las cuales la comunidad identifico sus necesidades y requerimientos de diseño. 3. Diseño final de redes de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, sistema eléctrico y alumbrado público y equipamiento social. • A la fecha el avance físico es del 90% y el avance financiero es de 90% en relación al monto del contrato que es de L. 8, 878,240.54.

2.0	PRODUCTO 1.2 JÓVENES DE LOS BARRIOS INTERVENIDOS CAPACITADOS	
2.1	<i>Programa de Deportes y Valores</i>	<ul style="list-style-type: none"> Este proyecto consiste en la enseñanza de disciplinas deportivas implementando los valores olímpicos; al semestre se imparten seis (6) disciplinas olímpicas: taekwondo, levantamiento de Pesas, tenis de Mesa, atletismo, balonmano y lucha olímpica; también, se atiende niños y/o jóvenes con discapacidad y mujeres que practican el baile de Zumba. <p>En el programa participan 1,337 niños y jóvenes en 16 secciones deportivas sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19 se ha comenzado a realizar clases virtuales para el entrenamiento en deportes y a estas sólo tienen acceso quienes en sus viviendas cuentan con un servicio de internet; en este sentido se ha creado un canal en YouTube https://www.youtube.com/channel/UC5mxsM-qXz6wAdCsBzzufYA</p>
1.2	<i>Capacitaciones en valores y emprendimiento</i>	<ul style="list-style-type: none"> En este producto se provee la capacitación en valores y emprendimiento, que iniciarán en el mes de OCTUBRE del año 2020 (ESTIMANDO LA APERTURA ECONÓMICA ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19); la meta a alcanzar inicialmente programada era 2,000 asistencias a capacitación, sin embargo, ante la emergencia se ha reprogramado este producto a una asistencia de 750 personas; ya que hasta el día 14 de septiembre de 2020 se emitió la CIRCULAR NO.DGIP -004-2020 en la cual se define el proceso de reactivación económica; en este sentido, hasta esta fecha se iniciaron los procesos de compra de insumos para brindar capacitaciones los cuales se restringieron mediante la CIRCULAR NO. DGIP-003-2020.
3.0	PRODUCTO 1.3 MUJERES DE LOS BARRIOS INTERVENIDOS CAPACITADAS EN EMPRENDEDURISMO Y EMPLEO	
3.1	<i>Capacitaciones en empleabilidad.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Ejecución con fondos ATN/OC-17135-HO Proyecto de Revitalización Económica y Desarrollo de Barrios Vulnerables de Tegucigalpa Al mes de marzo inició el programa de capacitación en programación y animación digital donde participan 14 mujeres a través de la fundación CADERH, financiado a través de la cooperación técnica ATN/OC-17135-HO; actualmente debido a la pandemia del COVID-19 la fundación CADERH realiza capacitaciones virtuales por tal motivo brindó a las participantes una computadora portátil y un chip para la conexión de servicios de internet; en este convenio se han ejecutado \$5,000.00 dólares que corresponde al 50% del monto. A través de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa se está ejecutando un convenio para Desarrollar 2 programas de formación <ul style="list-style-type: none"> Cierre de brechas de competencias blandas y técnicas de 75 jóvenes para la inserción laboral financiado a través de la cooperación técnica ATN/OC-17135-HO. Desarrollo de 25 microemprendimientos con jóvenes en base al diseño de un plan de negocios financiado a través de la cooperación técnica ATN/OC-17135-HO. <p>El convenio se firmó el día 15 de junio de 2020 y ha iniciado su ejecución al mes de agosto de 2020, debido a la espera de la reapertura económica inteligente.</p>

xi. PROBLEMÁTICA:

PROBLEMA	ACCIONES DE MITIGACIÓN, COMENTARIOS, NECESIDADES DE APOYO
No contar con la licencia Ambiental para los proyectos de las colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén, y Brisas del Mogote.	<p>Estas colonias se encuentran ubicadas en la cuenca del río Guacerique, la cual abastece el embalse de los Laurales, una de las tres fuentes de abastecimiento de la ciudad. El Saneamiento de estas colonias es imperativo para detener la contaminación del embalse. Sin embargo, se espera dificultades por parte de MiAmbiente en brindar el licenciamiento ambiental. Es por eso que se ha indicado a la firma consultora incorporar en su diseño todas medidas de mitigación necesarias para garantizar la viabilidad técnica y ambiental del proyecto. Asimismo, se requiere la actualización del Plan de manejo de la Cuenca de Guacerique, de manera que se actualice el uso de suelo, se identifiquen los asentamientos informales que se han establecido en los últimos años (incluidas las colonias en referencia) y se defina el plan de manejo de la zona.</p> <p>En los meses de enero y febrero del año 2020 se han realizado varias reuniones con el SANAA en las cuales se ha acordado la aprobación técnica de diseños de sistemas de agua potable y saneamientos quedando sujetos a la aprobación del proyecto por parte de MiAmbiente en donde también se ha expuesto la problemática para la atención del saneamiento en la zona de intervención.</p>


Disminución de \$5,000,000.00 de fondos del contrato de préstamo:

\$4,700,000.00 (32% del monto original) del Producto de obras Integrales de mejoramiento de barrios y \$300,000.00 (48% del monto original) del Producto Mujeres de los barrios intervenidos capacitadas en emprendimiento y empleo.

Decreto Ejecutivo PCM-046-2020 del 21 de mayo, 2020.

Las reducciones tendrán las siguientes afectaciones en los objetivos, impactos y resultados esperados del programa:

1. Para el producto Proyectos Integrales de mejoramiento de barrios implementados obras, el programa tenía previsto la construcción 9 proyectos integrales de mejoramiento de barrios informales que incluyen red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, pavimentación, obras de mitigación y equipamiento social. Se esperaba beneficiar al menos 2,800 alrededor de 8,435 personas. Actualmente se ha iniciado la primera fase de construcción que abarca 4 barrios con un total de 1,000 lotes. Las obras iniciaron el 20 de diciembre de 2020 y tiene un avance del 16%. El resto de los proyectos se encuentran en proceso licenciamiento ambiental y están previstos para iniciar obras al año 2021. Con la reducción se dejarán de atender a **1,300 viviendas** (46% de la meta inicial) que no tendrán acceso a ninguno de los servicios urbanos y no podrán salir de las condiciones de informalidad. Las colonias afectadas serán Nueva Jerusalén y Montes de los Olivos como, se muestra en el siguiente mapa:

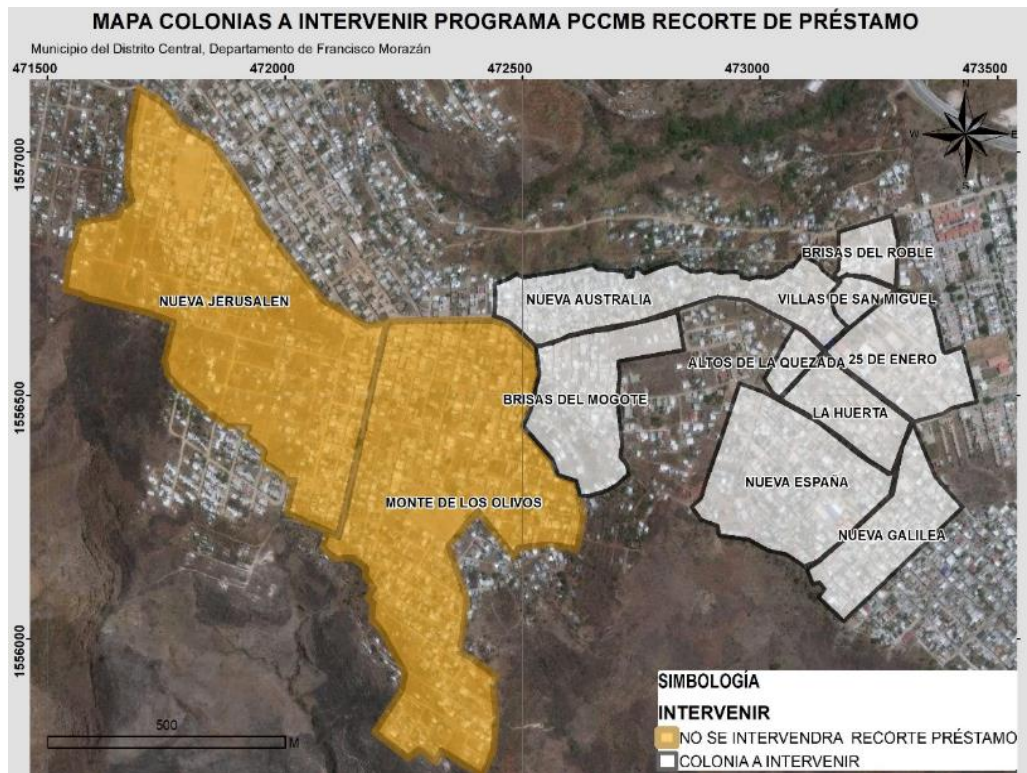

2. Los nueve barrios bordean la cuenca de Guacerique, en la cual se encuentra el embalse de los Laureles que abastece de agua potable a la ciudad capital. Los 9 barrios beneficiarios del programa no cuentan con sistemas de alcantarillado y drenaje pluvial, por lo que los desechos de las mismas drenan hacia la cuenca contaminando el agua de la represa. Con la reducción de los fondos no se logrará el saneamiento de cuenca en vista que las aguas residuales de las colonias Nueva Jerusalén y Monte de Olivos continuarán drenando libremente.
3. La Cancelación de los Proyectos integrales de las Colonias Monte de los Olivos y Nueva Jerusalén tendrán repercusiones sociales para el Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo. El programa tiene tres años de estar preparando las obras y realizando actividades de desarrollo social y económico de los

habitantes. Todos los habitantes conocen que el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de Honduras han destinado fondos para la realización de los proyectos integrales y que los diseños se encuentran finalizados. La no realización de los mismo dañará negativamente la imagen del Gobierno de Honduras y la del Organismo financiador. Se espera inclusive manifestaciones, protestas y la toma de calles de las personas afectadas.

4. Para el producto Mujeres de los barrios intervenidos capacitadas en emprendimiento y empleo. Se plantea una reducción del 48% del presupuesto. La meta original consistía en la capacitación de al menos 700 mujeres en riesgo social. Estas actividades están programadas para iniciar en el año en curso y se están iniciando las contrataciones iniciales. Con la reducción del presupuesto se está ajustando la meta al 50% (350 mujeres).
5. Se han realizado múltiples reuniones con vecinos de la comunidad para comunicar el recorte de fondos siguiendo el PGAS (Plan de Gestión Ambiental y Social establecido en el contrato de préstamo) y han manifestado su descontento ante el recorte de sus proyectos; han indicado realizar tomas que pueden afectar la ejecución de proyectos en colonias aledañas.

CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA



✓ **Proyecto de Infraestructura Rural BCIE**

i. Objetivo General

Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local. Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son de L. 283 millones aproximadamente.

ii. Focalización:

En base a la metodología de selección de las mancomunidades ejecutado por PIR, que toma en consideración el índice de desarrollo humano, la capacidad de gerenciamiento de la Unidades técnicas Municipales en cada mancomunidad y no más de una mancomunidad por departamento, fueron seleccionadas las mancomunidades de los departamentos de Lempira (CAFEG), Intibucá (AMFI) y Francisco Morazán (MANOFM).

iii. Tipología de Proyectos

- Electrificación Rural: proyectos para habilitar o mejorar el acceso a electricidad teniendo los beneficiarios que aportar el 15% del monto total del proyecto.
- Agua y Saneamiento: proyectos de rehabilitación, expansión y construcción de sistemas comunales de agua y saneamiento y facilidades en áreas rurales, de las mancomunidades previamente seleccionadas.
- Caminos Rurales: proyectos de rehabilitación y mejoramiento de los caminos municipales eficientemente y utilizando métodos de empleo masivo de mano de obra aportando las comunidades beneficiadas el 15% del total del proyecto.

iv. Monto del Convenio:

L.285.0 Millones de Lempiras aproximadamente, según convenio de préstamo el tiempo de ejecución del proyecto es de 60 meses.

v. **Avance Financiero**

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2011	37.790.000,00	0,00	0%
2012	6.393.674,00	0,00	0%
2013	33.774.273,00	33.771.086,72	100%
2014	42.465.271,00	32.714.051,57	77%
2015	32.683.893,00	32.295.225,85	99%
2016	95.056.511,00	93.906.331,81	99%
2017	89.155.169,00	86.922.798,37	97%
2018	37.332.495,00	36.390.084,05	97%
2019	34.274.786,00	34.213.605,05	100%
2020	5.000.000,00	4.184.495,22	84%

vi. **Avance por Sector**

SECTOR	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios Directos 2020
AGUA Y SANEAMIENTO	3	2.348.475,54	24	1.212
ELECTRIFICACION	0	-	0	0
INFRAESTRUCTURA VIAL	1	1.142.691,19	15	570
TOTAL	4	3.491.166,73	39	1.782

vii. **Avance por Departamento**

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios directos 2020
FRANCISCO MORAZAN	0	-	0	0
INTIBUCÁ	3	2.905.238,20	30	1.284
LEMPIRA	1	585.928,53	9	498
TOTAL	4	3.491.166,73	39	1.782

viii. **Otras Inversiones**

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2020
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	693.328,49
TOTAL	693.328,49

viii. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

El presente documento hace referencia a los movimientos que corresponden a la ejecución física y financiera del Programa PIR al tercer trimestre del año 2020, para cada sector de inversión y para la fuente de financiamiento activa actualmente.

Con fondos del Préstamo BCIE No. 1736, se interviene en los sectores de Agua y Saneamiento, Caminos Rurales y Electrificación Rural por Extensión de Red en la Mancomunidades de Consejo Intermunicipal CAFEG (municipios de Candelaria, Gualcinse, Piraera, San Andrés, San Francisco y Santa Cruz), departamento de Lempira; Mancomunidad de los municipios del Norte y Occidente de Francisco Morazán MANOFM (municipios de Vila de San Francisco, El Porvenir, Guaimaca, Marale, Orica, San Ignacio, Cantarranas, Valle de Ángeles y Vallecillo) departamento de Francisco Morazán y Asociación de Municipios Fronterizos de Intibucá AMFI (municipios de Camasca, Colomocagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de la Sierra y Santa Lucía) en el departamento de Intibucá.

ix. EJECUCIÓN FINANCIERA

Ejecución presupuestaria al 30 de septiembre 2020

Código	Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO 2020				Disponible	% Ejecución
		Lempiras					
		Aprobado	Decremento Incremento	Vigente	Ejecutado		
47	Préstamo BCIE-1736	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,184,495.22	815,504.78	83.69%
	Total	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,184,495.22	815,504.78	

En fecha 15 de junio de 2020, mediante Oficio No. DGCP-FE-620/2020, la Secretaria de Finanzas emitió un Dictamen Técnico DGIP No. 027-2020, a satisfacción otorgando la ampliación al Proyecto hasta el 30 de septiembre del 2020. Dicha solicitud fue aprobada por parte del BCIE el 10 de julio del 2020, mediante ORHON-0250/2020.

En el marco del cierre definitivo del Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) y con la previa autorización del BCIE, se efectuó traslado de fondos de las cuentas PIR a cuenta del FHS No.11-401-014437-0 según memorándum PIR 256/2020 (F01 424 y F01 468) y memorándum 247/2020, por un total de L 3,149,714.48, como reserva para el último pago de estimaciones de obras cuya finalización va más allá de la fecha de cierre del Proyecto (30 de septiembre de 2020).

1. PLAN GLOBAL DE INVERSION

De los fondos del préstamo BCIE No. 1736 se ha ejecutado un monto de US\$ 15.146 Millones, hasta el 30 de septiembre del 2020, lo que representa el 100.98% de monto total de US\$ 15.00 Millones. Para fines de presentación de la ejecución real del PGI, se incluyen – rebajando la ejecución- las multas aplicadas, de conformidad a la política financiera del BCIE de reinvertir estos valores.

Componentes de Inversión	Asignado	Ejecución Acumulada
A. Apoyo a la Planificación Local Participativa para la Entrega de los Servicios de Infraestructura	509,603	509,603
B. Entrega de los Servicios de Infraestructura	12,444,403	12,591,109
D. Fortalecimiento Local y Desarrollo de Políticas	545,994	545,868
E. Gerencia, Monitoreo y Evaluación	1,500,000	1,499,920
Total	\$ 15,000,000	\$ 15,146,500

2. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Al 30 de septiembre 2020, no se realizaron modificaciones al presupuesto asignado al Proyecto.

3. EJECUCIÓN FISICA

En el **sector de Agua y Saneamiento**, durante el 2020 se finalizaron tres (3) subproyectos de construcción de sistemas de agua potable mediante microcaptación pluvial y saneamiento: Construcción Sistema Integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico Comunidad El Coyolar, Construcción Sistema Integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico Comunidad El Derrumbado y Construcción Sistema de Microcaptación Pluvial Comunidades Guasquin, La Puebla, El Triunfo y San Matías. A junio 2020, se tenía pendiente el pago de la última estimación de los tres subproyectos arriba mencionados, que dependían de la visita a sitio de las obras por parte de la Inspectoría de SEDECOAS/FHIS para la revisión y recepción a conformidad las subsanaciones y reparaciones menores de los trabajos ejecutados. Debido a la emergencia sanitaria nacional a causa del COVID-19, las giras en campo se encontraban suspendidas, reestableciéndose en el mes de julio 2020, extendiendo las actas de recepción definitiva correspondientes y autorizando el pago de las últimas estimaciones de obra, que fueron efectivas en los meses de agosto y septiembre.

En el **sector de Caminos Rurales**, se finalizaron las actividades de construcción del subproyecto que de Pavimentación de Casco Urbano del Municipio de Magdalena, en el departamento de Intibucá, quedando

pendiente la subsanación de obra según las observaciones realizadas por Inspectoría. Se consideró la incorporación de una orden de cambio para el mejoramiento de algunas actividades necesarias para el buen funcionamiento del pavimento:

N	Cód. de Proyecto	Nombre de Proyecto	Ubicación		Porcentaje de Ejecución
			Municipio	Departamento	
1	105600	Pavimentación de Casco Urbano del Municipio de Magdalena	Magdalena	Intibucá	100%

El 15 de junio de 2020, mediante memorándum PIR No. 0187/2020, fue solicitado a la UPEG gestionara ante la Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG) el ajuste de Metas del POA y del Sistema de Gestión por Resultados -SGPR, según los lineamientos generales descritos en la Circular N°CGG-494-2020 del 16 de abril del 2020, con el fin de reprogramar la fecha de entrega del subproyecto Código 105600 Pavimentación del Casco Urbano del Municipio de Magdalena, Departamento de Intibucá, debido que a la emergencia sanitaria nacional no se habían reanudado actividades en sitio a finales de junio 2020. Fue propuesta como fecha de terminación del subproyecto el mes de septiembre 2020, considerándose un tiempo prudente para que el Contratista ejecutara las actividades pendientes. Al 30 de septiembre 2020, el subproyecto se encuentra finalizado, sin embargo, quedan pendientes las subsanaciones y correcciones a la obra a partir de las observaciones realizadas por la Inspectoría.

En el **sector de Electrificación Rural** por extensión de red, a la fecha, no se tienen subproyectos en ejecución, ya que han sido finalizados todos los subproyectos programados a ejecutarse.

4. RESULTADOS DE GESTION (FP02)

Con fondos del Préstamo del BCIE-1736, al 30 de septiembre del año 2020, se ha incrementado el acceso a servicios de infraestructura vial mejorados a 507 personas con la pavimentación con concreto hidráulico de 0.44 km de calles en el Casco Urbano del Municipio de Magdalena, Intibucá. Durante la intervención del proyecto de generaron 15 empleos temporales en la zona.

5. SITUACIÓN DE CONTRATOS Y LICITACIONES

A la fecha, no se encuentran procesos de contratación de obra o consultorías activos ni pendientes de publicación.

6. DESCENTRALIZACIÓN A LAS MANCOMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL PIR

Con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE Préstamo No. 1736, desde el inicio del Proyecto al 30 de junio del 2020, se han transferido las Mancomunidades beneficiarias MANOFM, CAFEG y AMFI un monto de L 147.6 Millones para la ejecución de subproyectos de infraestructura de los sectores Agua & Saneamiento, Electrificación Rural y Caminos Rurales y fortalecimiento institucional.

La UCP/PIR ha dado seguimiento a los fondos transferidos a las Mancomunidades para que sean utilizados única y exclusivamente para los fines autorizados expresamente en los respectivos convenios interinstitucionales FHIS-Mancomunidades y en los términos y condiciones establecidos en el Manual Operativo de FHIS, al tenor de las condiciones convenidas entre el Gobierno de Honduras y el BCIE bajo el Convenio de Préstamo No. 1736.

TRANSFERENCIAS PARA EJECUCIÓN DE SUBPROYECTOS DESCENTRALIZADOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2020*

MANCOMUNIDAD	AGUA Y SANEAMIENTO	ELECTRIFICACION RURAL	CAMINOS RURALES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	TOTAL LEMPIRAS
AMFI	L 15,190,873.37	L 11,761,414.15	L 18,870,853.47	L 461,678.00	L 46,284,818.99
CAFEG	L 19,261,737.39	L 19,238,407.47	L 13,083,063.16	L 707,658.00	L 52,290,866.02
MANOFM	L 19,839,490.05	L 9,378,993.64	L 18,359,222.24	L 1,475,730.00	L 49,053,435.93
Total	L 54,292,100.81	L 40,378,815.26	L 50,313,138.87	L 2,645,066.00	L 147,629,120.94
	37%	27%	34%	1.8%	100.00%

*Nota: valores netos ajustados al 30 de septiembre 2020, incluyen devoluciones en concepto de obra no ejecutada y rescisión de contratos.

7. DESEMBOLSOS DEL PIR

El 21 de noviembre del 2018, se registró el último desembolso por un monto de USD\$ 1, 775,884.55, y que corresponde a la séptima Restitución del Fondo Rotatorio, completando así el 100% del monto del Préstamo.

8. PROBLEMÁTICA FÍSICA Y FINANCIERA

En el marco del cierre definitivo del Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) y con la previa autorización del BCIE, se efectuó traslado de fondos de las cuentas PIR a cuenta del FHIS No.11-401-014437-0 según

memorándum PIR 256/2020 (F01 424 y F01 468) y memorándum 247/2020, por un total de L 3,149,714.48, como reserva para el último pago de estimaciones de obras cuya finalización va más allá de la fecha de cierre del Proyecto (30 de septiembre de 2020). Esta acción de reserva de fondos fue realizada preventivamente, ante la incertidumbre de no recibir las estimaciones de pago en tiempo lo que podría impedir cumplir con la Justificación de Fondos al BCIE y la Auditoria de Cierre del PIR y, siendo el PIR informado que el plazo de cierre no podría ser ampliado.

Por otro lado, en la ejecución física al II trimestre 2020 se tenía pendiente la aprobación de la reprogramación de metas del Sistema de Gestión por Resultados por medio de la cual se solicitó a la Secretaria de Coordinación General de Gobierno ajustar la fecha de finalización del subproyecto de Pavimentación del Casco Urbano de Magdalena de marzo a septiembre, debido a la emergencia sanitaria decretada a nivel nacional por COVID-19, lo que impidió la finalización del subproyecto en la fecha inicialmente programada, sin embargo, esta solicitud se encuentra pendiente de aprobación.

CARTERA KfW Entwicklungsbank



✓ Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V

i. Objetivo General



Consiste en la utilización de centros educativos mejorados, ampliados o nuevos y equipados bajo conceptos pedagógicos que operan de manera sostenible por la comunidad educativa. De esta manera se pretende contribuir a que niños/as y jóvenes de regiones pobres utilicen una oferta de alta calidad educativa, tanto formal como de educación vocacional.

ii. Focalización

Fase IV: El Área de intervención abarcará los departamentos que están siendo intervenidos en las fases anteriores (Zona de Occidente): 1) Copán, 2) Santa Bárbara, 3) Intibucá, 4) Lempira, 5) La Paz, 6) Ocotepeque. 7) Centros a nivel nacional en casos de emergencia (catástrofes naturales). La información de estos centros deberá ser actualizada en el plan maestro y sólo si se determina su precariedad, podrán ser intervenidos previo a No Objeción del KfW. 8) Adicionalmente se extenderá el área de intervención a los departamentos adyacentes a la zona de occidente, delimitando el área de intervención a través de la Carretera Panamericana. Los municipios a ser beneficiados se encuentran al oeste de la misma en los siguientes departamentos: 1) Choluteca, 2) Valle, 3) Francisco Morazán (exceptuando el núcleo urbano de Tegucigalpa), 4) Comayagua y adicionalmente 5) Gracias a Dios.

Fase V: El Área de intervención abarcará los departamentos de: Ocotepeque, Lempira y Copan, en la zona de Occidente. Además, los departamentos al oeste de la carretera CA-5 de los departamentos de Francisco Morazán (exceptuando el Distrito Central), Valle, Choluteca, Comayagua. También seguirá formando parte del Programa el Departamento de Gracias a Dios (siempre y cuando no se alcance un mínimo de infraestructura en este departamento y según las experiencias de la fase IV del PROMINE).

iii. Priorización de los Centros Educativos

Esta es realizada por la Secretaria de Educación apoyados en la herramienta del Plan Maestro de Infraestructura Educativa.

iv. Descripción del Proyecto

Fase IV: El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y en la planificación estratégica para los años 2014 - 2018 de la Secretaría de Educación (SE). El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las tres fases previas PROMINE I, II y III. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

Fase V: El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y el Plan Estratégico del Sector de Educación para los años 2017 - 2030 de la Republica de Honduras. El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las cuatro fases previas PROMINE I, II, III y IV. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

v. Monto del Proyecto:

Fase IV:

Fondos de Donación por un monto de € 15,000,000.00 euros, Contrapartida Nacional para SEDECOAS/FHIS de € 424,000 euros, Contrapartida Nacional para SE de € 218,000 euros, Contrapartida Municipal de € 515,000 euros y Contrapartida Comunitaria de € 514,000 euros.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 03/12/2015

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 17/02/2017

Fecha de Inicio: 02 de Abril 2018 (Se considera la fecha de inicio de la Consultoría)

Fecha de Finalización de convenio: 30/11/2020

Fase V:

Fondos de Donación por un monto de 10, 000,000.00 euros, Contrapartida Nacional para IDECOAS/FHIS de 495,000 euros, Contrapartida Nacional para SE de 250,000 euros, Contrapartida Municipal de 600,000 euros Contrapartida Comunitaria de 600,000 euros.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 06/07/2018

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 21/03/2019

Fecha de Inicio: Inicio tentativo IV trimestre 2020

Fecha de Finalización de convenio: 37 meses a partir del inicio de la consultoría

vi. Avance Financiero PROMINE FASE III y IV

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2016	145.687.475,00	142.916.817,45	98%
2017	107.279.375,00	96.731.967,93	90%
2018	53.035.502,00	50.951.601,81	96%
2019	81.069.633,00	79.762.875,76	98%
2020	135.907.777,00	24.768.632,74	17%
Presupuesto 2020 Fase IV y Fase V			

vii. Avance Físico por Sector PROMINE FASE IV y V

SECTOR	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios Directos 2020
EDUCACION	1	20.908.596,51	22	124
TOTAL	1	20.908.596,51	22	124

viii. Avance Físico por Departamento PROMINE FASE IV y V

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios Directos 2020
COPAN	0	5.163.417,74	0	0
FRANCISCO MORAZAN	0	73.295,32	0	0
GRACIAS A DIOS	0	376.668,00	0	0
INTIBUCÁ	1	6.243.177,79	22	124
LEMPIRA	0	8.510,00	0	0
OCOTEPEQUE	0	9.043.527,66	0	0
TOTAL	1	20.908.596,51	22	124


ix. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2020
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	3.746.584,41
GASTO OPERATIVO DEL PROGRAMA	113.451,82
TOTAL	3.860.036,23

*Viaticos y Combustible

x. AVANCES GENERALES

▪ FASE IV.

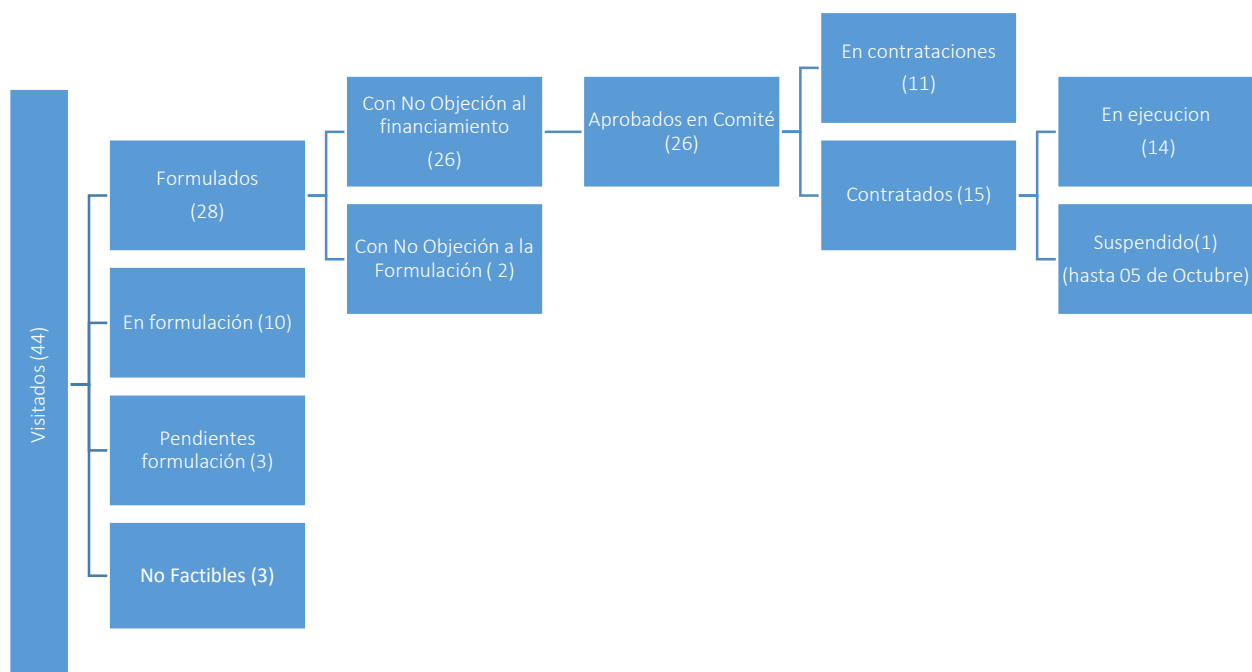

xi. AVANCE FINANCIERO SEGÚN PRESUPUESTO ASIGNADO FASE VI Y FASE V

Año	Planificado al II Trimestre		
	Trimestre	Ejecutado	Eficiencia
2020	35,943,709.00	24,768,632.74	69%

Dada la corrección en los enlaces de convenio a las actividades obras, se ha realizado un reprogramación de los recursos asignados para este año, definiendo la mayoría del monto a ejecutar en el IV trimestre.

Se mantiene el monto reportado en el trimestre anterior dado que por la corrección en los convenios enlazados a las actividades obras y la suspensión de la proyección no se avanzó en la ejecución.

xii. LOGROS III TRIMESTRE

- ✓ Se han avanzado en los procesos de contratación de proyectos esto con la finalidad de avanzar en la ejecución y poder solicitar la ampliación de tiempo.

xiii. RETOS PROXIMOS

Entre los principales retos que enfrenta el PROMINE-KfW:

- Formulación y aprobación del resto de los proyectos para comprometer el convenio. (3 proyectos en formulación)
- Contratación de los componentes aprobados por un monto de 152,548,236.43
- Contratación de Inspectoría Social y de Infraestructura para el departamento de Gracias Dios
- Contratación de Auditoria
- Iniciar los proyectos que están en contrataciones
- Modificación presupuestaria.
- Solicitud de Ampliación de Vigencia del Programa
- Contratación de la Asistencia Técnica para el PROMINE V

✓ Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)



i. Objetivo General

Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).

ii. Focalización

A través de un proceso de concurso con criterios de selección predefinidos en el acuerdo separado y evaluación de propuestas técnicas alineadas a los componentes del programa fueron seleccionados 3 municipios en donde se está realizando la intervención del CONVIVIR a través de obras de infraestructura y medidas de alcance social para beneficio enfocado en la juventud. Así mismo se definieron los barrios, colonias o comunidades urbanas en donde se focaliza las acciones y en donde ya se ha realizado una labor de socialización de los alcances, compromisos y beneficios para la población. Los municipios seleccionados son:

- Municipio de Gracias, departamento de Lempira
- Municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua
- Municipio de La Lima, departamento de Cortes.

iii. Descripción del Proyecto

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

iv. Monto del Proyecto:

Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son Euros 10,000,000.00. El tipo de financiamiento es un contrato de Préstamo.

Fecha de Firma de convenio: 08/11/2012

Fecha de Finalización de convenio: 31/12/2020

v. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2014	21.289.204,00	18.316.427,97	86%
2015	38.873.159,00	34.024.198,74	88%
2016	88.796.503,00	83.460.868,42	94%
2017	51.288.495,00	48.071.886,28	94%
2018	65.657.852,00	43.535.738,65	66%
2019	33.661.644,00	30.786.651,68	91%
2020	21.673.156,00	6.660.962,30	31%

vi. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios Directos 2020
EMPREDIMIENTO Y VALORES	0	256.900,00	0	0
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	1	4.384.245,32	56	6.210
TOTAL	1	4.641.145,32	56	6.210

vii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios directos 2020
COMAYAGUA	1	1.997.746,83	31	3.500
CORTES	0	810.004,52	10	1.500
LEMPIRA	0	1.833.393,96	15	1.210
TOTAL	1	4.641.145,32	56	6.210

viii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2020
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	2.019.816,98
TOTAL	2.019.816,98

ix. INFORMACION FINANCIERA

En el presente cuadro se observa la ejecución financiera que ha tenido el Programa CONVIVIR desde su creación a la fecha, en el Tercer Trimestre del año 2020 lo ejecutado se distribuye de la siguiente manera:

Ejecución financiera del 3er trimestre

Componente	Presupuesto Ejecutado 2014	Presupuesto Ejecutado 2015	Presupuesto Ejecutado 2016	Presupuesto Ejecutado 2017	Presupuesto Ejecutado 2018	Presupuesto Ejecutado 2019	Presupuesto Ejecutado II Trimestre 2020
01-Gasto Operativo	L. 536,459.53	L. 4011,908.76	L. 8,186,328.38	L. 7,484,899.00	L. 6,977,244.45	L. 0.00	L. 0.00
06- Construcción	L. 4134,589.44	L. 14781,805.43	L. 53,726,357.68	L. 21,533,793.15	L. 9,885,956.39	L. 19,765,281.37	L. 3,036,241.77
05- Fortalecimiento de Habilidades de Jóvenes	L. 0.00	L. 2011,078.63	L. 8,078,022.83	L. 3,972,943.74	L. 6,175,521.00	L. 443,284.80	L. 256,900.00
04- Mejoramiento Capacidades de Actores Relevantes	L. 0.00	L. 4114,456.01	L. 2,137,666.23	L. 2,906,038.90	L. 3,210,648.09	L. 4,030,730.00	L. 0.00
03-Materiales y Equipos	L. 0.00	L. 820,323.53	L. 3,142,655.66	L. 3,383,553.95	L. 5,733,027.16	L. 1,349,051.65	L. 1,348,003.55
02-Consultoría internacional	L. 13645,379.00	L. 8284,626.38	L. 8,189,837.64	L. 8,790,657.54	L. 11,553,341.56	L. 5,198,303.86	L. 2,019,816.98
07- Gasto Operativo Fase II							L. 0.00
08- Consultoría internacional fase II							L. 0.00
Total	L. 18,316,427.97	L. 34,024,198.74	L. 83,460,868.42	L. 48,071,886.28	L. 43,535,738.65	L. 30,786,651.66	L. 6,660,962.30

Al cierre del período del periodo de Julio a Septiembre del año 2020 la ejecución financiera del programa alcanza a un **30.7%** Entre las razones más importantes para este porcentaje (%) de ejecución, es debido a que todo lo programado para el tercer trimestre no culminó al final del periodo debido a la situación actual de la Pandemia del COVID-19, por lo que los procesos y proyectos se suspendieron su ejecución y se reactivaron en el mes de julio.

Los procesos de resolución de contrato de los proyectos “Casa de la Cultura” y “mediana Sitraterco” aún se encuentran en proceso para la recuperación de los fondos a la cuenta del programa CONVIVIR, a finales del mes de diciembre del año 2019 se recibió la noticia y el F01 del depósito y a finales de febrero del año en curso de una parte de estos fondos a las cuentas del SEDECOAS/FHIS, restando un monto de L. 8,139,334.38.

Actualmente está en proceso una incorporación de presupuesto en la SEFIN, fondos que son necesarios para la culminación del programa.

x. COMPONENTE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA- AVANCE FISICO

En el componente de Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura el Programa CONVIVIR, la gestión del SEDECOAS/FHIS está orientada a lograr la buena ejecución de cada obra priorizada. Para ello, durante este período se ha continuado con el trabajo conjunto con la Dirección de Control y Seguimiento y el apoyo de la Asistencia Técnica. Se ha logrado dar término de un número de 30 obras de infraestructura.

La institución es también responsable de la tramitación de documentación para lograr la aprobación de órdenes de cambio, y desembolsos de fondos para construcción.

Actualmente se tiene una cartera de **37 proyectos** de infraestructura aprobados para ejecutar con el monto del convenio. De dichos proyectos ya se terminaron 30 obras, 7 proyectos en ejecución y 2 proyectos en proceso de resolución de contrato debido a la falta de voluntad política del municipio y factibilidad social de las obras estas se encuentran ubicados en La Lima, Cortes.

Se continúa trabajando en el proceso de equipamiento de los proyectos priorizando los que están terminados y los que están próximos a inaugurar.

El SEDECOAS/FHIS ha actuado por medio de su equipo de Control y Seguimiento, inspectores sociales y técnicos, y apoyo del equipo de Asistencia Técnica dando seguimiento a la ejecución de los proyectos en construcción, como también trabajando en el seguimiento a las gestiones administrativas relacionadas con desembolsos, ordenes de cambio ingresados en el ciclo de proyectos del SEDECOAS/FHIS.

A continuación se anexan los tres cuadros que corresponden a la ejecución física de cada una de las obras de infraestructura

No. 1 Obras priorizadas en el municipio de Siguatepeque, Comayagua

No.	Código FHIS	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado	ESTADO	
					Avance Físico	Avance Financiero
1	105175	Construcción Cancha Multiuso Parque Bosque Calanterique	Suyapita	L. 3,104,790.79	CONCLUIDO	
2	106002	Construcción Salón Multiusos Y Cancha Deportiva Noé Cruz Villeda	Col. Noé Cruz Villeda	L. 3,012,043.70	CONCLUIDO	
3	106347	Construcción Centro De Calidad De Vida	La Crucita	L. 2,956,701.47	CONCLUIDO	
4	106181	Construcción Centro De Calidad De Vida Bo. El Carmen	Bol El Carmen	L. 3,767,167.59	CONCLUIDO	
5	106094	Remodelación Centro De Capacitación Digital	Bo. El Centro	L. 410,327.27	CONCLUIDO	
6	105928	Construcción De Obras Complementarias Campo De Futbol Col. Mata	Col. Mata	L. 2,721,312.41	CONCLUIDO	
7	106308	Construcción Centro De Calidad De Vida	Bo. San Juan	L. 3,598,956.85	CONCLUIDO	

8	107303	Construcción Oficina Municipal De La Juventud	Barrio El Centro	L. 3,638,941.50	CONCLUIDO	
9	107324	Remodelación Centro De Aprender Para Emprender - Infop	Suyapita	L. 986,493.87	CONCLUIDO	
10	107546	Construcción Obras Complementarias Plaza Del Bosque Calanterique	Suyapita	L. 1,805,135.54	CONCLUIDO	
11	107317	Construcción Casa De La Cultura	Bol El Carmen	L. 11,012,069.37	20.28%	18.50%
12	107547	Remodelación De Biblioteca Municipal, Siguatepeque	Bo. El Centro	L. 461,153.55	CONCLUIDO	
13	107483	Construcción Plaza Turística de Artesanos EL Porvenir	Aldea El Porvenir	L. 4,760,463.87	40%	15%
TOTAL INVERSION				L. 42,235,557.78		

No. 2 Obras priorizadas en el municipio de Gracias, Lempira

No.	Código FHIS	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado	ESTADO	
					Avance Físico	Avance Financiero
1	105174	Construcción Plaza Recreativa Colonia Borjas	Col. Borjas	L. 3,225,774.53	CONCLUIDO	
2	106006	Construcción Plaza De Recreación Para La Convivencia Pinalito Y Bella Vista	Pinalito	L. 2,147,440.69	CONCLUIDO	
3	106145	Remodelación Centro De Capacitación Digital	La Merced	L. 56,983.16	CONCLUIDO	
4	106090	Ampliación Plaza Boulevard Marco Tulio Rodriguez	El Progreso	L. 2,454,714.29	CONCLUIDO	
5	106062	Construcción Casa De La Cultura	Mercedes	L. 8,169,443.80	CONCLUIDO	
6	106007	Construcción Escuela De Música Mejicapa	Bo. Mejicapa	L. 2,590,324.49	CONCLUIDO	
7	105994	Reposición Polideportivo Villas Del Rosario	Villas del Rosario	L. 7,868,528.04	CONCLUIDO	
8	106003	Construcción Parque Recreativo Col. Moreno Y Hércules	Col. Moreno	L. 5,459,590.31	CONCLUIDO	
9	106004	Remodelación Plaza San Sebastián	Gracias	L. 4,029,707.82	CONCLUIDO	
10	106136	Construcción Salón Multiusos Bella Vista Y Pinalito	Col. Bella Vista	L. 2,979,546.19	CONCLUIDO	
11	105992	Construcción Campo De Pelota Bella Vista Y Pinalito	Col. Bella Vista	L. 3,197,439.41	CONCLUIDO	
12	105713	Ampliación Casa De La Juventud	Villas del Rosario	L. 6,619,560.57	CONCLUIDO	
13	106328	Construcción Centro De Calidad De Vida Villami	Villami	L. 2,447,597.92	CONCLUIDO	
14	107489	Centro De Aprender Para Emprender, Inst. Ramón Rosa	Barrio Mejicapa	L. 4,776,414.85	43%	46%
TOTAL INVERSION				L. 56,023,066.07		

No. 3 Obras priorizadas en el municipio de La Lima, Cortés

No.	Código FHIS	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado	ESTADO	
					Avance Físico	Avance Financiero
1	105173	Construcción Centro Juvenil De Desarrollo Integral	Centro Sula	L. 3,262,220.20	CONCLUIDO	
2	106182	Construcción Centro De Calidad De Vida Col. Nuevo San Juan	Col. Nuevo San Juan	L. 2,961,528.33	100%	100%
3	106184	Construcción Centro De Calidad De Vida	Col Álvarez Martínez	L. 3,068,158.19	98%	100%
4	105893	Remodelación Casa De La Cultura	Col. Sitraterco	L. 9,605,935.76	En proceso de resolución de contrato	
5	105895	Remodelación Camino De Los Gatos Paseo Del Puente Y Áreas Aledañas	Bo. Centro Sur	L. 2,831,897.23	95%	99%
6	106093	Remodelación Centro De Capacitación Digital	Bo. Centro Norte	L. 225,080.18	CONCLUIDO	
7	105738	Ampliación Plaza Juventud Barrio Centro Sur	Bo. Centro Sur	L. 7,036,616.12	CONCLUIDO	
8	105897	Remodelación Mediana Sitraterco	Col Sitraterco	L. 8,518,858.49	En proceso de resolución de contrato	
9	105900	Construcción Cancha Multiusos Colonia El Maestro	El Maestro	L. 2,687,523.23	CONCLUIDO	
10	105902	Remodelación Parque De Los Pinos	Col. Los Pinos	L. 1,775,191.17	CONCLUIDO	
11	107488	Remodelación Biblioteca Municipal	Bo. Centro Sur	L. 1,500,285.33	CONCLUIDO	
12	107610	Remodelación Centro de Aprender para Emprender, Instituto Técnico Vocacional Valle de Sula	Col. Oro Verde	L. 4,168,239.85	20%	15%
TOTAL INVERSION				L. 29,516,739.83		

Nota: De los 39 proyectos actualmente aprobados en la cartera del Programa CONVIVIR, 2 proyectos en el Municipio de La Lima, Cortes se encuentran en el proceso para rescindirlos debido a que no hay factibilidad social ni apoyo por parte del municipio para continuar con la Ejecución de los mismos, dichos proyectos son: Mediana Sitraterco y Casa de la Cultura.

xi. AVANCE DEL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES Y LABORALES DE JÓVENES Y COMPONENTE MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES RELEVANTES

En el Tercer Trimestre del año 2020, hemos brindado asesoramiento y asistencia técnica de a las 20 Organizaciones de Mantenimiento y Gestión (ORMAG), de cada uno de los proyectos de infraestructura que fueron constituidos bajo la Metodología PEC. Cabe mencionar que el aporte de la Fundación para el Desarrollo de Honduras (FIPADEH) ha sido invaluable, fundamental y comprometida, siendo la contraparte de SEDECOAS que ha fortalecido y diseñado los procesos de participación comunitaria los cuales tienen muchos desafíos tanto en su mantenimiento de infraestructura como en la programación social siendo los anteriores

componentes importantes para la sostenibilidad de cada proyectos Convivir, a continuación se detallan las principales actividades:

#	ACTIVIDADES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS	DIFICULTADES
<p>CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL IDECOAS/FHIS Y FIPADEH PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES CON ACTORES RELEVANTES:</p> <p>Porcentaje de ejecución Adendúm No. 06: 90 %</p> <p>Situación Actual: En ejecución Adendúm No. 05: Modelo de Gestión y Mantenimiento ORMAG</p> <p>Adendúm de Tiempo: 30 de noviembre del 2020 (Pendiente)</p>				
1	Legalización y personería jurídica de la ORMAG Municipal.	El asesor legal asignado por FIPADEH ha dado continuidad y seguimiento al proceso de constitución legal de las ORMAG Municipal, con el apoyo del enlace legal del Programa.	Tres (03) documentos de personería de la ORMAG Municipal (Una por municipio)	
2	Revisión final de los planes de Revitalización Mantenimiento y Gestión de los 20 proyectos conformados con ORMAG Barrial	Se ha brindado un último asesoramiento para cada uno de los proyectos conjuntamente con el equipo de FIPADEH, se han desarrollado jornadas de trabajo intensiva proyecto por proyecto y en las horas que tiene disponibles los miembros de las comunidad	Revisados con los miembros de las ORMAG los planes de revitalización, gestión y mantenimiento de 15 proyectos.	Es el último asesoramiento realizado de parte del Programa conjuntamente con el equipo de FIPADEH, ya que el entendimiento del manejo de los 3 componentes (Revitalización, Gestión y Mantenimiento) sigue siendo un desafío para los miembros de los ORMAG.
3	Elaboración del plan maestro como una herramientas institucional que oriente la lógica de intervención del modelo de mantenimiento y Gestión (ORMAG)	Se realizaron reuniones conjuntamente con el equipo de FIPADEH para analizar, redefinir y estructurar los momentos metodológicos de la intervención comunitaria orienta el trabajo con las organización de mantenimiento y gestión (ORMAG), definiendo la intervención por medio de fases que ayudan	Un documento de Plan maestro para el desarrollo del Modelos de Mantenimiento y Gestión (ORMAG).	El tiempo que ha conllevado la definición del documento ha sido como parte del compromiso con la labor institucional, por tal motivo se redoblaron las reuniones de elaboración del documento entre los equipos de FIPADEH y de Convivir

#	ACTIVIDADES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS	DIFICULTADES
<p>CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL IDECOAS/FHIS Y EL CENET PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD JUVENIL</p> <p>Porcentaje de ejecución: 70% (Tentativo)</p> <p>Adendum de Tiempo (30 de octubre)</p>				
1	Se han desarrollado 4 Diplomados para la formación de facilitadores de inserción laboral juvenil	El Cenet trabajo en una plataforma virtual para desarrollar los 4 diplomados en los tres municipios, la plataforma ha permitido el uso de recursos pedagógicos eficientes para el adecuado aprendizaje de los participantes, de igual manera la participación ha requerido un nivel de compromiso	Se han transferido conocimiento y habilidades para el manejo del proceso de inserción laboral juvenil a técnicos municipales, técnicos de ONG, oficiales de juventud docentes del Instituto Valle de sula alcanzando el número de participantes: Siguatepeque: 14 Gracias 15 La Lima 14 Docentes de Valle de sula : 10 Se ha tenido la participación aproximada de 53 personas.	Los fondos destinados para el desarrollo del Diplomado no ha sido posible implementarlos ya que el CENET no encontró la vía administrativa para justificar la compra de internet de los participantes, en tal sentido el Cenet tuvo que utilizar fondos propios para terminar de ejecutar las actividades pendientes, se realizara un reintegro oficial de los fondos no ejecutados
2.	Elaboración del Reglamento para el uso de los Kioscos Convivir	El equipo de Cenet conjuntamente con el equipo de Convivir, elaboraron el documentos de reglamento que orienta el uso de los kioscos de cada uno de los proyectos, el cual establece que la prioridad de uso será para los jóvenes emprendedores del Programa o de las comunidades, se va a elaborar un contrato de alquiler donde el arrendamiento será como cantidad mínima de L.200.00 para los jóvenes que recién estén emprendiendo.	Un documento de Reglamento para el uso de los kioscos Convivir.	
<p>CONVENIO DE COOPERACION ENTRE E IDECOAS/FHIS Y LA FUNDACION ANED PARA E DESAROLO DE LA SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS DEL PROGRAMA Y EL LINEA DE BASE FASE CUATRO:</p> <p>Adendum de Tiempo: Pendiente al 30 de octubre</p> <p>Porcentaje de ejecución 100%.</p>				

#	ACTIVIDADES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS	DIFICULTADES
3	Finalizados Documentos de Línea Base, sistematización de Experiencia del Programa e Historias de Experiencia de Jóvenes finalizado	El equipo de ANED realizo las respectivas cotizaciones para las impresiones finales de los documentos de LB. Historias de éxito y Sistematización del Programa	Se imprimieron los documentos oficiales: 70 Historias de Éxito 45 sistematizaciones- 45 Líneas base 45 Análisis de marco lógico.	Pendiente cierre de Liquidación del Convenio
<p>Contrato de un consultor especialista en el are de café</p> <p>Adendum al 30 de Noviembre.</p> <p>Porcentaje de ejecución: 70%</p> <p>Adendum 30 de noviembre (Pendiente)</p>				
4	Seguimiento de la cafetería Café	Se realizaron reuniones con el equipo técnico municipal para la revisión de Plan de negocios de la Cafetería Café Tencali, con el propósito de incorporar cambios y observaciones al documento. Se han trabajado los documentos finales del Plan de negocios, programación de funcionamiento,	<ul style="list-style-type: none"> El proceso de compra de equipo especializado en café ha sido ingresado de manera oficial. Documentos borradores del plan de negocios y de la programación de funcionamiento de la cafetería Tencali. 	La dificultad continúa con la compra del equipamiento especializado para el área de café.
<p>Contrato de un consultor especialista en gestión cultural:</p> <p>Adendum de tiempo: 31 de Octubre (Pendiente)</p> <p>Porcentaje de avances: 40%</p>				
5	<ul style="list-style-type: none"> Se culminó el desarrollo de los talleres virtuales en gestión cultural con el municipio de gracias y el municipio de Siguatepeque, se dio inicio con la elaboración de la propuesta de funcionamiento de la casa de la cultura de ambos municipios 	Se desarrollaron los talleres vía virtual con cada uno de los municipios, con el propósito de construir de manera conjunta con la las propuesta de funcionamiento de cada municipio, la incorporación de los participante fue aceptable y la calidad de participación de ambos municipios ha sido acertada con la realidad.	<p>Se han capacitado 27 personas en el modelo de gestión cultural en ambos municipios.</p> <p>Dos documentos borradores de propuesta de gestión cultural.</p>	Ha sido un desafío incorporar la participación de los miembros de la comunidad, no todo tiene acceso a la tecnología de internet.

xii. AVANCE DE PROCESOS

El país actualmente se encuentre en cuarentena debido a la pandemia desde el 16 de marzo del año en curso, por lo que se suspendieron todas las obras que se encontraban en ejecución, se ha disminuido el trabajo presencial y aumentado el teletrabajo (trabajo desde casa), sin embargo para el mes de septiembre se reactivaron las actividades laborales en las nuevas instalaciones dentro del Centro Cívico Gubernamental, por lo que el equipo se ha comprometido y avanzado en actividades para la reactivación de los procesos y proyectos en campo, como ser las siguientes:

1. Se logró la reactivación de los proyectos CONVIVIR, con las medidas de bioseguridad correspondientes, en el mes de julio logrando levantar la ejecución física y financiera de los proyectos.
2. Se logró activar los procesos de compra de los proyectos, los cuales para el mes de septiembre se realizó la publicación de los mismos en la plataforma de HONDUCOMPRAS 2.
3. A pesar de la situación, se ha logrado avanzar con los procesos sociales de forma virtual, con el seguimiento y monitoreo con el equipo de SEDECOAS y las diferentes organizaciones con las cuales se tiene convenios u contratos, según lo que se puede observar en el cuadro anterior del detalle de avances.
4. Priorización de pagos, de la operatividad del programa, pago de desembolsos proyectos entre otros.
5. Seguimiento de los avances financieros, como ser elaboración de modificaciones presupuestarias, solicitudes de cuota y todo lo referente con este aspecto.
6. Reuniones de seguimiento de forma virtual con el equipo tanto de SEDECOAS, municipalidades, KfW, SEFIN, entre otros.
7. La Coordinación del programa CONVIVIR, en conjunto con la inspectoría de la Dirección de Control y Seguimiento a realizado giras de trabajo en los municipio de Siguatepeque, Gracias y La Lima, para el monitoreo y seguimiento de los procesos y obras de infraestructura, y poder lograr las metas establecidas.

CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)



✓ Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)

A. Objetivo General

El propósito de esta Actividad es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

B. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en las cinco municipalidades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Tela y La Ceiba. Las comunidades específicas de intervención serán identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

C. Descripción del Proyecto

Esta Actividad ayudará al GdeH (representado a través de FHIS) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otras partes interesadas. La Actividad incluye dos resultados complementarios: Resultado 1: Mejora de la infraestructura comunitaria, las actividades responderán a las prioridades de infraestructura comunitaria para abordar la seguridad ciudadana. Resultado 2: Aumento de la cohesión comunitaria, considera que la forma en que las intervenciones de infraestructura son concebidas, diseñadas y ejecutadas pueden desempeñar un papel directo en el aumento de la cohesión social y comunitaria y promover un marco holístico de prevención de la violencia. Los proyectos bajo la Actividad incluirán instalaciones educativas, centros de salud, alumbrado público, espacios comunitarios más seguros, centros de alcance y comunitarios, centros vocacionales, jardines comunitarios, parques, espacios

recreativos, paradas de buses, accesos peatonales, mejoras al alumbrado de calles, señalización, instalaciones para el sector seguridad y justicia, así como otros proyectos de infraestructura de pequeña escala que se acuerde entre las Partes.

D. Monto del Convenio

Presupuesto total estimado: \$14,637, 541.74, de los cuales, fondos de donación de USAID: \$11, 710,033.39; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$ 2, 927,508.35 (efectivo: \$ 2,127,508.35 y especies: \$ 800,000.00).

i. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	23.226.555,00	21.906.553,68	94%
2019	60.781.669,00	60.781.669,00	100%
2020	145.322.291,00	46.273.981,48	32%

ii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios Directos 2020
INFRAESTRUCTURA VIAL	1	5.679.563,48	26	8.936
PREVENCION SITUACIONAL/CONVIVENCIA	2	17.184.619,13	156	70.672
EDUCACION	3	13.846.599,48	111	8.769
TOTAL	6	36.710.782,09	293	88.377

iii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios directos 2020
ATLANTIDA	5	20.909.690,00	192	70.185
CORTES	0	6.886.685,32	60	12.682
FRANCISCO MORAZAN	1	8.914.406,77	41	5.510
TOTAL	6	36.710.782,09	293	88.377

iv. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2020
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	9.375.493,28
GASTO OPERATIVO DEL PROGRAMA	187.706,11
TOTAL	9.563.199,39

E. Principales Logros (julio-septiembre 2020)

COMPONENTE TÉCNICO

A. PROYECTOS FINALIZADOS

A la fecha se reportan 3 proyectos finalizados en el último trimestre del 2020, sumando un total de 17 proyectos del plan de trabajo.

No.	UBICACIÓN			Nombre del Proyecto	Monto	Estatus actual de Proyectos
	Departamento	Municipio	Comunidad			
1	Atlántida	La Ceiba	Col. Las Mercedes	Construcción Kinder Mirian Lobo	L. 2,999,675.92	F
2	Atlántida	La Ceiba	Col. Las Mercedes	Ampliación y Mejoras CEB Marco Antonio Ponce	L. 4,826,051.18	F
3	Atlántida	La Ceiba	Col. Las Mercedes	Ampliación Centro de Alcance	L. 1,644,821.01	F
4	Atlántida	La Ceiba	Sector Bonitillo	Construcción Posta Policial Bonitillo	L. 4,750,000.00	F
5	Atlántida	La Ceiba	Sector Bonitillo	Reparación CEB Miguel Paz Barahona	L. 137,305.22	F
6	Atlántida	Tela	Col. San Alejo	Reparación Instituto Triunfo de la Cruz Fase I	L. 974,243.14	F
7	Cortés	Choloma	Col. La Granja 1 y 2	Pavimentación Calle Principal hacia los Juzgados (Ruta Segura)	L. 2,892,602.76	F
8	Cortés	Choloma	Sector López Arellano	Pavimentación Calle Principal Col. Lopez Arellano (Ruta Segura)	L. 3,054,996.99	F
9	Cortés	San Pedro Sula	Col. Que Masjo, S. Rivera	Obras Complementarias CEB José Antonio Peraza	L. 2,572,000.59	F
10	Cortés	San Pedro Sula	Col. Central, S. Rivera Hdez	Reparación Escuela Carlos Rivera López	L. 2,676,001.97	F
11	Francisco Morazán	MDC	Barrio La Moncada	Reparación de Casa Alianza Centro	L. 4,271,040.32	F
12	Francisco Morazán	MDC	Col. Estados Unidos	Mejoras Centro de Alcance (CDA) Estados Unidos	L. 240,000.00	F
13	Francisco Morazán	MDC	Col. Las Ayestas	Mejoras al Centro de Alcance (CDA) Las Ayestas	L. 1,193,312.20	F
14	Francisco Morazán	MDC	Col. Las Torres	Reparación Instituto Reynaldo Narváez Rosales	L. 2,922,825.21	F
15	Francisco Morazán	MDC	Col. Nueva Suyapa	Construcción Ruta Segura a Centro de Alcance	L. 3,684,432.26	F
16	Cortés	San Pedro Sula	Sector Satellite	UMEP-7 Reparación y Ampliación CDA Arenales	L. 960,000.00	F
17	Cortés	San Pedro Sula	Predios del Hospital Mario Catarino Rivas	Acondicionamiento y Mejoras al laboratorio de Virología de SPS	L. 2,242,000.00	F

B. PROYECTOS EN EJECUCIÓN

A la fecha se están ejecutando 17 proyectos, de los cuales 2 son orientados a fortalecer el sistema de salud y el resto en educación y la seguridad ciudadana a través de la recuperación de espacios y apoyo a la infraestructura de los operadores de justicia del país.

No.	UBICACIÓN			Nombre del Proyecto	Monto	Estatus actual de Proyectos
	Departamento	Municipio	Comunidad			
1	Atlántida	La Ceiba	Barrio La Isla	Reparación y obras complementarias Escuela Ramón Montoya	L. 5,605,150.25	E
2	Atlántida	La Ceiba	Col. San Judas	Reparación CEB Claudio Barrera	L. 5,473,876.39	E
3	Atlántida	La Ceiba	Corozal	Construcción de Centro Integral Corozal	L. 3,300,000.00	E
4	Atlántida	La Ceiba	Corozal	Construcción de Centro de Alcance El Corozal	L. 2,022,031.76	E
5	Atlántida	La Ceiba	Col. Sutrasco	Reparación CEIN y Ampliación MAIE	L. 3,439,700.00	E
6	Atlántida	La Ceiba	La Ceiba	Ampliación Espacio Físico Municipal	L. 1,920,000.00	E
7	Atlántida	Tela	Col. San Alejo	Reparación Instituto Triunfo de la Cruz Fase II	L. 3,895,772.66	E
8	Cortés	Choloma	Col. Japón	Construcción Techo a Cancha Multiusos	L. 1,200,000.00	E
9	Cortés	San Pedro Sula	Sector Rivera Hdez.	Ampliación CEB Dr. Alfonso Lacayo	L. 6,000,000.00	E
10	Cortés	San Pedro Sula	Colonia Calpules	Escuela Alex E. Alanis Lagos-4	L. 480,000.00	E
11	Atlántida	Tela	Tornabe	CEB Marco Aurelio Soto-1	L. 480,000.00	E
12	Atlántida	Tela	Colonia San Jose	CEB Antonio Jose Coello-2	L. 480,000.00	E
13	Francisco Morazán	MDC	Colonia Izaguirre	UMEP-1 Iluminación Calle Principal Colonia Izaguirre	L. 278,302.51	E
14	Francisco Morazán	MDC	Colonia Villa Nueva	UMEP-4 Reparación Sede del Patronato Col. Villa Nueva	L. 960,000.00	E
15	Atlántida	La Ceiba	Barrio La Isla	UDEP La Ceiba Construcción Centro de Alcance Barrio La Isla	L. 960,000.00	E
16	Atlántida	Ceiba	Predios del Hospital Regional	Construcción de Clínicas y Áreas de descanso en Hospital Regional Atlántida	L. 4,304,936.69	E
17	Atlántida	Ceiba	Región Departamental	Construcción Laboratorio Regional Atlántida de Virología	L. 4,241,803.88	E

C. COMPONENTE SOCIAL

Se está realizando capacitaciones continuas a los comités y personal de mano de obra en temas de Bioseguridad, también se ha fortalecido a la comunidad en temas de Género, cumpliendo los indicadores del Plan de monitoreo y Plan de Género del programa.

PROYECTOS DE EMERGENCIA

I. PROYECTOS				
PROYECTOS DE EMERGENCIA COVID-19				
PROYECTOS				
No.	Localización			Tipo de Proyecto
	Departamento	Municipio	Comunidad	
1.01	Atlántida	La Ceiba	La Ceiba	CONSTRUCCION DE CLINICAS Y AREA DE DESCANSO EN HOSPITAL REGIONAL DE ATLANTIDA
1.02	Atlántida	La Ceiba	La Ceiba	LABORATORIO DE VIROLOGIA LA CEIBA
1.03	Cortes	San Pedro Sula	San Pedro Sula	MEJORAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE VIROLOGIA

Estos proyectos se realizaron mediante licitación y están siendo ejecutados por contratista en un plazo de ejecución máxima de 60 días calendario.

i. Problemática en la ejecución del III trimestre

Por el estado de emergencia a nivel nacional emitido mediante Decreto, se suspendió la ejecución de proyectos, lo que conllevó a una reprogramación de las actividades a partir del 01 de septiembre.

Uno de los problemas es el valor presupuestario asignado, ya que actualmente aparece el mismo monto que a inicio de año, para lograr los nuevos objetivos planificados, se ha solicitado la disminución del monto por congelamiento para fondos externos y para fondos nacionales, sin embargo a la fecha no ha sido posible su modificación, y en consecuencia porcentajes de ejecución saldrán bajos para el programa.

Acciones realizadas por la DIM:

La Dirección DIM envió solicitud de disminución de cuota a SEFIN por la reprogramación de los proyectos mediante oficio y se está a la espera de la aprobación de la solicitud.

Así mismo se incorporaron 3 nuevos proyectos para apoyar la pandemia, de los cuales uno ha finalizado y 2 están en ejecución y programados para finalizar este año 2020.

✓ **Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)**

ii. Antecedente

Las pobres condiciones sociales y económicas son especialmente pronunciadas en el occidente de Honduras, extrema pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático, bajos niveles educativos, migración, falta de acceso a los servicios básicos y otros retos socioeconómicos son endémicos. La provisión de servicios básicos de educación y nutrición son escasos en la zona de occidente y es difícil el acceso a los ya existentes, así mismo la gestión de servicios de educación, nutrición y agua y saneamiento son deficientes por lo que los ciudadanos cuentan además con pocos espacios de participación para mejorar sus vidas a nivel de hogar y sus vidas productivas, lo que genera una gran brecha de pobreza.

En este sentido se busca a través de proyectos de infraestructura de pequeña escala, la generación de accesos para la comunidad a espacios de participación que sirvan como plataforma para impulsar el desarrollo sostenible de la región, logrando satisfacer necesidades no satisfechas de algunos de los servicios básicos para generar un efecto multiplicador en la zona occidental del país.

Actualmente, la **AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID)** en apoyo al Gobierno de Honduras, ha asignado fondos de donación para la ejecución de proyectos de infraestructura a través de la **SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO, FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (SEDECOAS/FHIS)**, que vengán a mejorar las condiciones en las comunidades seleccionadas en el occidente de Honduras.

En base a lo anterior, surge la Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras, mediante la cual se ha considerado proveer esfuerzos de infraestructura a pequeña escala para mejorar la entrega de servicios a la población, mejorando condiciones de pobreza, vulnerabilidad al cambio climático, bajos niveles educativos e inseguridad alimentaria debido a la falta de acceso a servicios básicos. A su vez con esto se pretende crear una plataforma de participación ciudadana para cimentar las bases de una estructura comunitaria más efectiva, jugando un rol importante en la mejora de la entrega de servicios locales en el Occidente de Honduras. - El área de intervención será enfocada en las zonas de mayor pobreza, específicamente está orientada a seis departamentos del Occidente de Honduras.

Se ha planteado como meta beneficiar comunidades ubicadas en los seis departamentos de la zona de occidente de Honduras, su mayoría de la zona rural, habitantes en comunidades que presentan condiciones de pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático, bajos niveles educativos, migración y falta de acceso a servicios público.

La administración y ejecución de la Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH), financiado con fondos USAID, estará a cargo del SEDECOAS/FHIS, a través de la Dirección de Infraestructura Mayor (DIM).

iii. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en los departamentos de Ocotepeque, la Paz, Copan, Intibucá, Santa Bárbara y Lempira y zonas occidentales específicas de intervención identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

iv. Monto del Convenio

El monto total de la Actividad es de \$3,750,000.00 (USAID \$ 3,000,000.00, Gobierno de Honduras \$ 750,000.00).

v. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2019	6.190.650,00	5.981.569,54	97%
2020	65.583.096,00	9.146.208,31	14%

vi. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios Directos 2020
EDUCACION	0	4.738.591,66	55	459
TOTAL	0	4.738.591,66	55	459

vii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios directos 2020
OCOTEPEQUE	0	1.655.120,75	10	144
INTIBUCÁ	0	1.517.719,65	20	239
LA PAZ	0	1.565.751,26	25	76
TOTAL	0	4.738.591,66	55	459

viii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2020
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	3.848.064,93
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO	559.551,72
TOTAL	4.407.616,65

ix. Principales Logros (julio-septiembre 2020)

A. PROYECTOS FINALIZADOS

A la fecha no se reportan proyectos finalizados en vista que iniciaron en el último trimestre del 2020.

B. PROYECTOS A INICIAR

A continuación, se presentan los proyectos en proceso previo a ejecución:

No.	Localización			Tipo de Proyecto	Metodología de Construcción *	Total USAID (L.)
	Departamento	Municipio	Comunidad			
1	Ocatepeque	Sensenti	Azacualpa	Ampliación CEB Álvaro Contreras	Ejecución	L. 4,494,819.97
2	Intibucá	Yamaranguila	Planes	Ampliación CEB Francisco Morazán	Ejecución	L. 4,748,951.39
3	La Paz	San José	Cerro Bueno	Reposición Escuela Unión y Fe	Ejecución	L. 3,818,292.58
4	Intibucá	Jesús de Otoro	Barrio Santa Cruz	Ampliación CEB Tiburcio Carias Andino	Pendiente	L. 4,953,438.10
5	Lempira	Belén	La Puerta	Ampliación Escuela Eusebio Amaya Gómez	Pendiente	L. 4,830,980.59
6	Ocatepeque	La Labor	Llano Largo	Ampliación CEB Prudencio Arita	Pendiente	L. 4,836,883.17
7	Francisco Morazán	M.D.C.	Tegucigalpa	Construcción de Cisternas y Cambio de Techo Sala de Operaciones y Neumología Instituto Nacional Cardiopulmonar Toráx	Pendiente	L. 2,130,000.00
8	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Construcción Clínicas y Área de Descanso para Médicos del Hospital Santa Bárbara Integrado (HSBI)	Pendiente	L. 6,000,000.00
9	Cortés	San Pedro Sula	San Pedro Sula	Construcción de Área de Descanso para Médicos en el Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela (HLMV)	Pendiente	L. 1,800,000.00
10	Copán	Santa Rosa de Copán	Barrio El Calvario	Construcción de Laboratorio de Virología en la Regional de Salud No.4	Ejecución	L. 6,000,000.00
11	Intibucá	La Esperanza	La Esperanza	Rehabilitación y Ampliación Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato	Pendiente	L. 6,020,000.00
12	Lempira	Gracias	Gracias	Clínicas de Aislamiento Pacientes COVID Hospital Dr. Juan Manuel Gálvez	Pendiente	L. 4,700,000.00
13	Varios	Varios	Varios	Equipamiento, Mobiliario e Instalaciones de servicios para Proyectos de Emergencia	Pendiente	L. 850,000.00
GRAN TOTAL INVERSIÓN (A.1)						L. 55,183,365.80

C. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

A continuación, se presentan los proyectos en ejecución:

No.	Ubicación	Nombre del Proyecto	% ejecución física
1	Ocatepeque, Sensenti	Ampliación Centro de Educación Básica Álvaro Contreras	52%
2	Intibucá, Yamaranguila	Ampliación Centro de Educación Básica Francisco Morazán	77%
3	La Paz, San José	Reposición Escuela Unión Y Fe	42%
4	Santa Rosa de Copán	Construcción de Laboratorio de Virología de la Regional de Salud No. 4[1]	18%

¹ Este proyecto es de Emergencia y es realizado por medio de contratista, según contrato este proyecto no contempla anticipo por su naturaleza (de emergencia).

x. INFORMACION FINANCIERA

SEDECOAS/FHIS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MAYOR
"PROGRAMA ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS"
OBJETIVO DE DESARROLLO 2, Convenio USAID No. 522-0502
Solicitud de Reembolso de Fondos No. 07

Fecha de inicio de la Actividad 29 DE OCTUBRE 2018
Fecha estimada de terminación de la Actividad 28 de ABRIL DE 2021
Mes a que corresponden los gastos reclamados COMPLEMENTO GASTOS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2020 Y GASTOS DE JUNIO 2020

A	B	C	D	E	F (D+E)	G (C-F)
	Lineas de Presupuesto	Presupuesto Aprobado	Gastos acumulados hasta la última Liquidación	Reembolso	Total gastos acumulados	Presupuesto disponible
A	CONSTRUCCIÓN	59,350,000.00	4,080,397.25	658,194.41	4,738,591.66	54,611,408.34
B	INSPECTORÍA Y ASISTENCIA TECNICA	14,040,000.00	3,790,621.30	530,430.40	4,321,051.70	9,718,948.30
C	ESTUDIOS AMBIENTALES	100,000.00	-		-	100,000.00
D	EQUIPO DIM / FHIS Acondicionamiento espacio físico	250,000.00	-		-	250,000.00
E	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO HUMANO	260,000.00	66,908.69		66,908.69	193,091.31
F	AUDITORÍA	1,000,000.00	19,656.26		19,656.26	980,343.74
	Total	75,000,000.00	7,957,583.50	1,188,624.81	9,146,208.31	65,853,791.69

CERTIFICACION

El suscrito, Administrador del proyecto USAID/PIOH, por este medio certifica que todos los gastos aquí solicitados corresponde a gastos reales y propios del proyecto para el cual están siendo reclamados y que la documentación soporte original por cada solicitud, se encuentra lista y disponible en la oficina del proyecto para ser verificada por la USAID en cualquier momento.
Tegucigalpa MDC, 17 de Julio de 2020

xi. Problemática en la ejecución del III trimestre 2020

Las actividades de capacitación, ejecución física y financiera fueron suspendidas, por el toque de queda absoluto decretado por el Gobierno de la República por la Pandemia del COVID-19, desde el mes de marzo y reactivadas nuevamente hasta el 01 de septiembre del 2020.

Acciones realizadas por la DIM:

Se está realizando seguimiento vía teléfono con los CEPS por medio del personal de campo para ir informando sobre las medidas dictadas por el Gobierno de la Republica de Honduras (durante la pandemia), actualmente con la reactivación de proyectos de septiembre, el personal se ha reintegrado a las labores de seguimiento en campo.
