



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



---

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS  
DE DESARROLLO COMUNITARIO,  
AGUA Y SANEAMIENTO  
SEDECOAS

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL  
(SEDECOAS/FHIS)

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan  
Operativo Anual POA-Presupuesto

**IV Trimestre 2020**



## Indicé

<b>Introducción</b> .....	3
<b>Antecedentes</b> .....	3
<b>Misión:</b> .....	4
<b>Visión:</b> .....	4
<b>Valores:</b> .....	4
<b>Resumen Ejecutivo</b> .....	5
<b>Situación Actual de los Programas:</b> .....	6
<b>Proyectos FHIS</b> .....	8
<b>Ejecución Presupuestaria por Programas 2020</b> .....	9
<b>Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2020</b> .....	10
<b>Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Cuarto Trimestre 2020</b> .....	11
<b>Ejecución Gasto Operativo Cuarto Trimestre del 2020</b> .....	12
<b>Cuadro por Sector 2020 (Ejecutado)</b> .....	14
<b>CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO</b> .....	15
✓ <b>Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)</b> .....	15
<b>CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA</b> .....	22
✓ <b>Proyecto de Infraestructura Rural BCIE</b> .....	22
<b>CARTERA KfW Entwicklungsbank</b> .....	25
✓ <b>Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V</b> .....	25
✓ <b>Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)</b> ..	30
<b>CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)</b> 41	
✓ <b>Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)</b> .....	41
<b>Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)</b> ...	45
<b>PROGRAMA 15: RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA NACIONAL</b> .....	49
✓ <b>Respuesta a Emergencia Generados por los Huracanes Eta e Iota</b> .....	49

## **Introducción**



El presente informe es la recopilación de las actividades e inversiones realizadas por el SEDECOAS/FHIS durante el cuarto trimestre de 2020.

## **Antecedentes**

De acuerdo al Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-056-2019 se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), la cual debe de promover el Desarrollo Comunitario por medio de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos, en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerables de Honduras quien para el desarrollo de sus funciones debe contar con una Subsecretaría de Estado.

Se adscribe a dicha Secretaría de Estado, El Instituto Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS).

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es un organismo Desconcentrado de la Presidencia de la República, creado el 22 de febrero de 1990 y extendida su vida legal hasta el año 2022 según decreto No. 222-2010 cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados, en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social y/o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Asimismo, asesorará a los gobiernos locales con respecto a los procesos de captación de recursos de las fuentes de financiamiento nacionales y/o externas y las asiste en la transferencia de las capacidades técnicas y administrativas, para convertir a estos gobiernos locales en administradores eficientes de sus programas y proyectos, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Nación en aplicación del principio de Descentralización.

### **Misión:**

“Somos una Institución estatal, desconcentrada, técnica y captadora de recursos que promueve el desarrollo local sostenible, participativo e incluyente mediante el fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, en alianza con socios estratégicos para desarrollar obras de infraestructura y proyectos de orientación social de acuerdo al plan de nación y visión de país de forma transparente y eficiente, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable de Honduras”.

### **Visión:**

“Ser para el año 2022, la Institución líder en gestión y fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, para la ejecución de proyectos, que contribuya equitativamente al desarrollo sustentable nacional”.

### **Valores:**

- **Ética:** Ejercicio de las funciones con sujeción a las normas morales que promuevan la confianza de la población hondureña.
- **Integridad:** Actuación sustentada en la honradez, prudencia, entereza, rectitud y firmeza.
- **Compromiso:** Ejecución de proyectos que coadyuven al desarrollo local.
- **Transparencia:** Amplia difusión de información sobre nuestras actuaciones. Rendición de cuentas ante la sociedad.
- **Lealtad:** Actuar con fidelidad y rectitud hacia el FHIS y compañeros de trabajo, con el objetivo de identificarse con la institución.
- **Equidad:** El FHIS no hace distinción de credo, raza, de ninguna otra forma de discriminación humana.




### Resumen Ejecutivo

SEDECOAS/FHIS, llega hasta los lugares más recónditos del país, para contribuir a mitigar las necesidades de la población más pobre y vulnerable a través de respuestas rápidas y concretas con proyectos de Agua y Saneamiento, Educación, Electrificación Rural, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural.

El presupuesto del FHIS para la gestión 2020 al 31 de diciembre asciende a 895.2 Millones de Lempiras:

Fuente	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	% de Participación en el Presupuesto Vigente
<b>BID</b>	L. 134.871.251,00	L. 105.302.450,00	12%
<b>BCIE</b>	L. -	L. 5.000.000,00	1%
<b>USAID</b>	L. 210.905.387,00	L. 210.905.387,00	24%
<b>GOH*</b>	L. 525.792.513,00	L. 401.349.166,00	45%
<b>KfW</b>	L. 158.382.933,00	L. 172.689.092,00	19%
<b>TOTAL</b>	<b>L. 1.029.952.084,00</b>	<b>L. 895.246.095,00</b>	<b>100%</b>

\* Incluye costo Operativo del FHIS

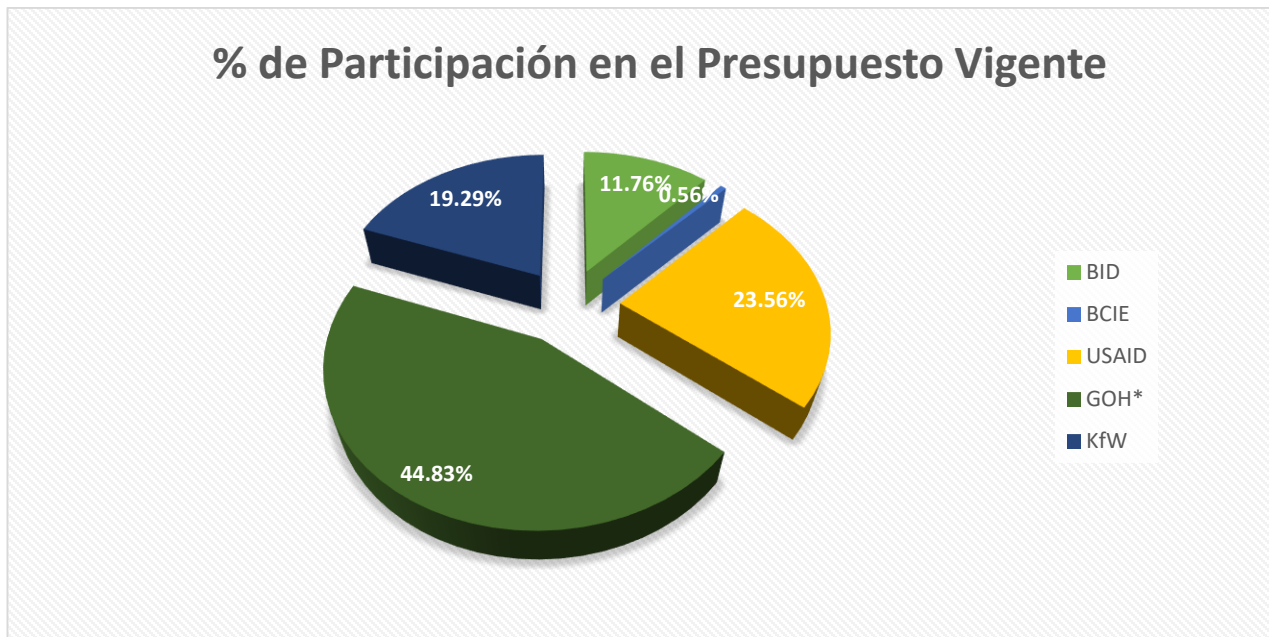

## **Situación Actual de los Programas:**

1. Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), Debido a la pandemia del COVID-19 en este proyecto se han implementado los protocolos de bio-seguridad establecidos por: la Secretaría del Trabajo, SEDECOAS FHIS y el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.  
En los meses de enero a diciembre del año 2020 se han realizado varias reuniones con el SANAA en las cuales se ha acordado la aprobación técnica de diseños de sistemas de agua potable y saneamientos quedando sujetos a la aprobación del proyecto por parte de MiAmbiente en donde también se ha expuesto la problemática para la atención del saneamiento en la zona de intervención.
2. Programa Infraestructura Rural (BCIE), De los fondos del préstamo BCIE No. 1736 se ha ejecutado un monto de US\$ 15.146 Millones, hasta el 30 de septiembre del 2020, lo que representa el 100.98% de monto total de US\$ 15.00 Millones. Este excedente se debe a las multas aplicadas, de conformidad a la política financiera de BCIE de reinvertir estos valores, lo cual representa L.3,470,846.00
3. Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE III y IV: En general la ejecución del Programa en el año 2020, se vio afectada por la pandemia, los huracanes ETA e IOTA, al finalizar el año se logró una ejecución del 92%, sin embargo, con respecto a los fondos nacionales un monto de L.2, 061,214.00 se encontraban congelados. Ahora en el año 2021 se busca impulsar las actividades en campo con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y avanzar en una ejecución normal.  
Se finalizaron cuatro proyectos, la planificación original contemplaba más sin embargo dadas las condiciones antes mencionadas se realizaron ajustes, llegando a un total de 4 proyectos para el año 2020.
4. Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR), Al cierre del período del periodo de octubre a diciembre del año 2020 la ejecución financiera del programa alcanza a un 99.45%, tomando en cuenta que se tiene en trámite aun 3 modificaciones pendientes, que las cuales, si se tiene la aprobación y disminución del presupuesto, sin embargo, si no se realizara la ejecución llegara a un 80.55%, adicional el Programa CONVIVIR también sufrió por el congelamiento de fondos que afectaron su ejecución por L. 7,237,553. Cabe mencionar que a pesar de la situación actual de la Pandemia del COVID-19, el paso de los huracanes ETA e IOTA, los proyectos y procesos sociales lograron culminar y así lograr las metas de cierre del Programa CONVIVIR de Fase I

5. Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS) y Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH): Se han mantenido el estado de emergencia decretado por el Gobierno de la Republica de Honduras por la Pandemia de COVID-19, lo cual genera atrasos por las restricciones en la libre circulación (ya que se estaba atendiendo por dígitos).

Los proyectos sufrieron atrasos y otros experimentaron daños ocasionados por los Huracanes Eta y IOTA, en el mes de noviembre trayendo como consecuencia la suspensión de los proyectos y reorientar recursos para reparaciones ocasionados por estos fenómenos.

Otro de los problemas experimentados es el valor presupuestario asignado, ya que actualmente aparece el mismo monto que a inicio de año, para lograr los objetivos reajustados y planificados, asimismo se ha solicitado la disminución del monto para fondos externos y para fondos nacionales, sin embargo, la modificación no fue realizada por SEFIN, y en consecuencia porcentajes de ejecución saldrán bajos para el programa.


## Proyectos FHIS

Fuente	Nombre del Proyecto	Nombre Corto	Sector	Modalidad Ejecucion
<b>BID</b>	Programa Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	PCCMB 4518/BL-HO	Infraestructura Social	Centralizados
<b>BCIE</b>	Proyectos de Infraestructura Rural	PIR BCIE 1736	Agua y Sanemiento, Eletrificacion y Caminos Rurales	Descentralizados/ Centralizados
<b>KFW</b>	Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar SE-FHIS FASE III y IV	PROMINE	Infraestructura Escolar	Descentralizados
	Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras	CONVIVIR	Infraestructura Social y Fortalecimiento de las Capacidades de los Jóvenes	Descentralizados
<b>USAID</b>	Programa de Infreestructura para la Seguridad Ciudadana	ICS	Recuperacion de espacio públicos e infraestrutur escolar para la mejora de la seguridad ciudadana	PEC/Centralizados
	Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras	PIOH	Mejorar las condiciones de Infraestructura Básica para contribuir al desarrollo en el Occidente de Honduras.	PEC/Centralizados




### Ejecución Presupuestaria por Programas 2020

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Monto Planificado IV Trimestre	Devengado del IV Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% Ejecución IV Trimestre/ Planificado IV Trimestre	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
Programa 1: Actividades Centrales	L. 525,792,513.00	L. 356,349,166.00	L. 64,504,484.00	L. 148,888,509.86	L. 326,177,873.66	L. 30,171,292.34	231%	92%
Programa 11: Infraestructura Rural	L. 65,583,096.00	L. 70,583,096.00	L. 20,428,828.00	L. 4,190,586.18	L. 17,521,289.71	L. 53,061,806.29	21%	25%
Programa 12: Infraestructura Escolar	L. 135,907,777.00	L. 134,608,478.00	L. 30,274,473.00	L. 98,452,983.58	L. 123,221,616.32	L. 11,386,861.68	325%	92%
Programa 14: Fomento al Desarrollo Local	L. 302,668,698.00	L. 288,705,355.00	L. 206,522,155.00	L. 73,795,002.36	L. 162,554,472.12	L. 126,150,882.88	36%	56%
Programa 15: Reconstrucción Infraestructura Nacional		L. 45,000,000.00	L. -	L. 45,000,000.00	L. 45,000,000.00	L. -	0%	
<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,029,952,084.00</b>	<b>L. 895,246,095.00</b>	<b>L. 321,729,940.00</b>	<b>L. 370,327,081.98</b>	<b>L. 674,475,251.81</b>	<b>L. 220,770,843.19</b>	<b>115%</b>	<b>75%</b>

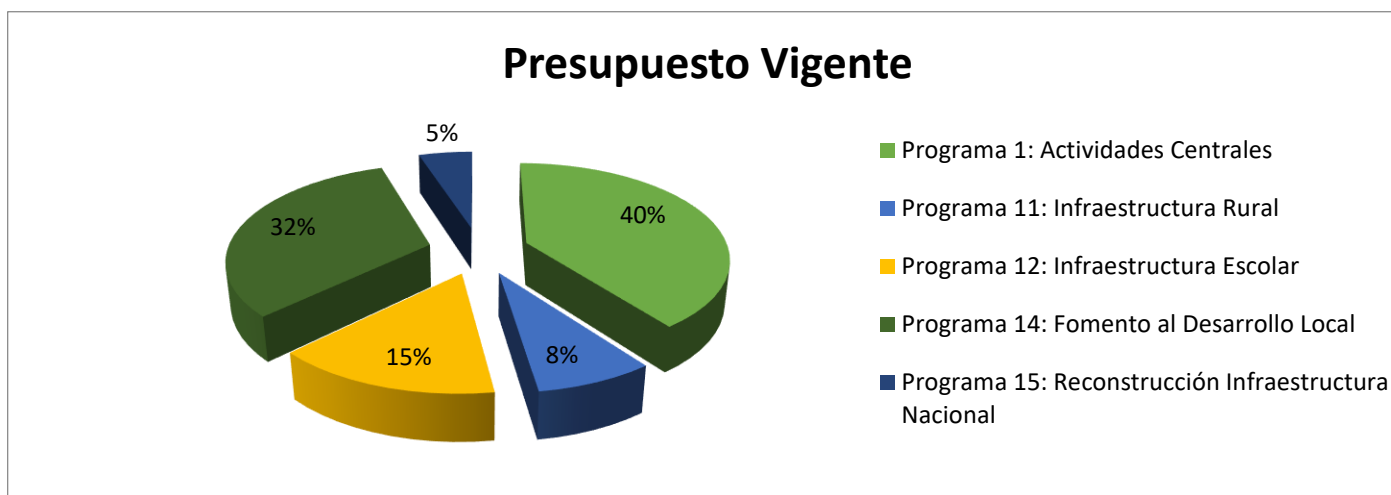


### Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2020

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente 2020	Devengado del IV Trimestre	Devengado Acumulado 2020	% Ejecución al IV Trimestre / Presupuesto Vigente
Gasto Operativo/Gobierno	L. 525.792.513,00	L. 356.349.166,00	L. 148.888.509,86	L. 326.177.873,66	92%
Proyecto de Infraestructura Rural 1736-BCIE	L. -	L. 5.000.000,00	L. -	L. 4.184.495,22	84%
Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras	L. 65.583.096,00	L. 65.583.096,00	L. 4.190.586,18	L. 13.336.794,49	20%
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar, KfW VIII	L. 135.907.777,00	L. 134.608.478,00	L. 98.452.983,58	L. 123.221.616,32	92%
Proyecto Convivencia y Especios Seguros para los Jovenes CONVIVIR	L. 22.475.156,00	L. 38.080.614,00	L. 24.013.446,15	L. 30.674.408,45	81%
Programa de Infreestructura para la Seguridad Ciudadana	L. 145.322.291,00	L. 145.322.291,00	L. 14.404.700,20	L. 60.678.681,68	42%
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	L. 134.871.251,00	L. 105.302.450,00	L. 35.376.856,01	L. 71.201.381,99	68%
Programa de Respuesta a Emergencia Generada por los Huracanes ETA e IOTA		L. 45.000.000,00	L. 45.000.000,00	L. 45.000.000,00	100%
<b>TOTAL</b>	<b>L. 1.029.952.084,00</b>	<b>L. 895.246.095,00</b>	<b>L. 370.327.081,98</b>	<b>L674.475.251,81</b>	<b>75%</b>

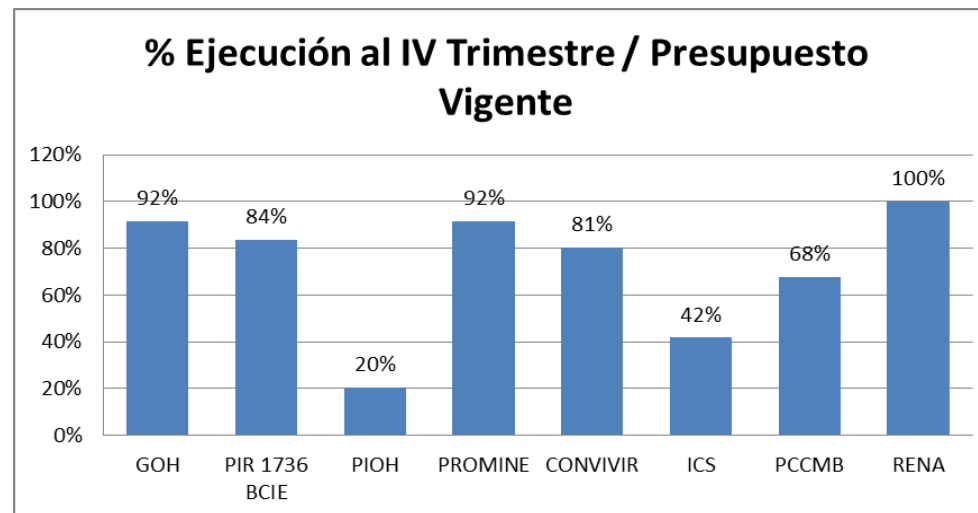

### Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Cuarto Trimestre 2020

Grupo	Aprobado	Presupuesto Vigente por Grupo	Devengado IV Trimestre	Devengado Acumulado al IV Trimestre	Disponible	% Ejecución IV Trimestre/ Presupuesto Vigente	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
SERVICIOS PERSONALES	L. 192.891.707,00	L. 153.715.094,00	L. 49.182.328,39	L. 138.039.619,11	L. 15.675.474,89	32%	90%
SERVICIOS NO PERSONALES	L. 121.548.289,00	L. 186.240.540,00	L. 29.244.156,08	L. 141.740.803,38	L. 44.499.736,62	16%	76%
MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 17.766.434,00	L. 7.294.235,00	L. 1.206.359,71	L. 1.778.893,86	L. 5.515.341,14	17%	24%
BIENES CAPITALIZABLES	L. 635.701.536,00	L. 536.127.432,00	L. 287.667.031,37	L. 381.225.397,07	L. 154.902.034,93	54%	71%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. 62.044.118,00	L. 9.977.794,00	L. 3.027.206,43	L. 9.804.141,28	L. 173.652,72	30%	98%
OTROS GASTOS		L. 1.891.000,00	L. -	L. 1.886.397,11	L. 4.602,89	0%	100%
<b>Total</b>	<b>L. 1.029.952.084,00</b>	<b>L. 895.246.095,00</b>	<b>L. 370.327.081,98</b>	<b>L. 674.475.251,81</b>	<b>L. 220.770.843,19</b>	<b>41%</b>	<b>75%</b>

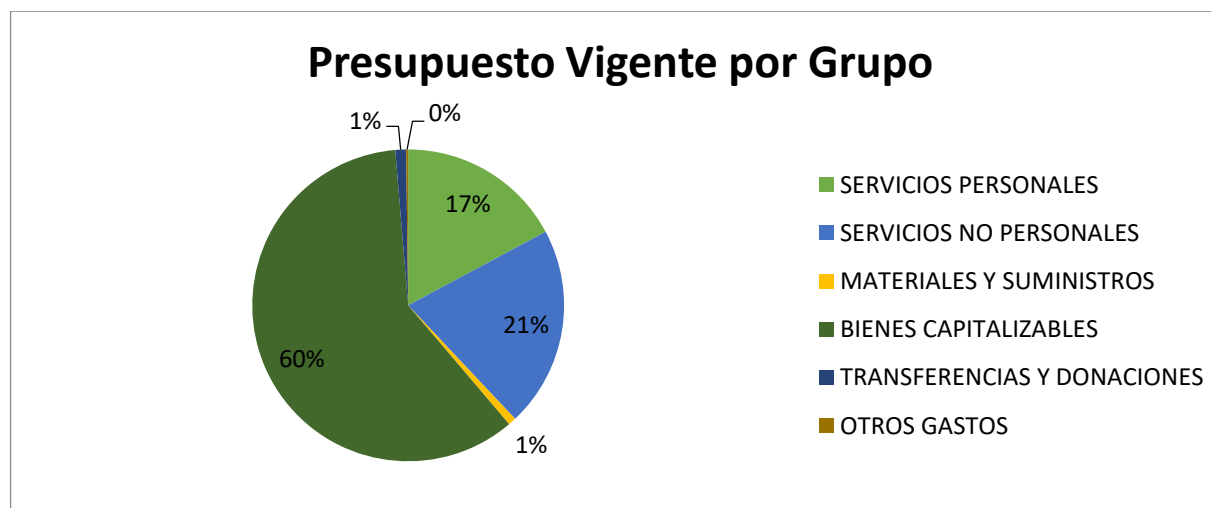



## Ejecución Gasto Operativo Cuarto Trimestre del 2020

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
1100	Sueldos Básicos	18.480.936,00	18.084.042,77	390.215,23
11400	Adicionales	1540.078,00	1081.203,09	458.874,91
11510	Decimotercer Mes	1540.078,00	1425.791,20	114.286,80
11520	Decimocuarto Mes	1540.078,00	1533.067,17	7.010,83
11600	Complementos	1245.043,00	1242.137,21	2.905,79
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	2.679.737,00	2.652.001,81	27.735,19
11750	Contribuciones para Seguro Social	669.713,00	601.032,80	68.680,20
12100	Sueldos Básicos	32.700.485,00	27.323.248,00	1639.553,10
12410	Decimotercer Mes	3.150.041,00	2.882.134,42	236.392,69
12420	Decimocuarto Mes	3.150.041,00	3.110.883,42	24.865,91
12550	Contribuciones para Seguro Social	2.274.110,00	1.567.159,99	697.596,01
16200	Compensaciones	7.051.987,00	7.051.987,00	0,00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	5.723.750,00	3.355.119,41	548.840,62
26110	Pasajes Nacionales	6.162,00	6.161,39	0,61
27500	Gastos Judiciales	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
29100	Ceremonial y Protocolo	148.300,00	148.300,00	0,00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100.000.000,00	99.999.999,99	0,01
99720	Para Ero gaciones de Capital por Devolución de Prestamos	1.891.000,00	1.886.397,11	4.602,89
1100	Sueldos Básicos	19.836.384,00	17.733.320,81	2.103.063,19
11400	Adicionales	1.653.032,00	820.905,93	832.126,07
11510	Decimotercer Mes	1.653.032,00	1.388.315,51	264.716,49
11520	Decimocuarto Mes	1.653.032,00	1.637.015,95	16.016,05
11600	Complementos	1.343.986,00	962.413,11	381.572,89
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	2.876.279,00	2.656.112,10	220.166,90
11750	Contribuciones para Seguro Social	1.146.758,00	1.011.050,60	135.707,40
21200	Agua	37.009,00	3.200,00	33.809,00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	178.027,00	178.026,50	0,50
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	1.990,00	1.989,50	0,50
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	278.078,00	278.077,11	0,89
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	24.150,00	0,00	24.150,00
24300	Servicios Jurídicos	37.652,00	0,00	0,00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	3.302.800,00	3.125.333,33	101.466,67
24500	Servicios de Capacitación	45.907,00	0,00	28.587,00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	75.000,00	0,00	0,00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	15.500.000,00	4.636.063,09	8.267.766,67
25100	Servicio de Transporte	3.620,00	3.620,00	0,00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	316.048,00	313.737,25	2.310,75
25400	Primas y Gastos de Seguro	1.404.021,00	869.933,02	0,98
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	90.320,00	87.302,25	3.017,75
27210	Tasas	243.478,00	129.988,40	74.924,60
3110	Productos Alimenticios Y Bebidas	90.919,00	81.887,63	9.031,37
33100	Productos De Papel Y Cartón	68.499,00	67.984,79	514,21



OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	56.000,00	56.000,00	0,00
35620	Diesel	55.715,00	55.714,10	0,90
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	41.110,00	1.109,22	40.000,78
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20.238,00	13.911,25	6.326,75
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	691,00	690,93	0,07
39600	Repuestos y Accesorios	179.524,00	91.587,14	87.936,86
11100	Sueldos Básicos	4.198.800,00	4.020.313,48	178.486,52
11400	Adicionales	349.900,00	285.022,21	64.877,79
11510	Decimotercer Mes	349.900,00	333.900,00	16.000,00
11520	Decimocuarto Mes	349.900,00	349.900,00	0,00
11600	Complementos	283.000,00	243.893,77	39.106,23
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	608.826,00	591.899,00	16.927,00
11750	Contribuciones para Seguro Social	140.309,00	130.436,60	9.872,40
11100	Sueldos Básicos	2.566.800,00	2.262.988,16	303.811,84
11400	Adicionales	213.900,00	123.150,99	90.749,01
11510	Decimotercer Mes	213.900,00	120.436,11	93.463,89
11520	Decimocuarto Mes	213.900,00	212.780,83	1.119,17
11600	Complementos	173.100,00	94.143,00	78.957,00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	372.186,00	334.759,00	37.427,00
11750	Contribuciones para Seguro Social	125.324,00	89.308,60	36.015,40
11100	Sueldos Básicos	2.544.000,00	2.535.425,50	8.574,50
11400	Adicionales	212.000,00	80.493,61	131.506,39
11510	Decimotercer Mes	212.000,00	212.000,00	0,00
11520	Decimocuarto Mes	212.000,00	212.000,00	0,00
11600	Complementos	171.800,00	122.839,24	48.960,76
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	368.880,00	368.880,00	0,00
11750	Contribuciones para Seguro Social	102.893,00	102.485,90	407,10
11100	Sueldos Básicos	22.336.512,00	20.751.471,85	1.582.820,15
11400	Adicionales	1.861.376,00	1.190.373,73	671.002,27
11510	Decimotercer Mes	1.861.376,00	1.758.142,01	103.233,99
11520	Decimocuarto Mes	1.861.376,00	1.491.825,64	369.550,36
11600	Complementos	1.508.241,00	1.259.003,42	249.237,58
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	3.238.796,00	3.144.065,28	94.730,72
11750	Contribuciones para Seguro Social	879.269,00	853.858,29	25.410,71
26210	Viáticos Nacionales	2.211.809,00	2.179.338,86	32.470,14
35620	Diesel	265.000,00	265.000,00	0,00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	16.988,00	0,00	16.988,00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	95.000,00	94.999,78	0,22
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	121.801,00	106.984,50	14.816,50
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	103.466,00	99.798,00	3.668,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>356.349.166,00</b>	<b>326.177.873,66</b>	<b>21.174.966,67</b>

### Cuadro por Sector 2020 (Ejecutado)

SECTOR	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios directos 2020
INFRAESTRUCTURA VIAL	1	48,671,600.49	26	8,936
EMPRENDIMIENTO Y VALORES	0	17,904,524.42	262	6,301
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1	46,949,511.31	64	0
PREVENCIÓN SITUACIONAL/CONVIVENCIA	4	43,025,224.53	227	75,422
EDUCACIÓN	7	139,621,584.14	327	9,693
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>296,172,444.89</b>	<b>906</b>	<b>100,352</b>

### Cuadro por Departamento 2020 (Ejecutado)

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios directos 2020
ATLANTIDA	5	24,639,303.42	228	70,185
CHOLUTECA	0	17,118.75	0	0
COMAYAGUA	1	14,266,641.30	31	2,040
COPAN	0	23,722,162.90	0	0
CORTES	1	13,825,863.80	73	19,141
FRANCISCO MORAZAN	1	70,839,052.91	331	6,852
GRACIAS A DIOS	0	33,747,965.75	0	0
INTIBUCÁ	2	31,457,169.75	107	502
LA PAZ	0	19,703,813.23	18	79
LEMPIRA	1	20,124,506.79	27	1,210
OCOTEPEQUE	2	29,484,090.65	91	343
OLANCHO	0	5,344,755.64	0	0
SANTA BARBARA	0	9,000,000.00	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>296,172,444.89</b>	<b>906</b>	<b>100,352</b>

### Cuadro por Otras Inversiones 2020 (Ejecutado)

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2020
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	41,823,410.68
GASTO OPERATIVO DE PROGRAMAS	5,704,658.01
ACTIVIDADES CENTRALES FHIS	326,177,873.66
<b>TOTAL</b>	<b>373,705,942.35</b>

## CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO



### ✓ Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)



#### i. Antecedentes

Actualmente el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y la Secretaría de Seguridad ejecutan conjuntamente la operación BID 4518/BL-HO denominada “Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios” el cual es un préstamo por un monto total de US\$60,000,000.00 la operación fue aprobada por el Banco Interamericano de Desarrollo en el mes de abril de 2018, posteriormente aprobada por el Congreso Nacional en el mes de octubre de 2018, y fue efectivo a partir del 28 de noviembre de 2018, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta

#### ii. Objetivo

Contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

#### iii. Componentes

**Componente 1.** Mejoramiento del hábitat de barrios urbanos vulnerables (US\$18.219 millones). El propósito de este componente es mejorar el acceso a servicios de infraestructura urbana y generar espacios con condiciones de seguridad, para incentivar una mejor convivencia y aumentar la capacidad de los ciudadanos para el cumplimiento pacífico de normas. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Infraestructura básica: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios en los siguientes barrios del Distrito Central: Monte de los Olivos, Nueva Jerusalén; Australia; 25 de Enero; Nueva

España; Brisas del Mogote y Nueva Galilea teniendo como marco para las intervenciones el Plan Integral de Mejoramiento de Barrios, el cual incluye los correspondientes diseños urbanísticos, de ingeniería, la programación y presupuestos. Este instrumento es crítico para la adecuada programación de las inversiones y para facilitar el diálogo con la comunidad sobre las actividades a desarrollar. Se financiará consultorías y contratación de obras para: (i) la preparación de los Planes Integrales de Mejoramiento de Barrios (PIMB); y (ii) las inversiones en obras de infraestructura básica de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, pavimentación, drenaje pluvial, plazas y parques, equipamientos sociales y otras necesidades detectadas en los PIMB. Se promoverá la recuperación de escuelas públicas y centros de salud (operados por las entidades estatales específicas).

Convivencia y Emprendimiento a nivel barrial: promueve la participación de los vecinos en el mejoramiento de las condiciones de su entorno, así como el fortalecimiento de sus redes sociales y vecinales para mejorar el tejido social en los barrios. Se financiará: (i) capacitación de líderes, programa de deportes y valores, apoyado por el Comité Olímpico Internacional; (ii) capacitación de vecinos en áreas de empleabilidad dentro y fuera del barrio mediante la asistencia técnica de las Universidades y su vinculación con el sector empresarial, (iii) organización para utilización de sistemas de alerta temprana para desastres naturales. Todas las actividades tendrán enfoque de género.

**Componente 2:** Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios (US\$22.130 millones). Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios de prevención social de la violencia al ciudadano y brindar una atención oportuna a las víctimas de violencias y delitos, fortaleciendo la gestión local. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

**Fortalecimiento de capacidades de actores municipales.** Se financiará: (i) capacitación y asistencia técnica a las autoridades locales para promover la participación ciudadana en la preparación de planes locales de prevención social de la violencia; (ii) fortalecimiento de las capacidades de los responsables de los observatorios locales, para el análisis estratégico de estadísticas del crimen y delito -incluyendo la desagregación por género-; y (iii) estrategia de comunicación a través de campañas y consultas sociales para promover medidas y valores para la reducción de violencias, respeto por las normas legales, morales, culturales y el uso de la oferta de servicios disponibles de prevención y atención a víctimas.

**Intervenciones de prevención social de la violencia a nivel municipal.** Se financiará: (i) programas para la atención a víctimas de VIF a través del módulo de Atención Integral Especializado (MAIE); (ii) desarrollo de protocolos para homologar la actuación de primeros respondientes para atención a víctimas, (iii) programa de prevención social de la violencia para jóvenes en situación de riesgo; (iii) modelo innovador de policía comunitaria y patrullaje policial sistemático -Hot Spots-; y (iv) mejoramiento de la infraestructura de las Jefaturas Departamentales, para ofrecer servicios policiales a la comunidad.



**Componente 3:** Efectividad policial. (US\$16 millones). Con el propósito de mejorar el desempeño y la calidad en la prestación de los servicios policiales, se apoyará la consolidación del sistema nacional de formación y profesionalización, así como su sistema de integridad. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Consolidación del sistema educativo policial basado en la filosofía de Policía Comunitaria. Se financiará: (i) diseño del modelo de Sistema de Formación y Profesionalización Policial, articulando sus diferentes instancias de formación (Instituto Técnico Policial -ITP-, ANAPO, Universidad y educación continua y entrenamiento), incluye mecanismos de evaluación continua del personal. Lo anterior, deberá estar sujeto a promover principios de meritocracia y transparencia en el desarrollo de la carrera policial; (ii) modernización del currículum académico para los medios y altos mandos policiales, certificado bajo la filosofía de policía comunitaria y orientando la formación a competencias para la toma de decisiones operativas. Lo anterior, incluyendo la redefinición del perfil de ingreso de candidatos a la ANAPO. Esto considerará la incorporación de nuevos cadetes, provenientes del ITP y otros candidatos que ya hayan cursado licenciaturas y tecnicaturas en otras universidades; modernizar el régimen de formación de oficiales en el nuevo campus universitario y generar una nueva estructura de gobierno y planta de profesores-investigadores de tiempo completo (teóricos y prácticos) (iii) fortalecimiento de las capacidades pedagógicas para docentes; (iv) fortalecimiento de la integridad policial a través de la consolidación de un sistema de evaluación y rendición de cuentas; y (v) modernización de la infraestructura física y tecnológica de la Academia Nacional de Policía y el Centro de Investigación y Desarrollo Policial.

Fortalecimiento de las capacidades en investigación criminal. Se financiará: (i) programa de capacitación y especialización continua en investigación criminal en coordinación con el MP; (ii) capacitación técnica en el uso de tecnologías de la información para análisis estratégicos delictuales; e (iii) implementación de un sistema integrado de información delictiva y criminal para mejorar la resolución del delito -integrando estadísticas por categoría de género.

#### **iv. Mecanismo de Ejecución.**

Se propone contar con dos organismos ejecutores independientes, pero con responsabilidades compartidas en el diseño, implementación y evaluación de iniciativas que se realicen en la misma área geográfica. El componente 1 de esta operación será ejecutado por SEDECOAS-FHIS y el componente 2 y 3 por la Secretaría de Seguridad.

**v. Monto del Convenio:**

US\$ 60,000,000.00 Millones de Dólares, según convenio de préstamo el cual se desglosa de la siguiente manera: SEDECOAS- FHIS le corresponde US\$ 20, 000,000.00 Millones de Dólares y a la Secretaria de Seguridad le corresponde US\$ 40,000,000.00 Millones de Dólares.

La duración del convenio es por 5 años después de la publicación de diario La Gaceta Acuerdo Ejecutivo No. 114-2018.

**vi. Avance financiero**

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	17.749.164,00	14.959.784,44	84%
2019	84.562.822,00	75.678.087,16	89%
2020	105.302.450,00	71.201.381,99	68%

**vii. Avance por Sector**

SECTOR	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios Directos 2020
EMPREDIMIENTO Y VALORES	0	16,845,973.93	262	6,301
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	0	46,292,546.34	28	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>63,138,520.27</b>	<b>290</b>	<b>6,301</b>

**viii. Avance por Departamento**

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios directos 2020
FRANCISCO MORAZAN	0	63,138,520.27	290	6,301
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>63,138,520.27</b>	<b>290</b>	<b>6,301</b>

**ix. Otras Inversiones**

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2020
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	3,400,005.64
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	4,662,856.08
<b>TOTAL</b>	<b>8,062,861.72</b>

x. AVANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

<i>Avances Programa</i>		
COMPONENTE 1 MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES		
1.0	PRODUCTO 1.1 NUEVE PROYECTOS INTEGRALES DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS (RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PÚBLICO, EQUIPAMIENTO SOCIAL Y PAVIMENTACIÓN), COMPLETADOS Y SIENDO UTILIZADOS	
1.1	<i>Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los Proyectos de integración urbana el cual incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y obras de mitigación de riesgos, colonias 25 de Enero, Australia, Nueva España, Nueva Galilea, inició la ejecución de obras el día 20 de Diciembre de 2019. La duración prevista del proyecto es al mes de junio del año 2021 (período ampliado debido a la pandemia por el COVID-19). Al mes de <b>SEPTIEMBRE</b> de 2020 se tiene la instalación de servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y pavimentación de calles en sectores de los barrios beneficiados; el porcentaje de avance físico de este producto es de un <b>59.5%</b> y tiene un avance financiero de <b>65%</b> en relación al monto contratado que es de <b>L. 128,592,322.09</b>. Debido a la pandemia del COVID-19 en este proyecto se han implementado los protocolos de bio-seguridad establecidos por: la Secretaría del Trabajo, SEDECOAS FHIS y el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.</li> </ul> <p>La consultoría de supervisión de estas obras, inició el día 06 de octubre de 2019. Se recibió el primer producto, informe inicial, en cual se revisó técnicamente el diseño de obras. La firma consultora concluyó que los diseños y cantidades de obras estaban correctos y que no era necesario incorporar correcciones para iniciar la etapa de supervisión de obras, a la fecha la consultoría de supervisión tiene un avance financiero del <b>43%</b> en relación al monto contratado que es de <b>L. 12,326,842.75</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El proyecto de equipamiento social el cual incluye, Reparación de Cancha Polideportiva, Colonia Nueva Galilea, Construcción de Centro Comunal, Colonia Nueva Galilea, Ampliación de Jardín de Niños; Colonia Nueva España, Ampliación Escuela David Corea Sánchez, Colonia Australia, Construcción Centro Comunal, Colonia Australia y Construcción Centro Comunal, Colonia 25 de Enero, inició el día 23 de noviembre de 2019. Al mes de <b>junio de 2020</b> se tiene un avance físico promedio del <b>75%</b> y un avance financiero del <b>78%</b> en relación al monto contratado que es de <b>L. 10,967,584.51</b>.</li> </ul> <p>Los servicios de consultoría para supervisión de obras se iniciaron día 11 de noviembre de 2019. Se espera finalizar en el segundo semestre del año 2020 al mes de junio de 2020 se tiene un avance financiero de <b>75 %</b>. en relación al monto contratado que es de <b>L. 602,493.06</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La consultoría para el diseño de obras del Proyecto de Integración Urbana en colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén No. 2, Brisas del Mogote Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador, ha entregado los tres productos de la consultoría que consisten en:</li> </ul>

		<p>1. Diagnóstico urbano de las redes de servicios públicos y equipamiento social existentes.</p> <p>2. Informe Intermedio: Diseño preliminar de redes de servicios públicos y equipamiento social; en esta actividad se realizaron múltiples reuniones comunitarias en las cuales la comunidad identificó sus necesidades y requerimientos de diseño.</p> <p>3. Diseño final de redes de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, sistema eléctrico y alumbrado público y equipamiento social.</p> <p>A la fecha el avance físico es del <b>95%</b> y el avance financiero es de <b>90%</b> en relación al monto del contrato que es de <b>L. 8,878,240.54</b>.</p>
<b>2.0</b>	<b>PRODUCTO 1.2 JÓVENES DE LOS BARRIOS INTERVENIDOS CAPACITADOS</b>	
<b>2.1</b>	<i>Programa de Deportes y Valores</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Este proyecto consiste en la enseñanza de disciplinas deportivas implementando los valores olímpicos; al semestre se imparten seis (6) disciplinas olímpicas: taekwondo, levantamiento de Pesas, tenis de Mesa, atletismo, balonmano y lucha olímpica; también, se atiende niños y/o jóvenes con discapacidad y mujeres que practican el baile de Zumba.</li> </ul> <p>En el programa participan 1,337 niños y jóvenes en 16 secciones deportivas sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19 se ha comenzado a realizar clases virtuales para el entrenamiento en deportes y a estas sólo tienen acceso quienes en sus viviendas cuentan con un servicio de internet; en este sentido se ha creado un canal en YouTube <a href="https://www.youtube.com/channel/UC5mxsM-qXz6wAdCsBzzufYA">https://www.youtube.com/channel/UC5mxsM-qXz6wAdCsBzzufYA</a></p>
<b>1.2</b>	<i>Capacitaciones en valores y emprendimiento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En este producto se provee la capacitación en valores y emprendimiento, iniciaron en el mes de OCTUBRE del año 2020; la meta a alcanzar inicialmente programada era 2,000 asistencias a capacitación, sin embargo, ante la emergencia se obtuvo una asistencia de 921 participantes.</li> </ul>
<b>3.0</b>	<b>PRODUCTO 1.3 MUJERES DE LOS BARRIOS INTERVENIDOS CAPACITADAS EN EMPRENDEDURISMO Y EMPLEO</b>	
<b>3.1</b>	<i>Capacitaciones en empleabilidad.</i>	<p><b>Ejecución con fondos ATN/OC-17135-HO Proyecto de Revitalización Económica y Desarrollo de Barrios Vulnerables de Tegucigalpa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Al mes de marzo inició el programa de capacitación en programación y animación digital donde participan <b>14 mujeres a través de la fundación CADERH</b>, financiado a través de la cooperación técnica ATN/OC-17135-HO; actualmente debido a la pandemia del COVID-19 la fundación CADERH realiza capacitaciones virtuales por tal motivo brindó a las participantes una computadora portátil y un chip para la conexión de servicios de internet; en este convenio se han ejecutado <b>\$5,000.00 dólares</b> que corresponde al 50% del monto.</li> <li>A través de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa se está ejecutando un convenio para Desarrollar 2 programas de formación <ul style="list-style-type: none"> <li>Cierre de brechas de competencias blandas y técnicas donde han participado 102 jóvenes en capacitaciones: Inteligencia Emocional, Resiliencia, Resolución de Conflictos, Ortografía y Redacción; destinadas a la inserción laboral; financiado a través de la cooperación técnica ATN/OC-17135-HO.</li> <li>Han participado 96 jóvenes en capacitaciones para el Talleres de Emprendimiento en los siguientes módulos: ¿Está listo para ser emprendedor?, ¿Que contribuye a generar una idea de negocio exitosa?, ¿Cómo crear una lista de ideas de negocio?, ¿Cuál idea de negocio es más conveniente de aplicar?, ¿Qué contribuye a generar</li> </ul> </li> </ul>

		<p>una idea de negocio exitosa?, Evalúe si está listo para iniciar un negocio, Plan de negocio y comercialización de producto, Precio plaza y promoción; de los jóvenes participantes. El personal en un negocio, Compras para su negocio, Ecologización de su negocio); se desarrollaron 28 microemprendimientos con jóvenes en base al diseño de un plan de negocios financiado a través de la cooperación técnica ATN/OC-17135-HO.</p> <p>El convenio se firmó el día 15 de junio de 2020 y se espera finalizar al mes de marzo de 2021</p>
--	--	--

**xi. PROBLEMATICA:**

PROBLEMA	ACCIONES DE MITIGACIÓN, COMENTARIOS, NECESIDADES DE APOYO
<p><b>No contar con la licencia Ambiental para los proyectos de las colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén, y Brisas del Mogote.</b></p>	<p>Estas colonias se encuentran ubicadas en la cuenca del río Guacerique, la cual abastece el embalse de los Laurales, una de las tres fuentes de abastecimiento de la ciudad. El Saneamiento de estas colonias es imperativo para detener la contaminación del embalse. Sin embargo, se espera dificultades por parte de MiAmbiente en brindar el licenciamiento ambiental. Es por eso que se ha indicado a la firma consultora incorporar en su diseño todas medidas de mitigación necesarias para garantizar la viabilidad técnica y ambiental del proyecto. Asimismo, se requiere la actualización del Plan de manejo de la Cuenca de Guacerique, de manera que se actualice el uso de suelo, se identifiquen los asentamientos informales que se han establecido en los últimos años (incluidas las colonias en referencia) y se defina el plan de manejo de la zona.</p> <p>En los meses de enero a diciembre del año 2020 se han realizado varias reuniones con el SANAA en las cuales se ha acordado la aprobación técnica de diseños de sistemas de agua potable y saneamientos quedando sujetos a la aprobación del proyecto por parte de MiAmbiente en donde también se ha expuesto la problemática para la atención del saneamiento en la zona de intervención.</p> <p>El Programa PCCMB también sufrió por el congelamiento de fondos que afectaron su ejecución por L23,513,032.00.</p>

## **CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA**



### ✓ **Proyecto de Infraestructura Rural BCIE**

#### **i. Objetivo General**

Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local. Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son de L. 283 millones aproximadamente.

#### **ii. Focalización:**

En base a la metodología de selección de las mancomunidades ejecutado por PIR, que toma en consideración el índice de desarrollo humano, la capacidad de gerenciamiento de la Unidades técnicas Municipales en cada mancomunidad y no más de una mancomunidad por departamento, fueron seleccionadas las mancomunidades de los departamentos de Lempira (CAFEG), Intibucá (AMFI) y Francisco Morazán (MANOFM).

#### **iii. Tipología de Proyectos**

- Electrificación Rural: proyectos para habilitar o mejorar el acceso a electricidad teniendo los beneficiarios que aportar el 15% del monto total del proyecto.
- Agua y Saneamiento: proyectos de rehabilitación, expansión y construcción de sistemas comunales de agua y saneamiento y facilidades en áreas rurales, de las mancomunidades previamente seleccionadas.
- Caminos Rurales: proyectos de rehabilitación y mejoramiento de los caminos municipales eficientemente y utilizando métodos de empleo masivo de mano de obra aportando las comunidades beneficiadas el 15% del total del proyecto.

#### **iv. Monto del Convenio:**

L.285.0 Millones de Lempiras aproximadamente, según convenio de préstamo el tiempo de ejecución del proyecto es de 60 meses.

v. **Avance Financiero**

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2011	37,790,000.00	0.00	0%
2012	6,393,674.00	0.00	0%
2013	33,774,273.00	33,771,086.72	100%
2014	42,465,271.00	32,714,051.57	77%
2015	32,683,893.00	32,295,225.85	99%
2016	95,056,511.00	93,906,331.81	99%
2017	89,155,169.00	86,922,798.37	97%
2018	37,332,495.00	36,390,084.05	97%
2019	34,274,786.00	34,213,605.05	100%
2020	5,000,000.00	4,184,495.22	84%

vi. **Avance por Sector**

SECTOR	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios Directos 2020
AGUA Y SANEAMIENTO	3	2,348,475.54	24	1,212
ELECTRIFICACION	0	-	0	0
INFRAESTRUCTURA VIAL	1	1,142,691.19	15	570
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>3,491,166.73</b>	<b>39</b>	<b>1,782</b>

vii. **Avance por Departamento**

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios directos 2020
FRANCISCO MORAZAN	0	-	0	0
INTIBUCÁ	3	2.905.238,20	30	1.284
LEMPIRA	1	585.928,53	9	498
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>3.491.166,73</b>	<b>39</b>	<b>1.782</b>

viii. **Otras Inversiones**

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2020
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	693.328,49
<b>TOTAL</b>	<b>693.328,49</b>

### **viii. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO**

En el marco del cierre definitivo del Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) y con la previa autorización del BCIE, se efectuó traslado de fondos de las cuentas PIR a cuenta del FHS No.11-401-014437-0 según memorándum PIR 256/2020 (F01 424 y F01 468) y memorándum 247/2020, por un total de L 3,149,714.48, como reserva para el último pago de estimaciones de obras cuya finalización va más allá de la fecha de cierre del Proyecto (30 de septiembre de 2020). Esta acción de reserva de fondos fue realizada preventivamente, ante la incertidumbre de no recibir las estimaciones de pago en tiempo lo que podría impedir cumplir con la Justificación de Fondos al BCIE y la Auditoria de Cierre del PIR y, siendo el PIR informado que el plazo de cierre no podría ser ampliado.

El PIR también se vio afectado en su ejecución por el congelamiento de fondos por L. 815,504.00.



## CARTERA KfW Entwicklungsbank



### ✓ Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V

#### i. Objetivo General



Consiste en la utilización de centros educativos mejorados, ampliados o nuevos y equipados bajo conceptos pedagógicos que operan de manera sostenible por la comunidad educativa. De esta manera se pretende contribuir a que niños/as y jóvenes de regiones pobres utilicen una oferta de alta calidad educativa, tanto formal como de educación vocacional.

#### ii. Focalización

**Fase IV:** El Área de intervención abarcará los departamentos que están siendo intervenidos en las fases anteriores (Zona de Occidente): 1) Copán, 2) Santa Bárbara, 3) Intibucá, 4) Lempira, 5) La Paz, 6) Ocotepeque. 7) Centros a nivel nacional en casos de emergencia (catástrofes naturales). La información de estos centros deberá ser actualizada en el plan maestro y sólo si se determina su precariedad, podrán ser intervenidos previo a No Objeción del KfW. 8) Adicionalmente se extenderá el área de intervención a los departamentos adyacentes a la zona de occidente, delimitando el área de intervención a través de la Carretera Panamericana. Los municipios a ser beneficiados se encuentran al oeste de la misma en los siguientes departamentos: 1) Choluteca, 2) Valle, 3) Francisco Morazán (exceptuando el núcleo urbano de Tegucigalpa), 4) Comayagua y adicionalmente 5) Gracias a Dios.

**Fase V:** El Área de intervención abarcará los departamentos de: Ocotepeque, Lempira y Copan, en la zona de Occidente. Además, los departamentos al oeste de la carretera CA-5 de los departamentos de Francisco Morazán (exceptuando el Distrito Central), Valle, Choluteca, Comayagua. También seguirá formando parte del Programa el Departamento de Gracias a Dios (siempre y cuando no se alcance un mínimo de infraestructura en este departamento y según las experiencias de la fase IV del PROMINE).

#### iii. Priorización de los Centros Educativos

Esta es realizada por la Secretaria de Educación apoyados en la herramienta del Plan Maestro de Infraestructura Educativa.

#### iv. Descripción del Proyecto

**Fase IV:** El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y en la planificación estratégica para los años 2014 - 2018 de la Secretaría de Educación (SE). El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las tres fases previas PROMINE I, II y III. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

**Fase V:** El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y el Plan Estratégico del Sector de Educación para los años 2017 - 2030 de la Republica de Honduras. El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las cuatro fases previas PROMINE I, II, III y IV. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

#### v. Monto del Proyecto:

##### Fase IV:

Fondos de Donación por un monto de € 15,000,000.00 euros, Contrapartida Nacional para SEDECOAS/FHIS de € 424,000 euros, Contrapartida Nacional para SE de € 218,000 euros, Contrapartida Municipal de € 515,000 euros y Contrapartida Comunitaria de € 514,000 euros.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 03/12/2015

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 17/02/2017

Fecha de Inicio: 02 de Abril 2018 (Se considera la fecha de inicio de la Consultoría)

Fecha de Finalización de convenio: 30/11/2020

##### Fase V:

Fondos de Donación por un monto de 10, 000,000.00 euros, Contrapartida Nacional para IDECOAS/FHIS de 495,000 euros, Contrapartida Nacional para SE de 250,000 euros, Contrapartida Municipal de 600,000 euros Contrapartida Comunitaria de 600,000 euros.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 06/07/2018

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 21/03/2019

Fecha de Inicio: Inicio tentativo IV trimestre 2020

Fecha de Finalización de convenio: 37 meses a partir del inicio de la consultoría

**vi. Avance Financiero PROMINE FASE IV y V**

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2016	145.687.475,00	142.916.817,45	98%
2017	107.279.375,00	96.731.967,93	90%
2018	53.035.502,00	50.951.601,81	96%
2019	81.069.633,00	79.762.875,76	98%
2020	134.608.478,00	123.221.616,32	92%
Presupuesto 2020 Fase IV y Fase V			

**vii. Avance Físico por Sector PROMINE FASE IV y V**

SECTOR	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios Directos 2020
EDUCACION	4	114,366,483.03	103	453
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>114,366,483.03</b>	<b>103</b>	<b>453</b>

**viii. Avance Físico por Departamento PROMINE FASE IV y V**


DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios Directos 2020
CHOLUTECA	0	17,118.75	0	0
COPAN	0	14,763,399.80	0	0
FRANCISCO MORAZAN	0	69,295.43	0	0
GRACIAS A DIOS	0	33,789,202.68	0	0
INTIBUCÁ	2	19,590,967.10	54	254
LA PAZ	0	18,551,014.68	0	0
LEMPIRA	0	4,744,737.06	0	0
OCOTEPEQUE	2	17,495,991.57	49	199
OLANCHO	0	5,344,755.96	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>114,366,483.03</b>	<b>103</b>	<b>453</b>

**ix. Otras Inversiones**

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2020
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	8,067,946.16
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA*	787,187.13
<b>TOTAL</b>	<b>8,855,133.29</b>
*Viaticos, pasajes y Combustible	

## x. AVANCES GENERALES

### ▪ FASE IV.

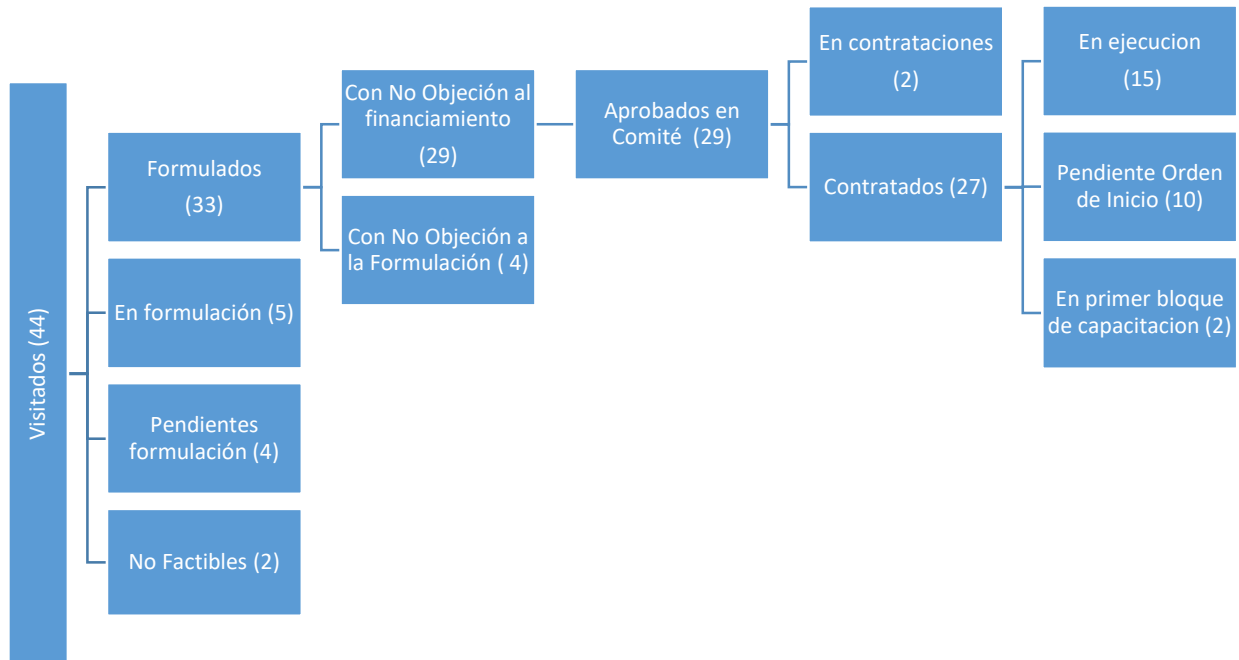

### xi. AVANCE FINANCIERO SEGÚN PRESUPUESTO ASIGNADO FASE VI Y FASE V

Año	Planificado al IV Trimestre*	Ejecutado	Eficiencia
2020	134,608,478.00	123,221,616.32	92%
*Sin embargo de los fondos nacionales L. 2,061,214.00 se encontraban congelados.			

En general la ejecución del Programa en el año 2020, se vio afectada por la pandemia, los huracanes ETA e IOTA, al finalizar el año se logró una ejecución del 92%, sin embargo, con respecto a los fondos nacionales un monto de L.2, 061,214.00 se encontraban congelados. Ahora en el año 2021 se busca impulsar las actividades en campo con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y avanzar en una ejecución normal.

### xii. LOGROS IV TRIMESTRE

- ✓ Se finalizaron cuatro proyectos, la planificación original contemplaba más sin embargo dadas las condiciones antes mencionadas se realizaron ajustes, llegando a un total de 4 proyectos para el año 2020.

- ✓ Se logró una ejecución de 92%
- ✓ Se contrató en su mayoría el monto de convenio en el componente de infraestructura.
- ✓ Se obtuvo una ampliación de tiempo de la vigencia del programa hasta el 30 de noviembre del 2020

### **xiii. RETOS PROXIMOS**

Entre los principales retos que enfrenta el PROMINE-KfW:

- Inicio de los proyectos en el departamento de Gracias a Dios.
- Aprobación de la modificación presupuestaria para continuar ejecución en fase IV.

## ✓ Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)



### i. Objetivo General

Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).

### ii. Focalización

A través de un proceso de concurso con criterios de selección predefinidos en el acuerdo separado y evaluación de propuestas técnicas alineadas a los componentes del programa fueron seleccionados 3 municipios en donde se está realizando la intervención del CONVIVIR a través de obras de infraestructura y medidas de alcance social para beneficio enfocado en la juventud. Así mismo se definieron los barrios, colonias o comunidades urbanas en donde se focaliza las acciones y en donde ya se ha realizado una labor de socialización de los alcances, compromisos y beneficios para la población. Los municipios seleccionados son:

- Municipio de Gracias, departamento de Lempira
- Municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua
- Municipio de La Lima, departamento de Cortes.

### iii. Descripción del Proyecto

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

### iv. Monto del Proyecto:

Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son Euros 10,000,000.00. El tipo de financiamiento es un contrato de Préstamo.

**Fecha de Firma de convenio:** 08/11/2012

**Fecha de Finalización de convenio:** 31/12/2020

**v. Avance Financiero**

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2014	21.289.204,00	18.316.427,97	86%
2015	38.873.159,00	34.024.198,74	88%
2016	88.796.503,00	83.460.868,42	94%
2017	51.288.495,00	48.071.886,28	94%
2018	65.657.852,00	43.535.738,65	66%
2019	33.661.644,00	30.786.651,68	91%
2020	38.080.614,00	30.674.408,45	81%

**vi. Avance por Sector**

SECTOR	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios Directos 2020
EMPREDIMIENTO Y VALORES	0	1,058,550.43	0	0
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	2	24,900,934.40	71	4,750
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>25,959,484.83</b>	<b>71</b>	<b>4,750</b>

**vii. Avance por Departamento**

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios directos 2020
COMAYAGUA	1	14,307,878.20	31	2,040
CORTES	0	5,230,600.00	13	1,500
LEMPIRA	1	6,421,006.63	27	1,210
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>25,959,484.83</b>	<b>71</b>	<b>4,750</b>

**viii. Otras Inversiones**

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2020
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	4,714,923.62
<b>TOTAL</b>	<b>4,714,923.62</b>

## ix. INFORMACION FINANCIERA

En el presente cuadro se observa la ejecución financiera que ha tenido el Programa CONVIVIR desde su creación a la fecha, en el Cuarto Trimestre del año 2020 lo ejecutado se distribuye de la siguiente manera:

### Ejecución financiera del 4to trimestre

Componente	Presupuesto Ejecutado 2014	Presupuesto Ejecutado 2015	Presupuesto Ejecutado 2016	Presupuesto Ejecutado 2017	Presupuesto Ejecutado 2018	Presupuesto Ejecutado 2019	Presupuesto Ejecutado IV Trimestre 2020
01-Gasto Operativo	L. 536,459.53	L. 4011,908.76	L. 8,186,328.38	L. 7,484,899.00	L. 6,977,244.45	L. 0.00	L. 0.00
06- Construcción	L. 4134,589.44	L. 14781,805.43	L. 53,726,357.68	L. 21,533,793.15	L. 9,885,956.39	L. 19,765,281.37	L. 20,525,724.42
05- Fortalecimiento de Habilidades de Jóvenes	L. 0.00	L. 2011,078.63	L. 8,078,022.83	L. 3,972,943.74	L. 6,175,521.00	L. 443,284.80	L. 708,042.70
04- Mejoramiento Capacidades de Actores Relevantes	L. 0.00	L. 4114,456.01	L. 2,137,666.23	L. 2,906,038.90	L. 3,210,648.09	L. 4,030,730.00	L. 305,507.73
03-Materiales y Equipos	L. 0.00	L. 820,323.53	L. 3,142,655.66	L. 3,383,553.95	L. 5,733,027.16	L. 1,349,051.65	L. 4,375,209.98
02-Consultoría internacional	L. 13645,379.00	L. 8284,626.38	L. 8,189,837.64	L. 8,790,657.54	L. 11,553,341.56	L. 5,198,303.86	L. 4,714,923.62
07- Gasto Operativo Fase II							L. 0.00
08- Consultoría internacional fase II							L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 18,316,427.97</b>	<b>L. 34,024,198.74</b>	<b>L. 83,460,868.42</b>	<b>L. 48,071,886.28</b>	<b>L. 43,535,738.65</b>	<b>L. 30,786,651.66</b>	<b>L. 30,674,408.45</b>

Al cierre del período del periodo de octubre a diciembre del año 2020 la ejecución financiera del programa alcanza a un 99.45%, tomando en cuenta que se tiene en trámite aun 3 modificaciones pendientes, que las cuales, si se tiene la aprobación y disminución del presupuesto, sin embargo, si no se realizara la ejecución llegara a un 80.55%, adicional el Programa CONVIVIR también sufrió por el congelamiento de fondos que afectaron su ejecución por L. 7,237,553. Cabe mencionar que a pesar de la situación actual de la Pandemia del COVID-19, el paso de los huracanes ETA e IOTA, los proyectos y procesos sociales lograron culminar y así lograr las metas de cierre del Programa CONVIVIR de Fase I, quedando pendientes 2 proyectos que aún están en ejecución.

Los procesos de resolución de contrato de los proyectos “Casa de la Cultura” y “mediana Sitraterco” aún se encuentran en proceso para la recuperación de los fondos a la cuenta del programa CONVIVIR, a finales del mes de diciembre del año 2019 se recibió la noticia y el F01 del depósito y a finales de febrero del año en curso de una parte de estos fondos a las cuentas del SEDECOAS/FHIS, restando un monto de L. 8,139,334.38.



## x. COMPONENTE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA- AVANCE FISICO

En el componente de Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura el Programa CONVIVIR, la gestión del SEDECOAS/FHIS está orientada a lograr la buena ejecución de cada obra priorizada. Para ello, durante este período se ha continuado con el trabajo conjunto con la Dirección de Control y Seguimiento y el apoyo de la Asistencia Técnica. Se ha logrado dar término de un número de 35 obras de infraestructura.

La institución es también responsable de la tramitación de documentación para lograr la aprobación de órdenes de cambio, y desembolsos de fondos para construcción.

Actualmente se tiene una cartera de 37 proyectos de infraestructura aprobados para ejecutar con el monto del convenio. De dichos proyectos ya se terminaron 35 obras, 2 proyectos en ejecución y 2 proyectos en proceso de resolución de contrato debido a la falta de voluntad política del municipio y factibilidad social de las obras estas se encuentran ubicados en La Lima, Cortes.

Se continúa trabajando en el proceso de equipamiento de los proyectos priorizando los que están terminados y los que están próximos a inaugurar.

El SEDECOAS/FHIS ha actuado por medio de su equipo de Control y Seguimiento, inspectores sociales y técnicos, y apoyo del equipo de Asistencia Técnica dando seguimiento a la ejecución de los proyectos en construcción, como también trabajando en el seguimiento a las gestiones administrativas relacionadas con desembolsos, ordenes de cambio ingresados en el ciclo de proyectos del SEDECOAS/FHIS.

A continuación, se anexan los tres cuadros que corresponden a la ejecución física de cada una de las obras de infraestructura

### *No. 1 Obras priorizadas en el municipio de Siguatepeque, Comayagua*

No.	Código FHIS	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado	ESTADO	
					Avance Físico	Avance Financiero
1	105175	Construcción Cancha Multiuso Parque Bosque Calanterique	Suyapita	L. 3,104,790.79	CONCLUIDO	
2	106002	Construcción Salón Multiusos Y Cancha Deportiva Noé Cruz Villeda	Col. Noé Cruz Villeda	L. 3,012,043.70	CONCLUIDO	
3	106347	Construcción Centro De Calidad De Vida	La Crucita	L. 2,956,701.47	CONCLUIDO	
4	106181	Construcción Centro De Calidad De Vida Bo. El Carmen	Bol El Carmen	L. 3,767,167.59	CONCLUIDO	
5	106094	Remodelación Centro De Capacitación Digital	Bo. El Centro	L. 410,327.27	CONCLUIDO	
6	105928	Construcción De Obras Complementarias Campo De Futbol Col. Mata	Col. Mata	L. 2,721,312.41	CONCLUIDO	
7	106308	Construcción Centro De Calidad De Vida	Bo. San Juan	L. 3,598,956.85	CONCLUIDO	

8	107303	Construcción Oficina Municipal De La Juventud	Barrio El Centro	L. 3,638,941.50	CONCLUIDO	
9	107324	Remodelación Centro De Aprender Para Emprender - Infop	Suyapita	L. 986,493.87	CONCLUIDO	
10	107546	Construcción Obras Complementarias Plaza Del Bosque Calanterique	Suyapita	L. 1,805,135.54	CONCLUIDO	
11	107317	Construcción Casa De La Cultura	Bol El Carmen	L. 11,012,069.37	50.03%	53.45%
12	107547	Remodelación De Biblioteca Municipal, Siguatepeque	Bo. El Centro	L. 461,153.55	CONCLUIDO	
13	107483	Construcción Plaza Turística de Artesanos EL Porvenir	Aldea El Porvenir	L. 3,870,593.12	CONCLUIDO	
<b>TOTAL INVERSION</b>				<b>L. 41,386,687.31</b>		

*No. 2 Obras priorizadas en el municipio de Gracias, Lempira*

No.	Código FHIS	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado	ESTADO	
					Avance Físico	Avance Financiero
1	105174	Construcción Plaza Recreativa Colonia Borjas	Col. Borjas	L. 3,225,774.53	CONCLUIDO	
2	106006	Construcción Plaza De Recreación Para La Convivencia Pinalito Y Bella Vista	Pinalito	L. 2,147,440.69	CONCLUIDO	
3	106145	Remodelación Centro De Capacitación Digital	La Merced	L. 56,983.16	CONCLUIDO	
4	106090	Ampliación Plaza Boulevard Marco Tulio Rodríguez	El Progreso	L. 2,454,714.29	CONCLUIDO	
5	106062	Construcción Casa De La Cultura	Mercedes	L. 8,169,443.80	CONCLUIDO	
6	106007	Construcción Escuela De Música Mejicapa	Bo. Mejicapa	L. 2,590,324.49	CONCLUIDO	
7	105994	Reposición Polideportivo Villas Del Rosario	Villas del Rosario	L. 7,868,528.04	CONCLUIDO	
8	106003	Construcción Parque Recreativo Col. Moreno Y Hércules	Col. Moreno	L. 5,459,590.31	CONCLUIDO	
9	106004	Remodelación Plaza San Sebastián	Gracias	L. 4,029,707.82	CONCLUIDO	
10	106136	Construcción Salón Multiusos Bella Vista Y Pinalito	Col. Bella Vista	L. 2,979,546.19	CONCLUIDO	
11	105992	Construcción Campo De Pelota Bella Vista Y Pinalito	Col. Bella Vista	L. 3,197,439.41	CONCLUIDO	
12	105713	Ampliación Casa De La Juventud	Villas del Rosario	L. 6,619,560.57	CONCLUIDO	
13	106328	Construcción Centro De Calidad De Vida Villami	Villami	L. 2,447,597.92	CONCLUIDO	
14	107489	Centro De Aprender Para Emprender, Inst. Ramón Rosa	Barrio Mejicapa	L. 4,776,414.85	CONCLUIDO	
<b>TOTAL INVERSION</b>				<b>L. 56,023,066.07</b>		

**No. 3 Obras priorizadas en el municipio de La Lima, Cortés**

No.	Código FHIS	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado	ESTADO	
					Avance Físico	Avance Financiero
1	105173	Construcción Centro Juvenil De Desarrollo Integral	Centro Sula	L. 3,262,220.20	CONCLUIDO	
2	106182	Construcción Centro De Calidad De Vida Col. Nuevo San Juan	Col. Nuevo San Juan	L. 2,961,528.33	100%	100%
3	106184	Construcción Centro De Calidad De Vida	Col Álvarez Martínez	L. 3,068,158.19	98%	100%
4	105893	Remodelación Casa De La Cultura	Col. Sitraterco	L. 9,605,935.76	En proceso de resolución de contrato	
5	105895	Remodelación Camino De Los Gatos Paseo Del Puente Y Áreas Aledañas	Bo. Centro Sur	L. 2,831,897.23	95%	99%
6	106093	Remodelación Centro De Capacitación Digital	Bo. Centro Norte	L. 225,080.18	CONCLUIDO	
7	105738	Ampliación Plaza Juventud Barrio Centro Sur	Bo. Centro Sur	L. 7,036,616.12	CONCLUIDO	
8	105897	Remodelación Mediana Sitraterco	Col Sitraterco	L. 8,518,858.49	En proceso de resolución de contrato	
9	105900	Construcción Cancha Multiusos Colonia El Maestro	El Maestro	L. 2,687,523.23	CONCLUIDO	
10	105902	Remodelación Parque De Los Pinos	Col. Los Pinos	L. 1,775,191.17	CONCLUIDO	
11	107488	Remodelación Biblioteca Municipal	Bo. Centro Sur	L. 1,500,285.33	CONCLUIDO	
12	107610	Remodelación Centro de Aprender para Emprender, Instituto Técnico Vocacional Valle de Sula	Col. Oro Verde	L. 4,168,239.85	42%	41.65%
<b>TOTAL INVERSION</b>				<b>L. 29,516,739.83</b>		

**Nota:** De los 39 proyectos actualmente aprobados en la cartera del Programa CONVIVIR, 2 proyectos en el Municipio de La Lima, Cortes se encuentran en el proceso para rescindirlos debido a que no hay factibilidad social ni apoyo por parte del municipio para continuar con la Ejecución de los mismos, dichos proyectos son: Mediana Sitraterco y Casa de la Cultura.

**xi. AVANCE DEL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES Y LABORALES DE JÓVENES Y COMPONENTE MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES RELEVANTES**

En el Cuarto Trimestre del año 2020, se realizaron esfuerzos conjuntamente con la asistencia técnica en brindar las revisiones finales a cada uno de los productos al igual que culminar técnica y administrativamente con cada uno de los procesos sociales ejecutados ya sea por medio de convenios interinstitucionales, así como por contratos de consultorías individuales, la cuales a continuación se describen:

#	ACTIVIDADES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS	DIFICULTADES
<p><b>CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL IDECOAS/FHIS Y FIPADEH PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES CON ACTORES RELEVANTES:</b></p> <p>Porcentaje de ejecución Adendum No. 100: %</p> <p><b>Adendum de Tiempo: Noviembre del 2020</b></p>				
1	Entrega de personería jurídica, planes de revitalización de las ORMAG a nivel barrial y plan de acción de la ORMAG municipal.	Se realizó una gira por los tres municipios de injerencia del Programa con el propósito de realizar la entrega oficial del documento de personería jurídica originales, por lo que se convocó a los miembros de la ORMAG Municipal. De igual manera se entregaron las diferentes herramientas de planificación las cuales fueron realizadas de manera participativa con los miembros de la ORMAG municipal.	Entregados Tres (03) Documentos de personería jurídica a la Junta directiva de la ORMAG Municipal.	Por el impacto del Huracán y tormenta Tropical ETA –IOTA, se complicó la movilización a los 3 municipios, sin embargo, se logró realizar las entregas correspondientes.
2	Revisión del Plan maestro y guía metodológica de implementación del Modelo de sostenibilidad del Programa	La revisión del Plan Maestro y guía metodológica ha sido elaborada de manera conjunta inspección social de control y seguimiento, ya que se ha tenido que realizar ajuste en el área de administración y controles básicos vinculando el manejo administrativo desde PEC y llegando a ORMAG	A continuación, se detalla los documentos finales que han sido entregados por FIPADEH, mismo que han pasado por revisiones de parte de SEDECOAS y la Asistencia Técnica:	
3	<b>Entrega de productos finales del Convenio entre FIPADEH y SEDECOAS</b>	FIPADEH entrego los documentos en físico, considerados como productos finales del Convenio de cooperación para el fortalecimiento de Actores Relevantes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tres (3) personerías jurídicas de las ORMAG municipal.</li> <li>Veinte y dos (22) Planes de revitalización, mantenimiento, operación y Gestión elaborados</li> </ul>	



#	ACTIVIDADES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS	DIFICULTADES
			<p>conjuntamente con los miembros de la Junta directiva de la ORMAG Barrial.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tres (3) planes estratégicos de la ORMAG municipal, elaborado con la participación de las juntas directivas</li> <li>• Entrega de 10 set (90 módulos de la metodología PEC).</li> <li>• Entrega de la guía conceptual y el plan maestro para la Implementación del Modelo ORMAG</li> <li>• Entrega de las actas de aprobación de corporación municipal de:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- La creación de la unidad de mediación y conciliación.</li> <li>- La aprobación del plan de seguridad ciudadana, avalador por la Subsecretaria de Seguridad (UGAGLO).</li> <li>- La aprobación de la estrategia municipal de juventud.</li> </ul> </li> </ul>	
<p><b>CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL IDECOAS/FHIS Y EL CENET PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD JUVENIL</b></p> <p>Porcentaje de ejecución: 100%</p> <p><b>Adendum de Tiempo (Octubre 2020)</b></p>				

#	ACTIVIDADES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS	DIFICULTADES
01	Entrega de los documentos finales del parte del CENET, y cierre de convenio de Cooperación interinstitucional.	Se emitió de parte de la Coordinación del Programa, la comunicación oficial referente a las observaciones a nivel técnico y administrativo las cuales estaban pendientes de corregir e incorporar, tanto en algunos productos finales como en la documentación administrativa final.	A continuación, se detalla los productos finales presentados por el CENET: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tres Documentos con la Estrategia de la Promoción de la empleabilidad Juvenil de los municipios de injerencia del Programa.</li> <li>Un reglamento para el funcionamiento de los kioscos CONVIVIR.</li> <li>Un informe general del diplomado realizado con la formación de facilitadores para la inserción laboral juvenil.</li> <li>45 actores claves formados como facilitadores para la inserción laboral juvenil.</li> </ul>	Cabe mencionar que el CENET ha presentado un valioso aporte innovador y creativo en las líneas de acción de la estrategia de empleabilidad contextualizadas según la necesidad de cada municipio, al igual que una contribución importante a las OMJ a nivel técnico, sin embargo, el manejo de la comunicación institucional se volvió muy sensible del parte del CENET afectando la rápida solución a los problemas presentados.
<b>CONTRATO DE UN CONSULTOR ESPECIALISTA EN EL AREA DE CAFÉ</b> <b>Adendum al 30 de noviembre.</b> <b>Porcentaje de ejecución: 90%</b>				
5	<b>Revisión final y aprobación de los documentos para el funcionamiento de la cafetería café</b>	Se realizó una revisión a profundidad del plan de negocios de la cafetería café la propuesta del funcionamiento y el manual de réplicas de capacitación para la formación de jóvenes baristas del municipio, se realizaron varios ajustes y propuesta de mejora al documento, mismas que se incorporaron en los documentos finales.	A continuación, se detalla la entrega de los documentos finales: <ul style="list-style-type: none"> <li>Un Plan de negocios para el establecimiento de la Cafetería Café TENCALI</li> <li>Una propuesta de programa para el funcionamiento de la cafetería café.</li> <li>Un manual de réplicas para la capacitación de jóvenes en barismo y catación.</li> </ul>	Cabe mencionar que está pendiente la instalación de la maquina esspreso y el seguimiento del uso insitu, sin embargo la dificultada de las tormentas tropicales y el Covid 19 han detenido el proceso.
<b>CONTRATO DE UN CONSULTOR ESPECIALISTA EN GESTIÓN CULTURAL:</b> <b>Adendum de tiempo: 30 de noviembre</b> <b>Porcentaje de avances: 100 %</b>				
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de la Estrategia de la de</li> </ul>	Se realizaron gestiones de parte de la coordinación del	Aprobadas mediante punto de acta de corporación	Debido a la situación de contagios ocasionados

#	ACTIVIDADES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS	DIFICULTADES
	<p>Funcionamiento de la casa de la cultura de Siguatepeque y Gracias.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración de los planes de revitalización mantenimiento, operación y gestión de la casa de la cultura con el apoyo del enlace de la dirección de proyectos.</li> </ul>	<p>programa, para incorporar en agenda de Corporación municipal la discusión y aprobación de la estrategia de funcionamiento de la casa de la cultura de ambos municipios.</p> <p>Se programaron giras para socializar y promover la aprobación de la estrategia de gestión cultural en cada municipio.</p>	<p>municipal la aprobación de la estrategia de funcionamiento de la Casa de la cultura de Gracias y Siguatepeque</p>	<p>por la pandemia se retrasó la aprobación de las estrategias en corporación municipal, sin embargo, se buscaron las vías que dieron pronta solución al problema.</p>

## xii. AVANCE DE PROCESOS

El país actualmente se encuentre en cuarentena debido a la pandemia desde el 16 de marzo del año en curso, por lo que se suspendieron todas las obras que se encontraban en ejecución, se ha disminuido el trabajo presencial y aumentado el teletrabajo (trabajo desde casa), sin embargo para el mes de septiembre se reactivaron las actividades laborales en las nuevas instalaciones dentro del Centro Cívico Gubernamental, en el mes de noviembre el país fue afectado por los huracanes ETA e IOTA, por lo que el equipo se ha comprometido y avanzado en actividades para la reactivación de los procesos y proyectos en campo, como ser las siguientes:

1. Se logró la culminación de los proyectos CONVIVIR, con las medidas de bioseguridad correspondientes, en el mes de diciembre se logró la culminación de los proyectos en ejecución y cierre administrativos, quedando pendientes 2 obras, las cuales actualmente se encuentran en ejecución.
2. Se logró adjudicar los procesos de compra del equipamiento de los proyectos, los cuales solo quedo pendiente la entrega del mobiliario para el mes de enero del año 2021.
3. A pesar de la situación, se ha logro culminar con los procesos sociales de forma virtual, con el seguimiento y monitoreo con el equipo de SEDECOAS y las diferentes organizaciones con las cuales se tiene convenios u contratos, según lo que se puede observar en el cuadro anterior del detalle de avances.
4. Priorización de pagos, de la operatividad del programa, pago de desembolsos proyectos entre otros.
5. Seguimiento de los avances financieros, como ser elaboración de modificaciones presupuestarias, solicitudes de cuota y todo lo referente con este aspecto.

6. Reuniones de seguimiento de forma virtual con el equipo tanto de SEDECOAS, municipalidades, KfW, SEFIN, entre otros.
7. La Coordinación del programa CONVIVIR, en conjunto con la inspectoría de la Dirección de Control y Seguimiento a realizado giras de trabajo en los municipios de Siguatepeque, Gracias y La Lima, para el monitoreo y seguimiento de los procesos y obras de infraestructura, y poder lograr las metas establecidas.
8. Cabe mencionar que, al paso de los huracanes en el mes de noviembre, los proyectos de La Lima fueron gravemente afectados por las inundaciones, lo que con llevo a realizar inspecciones y recuento de daños en las obras.
9. La Coordinación del programa CONVIVIR, en conjunto con la inspectoría de la Dirección de Control y Seguimiento a realizado giras de trabajo en los municipios de Siguatepeque, Gracias y La Lima, para el monitoreo y seguimiento de los procesos y obras de infraestructura, y poder lograr las metas establecidas.



## **CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)**



### **✓ Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)**

#### **A. Objetivo General**

El propósito de esta Actividad es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

#### **B. Focalización**

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en las cinco municipalidades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Tela y La Ceiba. Las comunidades específicas de intervención serán identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

#### **C. Descripción del Proyecto**

Esta Actividad ayudará al GdeH (representado a través de FHIS) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otras partes interesadas. La Actividad incluye dos resultados complementarios: Resultado 1: Mejora de la infraestructura comunitaria, las actividades responderán a las prioridades de infraestructura comunitaria para abordar la seguridad ciudadana. Resultado 2: Aumento de la cohesión comunitaria, considera que la forma en que las intervenciones de infraestructura son concebidas, diseñadas y ejecutadas pueden desempeñar un papel directo en el aumento de la cohesión social y comunitaria y promover un marco holístico de prevención de la violencia. Los proyectos bajo la Actividad incluirán instalaciones educativas, centros de salud, alumbrado público, espacios comunitarios más seguros, centros de alcance y comunitarios, centros vocacionales, jardines comunitarios, parques, espacios

recreativos, paradas de buses, accesos peatonales, mejoras al alumbrado de calles, señalización, instalaciones para el sector seguridad y justicia, así como otros proyectos de infraestructura de pequeña escala que se acuerde entre las Partes.

#### D. Monto del Convenio

Presupuesto total estimado: \$14,637, 541.74, de los cuales, fondos de donación de USAID: \$11, 710,033.39; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$ 2, 927,508.35 (efectivo: \$ 2,127,508.35 y especies: \$ 800,000.00).

##### i. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	23.226.555,00	21.906.553,68	94%
2019	60.781.669,00	60.781.669,00	100%
2020	145.322.291,00	60.678.681,68	42%

##### ii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios Directos 2020
INFRAESTRUCTURA VIAL	1	3,671,600.49	26	8,936
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1	656,964.97	36	0
PREVENCION SITUACIONAL/CONVIVENCIA	2	18,536,659.06	156	70,672
EDUCACION	3	18,124,290.61	111	8,769
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>40,989,515.13</b>	<b>329</b>	<b>88.377</b>

##### iii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios directos 2020
ATLANTIDA	5	24,680,540.32	228	70,185
CORTES	1	8,636,500.70	60	17,641
FRANCISCO MORAZAN	1	7,672,474.11	41	551
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>40,989,515.13</b>	<b>329</b>	<b>88.377</b>

##### iv. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2020
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	19,501,460.44
GASTO OPERATIVO DEL PROGRAMA	187,706.11
<b>TOTAL</b>	<b>19,689,166.55</b>

## E. Principales Logros (octubre a diciembre 2020)

### COMPONENTE TÉCNICO

#### A. PROYECTOS FINALIZADOS

A la fecha se reporta la finalización de 1 proyecto finalizado en el cuarto trimestre del 2020, sumando un total de 18 proyectos del plan de trabajo.

No.	UBICACIÓN			Nombre del Proyecto	Monto	Estatus actual de Proyectos
	Departamento	Municipio	Comunidad			
1	Atlántida	La Ceiba	Col. Las Mercedes	Construcción Kinder Mirian Lobo	L. 2,999,675.92	F
2	Atlántida	La Ceiba	Col. Las Mercedes	Ampliación y Mejoras CEB Marco Antonio Ponce	L. 4,826,051.18	F
3	Atlántida	La Ceiba	Col. Las Mercedes	Ampliación Centro de Alcance	L. 1,644,821.01	F
4	Atlántida	La Ceiba	Sector Bonitillo	Construcción Posta Policial Bonitillo	L. 4,750,000.00	F
5	Atlántida	La Ceiba	Sector Bonitillo	Reparación CEB Miquel Paz Barahona	L. 137,305.22	F
6	Atlántida	Tela	Col. San Alejo	Reparación Instituto Triunfo de la Cruz Fase I	L. 974,243.14	F
7	Cortés	Choloma	Col. La Granja 1 y 2	Pavimentación Calle Principal hacia los Juzgados (Ruta Segura)	L. 2,892,602.76	F
8	Cortés	Choloma	Sector López Arellano	Pavimentación Calle Principal Col. Lopez Arellano (Ruta Segura)	L. 3,054,996.99	F
9	Cortés	San Pedro Sula	Col. Que Mayo, S. Rivera	Obras Complementarias CEB José Antonio Peraza	L. 2,572,000.59	F
10	Cortés	San Pedro Sula	Col. Central, S. Rivera Hdez	Reparación Escuela Carlos Rivera López	L. 2,676,001.97	F
11	Francisco Morazán	MDC	Barrio La Moncada	Reparación de Casa Alianza Centro	L. 4,271,040.32	F
12	Francisco Morazán	MDC	Col. Estados Unidos	Mejoras Centro de Alcance (CDA) Estados Unidos	L. 240,000.00	F
13	Francisco Morazán	MDC	Col. Las Ayestas	Mejoras al Centro de Alcance (CDA) Las Ayestas	L. 1,193,312.20	F
14	Francisco Morazán	MDC	Col. Las Torres	Reparación Instituto Reinaldo Narváez Rosales	L. 2,922,825.21	F
15	Francisco Morazán	MDC	Col. Nueva Suyapa	Construcción Ruta Segura a Centro de Alcance	L. 3,684,432.26	F
16	Cortés	San Pedro Sula	Sector Satellite	UMEP-7 Reparación y Ampliación CDA Arenales	L. 960,000.00	F
17	Cortés	San Pedro Sula	Predios del Hospital Mario Catarino Rivas	Acondicionamiento y Mejoras al laboratorio de Virología de SPS	L. 2,242,000.00	F

#### B. PROYECTOS EN EJECUCIÓN

A la fecha se están ejecutando 13 proyectos, de los cuales 2 son orientados a fortalecer el sistema de salud y el resto en educación y la seguridad ciudadana a través de la recuperación de espacios y apoyo a la infraestructura de los operadores de justicia del país.

#### C. COMPONENTE SOCIAL

Se llevaron a cabo capacitaciones a los comités y personal de mano de obra en temas de Bioseguridad, también se ha fortalecido a la comunidad en temas de Género, cumpliendo los indicadores del Plan de monitoreo y Plan de Género del programa.

## PROYECTOS DE EMERGENCIA

INVERSIÓN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA ICS							
ítem	Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Aldea/Colonia	Monto total de	% Avance físico	Estatus
1	Laboratorio de Virología de La Ceiba	Atlántida	La Ceiba	Col. San José	L. 3825,738.91	100%	Cierre
2	Clinica y sala de descanso de La Ceiba	Atlántida	La Ceiba	Col. Las Brisas	L. 6146,903.35	96%	Ejecución
3	Reparación CEIN Y Ampliación MAIE,	Atlántida	La Ceiba	Col. Sutrafscó	L. 2575,044.55	97%	Ejecución
4	Reparación CEB Claudio Barrera, Colonia	Atlántida	La Ceiba	San Judas	L. 5473,876.39	95%	Ejecución
5	Ampliación CEB Dr. Alfonso Lacayo Sector	Cortés	SPS	Sector Rivera Hernández	L. 6000,000.00	100%	Cierre
6	Escuela Alex E. Alanis Lagos	Cortés	SPS		L. 480,000.00	100%	Cierre
7	Techado a Cancha Multiusos de la colonia	Cortés	Choloma	Col. Japón	L. 1200,000.00	100%	Cierre
8	Construcción de Obras de Confianza CEB	Atlántida	Tela	Tornabé	L. 474,112.47	40%	Ejecución
9	Reparación Modulo Sanitario CEB Antonio	Atlántida	Tela	Barrio San Antonio	L. 472,405.39	40%	Ejecución
10	Reparación Instituto Triunfo de la Cruz	Atlántida	Tela	Col. San Alejo	L. 3895,772.66	99%	Ejecución
11	Espacio Físico Municipal	Atlántida	La Ceiba	Barrio Centro	L. 1920,000.00	70%	Ejecución
12	*Construcción de Centro de Alcance, Barrio	Atlántida	La Ceiba	La Isla	L. 960,000.00	100%	Cierre
13	Reparación y obras complementarias	Atlántida	La Ceiba	La Isla	L. 5605,150.25	100%	Cierre

Nota: los proyectos de emergencia (ítem 1 y 2) se realizaron mediante licitación y están siendo ejecutados por contratista en un plazo de ejecución máxima de 60 días calendario.

### **i. Problemática en la ejecución del IV trimestre**

- Se ha mantenido el estado de emergencia decretado por el Gobierno de la República de Honduras por la Pandemia de COVID-19, lo cual genera atrasos por las restricciones en la libre circulación (ya que se estaba atendiendo por dígitos).
- Los proyectos sufrieron atrasos y otros experimentaron daños ocasionados por los Huracanes Eta y IOTA, en el mes de noviembre trayendo como consecuencia la suspensión de los proyectos y reorientar recursos para reparaciones ocasionados por estos fenómenos.
- Otro de los problemas experimentados es el valor presupuestario asignado, ya que actualmente aparece el mismo monto que a inicio de año, para lograr los objetivos reajustados y planificados, asimismo se ha solicitado la disminución del monto para fondos externos y para fondos nacionales, sin embargo, la modificación no fue realizada por SEFIN, y en consecuencia porcentajes de ejecución saldrán bajos para el programa.

### **Acciones realizadas por la DIM:**

- El equipo de formulación y supervisión de los proyectos hicieron las respectivas valoraciones de las obras para estimar los daños y las acciones a llevar a cabo afectados por los huracanes descritos anteriormente.

## Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)

### ii. Antecedente

Las pobres condiciones sociales y económicas son especialmente pronunciadas en el occidente de Honduras, extrema pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático, bajos niveles educativos, migración, falta de acceso a los servicios básicos y otros retos socioeconómicos son endémicos. La provisión de servicios básicos de educación y nutrición son escasos en la zona de occidente y es difícil el acceso a los ya existentes, así mismo la gestión de servicios de educación, nutrición y agua y saneamiento son deficientes por lo que los ciudadanos cuentan además con pocos espacios de participación para mejorar sus vidas a nivel de hogar y sus vidas productivas, lo que genera una gran brecha de pobreza.

En este sentido se busca a través de proyectos de infraestructura de pequeña escala, la generación de accesos para la comunidad a espacios de participación que sirvan como plataforma para impulsar el desarrollo sostenible de la región, logrando satisfacer necesidades no satisfechas de algunos de los servicios básicos para generar un efecto multiplicador en la zona occidental del país.

Actualmente, la **AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID)** en apoyo al Gobierno de Honduras, ha asignado fondos de donación para la ejecución de proyectos de infraestructura a través de la **SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO, FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (SEDECOAS/FHIS)**, que vengán a mejorar las condiciones en las comunidades seleccionadas en el occidente de Honduras.

En base a lo anterior, surge la Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras, mediante la cual se ha considerado proveer esfuerzos de infraestructura a pequeña escala para mejorar la entrega de servicios a la población, mejorando condiciones de pobreza, vulnerabilidad al cambio climático, bajos niveles educativos e inseguridad alimentaria debido a la falta de acceso a servicios básicos. A su vez con esto se pretende crear una plataforma de participación ciudadana para cimentar las bases de una estructura comunitaria más efectiva, jugando un rol importante en la mejora de la entrega de servicios locales en el Occidente de Honduras. - El área de intervención será enfocada en las zonas de mayor pobreza, específicamente está orientada a seis departamentos del Occidente de Honduras.

Se ha planteado como meta beneficiar comunidades ubicadas en los seis departamentos de la zona de occidente de Honduras, su mayoría de la zona rural, habitantes en comunidades que presentan condiciones de pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático, bajos niveles educativos, migración y falta de acceso a servicios público.

La administración y ejecución de la Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH), financiado con fondos USAID, estará a cargo del SEDECOAS/FHIS, a través de la Dirección de Infraestructura Mayor (DIM).

### iii. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en los departamentos de Ocotepeque, la Paz, Copan, Intibucá, Santa Bárbara y Lempira y zonas occidentales específicas de intervención identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

### iv. Monto del Convenio

El monto total de la Actividad es de \$3,750,000.00 (USAID \$ 3,000,000.00, Gobierno de Honduras \$ 750,000.00).

### v. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2019	6.190.650,00	5.981.569,54	97%
2020	65.583.096,00	13.336.794,49	20%

### vi. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios Directos 2020
EDUCACION	0	7,130,810.98	113	471
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>7,130,810.98</b>	<b>113</b>	<b>471</b>

**vii. Avance por Departamento**

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios directos 2020
INTIBUCÁ	0	2,907,439.55	53	248
LA PAZ	0	1,194,035.45	18	79
OCOTEPEQUE	0	3,029,335.98	42	144
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>7,130,810.98</b>	<b>113</b>	<b>471</b>

**viii. Otras Inversiones**

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2020
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	6,139,074.82
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO	66,908.69
<b>TOTAL</b>	<b>6,205,983.51</b>

**ix. Principales Logros (octubre-diciembre 2020)**

**A. PROYECTOS FINALIZADOS**

A la fecha no se reportan proyectos finalizados en vista que iniciaron en el último trimestre del 2020.

**B. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**

A continuación, se presentan los proyectos en ejecución:

INVERSIÓN PILOTO DE INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE DE HONDURAS - PIOH							
ítem	Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Aldea	Monto total de contrato	% Avance físico	Estatus
1	Ampliación Centro de Educación Básica Francisco Morazán	Intibucá	Yamaranguila	Planes	L. 4748,951.39	98%	Ejecución
2	Reposición Escuela Unión YFe	La Paz	San José	Cerro Bueno	L. 3618,292.58	87%	Ejecución
3	Ampliación CEB Tiburcio Carías Andino	Intibucá	Jesús de Otoro	Barrio Santa Cruz	L. 4397,544.84	15%	Ejecución
4	Ampliación Escuela Eusebio Amaya Gómez	Lempira	Belén	La Puerta	L. 4830,980.59	3%	Ejecución
5	Construcción de Cisternas y Cambio de	Francisco Morazán	M.D.C.	Tegucigalpa	L. 1787,515.91	96%	Ejecución
6	Construcción Clínicas y Área de Descanso	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Santa Bárbara	L. 5117,997.40	85%	Ejecución
7	Construcción de Área de Descanso para	Cortés	San Pedro Sula	San Pedro Sula	L. 1281,688.19	56%	Ejecución
8	Construcción de Laboratorio de Virología en	Copán	Santa Rosa de Copán	Barrio El Calvario	L. 3877,531.86	99%	Ejecución
9	Rehabilitación y Ampliación Hospital Dr.	Intibucá	La Esperanza	La Esperanza	L. 6.020.000,00	5%	Ejecución

**x. Problemática en la ejecución del IV trimestre 2020**

- Se ha mantenido el estado de emergencia decretado por el Gobierno de la Republica de Honduras por la Pandemia de COVID-19, lo cual genera atrasos por las restricciones en la libre circulación (ya que se estaba atendiendo por dígitos).
- Los proyectos sufrieron atrasos y otros experimentaron daños ocasionados por los Huracanes Eta y IOTA, en el mes de noviembre trayendo como consecuencia la suspensión de los proyectos y reorientar recursos para reparaciones ocasionados por estos fenómenos.
- Otro de los problemas experimentados es el valor presupuestario asignado, ya que actualmente aparece el mismo monto que a inicio de año, para lograr los objetivos reajustados y planificados, asimismo se ha solicitado la disminución del monto para fondos externos y para fondos nacionales, sin embargo la su modificación no fue realizada por SEFIN, y en consecuencia porcentajes de ejecución saldrán bajos para el programa.

**Acciones realizadas por la DIM:**

- El equipo de formulación y supervisión de los proyectos hicieron las respectivas valoraciones de las obras para estimar los daños y las acciones a llevar a cabo afectados por los huracanes descritos anteriormente.



## **PROGRAMA 15: RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA NACIONAL**

### ✓ **Respuesta a Emergencia Generados por los Huracanes Eta e Iota**

#### **i. Objetivo General**

Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción del mismo y manejo de desastre, como una estrategia para mejorar la eficiencia en la preparación para la respuesta y la recuperación post desastre naturales.

#### **ii. Focalización**

El Programa realizar intervenciones en los 5 departamento occidente: Ocotepeque, Copan, Santa Bárbara, Lempira e Intibucá.

#### **iii. Avance Financiero**

<b>Año</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Eficiencia</b>
<b>2020</b>	45,000,000.00	45,000,000.00	100%

#### **iv. Avance por Sector**

<b>SECTOR</b>	<b>Proyectos Finalizados 2020</b>	<b>Mto. Ejecutado 2020</b>
INFRAESTRUCTURA VIAL	0	45,000,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>45,000,000.00</b>

#### **v. Situación Actual**

Se llevaron a cabo las contrataciones de las medidas de emergencia necesarias para habilitar el paso en los diversos puntos de los 5 departamento de occidente, a continuación, se detallan los proyectos que actualmente se trabajan:

- a) 44 proyectos que incluyen: rehabilitación de caminos, carreras y pasos, proyectos de prevención y mitigación y habilitación de pasos de puentes en el departamento de Copán.
- b) 30 proyectos que incluyen: rehabilitación de caminos y rehabilitación de sistemas de agua potable en el departamento de Intibucá.
- c) 28 proyectos que incluyen: rehabilitación de caminos, carreras y pasos, limpieza por derrumbe entre otros en el departamento de Lempira.
- d) 35 proyectos que incluyen la rehabilitación de caminos en el departamento de Ocotepeque.
- e) 29 proyectos que incluyen: rehabilitación de caminos y rehabilitación de sistemas de agua potable en el municipio de Santa Bárbara.
