



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO

**FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
(IDECOAS/FHIS)**

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan
Operativo Anual POA-Presupuesto

I Trimestre 2019

Contenido

✓	Introducción	2
✓	Antecedentes	2
✓	Misión:	3
✓	Visión:	3
✓	Valores:	3
✓	Resumen Ejecutivo.....	4
✓	Situación actual de los programas	5
✓	Proyectos FHIS	7
✓	Ejecución Presupuestaria por Programas 2019	8
✓	Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2019	9
✓	Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Primer Trimestre 2019.....	10
✓	Ejecución Gasto Operativo Primer Trimestre del 2019	11
✓	Cuadros de Sector, Departamento y Otras Inversiones	14
▪	CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.....	15
✓	Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB).....	15
▪	CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	21
✓	Proyecto de Infraestructura Rural BCIE	21
▪	CARTERA KfW Entwicklungsbank	28
✓	Programa Mejora a la Infraestructura Escolar SE-FHIS KfW (PROMINE) FASE III y IV	28
✓	Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)	33
▪	CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID).....	41
✓	Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a través de las Energías Renovables (PODER)	41
✓	Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS).....	45

Introducción



El presente informe es la recopilación de las actividades e inversiones realizadas por el IDECOAS/FHIS durante el primer trimestre de 2019.

Antecedentes

De acuerdo al Artículo 3, Numeral 4, Artículo 13 y 20 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-001-2014 se crea el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, mismo que se encuentra integrado por el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), que fue creado mediante el Decreto Ejecutivo PCM-013-2014 publicado el 30 de Mayo del 2014 y tiene como propósito la integración institucional del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y del Servicio Autónomo Nacional de Acueducto y Alcantarillados (SANAA) y demás afines al sector, en el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS). Independiente de su integración estas instituciones continúan cumpliendo los objetivos establecidos en sus leyes constitutivas. A partir de la aprobación del Decreto PCM-013-2014 queda establecida la nueva estructura y funcionamiento del IDECOAS con las entidades que lo integran.

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es un organismo Desconcentrado de la Presidencia de la República, creado el 22 de febrero de 1990 y extendida su vida legal hasta el año 2022 según decreto No. 222-2010 cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados, en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social y/o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Asimismo, asesorará a los gobiernos locales con respecto a los procesos de captación de recursos de las fuentes de financiamiento nacionales y/o externas y las asiste en la transferencia de las capacidades

técnicas y administrativas, para convertir a estos gobiernos locales en administradores eficientes de sus programas y proyectos, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Nación en aplicación del principio de Descentralización.

Misión:

“Somos una Institución estatal, desconcentrada, técnica y captadora de recursos que promueve el desarrollo local sostenible, participativo e incluyente mediante el fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, en alianza con socios estratégicos para desarrollar obras de infraestructura y proyectos de orientación social de acuerdo al plan de nación y visión de país de forma transparente y eficiente, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable de Honduras”.

Visión:

“Ser para el año 2022, la Institución líder en gestión y fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, para la ejecución de proyectos, que contribuya equitativamente al desarrollo sustentable nacional”.

Valores:


- Ética: Ejercicio de las funciones con sujeción a las normas morales que promuevan la confianza de la población hondureña.
- Integridad: Actuación sustentada en la honradez, prudencia, entereza, rectitud y firmeza.
- Compromiso: Ejecución de proyectos que coadyuven al desarrollo local.
- Transparencia: Amplia difusión de información sobre nuestras actuaciones. Rendición de cuentas ante la sociedad.
- Lealtad: Actuar con fidelidad y rectitud hacia el FHIS y compañeros de trabajo, con el objetivo de identificarse con la institución.
- Equidad: El FHIS no hace distinción de credo, raza, de ninguna otra forma de discriminación humana.

Resumen Ejecutivo

El IDECOAS/FHIS, llega hasta los lugares más recónditos del país, para contribuir a mitigar las necesidades de la población más pobre y vulnerable a través de respuestas rápidas y concretas con proyectos de Agua y Saneamiento, Educación, Electrificación Rural, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural.

El presupuesto del FHIS para la gestión 2019 al 31 de marzo asciende a 732.6 Millones de Lempiras:

Fuente	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	% de Participación en el Presupuesto Vigente
BID	L. 117,716,409.00	L. 117,716,409.00	16.07%
BCIE	L. 15,809,640.00	L. 15,809,640.00	2.16%
USAID	L. 141,691,372.00	L. 111,691,372.00	15.25%
GOH*	L. 319,853,560.00	L. 321,453,560.00	43.88%
KfW	L. 185,953,992.00	L. 165,953,992.00	22.65%
TOTAL	L. 781,024,973.00	L. 732,624,973.00	100.00%
* Incluye costo Operativo del FHIS			

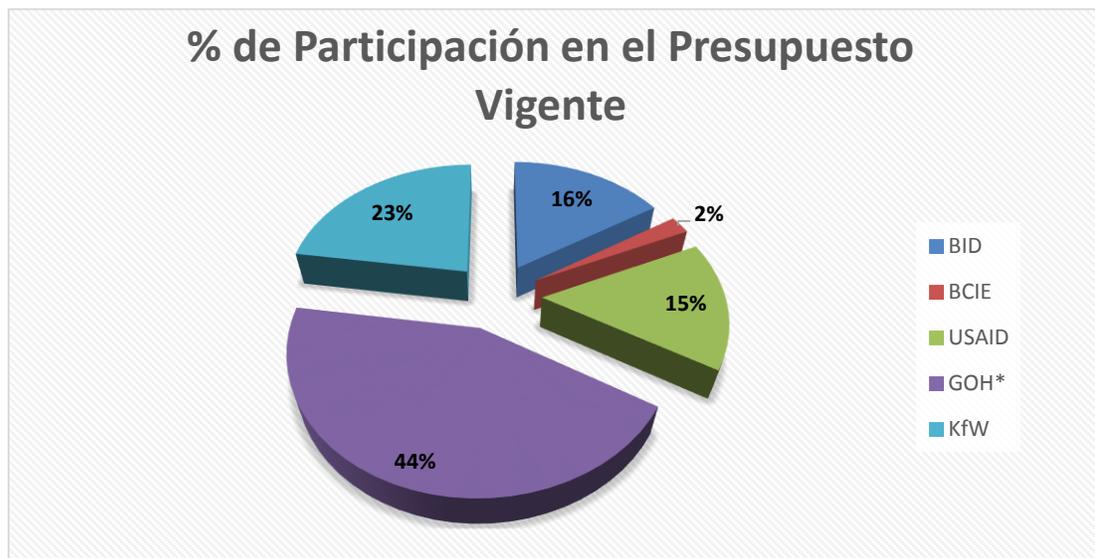

Situación Actual de los Programas:

1. Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), Se han diseñado al 100% 4 proyectos integrales de mejoramiento de barrio que incluye: mejora, reparación y/o construcción del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y sistema vial para las colonias: Nueva España, Nueva Australia, Nueva Galilea y 25 de Enero, adicional se ha ejecutado el Programa de entrenamiento deportes olímpicos y Valores en las disciplinas de: Taekwondo, Tenis de Mesa, y Levantamiento de pesas, con una participación de 606 niños y jóvenes de las colonias beneficiarias.
2. Programa Infraestructura Rural (BCIE), **Agua y Saneamiento:** actualmente se encuentran en ejecución un subproyecto de Ampliación de Sistema Alcantarillado Sanitario Casco Urbano de El Porvenir en el Municipio de Francisco Morazán, **Caminos Rurales:** se encuentran en ejecución un subproyecto de Rehabilitación de Caminos Rurales tramo Gualmuraca – Cañadas, en el municipio de Candelaria, Lempira, durante el I trimestre del año 2019, se ha incrementado la cobertura a servicios de energía eléctrica para 414 pobladores que habitan en 69 viviendas en los Municipios de San Andrés, Lempira y Vallecillo, Francisco Morazán con la construcción de dos sistemas de Electrificación Rural por Extensión de Red, mientras que con la rehabilitación de 9.78 kilómetros de caminos rurales y 0.938 km de pavimento construido se mejora el acceso a servicios de infraestructura vial para 1,442 personas focalizados en los Municipios de San Andrés y Candelaria, Lempira.
3. Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE III y IV: Se ejecutó el 89.93 % con respecto a lo planificado para el primer trimestre, se finalizó 1 proyectos con el cual se beneficiaron 1,104 personas (alumnos y personal administrativo) y se generaron 41 empleos.
4. Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR), Actualmente se tiene una cartera de 39 proyectos de infraestructura aprobados para ejecutar con el monto del convenio. De dichos proyectos ya se terminaron 24 obras, 4 proyectos en ejecución y 2 proyectos en proceso de resolución de contrato debido a la falta de voluntad política del municipio y factibilidad social de las obras estas se encuentran ubicadas en La Lima, Cortes, adicionalmente se está trabajando en el Diseño y Formulación de 11 proyectos para su aprobación.

5. Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a través de las Energías Renovables (PODER), actualmente se encuentran en ejecución 5 proyectos de energía renovable, 5 proyectos ya contratados por iniciar, 1 proyectos aprobado por Comité de Operaciones y 1 proyectos en formulación.


6. Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS), actualmente el Programa se encuentra en proceso de ejecución de 1 proyecto de infraestructura, 2 proyectos por iniciar de obras.

Proyectos FHIS

Fuente	Nombre del Proyecto	Nombre Corto	Sector	Modalidad Ejecucion
BID	Programa Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	4518/BL-HO	Infraestructura Social	Centralizados
BCIE	Proyectos de Infraestructura Rural	BCIE 1736	Agua y Sanemiento, Eletrificacion y Caminos Rurales	Descentralizados/ Centralizados
KFW	Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE III y IV	PROMINE	Infraestructura Escolar	Descentralizados
	Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras	CONVIVIR	Infraestructura Social y Fortalecimiento de las Capacidades de los Jóvenes	Descentralizados
USAID	Programa de Oportunidades para el Desarrollo a través de Energía Renovable	PODER	Soluciones y tecnologías haciendo uso de las energías renovables orientados a la mejora de procesos productivos logrando atacar las causa de pobreza e inseguridad alimentaria	PEC/Centralizados
	Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana	ICS	Recuperacion de espacio públicos e infraestructura escolar para la mejora de la seguridad ciudadana	Centralizados


Ejecución Presupuestaria por Programas 2019

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Monto Planificado I Trimestre	Devengado del I Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% Ejecución I Trimestre/ Planificado I Trimestre	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
Programa 1: Actividades Centrales	L. 319,853,560.00	L. 321,453,560.00	L. 73,160,209.00	L. 46,428,566.41	L. 46,428,566.41	L. 275,024,993.59	63%	14%
Programa 11: Infraestructura Rural	L. 15,809,640.00	L. 15,809,640.00	L. 5,983,325.00	L. 4,682,086.16	L. 4,682,086.16	L. 11,127,553.84	78%	30%
Programa 12: Infraestructura Escolar	L. 123,157,419.00	L. 103,157,419.00	L. 19,756,885.00	L. 17,768,187.45	L. 17,768,187.45	L. 85,389,231.55	90%	17%
Programa 14: Fomento al Desarrollo Local	L. 286,794,651.00	L. 256,794,651.00	L. 31,280,370.00	L. 8,145,286.08	L. 8,145,286.08	L. 248,649,364.92	26%	3%
Programa 17: Infraestructura Productiva	L. 35,409,703.00	L. 35,409,703.00	L. 11,803,235.00	L. 2,342,683.97	L. 2,342,683.97	L. 33,067,019.03	20%	7%
TOTAL	L. 781,024,973.00	L. 732,624,973.00	L. 141,984,024.00	L. 79,366,810.07	L. 79,366,810.07	L. 653,258,162.93	56%	11%

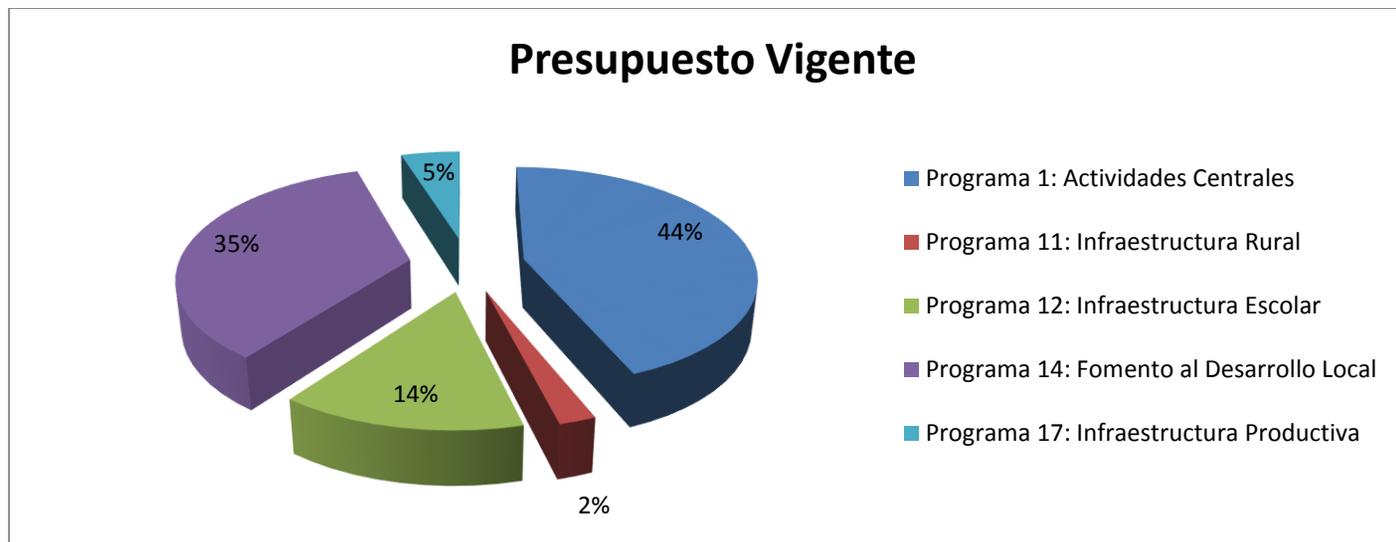


Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2019

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente 2019	Devengado del I Trimestre	Devengado Acumulado 2019	% Ejecución al I Trimestre / Presupuesto Vigente
Gasto Operativo/Gobierno	L. 319,853,560.00	L. 321,453,560.00	L. 46,428,566.41	L. 46,428,566.41	14%
Proyecto de Infraestructura Rural 1736-BCIE	L. 15,809,640.00	L. 15,809,640.00	L. 4,682,086.16	L. 4,682,086.16	30%
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar, KfW VIII	L. 123,157,419.00	L. 103,157,419.00	L. 17,768,187.45	L. 17,768,187.45	17%
Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras CONVIVIR	L. 62,796,573.00	L. 62,796,573.00	L. 2,407,624.82	L. 2,407,624.82	4%
Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana	L. 106,281,669.00	L. 76,281,669.00	L. 2,500,000.00	L. 2,500,000.00	3%
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	L. 117,716,409.00	L. 117,716,409.00	L. 3,237,661.26	L. 3,237,661.26	3%
Programa de Oportunidades para el Desarrollo a través de Energía Renovable	L. 35,409,703.00	L. 35,409,703.00	L. 2,342,683.97	L. 2,342,683.97	7%
TOTAL	L. 781,024,973.00	L. 732,624,973.00	L. 79,366,810.07	L. 79,366,810.07	11%

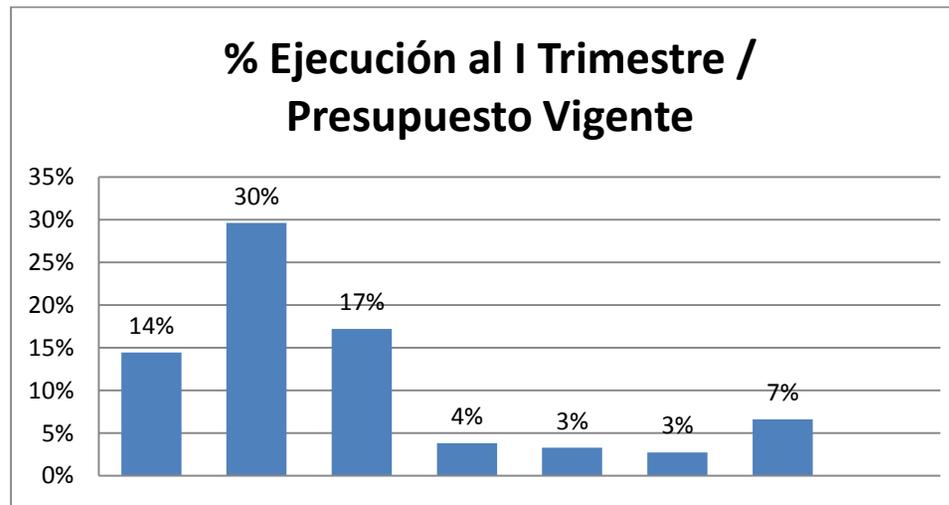

Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Primer Trimestre 2019

Grupo	Aprobado	Presupuesto Vigente por Grupo	Devengado I Trimestre	Devengado Acumulado al I Trimestre	Disponible	% Ejecución I Trimestre/ Presupuesto Vigente	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
SERVICIOS PERSONALES	L. 154,452,754.00	L. 156,052,754.00	L. 30,879,127.79	L. 30,879,127.79	L. 125,173,626.21	20%	20%
SERVICIOS NO PERSONALES	L. 126,293,052.00	L. 123,413,052.00	L. 11,675,755.92	L. 11,675,755.92	L. 111,737,296.08	9%	9%
MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 7,526,183.00	L. 7,526,183.00	L. 356,599.09	L. 356,599.09	L. 7,169,583.91	5%	5%
BIENES CAPITALIZABLES	L. 484,680,444.00	L. 424,391,301.00	L. 23,739,178.59	L. 23,739,178.59	L. 400,652,122.41	6%	6%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. 8,072,540.00	L. 8,072,540.00	L. 530,645.08	L. 530,645.08	L. 7,541,894.92	7%	7%
OTROS GASTOS	L. -	L. 13,169,143.00	L. 12,185,503.60	L. 12,185,503.60	L. 9,386,558.88	93%	93%
Total	L. 781,024,973.00	L. 719,455,830.00	L. 79,366,810.07	L. 79,366,810.07	L. 652,274,523.53	11%	11%

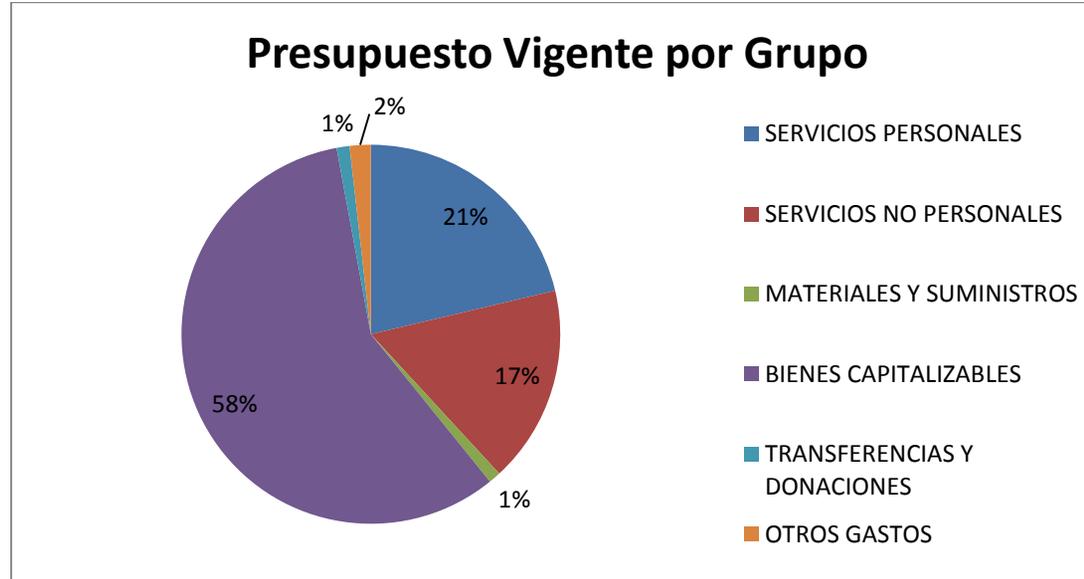

Ejecución Gasto Operativo Primer Trimestre del 2019

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
1100	Sueldos Básicos	16,422,813.00	4,158,092.68	0.00
11400	Adicionales	1,115,626.00	641,695.63	0.00
11510	Decimotercer Mes	1,368,568.00	3,777.78	0.00
11520	Decimocuarto Mes	1,368,568.00	256,343.83	0.02
11600	Complementos	1,169,521.00	658,154.08	0.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	2,381,308.00	607,917.64	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	593,473.00	136,601.90	0.00
26110	Pasajes Nacionales	84,189.00	0.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	180,000.00	45,705.40	258.21
29100	Ceremonial y Protocolo	504,248.00	45,619.19	0.84
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	136,830,857.00	0.00	0.00
51220	Ayuda Social a Personas	68,400.00	15,000.00	0.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	4,140.00	0.00	0.00
1100	Sueldos Básicos	16,441,293.00	4,189,623.26	0.00
11400	Adicionales	16,355,210.00	378,842.47	5,769.71
11510	Decimotercer Mes	1,370,108.00	4,153.16	0.84
11520	Decimocuarto Mes	1,370,108.00	269,163.42	2,734.86
11600	Complementos	1,035,520.00	428,147.57	3,962.94
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	2,383,988.00	612,951.48	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	1,117,852.00	244,391.55	0.00
12910	Contratos Especiales	47,974,677.00	8,045,528.66	813.28
16200	Compensaciones	1,608,301.00	0.00	6,993.00
21110	Suministro De Energía Eléctrica	191,085.00	0.00	0.00
21200	Agua	56,160.00	0.00	0.00
22900	Otros Alquileres	21,649.00	0.00	0.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	90,324.00	0.00	0.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	996,060.00	227,621.00	0.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	75,048.00	0.00	0.00
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	64,946.00	0.00	0.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	112,041.00	0.00	0.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	115,459.00	0.00	0.00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	480,000.00	135,000.00	0.00
24500	Servicios de Capacitación	86,600.00	0.00	0.00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	3,638,279.00	1,366,300.00	0.00
25100	Servicio de Transporte	12,000.00	0.00	0.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,138,770.00	426,824.98	0.02
25400	Primas y Gastos de Seguro	1,731,631.00	163,453.86	0.14
26210	Viáticos Nacionales	120,000.00	15,546.88	94.24
27210	Tasas	154,262.00	0.00	0.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	261,851.00	55,658.25	621.75
32310	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	0.00
33100	Productos de papel y cartón	215,761.00	13,713.75	0.00

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
33300	Productos de Artes Gráficas	37,885.00	0.00	0.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	29,186.00	23,760.00	0.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	432,972.00	0.00	0.00
35100	Productos Químicos	12,027.00	12025.00	2.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	16,036.00	0.00	0.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	18,041.00	12970.70	0.30
35620	Diesel	391,953.00	0.00	0.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	144,324.00	0.00	0.00
36400	Herramientas Menores	6,014.00	0.00	0.00
36930	Elementos de Ferretería	21,649.00	7641.06	7.94
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	84,189.00	54884.01	0.18
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	247,652.00	6,863.95	0.29
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	50,513.00	2725.50	0.50
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	4,009.00	0.00	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	535,039.00	49406.30	0.20
99720	Para Erogaciones de Capital por Devolución de Prestamos	13,169,143.00	12,185,503.60	983,639.40
11100	Sueldos Básicos	3,804,000.00	992,781.93	0.00
11400	Adicionales	250,000.00	100,000.00	0.00
11510	Decimotercer Mes	317,000.00	0.00	0.00
11520	Decimocuarto Mes	317,000.00	24,186.11	0.00
11600	Complementos	233,500.00	80,000.00	0.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	551,580.00	145,507.50	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	118,784.00	32,347.50	0.00
24300	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	100,000.00	30698.88	88.64
33700	Especies Timbradas y Valores	38,030.00	0.00	0.00
11100	Sueldos Básicos	2,160,000.00	553,169.16	0.00
11400	Adicionales	121,000.00	50,541.67	0.00
11510	Decimotercer Mes	180,000.00	0.00	0.00
11520	Decimocuarto Mes	180,000.00	10041.67	0.00
11600	Complementos	126,300.00	54,935.00	0.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	313,200.00	82,215.00	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	84,846.00	21,565.00	0.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	216,486.00	21620.00	0.00
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	168,378.00	0.00	0.00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	193,598.00	88,000.00	0.00
11100	Sueldos Básicos	2,124,000.00	552,228.97	0.00
11400	Adicionales	92,000.00	52,600.00	0.00
11510	Decimotercer Mes	177,000.00	0.00	0.00
11520	Decimocuarto Mes	177,000.00	26,133.34	0.00
11600	Complementos	116,100.00	67,594.80	0.00

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	307,980.00	80,475.00	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	84,846.00	21,565.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	150,000.00	20,531.25	38.35
11100	Sueldos Básicos	20,352,126.00	5,147,380.34	294,424.80
11400	Adicionales	1,193,342.00	529,346.55	15,502.84
11510	Decimotercer Mes	1,696,010.00	9,005.77	0.00
11520	Decimocuarto Mes	1,696,010.00	127,016.59	0.00
11600	Complementos	1,406,008.00	517,671.96	3,908.48
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	2,951,058.00	754,875.32	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	845,130.00	210,558.50	0.00
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	190,404.00	14,000.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	1,849,518.00	508,365.06	524.17
TOTAL PROGRAMA		321,453,560.00	46,428,566.41	1,319,387.94

Cuadro por Sector 2019 (Ejecutado)

SECTOR	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios directos 2019
AGUA Y SANEAMIENTO	0	147,698.52	0	0
ELECTRIFICACION	2	766,241.64	21	414
INFRAESTRUCTURA VIAL	3	1,320,750.92	53	1,442
PREVENCION SITUACIONAL/CONVIVIENCIA	1	5,845,820.35	58	2,308
EDUCACION	1	17,943,422.49	96	3,999
RIEGO	0	878,483.81	0	0
ENERGIA RENOVABLE	3	1,464,200.16	0	338
TOTAL	10	28,366,617.89	228	8,501

Cuadro por Departamento 2019 (Ejecutado)

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios directos 2019
ATLANTIDA	0	1,963,526.60	38	1,957
COMAYAGUA	0	1,197,139.14	10	15
COPAN	0	4,068,057.83	0	0
CORTES	0	1,189,930.53	12	1,515
FRANCISCO MORAZAN	2	2,934,439.16	48	1,989
INTIBUCÁ	2	6,063,216.47	0	247
LA PAZ	0	275,603.03	0	0
LEMPIRA	6	1,868,517.20	120	2,778
OCOTEPEQUE	0	8,069,661.98	0	0
SANTA BARBARA	0	736,525.95	0	0
TOTAL	10	28,366,617.89	228	8,501

Otras Inversiones 2019 (Ejecutado)

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2019
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	415,884.91
GASTO OPERATIVO DE PROGRAMAS	4,155,740.86
ACTIVIDADES CENTRALES FHIS	46,428,566.41
TOTAL	51,000,192.18

CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

✓ Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)



i. Antecedentes

Actualmente el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), adscrito al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS) y la Secretaría de Seguridad ejecutan conjuntamente la operación BID 4518/BL-HO denominada “Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios” el cual es un préstamo por un monto total de US\$60,000,000.00 la operación fue aprobada por el Banco Interamericano de Desarrollo en el mes de abril de 2018, posteriormente aprobada por el Congreso Nacional en el mes de octubre de 2018, y fue efectivo a partir del 28 de noviembre de 2018, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta

A partir del 15 de septiembre de 2017 se han autorizado al Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS) Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) financiamiento retroactivo para la preparación y diseño del programa. Estas inversiones se cargarán retroactivamente a los recursos del préstamo. Los gastos elegibles incluyen las categorías de obras, bienes, servicios de no consultoría, y servicios de consultoría, hasta por la suma de US\$9.000.000.00 (15% del monto propuesto del préstamo), efectuados por el Prestatario antes de la fecha de aprobación del préstamo, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el contrato de préstamo. Provisionalmente estos gastos reembolsables serán financiados con los fondos adicionales de contrapartida comunitaria del Programa de Integración de Convivencia Urbana disponibles en fuente FHIS Aportes Municipales.

ii. Objetivo

Contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones

sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

iii. Componentes

Componente 1. Mejoramiento del hábitat de barrios urbanos vulnerables (US\$18.219 millones).

El propósito de este componente es mejorar el acceso a servicios de infraestructura urbana y generar espacios con condiciones de seguridad, para incentivar una mejor convivencia y aumentar la capacidad de los ciudadanos para el cumplimiento pacífico de normas. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Infraestructura básica: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios en los siguientes barrios del Distrito Central: Monte de los Olivos, Nueva Jerusalén; Australia; 25 de Enero; Nueva España; Brisas del Mogote y Nueva Galilea teniendo como marco para las intervenciones el Plan Integral de Mejoramiento de Barrios, el cual incluye los correspondientes diseños urbanísticos, de ingeniería, la programación y presupuestos. Este instrumento es crítico para la adecuada programación de las inversiones y para facilitar el diálogo con la comunidad sobre las actividades a desarrollar. Se financiará consultorías y contratación de obras para: (i) la preparación de los Planes Integrales de Mejoramiento de Barrios (PIMB); y (ii) las inversiones en obras de infraestructura básica de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, pavimentación, drenaje pluvial, plazas y parques, equipamientos sociales y otras necesidades detectadas en los PIMB. Se promoverá la recuperación de escuelas públicas y centros de salud (operados por las entidades estatales específicas).

Convivencia y Emprendimiento a nivel barrial: promueve la participación de los vecinos en el mejoramiento de las condiciones de su entorno, así como el fortalecimiento de sus redes sociales y vecinales para mejorar el tejido social en los barrios. Se financiará: (i) capacitación de líderes, programa de deportes y valores, apoyado por el Comité Olímpico Internacional; (ii) capacitación de vecinos en áreas de empleabilidad dentro y fuera del barrio mediante la asistencia técnica de las Universidades y su vinculación con el sector empresarial, (iii) organización para utilización de sistemas de alerta temprana para desastres naturales. Todas las actividades tendrán enfoque de género.

Componente 2: Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios (US\$22.130 millones). Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios de prevención social de la violencia al ciudadano y brindar una atención oportuna a las víctimas de violencias y delitos, fortaleciendo la gestión local. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Fortalecimiento de capacidades de actores municipales. Se financiará: (i) capacitación y asistencia técnica a las autoridades locales para promover la participación ciudadana en la preparación de planes locales de prevención social de la violencia; (ii) fortalecimiento de las capacidades de los responsables de los observatorios locales, para el análisis estratégico de estadísticas del crimen y delito -incluyendo la desagregación por género-; y (iii) estrategia de comunicación a través de campañas y consultas sociales para promover medidas y valores para la reducción de violencias, respeto por las normas legales, morales, culturales y el uso de la oferta de servicios disponibles de prevención y atención a víctimas.

Intervenciones de prevención social de la violencia a nivel municipal. Se financiará: (i) programas para la atención a víctimas de VIF a través del módulo de Atención Integral Especializado (MAIE); (ii) desarrollo de protocolos para homologar la actuación de primeros respondientes para atención a víctimas, (iii) programa de prevención social de la violencia para jóvenes en situación de riesgo; (iii) modelo innovador de policía comunitaria y patrullaje policial sistemático -Hot Spots-; y (iv) mejoramiento de la infraestructura de las Jefaturas Departamentales, para ofrecer servicios policiales a la comunidad.

Componente 3. Efectividad policial. (US\$16 millones). Con el propósito de mejorar el desempeño y la calidad en la prestación de los servicios policiales, se apoyará la consolidación del sistema nacional de formación y profesionalización, así como su sistema de integridad. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Consolidación del sistema educativo policial basado en la filosofía de Policía Comunitaria. Se financiará: (i) diseño del modelo de Sistema de Formación y Profesionalización Policial, articulando sus diferentes instancias de formación (Instituto Técnico Policial -ITP-, ANAPO, Universidad y educación continua y entrenamiento), incluye mecanismos de evaluación continua del personal. Lo anterior, deberá estar sujeto a promover principios de meritocracia y transparencia en el desarrollo de la carrera policial; (ii) modernización del currículum académico para los medios y altos mandos policiales, certificado bajo la filosofía de policía comunitaria y orientando la formación a competencias para la toma de decisiones operativas. Lo anterior, incluyendo la

redefinición del perfil de ingreso de candidatos a la ANAPO. Esto considerará la incorporación de nuevos cadetes, provenientes del ITP y otros candidatos que ya hayan cursado licenciaturas y tecnicaturas en otras universidades; modernizar el régimen de formación de oficiales en el nuevo campus universitario y generar una nueva estructura de gobierno y planta de profesores-investigadores de tiempo completo (teóricos y prácticos) (iii) fortalecimiento de las capacidades pedagógicas para docentes; (iv) fortalecimiento de la integridad policial a través de la consolidación de un sistema de evaluación y rendición de cuentas; y (v) modernización de la infraestructura física y tecnológica de la Academia Nacional de Policía y el Centro de Investigación y Desarrollo Policial.

Fortalecimiento de las capacidades en investigación criminal. Se financiará: (i) programa de capacitación y especialización continua en investigación criminal en coordinación con el MP; (ii) capacitación técnica en el uso de tecnologías de la información para análisis estratégicos delictuales; e (iii) implementación de un sistema integrado de información delictiva y criminal para mejorar la resolución del delito -integrando estadísticas por categoría de género.

iv. Mecanismo de Ejecución.

Se propone contar con dos organismos ejecutores independientes, pero con responsabilidades compartidas en el diseño, implementación y evaluación de iniciativas que se realicen en la misma área geográfica. El componente 1 de esta operación será ejecutado por IDECOAS-FHIS y el componente 2 y 3 por la Secretaría de Seguridad.

- v. **Monto del Convenio:** US\$ 60,000,000.00 Millones de Dólares, según convenio de préstamo el cual se desglosa de la siguiente manera: al IDECOAS- FHIS le corresponde US\$ 20,000,000.00 Millones de Dólares y a la Secretaría de Seguridad le corresponde US\$ 40,000,000.00 Millones de Dólares.

La duración del convenio es por 5 años después de la publicación de diario La Gaceta Acuerdo Ejecutivo No. 114-2018.

vi. Avance financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	17,749,164.00	14,959,789.44	84%
2019	117,716,409.00	3,237,661.26	3%

vii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios Directos 2019
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	0	2,158,935.25	21	686
TOTAL	0	2,158,935.25	21	686

viii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios directos 2019
FRANCISCO MORAZAN	0	2,158,935.25	21	686
TOTAL	0	2,158,935.25	21	686

ix. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2019
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	1,078,726.01
TOTAL	1,078,726.01

x. Principales Logros

<i>Avances Programa</i>		
Componente 1 Mejoramiento del hábitat de barrios urbanos vulnerables		
1.0	PRODUCTO 1.1 Nueve proyectos integrales de mejoramiento de barrios (red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, equipamiento social y pavimentación), completados y siendo utilizados	
1.1	<i>Diseño de Obras y aprobaciones</i>	<ul style="list-style-type: none"> Se han diseñado al 100% 4 proyectos integrales de mejoramiento de barrio que incluye: mejora, reparación y/o construcción del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y sistema vial para las colonias: Nueva España, Nueva Australia, Nueva Galilea y 25 de Enero. Se tiene la licencia ambiental para 2 proyectos integrales; hay 2 proyectos que tienen en trámite el licenciamiento ambiental. Se tiene la aprobación del SANAA y ENEE del diseño de sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y sistema eléctrico de 4 proyectos integrales de mejoramiento de barrio. Se ha diseñado el 100% de 6 obras de equipamiento social: 4 Centros comunales,

		<p>Ampliación de 1 centro educativo y reparación de 1 cancha polideportiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inició el proceso de adjudicación para la supervisión de obras de 4 proyectos integrales. • Se adjudicó el diseño de 5 proyectos integrales de mejoramiento de barrio. <p>Nota: el producto 1.1 indica que hay 9 proyectos integrales de mejoramiento de barrio, sin embargo, para la ejecución del presente año se pretende lograr la adjudicación de 4 proyectos; al año 2020 se realizarán los procesos de adquisición para la construcción de proyectos integrales en los 5 barrios restantes.</p>
2.0	PRODUCTO 1.2 Jóvenes de los barrios intervenidos capacitados	
2.1	<i>Programa de Deportes y Valores</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha ejecutado el Programa de entrenamiento deportes olímpicos y Valores en las disciplinas de: Taekwondo, Tenis de Mesa, y Levantamiento de pesas, con una participación de 606 niños y jóvenes de las colonias beneficiarias.
1.2	<i>Capacitaciones en valores</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizó el plan de capacitación para jóvenes y niños. • Se adjudicaron las meriendas para iniciar las capacitaciones en valores en el mes de abril.
3.0	PRODUCTO 1.3 Mujeres de los barrios intervenidos capacitadas en emprendedurismo y empleo	
3.1	<i>Capacitaciones en emprendimiento y empleabilidad.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizó el plan de capacitación.

xi. Problemática

- En el producto 1.1, Es necesario obtener el licenciamiento de 2 proyectos integrales de mejoramiento de barrio; para iniciar el proceso de adjudicación de obras de infraestructura ya que es la ruta crítica del programa.

CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA

✓ **Proyecto de Infraestructura Rural BCIE**



i. Objetivo General

Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local. Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son de L. 283 millones aproximadamente.

ii. Focalización:

- En base a la metodología de selección de la mancomunidades ejecutado por PIR, que toma en consideración el índice de desarrollo humano, la capacidad de gerenciamiento de la Unidades técnicas Municipales en cada mancomunidad y no más de una mancomunidad por departamento, fueron seleccionadas las mancomunidades de los departamentos de Lempira (CAFEG), Intibucá (AMFI) y Francisco Morazán (MANOFM).

iii. Tipología de Proyectos

- Electrificación Rural: proyectos para habilitar o mejorar el acceso a electricidad teniendo los beneficiarios que aportar el 15% del monto total del proyecto.
- Agua y Saneamiento: proyectos de rehabilitación, expansión y construcción de sistemas comunales de agua y saneamiento y facilidades en áreas rurales, de las mancomunidades previamente seleccionadas.
- Caminos Rurales: proyectos de rehabilitación y mejoramiento de los caminos municipales eficientemente y utilizando métodos de empleo masivo de mano de obra aportando las comunidades beneficiadas el 15% del total del proyecto.

Monto del Convenio: L.285.0 Millones de Lempiras aproximadamente, según convenio de préstamo el tiempo de ejecución del proyecto es de 60 meses.

iv. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2011	37,790,000.00	0.00	0.00%
2012	6,393,674.00	0.00	0.00%
2013	33,774,273.00	33,771,086.72	99.99%
2014	42,465,271.00	32,714,051.57	77.04%
2015	32,683,893.00	32,295,225.85	98.81%
2016	95,056,511.00	93,906,331.81	98.79%
2017	89,155,169.00	86,922,798.37	97.50%
2018	37,332,495.00	36,390,084.05	97.48%
2019	15,809,640.00	4,682,086.16	29.62%

v. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios Directos 2019
AGUA Y SANEAMIENTO	0	147,698.52	0	0
ELECTRIFICACION	2	766,241.64	21	414
INFRAESTRUCTURA VIAL	3	1,320,750.92	53	1,442
TOTAL	5	2,234,691.08	74	1,856

vi. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios directos 2019
FRANCISCO MORAZAN	1	528,290.79	10	288
INTIBUCÁ	0	147,698.52	0	0
LEMPIRA	4	1,558,701.77	64	1,568
TOTAL	5	2,234,691.08	74	1,856

vii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2019
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	364,692.41
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	2,082,702.67
TOTAL	2,447,395.08

viii. Principales Logros

1. EJECUCIÓN FINANCIERA:

Ejecución presupuestaria al 31 de marzo 2019

Código	Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO 2019				Disponible	% Ejecución
		Lempiras					
		Aprobado	Decremento Incremento	Vigente	Ejecutado		
47	Préstamo BCIE-1736	15,809,640.00		15,809,640.00	4,682,086.16	11,112,835.09	29.62%
	Total	15,809,640.00		15,809,640.00	4,682,086.16	11,112,835.09	

2. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Durante el I trimestre 2019, se solicitaron tres (3) modificaciones presupuestarias:

- Modificación tipo traslado interno entre actividades y objetos del gasto por L 1,500,000.00, aprobada el 25 de febrero del 2019, el cual no modifica el monto global del presupuesto aprobado,
- Modificación tipo Incremento/ traslado presupuestario por L 21,200,000.00, el cual se espera sea aprobado en los primeros días del mes de abril 2019,
- Modificación tipo incremento/ traslado presupuestario por L 957,612.00, con lo que se ajustará el presupuesto vigente, la cual se encuentra en trámite ante la Secretaria de Finanzas.

Los últimos dos montos se trasladan de la estructura presupuestaria del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB).

3. EJECUCIÓN FISICA:

En el sector de **Agua y Saneamiento**, actualmente se encuentran en ejecución un subproyecto de Ampliación de Sistema Alcantarillado Sanitario Casco Urbano de El Porvenir en el Municipio de Francisco Morazán. A continuación se presenta el porcentaje de avance de obra del subproyecto mencionado y el detalle del nuevo subproyecto a ejecutarse durante el 2019:

N.	Código de Proyecto	Nombre de Proyecto	Ubicación		Porcentaje de Ejecución
			Municipio	Departamento	
1	106569	Ampliación Sistema Alcantarillado Sanitario Casco Urbano de El Porvenir	El Porvenir	Francisco Morazán	95%
2	107196	Construcción de Sistema Integral de Micro captación Pluvial y Saneamiento Básico Comunidad El Coyolar	San Marcos de la Sierra	Intibucá	<i>Por Ejecutar</i>

En el sector de **Caminos Rurales**, se encuentran en ejecución un subproyecto de *Rehabilitación de Caminos Rurales tramo Gualmuraca – Cañadas*, en el municipio de Candelaria, Lempira. El porcentaje de avance de obra y la ubicación del mismo se detalla a continuación, así también el detalle de los subproyectos a ejecutar durante el 2019:

N	Cód. de Proyecto	Nombre de Proyecto	Ubicación		Porcentaje de Ejecución
			Municipio	Departamento	
1	107216	Rehabilitación de Caminos Rurales Gualmuraca - Cañadas	Candelaria	Lempira	85%
2	107215	Rehabilitación de Caminos Rurales Azacualpa - Buena Vista	Candelaria	Lempira	<i>Por Ejecutar</i>
3	105592	Rehabilitación de Caminos Rurales Calle San Antonio del Monte	Camasca	Intibucá	<i>Por Ejecutar</i>
4	105594	Rehabilitación de Caminos Rurales Calle Agua Zarca	Camasca	Intibucá	<i>Por Ejecutar</i>

Durante el I trimestre 2019, se reportan la finalización de 9.78 km de caminos rurales rehabilitados, correspondiente a los tramos *La Puerta – San Buenaventura* en el municipio de San Andrés, Lempira (5.42km) y el *tramo Azacualpa – San Lorenzo* en el municipio de Candelaria, Lempira (4.36 km), además de la Construcción del Pavimento del Kilómetro Municipal con una longitud de 0.938 km en el Casco Urbano del municipio de Candelaria, Lempira. Con la entrega de estos tres subproyectos se benefician a 1,442 personas y generando 53 empleos temporales durante la ejecución de las obras.

En el sector de **Electrificación Rural** por extensión de red, a la fecha, no se tienen subproyectos en ejecución, ya que han sido finalizados todos los subproyectos. Programados a ejecutarse. Durante el I trimestre 2019, finalizaron los subproyectos de Electrificación Rural por Extensión de Red de *Comunidad Las Delicias Aldea San Cristóbal*, en el Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán construyendo 48 acometidas domiciliarias y el subproyecto de la *Comunidad La Sidra Aldea Guaxinlaca*, en el Municipio de San Andrés, Lempira, con 21 acometidas domiciliarias construidas. La construcción de subproyectos por extensión de la red también incluyen la construcción de 5.485 kilómetros de línea entre primaria y secundaria entre los dos sistemas, hincado de postes de madera curada, instalación de lámparas de vapor de sodio de 100 watts y la instalación de transformadores de potencia, con una proyección a 15 años de servicio para 414 beneficiarios. Durante la ejecución de las obras se generaron 21 empleos temporales en la zona.

4. SITUACIÓN DE CONTRATOS Y LICITACIONES

Durante el I trimestre 2019, se han adjudicado tres subproyectos del Sector Caminos Rurales por un total de L 10.13 Millones, de los cuales L 9.62 Millones serán financiados con fondos del Préstamo,

así como el contrato de la consultoría de supervisión de dos subproyectos por un monto de L 0.27 Millones, detallado a continuación:

N.	Nombre del Proyecto	Código	Fecha de Adjudicación	Fecha de Firma de Contrato	Monto Estimado Aporte FHIS	Monto Total del Contrato	Estatus
1	Rehabilitación de Caminos Rurales Calle Agua Zarca y Rehabilitación de Caminos Rurales Calle San Antonio del Monte, Municipio de Camasca, Departamento de Intibucá (Licitación por Lotes)	105594 105592	13/3/2019	25/3/2019	L 3,636,326.29	L 3,827,711.88	Contratos firmados por el ejecutor, en trámite de firma por parte del Ministro.
2	Rehabilitación de Caminos Rurales Azacualpa – Buena Vista Municipio de Candelaria, Departamento de Lempira (SEGUNDO PROCESO)	107215	3/4/2019	PENDIENTE	L 5,984,643.03	L 6,299,624.24	Pendiente firma de contrato
Total					L 9,620,969.32	L 10,127,336.12	

En contratación, existe un proceso en curso, perteneciente al Sector Agua y Saneamiento, por un monto equivalente a L 4.87 Millones, tal como se describe en la siguiente tabla:

N.	Nombre del Proyecto	Código	Monto Estimado Aporte FHIS	Monto Total del Contrato	Estatus
1	Construcción de Sistema Integral de Micro captación Pluvial y Saneamiento Básico, Aldea El Coyolar, Municipio de San Marcos de la Sierra, Intibucá	107196	L 4,873,431.73	L 4,873,431.73	En proceso de evaluación de ofertas
Total			L 4,873,431.73	L 4,873,431.73	

Actualmente, no existen procesos pendientes de publicación.

5. RESULTADOS DE GESTION (FP02)

Con fondos del Préstamo del BCIE-1736, durante el I trimestre del año 2019, se ha incrementado la cobertura a servicios de energía eléctrica para 414 pobladores que habitan en 69 viviendas en los Municipios de San Andrés, Lempira y Vallecillo, Francisco Morazán con la construcción de dos sistemas de Electrificación Rural por Extensión de Red, mientras que con la rehabilitación de 9.78 kilómetros de caminos rurales y 0.938 km de pavimento construido se mejora el acceso a servicios de infraestructura vial para 1,442 personas focalizados en los Municipios de San Andrés y Candelaria, Lempira.

En total, se benefician 1,856 pobladores de la zona rural con la ejecución de estos cinco proyectos y brindando empleo directo temporal a 74 personas durante las actividades constructivas.

6. DESCENTRALIZACIÓN A LAS MANCOMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL PIR

Con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE Préstamo No. 1736, desde el inicio del Proyecto al 31 de marzo del 2019, se han transferido las Mancomunidades beneficiarias MANOFM, CAFEG y AMFI un monto de L 157.4 Millones para la ejecución de subproyectos de infraestructura de los sectores Agua & Saneamiento, Electrificación Rural y Caminos Rurales y fortalecimiento institucional.

La UCP/PIR ha dado seguimiento a los fondos transferidos a las Mancomunidades para que sean utilizados única y exclusivamente para los fines autorizados expresamente en los respectivos convenios interinstitucionales FHIS-Mancomunidades y en los términos y condiciones establecidos en el Manual Operativo de FHIS, al tenor de las condiciones convenidas entre el Gobierno de Honduras y el BCIE bajo el Convenio de Préstamo No. 1736.

Durante el 2019 no existen movimientos en el registro de las transferencias a las Mancomunidades.

TRANSFERENCIAS PARA EJECUCIÓN DE SUBPROYECTOS DESCENTRALIZADOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ACUMULADO AL 31 MARZO 2019*

MANCOMUNIDAD	AGUA Y SANEAMIENTO	ELECTRIFICACION RURAL	CAMINOS RURALES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	TOTAL LEMPIRAS
AMFI	L 15,570,143.37	L 11,761,414.15	L 18,870,853.47	L 461,678.00	L 46,664,088.99
CAFEG	L 24,391,554.38	L 19,238,407.47	L 13,277,543.75	L 707,658.00	L 57,615,163.60
MANOFM	L 19,839,490.05	L 9,378,993.64	L 22,421,905.68	L 1,475,730.00	L 53,116,119.37
Total	L 59,801,187.80	L 40,378,815.26	L 54,570,302.90	L 2,645,066.00	L 157,395,371.96
	37.99%	25.65%	34.67%	1.68%	100.00%

*Nota: valores netos ajustados al 31 de marzo 2019, incluyen devoluciones por obra no ejecutada y rescisión de contratos.

7. DESEMBOLSOS DEL PIR

Durante el I trimestre 2019, no se registran desembolsos, ya que el 21 de noviembre del 2018 se registró el último desembolso por un monto de USD\$ 1, 775,884.55, y que corresponde a la séptima Restitución del Fondo Rotatorio, completando así el 100% del monto del Préstamo.

8. PROBLEMÁTICA FÍSICA Y FINANCIERA

- No se ha registrado problemática por disponibilidad presupuestaria ni de efectivo.
- La ejecución y entrega de productos ha sido acorde a la proyección de metas realizada a inicios del año, a pesar de los atrasos en la ejecución de los subproyectos relacionados con la entrega tardía de la contrapartida municipal (suministro de materiales), los cuales fueron solucionados aprobando ampliaciones de tiempo debidamente justificadas y utilizando estrategias para avanzar en otras actividades que no requerían el uso de estos insumos.

CARTERA KfW Entwicklungsbank

✓ **Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS**

FASE III y IV



1. Objetivo General

Fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la SE y la gestión local participativa así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico).

2. Focalización

El área de intervención del Programa comprende principalmente los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara. El Programa PROEFA de la GIZ apoya actualmente al sector educativo en Honduras. Al igual que en las fases I y II del Programa se buscará la coordinación con el Programa PROEFA de la GIZ o en su debido caso con el Programa que le siga, siempre y cuando existan medidas complementarias entre ambos programas.

3. Descripción del Proyecto

El Programa comprende la tercera fase del Programa PROMINE que se enmarca en el área de educación básica con un componente de infraestructura que complementa al Plan EfA-FTI (Education for All / Fast Track Initiative) y contribuye al logro de las Metas del Milenio en Educación en la República de Honduras y por lo tanto en general se rige por los acuerdos ya definidos para la ejecución de la primera y segunda fase. Se financiará infraestructura educativa en estrecha articulación con el Sector. La ejecución del Programa será responsabilidad de la Secretaría de Educación (SE) como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) como ente ejecutor. Los recursos del Programa se utilizarán principalmente para financiar la construcción, ampliación y/o el mejoramiento de los Centros Educativos (CE) así como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizarán mediante la modalidad descentralizada con énfasis en la ejecución comunitaria (Proyectos Ejecutados por la Comunidad – PEC-FHIS) empleada con éxito en el programa FHIS VI y VII, y en las primeras fases de PROMINE, aplicada de forma general en todos los proyectos, indistinto de su monto financiero, excepto los altamente complejos.

4. Monto del Proyecto:

Fase III:

Fondos de Crédito por un monto de € 10,000,000.00 euros, Contrapartida Nacional para IDECOAS/FHIS de €495,000 euros, Contrapartida Nacional para SE de € 250,000 euros, Contrapartida Municipal de € 600,000 euros y Contrapartida Comunitaria de € 600,000 euros.

Fecha de Firma de Contrato de Préstamo: 30/12/2013

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 15/12/2014

Fecha de Inicio: 16 de Septiembre 2015 (Se considera la fecha de inicio de la Consultoría)

Fecha de Finalización de Convenio: 31/05/2019

Fase IV:

Fondos de Donación por un monto de € 15,000,000.00 euros, Contrapartida Nacional para IDECOAS/FHIS de € 424,000 euros, Contrapartida Nacional para SE de € 218,000 euros, Contrapartida Municipal de € 515,000 euros y Contrapartida Comunitaria de € 514,000 euros

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 03/12/2015

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 17/02/2017

Fecha de Inicio: 02 de Abril 2018 (Se considera la fecha de inicio de la Consultoría)

Fecha de Finalización de convenio: 30/11/2020

i. Avance Financiero PROMINE FASE III y IV

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2016	145,687,475.00	142,916,817.45	98.10%
2017	107,279,375.00	96,731,967.93	90.17%
2018	53,035,502.00	50,951,601.81	96.07%
2019	103,157,419.00	17,768,187.45	17.22%
Presupuesto 2018 Fase III y Fase IV			

ii. Avance Físico por Sector PROMINE FASE III y IV

SECTOR	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios Directos 2019
EDUCACION	1	16,722,682.77	41	1,104
TOTAL	1	16,722,682.77	41	1,104

iii. Avance Físico por Departamento PROMINE FASE III y IV


DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios directos 2019
COPAN	0	4,068,057.83	0	0
INTIBUCÁ	0	4,011,581.90	0	0
LA PAZ	0	275,603.03	0	0
LEMPIRA	1	-	41	1,104
OCOTEPEQUE	0	8,069,661.98	0	0
SANTA BARBARA	0	297,778.03	0	0
TOTAL	1	16,722,682.77	41	1,104

iv. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2019
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	51,192.50
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	994,312.18
TOTAL	1,045,504.68


Avance físico de las obras

A. FASE III

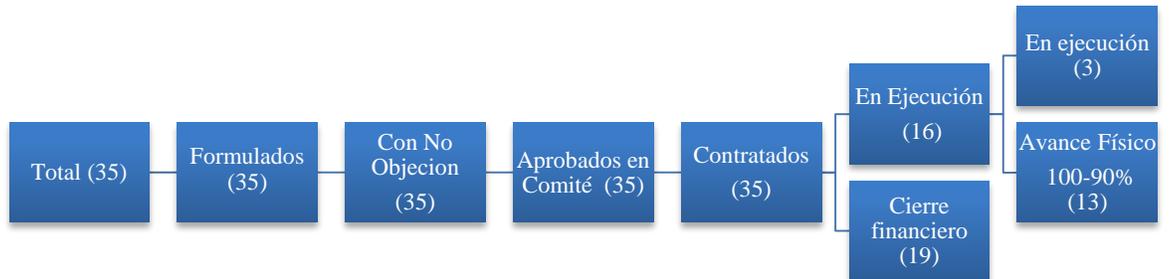

Uno de los proyectos que se encuentran en ejecución se está analizando suspenderlo debido a problemas estructurales que está presentando en la infraestructura existente.

B. FASE IV

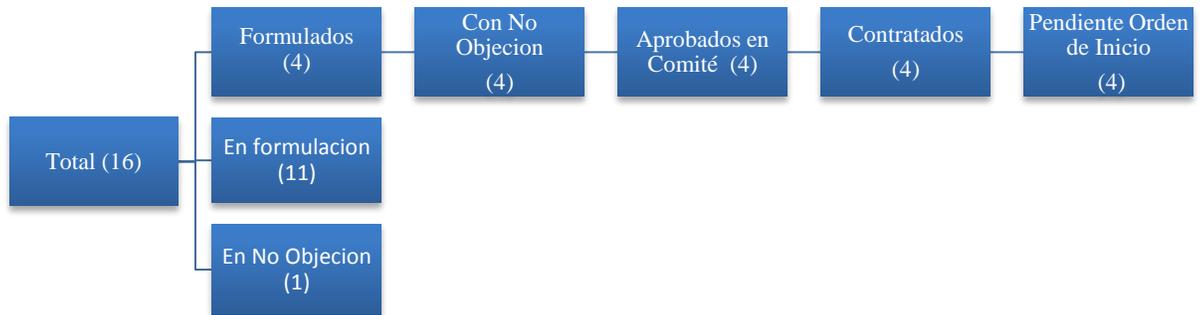

5. Logros I Trimestre

- ✓ Se ejecutó el 89.93 % con respecto a lo planificado para el primer trimestre.
- ✓ Se finalizó 1 proyectos con el cual se beneficiaron 1,104 personas (alumnos y personal administrativo) y se generaron 41 empleos.

6. Próximos Retos

Entre los principales retos que enfrenta el PROMINE-KfW:

- **Ejecución de Proyectos:** i) Inicio de proyectos en la fase IV.
- **Vigencia del PROMINE III:** De parte de IDECOAS se realizó la solicitud de ampliación a la SEFIN hasta agosto 2019, sin embargo al KfW se solicitó hasta mayo 2019, sin embargo se estará solicitando la ampliación considerando que uno de los proyectos se estará suspendiendo por problemas estructurales presentados en la infraestructura existente, se estará realizando un visita por parte de COPECO y un ingeniero estructuralista para analizar el caso. De esta visita dependerá la ampliación a solicitarse.

7. Problemática

La variación con respecto al planificado se debe a que:

- 1) Unos de los proyectos a los cuales se consideró en este trimestre de realizar el segundo desembolso presento dificultades para su orden de inicio.

✓ **Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras**
(CONVIVIR)



i. Objetivo General

Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).

ii. Focalización

A través de un proceso de concurso con criterios de selección predefinidos en el acuerdo separado y evaluación de propuestas técnicas alineadas a los componentes del programa fueron seleccionados 3 municipios en donde se está realizando la intervención del CONVIVIR a través de obras de infraestructura y medidas de alcance social para beneficio enfocado en la juventud. Así mismo se definieron los barrios, colonias o comunidades urbanas en donde se focaliza las acciones y en donde ya se ha realizado una labor de socialización de los alcances, compromisos y beneficios para la población. Los municipios seleccionados son:

- Municipio de Gracias, departamento de Lempira
- Municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua
- Municipio de La Lima, departamento de Cortes.

iii. Descripción del Proyecto

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

Monto del Proyecto: Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son Euros 12, 200,000.00. El tipo de financiamiento es un contrato de Préstamo.

Fecha de Firma de convenio: 08/11/2012

Fecha de Finalización de convenio: 31/12/2019

i. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2014	21,289,204.00	18,316,427.97	86.04%
2015	38,873,159.00	34,024,198.74	87.53%
2016	88,796,503.00	83,460,868.42	93.99%
2017	51,288,495.00	48,071,886.28	93.73%
2018	65,657,852.00	43,535,738.65	66.31%
2019	62,796,573.00	2,407,624.82	3.83%

ii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios Directos 2019
PREVENCION SITUACIONAL / CONVIVENCIA	0	2,407,624.82	37	45
TOTAL	0	2,407,624.82	37	45

iii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios directos 2019
COMAYAGUA	0	1,197,139.14	10	15
CORTES	0	900,670.25	12	15
LEMPIRA	0	309,815.43	15	15
TOTAL	0	2,407,624.82	37	45

iv. Principales Logros

En el presente cuadro se observa la ejecución financiera que ha tenido el Programa CONVIVIR desde su creación a la fecha, en el primer trimestre del año 2019 lo ejecutado se distribuye de la siguiente manera:

Ejecución financiera del 1er trimestre

Componente	Presupuesto Ejecutado 2014	Presupuesto Ejecutado 2015	Presupuesto Ejecutado 2016	Presupuesto Ejecutado 2017	Presupuesto Ejecutado 2018	Ejecutado 2019
01-Gasto Operativo	536,459.53	4011,908.76	8,186,328.38	7,484,899.00	6,977,244.45	0
02- Construcción	4134,589.44	14781,805.43	53,726,357.68	21,533,793.15	9,885,956.39	1,891,979.74
03- Fortalecimiento de Habilidades de Jóvenes	0.00	2011,078.63	8,078,022.83	3,972,943.74	6,175,521.00	0
04- Mejoramiento Capacidades de Actores Relevantes	0.00	4114,456.01	2,137,666.23	2,906,038.90	3,210,648.09	0
05-Materiales y Equipos	0.00	820,323.53	3,142,655.66	3,383,553.95	5,733,027.16	515,645.08
06-Consultoría internacional	13645,379.00	8284,626.38	8,189,837.64	8,790,657.54	11,553,341.56	0
Total	18,316,427.97	34,024,198.74	83,460,868.42	48,071,886.28	43,535,738.65	2,407,624.82

v. Avance Físico

Al cierre del período del periodo de Enero a Marzo del año 2019 la ejecución financiera del programa alcanza a un 3.99% Entre las razones más importantes para este porcentaje (%) de ejecución, es debido a que los proyectos algunos se encuentran en ejecución y otros en proceso de diseño y formulación al igual que los procesos sociales con juventud por lo que se comenzaran a reportar los productos en el Segundo Trimestre del año en curso.

Los procesos de resolución de contrato de los proyectos “Casa de la Cultura” y “mediana Sitraterco” aún se encuentran en proceso para la recuperación de los fondos a la cuenta del programa CONVIVIR.

1. COMPONENTE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA- AVANCE FISICO

Actualmente se tiene una cartera de 39 proyectos de infraestructura aprobados para ejecutar con el monto del convenio. De dichos proyectos ya se terminaron 24 obras, 4 proyectos en ejecución y 2 proyectos en proceso de resolución de contrato debido a la falta de voluntad política del municipio y factibilidad social de las obras estas se encuentran ubicadas en La Lima, Cortes, adicionalmente se está trabajando en el Diseño y Formulación de 11 proyectos para su aprobación.

Obras priorizadas en el municipio de Siguatepeque, Comayagua

Proyecto	Inversión Estimada*	Estado
	(millones de Lempiras)	
1. Obra de Confianza	L. 3104790.51	Proyecto terminado
2. Cancha de Futbol Col. Mata	L. 2668978.76	Proyecto terminado
3. Centro Calidad de Vida Col. Noé Cruz	L. 3012043.70	Proyecto Terminado
4. Centro de calidad de vida Bo. San Juan	L. 3598956.85	Proyecto Terminado, pendiente orden de cambio
5. Centro de Educación Digital	L. 393,589.02	Proyecto Terminado
6. Colonia El Carmen	L. 3,767,167.59	Proyecto Terminado
7. Centro de calidad de vida aldea Las Crucitas	L. 2,956,701.47	Proyecto Terminado
8 Construcción Oficina Municipal de Juventud	L. 3,642,066.27	Proyecto en ejecución, 75% de Avance Físico.
TOTAL	L. 19,753,680.80	

Obras priorizadas en el municipio de Gracias, Lempira

Proyecto	Inversión Estimada*	Estado
	(millones de Lempiras)	
1. Obra de Confianza	L.3,225774.58	Proyecto Terminado.
2. Ampliación Casa de la Juventud.	L.6,846269.84	Proyecto Terminado.
3. Construcción campo de pelota Bella Vista y Pinalito.	L. 2,974,938.57	Proyecto Terminado
4. Reposición Polideportivo Villas del Rosario.	L. 6,338,642.02	Proyecto Terminado
5. Construcción plaza para la Recreación y la Convivencia Pinalito y Bella Vista.	L. 2,147,440.69	Proyecto Terminado
6. Remodelación Plaza San Sebastián	L. 4,029,707.82	Proyecto Terminado
7. Casa de la cultura	L. 8,169,443.80	Proyecto en ejecución, 30% avance físico
8. Centros de Formación Digital.	L. 53,756.51	Proyecto terminado
9. Construcción de Salón multiusos Bella Vista y Pinalito.	L. 2,979,546.19	Proyecto terminado
10. Construcción parque recreativo Moreno y Hércules.	L. 5,459,590.31	Proyecto Terminado
11. Ampliación plaza Marco Tulio Rodriguez	L. 2,454,714.29	Proyecto Terminado
12. Centro de calidad de vida Villami	L. 2,447,597.92	Proyecto terminado
13. Escuela de música Mejicapa	L. 3,280,000.00	Proyecto terminado
TOTAL	L.50,407,422.54	

Obras priorizadas en el municipio de La Lima, Cortés

Proyecto	Inversión Estimada*	Estado
	(millones de Lempiras)	
1. Construcción centro juvenil de desarrollo integral	L. 3262,221.20	Proyecto terminado
2. Ampliación Plaza de la Juventud.	L. 7036,616.12	Proyecto terminado
3. Remodelación Caminos de los Gatos paseo del Puente y Áreas Aledañas	L. 1261,200.58	Pendiente Orden de cambio
4. Remodelación parque los Pinos La Lima	L. 1775,191.17	Proyecto terminado
5. Parque Mediana Sitraterco	L. 8518,858.49	Proyecto para Rescindir, no tiene factibilidad
6. Casa de la Cultura	L. 9605,935.76	Proyecto para Rescindir, no tiene factibilidad
7. Remodelación Cancha El Maestro	L. 2687,523.23	Proyecto terminado
8. Centros de Formación Digital.	L. 211,335.17	Proyecto terminado
9. Construcción Centro de Calidad De Vida Col. Nuevo San Juan	L. 2961,528.33	Proyecto en ejecución, 83% avance físico
10. Construcción Centro de Calidad de Vida Alvarez Martínez	L. 3068,158.19	Proyecto en ejecución 92% avance físico
TOTAL	L. 40,388,568.24	

A la Cartera de proyectos del Programa CONVIVIR se le adicionaran 11 obras de las cuales se encuentran en proceso de diseño y formulación.

Se espera que dichos proyectos estén aprobados para el mes de Abril del año 2019.

Nota: De los 30 proyectos actualmente aprobados en la cartera del Programa CONVIVIR, 2 proyectos en el Municipio de La Lima, Cortes se ha iniciado el proceso para rescindirlos debido a que no hay factibilidad social ni apoyo por parte del municipio para continuar con la Ejecución de los mismos, dichos proyectos son: Mediana Sitraterco y Casa de la Cultura.

2. AVANCE DEL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES Y LABORALES DE JÓVENES Y COMPONENTE MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES RELEVANTES

En el Primer Trimestre del año 2019, se continuó con la formulación de procesos y ejecución de procesos de igual manera con la selección de participantes para estos dos (2) componentes esenciales del programa CONVIVIR, el cual se detalle a continuación un cuadro resumen de la situación de cada uno de ellos:

#	ACTIVIDADES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS	DIFICULTADES
<p>CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL IDECOAS/FHIS Y FIPADEH PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES CON ACTORES RELEVANTES: Porcentaje de ejecución: 89.9% Situación Actual: En ejecución, Adendúm de tiempo al 31 de Marzo del 2019, se concretara un Adendúm No. 5 para continuar coordinado el componente Para la Conformación de ORMAS Total de Participantes Directos: 789 participantes (A la Fecha).</p>				
1	<p>Seguimiento a la ejecución del Convenio con FIPADEH:</p> <p>a. Revisión de la Estrategia Municipal para el Desarrollo de la Juventud.</p> <p>b. Socialización y revisión de la Metodología PEC, Manual introductorio y 4 manuales enviado a la dirección de Control y Seguimiento y la UTC.</p> <p>Plan de seguridad Ciudadana del Municipio de Gracias</p>	<p>Estrategia de Juventud: Se realizó nuevamente una gira para la construcción de la estrategia de juventud ya que el primer proceso Tuvo que repetirse, debido a la falta de consistencia de la primera consulta realizada por el consultor. Esta gira fue acompañada por el personal del INJ.</p> <p>Metodología PEC. El Equipo Técnico del IDECOAS/FHIS en este caso la UTC, y en conjunto con la Oficial de Juventud y enlaces sociales del programa, se retomó la redefinición completa de la estructura de contenidos de los manuales, lo anterior ha conlleva en jornadas de trabajo completas con el equipo de la institución.</p> <p>Se socializo el Plan de Seguridad Ciudadana en el Municipio de Gracias con actores claves del municipio y de las secretarías de Estado presentes en el Municipio.</p>	<p>Se desarrollaron 3 talleres de consulta para la construcción de la estrategia (1 por municipio) con la siguiente participación:</p> <p>Gracias: 17 participantes. La Lima: 43 participantes Siguatepeque: 45 participantes Total: 105 participantes</p> <p>En proceso de elaboración y revisión de la Estrategia de los tres municipios</p> <p>20 jornadas de trabajo con el equipo técnico de IDECOAS, para el replanteamiento de los manuales PEC</p> <p>En Proceso de terminar y aprobar los manuales finales</p> <p>Participación de 15 actores claves en la Socialización del Plan de Seguridad ciudadana. Aprobación del Plan en Punto de Acta de Corporación Municipal</p>	<p>Se tuvo que generar la participación nuevamente de los municipios para replantear una nueva estrategia, esto conlleva una nueva contratación de un consultor y la extensión de tiempo, dicho documento aún se encuentra en revisión.</p> <p>La falta de experiencia y conocimiento a nivel nacional en la Metodología PEC, no hay consultores con conocimiento amplio de la metodología.</p> <p>Aun no se logra la coordinación con la Subsecretaría de Prevención de Seguridad, se ha solicitado en repetidas ocasiones a la Coordinación de la Unidad del gobierno local asignada al tema, sin embargo no se ha tenido respuesta</p>
<p>CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL IDECOAS FHIS Y ZAMORANO PARA LA FORMACION</p>				

#	ACTIVIDADES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS	DIFICULTADES
AMBIENTAL CON ENFOQUE EN PROCESOS DE PRODUCCION Y EMPRENDIMIENTO JUVENIL:				
Porcentaje de ejecución: 50%				
Situación Actual: En ejecución, Adendúm de tiempo al 30 de Mayo del 2019.				
Total de Participantes Directos: 90 participantes (A la Fecha).				
2	<p>Componentes A: fortalecimiento de jóvenes en temas ambientales con enfoque en emprendimiento. (Por los tres municipio): - Definición de los proyectos a ejecutarse con los jóvenes. - Inicio de elaboración en acuerdos municipales en temas ambientales.</p> <p>Componente B: Desarrollo del diagnóstico en Café del Instituto Ramon Rosa/Gracias: - Reunión de validación de la Currícula de lácteos y café Del Inst. Ramon rosa de Gracias</p>	<p>Se asignó a un tutor por municipio para coordinar las acciones con cada oficial de juventud y con los jóvenes seleccionados para ser formados y certificados por ZAMORANO.</p> <p>De igual manera se realizaron reuniones de seguimiento y acompañamiento al equipo técnico formulador y diseñador de proyectos de cada municipio, hasta lograr la aprobación de los planos finales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se certificaron 43 jóvenes en los 5 bloques Completos en temas de formación ambiental en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano • Se definieron 6 propuestas de Proyectos ambientales con enfoque en emprendimiento (2 en cada municipio). • Taller de emprendedurismo de 30 estudiantes realizado por Zamorano en el Instituto en los Rubros de Lácteos y Café. • Certificación en temas de emprendimiento de 20 docentes del Instituto Ramon Rosa en la Escuela agrícola Panamericana Zamorano • Se realizó la Validación de la Currícula de Lácteos y Café con 17 docentes del Instituto 	Cambios suscitados de Oficial de Juventud en especial de la Municipalidad de La Lima, poniendo en riesgo el seguimiento de los jóvenes al igual que los alcances del proceso en general .
CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL IDECOAS/FHIS Y EL CENET PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD JUVENIL				
Porcentaje de ejecución: 50%				
Situación Actual: En ejecución, Adendúm de tiempo al 30 de Junio del 2019.				
Total de Participantes Directos: 135 participantes (A la Fecha).				
3	Seguimiento de	Se asignó un coordinador por	• Seguimiento a la	El proceso interno de

#	ACTIVIDADES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS	DIFICULTADES
	<p>Convenio entre IDECOAS/FHIS y CENET.</p> <p>Reunión con el Staff de CENET para presentación el Programa, alcances de los productos esperados, etc.</p> <p>Reuniones con el Staff del equipo municipal (Oficial de juventud, enlace municipal y enlace social) para fortalecer los alcances esperados en la construcción de la estrategia de empleabilidad por municipio).</p>	<p>municipio para focalizar las acciones según las necesidades de cada municipio, de igual manera fortalecer la coordinación técnica con el equipo de las municipalidades. De igual manera se realizó una serie de consultas a través de talleres participativos siendo la OMJ la</p> <p>De igual manera se realizaron reuniones con el equipo técnico de IDECOAS a nivel de coordinación y a nivel técnico de infraestructura, en este caso se movilizó al instituto Valle de Sula para conocer las necesidades en las mejoras de infraestructura.</p>	<p>estrategia de empleabilidad de los Municipios, (Una por municipio)</p> <ul style="list-style-type: none"> Identificados emprendedores por Municipio Gracias 33 emprendedores La Lima 16 Emprendedores Siguatepeque 12 emprendedores 	<p>contratación de CENET como dependencia del Estado complico el cumplimiento de Cronograma de tiempo del convenio. Lo que conllevó a Adendúm.</p> <p>La participación efectiva de los Oficiales de Juventud en coordinar con otros actores de sociedad civil, provocando posponer actividades y por ende retrasos.</p>
<p>CONVENIO DE COOPERACION ENTRE E IDECOAS/FHIS Y LA FUNDACION ANED PARA E DESAROLO DE LA SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS DEL PROGRAMA Y EL LINEA DE BASE FASE CUATRO:</p> <p>Firma de convenio reciente, extensión de tiempo al 31 de mayo del 2019</p>				
4	<p>Fundacion ANED.</p> <ul style="list-style-type: none"> En construcción la elaboración del Plan de Sistematización de Experiencias del Programa Convivir Fase 4. En construcción la elaboración del Protocolo Línea de Base de Salida. 	<p>Se realizaron reuniones de consulta a profundidad para conocer el origen del programa, sus componentes, resultados y avances a la fecha, de igual manera se delimitó el eje sistematizados del Programa, siendo este los Modelos y enfoques de participación comunitaria y Juvenil para la Promoción de la Convivencia. De igual manera se delimitó a nivel contextual el marco de variables e indicadores según el informe resultando de los datos obtenidos de la línea de Base del INE, de igual manera se profundizó en los indicadores y resultados propios del Programa, con el propósito de verificar y medir avances e impactos según los objetivos y resultados plateados por el Programa a nivel nacional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Grupos focales con Jóvenes (15 por municipio_) total: 45 Grupos focales comunitarios (15 por municipio, Total 45) Grupos Focales Municipales (15 por municipio, Total 45), <p>Total de participantes: 135 participantes</p> <p>Intercambio de experiencia a nivel de IDECOAS/FHIS con la participación de 20 miembros del programa (Taller de socialización de resultados).</p> <p>Nueva Definición del Marco de indicadores del Programa, como propuesta de parte de ANED.</p>	

CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)

✓ Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a Través de las Energías Renovables (PODER)



i. Objetivo General

El Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a través de las Energías Renovables (PODER), tiene como objetivo principal, mejorar las condiciones de vida del sector rural de Honduras más pobre del país. La falta de energía limita las oportunidades económicas y las opciones alimenticias disponibles en los hogares hondureños. Sin energía, familias rurales no tienen la capacidad de refrigerar y almacenar alimentos nutritivos, operar sistemas de irrigación y llevar a cabo procesos que les de valor agregado para generar ingresos adicionales, o incluso que les permita finalizar las tareas escolares por la noche. La meta de esta Actividad es proporcionar acceso a energías renovables (incluyendo las tecnologías que pueden resultar en la entrega de energía eléctrica) a por lo menos 10,000 familias rurales de Honduras, aproximadamente 50,000 beneficiarios en el occidente de Honduras en comunidades de la iniciativa de Alimentando el Futuro del Gobierno de Estados Unidos, a través de los proyectos, y de esta manera abordar algunas de las causas fundamentales de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición.

ii. Focalización

Proyectos que mejoran la posibilidad para generar el ingreso de los residentes de las comunidades del área de influencia en los departamentos de La Paz, Lempira, Intibucá, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque.

iii. Descripción del Proyecto

Soluciones y tecnologías haciendo uso de las energías renovables orientados a la mejora de los procesos productivos logrando atacar las causas de pobreza e inseguridad alimentaria.

iv. **Monto del Convenio:** Los fondos destinados para la ejecución de este Programa es de 20.82 millones de lempiras para el año 2016. Estos fondos son donación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

v. **Avance Financiero**

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2015	10,860,882.00	9,750,284.62	89.77%
2016	16,406,200.00	16,406,199.26	100.00%
2017	22,636,218.00	22,589,168.01	99.79%
2018	20,820,000.00	20,819,999.68	100.00%
2019	35,409,703.00	2,342,683.97	6.62%

vi. **Avance por Sector**

SECTOR	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Beneficiarios Directos 2019
RIEGO	0	878,483.81	0
ENERGIA RENOVABLE	3	1,464,200.16	338
TOTAL	3	2,342,683.97	338

vii. **Avance por Departamento**

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Beneficiarios directos 2019
INTIBUCÁ	2	1,903,936.05	247
LEMPIRA	1	-	91
SANTA BARBARA	0	438,747.92	0
TOTAL	3	2,342,683.97	338

viii. **Principales Logros y avances (enero a marzo de 2019)**

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

- En ejecución 5 proyectos de energía renovable, 5 proyectos ya contratados por iniciar, 1 proyecto aprobado por Comité de Operaciones y 1 proyecto en formulación.

No.	Nombre	Comunidad	Departamento	Costo USAID	Etapas	Avance
1	Micro generación en sistema de riego por goteo	Llanito Verde	Lempira	1,250,000.00	En Ejecución	50.00%
2	Sistema de Biodigestión a partir de residuos de café	Cooperativa Montaña Verde	Santa Bárbara	1,472,331.66	En Ejecución	31.00%
3	Secadoras solares tipo Domo para pequeños productores (121)	Varias comunidades	Lempira	1,984,783.90	En Ejecución	0.00%
4	Secadoras solares tipo Domo para pequeños productores (85)	Varias comunidades	Santa Bárbara	1,389,348.73	En Ejecución	0.00%
5	Centro de Entrenamiento y Capacitación en Energías Renovables	Lepaera	Lempira	719,547.15	Contratado	0.00%
6	Proyecto de secadoras solares industriales en el Departamento de Intibucá	Varias comunidades	Intibucá	2,500,000.00	Contratado	0.00%
7	Proyecto de secadoras solares tipo domo en el Departamento de Intibucá	Varias comunidades	Intibucá	1,723,878.90	En Ejecución	0.00%
8	Secadoras solares tipo domo para pequeños productores en Lempira, y Santa Bárbara	Varias comunidades	Lempira y Santa Bárbara	2,000,000.00	Aprobado por Comité	0.00%
9	Centro de Entrenamiento Nutricional (CEN) Semané, Yamaranguila, Intibucá	Semané	Intibucá	160,000.00	Contratado	0.00%
10	Centro de Entrenamiento y Capacitación de Energía Renovables - Cucuyagua, Copán	Cucuyagua, Copán	Copán	160,000.00	Contratado	0.00%
11	Centro de Entrenamiento y Capacitación de Energía Renovables - Jesús de Otoro, Otoro, Intibucá	Jesús de Otoro, Otoro, Intibucá	Intibucá	160,000.00	Contratado	0.00%
12	Kits tecnológicos para Centros de Entrenamiento Nutricional (9)	Varias comunidades	Intibucá, La Paz, Lempira	514,395.00	En formulación	0.00%

ix. Problemática

- La Carta de Ejecución 17-2018, que ampliaba la duración del proyecto por un año más, y proveía de fondos por un valor de un millón de dólares (US\$ 1,000,000.00) fue firmada hasta el 29 de octubre del año 2018. Sigue sin resolverse la situación de las exoneraciones de impuestos que vencieron el 30 de septiembre del año 2018, por lo que todavía no se pueden realizar compras exoneradas de impuestos, valor que no es reconocido como gasto por USAID. El trámite de la solicitud de exoneración de impuestos lo hace USAID, y no el

IDECOAS/FHIS. SE nos había informado que el trámite para el dictamen de exoneración de impuestos duraría unos tres meses a partir de diciembre, sin embargo, ya transcurrió todo el primer trimestre del 2019, y se cree que el dictamen tardara unos dos meses adicionales. En ese sentido se está ampliando la duración del convenio en 9 meses adicionales, para poder finalizar los mismos antes del 30 de junio del 2020.

- Ahora, y de acuerdo a políticas internas de USA, han disminuido fondos para el proyecto por un monto de US\$ 100,000.00 lo que implica que dos de los proyectos programados a ejecutar no se realizaran.

✓ **Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)**



i. Objetivo General

El propósito de esta Actividad es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

ii. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en las cinco municipalidades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Tela y La Ceiba. Las comunidades específicas de intervención serán identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

iii. Descripción del Proyecto

Esta Actividad ayudará al GdeH (representado a través de FHIS) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otras partes interesadas. La Actividad incluye dos resultados complementarios: Resultado 1: Mejora de la infraestructura comunitaria, las actividades responderán a las prioridades de infraestructura comunitaria para abordar la seguridad ciudadana. Resultado 2: Aumento de la cohesión comunitaria, considera que la forma en que las intervenciones de infraestructura son concebidas, diseñadas y ejecutadas pueden desempeñar un papel directo en el aumento de la cohesión social y comunitaria y promover un marco holístico de prevención de la violencia. Los proyectos bajo la Actividad incluirán

instalaciones educativas, centros de salud, alumbrado público, espacios comunitarios más seguros, centros de alcance y comunitarios, centros vocacionales, jardines comunitarios, parques, espacios recreativos, paradas de buses, accesos peatonales, mejoras al alumbrado de calles, señalización, instalaciones para el sector seguridad y justicia, así como otros proyectos de infraestructura de pequeña escala que se acuerde entre las Partes.

iv. **Monto del Convenio:** Presupuesto total estimado: \$14, 637,541.74, de los cuales, fondos de donación de USAID: \$11, 710,033.39; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$ 2, 927,508.35 (efectivo: \$ 2, 127,508.35 y especies: \$ 800,000.00).

v. **Avance Financiero**

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	23,226,555.00	21,906,553.68	94.32%
2019	76,281,669.00	2,500,000.00	3.28%

vi. **Avance por Sector**

SECTOR	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios Directos 2019
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	1	L 1,279,260.28	0	1,577
EDUCACION	0	L 1,220,739.72	55	2,895
TOTAL	1	2,500,000.00	55	4,472

vii. **Avance por Departamento**

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios directos 2019
ATLANTIDA	0	L 1,963,526.60	38	1,957
CORTES	0	L 289,260.28	0	1,500
FRANCISCO MORAZAN	1	L 247,213.12	17	1,015
TOTAL	1	2,500,000.00	55	4,472

viii. Principales Logros (enero a marzo 2019)

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

A. PROYECTOS EJECUTADOS:

A continuación se presentan los proyectos ejecutados:

No.	Tipo de Proyecto	Ubicación	Monto del Proyecto	Status
1	Mejoras al Centro de Alcance Las Aiestas	Col. Las Aiestas, Distrito Central	L. 1,193,312.20	Elaboración de Acta de recepción
TOTAL EJECUTADO			L.1,193,312.20	

B. PROYECTOS A INICIAR

A continuación se presentan los proyectos en proceso previo a ejecución:

No.	Tipo de Proyecto	Ubicación	Monto del Proyecto	Status
1	Reparación de Casa Alianza Centro	Comayagua, Francisco Morazán	L.3,883,846.45	Trámites de Construcción
2	Reparación CEIN y Ampliación MAIE	La Ceiba, Atlántida	L. 2,575,044.55	Contrato en firma del ministro

C. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

A continuación se presentan los proyectos en ejecución:

No.	Tipo de Proyecto	Ubicación	Monto del Proyecto	Status
1	Reparación de Escuela Carlos Rivera López	Colonia Central, Sector Rivera Hernández, San Pedro Sula	L. 2,577,284.86	Cierre Financiero
2	Obras Complementarias CEB José Antonio Peraza	Col. 6 de Mayo, Sector Rivera Hernández, San Pedro Sula	L.2,431,860.79	Cierre Financiero
3	Pavimentación Calle Principal Col. Lopez Arellano (Ruta Segura)	Sector López Arellano, Choloma	L. 3,055,000.00	88% avance físico
4	Pavimentación Calle Principal hacia los juzgados (Ruta Segura)	Col. La Granja 1 y 2, Choloma	L. 3,500,000.00	95% avance físico
5	Reparación Instituto Reynaldo Narváez Rosales	Col. Las Torres, Distrito Central	L. 3,200,000.00	98% avance físico
6	Reparación Marco Antonio	La Ceiba, Atlántida	L. 4,826,051.18	72% avance físico

	Ponce			
7	Mejoras Instituto Triunfo de la Cruz	Col. San Alejo, Tela	L. 974,243.14	98% avance físico
8	Reparación Techo CEB Miguel Paz Barahona	Sector Bonitillo, La Ceiba	L. 137,702.02	95% avance físico
9	Construcción Centro Integral Corozal	Corozal, La Ceiba	L. 3,300,000.00	35% avance físico
10	Construcción Posta Policial Bonitillo	Sector Bonitillo, La Ceiba	L. 3,349,356.72	18% avance físico
TOTAL EN EJECUCIÓN			L. 27,351,498.71	
