



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO

**FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
(IDECOAS/FHIS)**

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan
Operativo Anual POA-Presupuesto

II Trimestre 2019

Contenido

✓	Introducción	2
✓	Antecedentes	2
✓	Misión:	3
✓	Visión:	3
✓	Valores:	3
✓	Resumen Ejecutivo.....	4
✓	Situación actual de los programas	5
✓	Proyectos FHS	7
✓	Ejecución Presupuestaria por Programas 2019	8
✓	Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2019	9
✓	Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Segundo Trimestre 2019	10
✓	Ejecución Gasto Operativo Segundo Trimestre del 2019	11
✓	Cuadros de Sector, Departamento y Otras Inversiones.....	14
▪	CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.....	15
✓	Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB).....	15
▪	CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	222
✓	Proyecto de Infraestructura Rural BCIE	222
▪	CARTERA KfW Entwicklungsbank	29
✓	Programa Mejora a la Infraestructura Escolar SE-FHS KfW (PROMINE) FASE III y IV.....	29
✓	Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)	31
▪	CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID).....	45
✓	Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a través de las Energías Renovables (PODER)	45
✓	Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS).....	50
✓	Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH) ...	54

Introducción



El presente informe es la recopilación de las actividades e inversiones realizadas por el IDECOAS/FHIS durante el segundo trimestre de 2019.

Antecedentes

De acuerdo al Artículo 3, Numeral 4, Artículo 13 y 20 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-001-2014 se crea el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, mismo que se encuentra integrado por el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), que fue creado mediante el Decreto Ejecutivo PCM-013-2014 publicado el 30 de Mayo del 2014 y tiene como propósito la integración institucional del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y del Servicio Autónomo Nacional de Acueducto y Alcantarillados (SANAA) y demás afines al sector, en el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS). Independiente de su integración estas instituciones continúan cumpliendo los objetivos establecidos en sus leyes constitutivas. A partir de la aprobación del Decreto PCM-013-2014 queda establecida la nueva estructura y funcionamiento del IDECOAS con las entidades que lo integran.

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es un organismo Desconcentrado de la Presidencia de la República, creado el 22 de febrero de 1990 y extendida su vida legal hasta el año 2022 según decreto No. 222-2010 cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados, en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social y/o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Asimismo, asesorará a los gobiernos locales con respecto a los procesos de captación de recursos de las fuentes de financiamiento nacionales y/o externas y las asiste en la transferencia de las capacidades

técnicas y administrativas, para convertir a estos gobiernos locales en administradores eficientes de sus programas y proyectos, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Nación en aplicación del principio de Descentralización.

Misión:

“Somos una Institución estatal, desconcentrada, técnica y captadora de recursos que promueve el desarrollo local sostenible, participativo e incluyente mediante el fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, en alianza con socios estratégicos para desarrollar obras de infraestructura y proyectos de orientación social de acuerdo al plan de nación y visión de país de forma transparente y eficiente, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable de Honduras”.

Visión:

“Ser para el año 2022, la Institución líder en gestión y fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, para la ejecución de proyectos, que contribuya equitativamente al desarrollo sustentable nacional”.

Valores:

- Ética: Ejercicio de las funciones con sujeción a las normas morales que promuevan la confianza de la población hondureña.
- Integridad: Actuación sustentada en la honradez, prudencia, entereza, rectitud y firmeza.
- Compromiso: Ejecución de proyectos que coadyuven al desarrollo local.
- Transparencia: Amplia difusión de información sobre nuestras actuaciones. Rendición de cuentas ante la sociedad.
- Lealtad: Actuar con fidelidad y rectitud hacia el FHIS y compañeros de trabajo, con el objetivo de identificarse con la institución.
- Equidad: El FHIS no hace distinción de credo, raza, de ninguna otra forma de discriminación humana.


Resumen Ejecutivo

El IDECOAS/FHIS, llega hasta los lugares más recónditos del país, para contribuir a mitigar las necesidades de la población más pobre y vulnerable a través de respuestas rápidas y concretas con proyectos de Agua y Saneamiento, Educación, Electrificación Rural, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural.

El presupuesto del FHIS para la gestión 2019 al 30 de junio asciende a 698.8 Millones de Lempiras:

Fuente	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	% de Participación en el Presupuesto Vigente
BID	L. 117,716,409.00	L. 95,558,797.00	13.67%
BCIE	L. 15,809,640.00	L. 37,967,252.00	5.43%
USAID	L. 141,691,372.00	L. 97,882,022.00	14.01%
GOH*	L. 319,853,560.00	L. 321,453,560.00	46.00%
KfW	L. 185,953,992.00	L. 145,953,992.00	20.89%
TOTAL	L. 781,024,973.00	L. 698,815,623.00	100.00%

* Incluye costo Operativo del FHIS

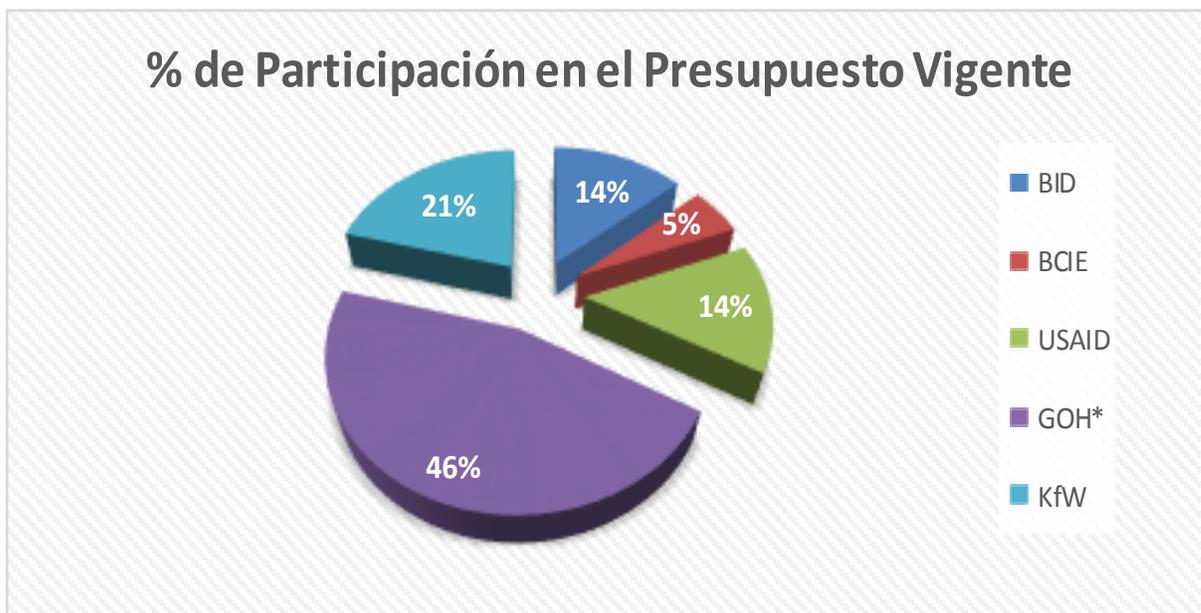

Situación Actual de los Programas:

1. Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), Se inició la consultoría de diseño de obras del Proyecto de Integración Urbana Incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario, Agua Potable, Drenaje Pluvial, Red de Alumbrado Público, Mejoramiento Vial, Espacios de Recreación y Obras de Mitigación de Riesgos para 3,035 predios, así mismo se iniciaron los procesos de licitación de 10 proyectos en las zonas intervenidas por el programa, 606 jóvenes participando en el Programa deportivo y valores, se realizaron 8 talleres de emprendimiento y valores con 673 participantes.
2. Programa Infraestructura Rural (BCIE), **Agua y Saneamiento:** actualmente se encuentran en ejecución un subproyecto de Construcción Sistema Integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico comunidad El Coyolar, Municipio der San Marcos de la Sierra, departamento de Intibuca. **Caminos Rurales:** se encuentran en ejecución tres subproyectos: Calle Agua Zarca y Calle San Antonio del Monte en el Municipio de Camasca, Intibuca que dieron inicio en el mes de mayo y el tramo Azacualpa, Buena Vista, municipio de Candelaria, Lempira, iniciando ejecución en junio 2019. Durante el II trimestre de 2019 se finalizaron las obras de construcción del pavimento en casco urbano del municipio de Candelaria, Lempira con una longitud de 938 metros, beneficiando a 540 pobladores; Durante las actividades de construcción se generaron 15 empleos temporales en la zona. Adicionalmente, se rehabilitaron 5.76 km de caminos de las comunidades Gualmuraca – Cañadas, del Municipio de Candelaria, Lempira, generando 41 empleos temporales y beneficiando a una población de 500 personas aproximadamente
3. Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE III y IV: Se ejecutó el 91.10 % con respecto a lo planificado para el segundo trimestre, se finalizó 3 proyectos con el cual se beneficiaron 1,423 personas (alumnos y personal administrativo) y se generaron 87 empleos.
4. Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR), Actualmente se tiene una cartera de 39 proyectos de infraestructura aprobados para ejecutar con el monto del convenio. De dichos proyectos ya se terminaron 24 obras, 4 proyectos en ejecución y 2 proyectos en proceso de resolución de contrato debido a la falta de voluntad política del municipio y factibilidad social de las obras estas se encuentran ubicadas en La Lima, Cortes, adicionalmente se está trabajando en el Diseño y Formulación de 11 proyectos para su aprobación.


5. Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a través de las Energías Renovables (PODER), actualmente se terminaron 16 sistemas de riego y 23 proyectos de energía renovable, encuentran en ejecución 4 proyectos de energía renovable, 5 proyectos con orden de inicio y 1 proyectos en formulación.
6. Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS), actualmente el Programa se encuentra en proceso de ejecución de 6 proyectos de infraestructura, se encuentran 5 proyectos por iniciar obras y 8 proyectos terminados.

Proyectos FHIS

Fuente	Nombre del Proyecto	Nombre Corto	Sector	Modalidad Ejecucion
BID	Programa Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	PCCMB 4518/BL-HO	Infraestructura Social	Centralizados
BCIE	Proyectos de Infraestructura Rural	PIR BCIE 1736	Agua y Sanemiento, Eletrificacion y Caminos Rurales	Descentralizados/ Centralizados
KFW	Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar SE-FHIS FASE III y IV	PROMINE	Infraestructura Escolar	Descentralizados
	Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras	CONVIVIR	Infraestructura Social y Fortalecimiento de las Capacidades de los Jóvenes	Descentralizados
USAID	Programa de Oportunidades para el Desarrollo a través de Energía Renovable	PODER	Soluciones y tecnologías haciendo uso de las energías renovables orientados a la mejora de procesos productivos logrando atacar las causa de pobreza e inseguridad alimentaria	PEC/Centralizados
	Programa de Infreestructura para la Seguridad Ciudadana	ICS	Recuperacion de espacio públicos e infraestructura escolar para la mejora de la seguridad ciudadana	PEC/Centralizados
	Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras	PIOH	Mejorar las condiciones de Infraestructura Básica para contribuir al desarrollo en el Occidente de Honduras.	PEC/Centralizados


Ejecución Presupuestaria por Programas 2019

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Monto Planificado II Trimestre	Devengado del II Trimestre	Devengado Acumulado	Disponibile	% Ejecución II Trimestre/ Planificado II Trimestre	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
Programa 1: Actividades Centrales	L. 319,853,560.00	L. 321,453,560.00	L. 24,026,000.00	L. 39,143,256.99	L. 85,571,823.40	L. 235,881,736.60	163%	27%
Programa 11: Infraestructura Rural	L. 15,809,640.00	L. 44,157,902.00	L. 10,078,063.00	L. 7,213,160.81	L. 11,895,246.97	L. 32,262,655.03	72%	27%
Programa 12: Infraestructura Escolar	L. 123,157,419.00	L. 83,157,419.00	L. 15,335,660.00	L. 14,202,315.84	L. 31,970,503.29	L. 51,186,915.71	93%	38%
Programa 14: Fomento al Desarrollo Local	L. 286,794,651.00	L. 219,137,039.00	L. 36,574,703.00	L. 33,718,402.29	L. 41,863,688.37	L. 177,273,350.63	92%	19%
Programa 17: Infraestructura Productiva	L. 35,409,703.00	L. 30,909,703.00	L. 11,000,000.00	L. 9,474,803.37	L. 11,817,487.34	L. 19,092,215.66	86%	38%
TOTAL	L. 781,024,973.00	L. 698,815,623.00	L. 97,014,426.00	L. 103,751,939.30	L. 183,118,749.37	L. 515,696,873.63	107%	26%

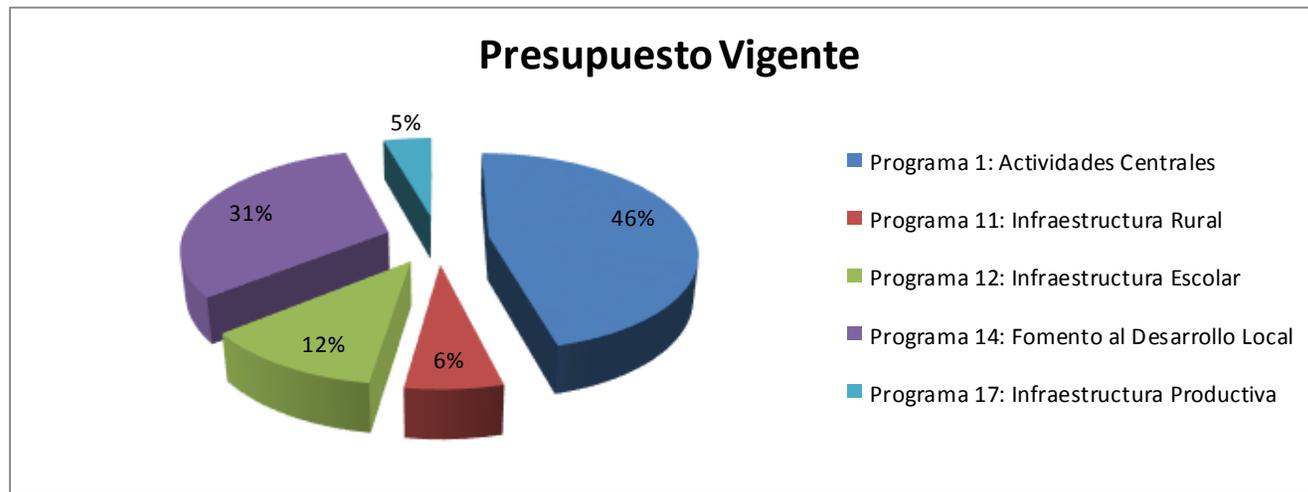


Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2019

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente 2019	Devengado del II Trimestre	Devengado Acumulado 2019	% Ejecución al II Trimestre / Presupuesto Vigente
Gasto Operativo/Gobierno	L. 319,853,560.00	L. 321,453,560.00	L. 39,143,256.99	L. 85,571,823.40	27%
Proyecto de Infraestructura Rural 1736-BCIE	L. 15,809,640.00	L. 37,967,252.00	L. 7,213,160.81	L. 11,895,246.97	31%
Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras	L. -	L. 6,190,650.00	L. -	L. -	0%
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar, KfW VIII	L. 123,157,419.00	L. 83,157,419.00	L. 14,202,315.84	L. 31,970,503.29	38%
Proyecto Convivencia y Especios Seguros para los Jovenes CONVIVIR	L. 62,796,573.00	L. 62,796,573.00	L. 8,973,971.55	L. 11,381,596.37	18%
Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana	L. 106,281,669.00	L. 60,781,669.00	L. 17,817,550.08	L. 20,317,550.08	33%
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	L. 117,716,409.00	L. 95,558,797.00	L. 6,926,880.66	L. 10,164,541.92	11%
Programa de Oportunidades para el Desarrollo a través de Energía Renovable	L. 35,409,703.00	L. 30,909,703.00	L. 9,474,803.37	L. 11,817,487.34	38%
TOTAL	L. 781,024,973.00	L. 698,815,623.00	L. 103,751,939.30	L. 183,118,749.37	26%

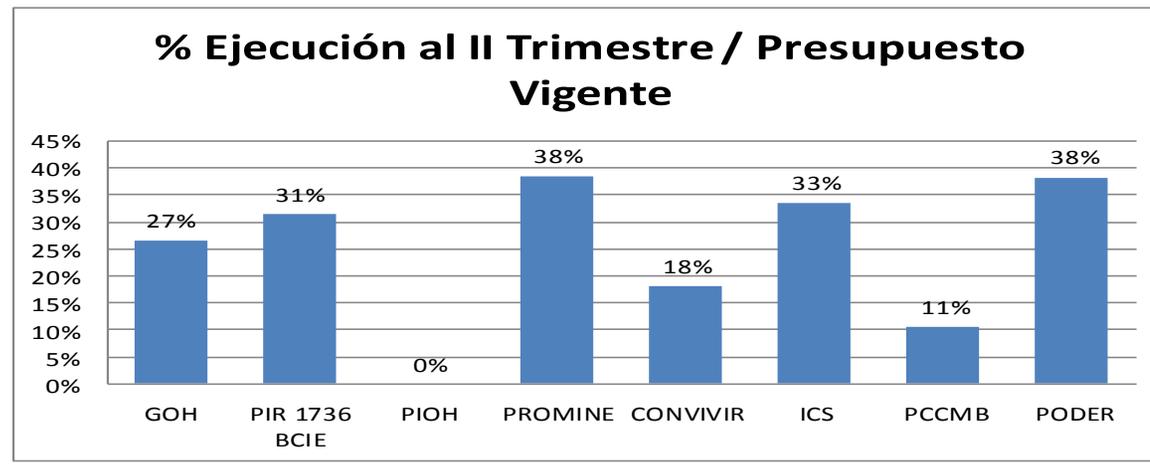

Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Segundo Trimestre 2019

Grupo	Aprobado	Presupuesto Vigente por Grupo	Devengado II Trimestre	Devengado Acumulado al II Trimestre	Disponible	% Ejecución II Trimestre/ Presupuesto Vigente	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
SERVICIOS PERSONALES	L. 154,452,754.00	L. 156,052,754.00	L. 35,942,978.93	L. 66,822,106.72	L. 89,230,647.28	23%	43%
SERVICIOS NO PERSONALES	L. 126,293,052.00	L. 119,445,817.00	L. 25,818,766.01	L. 37,494,521.93	L. 81,951,295.07	22%	31%
MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 7,526,183.00	L. 7,872,583.00	L. 876,821.89	L. 1,233,420.98	L. 6,639,162.02	11%	16%
BIENES CAPITALIZABLES	L. 484,680,444.00	L. 394,202,786.00	L. 41,060,372.47	L. 64,799,551.06	L. 329,403,234.94	10%	16%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. 8,072,540.00	L. 8,072,540.00	L. 53,000.00	L. 583,645.08	L. 7,488,894.92	1%	7%
OTROS GASTOS	L. -	L. 13,169,143.00	L. -	L. 12,185,503.60	L. 983,639.40	0%	93%
Total	L. 781,024,973.00	L. 698,815,623.00	L. 103,751,939.30	L. 183,118,749.37	L. 515,696,873.63	15%	26%

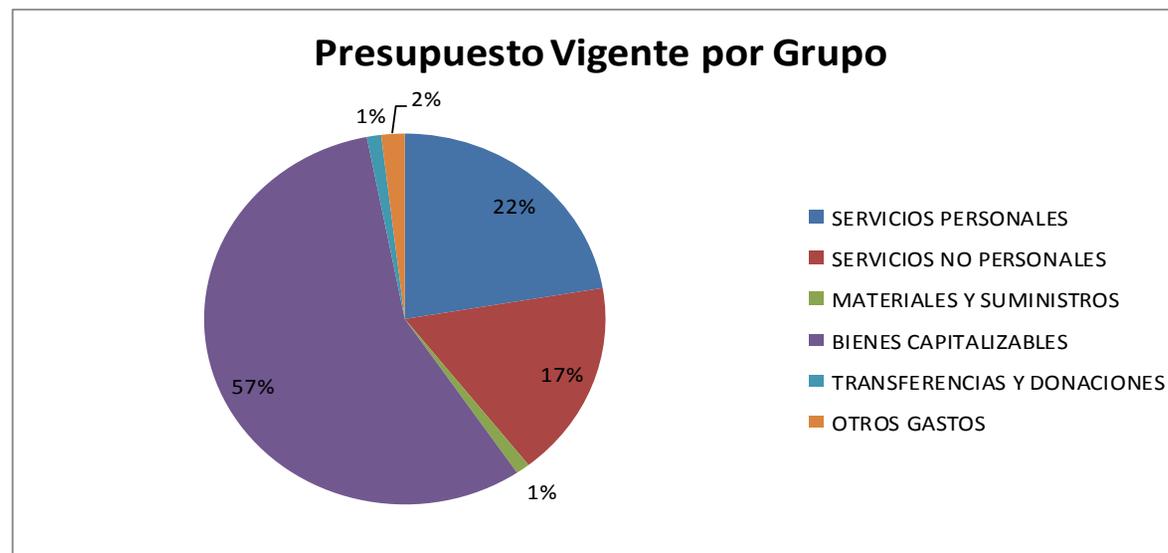

Ejecución Gasto Operativo Segundo Trimestre del 2019

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
1100	Sueldos Básicos	16,422,813.00	8,290,372.22	7,077.17
11400	Adicionales	1,115,626.00	883,259.51	483.33
11510	Decimotercer Mes	1,368,568.00	31,229.16	19.45
11520	Decimocuarto Mes	1,368,568.00	1,368,568.00	0.00
11600	Complementos	1,169,521.00	935,892.37	172.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	2,381,308.00	1,213,080.28	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	593,473.00	276,173.10	0.00
26110	Pasajes Nacionales	84,189.00	0.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	180,000.00	74,374.93	55.08
29100	Ceremonial y Protocolo	304,248.00	45,619.19	0.84
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	136,830,857.00	0.00	0.00
51220	Ayuda Social a Personas	68,400.00	68,000.00	400.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	4,140.00	0.00	3,312.00
1100	Sueldos Básicos	16,441,293.00	8,320,603.46	450,912.43
11400	Adicionales	16,355,210.00	508,454.67	3,895.73
11510	Decimotercer Mes	1,370,108.00	92,458.76	471.67
11520	Decimocuarto Mes	1,370,108.00	1,370,108.00	0.00
11600	Complementos	1,035,520.00	596,824.00	1,097.69
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	2,383,988.00	1,218,797.96	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	1,117,852.00	412,173.95	83,891.20
12100	Sueldos Básicos	24,830,352.00	4,300,156.36	18,734,058.15
12410	Decimotercer Mes	2,317,933.00	0.00	2,317,933.00
12420	Decimocuarto Mes	2,317,934.00	1,708,278.21	606,017.45
12550	Contribuciones para Seguro Social	1,266,912.00	83,891.20	1,183,020.80
12910	Contratos Especiales	17,241,546.00	13,754,697.39	3,486,848.61
16200	Compensaciones	1,608,301.00	0.00	6,993.00
21110	Suministro De Energía Eléctrica	191,085.00	0.00	0.00
21200	Agua	56,160.00	0.00	0.00
22900	Otros Alquileres	21,649.00	0.00	0.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	90,324.00	0.00	0.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	996,060.00	253,221.01	44,365.09
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	75,048.00	42,205.00	7,843.00
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	64,946.00	0.00	0.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	112,041.00	11,672.50	5,460.50
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	115,459.00	69,000.00	11,459.00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	480,000.00	240,500.00	0.00
24500	Servicios de Capacitación	86,600.00	0.00	68,400.00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	3,638,279.00	2,279,266.67	0.00
25100	Servicio de Transporte	12,000.00	2,240.00	0.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,838,770.00	772,244.74	687,945.26
25400	Primas y Gastos de Seguro	1,147,631.00	361,687.57	50,430.19
26210	Viáticos Nacionales	120,000.00	15,546.88	94.24

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
27210	Tasas	54,262.00	0.00	0.00
3110	Productos Alimenticios Y Bebidas	261,851.00	141,226.75	932.25
32310	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	0.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	215,761.00	120,899.93	0.00
33300	Productos de Artes Gráficas	37,885.00	0.00	0.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	29,186.00	23,760.00	0.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	432,972.00	0.00	0.00
35100	Productos Químicos	12,027.00	12,025.00	2.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	100,036.00	6,688.96	36.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	18,041.00	12,970.70	0.30
35620	Diesel	391,953.00	150,000.00	0.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	144,324.00	65,791.50	49,667.50
36400	Herramientas Menores	6,014.00	0.00	0.00
36930	Elementos de Ferretería	21,649.00	7,641.06	7.94
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	84,189.00	54,884.01	0.18
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	247,652.00	70,546.38	4,230.27
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	50,513.00	22,740.50	2,575.50
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	4,009.00	0.00	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	535,039.00	184,712.52	0.00
99720	Para Erogaciones de Capital por Devolución de Prestamos	13,169,143.00	12,185,503.60	983,639.40
11100	Sueldos Básicos	3,804,000.00	1,952,228.71	1,457.89
11400	Adicionales	250,000.00	122,000.00	0.00
11510	Decimotercer Mes	317,000.00	0.00	0.00
11520	Decimocuarto Mes	317,000.00	317,000.00	0.00
11600	Complementos	233,500.00	107,169.00	1,431.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	551,580.00	286,375.00	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	118,784.00	65,013.10	0.00
24300	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	100,000.00	30,698.88	88.64
33700	Especies Timbradas y Valores	38,030.00	0.00	0.00
11100	Sueldos Básicos	2,160,000.00	1,114,103.03	0.00
11400	Adicionales	121,000.00	53,000.00	0.00
11510	Decimotercer Mes	180,000.00	0.00	0.00
11520	Decimocuarto Mes	180,000.00	180,000.00	0.00
11600	Complementos	126,300.00	56,900.00	0.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	313,200.00	164,430.00	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	84,846.00	43,837.00	0.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	216,486.00	30,245.00	175.00
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	168,378.00	0.00	0.00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	193,598.00	154,867.33	0.00
11100	Sueldos Básicos	2,124,000.00	1,144,956.70	1,207.40

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
11400	Adicionales	92,000.00	59,133.33	0.00
11510	Decimotercer Mes	177,000.00	6,572.22	0.00
11520	Decimocuarto Mes	177,000.00	177,000.00	0.00
11600	Complementos	116,100.00	72,818.80	0.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	307,980.00	166,460.00	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	84,846.00	46,064.20	0.00
26210	Viáticos Nacionales	150,000.00	35,321.04	38.35
11100	Sueldos Básicos	20,352,126.00	10,305,292.27	130,188.29
11400	Adicionales	1,193,342.00	718,515.71	10,077.09
11510	Decimotercer Mes	1,696,010.00	24,576.50	2,750.00
11520	Decimocuarto Mes	1,696,010.00	1,663,129.77	32,880.23
11600	Complementos	1,406,008.00	688,418.74	2,259.05
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	2,951,058.00	1,506,633.14	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	845,130.00	415,460.90	0.00
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	190,404.00	80,815.00	2,300.00
26210	Viáticos Nacionales	1,849,518.00	1,122,800.03	90,776.82
TOTAL PROGRAMA		321,453,560.00	85,571,823.40	29,079,377.98

Cuadro por Sector 2019 (Ejecutado)

SECTOR	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios Directos 2019
AGUA Y SANEAMIENTO	1	L. 790,855.68	20	2,004
ELECTRIFICACION	2	L. 1,096,825.26	21	414
EMPRENDIMIENTO Y VALORES	0	L. 5,913,338.35	27	1,309
INFRAESTRUCTURA VIAL	7	L. 10,950,524.18	128	11,418
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	1	L. 10,378,772.09	53	365
EDUCACION	8	L. 37,976,321.78	167	5,287
RIEGO	0	L. 878,483.81	0	0
ENERGIA RENOVABLE	4	L. 9,158,480.18	1,174	478
TOTAL	23	L. 77,143,601.33	1,590	21,275

Cuadro por Departamento 2019 (Ejecutado)

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios directos 2019
ATLANTIDA	3	L. 5,856,355.82	40	1,892
COMAYAGUA	0	L. 3,421,164.85	20	25
COPAN	0	L. 3,851,520.96	0	0
CORTES	4	L. 12,902,159.92	69	10,933
FRANCISCO MORAZAN	3	L. 6,765,524.96	70	3,891
INTIBUCÁ	3	L. 14,379,520.45	1,168	304
LA PAZ	0	L. 16,218.75	0	0
LEMPIRA	9	L. 13,061,540.36	201	4,090
OCOTEPEQUE	0	L. 11,995,250.09	0	0
SANTA BARBARA	1	L. 4,894,345.17	22	140
TOTAL	23	L. 77,143,601.33	1,590	21,275

Otras Inversiones 2019 (Ejecutado)

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2019
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	10,232,593.40
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	10,170,731.24
TOTAL	20,403,324.64

CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

✓ Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)



i. Antecedentes

Actualmente el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), adscrito al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS) y la Secretaría de Seguridad ejecutan conjuntamente la operación BID 4518/BL-HO denominada “Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios” el cual es un préstamo por un monto total de US\$60,000,000.00 la operación fue aprobada por el Banco Interamericano de Desarrollo en el mes de abril de 2018, posteriormente aprobada por el Congreso Nacional en el mes de octubre de 2018, y fue efectivo a partir del 28 de noviembre de 2018, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta

A partir del 15 de septiembre de 2017 se han autorizado al Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS) Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) financiamiento retroactivo para la preparación y diseño del programa. Estas inversiones se cargarán retroactivamente a los recursos del préstamo. Los gastos elegibles incluyen las categorías de obras, bienes, servicios de no consultoría, y servicios de consultoría, hasta por la suma de US\$9.000.000.00 (15% del monto propuesto del préstamo), efectuados por el Prestatario antes de la fecha de aprobación del préstamo, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el contrato de préstamo. Provisionalmente estos gastos reembolsables serán financiados con los fondos adicionales de contrapartida comunitaria del Programa de Integración de Convivencia Urbana disponibles en fuente FHIS Aportes Municipales.

ii. Objetivo

Contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones

sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

iii. Componentes

Componente 1. Mejoramiento del hábitat de barrios urbanos vulnerables (US\$18.219 millones). El propósito de este componente es mejorar el acceso a servicios de infraestructura urbana y generar espacios con condiciones de seguridad, para incentivar una mejor convivencia y aumentar la capacidad de los ciudadanos para el cumplimiento pacífico de normas. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Infraestructura básica: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios en los siguientes barrios del Distrito Central: Monte de los Olivos, Nueva Jerusalén; Australia; 25 de Enero; Nueva España; Brisas del Mogote y Nueva Galilea teniendo como marco para las intervenciones el Plan Integral de Mejoramiento de Barrios, el cual incluye los correspondientes diseños urbanísticos, de ingeniería, la programación y presupuestos. Este instrumento es crítico para la adecuada programación de las inversiones y para facilitar el diálogo con la comunidad sobre las actividades a desarrollar. Se financiará consultorías y contratación de obras para: (i) la preparación de los Planes Integrales de Mejoramiento de Barrios (PIMB); y (ii) las inversiones en obras de infraestructura básica de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, pavimentación, drenaje pluvial, plazas y parques, equipamientos sociales y otras necesidades detectadas en los PIMB. Se promoverá la recuperación de escuelas públicas y centros de salud (operados por las entidades estatales específicas).

Convivencia y Emprendimiento a nivel barrial: promueve la participación de los vecinos en el mejoramiento de las condiciones de su entorno, así como el fortalecimiento de sus redes sociales y vecinales para mejorar el tejido social en los barrios. Se financiará: (i) capacitación de líderes, programa de deportes y valores, apoyado por el Comité Olímpico Internacional; (ii) capacitación de vecinos en áreas de empleabilidad dentro y fuera del barrio mediante la asistencia técnica de las Universidades y su vinculación con el sector empresarial, (iii) organización para utilización de

sistemas de alerta temprana para desastres naturales. Todas las actividades tendrán enfoque de género.

Componente 2: Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios (US\$22.130 millones). Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios de prevención social de la violencia al ciudadano y brindar una atención oportuna a las víctimas de violencias y delitos, fortaleciendo la gestión local. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Fortalecimiento de capacidades de actores municipales. Se financiará: (i) capacitación y asistencia técnica a las autoridades locales para promover la participación ciudadana en la preparación de planes locales de prevención social de la violencia; (ii) fortalecimiento de las capacidades de los responsables de los observatorios locales, para el análisis estratégico de estadísticas del crimen y delito -incluyendo la desagregación por género-; y (iii) estrategia de comunicación a través de campañas y consultas sociales para promover medidas y valores para la reducción de violencias, respeto por las normas legales, morales, culturales y el uso de la oferta de servicios disponibles de prevención y atención a víctimas.

Intervenciones de prevención social de la violencia a nivel municipal. Se financiará: (i) programas para la atención a víctimas de VIF a través del módulo de Atención Integral Especializado (MAIE); (ii) desarrollo de protocolos para homologar la actuación de primeros respondientes para atención a víctimas, (iii) programa de prevención social de la violencia para jóvenes en situación de riesgo; (iii) modelo innovador de policía comunitaria y patrullaje policial sistemático -Hot Spots-; y (iv) mejoramiento de la infraestructura de las Jefaturas Departamentales, para ofrecer servicios policiales a la comunidad.

Componente 3. Efectividad policial. (US\$16 millones). Con el propósito de mejorar el desempeño y la calidad en la prestación de los servicios policiales, se apoyará la consolidación del sistema nacional de formación y profesionalización, así como su sistema de integridad. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Consolidación del sistema educativo policial basado en la filosofía de Policía Comunitaria. Se financiará: (i) diseño del modelo de Sistema de Formación y Profesionalización Policial, articulando sus diferentes instancias de formación (Instituto Técnico Policial -ITP-, ANAPO, Universidad y educación continua y entrenamiento), incluye mecanismos de evaluación continua del personal. Lo anterior, deberá estar sujeto a promover principios de meritocracia y transparencia en el desarrollo de la carrera policial; (ii) modernización del currículum académico para los medios y altos mandos

policiales, certificado bajo la filosofía de policía comunitaria y orientando la formación a competencias para la toma de decisiones operativas. Lo anterior, incluyendo la redefinición del perfil de ingreso de candidatos a la ANAPO. Esto considerará la incorporación de nuevos cadetes, provenientes del ITP y otros candidatos que ya hayan cursado licenciaturas y tecnicaturas en otras universidades; modernizar el régimen de formación de oficiales en el nuevo campus universitario y generar una nueva estructura de gobierno y planta de profesores-investigadores de tiempo completo (teóricos y prácticos) (iii) fortalecimiento de las capacidades pedagógicas para docentes; (iv) fortalecimiento de la integridad policial a través de la consolidación de un sistema de evaluación y rendición de cuentas; y (v) modernización de la infraestructura física y tecnológica de la Academia Nacional de Policía y el Centro de Investigación y Desarrollo Policial.

Fortalecimiento de las capacidades en investigación criminal. Se financiará: (i) programa de capacitación y especialización continua en investigación criminal en coordinación con el MP; (ii) capacitación técnica en el uso de tecnologías de la información para análisis estratégicos delictuales; e (iii) implementación de un sistema integrado de información delictiva y criminal para mejorar la resolución del delito -integrando estadísticas por categoría de género.

iv. Mecanismo de Ejecución.

Se propone contar con dos organismos ejecutores independientes, pero con responsabilidades compartidas en el diseño, implementación y evaluación de iniciativas que se realicen en la misma área geográfica. El componente 1 de esta operación será ejecutado por IDECOAS-FHIS y el componente 2 y 3 por la Secretaría de Seguridad.

- v. **Monto del Convenio:** US\$ 60,000,000.00 Millones de Dólares, según convenio de préstamo el cual se desglosa de la siguiente manera: al IDECOAS- FHIS le corresponde US\$ 20, 000,000.00 Millones de Dólares y a la Secretaria de Seguridad le corresponde US\$ 40,000,000.00 Millones de Dólares. La duración del convenio es por 5 años después de la publicación de diario La Gaceta Acuerdo Ejecutivo No. 114-2018.

vi. Avance financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	17,749,164.00	14,959,789.44	84%
2019	95,558,797.00	10,164,541.92	11%

vii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios Directos 2019
Emprendimiento y Valores	0	4,713,338.35	27	1,279
TOTAL	0	4,713,338.35	27	1,279

viii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios directos 2019
FRANCISCO MORAZAN	0	4,713,338.35	27	1,279
TOTAL	0	4,713,338.35	27	1,279

ix. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2019
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	3284948.99
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	2,166,254.58
TOTAL	5,451,203.57

x. Principales Logros

Componente Mejora de la Infraestructura básica en barrios:

1. Se inició la consultoría de diseño de obras del Proyecto de Integración Urbana Incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario, Agua Potable, Drenaje Pluvial, Red de Alumbrado Público, Mejoramiento Vial, Espacios de Recreación y Obras de Mitigación de Riesgos para 3,035 predios , en las siguientes colonias: Montes de los Olivos (1,096 predios), colonia Nueva Jerusalén No. 2 (1,306 Predios), Brisas del Mogote (198 Predios), Altos de la Quezada (61 Predios) La Huerta (186 Predios), Villas San Miguel (53 Predios), Brisas del Roble (70 Predios), y Altos del Mirador (65 Predios). Se prevé que esta consultoría tendrá una duración de siete (07) meses.

2. Se iniciaron los procesos de licitación de las siguientes obras:

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Tipo Contrato	Mto. Aprobado
107176	PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA 25 DE ENERO	Inversión	17,375,048.17
		Supervisión de Inversión	1,750,083.55
	PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA 25 DE ENERO	Total	19,125,131.72
107177	PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA NUEVA ESPAÑA	Inversión	43,384,000.66
		Supervisión de Inversión	4,369,808.08
	PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA NUEVA ESPAÑA	Total	47,753,808.74
107178	PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA NUEVA GALILEA	Inversión	24,414,230.63
		Supervisión de Inversión	2,459,097.84
	PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA NUEVA GALILEA	Total	26,873,328.47
107179	PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA NUEVA AUSTRALIA	Inversión	48,336,272.93
		Supervisión de Inversión	4,868,620.53
	PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA NUEVA AUSTRALIA	Total	53,204,893.46
107439	AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA DAVID COREA SÁNCHEZ	Inversión	2,737,060.94
		Supervisión de Inversión	136,853.05
	AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA DAVID COREA SÁNCHEZ	Total	2,873,913.99
107440	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL COLONIA AUSTRALIA.	Inversión	1,760,796.87
		Supervisión de Inversión	88,039.84
	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL COLONIA AUSTRALIA.	Total	1,848,836.71
107444	AMPLIACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS COLONIA NUEVA ESPAÑA.	Inversión	1,654,920.99
		Supervisión de inversión	82,746.05
	AMPLIACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS COLONIA NUEVA ESPAÑA.	Total	1,737,667.04
107447	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL COLONIA 25 DE ENERO.	inversión	1,768,471.83
		Supervisión de inversión	88,423.59
	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL COLONIA 25 DE ENERO.	Total	1,856,895.42
107448	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL COLONIA NUEVA GALILEA.	inversión	2,798,216.76
		Supervisión de inversión	139,910.84
	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL COLONIA NUEVA GALILEA.	Total	2,938,127.60
107450	REPARACIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA NUEVA GALILEA.	inversión	1,330,393.89
		Supervisión de inversión	66,519.69
	REPARACIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA NUEVA GALILEA.	Total	1,396,913.58
Gran Total			159,609,516.73

Componente Intervenciones para promover la convivencia ciudadana y emprendimiento a nivel barrial:

1. 606 jóvenes participando del Programa deportivo y Valores.
2. Capacitaciones en Emprendimiento y Valores: Se han realizado 8 talleres de emprendimientos y valores, con 673 asistencias.

xi. Problemática

- **Disponibilidad Presupuestaria:**

La Secretaría de Finanzas ha reducido el presupuesto disponible del programa, en menos treinta millones de lempiras (Lps.-30, 000,000.00) en el objeto del gasto **47210 Construcciones y Mejoras del Bienes del Dominio Público**. Con este objeto del gasto 47210 se tiene programado el pago de los anticipos de las obras descritos en el numeral 2 (componente Mejora de la Infraestructura básica en barrios), para los meses de octubre y noviembre, pero con el recorte del presupuesto no se contara con los fondos necesarios para iniciar las obras.

CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA

✓ **Proyecto de Infraestructura Rural BCIE**



i. Objetivo General

Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local. Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son de L. 283 millones aproximadamente.

ii. Focalización:

- En base a la metodología de selección de la mancomunidades ejecutado por PIR, que toma en consideración el índice de desarrollo humano, la capacidad de gerenciamiento de la Unidades técnicas Municipales en cada mancomunidad y no más de una mancomunidad por departamento, fueron seleccionadas las mancomunidades de los departamentos de Lempira (CAFEG), Intibucá (AMFI) y Francisco Morazán (MANOFM).

iii. Tipología de Proyectos

- Electrificación Rural: proyectos para habilitar o mejorar el acceso a electricidad teniendo los beneficiarios que aportar el 15% del monto total del proyecto.
- Agua y Saneamiento: proyectos de rehabilitación, expansión y construcción de sistemas comunales de agua y saneamiento y facilidades en áreas rurales, de las mancomunidades previamente seleccionadas.
- Caminos Rurales: proyectos de rehabilitación y mejoramiento de los caminos municipales eficientemente y utilizando métodos de empleo masivo de mano de obra aportando las comunidades beneficiadas el 15% del total del proyecto.

Monto del Convenio: L.285.0 Millones de Lempiras aproximadamente, según convenio de préstamo el tiempo de ejecución del proyecto es de 60 meses.

iv. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2011	37,790,000.00	0.00	0.00%
2012	6,393,674.00	0.00	0.00%
2013	33,774,273.00	33,771,086.72	99.99%
2014	42,465,271.00	32,714,051.57	77.04%
2015	32,683,893.00	32,295,225.85	98.81%
2016	95,056,511.00	93,906,331.81	98.79%
2017	89,155,169.00	86,922,798.37	97.50%
2018	37,332,495.00	36,390,084.05	97.48%
2019	37,967,252.00	11,895,246.94	31.33%

v. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios Directos 2019
AGUA Y SANEAMIENTO	1	790,855.68	20	2,004
ELECTRIFICACION	2	1,096,825.26	21	414
INFRAESTRUCTURA VIAL	5	5,002,924.43	109	2,482
TOTAL	8	6,890,605.37	150	4,900

vi. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios directos 2019
FRANCISCO MORAZAN	2	858,874.41	30	2,292
INTIBUCÁ	0	1,336,304.62	0	0
LEMPIRA	6	4,695,426.34	120	2,608
TOTAL	8	6,890,605.37	150	4,900

vii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2019
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	757,440.14
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	4,247,201.46
TOTAL	5,004,641.60

viii. Principales Logros

1. EJECUCIÓN FINANCIERA:

Ejecución presupuestaria al 30 de junio 2019

Código	Fuente de Financiamiento	Lempiras				Disponible	% Ejecución
		Aprobado	Decremento	Vigente	Ejecutado		
			Incremento				
47	Préstamo BCIE-1736	15,809,640.00	22,157,612.00	37,967,252.00	11,895,246.97	26,072,005.03	31.33%
	Total	15,809,640.00	22,157,612.00	37,967,252.00	11,895,246.97	26,072,005.03	

2. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Durante el II trimestre 2019, se solicitaron dos (2) modificaciones presupuestarias:

- 1) Modificación tipo incremento/ traslado presupuestario por L 21, 200,000.00, aprobada el 2 de abril de 2019.
- 2) Modificación tipo incremento/ traslado presupuestario por L 957,612.00, aprobada el 8 de mayo de 2019.

Los montos se trasladan de la estructura presupuestaria del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB).

3. EJECUCIÓN FÍSICA:

En el sector de **Agua y Saneamiento**, actualmente se encuentran en ejecución el subproyecto de Construcción Sistema Integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico Comunidad El Coyolar, ubicado en el municipio de San Marcos de la Sierra, Intibucá. A continuación se presenta el porcentaje de avance de obra del subproyecto mencionado y el detalle del nuevo subproyecto a ejecutarse durante el 2019:

N.	Código de Proyecto	Nombre de Proyecto	Ubicación		Porcentaje de Ejecución
			Municipio	Departamento	
1	107196	Construcción de Sistema Integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico Comunidad El Coyolar	San Marcos de la Sierra	Intibucá	Inicio 24/6/2019
2	107181	Construcción de Sistema de Micro captación Pluvial y Saneamiento, Comunidades de Guasquin, La Puebla, El Triunfo y San Matías	Piraera	Lempira	Por ejecutar
3	107182	Construcción de Sistema de Micro captación Pluvial y Saneamiento, Comunidad de El Derrumbado	San Marcos de la Sierra	Intibucá	Por ejecutar

Durante el II período 2019, se finalizaron las obras del subproyecto consistente en la Ampliación del Sistema Alcantarillado Sanitario Casco Urbano de El Porvenir en el Municipio de Francisco Morazán, compuesto de la red de alcantarillado sanitario, cajas de registro, construcción de pozos de inspección, acometidas domiciliarias, cruces aéreos con tubería de HFD de 8” ancladas con zapatas y columnas y colector. Inicialmente el proyecto estaba formulado para dar cobertura de saneamiento a 196 viviendas, sin embargo, con la aprobación de orden de cambio, se amplió la cobertura a 334 viviendas.

En el sector de **Caminos Rurales**, se encuentran en ejecución tres subproyectos: Calle Agua Zarca y Calle San Antonio del Monte en el Municipio de Camasca, que dieron inicio en el mes de mayo; así también el tramo Azacualpa – Buena Vista del Municipio de Candelaria, iniciando ejecución en junio 2019. El porcentaje de avance de obra y la ubicación del mismo se detalla a continuación:

N	Cód. de Proyecto	Nombre de Proyecto	Ubicación		Porcentaje de Ejecución
			Municipio	Departamento	
1	107215	Rehabilitación de Caminos Rurales Azacualpa - Buena Vista	Candelaria	Lempira	2%
2	105592	Rehabilitación de Caminos Rurales Calle San Antonio del Monte	Camasca	Intibucá	7%
3	105594	Rehabilitación de Caminos Rurales Calle Agua Zarca	Camasca	Intibucá	5%

Durante el II trimestre 2019, se finalizan las obras de construcción del Pavimento en Casco Urbano del Municipio de Candelaria, Lempira, con una longitud de 938 mts., beneficiando a 540 pobladores. Durante las actividades de construcción se generaron 15 empleos temporales en la zona. Adicionalmente, se rehabilitaron 5.76 km de caminos de las comunidades Gualmuraca – Cañadas, del Municipio de Candelaria, Lempira, generando 41 empleos temporales y beneficiando a una población de 500 personas aproximadamente.

En el sector de **Electrificación Rural** por extensión de red, a la fecha, no se tienen subproyectos en ejecución, ya que han sido finalizados todos los subproyectos programados a ejecutarse

4. SITUACIÓN DE CONTRATOS Y LICITACIONES

Durante el II trimestre 2019, se ha adjudicado el contrato de inversión de un subproyecto de Agua y Saneamiento, por un monto de L 4.29 Millones, monto que será financiado en su totalidad con recursos del Préstamo, mientras que en el sector Caminos Rurales se adjudicó y realizó la firma del contrato de inversión por un monto de L 6.3 Millones, de los cuales L 5.98 Millones serán financiados con fondos del préstamo, como se detalla a continuación:

N.	Nombre del Proyecto	Código	Fecha de Adjudicación	Fecha de Firma de Contrato	Monto Estimado Aporte FHIS	Monto Total del Contrato	Estatus
1	Rehabilitación de Caminos Rurales Azacualpa – Buena Vista Municipio de Candelaria, Departamento de Lempira (SEGUNDO PROCESO)	107215	3/4/2019	6/5/2019	L 5,984,643.03	L 6,299,624.24	Contrato firmado
2	Construcción de Sistema Integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico, Aldea El Coyolar, Municipio de San Marcos de la Sierra, Departamento de Intibucá	107196	9/5/2019	24/5/2019	L 4,287,714.39	L 4,287,714.39	Contrato firmado
Total					L 9,620,969.32	L 10,127,336.12	

De igual forma, se ha adjudicado la consultoría de supervisión de inversión que corresponden a los subproyectos de Caminos Rurales por un monto de L 0.41 Millones:

N.	Nombre del Proyecto	Código	Monto Total del Contrato	Estatus
1	Rehabilitación de Caminos Rurales Azacualpa – Buena Vista Municipio de Candelaria, Departamento de Lempira (SEGUNDO PROCESO)	107215	L 409,475.58	Contrato firmado
Total			L 409,475.58	

A la fecha existen dos procesos de contratación activos, del sector Agua Potable y Saneamiento, por un monto estimado de L 8.07 Millones, de los cuales L 7.47 Millones serán financiados con fondos del Préstamo, como se detalla a continuación:

N.	Nombre del Proyecto	Código	Monto Estimado Aporte FHIS	Monto Total del Contrato	Estatus
1	Construcción de Sistema de Microcaptación Pluvial y Saneamiento, Aldeas Guaquin, La Puebla, El Triunfo y San Matías, Municipio de Piraera, Departamento de Lempira	107181	L 3,098,401.10	L 3,698,401.10	En proceso de Evaluación de ofertas
2	Construcción de Sistema de Microcaptación Pluvial y Saneamiento, Aldea El Derrumbado, Municipio de San Marcos de la Sierra, Departamento de Intibucá	107182	L 4,374,219.64	L 4,374,219.64	Publicado
Totales			L 7,472,620.74	L 8,072,620.64	

5. RESULTADOS DE GESTION (FP02)

Con fondos del Préstamo del BCIE-1736, durante el II trimestre del año 2019, se ha incrementado la cobertura a los servicios de saneamiento para 2,004 personas que habitan en 334 viviendas del Casco Urbano del Municipio de El Porvenir, específicamente en los Barrios El Rubí, Montecitos, Las Palmas y Alto Pino.

Adicionalmente, se rehabilitaron 5.76 km de caminos pertenecientes a la red terciaria del país en las comunidades de Gualmuraca - Cañadas y se pavimentaron 938 mts del Casco Municipal de Candelaria, mejorando el acceso a servicios de infraestructura vial para 1,040 pobladores de estas comunidades y zonas aledañas, incrementando el turismo y la prestación de servicios de transporte y la a vez reduciendo los costos, horas de traslado hacia comunidades cercanas y mantenimiento de vehículos.

En total, se benefician 3,044 pobladores de la zona rural con la ejecución de estos tres proyectos y brindando empleo directo temporal a 76 personas durante las actividades constructivas.

6. DESCENTRALIZACIÓN A LAS MANCOMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL PIR

Con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE Préstamo No. 1736, desde el inicio del Proyecto al 30 de junio del 2019, se han transferido las Mancomunidades beneficiarias MANOFM, CAFEG y AMFI un monto de L 147.6 Millones para la ejecución de subproyectos de infraestructura de los sectores Agua & Saneamiento, Electrificación Rural y Caminos Rurales y fortalecimiento institucional.

La UCP/PIR ha dado seguimiento a los fondos transferidos a las Mancomunidades para que sean utilizados única y exclusivamente para los fines autorizados expresamente en los respectivos convenios interinstitucionales FHIS-Mancomunidades y en los términos y condiciones establecidos en el Manual Operativo de FHIS, al tenor de las condiciones convenidas entre el Gobierno de Honduras y el BCIE bajo el Convenio de Préstamo No. 1736.

En el siguiente cuadro, se muestra una disminución en comparación a la actualización del 31 de marzo del 2019, debido al ajuste por valores devueltos en concepto de obra no ejecutada durante el II trimestre 2019.

**TRANSFERENCIAS PARA EJECUCIÓN DE SUBPROYECTOS DESCENTRALIZADOS Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
ACUMULADO AL 30 JUNIO 2019***

MANCOMUNIDAD	AGUA Y SANEAMIENTO	ELECTRIFICACION RURAL	CAMINOS RURALES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	TOTAL LEMPIRAS
AMFI	L 15,190,873.37	L 11,761,414.15	L 18,870,853.47	L 461,678.00	L 46,284,818.99
CAFEG	L 19,261,737.39	L 19,238,407.47	L 13,083,063.16	L 707,658.00	L 52,290,866.02
MANOFM	L 19,839,490.05	L 9,378,993.64	L 18,359,222.24	L 1,475,730.00	L 49,053,435.93
Total	L 54,292,100.81	L 40,378,815.26	L 50,313,138.87	L 2,645,066.00	L 147,629,120.94
	37%	27%	34%	1.8%	100.00%

*Nota: valores netos ajustados al 30 de junio 2019, incluyen devoluciones en concepto de obra no ejecutada y rescisión de contratos.

7. DESEMBOLSOS DEL PIR

Durante el II trimestre 2019, no se registran desembolsos, ya que el 21 de noviembre del 2018 se registró el último desembolso por un monto de USD\$ 1,775,884.55, y que corresponde a la séptima Restitución del Fondo Rotatorio, completando así el 100% del monto del Préstamo.

8. PROBLEMÁTICA FÍSICA Y FINANCIERA

- No se ha registrado problemática por disponibilidad presupuestaria ni de efectivo.
- La ejecución presupuestaria se ha visto afectada, debido al atraso en la presentación de las estimaciones de obra de subproyectos de Caminos Rurales.
- Trámite tardío para la aprobación de las órdenes de cambio de subproyectos de Caminos Rurales.
- Trámite de firma de contrato, pago de anticipo e inicio de las obras demorado por lento avance en el proceso de Ciclo de Proyectos de FHIS.

CARTERA KfW Entwicklungsbank

✓ **Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS** **FASE III y IV**



1. Objetivo General

Fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la SE y la gestión local participativa así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico).

2. Focalización

El área de intervención del Programa comprende principalmente los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara. El Programa PROEFA de la GIZ apoya actualmente al sector educativo en Honduras. Al igual que en las fases I y II del Programa se buscará la coordinación con el Programa PROEFA de la GIZ o en su debido caso con el Programa que le siga, siempre y cuando existan medidas complementarias entre ambos programas.

3. Descripción del Proyecto

El Programa comprende la tercera fase del Programa PROMINE que se enmarca en el área de educación básica con un componente de infraestructura que complementa al Plan EfA-FTI (Education for All / Fast Track Initiative) y contribuye al logro de las Metas del Milenio en Educación en la República de Honduras y por lo tanto en general se rige por los acuerdos ya definidos para la ejecución de la primera y segunda fase. Se financiará infraestructura educativa en estrecha articulación con el Sector. La ejecución del Programa será responsabilidad de la Secretaría de Educación (SE) como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) como ente ejecutor. Los recursos del Programa se utilizarán principalmente para financiar la construcción, ampliación y/o el mejoramiento de los Centros Educativos (CE) así como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizarán mediante la modalidad descentralizada con énfasis en la ejecución comunitaria (Proyectos Ejecutados por la Comunidad – PEC-FHIS) empleada con éxito en el programa

FHIS VI y VII, y en las primeras fases de PROMINE, aplicada de forma general en todos los proyectos, indistinto de su monto financiero, excepto los altamente complejos.

4. Monto del Proyecto:

Fase III:

Fondos de Crédito por un monto de € 10,000,000.00 euros, Contrapartida Nacional para IDECOAS/FHIS de €495,000 euros, Contrapartida Nacional para SE de € 250,000 euros, Contrapartida Municipal de € 600,000 euros y Contrapartida Comunitaria de € 600,000 euros.

Fecha de Firma de Contrato de Préstamo: 30/12/2013

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 15/12/2014

Fecha de Inicio: 16 de Septiembre 2015 (Se considera la fecha de inicio de la Consultoría)

Fecha de Finalización de Convenio: 31/05/2019

Fase IV:

Fondos de Donación por un monto de € 15,000,000.00 euros, Contrapartida Nacional para IDECOAS/FHIS de € 424,000 euros, Contrapartida Nacional para SE de € 218,000 euros, Contrapartida Municipal de € 515,000 euros y Contrapartida Comunitaria de € 514,000 euros

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 03/12/2015

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 17/02/2017

Fecha de Inicio: 02 de Abril 2018 (Se considera la fecha de inicio de la Consultoría)

Fecha de Finalización de convenio: 30/11/2020

i. Avance Financiero PROMINE FASE III y IV

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2016	145,687,475.00	142,916,817.45	98.10%
2017	107,279,375.00	96,731,967.93	90.17%
2018	53,035,502.00	50,951,601.81	96.07%
2019	83,157,419.00	31,970,503.29	38.45%
Presupuesto 2018 Fase III y Fase IV			

ii. Avance Físico por Sector PROMINE FASE III y IV

SECTOR	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios Directos 2019
EDUCACION	3	26,921,963.40	87	1,423
TOTAL	3	26,921,963.40	87	1,423

iii. Avance Físico por Departamento PROMINE FASE III y IV


DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios directos 2019
COPAN	0	3,851,520.96	0	0
INTIBUCÁ	1	8,690,205.74	16	57
LA PAZ	0	16,218.75	0	0
LEMPIRA	2	6,575.25	71	1,366
OCOTEPEQUE	0	11,995,250.09	0	0
SANTA BARBARA	0	2,362,192.61	0	0
TOTAL	3	26,921,963.40	87	1,423

iv. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2019
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	2,812,702.90
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	2,235,836.99
TOTAL	5,048,539.89


Avance físico de las obras

A. FASE III

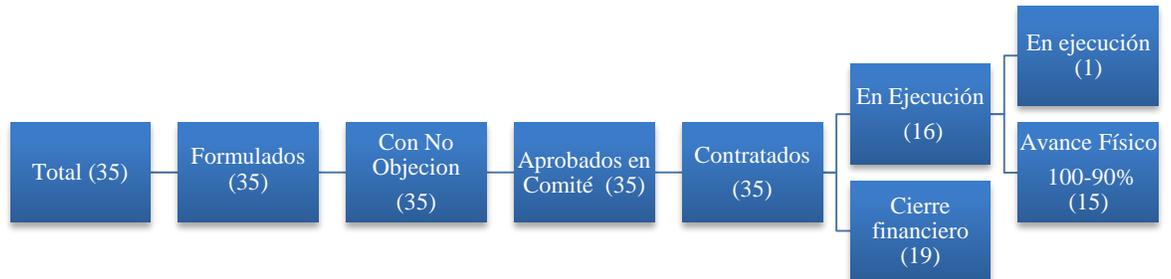

Uno de los proyectos que se encuentran en ejecución se está analizando suspenderlo debido a problemas estructurales que está presentando en la infraestructura existente.

B. FASE IV

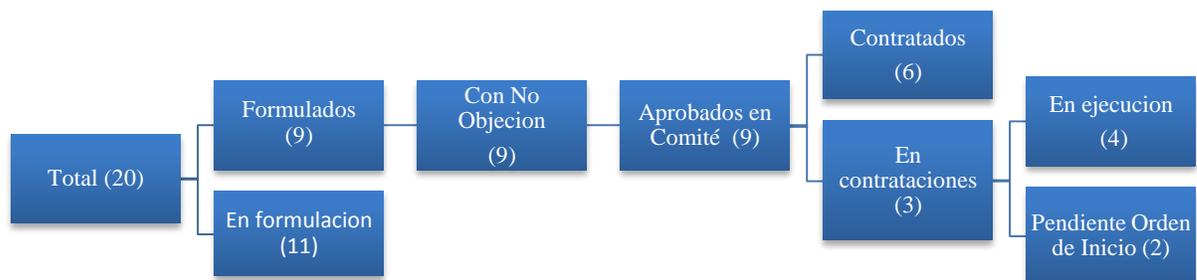

5. Logros II Trimestre

- ✓ Se ejecutó el 93 % con respecto a lo planificado para el segundo trimestre.
- ✓ Se finalizó 3 proyectos con el cual se beneficiaron 1,423 personas (alumnos y personal administrativo) y se generaron 87 empleos.

6. Próximos Retos

Entre los principales retos que enfrenta el PROMINE-KfW:

- **Ejecución de Proyectos:** i) Impulsar la formulación y evaluación de proyectos en la fase IV.
- **Cierre del PROMINE III:** Completar las actividades para el cierre de dicha fase a diciembre del 2019.

✓ **Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras**
(CONVIVIR)



i. Objetivo General

Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).

ii. Focalización

A través de un proceso de concurso con criterios de selección predefinidos en el acuerdo separado y evaluación de propuestas técnicas alineadas a los componentes del programa fueron seleccionados 3 municipios en donde se está realizando la intervención del CONVIVIR a través de obras de infraestructura y medidas de alcance social para beneficio enfocado en la juventud. Así mismo se definieron los barrios, colonias o comunidades urbanas en donde se focaliza las acciones y en donde ya se ha realizado una labor de socialización de los alcances, compromisos y beneficios para la población. Los municipios seleccionados son:

- Municipio de Gracias, departamento de Lempira
- Municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua
- Municipio de La Lima, departamento de Cortes.

iii. Descripción del Proyecto

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

Monto del Proyecto: Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son Euros 12, 200,000.00. El tipo de financiamiento es un contrato de Préstamo.

Fecha de Firma de convenio: 08/11/2012

Fecha de Finalización de convenio: 31/12/2019

i. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2014	21,289,204.00	18,316,427.97	86.04%
2015	38,873,159.00	34,024,198.74	87.53%
2016	88,796,503.00	83,460,868.42	93.99%
2017	51,288,495.00	48,071,886.28	93.73%
2018	65,657,852.00	43,535,738.65	66.31%
2019	62,796,573.00	11,381,596.37	18.12%

ii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios Directos 2019
EMPRENDIMIENTO Y VALORES	0	1,200,000.00	0	30
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	0	9,185,459.89	40	45
TOTAL	0	10,385,459.89	40	75

iii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios directos 2019
COMAYAGUA	0	3,421,164.85	20	25
CORTES	0	1,756,557.61	10	25
LEMPIRA	0	5,207,737.43	10	25
TOTAL	0	10,385,459.89	40	75

iv. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2019
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	996,136.48
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	-
TOTAL	996,136.48

v. Principales Logros

En el presente cuadro se observa la ejecución financiera que ha tenido el Programa CONVIVIR desde su creación a la fecha, en el Segundo trimestre del año 2019 lo ejecutado se distribuye de la siguiente manera:

Ejecución financiera del 2do trimestre

Componente	Presupuesto Ejecutado 2014	Presupuesto Ejecutado 2015	Presupuesto Ejecutado 2016	Presupuesto Ejecutado 2017	Presupuesto Ejecutado 2018	Presupuesto Ejecutado II Trimestre 2019
01-Gasto Operativo	L. 536,459.53	L. 4011,908.76	L8,186,328.38	L. 7,484,899.00	L6,977,244.45	-
02- Construcción	L. 4134,589.44	L. 14781,805.43	L. 53,726,357.68	L. 21,533,793.15	L. 9,885,956.39	L8,669,814.81
03- Fortalecimiento de Habilidades de Jóvenes	L. 0.00	L. 2011,078.63	L. 8,078,022.83	L.3,972,943.74	L. 6,175,521.00	L. 0.00
04- Mejoramiento Capacidades de Actores Relevantes	L. 0.00	L. 4114,456.01	L 2,137,666.23	L. 2,906,038.90	L. 3,210,648.09	L. 1,200,000.00
05-Materiales y Equipos	L. 0.00	L. 820,323.53	L. 3,142,655.66	L. 3,383,553.95	L. 5,733,027.16	L. 515,645.08
06-Consultoria internacional	L. 13645,379.00	L. 8284,626.38	L. 8,189,837.64	L. 8,790,657.54	L. 11,553,341.56	L. 996,136.48
Total	L. 18,316,427.97	L. 34,024,198.74	L 83,460,868.42	L. 48,071,886.28	L. 43,535,738.65	L. 11,381,596.37

vi. Avance Físico

Al cierre del período del periodo de Abril a Junio del año 2019 la ejecución financiera del programa alcanza a un **18.12%** Entre las razones más importantes para este porcentaje (%) de ejecución, es debido a que los proyectos algunos se encuentran en ejecución y otros en proceso de diseño y formulación al igual que los procesos sociales con juventud por lo que se comenzaran a reportar los productos en el Tercer Trimestre del año en curso.

Los procesos de resolución de contrato de los proyectos “Casa de la Cultura” y “mediana Sitraterco” aún se encuentran en proceso para la recuperación de los fondos a la cuenta del programa CONVIVIR.

1. Componente Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura- Avance Físico

Actualmente se tiene una cartera de **39 proyectos** de infraestructura aprobados para ejecutar con el monto del convenio. De dichos proyectos ya se terminaron 24 obras, 4 proyectos en ejecución y 2 proyectos en proceso de resolución de contrato debido a la falta de voluntad política del municipio y

factibilidad social de las obras estas se encuentran ubicadas en La Lima, Cortes, 3 proyectos en proceso de Licitación, adicionalmente se está trabajando en el Diseño y Formulación de 5 proyectos para su aprobación.

Se continúa trabajando en el proceso de equipamiento de los proyectos priorizando los que están terminados y los que están próximos a inaugurar.

A continuación se anexan los tres cuadros que corresponden a la ejecución física de cada una de las obras de infraestructura

Obras priorizadas en el municipio de Siguatepeque, Comayagua

Proyecto	Inversión Estimada*	Estado
	(millones de Lempiras)	
1. Obra de Confianza	L. 3104790.51	Proyecto terminado
2. Cancha de Futbol Col. Mata	L. 2721312.41	Proyecto terminado
3. Centro Calidad de Vida Col. Noé Cruz	L. 3,012,043.70	Proyecto Terminado
4. Centro de calidad de vida Bo. San Juan	L. 3,598,956.85	Proyecto Terminado, pendiente orden de cambio
5. Centro de Educación Digital	L. 410,327.27	Proyecto Terminado
6. Construcción Centro De Calidad De Vida Bo. El Carmen	L. 3,767,167.59	Proyecto Terminado
7. Centro de calidad de vida aldea Las Crucitas	L. 2,956,701.47	Proyecto Terminado
8 Construcción Oficina Municipal de Juventud	L. 3,638941.5	Proyecto en ejecución, avance físico 100% ,Avance financiero 81.84%
TOTAL	L. 23,210,241.58	

Obras priorizadas en el municipio de Gracias, Lempira

Proyecto	Inversión Estimada*	Estado
	(millones de Lempiras)	
1. Obra de Confianza	L.3,225774.58	Proyecto Terminado.
2. Ampliación Casa de la Juventud.	L. 6619560.57	Proyecto Terminado.
3. Construcción campo de pelota Bella Vista y Pinalito.	L. 3197439.41	Proyecto Terminado
4. Reposición Polideportivo Villas del Rosario.	L. 7,868,528.04	Proyecto Terminado
5. Construcción plaza para la Recreación y la Convivencia Pinalito y Bella Vista.	L. 2,147,440.69	Proyecto Terminado
6. Remodelación Plaza San Sebastián	L. 4,029,707.82	Proyecto Terminado
7. Casa de la cultura	L. 8,169,443.80	Proyecto en ejecución, 57% avance físico
8. Centros de Formación Digital.	L. 53,756.51	Proyecto terminado

9. Construcción de Salón multiusos Bella Vista y Pinalito.	L. 2,979,546.19	Proyecto terminado
10. Construcción parque recreativo Moreno y Hércules.	L. 5,459,590.31	Proyecto Terminado
11. Ampliación plaza Marco Tulio Rodriguez	L. 2,454,714.29	Proyecto Terminado
12. Centro de calidad de vida Villami	L. 2,447,597.92	Proyecto terminado
13. Escuela de música Mejicapa	L. 2,590,324.49	Proyecto terminado,
TOTAL	L.51,246,651.22	

Obras priorizadas en el municipio de La Lima, Cortés

Proyecto	Inversión Estimada*	Estado
	(millones de Lempiras)	
1. Construcción centro juvenil de desarrollo integral	L. 3,262,220.20	Proyecto terminado
2. Ampliación Plaza de la Juventud.	L. 7,036,616.12	Proyecto terminado
3. Remodelación Caminos de los Gatos paseo del Puente y Áreas Aledañas	L. 2,831,897.23	Pendiente Orden de cambio
4. Remodelación parque los Pinos La Lima	L. 1775,191.17	Proyecto terminado
5. Parque Mediana Sitraterco	L. 8518,858.49	Proyecto en proceso de resolución de contrato, no tiene factibilidad
6. Casa de la Cultura	L. 9605,935.76	Proyecto en proceso de resolución de contrato, no tiene factibilidad
7. Remodelación Cancha El Maestro	L. 2687,523.23	Proyecto terminado
8. Centros de Formación Digital.	L. 211,335.17	Proyecto terminado
9. Construcción Centro de Calidad De Vida Col. Nuevo San Juan	L. 2961,528.33	Proyecto en ejecución, 83% avance físico
10. Construcción Centro de Calidad de Vida Alvarez Martínez	L. 3068,158.19	Proyecto en ejecución 92% avance físico
TOTAL	L. 40,388,568.24	

A la Cartera de proyectos del Programa CONVIVIR se le adicionaran 8 obras de las cuales 4 se encuentran en proceso de licitación y 4 en proceso de diseño y formulación.

Se espera que dichos proyectos estén aprobados para el mes de Abril del año 2019.

Nota: De los 30 proyectos actualmente aprobados en la cartera del Programa CONVIVIR, 2 proyectos en el Municipio de La Lima, Cortes se ha iniciado el proceso para rescindirlos debido a que no hay factibilidad social ni apoyo por parte del municipio para continuar con la Ejecución de los mismos, dichos proyectos son: Mediana Sitraterco y Casa de la Cultura.

2. Avance del Componente de Fortalecimiento de Habilidades Sociales y Laborales de Jóvenes y Componente Mejoramiento de Capacidades de Actores Relevantes

En el segundo trimestre del año 2019, se continuó con la formulación de procesos y ejecución de procesos de igual manera con la selección de participantes para estos dos (2) componentes esenciales del programa CONVIVIR, el cual se detalla a continuación un cuadro resumen de la situación de cada uno de ellos:

#	ACTIVIDADES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS	DIFICULTADES
CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL IDECOAS/FHIS Y FIPADEH PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES CON ACTORES RELEVANTES:				
Porcentaje de ejecución Adendum No. 04: 90%				
Situación Actual: En ejecución, Adendúm de tiempo al 31 de Marzo del 2019, se concretara un Adendúm No. 5 para continuar coordinado el componente Para la Conformación de ORMAS				
1	<p>Inicio de acciones del Adendum 5: Modelo de Gestión y Mantenimiento (ORMA):</p> <p>1.1 Revisión de la Propuesta Técnica de FIPADEH para el desarrollo del modelo de Gestión y Mantenimiento de las ORMAS.</p> <p>1.2 Elaboración del Adendum # 5 para revisión de las direcciones de FHIS y FIPADEH.</p> <p>1.3 Firma del Adendum entre el IDECOAS y FIPADEH.</p> <p>1.4 Gira de socialización Inicial para presentación del equipo Coordinador de FIPADEH en campo.</p> <p>1.5 Coordinación para el apoyo de las Asambleas de Cierres de los proyectos de parte de FIPADEH para la UTC.</p>	<p>Se realizó el análisis y discusión a profundidad de la propuesta técnica presentada por FIPADEH para el inicio en los municipios, posterior a ello se generó la presentación del Adendum a las diferentes direcciones de IDECOAS FHIS y la firma del documento entre las partes.</p> <p>Cabe mencionar que una de las tareas importantes de FIPADEH ha sido la contratación del equipo técnico con el perfil para la coordinación de las acciones en los municipios, esta meta fue cumplida, se contrató al equipo con el perfil adecuado y se ha establecido la debida comunicación con los equipos municipales.</p> <p>De igual manera FIPADEH ha generado todo su apoyo para coordinar las Asambleas de Cierre de los proyectos que aun</p>	<p>Firma de Adendum para el Modelo de Gestión y Mantenimiento de las ORMAS</p> <p>Entrega del Plan maestro con la Ruta de Implementación para el fortalecimiento de las ORMAS.</p> <p>Contratación del equipo Coordinador de FIPADEH con el perfil adecuado para la intervención comunitaria y asignado a cada municipio.</p> <p>Mayor empoderamiento de la UTC de los proceso de intervención comunitaria</p> <p>Apoyo de parte de FIPADEH en la programación de las Asambleas de cierre como</p>	<p>Encontrar a los profesionales con el perfil para el nivel de coordinación requerido.</p> <p>Definir el Modelo de Operación y Mantenimiento, al igual que los lineamientos técnicos, ya que es un planteamiento nuevo, esta tarea se llevó a cabo de manera conjunta con el IDECOAS/FHIS y la Asistencia Técnica.</p> <p>La falta de experiencia y conocimiento a nivel nacional en la Metodología PEC, no hay consultores con conocimiento amplio de la metodología, sin embargo la metodología</p>

#	ACTIVIDADES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS	DIFICULTADES
	<p>Seguimiento del Adendum 4 a la ejecución del Convenio con FIPADEH:</p> <p>a. Revisión a profundidad de la Estrategia Municipal para el Desarrollo de la Juventud.</p> <p>b. Socialización y revisión de la Metodología PEC, Manual introductorio y 4 manuales enviado a la dirección de Control y Seguimiento y la UTC.</p>	<p>están pendientes, coordinando fluidamente con los municipios y sobre todo con la UTC, con ello se está contribuyendo al inicio con la etapa de conformación y fortalecimiento de las ORMAS.</p> <p>Estrategia de Juventud</p> <p>De manera conjunta con FIPADEH se han realizado varias revisiones a profundidad de la estrategia, y se buscó el modelo de planificación adecuado para que los municipios puedan ejecutar de acorde a la realidad del municipio las acciones que enmarca la misma estrategia, ha sido un proceso de constante revisión, el documento fuere referido a nivel de las OMJ para que realicen sus propias observaciones y enriquezcan los alcances.</p> <p>Para la revisión de los Manuales PEC se ha asignado uno de los técnicos sociales del programa, para que lleve a profundidad la revisión y actualización de los manuales de manera conjunta con la UTC y la Dirección de control y seguimiento, de igual manera se definió una nueva estrategia de trabajo y se contó con un nuevo equipo que cierre as ilustraciones exclusivas para el Programa, este proceso a conllevado mucho tiempo de</p>	<p>su aporte institucional al proceso y en especial a los Oficiales de la UTC en campo</p> <p>Una Estrategia de Juventud por municipio revisada de manera conjunta con el INJ y consolidada con las observaciones de la OMJ</p> <p>La creación del propio diseño e ilustración de la metodología PEC bajo el enfoque de contextos urbanos.</p> <p>El equipo Técnico del IDECIAS FHIS en espacial la UTC y control y seguimiento, mas posicionado de la metodología y del quehacer del programa, con una visión fortalecida para las nuevas intervenciones del Programa.</p> <p>Los 4 manuales del Primer bloque Adaptados y corregidos por los técnicos de la UTC y control y seguimiento</p>	<p>Contextualizar las necesidades de cada municipio en materia de juventud como un primer ejercicio de planificación estrategia a nivel municipal.</p> <p>Los cambios del equipo técnico contratado por FIPADEH, genero retrasos en el tiempo de entrega de los documentos, de igual manera no se encontraron a satisfacción de la Coordinación del Programa al igual que del ATP</p> <p>Aún pendiente de coordinar con la Subsecretaria de Prevención</p>

#	ACTIVIDADES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS	DIFICULTADES
	Plan de seguridad Ciudadana del Municipio de Gracias.	trabajo y concentración, sin embargo es un aporte muy importante para la fase II del Programa, ya que se contara con la metodología PEC para contextos Urbanos Solicitud a la Subsecretaria de prevención para la socialización del documento y su debida aprobación en los municipios.	El documento trabajado por el Programa, ha sido el insumo para los municipios y para la subsecretaria de prevención para afinar los documentos finales que son los instrumentos solicitados por la subsecretaria para generar aportes concretos a temas de seguridad en los municipios.	
<p>CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL IDECOAS FHS Y ZAMORANO PARA LA FORMACION AMBIENTAL CON ENFOQUE EN PROCESOS DE PRODUCCION Y EMPRENDIMIENTO JUVENIL:</p> <p>Porcentaje de ejecución: 100%</p> <p>Situación Actual: En ejecución, Adendum de tiempo al 30 de Mayo del 2019.</p> <p>Total de Participantes Directos: en esta etapa</p>				
2	<p>Componentes A:</p> <p>fortalecimiento de jóvenes en temas ambientales con enfoque en emprendimiento. (Por los tres municipio):</p> <p>- Evento de certificación de los jóvenes realizado en los tres municipios.</p> <p>-. Presentación de los jóvenes conformados en empresas ambientales, presentación de sus proyectos, solicitado su reconocimiento y aprobación en reunión ordinaria de corporación municipal en los tres municipios</p>	<p>Para esta última Fase, de implementación del Convenio, se realizó el debido lobby con las Autoridades Municipales para que los jóvenes fueran reconocido como jóvenes asociados en empresas de emprendimientos verdes, de igual manera se buscó la aprobación de las empresas formadas por los jóvenes, mismas que quedaron respaldas en puntos de actas por corporación municipal. De igual manera se tuvieron reuniones con el equipo técnico de zamorano para consolidar la mejor</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizaron 3 eventos de certificación de 43 jóvenes dadas por Zamorano • Puntos de Acta para el reconocimiento de los jóvenes como empresas de emprendimiento. • 3 Grupos de jóvenes reconocidos y apoyados por sus gobiernos locales en temas ambientales y emprendimientos • Creación de nuevas iniciativas de emprendimiento 	<p>Estar sujetos a las fechas de reunión ordinaria de Corporación Municipal para la socialización de los proyectos y empresas de los jóvenes.</p> <p>El tiempo disponible de los docentes para enfocarse en las corrección y adecuaciones de los syllabus apegados a los requerimientos de Zamorano</p>

#	ACTIVIDADES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS	DIFICULTADES
	<p>Componente B: Desarrollo del diagnóstico en Café del Instituto Ramon Rosa/Gracias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Socialización de las iniciativas de la propuesta de lácteos y café con la Secretaria de Educación, Subdirección curricular. - Reunión de solicitud de avances de parte de la coordinación del Programa y ATP al instituto Ramon Rosa. - Socialización de parte del Instituto Ramon Rosa su propuesta de intervención basada en la planta de lácteos y café e integrada en los Silabus de la Currícula del Bachillerato técnico en Agropecuaria. 	<p>estrategia de sostenibilidad de los proyectos.</p> <p>En la última etapa de revisión de los Silabus de lácteos y café, se motivó al instituto a generar una propuesta que integraran los momentos metodológicos lacteados en los Silabus los cuales deberán de están muy relacionado con las plantas de lácteos y café, por tal motivo los docentes socializaron l estrategia de implementación ya vinculante con los esperado en tema de infraestructura al equipo de IDECOAS y Zamorano</p>	<p>juvenil con enfoque ambiental:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En la Lima: Emprendimiento Juvenil Ecobambuhn, orientado a los proyectos orgánicos elaborados a base de bambú. Donación de un terreno municipal destinado para el aprovechamiento de los jóvenes en el desarrollo del Proyecto ambienta denominado “Vivero Municipal Oro Verde de La Lima” 2. En Siguatepeque: Empresa Juvenil Ecogreen con el Proyecto de protección ambiental “Fomento de la Educación en temas ambientales con enfoque en huertos biointensivos y manejo integral de residuos sólidos” 3. En Gracias: Empresa Juvenil Ecomundo Tours. Cabe mencionar que por iniciativa de los jóvenes y de la municipalidad se realizó un Primer cabildo abierto en temas ambientales, conducido por los jóvenes. <ul style="list-style-type: none"> • Aprobado el Silabus de lácteos y Café por Zamorano.(Con la incorporaciones hechas por los docentes, cumpliéndose la 	

#	ACTIVIDADES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS	DIFICULTADES
			metodología aprender haciendo)	
<p>CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL IDECOAS/FHIS Y EL CENET PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD JUVENIL</p> <p>Porcentaje de ejecución: 25% (Tentativo)</p> <p>Situación Actual: En ejecución, Adendúm de tiempo al 30 de Junio del 2019.</p> <p>Importante: continua la dificultad administrativa de la trasferencia de fondos, siendo esta un responsabilidad directa del CENET, por lo que no hubo ejecución operativa ni presupuestaria del convenio</p>				
3	<p>Seguimiento de Convenio entre IDECOAS/FHIS y CENET.</p> <p>Reuniones con el Staff de CENET para buscar la solución frente al problema administrativo que se generó con los fondos del Convenio.</p> <p>Reunión con el equipo de infraestructura del Programa convivir para el respectivo asesoramiento en el espacio arquitectónico y requerimientos enfocado a taller del procesamiento de alimentos del inst Valle de Sula</p> <p>Socialización de parte del equipo de infraestructura del Programa el diseño arquitectónico y equipamiento del taller de Procesamiento de alimentos a los docentes del Instituto Valle de sula.</p> <p>Reunión con la secretaria de Educación para socializar la</p>	<p>Con la dificultad de no tener los fondos disponibles para continuar con la ejecución del convenio, el equipo de CENET continua con el desarrollo de algunas actividades que no implico costos, en este caso se avanzó con la aprobación de los planos arquitectónicos elaborado por el equipo de IDECOAS y se acompañó a la gira de socialización y aprobación de planos e parte de los docentes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Planta Arquitectónica aprobada por el Equipo de Cenet. • Socialización y aprobación de la Planta Arquitectónica del Taller de alimentos por los docentes del Inst. Valle de Sula de La lima. • Solarización preliminar de la propuesta curricular a la secretaria de Educación 	<p>Cenet aún no ha logrado la recuperación de los fondos, por lo que el Convenio no se ha logrado ejecutar.</p>

#	ACTIVIDADES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS	DIFICULTADES
	propuesta de mejoramiento curricular.			
<p>CONVENIO DE COOPERACION ENTRE E IDECOAS/FHIS Y LA FUNDACION ANED PARA E DESAROLO DE LA SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS DEL PROGRAMA Y EL LINEA DE BASE FASE CUATRO:</p> <p>Firma de convenio reciente, extensión de tiempo al 31 de mayo del 2019.</p> <p>% de ejecución 50%</p> <p>Solicitud de extensión de tiempo al 30 de agosto del 2019</p>				
4	<p>Fundacion ANED.</p> <ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de jornadas de análisis a profundidad para fortalecer la construcción de la sistematización de experiencias y Línea base de manera conjunta con el Idecoas Fhis, Aned y el ATP. Apoyo a la Coordinación para elaboración de Video Oficial del Programa a nivel de cada Municipio. Definición de nuevos enfoques para micro videos por componente. 	<p>Se realizaron reuniones de consulta a profundidad para conocer el origen del programa, sus componentes, resultados y avances a la fecha, de igual manera se delimito el eje sistematizados del Programa, siendo este los Modelos y enfoques de participación comunitaria y Juvenil para la Promoción de la Convivencia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Un informe preliminar de Línea Base Un informe Preliminar de Sistematización de experiencias Definición del ciclo de implementación del Programa dentro del ciclo de Proyectos desarrollados por el FHIS, dando como resultado el ciclo de implementación de los procesos sociales. Identificación de logros e impactos considerables por el programa, 	<p>El cambio constante del equipo técnico de Aned sobre todo en la coordinación de la sistematización, teniendo que reorientar el proceso constantemente e invirtiendo tiempo para ello.</p>

CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)

✓ Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a Través de las Energías Renovables (PODER)



i. Objetivo General

El Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a través de las Energías Renovables (PODER), tiene como objetivo principal, mejorar las condiciones de vida del sector rural de Honduras más pobre del país. La falta de energía limita las oportunidades económicas y las opciones alimenticias disponibles en los hogares hondureños. Sin energía, familias rurales no tienen la capacidad de refrigerar y almacenar alimentos nutritivos, operar sistemas de irrigación y llevar a cabo procesos que les de valor agregado para generar ingresos adicionales, o incluso que les permita finalizar las tareas escolares por la noche. La meta de esta Actividad es proporcionar acceso a energías renovables (incluyendo las tecnologías que pueden resultar en la entrega de energía eléctrica) a por lo menos 10,000 familias rurales de Honduras, aproximadamente 50,000 beneficiarios en el occidente de Honduras en comunidades de la iniciativa de Alimentando el Futuro del Gobierno de Estados Unidos, a través de los proyectos, y de esta manera abordar algunas de las causas fundamentales de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición.

ii. Focalización

Proyectos que mejoran la posibilidad para generar el ingreso de los residentes de las comunidades del área de influencia en los departamentos de La Paz, Lempira, Intibucá, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque.

iii. Descripción del Proyecto

Soluciones y tecnologías haciendo uso de las energías renovables orientados a la mejora de los procesos productivos logrando atacar las causas de pobreza e inseguridad alimentaria.

iv. **Monto del Convenio:** Los fondos destinados para la ejecución de este Programa es de 20.82 millones de lempiras para el año 2016. Estos fondos son donación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

v. **Avance Financiero**

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2015	10,860,882.00	9,750,284.62	89.77%
2016	16,406,200.00	16,406,199.26	100.00%
2017	22,636,218.00	22,589,168.01	99.79%
2018	20,820,000.00	20,819,999.68	100.00%
2019	30,909,703.00	11,817,487.34	38.23%

vi. **Avance por Sector**

SECTOR	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios Directos 2019
RIEGO	0	878,483.81	0	0
ENERGIA RENOVABLE	4	9,158,480.18	1,174	48
TOTAL	4	10,036,963.99	1,174	48

vii. **Avance por Departamento**

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios directos 2019
INTIBUCÁ	2	4,353,010.09	1,152	247
LEMPIRA	1	3,151,801.34	0	91
SANTA BARBARA	1	2,532,152.56	22	140
TOTAL	4	10,036,963.99	1,174	478

viii. **Otras Inversiones**

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2019
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	806,485.36
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	974,037.99
TOTAL	1,780,523.35

ix. Principales Logros y avances (de abril a junio 2019)

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

- En ejecución 4 proyectos de energía renovable, 5 proyectos ya contratados por iniciar y 1 proyecto en formulación

No.	Nombre	Comunidad	Departamento	Costo USAID	Etapas	Avance
1	Micro generación en sistema de riego por goteo	Llanito Verde	Lempira	1,250,000.00	En Ejecución	65.00%
2	Secadoras solares tipo Domo para pequeños productores (121)	Varias comunidades	Lempira	1,984,783.90	En Ejecución	30.00%
3	Secadoras solares tipo Domo para pequeños productores (85)	Varias comunidades	Santa Bárbara	1,389,348.73	En Ejecución	30.00%
4	Centro de Entrenamiento y Capacitación en Energías Renovables	Lepaera	Lempira	719,547.15	Con Orden de Inicio	0.00%
5	Proyecto de secadoras solares industriales en el Departamento de Intibucá	Varias comunidades	Intibucá	2,500,000.00	Con Orden de Inicio	0.00%
6	Proyecto de secadoras solares tipo domo en el Departamento de Intibucá	Varias comunidades	Intibucá	1,723,878.90	En Ejecución	95.00%
7	Centro de Entrenamiento Nutricional (CEN) Semané, Yamaranguila, Intibucá	Semané	Intibucá	160,000.00	Con Orden de Inicio	0.00%
8	Centro de Entrenamiento y Capacitación de Energía Renovables - Cucuyagua, Cucuyagua, Copán	Cucuyagua, Copán	Copán	160,000.00	Con Orden de Inicio	0.00%
9	Centro de Entrenamiento y Capacitación de Energía Renovables - Jesús de Otoro, Otoro, Intibucá	Jesús de Otoro, Otoro, Intibucá	Intibucá	160,000.00	Con Orden de Inicio	0.00%
10	Kits tecnológicos para Centros de Entrenamiento Nutricional (9)	Varias comunidades	Intibucá, La Paz, Lempira	2,514,395.00	En formulación	0.00%

PROYECTOS TERMINADOS

- Proyectos terminados 16 sistemas de riego y 23 proyectos de energía renovable.

No.	Nombre	Comunidad	Departamento	Avance
1	Sistema de riego San Antonio del Norte	San Antonio del Norte	La Paz	100.00%
2	Sistema de riego Togopala	Togopala	Intibucá	100.00%
3	Sistema de riego Las Mesas	Las Mesas	Intibucá	100.00%
4	Sistema de riego Azacualpa	Azacualpa	Intibucá	100.00%
5	Sistema de riego El Tablón	El Tablon	Intibucá	100.00%
6	Sistema de riego Belén	Belen	Intibucá	100.00%
7	Sistema de riego Las Quebradas	Las Quebradas	Intibucá	100.00%
8	Sistema de riego Los Olivos	Los Olivos	Intibucá	100.00%

9	Sistema de riego Las Lagunas	Las Lagunas	Intibucá	100.00%
10	Sistema de riego La Rinconada	La Rinconada	Intibucá	100.00%
11	Sistema de riego El Cerrón	El Cerrón	La Paz	100.00%
12	Sistema de riego Panina	Panina	Intibucá	100.00%
13	Riego por goteo Las Flores-II	Las Flores-II	Intibucá	100.00%
14	Riego por goteo Nueva Yamala	Nueva Yamala	Santa Bárbara	100.00%
15	Secadoras solares tipo domo para pequeños productores	Varias comunidades	Santa Bárbara	100.00%
16	Secadoras solares tipo domo para pequeños productores	Varias comunidades	Copán	100.00%
17	Secadoras solares tipo domo para pequeños productores	Varias comunidades	Ocotepeque	100.00%
18	Estufas mejoradas	Varias comunidades Copan	Copán	100.00%
19	Estufas mejoradas	Varias comunidades	Santa Bárbara	100.00%
20	Estufas mejoradas	Varias comunidades	Ocotepeque	100.00%
21	Estufas mejoradas	Varias comunidades	Lempira	100.00%
22	Estufas mejoradas	Varias comunidades Intibuca	Intibucá	100.00%
23	Estufas mejoradas	Varias comunidades	La Paz	100.00%
24	Secadoras solares	Varias comunidades	Intibucá	100.00%
25	Sistema de riego Panina (fase 2)	Panina	Intibucá	100.00%
26	Sistema de riego Togopala (fase 2)	Togopala	Intibucá	100.00%
27	Secadoras solares tipo Domo para pequeños productores (122)	Varias comunidades	La Paz	100.00%
28	Estufas mejoradas varias comunidades (132)	Varias comunidades	Intibucá	100.00%
29	Estufas mejoradas varias comunidades (132)	Varias comunidades	La Paz	100.00%
30	Secadoras solares tipo Domo para pequeños productores (85)	Varias comunidades	Copán	100.00%
31	Secadoras solares tipo Domo para pequeños productores (85)	Varias comunidades	Ocotepeque	100.00%
32	Estufas mejoradas varias comunidades (241)	Varias comunidades	Santa Bárbara	100.00%
33	Estufas mejoradas varias comunidades (132)	Varias comunidades	Lempira	100.00%
34	Estufas mejoradas varias comunidades (241)	Varias comunidades	Copán	100.00%
35	Estufas mejoradas varias comunidades (241)	Varias comunidades	Ocotepeque	100.00%
36	Centro de Entrenamiento Nutricional	El Portillo Norte, Yamaranguila	Intibucá	100.00%
37	Centro de Entrenamiento Nutricional	Azacualpa, Yamaranguila	Intibucá	100.00%
38	Sistemas solares domiciliarios	Carrizalito y Valle de la Cruz, Erandique	Lempira	100.00%
39	Secadoras solares tipo Domo para pequeños productores (121)	Varias comunidades	Intibucá	100.00%
40	Sistema de Biodigestión a partir de residuos de café	Cooperativa Montaña Verde	Santa Barbara	100.00%

x. Problemática

- La Carta de Ejecución 17-2018, que ampliaba la duración del proyecto por un año más, y proveía de fondos por un valor de un millón de dólares (US\$ 1,000,000.00) fue firmada hasta el 29 de octubre del año 2018. Sigue sin resolverse la situación de las exoneraciones de impuestos que vencieron el 30 de septiembre del año 2018, por lo que todavía no se pueden realizar compras exoneradas de impuestos, valor que no es reconocido como gasto por USAID. El trámite de la solicitud de exoneración de impuestos lo hace USAID, y no el IDECOAS/FHIS. SE nos había informado que el trámite para el dictamen de exoneración de

impuestos duraría unos tres meses a partir de diciembre, sin embargo, ya transcurrió todo el primer trimestre del 2019, y se cree que el dictamen tardara unos dos meses adicionales. En ese sentido se está ampliando la duración del convenio en 9 meses adicionales, para poder finalizar los mismos antes del 30 de junio del 2020.

- Ahora, y de acuerdo a políticas internas de USA, han disminuido fondos para el proyecto por un monto de US\$ 180,000.00 lo que implica que tres (3) de los proyectos programados a ejecutar no se realizaran.

✓ **Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)**



i. Objetivo General

El propósito de esta Actividad es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

ii. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en las cinco municipalidades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Tela y La Ceiba. Las comunidades específicas de intervención serán identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

iii. Descripción del Proyecto

Esta Actividad ayudará al GdeH (representado a través de FHIS) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otras partes interesadas. La Actividad incluye dos resultados complementarios: Resultado 1: Mejora de la infraestructura comunitaria, las actividades responderán a las prioridades de infraestructura comunitaria para abordar la seguridad ciudadana. Resultado 2: Aumento de la cohesión comunitaria, considera que la forma en que las intervenciones de infraestructura son concebidas, diseñadas y ejecutadas pueden desempeñar un papel directo en el aumento de la cohesión social y comunitaria y promover un marco holístico de prevención de la violencia. Los proyectos bajo la Actividad incluirán instalaciones educativas,

centros de salud, alumbrado público, espacios comunitarios más seguros, centros de alcance y comunitarios, centros vocacionales, jardines comunitarios, parques, espacios recreativos, paradas de buses, accesos peatonales, mejoras al alumbrado de calles, señalización, instalaciones para el sector seguridad y justicia, así como otros proyectos de infraestructura de pequeña escala que se acuerde entre las Partes.

iv. **Monto del Convenio:** Presupuesto total estimado: \$14, 637,541.74, de los cuales, fondos de donación de USAID: \$11, 710,033.39; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$ 2, 927,508.35 (efectivo: \$ 2, 127,508.35 y especies: \$ 800,000.00).

v. **Avance Financiero**

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	23,226,555.00	21,906,553.68	94.32%
2019	60,781,669.00	20,317,550.08	33.43%

vi. **Avance por Sector**

Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios Directos 2019
2	5,947,599.75	19	8,936
1	L 1,193,312.20	13	320
5	L 11,054,358.38	80	3,864
8	18,195,270.33	112	13,120

vii. **Avance por Departamento**

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios directos 2019
ATLANTIDA	3	L 5,856,355.82	40	1,892
CORTES	4	L 11,145,602.31	59	10,908
FRANCISCO MORAZAN	1	L 1,193,312.20	13	320
TOTAL	8	18,195,270.33	112	13,120

viii. **Otras Inversiones**

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2019
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	L. 1,574,879.53
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	L. 547,400.22
TOTAL	L. 2,122,279.75

ix. **Principales Logros (abril a junio 2019)**

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

A. PROYECTOS EJECUTADOS:

A continuación se presentan los proyectos ejecutados:

No.	Tipo de Proyecto	Ubicación	Monto del Proyecto	Status
1	Mejoras al Centro de Alcance Las Ayestas	Col. Las Ayestas, Distrito Central	L. 1,193,312.20	Cierre Financiero
2	Reparación de Escuela Carlos Rivera López	Colonia Central, Sector Rivera Hernández, San Pedro Sula	L. 2,676,001.97	Cierre Financiero
3	Obras Complementarias CEB José Antonio Peraza	Col. 6 de Mayo, Sector Rivera Hernández, San Pedro Sula	L.2,522,000.59	Cierre Financiero
4	Mejoras Instituto Triunfo de la Cruz	Col. San Alejo, Tela	L. 892,602.62	Cierre Financiero
5	Reparación Techo CEB Miguel Paz Barahona	Sector Bonitillo, La Ceiba	L. 137,702.02	Cierre Financiero
6	Pavimentación Calle Principal Col. Lopez Arellano (Ruta Segura)	Sector López Arellano, Choloma	L. 3,054,996.99	Cierre Financiero
7	Pavimentación Calle Principal hacia los juzgados (Ruta Segura)	Col. La Granja 1 y 2, Choloma	L. 2,892,602.76	Cierre Financiero
8	Reparación Marco Antonio Ponce	La Ceiba, Atlántida	L. 4,826,051.18	Cierre Financiero
TOTAL EJECUTADO			L. 18,695,454.19	

B. PROYECTOS A INICIAR

A continuación se presentan los proyectos en proceso previo a ejecución:

No.	Tipo de Proyecto	Ubicación	Monto del Proyecto	Status
1	Reparación CEB Claudio Barrera F	La Ceiba, Atlántida	L.5,473,876.39	Firmado por el ministro, elaboración orden de inicio
2	Construcción Ruta Segura a CDA Nueva Suyapa	MDC, Francisco Morazán	L.3,684,432.26	En firma de contrato ministro
3	Construcción Techo a Cancha Multiusos Col. Japón	Choloma, Cortés	L.1,200,000.00	Pendiente certificación del CEP Municipalidad de Choloma
4	Ampliación CEB Dr. Alfonso Lacayo	Sector Rivera Hernández, San Pedro Sula	L.6,000,000.00	Conformación de expediente para contrataciones FHIS
5	Ampliación Centro de Alcance Las Mercedes	La ceiba, Atlántida	L.1,644,821.01	Contrato firmado por el CEP Firmado por el ministro. Elaboración orden de inicio
TOTAL PROYECTOS POR INICIAR			L.18,003,129.66	

C. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

A continuación se presentan los proyectos en ejecución:

No.	Tipo de Proyecto	Ubicación	Monto del Proyecto	Status
1	Reparación Instituto Reynaldo Narváez Rosales	Col. Las Torres, Distrito Central	L. 3,200,000.00	98% avance físico
2	Construcción Kinder Mirian Lobo	La Ceiba, Atlántida	L. 2,999,675.92	5% avance físico
3	Reparación de Casa Alianza Centro	Comayagüela, Francisco Morazán	L.3,883,846.45	57.5% avance físico
4	Reparación CEIN y Ampliación MAIE	La Ceiba, Atlántida	L. 2,575,044.55	5% avance físico
5	Construcción Centro Integral Corozal	Corozal, La Ceiba	L. 3,300,000.00	59.67% avance físico
6	Construcción Posta Policial Bonitillo	Sector Bonitillo, La Ceiba	L. 3,349,356.72	48.5% avance físico
TOTAL EN EJECUCIÓN			L. 19,307,923.64	

✓ **Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras**
(USAID/PIOH)



i. Antecedente

Las pobres condiciones sociales y económicas son especialmente pronunciadas en el occidente de Honduras, extrema pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático, bajos niveles educativos, migración, falta de acceso a los servicios básicos y otros retos socioeconómicos son endémicos. La provisión de servicios básicos de educación y nutrición son escasos en la zona de occidente y es difícil el acceso a los ya existentes, así mismo la gestión de servicios de educación, nutrición y agua y saneamiento son deficientes por lo que los ciudadanos cuentan además con pocos espacios de participación para mejorar sus vidas a nivel de hogar y sus vidas productivas, lo que genera una gran brecha de pobreza.

En este sentido se busca a través de proyectos de infraestructura de pequeña escala, la generación de accesos para la comunidad a espacios de participación que sirvan como plataforma para impulsar el desarrollo sostenible de la región, logrando satisfacer necesidades no satisfechas de algunos de los servicios básicos para generar un efecto multiplicador en la zona occidental del país.

Actualmente, la **AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID)** en apoyo al Gobierno de Honduras, ha asignado fondos de donación para la ejecución de proyectos de infraestructura a través del **INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO, FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (IDECOAS/FHIS)**, que vengán a mejorar las condiciones en las comunidades seleccionadas en el occidente de Honduras.

En base a lo anterior, surge la Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras, mediante la cual se ha considerado proveer esfuerzos de infraestructura a pequeña escala para mejorar la entrega de servicios a la población, mejorando condiciones de pobreza, vulnerabilidad al cambio climático, bajos niveles educativos e inseguridad alimentaria debido a la falta de acceso a servicios básicos. A su vez con esto se pretende crear una plataforma de participación ciudadana para cimentar las bases de una estructura comunitaria más efectiva, jugando un rol importante en la mejora de la entrega de servicios locales en el Occidente de Honduras.- El área de intervención será enfocada en las zonas de mayor pobreza, específicamente está orientada a seis departamentos del Occidente de Honduras.

Se ha planteado como meta beneficiar comunidades ubicadas en los seis departamentos de la zona de occidente de Honduras, su mayoría de la zona rural, habitantes en comunidades que presentan condiciones de pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático, bajos niveles educativos, migración y falta de acceso a servicios público.

La administración y ejecución de la Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH), financiado con fondos USAID, estará a cargo del IDECOAS/FHIS, a través de la Dirección de Infraestructura Mayor (DIM).

ii. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en los departamento de Ocotepeque, la Paz, Copan Intibucá, Santa Bárbara y Lempira y zonas occidente específicas de intervención identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

iii. **Monto del Convenio:** Se acaba de Incorporar al Presupuesto General de la Republica L. 6,190,560.00, que se logró con los fondos de contrapartida del Gobierno.

iv. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2019	6,190,650.00	0.00	0.00%
