



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



---

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS  
DE DESARROLLO COMUNITARIO,  
AGUA Y SANEAMIENTO  
SEDECOAS

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL  
(SEDECOAS/FHIS)

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan  
Operativo Anual POA-Presupuesto

**III Trimestre 2019**



## Indicé

<b>Introducción.....</b>	<b>3</b>
<b>Antecedentes .....</b>	<b>3</b>
<b>Misión:.....</b>	<b>4</b>
<b>Visión:.....</b>	<b>4</b>
<b>Valores: .....</b>	<b>4</b>
<b>Resumen Ejecutivo.....</b>	<b>5</b>
<b>Situación Actual de los Programas:.....</b>	<b>6</b>
<b>Proyectos FHIS.....</b>	<b>8</b>
<b>Ejecución Presupuestaria por Programas 2019 .....</b>	<b>9</b>
<b>Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2019.....</b>	<b>9</b>
<b>Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Tercer Trimestre 2019 .....</b>	<b>11</b>
<b>Ejecución Gasto Operativo Tercer Trimestre del 2019 .....</b>	<b>12</b>
<b>Cuadro por Sector 2019 (Ejecutado).....</b>	<b>15</b>
<b>CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO .....</b>	<b>16</b>
✓Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) .....	16
<b>CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA .....</b>	<b>23</b>
✓Proyecto de Infraestructura Rural BCIE .....	23
<b>CARTERA KfW Entwicklungsbank.....</b>	<b>31</b>
✓Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE III y IV	31
✓Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) .....	36
<b>CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)</b>	<b>45</b>
✓Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a Través de las Energías Renovables (PODER).....	45
✓Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS).....	49
✓Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)	53

## **Introducción**



El presente informe es la recopilación de las actividades e inversiones realizadas por el SEDECOAS/FHIS durante el tercer trimestre de 2019.

## **Antecedentes**

De acuerdo al Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-056-2019 se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), la cual debe de promover el Desarrollo Comunitario por medio de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos, en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerables de Honduras quien para el desarrollo de sus funciones debe contar con una Subsecretaría de Estado.

Se adscribe a dicha Secretaría de Estado, la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS).

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es un organismo Desconcentrado de la Presidencia de la República, creado el 22 de febrero de 1990 y extendida su vida legal hasta el año 2022 según decreto No. 222-2010 cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados, en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social y/o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Asimismo, asesorará a los gobiernos locales con respecto a los procesos de captación de recursos de las fuentes de financiamiento nacionales y/o externas y las asiste en la transferencia de las capacidades técnicas y administrativas, para convertir a estos gobiernos locales en administradores eficientes de sus programas y proyectos, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Nación en aplicación del principio de Descentralización.

### **Misión:**

“Somos una Institución estatal, desconcentrada, técnica y captadora de recursos que promueve el desarrollo local sostenible, participativo e incluyente mediante el fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, en alianza con socios estratégicos para desarrollar obras de infraestructura y proyectos de orientación social de acuerdo al plan de nación y visión de país de forma transparente y eficiente, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable de Honduras”.

### **Visión:**

“Ser para el año 2022, la Institución líder en gestión y fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, para la ejecución de proyectos, que contribuya equitativamente al desarrollo sustentable nacional”.

### **Valores:**

- **Ética:** Ejercicio de las funciones con sujeción a las normas morales que promuevan la confianza de la población hondureña.
- **Integridad:** Actuación sustentada en la honradez, prudencia, entereza, rectitud y firmeza.
- **Compromiso:** Ejecución de proyectos que coadyuven al desarrollo local.
- **Transparencia:** Amplia difusión de información sobre nuestras actuaciones. Rendición de cuentas ante la sociedad.
- **Lealtad:** Actuar con fidelidad y rectitud hacia el FHIS y compañeros de trabajo, con el objetivo de identificarse con la institución.
- **Equidad:** El FHIS no hace distinción de credo, raza, de ninguna otra forma de discriminación humana.

## Resumen Ejecutivo

SEDECOAS/FHIS, llega hasta los lugares más recónditos del país, para contribuir a mitigar las necesidades de la población más pobre y vulnerable a través de respuestas rápidas y concretas con proyectos de Agua y Saneamiento, Educación, Electrificación Rural, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural.

El presupuesto del FHIS para la gestión 2019 al 30 de septiembre asciende a 698.3 Millones de Lempiras:

Fuente	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	% de Participación en el Presupuesto Vigente
<b>BID</b>	L. 117,716,409.00	L. 101,558,797.00	14.54%
<b>BCIE</b>	L. 15,809,640.00	L. 37,967,252.00	5.44%
<b>USAID</b>	L. 141,691,372.00	L. 97,882,022.00	14.02%
<b>GOH*</b>	L. 319,853,560.00	L. 320,944,270.00	45.96%
<b>KfW</b>	L. 185,953,992.00	L. 139,953,992.00	20.04%
<b>TOTAL</b>	<b>L. 781,024,973.00</b>	<b>L. 698,306,333.00</b>	<b>100.00%</b>

\* Incluye costo Operativo del FHIS



### **Situación Actual de los Programas:**

1. Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), Se han diseñado al 100% 4 proyectos integrales de mejoramiento de barrio que incluye: mejora, reparación y/o construcción del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y sistema vial para las colonias: Nueva España, Nueva Australia, Nueva Galilea y 25 de Enero, Se ha ejecutado el Programa de entrenamiento deportes olímpicos y Valores en las disciplinas de: Taekwondo, Tenis de Mesa, y Levantamiento de pesas, con una participación de 900 niños y jóvenes de las colonias beneficiarias.
2. Programa Infraestructura Rural (BCIE), En el **sector de Agua y Saneamiento**, actualmente se encuentran en ejecución tres (3) subproyectos de construcción de sistemas de agua potable mediante Microcaptación pluvial y saneamiento. En el **sector de Caminos Rurales**, se encuentran en ejecución dos (2) subproyectos: rehabilitación del tramo Calle Agua Zarca del municipio de Camasca; así como el tramo Azacualpa – Buena Vista del Municipio de Candelaria.
3. Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE III y IV: Se ejecutó el 81.24 % con respecto a lo planificado acumulado para el III trimestre.  
Ejecución de Proyectos: Impulsar la formulación y evaluación de proyectos en la fase IV.  
Cierre del PROMINE III: Completar las actividades para el cierre de dicha fase a diciembre del 2019.
4. Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR), Al cierre del período del periodo de Julio a Septiembre del año 2019 la ejecución financiera del programa alcanza a un 29.42% Entre las razones más importantes para este porcentaje (%) de ejecución, es debido a que los proyectos algunos se encuentran en ejecución y otros en espera de la aprobación de la ampliación de tiempo del programa al 30 de junio del año 2020, ya que desde el 10 de julio del año en curso se encuentra en trámite en SEFIN sin dar alguna respuesta, sin dicha ampliación no se ha podido continuar con los proceso.
5. Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a través de las Energías Renovables (PODER), Se ejecutaron todos los proyectos planificados para este trimestre. El proyecto realiza su cierre operativo el 30 de Septiembre. Terminados 16 sistemas de riego y 23 proyectos de energía renovable.


6. Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS), actualmente finalizaron con cierre financiero 9 proyectos, 5 proyectos está por iniciar y 10 proyecto con % de avance físico.
  
7. PIOH: Se tienen Incorporados al Presupuesto General de la Republica L. 6,190,560.00, que se logró con los fondos de contrapartida del Gobierno.

## Proyectos FHIS

Fuente	Nombre del Proyecto	Nombre Corto	Sector	Modalidad Ejecucion
<b>BID</b>	Programa Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	PCCMB 4518/BL-HO	Infraestructura Social	Centralizados
<b>BCIE</b>	Proyectos de Infraestructura Rural	PIR BCIE 1736	Agua y Sanemiento, Eletrificacion y Caminos Rurales	Descentralizados/ Centralizados
<b>KFW</b>	Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar SE-FHIS FASE III y IV	PROMINE	Infraestructura Escolar	Descentralizados
	Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras	CONVIVIR	Infraestructura Social y Fortalecimiento de las Capacidades de los Jóvenes	Descentralizados
<b>USAID</b>	Programa de Oportunidades para el Desarrollo a través de Energía Renovable	PODER	Soluciones y tecnologías haciendo uso de las energías renovables orientados a la mejora de procesos productivos logrando atacar las causa de pobreza e inseguridad alimentaria	PEC/Centralizados
	Programa de Infreestructura para la Seguridad Ciudadana	ICS	Recuperacion de espacio públicos e infraestructura escolar para la mejora de la seguridad ciudadana	PEC/Centralizados
	Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras	PIOH	Mejorar las condiciones de Infraestructura Básica para contribuir al desarrollo en el Occidente de Honduras.	PEC/Centralizados


### Ejecución Presupuestaria por Programas 2019

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Monto Planificado III Trimestre	Devengado del III Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% Ejecución III Trimestre/ Planificado III Trimestre	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
Programa 1: Actividades Centrales	L. 319,853,560.00	L. 320,944,270.00	L. 104,499,377.00	L. 40,824,374.21	L. 126,396,197.61	L. 194,548,072.39	39%	39.4%
Programa 11: Infraestructura Rural	L. 15,809,640.00	L. 44,157,902.00	L. 20,877,238.00	L. 6,339,249.38	L. 18,234,496.35	L. 25,923,405.65	30%	41.3%
Programa 12: Infraestructura Escolar	L. 123,157,419.00	L. 83,157,419.00	L. 20,443,471.00	L. 12,890,938.43	L. 44,861,441.72	L. 38,295,977.28	63%	53.9%
Programa 14: Fomento al Desarrollo Local	L. 286,794,651.00	L. 219,137,039.00	L. 54,459,557.00	L. 20,456,784.87	L. 62,320,473.24	L. 156,816,565.76	38%	28.4%
Programa 17: Infraestructura Productiva	L. 35,409,703.00	L. 30,909,703.00	L. 17,567,020.00	L. 3,750,953.46	L. 15,568,440.80	L. 15,341,262.20	21%	50.4%
<b>TOTAL</b>	<b>L. 781,024,973.00</b>	<b>L. 698,306,333.00</b>	<b>L. 217,846,663.00</b>	<b>L. 84,262,300.35</b>	<b>L. 267,381,049.72</b>	<b>L. 430,925,283.28</b>	<b>39%</b>	<b>38%</b>

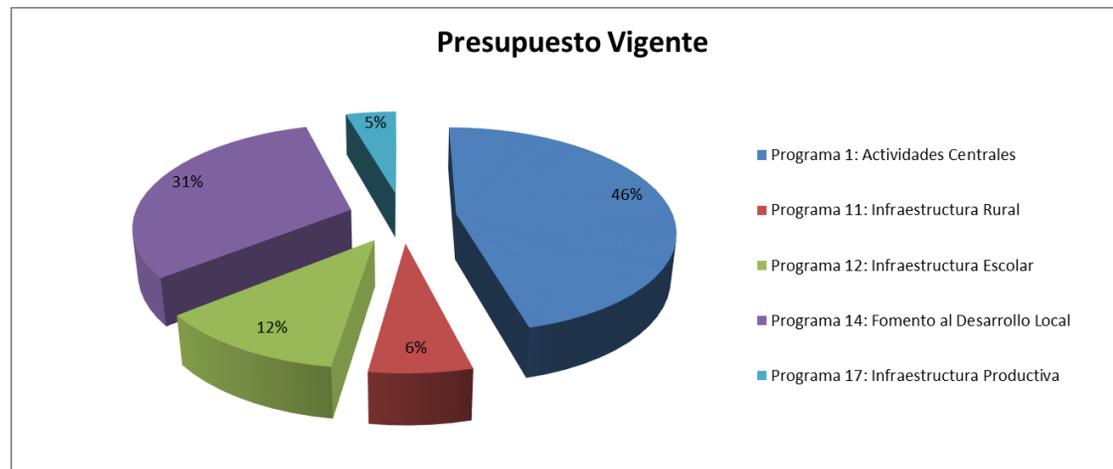


### Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2019

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente 2019	Devengado del III Trimestre	Devengado Acumulado 2019	% Ejecución al III Trimestre / Presupuesto Vigente
Gasto Operativo/Gobierno	L. 319,853,560.00	L. 320,944,270.00	L. 40,824,374.21	L. 126,396,197.61	39%
Proyecto de Infraestructura Rural 1736-BCIE	L. 15,809,640.00	L. 37,967,252.00	L. 6,322,905.62	L. 18,218,152.59	48%
Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras	L. -	L. 6,190,650.00	L. 16,343.76	L. 16,343.76	0%
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar, KfW VIII	L. 123,157,419.00	L. 83,157,419.00	L. 12,890,938.43	L. 44,861,441.72	54%
Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jovenes CONVIVIR	L. 62,796,573.00	L. 56,796,573.00	L. 5,330,627.72	L. 16,712,224.09	29%
Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana	L. 106,281,669.00	L. 60,781,669.00	L. 11,096,619.28	L. 31,414,169.36	52%
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	L. 117,716,409.00	L. 101,558,797.00	L. 4,029,537.87	L. 14,194,079.79	14%
Programa de Oportunidades para el Desarrollo a través de Energía Renovable	L. 35,409,703.00	L. 30,909,703.00	L. 3,750,953.46	L. 15,568,440.80	50%
<b>TOTAL</b>	<b>L. 781,024,973.00</b>	<b>L. 698,306,333.00</b>	<b>L. 84,262,300.35</b>	<b>L. 267,381,049.72</b>	<b>38%</b>

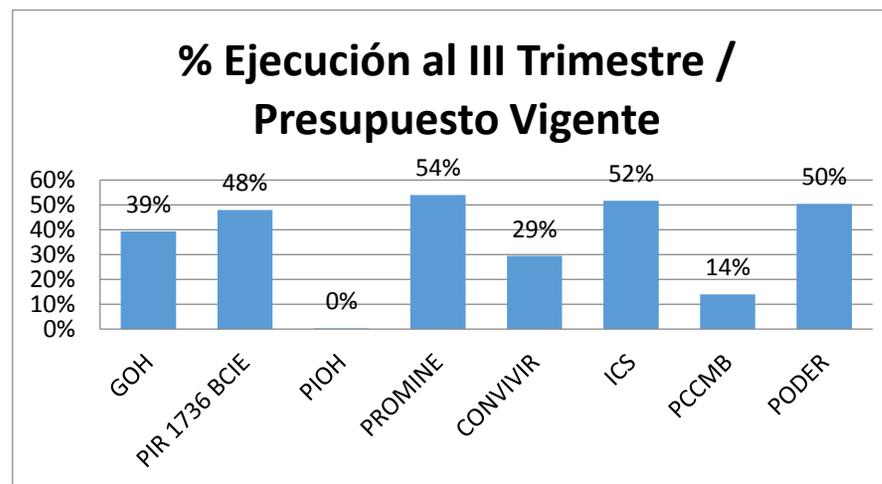

### Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Tercer Trimestre 2019

Grupo	Aprobado	Presupuesto Vigente por Grupo	Devengado III Trimestre	Devengado Acumulado al III Trimestre	Disponibile	% Ejecución III Trimestre/ Presupuesto Vigente	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
SERVICIOS PERSONALES	L. 154,452,754.00	L. 156,052,754.00	L. 35,406,155.21	L. 102,228,261.93	L. 53,824,492.07	23%	66%
SERVICIOS NO PERSONALES	L. 126,293,052.00	L. 110,966,094.00	L. 19,828,485.98	L. 57,323,007.91	L. 53,643,086.09	18%	52%
MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 7,526,183.00	L. 6,743,774.00	L. 772,168.75	L. 2,005,589.73	L. 4,738,184.27	11%	30%
BIENES CAPITALIZABLES	L. 484,680,444.00	L. 399,256,438.00	L. 28,178,996.11	L. 92,978,547.17	L. 306,277,890.83	7%	23%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. 8,072,540.00	L. 12,118,130.00	L. 76,494.30	L. 660,139.38	L. 11,457,990.62	1%	5%
OTROS GASTOS	L. -	L. 13,169,143.00	L. -	L. 12,185,503.60	L. 983,639.40	0%	93%
<b>Total</b>	<b>L. 781,024,973.00</b>	<b>L. 698,306,333.00</b>	<b>L. 84,262,300.35</b>	<b>L. 267,381,049.72</b>	<b>L. 430,925,283.28</b>	<b>12%</b>	<b>38%</b>

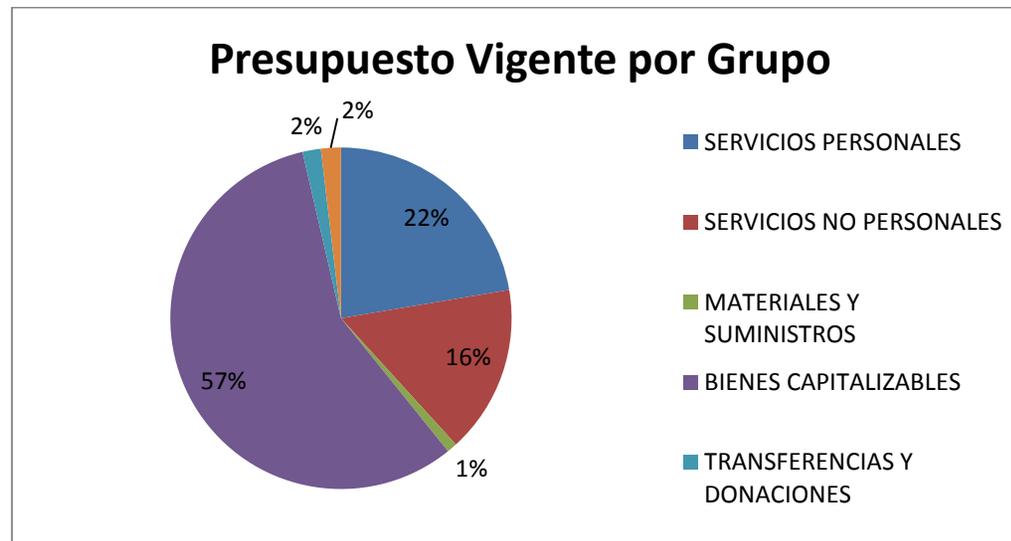



## Ejecución Gasto Operativo Tercer Trimestre del 2019

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
1100	Sueldos Básicos	16,422,813.00	12,398,558.59	751,229.94
11400	Adicionales	1,115,626.00	1,046,333.96	69,292.04
11510	Decimotercer Mes	1,368,568.00	132,881.92	1,235,686.08
11520	Decimocuarto Mes	1,368,568.00	1,368,568.00	0.00
11600	Complementos	1,169,521.00	1,088,216.34	81,304.66
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	2,381,308.00	1,807,657.92	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	593,473.00	415,001.70	97.140
26110	Pasajes Nacionales	42,095.00	7,546.88	34,548.12
26210	Viáticos Nacionales	180,000.00	144,325.85	17.89
29100	Ceremonial y Protocolo	136,437.00	53,662.46	0.10
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	136,830,857.00	1,196,963.67	0.00
51220	Ayuda Social a Personas	68,400.00	68,000.00	400.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	3,312.00	0.00	3,312.00
1100	Sueldos Básicos	16,441,293.00	11,600,566.42	1,533,816.73
11400	Adicionales	16,355,210.00	6,616,062.22	15,693,603.78
11510	Decimotercer Mes	1,370,108.00	153,272.96	1,216,835.04
11520	Decimocuarto Mes	1,370,108.00	1,370,108.00	0.00
11600	Complementos	1,035,520.00	809,395.50	226,124.50
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	2,383,988.00	1,811,785.24	0.50
11750	Contribuciones para Seguro Social	1,117,852.00	656,423.55	81,742.40
12100	Sueldos Básicos	28,317,200.00	19,681,179.88	8,623,469.83
12410	Decimotercer Mes	2,317,933.00	14,989.33	2,302,943.67
12420	Decimocuarto Mes	2,317,934.00	1,711,916.55	606,017.45
12550	Contribuciones para Seguro Social	1,266,912.00	694,623.96	572,288.04
12910	Contratos Especiales	13,754,698.00	13,754,697.39	0.61
16200	Compensaciones	1,608,301.00	0.00	6,993.00
21110	Suministro De Energía Eléctrica	191,085.00	0.00	34,367.25
21200	Agua	56,160.00	0.00	8,424.00
22900	Otros Alquileres	18,402.00	0.00	0.35
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	776.00	0.00	0.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	696,454.00	383,987.36	88,552.64
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	44,298.00	42,205.00	2,093.00
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	55,205.00	0.00	0.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	21,633.00	21,609.51	0.50
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	115,459.00	69,077.15	381.85
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	480,000.00	370,500.00	89,500.00
24500	Servicios de Capacitación	86,600.00	86,400.00	200.00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	3,638,279.00	3,523,266.67	61,012.33
25100	Servicio de Transporte	10,536.00	5,810.00	700.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,838,770.00	1,464,942.34	347,827.66
25400	Primas y Gastos de Seguro	1,107,631.00	549,507.52	288,000.00
26210	Viáticos Nacionales	720,000.00	272,076.81	407,556.29



OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
27210	Tasas	154,262.00	8,492.00	0.00
3110	Productos Alimenticios Y Bebidas	215,524.00	189,774.68	9,546.32
32310	Prendas de Vestir	8,500.00	0.00	0.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	215,761.00	194,750.81	17,020.19
33300	Productos de Artes Gráficas	37,885.00	23,000.00	7,000.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	28,373.00	23,760.00	0.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	218,027.00	0.00	218,027.00
35100	Productos Químicos	12,027.00	12,025.00	0.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	100,036.00	6,688.96	93,347.04
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	18,041.00	12,970.70	0.00
35620	Diesel	391,953.00	150,000.00	32,775.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	155,459.00	98,566.50	24,117.50
36400	Herramientas Menores	5,112.00	690.80	0.00
36930	Elementos de Ferrería	21,649.00	20,550.72	0.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	84,189.00	63,777.90	243.29
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	199,494.00	106,184.84	423.70
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	50,513.00	27,646.96	210.34
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	4,009.00	2,033.02	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	755,504.00	381,925.54	180,224.80
99720	Para Erogaciones de Capital por Devolución de Prestamos	13,169,143.00	12,185,503.60	983,639.40
11100	Sueldos Básicos	3,804,000.00	2,820,054.48	722,847.14
11400	Adicionales	250,000.00	212,125.00	37,875.00
11510	Decimotercer Mes	317,000.00	0.00	317,000.00
11520	Decimocuarto Mes	317,000.00	317,000.00	0.00
11600	Complementos	233,500.00	202,200.00	31,300.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	551,580.00	424,922.50	0.50
11750	Contribuciones para Seguro Social	118,784.00	96,193.90	906.40
24300	Servicios Jurídicos	42,500.00	0.00	42,500.00
26210	Viáticos Nacionales	100,000.00	91,834.65	9.10
33700	Especies Timbradas y Valores	32,326.00	0.00	0.00
11100	Sueldos Básicos	2,160,000.00	1,659,726.01	347,992.09
11400	Adicionales	121,000.00	103,000.00	18,000.00
11510	Decimotercer Mes	180,000.00	27,875.00	152,125.00
11520	Decimocuarto Mes	180,000.00	180,000.00	0.00
11600	Complementos	126,300.00	112,613.11	13,686.89
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	313,200.00	243,745.00	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	84,846.00	66,109.00	576.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	146,647.00	79,361.58	17,523.32
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	43,122.00	1,265.00	857.00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	189,889.00	188,867.33	1,021.67
11100	Sueldos Básicos	2,124,000.00	1,742,369.62	203,385.90
11400	Adicionales	92,000.00	73,633.33	18,366.67

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
11510	Decimotercer Mes	177,000.00	6,572.22	170,427.78
11520	Decimocuarto Mes	177,000.00	177,000.00	0.00
11600	Complementos	116,100.00	100,518.80	15,581.20
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	307,980.00	253,895.00	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	84,846.00	69,821.00	833.60
26210	Viáticos Nacionales	150,000.00	145,259.44	68.68
11100	Sueldos Básicos	20,352,126.00	15,416,610.25	599,339.04
11400	Adicionales	1,193,342.00	1,053,029.91	140,312.09
11510	Decimotercer Mes	1,696,010.00	98,522.90	1,597,487.10
11520	Decimocuarto Mes	1,696,010.00	1,686,176.61	9,833.39
11600	Complementos	1,406,008.00	1,033,955.60	372,052.40
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	2,951,058.00	2,252,445.96	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	845,130.00	620,363.30	699.20
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	190,404.00	148,435.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	1,808,778.00	1,744,689.43	46.01
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>320,852,270.00</b>	<b>126,322,564.28</b>	<b>40,750,074.73</b>

### Cuadro por Sector 2019 (Ejecutado)

SECTOR	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios directos 2019
AGUA Y SANEAMIENTO	1	3,161,945.32	20	2,004
ELECTRIFICACION	2	1,096,825.26	21	414
INFRAESTRUCTURA VIAL	8	11,901,497.56	149	11,790
EMPRENDIMIENTO Y VALORES	0	2,830,730.00	0	0
PREVENCION SITUACIONAL/CONVIVIENCIA	2	21,864,245.86	49	2,347
EDUCACION	9	53,183,143.37	219	7,190
ENERGIA RENOVABLE	13	8,239,424.98	1174	4,591
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>102,277,812.35</b>	<b>1,632</b>	<b>28,336</b>

### Cuadro por Departamento 2019 (Ejecutado)

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios directos 2019
ATLANTIDA	4	13,033,824.66	84	3,872
COMAYAGUA	0	5,142,643.26	0	0
COPAN	1	8,607,649.79	0	589
CORTES	4	11,626,000.90	59	10,908
FRANCISCO MORAZAN	4	10,968,732.38	87	4,562
GRACIAS A DIOS	0	41,639.79	0	0
INTIBUCÁ	6	17,418,277.29	1,189	1,634
LA PAZ	1	215,089.43	0	2,538
LEMPIRA	13	14,843,495.05	191	4,093
OCOTEPEQUE	0	11,886,555.38	0	0
SANTA BARBARA	2	8,493,904.42	22	140
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>102,277,812.35</b>	<b>1,632</b>	<b>28,336</b>

### Cuadro por Otras Inversiones 2019 (Ejecutado)

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2019
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	19,241,847.34
GASTO OPERATIVO DE PROGRAMAS	19,465,192.42
ACTIVIDADES CENTRALES FHS	126,396,197.61
<b>TOTAL</b>	<b>165,103,237.37</b>

## CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO



### ✓ Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)



#### i. Antecedentes

Actualmente el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y la Secretaría de Seguridad ejecutan conjuntamente la operación BID 4518/BL-HO denominada “Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios” el cual es un préstamo por un monto total de US\$60,000,000.00 la operación fue aprobada por el Banco Interamericano de Desarrollo en el mes de abril de 2018, posteriormente aprobada por el Congreso Nacional en el mes de octubre de 2018, y fue efectivo a partir del 28 de noviembre de 2018, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta

A partir del 15 de septiembre de 2017 se han autorizado a la Secretaría de Desarrollo Comunitarios Agua y Saneamiento (SEDECOAS) Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) financiamiento retroactivo para la preparación y diseño del programa. Estas inversiones se cargarán retroactivamente a los recursos del préstamo. Los gastos elegibles incluyen las categorías de obras, bienes, servicios de no consultoría, y servicios de consultoría, hasta por la suma de US\$9.000.000.00 (15% del monto propuesto del préstamo), efectuados por el Prestatario antes de la fecha de aprobación del préstamo, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el contrato de préstamo. Provisionalmente estos gastos reembolsables serán financiados con los fondos adicionales de contrapartida comunitaria del Programa de Integración de Convivencia Urbana disponibles en fuente FHIS Aportes Municipales.

#### ii. Objetivo

Contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos Los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación

criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

### iii. Componentes

**Componente 1.** Mejoramiento del hábitat de barrios urbanos vulnerables (US\$18.219 millones). El propósito de este componente es mejorar el acceso a servicios de infraestructura urbana y generar espacios con condiciones de seguridad, para incentivar una mejor convivencia y aumentar la capacidad de los ciudadanos para el cumplimiento pacífico de normas. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

**Infraestructura básica:** busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios en los siguientes barrios del Distrito Central: Monte de los Olivos, Nueva Jerusalén; Australia; 25 de Enero; Nueva España; Brisas del Mogote y Nueva Galilea teniendo como marco para las intervenciones el Plan Integral de Mejoramiento de Barrios, el cual incluye los correspondientes diseños urbanísticos, de ingeniería, la programación y presupuestos. Este instrumento es crítico para la adecuada programación de las inversiones y para facilitar el diálogo con la comunidad sobre las actividades a desarrollar. Se financiará consultorías y contratación de obras para: (i) la preparación de los Planes Integrales de Mejoramiento de Barrios (PIMB); y (ii) las inversiones en obras de infraestructura básica de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, pavimentación, drenaje pluvial, plazas y parques, equipamientos sociales y otras necesidades detectadas en los PIMB. Se promoverá la recuperación de escuelas públicas y centros de salud (operados por las entidades estatales específicas).

**Convivencia y Emprendimiento a nivel barrial:** promueve la participación de los vecinos en el mejoramiento de las condiciones de su entorno, así como el fortalecimiento de sus redes sociales y vecinales para mejorar el tejido social en los barrios. Se financiará: (i) capacitación de líderes, programa de deportes y valores, apoyado por el Comité Olímpico Internacional; (ii) capacitación de vecinos en áreas de empleabilidad dentro y fuera del barrio mediante la asistencia técnica de las Universidades y su vinculación con el sector empresarial, (iii) organización para utilización de sistemas de alerta temprana para desastres naturales. Todas las actividades tendrán enfoque de género.

**Componente 2:** Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios (US\$22.130 millones). Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios de prevención social de la violencia al ciudadano y brindar una atención oportuna a las víctimas de violencias y delitos, fortaleciendo la gestión local. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

**Fortalecimiento de capacidades de actores municipales.** Se financiará: (i) capacitación y asistencia técnica a las autoridades locales para promover la participación ciudadana en la preparación de planes locales de

prevención social de la violencia; (ii) fortalecimiento de las capacidades de los responsables de los observatorios locales, para el análisis estratégico de estadísticas del crimen y delito -incluyendo la desagregación por género-; y (iii) estrategia de comunicación a través de campañas y consultas sociales para promover medidas y valores para la reducción de violencias, respeto por las normas legales, morales, culturales y el uso de la oferta de servicios disponibles de prevención y atención a víctimas.

**Intervenciones de prevención social de la violencia a nivel municipal.** Se financiará: (i) programas para la atención a víctimas de VIF a través del módulo de Atención Integral Especializado (MAIE); (ii) desarrollo de protocolos para homologar la actuación de primeros respondientes para atención a víctimas, (iii) programa de prevención social de la violencia para jóvenes en situación de riesgo; (iii) modelo innovador de policía comunitaria y patrullaje policial sistemático -Hot Spots-; y (iv) mejoramiento de la infraestructura de las Jefaturas Departamentales, para ofrecer servicios policiales a la comunidad.

**Componente 3:** Efectividad policial. (US\$16 millones). Con el propósito de mejorar el desempeño y la calidad en la prestación de los servicios policiales, se apoyará la consolidación del sistema nacional de formación y profesionalización, así como su sistema de integridad. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Consolidación del sistema educativo policial basado en la filosofía de Policía Comunitaria. Se financiará: (i) diseño del modelo de Sistema de Formación y Profesionalización Policial, articulando sus diferentes instancias de formación (Instituto Técnico Policial -ITP-, ANAPO, Universidad y educación continua y entrenamiento), incluye mecanismos de evaluación continua del personal. Lo anterior, deberá estar sujeto a promover principios de meritocracia y transparencia en el desarrollo de la carrera policial; (ii) modernización del currículum académico para los medios y altos mandos policiales, certificado bajo la filosofía de policía comunitaria y orientando la formación a competencias para la toma de decisiones operativas. Lo anterior, incluyendo la redefinición del perfil de ingreso de candidatos a la ANAPO. Esto considerará la incorporación de nuevos cadetes, provenientes del ITP y otros candidatos que ya hayan cursado licenciaturas y tecnicaturas en otras universidades; modernizar el régimen de formación de oficiales en el nuevo campus universitario y generar una nueva estructura de gobierno y planta de profesores-investigadores de tiempo completo (teóricos y prácticos) (iii) fortalecimiento de las capacidades pedagógicas para docentes; (iv) fortalecimiento de la integridad policial a través de la consolidación de un sistema de evaluación y rendición de cuentas; y (v) modernización de la infraestructura física y tecnológica de la Academia Nacional de Policía y el Centro de Investigación y Desarrollo Policial.

Fortalecimiento de las capacidades en investigación criminal. Se financiará: (i) programa de capacitación y especialización continua en investigación criminal en coordinación con el MP; (ii) capacitación técnica en el uso de tecnologías de la información para análisis estratégicos delictuales; e (iii) implementación de un sistema

integrado de información delictiva y criminal para mejorar la resolución del delito -integrando estadísticas por categoría de género.

#### iv. Mecanismo de Ejecución.

Se propone contar con dos organismos ejecutores independientes, pero con responsabilidades compartidas en el diseño, implementación y evaluación de iniciativas que se realicen en la misma área geográfica. El componente 1 de esta operación será ejecutado por SEDECOAS-FHIS y el componente 2 y 3 por la Secretaría de Seguridad.

#### v. Monto del Convenio:

US\$ 60,000,000.00 Millones de Dólares, según convenio de préstamo el cual se desglosa de la siguiente manera: SEDECOAS- FHIS le corresponde US\$ 20, 000,000.00 Millones de Dólares y a la Secretaria de Seguridad le corresponde US\$ 40,000,000.00 Millones de Dólares.

La duración del convenio es por 5 años después de la publicación de diario La Gaceta Acuerdo Ejecutivo No. 114-2018.

#### vi. Avance financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	17,749,164.00	14,959,789.44	84%
2019	101,558,797.00	14,194,079.79	14%

#### vii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios Directos 2019
EMPRENDIMIENTO Y VALORES	0	7,410,260.92	27	1,950
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>7,410,260.92</b>	<b>27</b>	<b>1,950</b>

#### viii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios directos 2019
FRANCISCO MORAZAN	0	7,410,260.92	27	1,950
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>7,410,260.92</b>	<b>27</b>	<b>1,950</b>

ix. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2019
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	3,284,948.99
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	3,498,869.88
<b>TOTAL</b>	<b>6,783,818.87</b>

x. AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

<i>Avances Programa</i>		
<b>Componente 1</b> Mejoramiento del hábitat de barrios urbanos vulnerables		
<b>1.0</b>	<b>PRODUCTO 1.1</b> Nueve proyectos integrales de mejoramiento de barrios (red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, equipamiento social y pavimentación), completados y siendo utilizados	
<b>1.1</b>	<i>Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se han diseñado al 100% 4 proyectos integrales de mejoramiento de barrio que incluye: mejora, reparación y/o construcción del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y sistema vial para las colonias: Nueva España, Nueva Australia, Nueva Galilea y 25 de Enero.</li> <li>Se tiene la licencia ambiental para 4 proyectos integrales y la aprobación del SANAA y ENEE del diseño de sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y sistema eléctrico de 4 proyectos integrales de mejoramiento de barrio.</li> <li>Se ha publicado el documento base de licitación del proyecto: <i>Proyecto de Integración Urbana, incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y obras de mitigación de riesgos para 1071 predios en las siguientes colonias: Nueva Australia, Nueva Galilea, Nueva España y 25 de Enero</i>; se espera formalizar el contrato de ejecución de obras para el mes de noviembre de 2019; la supervisión del proyecto ya está adjudicada e inicia la ejecución de su contrato en el mes de octubre de 2019 con la revisión de diseños de obras de infraestructura.</li> <li>Se ha contratado la ejecución y supervisión de proyecto de 6 obras de equipamiento social Reparación de Cancha Polideportiva, Colonia Nueva Galilea, Construcción de Centro Comunal, Colonia Nueva Galilea, ampliación de Jardín de Niños; Colonia Nueva España, ampliación Escuela David Corea Sánchez, Colonia Australia, construcción Centro Comunal, Colonia Australia, y Construcción Centro Comunal, Colonia 25 de Enero; se espera el inicio de las obras a finales del mes de octubre de 2019.</li> <li>Se está ejecutando la consultoría para el diseño de 5 proyectos integrales de mejoramiento de barrio: <i>Proyecto de Integración Urbana Incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario, Agua Potable, Drenaje Pluvial, Red de Alumbrado Público, Mejoramiento Vial, Espacios</i></li> </ul>

		<p>de Recreación y Obras de Mitigación de Riesgos para 3035 predios , en las siguientes colonias: Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén No. 2, Brisas del Mogote, Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble y Altos del Mirador; ya se ha realizado el informe de diagnóstico de barrios y se están realizando los diseños preliminares de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, pavimentación, alumbrado público y equipamiento social.</p>
<b>2.0</b>	<b>PRODUCTO 1.2 Jóvenes de los barrios intervenidos capacitados</b>	
<b>2.1</b>	<i>Programa de Deportes y Valores</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha ejecutado el Programa de entrenamiento deportes olímpicos y Valores en las disciplinas de: Taekwondo, Tenis de Mesa, y Levantamiento de pesas, con una participación de 900 niños y jóvenes de las colonias beneficiarias.</li> </ul>
<b>1.2</b>	<i>Capitaciones en valores y emprendimiento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha obtenido la asistencia de <b>1344 personas</b> capacitadas en el programa de valores y emprendimiento en los siguientes temas:</li> <li>• Organización Comunitaria.</li> <li>• Normas Parlamentarias.</li> <li>• Derechos humanos, derechos del niño y adolescencia.</li> <li>• Derechos humanos, derechos de la mujer y adulto mayor.</li> <li>• Elaboración y envasado de encurtidos.</li> <li>• Elaboración de arroz chino.</li> <li>• Elaboración de piñatas.</li> <li>• Elaboración de tres leches.</li> <li>• Confección de bisutería.</li> </ul>
<b>3.0</b>	<b>PRODUCTO 1.3 Mujeres de los barrios intervenidos capacitadas en emprendedurismo y empleo</b>	
<b>3.1</b>	<i>Capitaciones en empleabilidad.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 mujeres se capacitan a través del programa Empleando Futuros en las siguientes especialidades: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Operario Textil (3).</li> <li>○ Panadería (4).</li> <li>○ Auxiliar de Bodega (2).</li> <li>○ Diseño Gráfico (5).</li> <li>○ Operario de Restaurante (6).</li> </ul> </li> </ul>

**xi. PROBLEMATICA:**

<b>Problema</b>	<b>Acciones de mitigación, comentarios, necesidades de apoyo</b>
<p><b>No contar con la aprobación de los diseños agua potable y saneamiento del SANAA al no poder identificar una fuente de agua.</b></p>	<p>Las colonias en referencia no cuentan actualmente con el servicio de agua potable. Como requisito aprobación del servicio, el SANAA requiere la identificación de una fuente de agua confiable para estas colonias. La primera alternativa para la dotación de agua, consistía en la utilización de un pozo existente en el plantel del SANAA en los Laureles. Sin embargo, se ha identificado que el pozo tiene problemas de verticalidad y de diámetro por lo que no puede ser explotado y se requiere la perforación de nuevo pozo en área cercana. La Unidad Coordinadora de Programa UCP está preparando el diseño y documentos de licitación para la perforación del nuevo pozo a fin de asegurar la dotación del servicio.</p>
<p><b>No contar con la licencia Ambiental para los proyectos de las colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén, y Brisas del Mogote.</b></p>	<p>Estas colonias se encuentran ubicadas en la cuenca del río Guacerique, la cual abastece el embalse de los Laurales, una de las tres fuentes de abastecimiento de la ciudad. El Saneamiento de estas colonias es imperativo para detener la contaminación del embalse. Sin embargo, se espera dificultades por parte de MiAmbiente en brindar el licenciamiento ambiental. Es por eso que se ha indicado a la firma consultora incorporar en su diseño todas medidas de mitigación necesarias para garantizar la viabilidad técnica y ambiental del proyecto. Asimismo se requiere la actualización del Plan de manejo de la Cuenca de Guacerique, de manera que se actualice el uso de suelo, se identifiquen los asentamientos informales que se han establecido en los últimos años (incluidas las colonias en referencia) y se defina el plan de manejo de la zona.</p>

## **CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA**



### ✓ **Proyecto de Infraestructura Rural BCIE**



#### **i. Objetivo General**

Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local. Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son de L. 283 millones aproximadamente.

#### **ii. Focalización:**

En base a la metodología de selección de la mancomunidades ejecutado por PIR, que toma en consideración el índice de desarrollo humano, la capacidad de gerenciamiento de la Unidades técnicas Municipales en cada mancomunidad y no más de una mancomunidad por departamento, fueron seleccionadas las mancomunidades de los departamentos de Lempira (CAFEG), Intibucá (AMFI) y Francisco Morazán (MANOFM).

#### **iii. Tipología de Proyectos**

- Electrificación Rural: proyectos para habilitar o mejorar el acceso a electricidad teniendo los beneficiarios que aportar el 15% del monto total del proyecto.
- Agua y Saneamiento: proyectos de rehabilitación, expansión y construcción de sistemas comunales de agua y saneamiento y facilidades en áreas rurales, de las mancomunidades previamente seleccionadas.
- Caminos Rurales: proyectos de rehabilitación y mejoramiento de los caminos municipales eficientemente y utilizando métodos de empleo masivo de mano de obra aportando las comunidades beneficiadas el 15% del total del proyecto.

#### **iv. Monto del Convenio:**

L.285.0 Millones de Lempiras aproximadamente, según convenio de préstamo el tiempo de ejecución del proyecto es de 60 meses.

v. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2011	37,790,000.00	0.00	0.00%
2012	6,393,674.00	0.00	0.00%
2013	33,774,273.00	33,771,086.72	99.99%
2014	42,465,271.00	32,714,051.57	77.04%
2015	32,683,893.00	32,295,225.85	98.81%
2016	95,056,511.00	93,906,331.81	98.79%
2017	89,155,169.00	86,922,798.37	97.50%
2018	37,332,495.00	36,390,084.05	97.48%
2019	37,967,252.00	18,218,152.59	47.98%

vi. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios Directos 2019
AGUA Y SANEAMIENTO	1	3,161,945.32	20	2,004
ELECTRIFICACION	2	1,096,825.26	21	414
INFRAESTRUCTURA VIAL	6	7,674,854.39	130	2,854
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>11,933,624.97</b>	<b>171</b>	<b>5,272</b>

vii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios directos 2019
FRANCISCO MORAZAN	2	2,266,714.18	30	2,292
INTIBUCÁ	1	3,355,703.59	21	372
LEMPIRA	6	6,311,207.20	120	2,608
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>11,933,624.97</b>	<b>171</b>	<b>5,272</b>

viii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	EJECUTADO 2019
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	1,166,010.86
Gasto Operativo	5,118,516.76
<b>TOTAL</b>	<b>6,284,527.62</b>

## ix. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

Con fondos del Préstamo BCIE No. 1736, se interviene en los sectores de Agua y Saneamiento, Caminos Rurales y Electrificación Rural por Extensión de Red en la Mancomunidades de *Consejo Intermunicipal CAFEG* (municipios de Candelaria, Gualcinse, Piraera, San Andrés, San Francisco y Santa Cruz), departamento de Lempira; *Mancomunidad de los municipios del Norte y Occidente de Francisco Morazán MANOFM* (municipios de Vila de San Francisco, El Porvenir, Guaimaca, Marale, Orica, San Ignacio, Cantarranas, Valle de Ángeles y Vallecillo) departamento de Francisco Morazán y *Asociación de Municipios Fronterizos de Intibucá AMFI* (municipios de Camasca, Colomocagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de la Sierra y Santa Lucía) en el departamento de Intibucá.

## x. EJECUCIÓN FINANCIERA

Ejecución presupuestaria al 30 de septiembre 2019

Código	Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO 2019				Disponible*	% Ejecución
		Lempiras					
		Aprobado	Decremento Incremento	Vigente	Ejecutado		
47	Préstamo BCIE-1736	15,809,640.00	22,157,612.00	37,967,252.00	18,218,152.59	19,749,099.41	47.98%
	<b>Total</b>	<b>15,809,640.00</b>	<b>22,157,612.00</b>	<b>37,967,252.00</b>	<b>18,218,152.59</b>	<b>19,749,099.41</b>	

**Presupuesto disponible después de aplicación del congelamiento L 2, 695,704.00**

### 1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Durante el III trimestre 2019, se aprobaron tres (3) modificaciones:

1. Modificación tipo traslado presupuestario entre actividades y objetos del gasto por L 67,473.00 aprobada el 29 de julio de 2019,
2. Modificación tipo traslado presupuestario entre actividades y objetos del gasto por L 61,400.00 aprobada el 20 de septiembre de 2019,
3. Modificación tipo traslado presupuestario entre actividades y objetos del gasto por L 43,000.00 aprobada el 26 de septiembre de 2019.

### 2. EJECUCIÓN FISICA

En el sector de Agua y Saneamiento, actualmente se encuentran en ejecución tres (3) subproyectos de construcción de sistemas de agua potable mediante Microcaptación pluvial y saneamiento. A continuación se

presenta el porcentaje de avance de obra del subproyecto mencionado y el detalle de los subproyecto a ejecutarse durante el 2019:

N	Cód. de Proyecto	Nombre de Proyecto	Ubicación		Porcentaje de Ejecución
			Municipio	Departamento	
1	107196	Construcción de Sistema Integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico Comunidad El Coyolar	San Marcos de la Sierra	Intibucá	26.96%
2	107181	Construcción de Sistema de Micro captación Pluvial y Saneamiento, Comunidades de Guasquin, La Puebla, El Triunfo y San Matías	Piraera	Lempira	21.91%
3	107182	Construcción de Sistema de Microcaptación Pluvial y Saneamiento, Comunidad de El Derrumbado	San Marcos de la Sierra	Intibucá	15%

El subproyecto de Construcción Sistema Integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico Comunidad El Coyolar, durante el período se realizaron actividades de excavación de zanjos para cimentación, paredes de bloque, fundición de castillos, soleras, instalación de puertas y ventanas para el mejoramiento de viviendas, suministro y acarreo de materiales locales, aportación municipal y comunitaria, nivelación del suelo para la preparación de las fundiciones de piso, suministro de sistemas de litio solar y suministro de tanques de 6,000lts. Cabe resaltar, que la UCP con su equipo técnico, ambiental y social realiza la supervisión de este subproyecto. Durante el mes de septiembre 2019, iniciaron actividades de construcción los dos últimos subproyectos planificados en la cartera de proyectos del sector. En el subproyecto 107181 de las Comunidades Guasquin, La Puebla, El Triunfo y San Matías consistente en la construcción del sistema de Microcaptación pluvial y saneamiento, se realizará la instalación de tanques de almacenamiento de 6,000 litros se refleja en actividades de excavación de zanjos para letrinas, fundición de ademados, construcción de brocales de mampostería y elaboración de casetas metálicas para las letrinas de fosa simple que serán construidas, además de la fundición de las losas para la colocación de los tanques de almacenamiento.

Por otra parte, el subproyecto 107182 de la comunidad El Derrumbado, presenta similitudes con el subproyecto de la Comunidad El Coyolar, consistente en un sistema integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico, donde se intervendrá con la instalación de sistemas de Microcaptación de aguas lluvias, mejoramiento de paredes y techos a viviendas, reparación de techos, construcción de letrinas e instalación de sistemas fotovoltaicos con batería de litio de tercera generación.

En el **sector de Caminos Rurales**, se encuentran en ejecución dos (2) subproyectos: rehabilitación del tramo Calle Agua Zarca del municipio de Camasca; así como el tramo Azacualpa – Buena Vista del Municipio de Candelaria. El porcentaje de avance de obra y la ubicación del mismo se detalla a continuación:

N	Cód. de Proyecto	Nombre de Proyecto	Ubicación		Porcentaje de Ejecución
			Municipio	Departamento	
1	107215	Rehabilitación de Caminos Rurales Azacualpa - Buena Vista	Candelaria	Lempira	43%
2	105594	Rehabilitación de Caminos Rurales Calle Agua Zarca	Camasca	Intibucá	98%
3	105600	Pavimentación de Casco Urbano del Municipio de Magdalena	Magdalena	Intibucá	Por ejecutar

Las principales actividades desarrolladas durante el periodo para el subproyecto 107215 se han concentrado en la construcción de cabezales y tragantes de mampostería, limpieza del derecho de vía y rehabilitación de calzada con tractor. La contraparte municipal fue suministrada en efectivo previo al inicio del proyecto. Este proyecto no conlleva aporte comunitario, sin embargo los beneficiarios de las comunidades de Azacualpa, San Francisco, El Platanar, Cañadas y Buena Vista han apoyado de buena forma la obra sobre todo en la reubicación de cercos para poder ampliar la calzada.

Mientras que para el subproyecto 105594, entre las actividades más importantes desarrolladas se encuentra la construcción de pavimento de concreto ciclópeo en tramos donde la pendiente es pronunciada, lo que imposibilitaba en paso en época de invierno. Debido a las fuertes lluvias registradas en la zona, se hizo necesaria la ampliación del plazo de ejecución para concluir con las actividades del proyecto, por lo que se finalizara en los primeros días del mes de octubre 2019.

Durante el mes de julio 2019, se finalizan las obras de rehabilitación del tramo Calle San Antonio del Monte, del municipio de Camasca, con una longitud de 1.36 kilómetros. Antes de la intervención del Proyecto, el tramo se encontraba en un estado deteriorado dado las altas precipitaciones en la zona, las fuertes pendientes del tramo y la falta de mantenimiento al mismo. El tramo no contaba con material selecto como capa de rodadura, además era necesario la instalación del drenaje para la evacuación de las aguas lluvias y la canalización de las entradas y salidas de las alcantarillas. Durante la ejecución de las obras se realizaron actividades de rehabilitación de la calzada con tractor para lograr el ancho mínimo del camino, se instalaron tuberías de concreto reforzado de 24” en alcantarillas, conformación de suelo tipo I, colocación de material selecto balastado, construcción de obras de drenaje y mitigación ambiental, además de la construcción de pavimento con concreto ciclópeo en algunos tramos con pendientes pronunciadas. De este subproyecto se benefician 372 pobladores de la zona, y del mismo modo, se generaron 21 empleos temporales.

En el sector de **Electrificación Rural por extensión de red**, a la fecha, no se tienen subproyectos en ejecución, ya que han sido finalizados todos los subproyectos programados a ejecutarse.

### 3. SITUACIÓN DE CONTRATOS Y LICITACIONES

Durante el III trimestre 2019, se han adjudicado dos contratos de obra en el sector de Agua y Saneamiento por un monto de Inversión de L 7.02 Millones, de los cuales L 6.42 Millones serán financiados con fondos del Préstamo, mientras que en el sector de Caminos Rurales se adjudicó un contrato de obra por un monto de L 2.69 Millones, de los cuales L 1.34 serán financiados con fondos del Préstamo. El detalle de las adjudicaciones se muestra a continuación:

N.	Nombre del Proyecto	Código	Fecha de Adjudicación	Fecha de Firma de Contrato	Monto Estimado Aporte FHS	Monto Total del Contrato	Estatus
1	Construcción de Sistema de Micro captación Pluvial y Saneamiento, Comunidades de Guasquin, La Puebla, El Triunfo y San Matías, Municipio de Piraera, Lempira	107181	8/7/2019	24/7/2019	L 2,563,613.25	L 3,163,613.25	Contrato firmado
2	Construcción de Sistema de Micro captación Pluvial y Saneamiento, Comunidad de El Derrumbado, Municipio San Marcos de la Sierra, Intibucá	107182	31/7/2019	12/8/2019	L 3,858,052.53	L 3,858,052.53	Contrato firmado
3	Pavimentación de Casco Urbano del Municipio de Magdalena, Intibucá	105600	16/9/2019	Pendiente	L 1,344,342.57	L 2,688,685.13	Contrato Adjudicado
<b>Total</b>					<b>L 7,766,008.35</b>	<b>L 9,710,350.91</b>	

#### 4. RESULTADOS DE GESTION (FP02)

Con fondos del Préstamo del BCIE-1736, durante el III trimestre del año 2019, se ha incrementado la cobertura a mejores vías de acceso a 372 personas, con la rehabilitación de 1.36 km de camino rural del tramo Calle San Antonio del Monte en el Municipio de Camasca, Intibucá, pertenecientes a la red terciaria del país. Con esta intervención se ha incrementado el turismo y la prestación de servicios de transporte y la a vez reduciendo los costos, horas de traslado hacia comunidades cercanas y mantenimiento de vehículos. Además, se ha brindado empleo directo temporal a 21 personas durante las actividades constructivas.

#### 5. DESCENTRALIZACIÓN A LAS MANCOMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL PIR

Con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE Préstamo No. 1736, desde el inicio del Proyecto al 30 de septiembre del 2019, se han transferido las Mancomunidades beneficiarias MANOFM, CAFEG y AMFI un monto de L 147.6 Millones para la ejecución de subproyectos de infraestructura de los sectores Agua & Saneamiento, Electrificación Rural y Caminos Rurales y fortalecimiento institucional.

La UCP/PIR ha dado seguimiento a los fondos transferidos a las Mancomunidades para que sean utilizados única y exclusivamente para los fines autorizados expresamente en los respectivos convenios interinstitucionales FHS-Mancomunidades y en los términos y condiciones establecidos en el Manual Operativo de FHS, al tenor de las condiciones convenidas entre el Gobierno de Honduras y el BCIE bajo el Convenio de Préstamo No. 1736.

**TRANSFERENCIAS PARA EJECUCIÓN DE SUBPROYECTOS DESCENTRALIZADOS Y FORTALECIMIENTO  
INSTITUCIONAL  
ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2019\***

MANCOMUNIDAD	AGUA Y SANEAMIENTO	ELECTRIFICACION RURAL	CAMINOS RURALES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	TOTAL LEMPIRAS
AMFI	L 15,190,873.37	L 11,761,414.15	L 18,870,853.47	L 461,678.00	L 46,284,818.99
CAFEG	L 19,261,737.39	L 19,238,407.47	L 13,083,063.16	L 707,658.00	L 52,290,866.02
MANOFM	L 19,839,490.05	L 9,378,993.64	L 18,359,222.24	L 1,475,730.00	L 49,053,435.93
<b>Total</b>	<b>L 54,292,100.81</b>	<b>L 40,378,815.26</b>	<b>L 50,313,138.87</b>	<b>L 2,645,066.00</b>	<b>L 147,629,120.94</b>
	37%	27%	34%	1.8%	100.00%

\*Nota: valores netos ajustados al 30 de septiembre 2019, incluyen devoluciones en concepto de obra no ejecutada y rescisión de contratos.

## 6. DESEMBOLSOS DEL PIR

El 21 de noviembre del 2018, se registró el último desembolso por un monto de USD\$ 1,775,884.55, y que corresponde a la séptima Restitución del Fondo Rotatorio, completando así el 100% del monto del Préstamo.

## 7. PROBLEMÁTICA FÍSICA Y FINANCIERA

- A partir de la ampliación de fecha de cierre y justificación del Fondo Rotatorio (al 31 de marzo del 2020), aprobada por el BCIE en agosto 2019, el PIR solicitó a la SEFIN estructura presupuestaria SIAFI para ejecutar los fondos del I trimestre 2020, sin embargo, a la fecha no se ha aprobado.
- Al final del III trimestre 2019 (25 de septiembre de 2019), la SEFIN aplicó congelamiento presupuestario por L 17,053,395.00, específicamente en la actividad de Obras, afectando la ejecución programada; esta situación podría mantenerse hasta el fin de año, corriendo el riesgo de incumplimiento de contrato de obra por falta de pago. Esto implicaría trasladar los saldos por pagar para el año 2020 a una estructura presupuestaria inexistente.
- En el subproyecto de *Construcción de Sistema Integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico de la Comunidad El Coyolar*, en el municipio de San Marcos de la Sierra, se ha presentado desfase en la ejecución de las obras, debido a que el Contratista no cuenta la logística necesaria para el desarrollo de las obras (materiales y personal calificado), por lo que se ha notificado vía bitácora y vía correo electrónico la necesidad incorporar más personal y materiales al día para recuperar tiempo y obra desfasada para el cumplimiento de la ejecución según el plazo contractual.
- En el subproyecto *Rehabilitación de Caminos Rurales Calle Agua Zarca*, ubicado en el municipio de Camasca, las actividades constructivas se han visto retrasadas debido a las fuertes lluvias en la zona, por lo que se consideró ampliar el plazo de ejecución contractual a 15 días para concluir las actividades

programadas, por lo que la nueva fecha de finalización es en los primeros días del mes de octubre 2019.

## **8. CARGA DE TRABAJO EN LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS**

En el sector Agua y Saneamiento, actualmente continúan se desarrollan actividades de campo y gabinete: elaboración de perfectibilidades, levantamientos topográficos para los estudios de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, levantamiento de información de encuestas técnicas y socioeconómicas, diseño y formulación de ampliaciones y nuevos sistemas de agua potable convencionales y no convencionales (microcaptación pluvial), sistemas de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento, así también en el sector Electrificación Rural se desarrollan actividades de diseño y formulación de nuevos sistemas por extensión de red, sin embargo, fueron eliminados del listado de carga de trabajo proyectos que ya fueron ejecutados, según datos Municipales.

## **CARTERA KfW Entwicklungsbank**



### ✓ **Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE III y IV**

#### **i. Objetivo General**



El objetivo del Programa consiste en fortalecer la Rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la SE y la gestión local participativa así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres a CE de calidad que operan de manera sostenible. De esta manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre básico y básico).

#### **ii. Focalización**

Fase III. El área de intervención para del Programa comprende principalmente los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara.

Fase IV. El Área de intervención abarcará los departamentos que están siendo intervenidos en las fases anteriores (Zona de Occidente): 1) Copán, 2) Santa Bárbara, 3) Intibucá, 4) Lempira, 5) La Paz, 6) Ocotepeque. 7) Centros a nivel nacional en casos de emergencia (catástrofes naturales). La información de estos centros deberá ser actualizada en el plan maestro y sólo si se determina su precariedad, podrán ser intervenidos previo a No Objeción del KfW. 8) Adicionalmente se extenderá el área de intervención a los departamentos adyacentes a la zona de occidente, delimitando el área de intervención a través de la Carretera Panamericana. Los municipios a ser beneficiados se encuentran al oeste de la misma en los siguientes departamentos: 1) Choluteca, 2) Valle, 3) Francisco Morazán (exceptuando el núcleo urbano de Tegucigalpa), 4) Comayagua y adicionalmente 5) Gracias a Dios.

#### **iii. Priorización de los Centros Educativos**

Esta es realizada por la Secretaria de Educación apoyados en la herramienta del Plan Maestro de Infraestructura Educativa.

#### **iv. Descripción del Proyecto**

El Programa PROMINE Fase III que se enmarca en el área de educación básica con un componente de infraestructura que complementa al Plan EfA-FTI (Education for All / Fast Track Initiative) y contribuye al logro de las Metas del Milenio en Educación en la República de Honduras y por lo tanto en general se rige por los acuerdos ya definidos para la ejecución de la primera y segunda fase. Se financia infraestructura educativa en estrecha articulación con el Sector. La ejecución del Programa es responsabilidad de la Secretaría de Educación (SE) como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) como ente ejecutor. Los recursos del Programa se utilizan principalmente para financiar la construcción, ampliación y/o el mejoramiento de los Centros Educativos (CE) así como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan mediante la modalidad descentralizada con énfasis en la ejecución comunitaria (Proyectos Ejecutados por la Comunidad – PEC-FHIS) empleada con éxito en el programa FHIS VI y VII, aplicada de forma general en todos los proyectos, indistinto de su monto financiero, excepto los altamente complejos.

El Programa PROMINE Fase IV se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y en la planificación estratégica para los años 2014 – 2018 de la Secretaría de Educación (SE). El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las tres fases previas PROMINE I, II y III. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

#### **v. Monto del Proyecto:**

##### **Fase III:**

Fondos de Crédito por un monto de € 10,000,000.00 euros, Contrapartida Nacional para SEDECOAS/FHIS de €495,000 euros, Contrapartida Nacional para SE de € 250,000 euros, Contrapartida Municipal de € 600,000 euros y Contrapartida Comunitaria de € 600,000 euros.

Fecha de Firma de Contrato de Préstamo: 30/12/2013

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 15/12/2014

Fecha de Inicio: 16 de Septiembre 2015 (Se considera la fecha de inicio de la Consultoría)

Fecha de Finalización de Convenio: 31/12/2019

#### **Fase IV:**

Fondos de Donación por un monto de € 15,000,000.00 euros, Contrapartida Nacional para SEDECOAS/FHIS de € 424,000 euros, Contrapartida Nacional para SE de € 218,000 euros, Contrapartida Municipal de € 515,000 euros y Contrapartida Comunitaria de € 514,000 euros

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 03/12/2015

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 17/02/2017

Fecha de Inicio: 02 de Abril 2018 (Se considera la fecha de inicio de la Consultoría)

Fecha de Finalización de convenio: 30/11/2020

#### **vi. Avance Financiero PROMINE FASE III y IV**

<b>Año</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Eficiencia</b>
<b>2016</b>	145,687,475.00	142,916,817.45	98.10%
<b>2017</b>	107,279,375.00	96,731,967.93	90.17%
<b>2018</b>	53,035,502.00	50,951,601.81	96.07%
<b>2019</b>	83,157,419.00	44,861,441.72	53.95%
<b>Presupuesto 2019 Fase III y Fase IV</b>			

#### **vii. Avance Físico por Sector PROMINE FASE III y IV**

<b>SECTOR</b>	<b>Proyectos Finalizados 2019</b>	<b>Mto. Ejecutado 2019</b>	<b>Empleos Generados 2019</b>	<b>Beneficiarios Directos 2019</b>
EDUCACION	3	37,309,649.34	87	1,423
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>37,309,649.34</b>	<b>87</b>	<b>1,423</b>

#### **viii. Avance Físico por Departamento PROMINE FASE III y IV**


<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>Proyectos Finalizados 2019</b>	<b>Mto. Ejecutado 2019</b>	<b>Empleos Generados 2019</b>	<b>Beneficiarios directos 2019</b>
COPAN	0	8,223,528.55	0	0
FRANCISCO MORAZAN	0	43,854.04	0	0
GRACIAS A DIOS	0	41,639.79	0	0
INTIBUCÁ	1	8,727,113.28	16	57
LA PAZ	0	53,126.29	0	0
LEMPIRA	2	334,043.29	71	1,366
OCOTEPEQUE	0	11,886,555.38	0	0
SANTA BARBARA	0	7,999,788.72	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>37,309,649.34</b>	<b>87</b>	<b>1,423</b>

**ix. Otras Inversiones**

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2019
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	4,217,217.28
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	3,334,575.10
<b>TOTAL</b>	<b>7,551,792.38</b>


**xii. AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS POR FASE**

**FASE III**

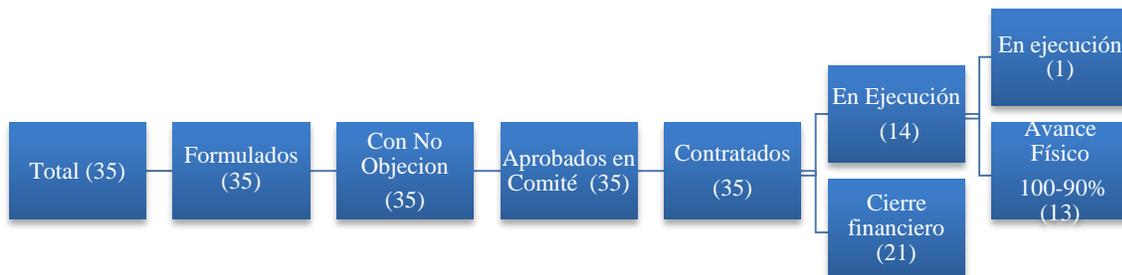

Se están considerando dos proyectos adicionales de equipamiento para completar y comprometer el componente de Infraestructura y Equipamiento.

**FASE IV.**

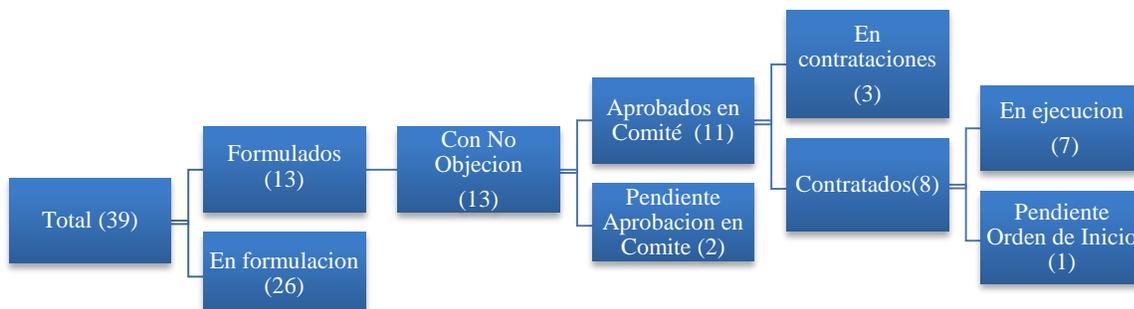

### **xiii. LOGROS III TRIMESTRE**

- Se ejecutó el 81.24 % con respecto a lo planificado acumulado para el III trimestre.

### **xiv. RETOS PROXIMOS**

Entre los principales retos que enfrenta el PROMINE-KfW:

- Ejecución de Proyectos: i) Impulsar la formulación y evaluación de proyectos en la fase IV.
- Cierre del PROMINE III: Completar las actividades para el cierre de dicha fase a diciembre del 2019.

✓ **Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)**



**i. Objetivo General**

Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).

**ii. Focalización**

A través de un proceso de concurso con criterios de selección predefinidos en el acuerdo separado y evaluación de propuestas técnicas alineadas a los componentes del programa fueron seleccionados 3 municipios en donde se está realizando la intervención del CONVIVIR a través de obras de infraestructura y medidas de alcance social para beneficio enfocado en la juventud. Así mismo se definieron los barrios, colonias o comunidades urbanas en donde se focaliza las acciones y en donde ya se ha realizado una labor de socialización de los alcances, compromisos y beneficios para la población. Los municipios seleccionados son:

- Municipio de Gracias, departamento de Lempira
- Municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua
- Municipio de La Lima, departamento de Cortes.

**iii. Descripción del Proyecto**

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

**iv. Monto del Proyecto:**

Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son Euros 12, 200,000.00. El tipo de financiamiento es un contrato de Préstamo.

**Fecha de Firma de convenio:** 08/11/2012

**Fecha de Finalización de convenio:** 31/12/2019

**v. Avance Financiero**

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2014	21,289,204.00	18,316,427.97	86.04%
2015	38,873,159.00	34,024,198.74	87.53%
2016	88,796,503.00	83,460,868.42	93.99%
2017	51,288,495.00	48,071,886.28	93.73%
2018	65,657,852.00	43,535,738.65	66.31%
2019	56,796,573.00	16,712,224.09	29.42%

**vi. Avance por Sector**

SECTOR	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios Directos 2019
EMPREDIMIENTO Y VALORES	0	2,830,730.00	0	0
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	0	11,480,928.40	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>14,311,658.40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**vii. Avance por Departamento**

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios directos 2019
COMAYAGUA	0	5,142,643.26	0	0
CORTES	0	2,834,535.07	0	0
LEMPIRA	0	6,334,480.08	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>14,311,658.40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**viii. Otras Inversiones**

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2019
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	2,400,565.69
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	-
<b>TOTAL</b>	<b>2,400,565.69</b>

**ix. INFORMACION FINANCIERA**

En el presente cuadro se observa la ejecución financiera que ha tenido el Programa CONVIVIR desde su creación a la fecha, en el Tercer Trimestre del año 2019 lo ejecutado se distribuye de la siguiente manera:

### Ejecución financiera del 3er trimestre

Componente	Presupuesto Ejecutado 2014	Presupuesto Ejecutado 2015	Presupuesto Ejecutado 2016	Presupuesto Ejecutado 2017	Presupuesto Ejecutado 2018	Presupuesto Ejecutado III Trimestre 2019
<b>01-Gasto Operativo</b>	L. 536,459.53	L. 4011,908.76	L8,186,328.38	L. 7,484,899.00	L6,977,244.45	-
<b>02- Construcción</b>	L. 4134,589.44	L. 14781,805.43	L. 53,726,357.68	L. 21,533,793.15	L. 9,885,956.39	L10,888,789.02
<b>03- Fortalecimiento de Habilidades de Jóvenes</b>	L. 0.00	L. 2011,078.63	L. 8,078,022.83	L.3,972,943.74	L. 6,175,521.00	L. 0.00
<b>04- Mejoramiento Capacidades de Actores Relevantes</b>	L. 0.00	L. 4114,456.01	L 2,137,666.23	L. 2,906,038.90	L. 3,210,648.09	L. 2.830,730.00
<b>05-Materiales y Equipos</b>	L. 0.00	L. 820,323.53	L. 3,142,655.66	L. 3,383,553.95	L. 5,733,027.16	L. 592,139.38
<b>06-Consultoría internacional</b>	L. 13645,379.00	L. 8284,626.38	L. 8,189,837.64	L. 8,790,657.54	L. 11,553,341.56	L. 2,400,565.69
<b>Total</b>	<b>L. 18,316,427.97</b>	<b>L. 34,024,198.74</b>	<b>L 83,460,868.42</b>	<b>L. 48,071,886.28</b>	<b>L. 43,535,738.65</b>	<b>L. 16,712,224.09</b>

Al cierre del período del periodo de Julio a Septiembre del año 2019 la ejecución financiera del programa alcanza a un 29.42% Entre las razones más importantes para este porcentaje (%) de ejecución, es debido a que los proyectos algunos se encuentran en ejecución y otros en espera de la aprobación de la ampliación de tiempo del programa al 30 de junio del año 2020, ya que desde el 10 de julio del año en curso se encuentra en trámite en SEFIN sin dar alguna respuesta, sin dicha ampliación no se ha podido continuar con los proceso.

Los procesos de resolución de contrato de los proyectos “Casa de la Cultura” y “mediana Sitraterco” aún se encuentran en proceso para la recuperación de los fondos a la cuenta del programa CONVIVIR.

#### **COMPONENTE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA- AVANCE FISICO**

En el componente de Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura el Programa CONVIVIR, la gestión del SEDECOAS/FHIS está orientada a lograr la buena ejecución de cada obra priorizada. Para ello, durante este período se ha continuado con el trabajo conjunto con la Dirección de Control y Seguimiento y el apoyo de la Asistencia Técnica. Se ha logrado dar término de un número de 25 obras de infraestructura.

La institución es también responsable de la tramitación de documentación para lograr la aprobación de órdenes de cambio, y desembolsos de fondos para construcción.

Actualmente se tiene una cartera de 37 proyectos de infraestructura aprobados para ejecutar con el monto del convenio. De dichos proyectos ya se terminaron 25 obras, 5 proyectos en ejecución, 3 proyectos en proceso de Licitación, 4 proyectos en espera de la aprobación de la ampliación de tiempo del programa CONVIVIR y 2 proyectos en proceso de resolución de contrato debido a la falta de voluntad política del municipio y factibilidad social de las obras estas se encuentran ubicadas en La Lima, Cortes.

Se continúa trabajando en el proceso de equipamiento de los proyectos priorizando los que están terminados y los que están próximos a inaugurar.

SEDECOAS/FHIS ha actuado por medio de su equipo de Control y Seguimiento, inspectores sociales y técnicos, y apoyo del equipo de Asistencia Técnica dando seguimiento a la ejecución de los proyectos en construcción, como también trabajando en el seguimiento a las gestiones administrativas relacionadas con desembolsos, ordenes de cambio ingresados en el ciclo de proyectos de SEDECOAS/FHIS.

A continuación se anexan los tres cuadros que corresponden a la ejecución física de cada una de las obras de infraestructura

***No. 1 Obras priorizadas en el municipio de Siguatepeque, Comayagua***

Proyecto	Inversión Estimada*	Estado
	(millones de Lempiras)	
1. Obra de Confianza	L. 3104790.51	Proyecto terminado
2. Cancha de Fútbol Col. Mata	L. 2721312.41	Proyecto terminado
3. Centro Calidad de Vida Col. Noé Cruz	L. 3,012,043.70	Proyecto Terminado
4. Centro de calidad de vida Bo. San Juan	L. 3,598,956.85	Proyecto Terminado, pendiente orden de cambio
5. Centro de Educación Digital	L. 410,327.27	Proyecto Terminado
6. Construcción Centro De Calidad De Vida Bo. El Carmen	L. 3,767,167.59	Proyecto Terminado
7. Centro de calidad de vida aldea Las Crucitas	L. 2,956,701.47	Proyecto Terminado
8 Construcción Oficina Municipal de Juventud	L. 3,638941.5	Proyecto Terminado
<b>TOTAL</b>	<b>L. 31,04790.79</b>	

***No. 2 Obras priorizadas en el municipio de Gracias, Lempira***

Proyecto	Inversión Estimada*	Estado
	(millones de Lempiras)	
1. Obra de Confianza	L.3,225774.58	Proyecto Terminado.
2. Ampliación Casa de la Juventud.	L. 6619560.57	Proyecto Terminado.
3. Construcción campo de pelota Bella Vista y Pinalito.	L. 3197439.41	Proyecto Terminado
4. Reposición Polideportivo Villas del Rosario.	L. 7,868,528.04	Proyecto Terminado
5. Construcción plaza para la Recreación y la Convivencia Pinalito y Bella Vista.	L. 2,147,440.69	Proyecto Terminado
6. Remodelación Plaza San Sebastián	L. 4,029,707.82	Proyecto Terminado

7. Casa de la cultura	L. 8,169,443.80	Proyecto en ejecución, 99% avance físico
8. Centros de Formación Digital.	L. 53,756.51	Proyecto terminado
9. Construcción de Salón multiusos Bella Vista y Pinalito.	L. 2,979,546.19	Proyecto terminado
10. Construcción parque recreativo Moreno y Hércules.	L. 5,459,590.31	Proyecto Terminado
11. Ampliación plaza Marco Tulio Rodriguez	L. 2,454,714.29	Proyecto Terminado
12. Centro de calidad de vida Villami	L. 2,447,597.92	Proyecto terminado
13. Escuela de música Mejicapa	L. 2,590,324.49	Proyecto terminado,
<b>TOTAL</b>	<b>L.51,246,651.22</b>	

### *No. 3 Obras priorizadas en el municipio de La Lima, Cortés*

Proyecto	Inversión Estimada*	Estado
	(millones de Lempiras)	
14. Construcción centro juvenil de desarrollo integral	L. 3,262,220.20	Proyecto terminado
15. Ampliación Plaza de la Juventud.	L. 7,036,616.12	Proyecto terminado
16. Remodelación Caminos de los Gatos paseo del Puente y Áreas Aledañas	L. 2,831,897.23	Pendiente Orden de cambio
17. Remodelación parque los Pinos La Lima	L. 1775,191.17	Proyecto terminado
18. Parque Mediana Sitraterco	L. 8518,858.49	Proyecto en proceso de resolución de contrato, no tiene factibilidad
19. Casa de la Cultura	L. 9605,935.76	Proyecto en proceso de resolución de contrato, no tiene factibilidad
20. Remodelación Cancha El Maestro	L. 2687,523.23	Proyecto terminado
21. Centros de Formación Digital.	L. 211,335.17	Proyecto terminado
22. Construcción Centro de Calidad De Vida Col. Nuevo San Juan	L. 2961,528.33	Proyecto en ejecución, 92% avance físico
23. Construcción Centro de Calidad de Vida Alvarez Martínez	L. 3068,158.19	Proyecto en ejecución 92% avance físico
<b>TOTAL</b>	<b>L. 40,388,568.24</b>	

A la Cartera de proyectos del Programa CONVIVIR se le adicionaran 8 obras de las cuales, 1 se encuentra terminada, 1 en ejecución y 3 en proceso de licitación y 4 se encuentran en espera de la aprobación de la ampliación de tiempo del programa para continuar con su ciclo.

Nota: De los 30 proyectos actualmente aprobados en la cartera del Programa CONVIVIR, 2 proyectos en el Municipio de La Lima, Cortes se encuentran en el proceso para rescindirlos debido a que no hay factibilidad social ni apoyo por parte del municipio para continuar con la Ejecución de los mismos, dichos proyectos son: Mediana Sitraterco y Casa de la Cultura.

## AVANCE DEL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES Y LABORALES DE JÓVENES Y COMPONENTE MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES RELEVANTES

En el Tercer Trimestre del año 2019, se continuó con la formulación de procesos y ejecución de procesos de igual manera con la selección de participantes para estos dos (2) componentes esenciales del programa CONVIVIR, el cual se detalle a continuación un cuadro resumen de la situación de cada uno de ellos:

#	ACTIVIDADES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS	DIFICULTADES
<p><b>CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL SEDECOAS/FHIS Y FIPADEH PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES CON ACTORES RELEVANTES:</b>            Porcentaje de ejecución Adendúm No. 05: 50%            Situación Actual: En ejecución Adendúm No. 05: Modelo de Gestión y Mantenimiento ORMAG</p>				
1	<p><b>Inicio de acciones del Adendúm 5: Modelo de Gestión y Mantenimiento (ORMA):</b>  <b>1.1</b> Inserción de los coordinadores(as), visitas de campo a los municipios donde se implementa el Programa CONVIVIR, con el fin de presentar al equipo de FIPADEH.</p>	<p>Para dar inicio al proceso de conformación de las ORMAG, se realizaron una serie de actividades preliminares, con el propósito de consolidar las acciones siguientes para el modelo de Gestión y Mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollo de las 5tas asambleas de cierre, inauguración y entrega de Proyectos: apoyo el proceso de convocatorias para el desarrollo de las Asambleas de cierre a través de:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Visitas de casa en casa para entrega de convocatorias</li> <li>– Perifoneo</li> <li>– Pega de carteles en lugares estratégicos</li> <li>– Convocatorias a través de las redes sociales.</li> <li>– Convocatorias a través de medios comunicación televisivos</li> <li>– Cuñas radiales</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>516 personas participaron</b> en los cierres y entregas de los proyectos de infraestructura a través de las asambleas de cierres apoyadas por FIPADEH y ejecutadas por la UTC.</li> </ul>	<p>Encontrar a los profesionales con el perfil para el nivel de coordinación requerido. Definir el Modelo de Operación y Mantenimiento, al igual que los lineamientos técnicos, ya que es un planteamiento nuevo, esta tarea se llevó a cabo de manera conjunta con el SEDECOAS/FHIS y la Asistencia Técnica.</p>
2				
3	<p>Jornadas de Capacitación sobre El Modelo de sostenibilidad y mantenimiento, que contó con la participación de representantes de la UTC, CONVIVIR y Control Seguimiento del SEDECOAS-FHIS, así como el equipo de coordinadores de FIPADEH.</p>	<p>Se han desarrollado dos talleres de Transferencia Metodología, el primero donde se explicó la metodología de implementación, proceso de conformación de las ORMAG-Municipales y Barriales, facilitado por la coordinadora general del proceso de implementación.</p> <p>Un segundo taller facilitado por el Arq. Carlos Gutiérrez ATP/CONVIVIR, sobre la metodología CPTED, donde se realizaron dos actividades de: a) Caminata exploratoria y b) análisis de dibujos de niños y niñas, para conocer</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>24 profesionales capacitados</b> Del personal de SEDECOAS/FHIS, de CONVIVIR, representante del UTC, Unidad de Control y Seguimiento (SEDECOAS-FHIS), a nivel municipal con Enlaces.</li> </ul>	<p>Por temas políticos La propuesta de conformación de las ORMAG-Barriales a través de planillas no fue completamente aceptada en los Municipios, y es así que se conforman de las dos formas a través de planillas y asambleas comunitarias.</p>

#	ACTIVIDADES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS	DIFICULTADES
	<p>Proceso de Conformación de las ORMAG-Barrales a través de Planillas y Asambleas Comunitarias:</p> <p><b>Seguimiento del Adendum 4 a la ejecución del Convenio con FIPADEH:</b> a. Revisión a profundidad de la Estrategia Municipal para el Desarrollo de la Juventud.</p>	<p>como expresan la percepción de inseguridad y seguridad.</p> <p>Para este proceso, FIPADEH realizo las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Socialización del proceso de conformación de las ORMAG-Municipales y Barrales, con Enlaces Municipales, Oficiales de las Oficinas Municipales de la Juventud y Autoridades Municipales.</li> <li>• Reuniones en los barrios para explicar el proceso de conformación de las ORMAG-Barrales, perfiles y responsabilidades de la junta directiva.</li> <li>• Reuniones para identificar los integrantes de las planillas.</li> <li>• Elección de ORMAG-Barrales, a través de planillas y Asambleas Comunitarias.</li> <li>• Elaboración de actas de conformación de las ORMAG-Barrales.</li> <li>• Socialización y aprobación de resultados con autoridades Municipales, para dar paso a la selección de la ORMAG-Municipal y juramentación de las mismas.</li> <li>• Programación de la elección de la ORMAG-Municipal y juramentación de las ORMAG.</li> </ul> <p><b>Estrategia de Juventud</b> De manera conjunta con FIPADEH se han realizado varias revisiones a profundidad de la estrategia, y se buscó el modelo de planificación adecuado para que los municipios puedan ejecutar de acorde a la realidad del municipio las acciones que enmarca la misma estrategia, ha sido un proceso de constante revisión, el documento fuere referido a nivel de las OMJ para que realicen sus propias observaciones y enriquezcan los alcances.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se lograron conformar <b>Veinte (20) ORMAG-Barrales</b>, integradas de la siguiente manera: en el Municipio de <b>Siguetepeque</b>, <b>Comayagua seis (06) ORMAG-Barrales</b>, en <b>la Lima</b>, <b>Cortés cinco (05)</b> y en <b>nueve (09) en Gracias, Lempira</b>.</li> <li>• Siete (07) fueron electas por Planilla y trece (13) por Asamblea comunitarias por elección directa.</li> <li>• <b>788 personas</b> de los 3 municipios participaron en asambleas comunitarias para la Conformación de las ORMAG Municipal</li> </ul> <p>3 documentos de estrategia de juventud revisados y afinados por los equipos técnicos municipales de cada municipio</p> <p>La creación del propio diseño e ilustración de la metodología PEC bajo el enfoque de contextos urbanos.</p>	<p>Las Estrategias de Juventud aún no han sido aprobadas en corporación municipal debido a las dificultades en la toma de decisiones de las autoridades en el caso de Siguatepeque no se ha definido el funcionamiento de la OMJ, en los municipios de Gracias y La Lima por falta de tiempo en las reuniones</p> <p>Aún pendiente de coordinar con la Subsecretaria de Prevención</p>



#	ACTIVIDADES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS	DIFICULTADES
	<b>b. Revisión final de la Metodología PEC, Manual introductoría y 4 manuales enviado a la dirección de Control y Seguimiento y la UTC.</b>	Para la revisión de los Manuales PEC se ha asignado uno de los técnicos sociales del programa, para que lleve a profundidad la revisión y actualización de los manuales de manera conjunta con la UTC y la Dirección de control y seguimiento, de igual manera se definió una nueva estrategia de trabajo y se contó con un nuevo equipo que cierre as ilustraciones exclusivas para el Programa, este proceso ha conllevado mucho tempo de trabajo y concentración, sin embargo es un aporte muy importante para la fase II dl Programa, ya que se contara con la metodología PEC para contextos Urbanos	El equipo Técnico del IDECIAS FHIS en espacial la UTC y control y seguimiento, más posicionado de la metodología y del quehacer del programa, con una visión fortalecida para las nuevas intervenciones del Programa. Los 4 manuales del Primer bloque Adaptados y corregidos por los técnicos de la UTC y control y seguimiento	
<p><b>CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL SEDECOAS FHIS Y ZAMORANO PARA LA FORMACION AMBIENTAL CON ENFOQUE EN PROCESOS DE PRODUCCION Y EMPRENDIMIENTO JUVENIL:</b>            Porcentaje de ejecución: 100%            Situación Actual: Ultimas acciones de Seguimiento del Departamento de Desarrollo y ambiente            Total de Participantes Directos: 50 jóvenes</p>				
2	<p><b>A continuación se describen las últimas actividades que a nivel de compromiso interinstitucional se han ejecutado de parte de Zamorano:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gira de seguimiento y asesoramiento de parte de Zamorano para los proyectos de emprendimiento de los jóvenes.(En los tres municipios</li> </ul>	Para el desarrollo de los seguimiento, Zamorano se comprometió en brindar una serie de reuniones para dar asesoramiento técnico a los jóvenes	<p><b>Tres (03) Estrategias de seguimiento y monitoreo para los proyectos de emprendimiento de los jóvenes)</b></p> <p><b>Tres (03) Planes de Acción para la Implementación de los emprendimientos.</b></p>	
<p><b>CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL SEDECOAS/FHIS Y EL CENET PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD JUVENIL</b>            Porcentaje de ejecución: 25% (Tentativo)            Situación Actual: Sin ejecución , CENET aún no recupera los fondos</p>				
<p><b>CONVENIO DE COOPERACION ENTRE SEDECOAS/FHIS Y LA FUNDACION ANED PARA E DESAROLO DE LA SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS DEL PROGRAMA Y EL LINEA DE BASE FASE CUATRO:</b></p>				

#	ACTIVIDADES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS	DIFICULTADES
Firma de convenio reciente, extensión de tiempo al 31 de mayo del 2019. % de ejecución 70%				
4	<p><b>Fundación ANED.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollo de jornadas de análisis a profundidad para fortalecer la construcción de la sistematización de experiencias y Línea base de manera conjunta con SEDECOAS/FHI, Aned y el ATP.</li> <li>Apoyo a la Coordinación para elaboración de Video Oficial del Programa a nivel de cada Municipio.</li> <li>Definición de nuevos enfoques para micro videos por componente.</li> </ul>	<p>Se realizaron reuniones de consulta a profundidad para conocer el origen del programa, sus componentes, resultados y avances a la fecha, de igual manera se delimito el eje sistematizados del Programa, siendo este los Modelos y enfoques de participación comunitaria y Juvenil para la Promoción de la Convivencia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un intercambio de experiencias con la participación de 45 actores claves a nivel institucional</li> <li>4 video promocionales del Programa Convivir.</li> <li>Un informe preliminar de Lina Base</li> <li>Un informe Preliminar de Sistematización de experiencias</li> <li>Definición del ciclo de implementación del Programa dentro del ciclo de Proyectos desarrollados por el FHIS, dando como resultado el ciclo de implementación de los procesos sociales.</li> <li>Identificación de logros e impactos considerables por el programa,</li> </ul>	<p>El cambio constante del equipo técnico de Aned sobre todo en la coordinación de la sistematización, teniendo que reorientar el proceso constantemente e invirtiendo tiempo para ello.</p>
5	<p><b>Contratación individual de un especialista en Temas de Café, para la activación de la cafetería Café de la plaza de la juventud de la Lima</b></p>	<p>A la fecha se ha realizado las acciones de capacitar a los jóvenes como baristas de café, y se han movilizado a los jóvenes a Valle de ángeles donde se encuentra el Coffe Shop para capacitarlos según los requerimientos de los TDR. Los jóvenes están preparando la estrategia de marketing para dar inicio con el funcionamiento de la cafetería café.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 jóvenes del municipio de la Lima Capacitados y formados como baristas de café</li> </ul>	<p>Retrasos en la contratación por los cambios institucionales.</p>

## **CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)**



### ✓ **Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a Través de las Energías Renovables (PODER)**

#### **i. Objetivo General**

El Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a través de las Energías Renovables (PODER), tiene como objetivo principal, mejorar las condiciones de vida del sector rural de Honduras más pobre del país. La falta de energía limita las oportunidades económicas y las opciones alimenticias disponibles en los hogares hondureños. Sin energía, familias rurales no tienen la capacidad de refrigerar y almacenar alimentos nutritivos, operar sistemas de irrigación y llevar a cabo procesos que les de valor agregado para generar ingresos adicionales, o incluso que les permita finalizar las tareas escolares por la noche. La meta de esta Actividad es proporcionar acceso a energías renovables (incluyendo las tecnologías que pueden resultar en la entrega de energía eléctrica) a por lo menos 10,000 familias rurales de Honduras, aproximadamente 50,000 beneficiarios en el occidente de Honduras en comunidades de la iniciativa de Alimentando el Futuro del Gobierno de Estados Unidos, a través de los proyectos, y de esta manera abordar algunas de las causas fundamentales de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición.

#### **ii. Focalización**

Proyectos que mejoran la posibilidad para generar el ingreso de los residentes de las comunidades del área de influencia en los departamentos de La Paz, Lempira, Intibucá, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque.

#### **iii. Descripción del Proyecto**

Soluciones y tecnologías haciendo uso de las energías renovables orientados a la mejora de los procesos productivos logrando atacar las causas de pobreza e inseguridad alimentaria.

#### **iv. Monto del Convenio**

Los fondos destinados para la ejecución de este Programa es de 29.04 millones de lempiras para el año 2019. Estos fondos son donación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

v. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2015	10,860,882.00	9,750,284.62	89.77%
2016	16,406,200.00	16,406,199.26	100.00%
2017	22,636,218.00	22,589,168.01	99.79%
2018	20,820,000.00	20,819,999.68	100.00%
2019	30,909,703.00	15,568,440.80	50.37%

vi. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios Directos 2019
ENERGIA RENOVABLE	13	8,239,424.98	1,174	4,591
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>8,239,424.98</b>	<b>1174</b>	<b>4,591</b>

vii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios directos 2019
COPAN	1	384,121.24	0	589
INTIBUCÁ	4	5,335,460.42	1,152	1,205
LA PAZ	1	161,963.14	0	2,538
LEMPIRA	5	1,863,764.48	0	119
SANTA BARBARA	2	494,115.70	22	140
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>8,239,424.98</b>	<b>1174</b>	<b>4,591</b>

viii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2019
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	806,485.36
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	6,522,530.46
<b>TOTAL</b>	<b>7,329,015.82</b>

## ix. Principales Logros (Julio a Septiembre de 2019)

### EJECUCIÓN DE PROYECTOS:

Se ejecutaron todos los proyectos planificados para este trimestre. El proyecto realiza su cierre operativo el 30 de Septiembre de 2019.

- Terminados 16 sistemas de riego y 23 proyectos de energía renovable.

No.	Nombre	Comunidad	Departamento	Avance
1	Sistema de riego San Antonio del Norte	San Antonio del Norte	La Paz	100.00%
2	Sistema de riego Togopala	Togopala	Intibucá	100.00%
3	Sistema de riego Las Mesas	Las Mesas	Intibucá	100.00%
4	Sistema de riego Azacualpa	Azacualpa	Intibucá	100.00%
5	Sistema de riego El Tablón	El Tablon	Intibucá	100.00%
6	Sistema de riego Belén	Belen	Intibucá	100.00%
7	Sistema de riego Las Quebradas	Las Quebradas	Intibucá	100.00%
8	Sistema de riego Los Olivos	Los Olivos	Intibucá	100.00%
9	Sistema de riego Las Lagunas	Las Lagunas	Intibucá	100.00%
10	Sistema de riego La Rinconada	La Rinconada	Intibucá	100.00%
11	Sistema de riego El Cerrón	El Cerrón	La Paz	100.00%
12	Sistema de riego Panina	Panina	Intibucá	100.00%
13	Riego por goteo Las Flores-II	Las Flores-II	Intibucá	100.00%
14	Riego por goteo Nueva Yamala	Nueva Yamala	Santa Bárbara	100.00%
15	Secadoras solares tipo domo para pequeños productores	Varias comunidades	Santa Bárbara	100.00%
16	Secadoras solares tipo domo para pequeños productores	Varias comunidades	Copán	100.00%
17	Secadoras solares tipo domo para pequeños productores	Varias comunidades	Ocatepeque	100.00%
18	Estufas mejoradas	Varias comunidades Copan	Copán	100.00%
19	Estufas mejoradas	Varias comunidades	Santa Bárbara	100.00%
20	Estufas mejoradas	Varias comunidades	Ocatepeque	100.00%
21	Estufas mejoradas	Varias comunidades	Lempira	100.00%
22	Estufas mejoradas	Varias comunidades Intibuca	Intibucá	100.00%
23	Estufas mejoradas	Varias comunidades	La Paz	100.00%
24	Secadoras solares	Varias comunidades	Intibucá	100.00%
25	Sistema de riego Panina (fase 2)	Panina	Intibucá	100.00%
26	Sistema de riego Togopala (fase 2)	Togopala	Intibucá	100.00%
27	Secadoras solares tipo Domo para pequeños productores (122)	Varias comunidades	La Paz	100.00%
28	Estufas mejoradas varias comunidades (132)	Varias comunidades	Intibucá	100.00%
29	Estufas mejoradas varias comunidades (132)	Varias comunidades	La Paz	100.00%
30	Secadoras solares tipo Domo para pequeños productores (85)	Varias comunidades	Copán	100.00%
31	Secadoras solares tipo Domo para pequeños productores (85)	Varias comunidades	Ocatepeque	100.00%
32	Estufas mejoradas varias comunidades (241)	Varias comunidades	Santa Bárbara	100.00%
33	Estufas mejoradas varias comunidades (132)	Varias comunidades	Lempira	100.00%
34	Estufas mejoradas varias comunidades (241)	Varias comunidades	Copán	100.00%
35	Estufas mejoradas varias comunidades (241)	Varias comunidades	Ocatepeque	100.00%
36	Centro de Entrenamiento Nutricional	El Portillo Norte, Yamaranguila	Intibucá	100.00%



37	Centro de Entrenamiento Nutricional	Azacualpa, Yamaranguila	Intibucá	100.00%
38	Sistemas solares domiciliarios	Carrizalito y Valle de la Cruz, Erandique	Lempira	100.00%
39	Secadoras solares tipo Domo para pequeños productores (121)	Varias comunidades	Intibucá	100.00%
40	Sistema de Biodigestión a partir de residuos de café	Cooperativa Montaña Verde	Santa Bárbara	100.00%
41	Micro generación en sistema de riego por goteo	Llanito Verde	Lempira	100.00%
42	Secadoras solares tipo Domo para pequeños productores (121)	Varias comunidades	Lempira	100.00%
43	Secadoras solares tipo Domo para pequeños productores (85)	Varias comunidades	Santa Bárbara	100.00%
44	Centro de Entrenamiento y Capacitación en Energías Renovables	Lepaera	Lempira	100.00%
45	Proyecto de secadoras solares industriales en el Departamento de Intibucá	Varias comunidades	Intibucá	100.00%
46	Proyecto de secadoras solares tipo domo en el Departamento de Intibucá	Varias comunidades	Intibucá	100.00%
47	Centro de Entrenamiento Nutricional (CEN) Semané, Yamaranguila, Intibucá	Semané	Intibucá	100.00%
48	Centro de Entrenamiento y Capacitación de Energía Renovables - Cucuyagua, Cucuyagua, Copán	Cucuyagua, Copán	Copán	100.00%
49	Centro de Entrenamiento y Capacitación de Energía Renovables - Jesús de Otoro, Otoro, Intibucá	Jesús de Otoro, Otoro, Intibucá	Intibucá	100.00%
50	Kits tecnológicos para Centros de Entrenamiento Nutricional (9)	Varias comunidades	Intibucá, La Paz, Lempira	100.00%

## ✓ Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)

### i. Objetivo General

El propósito de esta Actividad es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

### ii. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en las cinco municipalidades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Tela y La Ceiba. Las comunidades específicas de intervención serán identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

### iii. Descripción del Proyecto

Esta Actividad ayudará al GdeH (representado a través de FHIS) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otras partes interesadas. La Actividad incluye dos resultados complementarios: Resultado 1: Mejora de la infraestructura comunitaria, las actividades responderán a las prioridades de infraestructura comunitaria para abordar la seguridad ciudadana. Resultado 2: Aumento de la cohesión comunitaria, considera que la forma en que las intervenciones de infraestructura son concebidas, diseñadas y ejecutadas pueden desempeñar un papel directo en el aumento de la cohesión social y comunitaria y promover un marco holístico de prevención de la violencia. Los proyectos bajo la Actividad incluirán instalaciones educativas, centros de salud, alumbrado público, espacios comunitarios más seguros, centros de alcance y comunitarios, centros vocacionales, jardines comunitarios, parques, espacios recreativos, paradas de buses, accesos peatonales, mejoras al alumbrado de calles, señalización, instalaciones para el sector seguridad y justicia, así como otros proyectos de infraestructura de pequeña escala que se acuerde entre las Partes.

#### iv. Monto del Convenio

Presupuesto total estimado: \$14,637, 541.74, de los cuales, fondos de donación de USAID: \$11, 710,033.39; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$ 2, 927,508.35 (efectivo: \$ 2,127,508.35 y especies: \$ 800,000.00).

#### v. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	23,226,555.00	21,906,553.68	94.32%
2019	60,781,669.00	31,414,169.36	51.68%

#### vi. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios Directos 2019
INFRAESTRUCTURA VIAL	2	4,226,643.17	19	8,936
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	2	2,973,056.54	22	397
EDUCACION	6	15,873,494.03	132	5,767
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>23,073,193.74</b>	<b>173</b>	<b>15,100</b>

#### vii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios directos 2019
ATLANTIDA	4	13,033,824.66	84	3,872
CORTES	4	8,791,465.84	59	10,908
FRANCISCO MORAZAN	2	1,247,903.24	30	320
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>23,073,193.74</b>	<b>173</b>	<b>15,100</b>

#### viii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2019
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	7,366,619.16
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	974,356.46
<b>TOTAL</b>	<b>8,340,975.62</b>

## ix. Principales Logros (Julio a Septiembre 2019)

### A. PROYECTOS EJECUTADOS:

A continuación se presentan los proyectos ejecutados:

No.	Tipo de Proyecto	Ubicación	Monto del Proyecto	Status
1	Mejoras al Centro de Alcance Las Ayestas	Col. Las Ayestas, Distrito Central	L. 1,193,312.20	Cierre Financiero
2	Reparación de Escuela Carlos Rivera López	Colonia Central, Sector Rivera Hernández, San Pedro Sula	L. 2,676,001.97	Cierre Financiero
3	Obras Complementarias CEB José Antonio Peraza	Col. 6 de Mayo, Sector Rivera Hernández, San Pedro Sula	L.2,522,000.59	Cierre Financiero
4	Mejoras Instituto Triunfo de la Cruz	Col. San Alejo, Tela	L. 892,602.62	Cierre Financiero
5	Reparación Techo CEB Miguel Paz Barahona	Sector Bonitillo, La Ceiba	L. 137,702.02	Cierre Financiero
6	Pavimentación Calle Principal Col. Lopez Arellano (Ruta Segura)	Sector López Arellano, Choloma	L. 3,054,996.99	Cierre Financiero
7	Pavimentación Calle Principal hacia los juzgados (Ruta Segura)	Col. La Granja 1 y 2, Choloma	L. 2,892,602.76	Cierre Financiero
8	Reparación Marco Antonio Ponce	La Ceiba, Atlántida	L. 4,826,051.18	Cierre Financiero
9	Construcción Posta Policial de Bonitillo	La Ceiba, Atlántida	L. 3,578,634.33	Cierre Financiero
<b>TOTAL EJECUTADO</b>			L. 21,773,904.66	

### B. PROYECTOS A INICIAR

A continuación se presentan los proyectos en proceso previo a ejecución:

No.	Tipo de Proyecto	Ubicación	Monto del Proyecto	Status
1	Construcción Techo a Cancha Multiusos Col. Japón	Choloma, Cortés	L.1,200,000.00	Por iniciar
2	Ampliación CEB Dr. Alfonso Lacayo	Sector Rivera Hernández, San Pedro Sula	L.6,000,000.00	Por iniciar
3	Construcción Centro de Alcance El Corozal	La Ceiba, Atlántida	L. 1,838,210.69	Por iniciar
4	Reparación y Obras complementarias Escuela Ramón Montoya	La Ceiba, Atlántida	L. 5,605,150.25	Por iniciar
5	Mejoras Instituto Triunfo de la Cruz Fase II	Col. San Alejo, Tela	L. 3,895,772.66	Por iniciar
<b>TOTAL PROYECTOS POR INICIAR</b>			<b>L. 18,539,133.60</b>	

### C. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

A continuación se presentan los proyectos en ejecución:

No.	Tipo de Proyecto	Ubicación	Monto del Proyecto	Status
1	Reparación Instituto Reynaldo Narváez Rosales	Col. Las Torres, Distrito Central	L. 3,200,000.00	98% avance físico
2	Construcción Kinder Miriam Lobo	La Ceiba, Atlántida	L. 2,999,675.92	55% avance físico
3	Reparación de Casa Alianza Centro	Comayagüela, Francisco Morazán	L.3,883,846.45	85% avance físico
4	Reparación CEIN y Ampliación MAIE	La Ceiba, Atlántida	L. 2,575,044.55	5% avance físico
5	Mejoras a CDA Estados Unidos	M.D.C., Francisco Morazán	L. 240,000.00	40% avance físico
6	Construcción Centro Integral Corozal	Corozal, La Ceiba	L. 3,300,000.00	59.67% avance físico
7	Construcción CDA Arenales	San Pedro Sula, Cortés	L. 870,721.34	40% avance físico
8	Reparación CEB Claudio Barrera	La Ceiba, Atlántida	L.5,473,876.39	7% avance físico
9	Construcción Ruta Segura a CDA Nueva Suyapa	MDC, Francisco Morazán	L.3,684,432.26	15% avance físico
10	Ampliación Centro de Alcance Las Mercedes	La ceiba, Atlántida	L.1,644,821.01	45% avance físico
<b>TOTAL EN EJECUCIÓN</b>			<b>L. 27,872,417.92</b>	

### D. PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN DEL III TRIMESTRE

Los fondos nacionales solicitados por fuente 11 a través de SEFIN, no son asignados de acuerdo a las cuotas solicitadas, retrasando la ejecución de los mismos.

#### Acciones realizadas por la DIM:

La Dirección de Infraestructura Mayor gestionó ante SEFIN a la Tesorería General de la República para obtener el apoyo de que las cuotas se transfirieran con los montos solicitados.

✓ **Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras  
(USAID/PIOH)**

**i. Antecedente**

Las pobres condiciones sociales y económicas son especialmente pronunciadas en el occidente de Honduras, extrema pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático, bajos niveles educativos, migración, falta de acceso a los servicios básicos y otros retos socioeconómicos son endémicos. La provisión de servicios básicos de educación y nutrición son escasos en la zona de occidente y es difícil el acceso a los ya existentes, así mismo la gestión de servicios de educación, nutrición y agua y saneamiento son deficientes por lo que los ciudadanos cuentan además con pocos espacios de participación para mejorar sus vidas a nivel de hogar y sus vidas productivas, lo que genera una gran brecha de pobreza.

En este sentido se busca a través de proyectos de infraestructura de pequeña escala, la generación de accesos para la comunidad a espacios de participación que sirvan como plataforma para impulsar el desarrollo sostenible de la región, logrando satisfacer necesidades no satisfechas de algunos de los servicios básicos para generar un efecto multiplicador en la zona occidental del país.

Actualmente, la **AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID)** en apoyo al Gobierno de Honduras, ha asignado fondos de donación para la ejecución de proyectos de infraestructura a través de la **SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO, FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (SEDECOAS/FHIS)**, que vengán a mejorar las condiciones en las comunidades seleccionadas en el occidente de Honduras.

En base a lo anterior, surge la Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras, mediante la cual se ha considerado proveer esfuerzos de infraestructura a pequeña escala para mejorar la entrega de servicios a la población, mejorando condiciones de pobreza, vulnerabilidad al cambio climático, bajos niveles educativos e inseguridad alimentaria debido a la falta de acceso a servicios básicos. A su vez con esto se pretende crear una plataforma de participación ciudadana para cimentar las bases de una estructura comunitaria más efectiva, jugando un rol importante en la mejora de la entrega de servicios locales en el Occidente de Honduras.- El área de intervención será enfocada en las zonas de mayor pobreza, específicamente está orientada a seis departamentos del Occidente de Honduras.

Se ha planteado como meta beneficiar comunidades ubicadas en los seis departamentos de la zona de occidente de Honduras, su mayoría de la zona rural, habitantes en comunidades que presentan condiciones de pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático, bajos niveles educativos, migración y falta de acceso a servicios público.

La administración y ejecución de la Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH), financiado con fondos USAID, estará a cargo del SEDECOAS/FHIS, a través de la Dirección de Infraestructura Mayor (DIM).

## ii. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en los departamentos de Ocotepeque, la Paz, Copan, Intibucá, Santa Bárbara y Lempira y zonas occidentales específicas de intervención identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

## iii. Monto del Convenio

Se acaba de incorporar al Presupuesto General de la República L. 6,190,560.00, que se logró con los fondos de contrapartida del Gobierno.

## iv. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2019	6,190,650.00	16,343.76	0.26%

## v. Otras Inversiones

	Mto. Ejecutado 2019
<b>OTRAS INVERSIONES</b>	
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	16,343.76
<b>TOTAL</b>	<b>16,343.76</b>
