



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



---

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS  
DE DESARROLLO COMUNITARIO,  
AGUA Y SANEAMIENTO  
SEDECOAS

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL  
(SEDECOAS/FHIS)

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan  
Operativo Anual POA-Presupuesto

**IV Trimestre 2019**



## Indicé

<b>Introducción.....</b>	<b>3</b>
<b>Antecedentes .....</b>	<b>3</b>
<b>Misión:.....</b>	<b>4</b>
<b>Visión:.....</b>	<b>4</b>
<b>Valores: .....</b>	<b>4</b>
<b>Resumen Ejecutivo.....</b>	<b>5</b>
<b>Situación Actual de los Programas:.....</b>	<b>6</b>
<b>Proyectos FHIS.....</b>	<b>8</b>
<b>Ejecución Presupuestaria por Programas 2019 .....</b>	<b>9</b>
<b>Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2019.....</b>	<b>10</b>
<b>Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Cuarto Trimestre 2019 .....</b>	<b>11</b>
<b>Ejecución Gasto Operativo Cuarto Trimestre del 2019 .....</b>	<b>12</b>
<b>Cuadro por Sector 2019 (Ejecutado).....</b>	<b>15</b>
<b>CARTERA BANCO MUNDIAL .....</b>	<b>16</b>
✓ <b>Proyecto Municipios más Seguros .....</b>	<b>16</b>
<b>CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO .....</b>	<b>19</b>
✓ <b>Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) .....</b>	<b>19</b>
<b>CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA .....</b>	<b>25</b>
✓ <b>Proyecto de Infraestructura Rural BCIE .....</b>	<b>25</b>
<b>CARTERA KfW Entwicklungsbank.....</b>	<b>32</b>
✓ <b>Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE III y IV</b> <b>32</b>	
✓ <b>Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)..</b>	<b>37</b>
<b>CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)46</b>	
✓ <b>Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a Través de las Energías</b> <b>Renovables (PODER).....</b>	<b>46</b>
✓ <b>Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS).....</b>	<b>51</b>
✓ <b>Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)</b> <b>55</b>	



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS  
DE DESARROLLO COMUNITARIO,  
AGUA Y SANEAMIENTO  
SEDECOAS

## **Introducción**



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS  
DE DESARROLLO COMUNITARIO,  
AGUA Y SANEAMIENTO  
SEDECOAS

El presente informe es la recopilación de las actividades e inversiones realizadas por el SEDECOAS/FHIS durante el cuarto trimestre de 2019.

## **Antecedentes**

De acuerdo al Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-056-2019 se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), la cual debe de promover el Desarrollo Comunitario por medio de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos, en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerables de Honduras quien para el desarrollo de sus funciones debe contar con una Subsecretaría de Estado.

Se adscribe a dicha Secretaría de Estado, El Instituto Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS).

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es un organismo Desconcentrado de la Presidencia de la República, creado el 22 de febrero de 1990 y extendida su vida legal hasta el año 2022 según decreto No. 222-2010 cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados, en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social y/o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Asimismo, asesorará a los gobiernos locales con respecto a los procesos de captación de recursos de las fuentes de financiamiento nacionales y/o externas y las asiste en la transferencia de las capacidades técnicas y administrativas, para convertir a estos gobiernos locales en administradores eficientes de sus programas y proyectos, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Nación en aplicación del principio de Descentralización.

### **Misión:**

“Somos una Institución estatal, desconcentrada, técnica y captadora de recursos que promueve el desarrollo local sostenible, participativo e incluyente mediante el fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, en alianza con socios estratégicos para desarrollar obras de infraestructura y proyectos de orientación social de acuerdo al plan de nación y visión de país de forma transparente y eficiente, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable de Honduras”.

### **Visión:**

“Ser para el año 2022, la Institución líder en gestión y fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, para la ejecución de proyectos, que contribuya equitativamente al desarrollo sustentable nacional”.

### **Valores:**

- **Ética:** Ejercicio de las funciones con sujeción a las normas morales que promuevan la confianza de la población hondureña.
- **Integridad:** Actuación sustentada en la honradez, prudencia, entereza, rectitud y firmeza.
- **Compromiso:** Ejecución de proyectos que coadyuven al desarrollo local.
- **Transparencia:** Amplia difusión de información sobre nuestras actuaciones. Rendición de cuentas ante la sociedad.
- **Lealtad:** Actuar con fidelidad y rectitud hacia el FHIS y compañeros de trabajo, con el objetivo de identificarse con la institución.
- **Equidad:** El FHIS no hace distinción de credo, raza, de ninguna otra forma de discriminación humana.


## Resumen Ejecutivo

SEDECOAS/FHIS, llega hasta los lugares más recónditos del país, para contribuir a mitigar las necesidades de la población más pobre y vulnerable a través de respuestas rápidas y concretas con proyectos de Agua y Saneamiento, Educación, Electrificación Rural, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural.

El presupuesto del FHIS para la gestión 2019 al 31 de diciembre asciende a 621.1 Millones de Lempiras:

Fuente	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	% de Participación en el Presupuesto Vigente
<b>BID</b>	L. 117.716.409,00	L. 84.562.822,00	14%
<b>BCIE</b>	L. 15.809.640,00	L. 34.274.786,00	6%
<b>USAID</b>	L. 141.691.372,00	L. 97.882.022,00	16%
<b>GOH*</b>	L. 319.853.560,00	L. 288.201.248,00	46%
<b>BM</b>		L. 1.533.789,00	0%
<b>KfW</b>	L. 185.953.992,00	L. 114.731.277,00	18%
<b>TOTAL</b>	<b>L. 781.024.973,00</b>	<b>L. 621.185.944,00</b>	<b>100%</b>

\* Incluye costo Operativo del FHIS



### **Situación Actual de los Programas:**

1. Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), Se han diseñado al 100% 4 proyectos integrales de mejoramiento de barrio que incluye: mejora, reparación y/o construcción del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y sistema vial para las colonias: Nueva España, Nueva Australia, Nueva Galilea y 25 de Enero, Se ha ejecutado el Programa de entrenamiento deportes olímpicos y Valores en las disciplinas de: Taekwondo, Tenis de Mesa, y Levantamiento de pesas, con una participación de 900 niños y jóvenes de las colonias beneficiarias.
2. Programa Infraestructura Rural (BCIE), En el sector de **Agua y Saneamiento**, actualmente se encuentran en ejecución tres (3) subproyectos de construcción de sistemas de agua potable mediante microcaptación pluvial y saneamiento. En el sector de **Caminos Rurales**, se encuentra en ejecución un (1) subproyecto que corresponde a la Pavimentación de Casco Urbano del Municipio de Magdalena, en el departamento de Intibucá.
3. Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE III y IV: Se ejecutó el 98.39 % de los fondos asignados en el presupuesto vigente Y Cierre del PROMINE fase III.
4. Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR), La Cartera de proyectos del Programa CONVIVIR se le adicionaran 8 obras de las cuales, 1 se encuentra terminada, 4 en ejecución y 3 en proceso de licitación. De los 30 proyectos actualmente aprobados en la cartera del Programa CONVIVIR, 2 proyectos en el Municipio de La Lima, Cortes se encuentran en el proceso para rescindirlos debido a que no hay factibilidad social ni apoyo por parte del municipio para continuar con la Ejecución de los mismos, dichos proyectos son: Mediana Sitraterco y Casa de la Cultura.
5. Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a través de las Energías Renovables (PODER), Se ejecutaron todos los proyectos planificados y el proyecto PODER fue finalizado al 30 de septiembre del 2019.


6. Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS), Los fondos nacionales y de fuente externa del programa fueron ejecutados al 100% por el programa, sumando un total de L. 60,781,669.00
  
7. Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH): A la fecha no se reportan proyectos finalizados en vista que iniciaron en el último trimestre del 2019

## Proyectos FHIS

Fuente	Nombre del Proyecto	Nombre Corto	Sector	Modalidad Ejecucion
<b>BID</b>	Programa Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	PCCMB 4518/BL-HO	Infraestructura Social	Centralizados
<b>BCIE</b>	Proyectos de Infraestructura Rural	PIR BCIE 1736	Agua y Sanemiento, Eletrificacion y Caminos Rurales	Descentralizados/ Centralizados
<b>KFW</b>	Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar SE-FHIS FASE III y IV	PROMINE	Infraestructura Escolar	Descentralizados
	Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras	CONVIVIR	Infraestructura Social y Fortalecimiento de las Capacidades de los Jóvenes	Descentralizados
<b>USAID</b>	Programa de Oportunidades para el Desarrollo a través de Energía Renovable	PODER	Soluciones y tecnologías haciendo uso de las energías renovables orientados a la mejora de procesos productivos logrando atacar las causa de pobreza e inseguridad alimentaria	PEC/Centralizados
	Programa de Infrestrutura para la Seguridad Ciudadana	ICS	Recuperacion de espacio públicos e infraestructura escolar para la mejora de la seguridad ciudadana	PEC/Centralizados
	Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras	PIOH	Mejorar las condiciones de Infraestructura Básica para contribuir al desarrollo en el Occidente de Honduras.	PEC/Centralizados


### Ejecución Presupuestaria por Programas 2019

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Monto Planificado IV Trimestre	Devengado del IV Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% Ejecución IV Trimestre/ Planificado IV Trimestre	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
<b>Programa 1: Actividades Centrales</b>	L. 319.853.560,00	L. 288.201.248,00	L. 94.240.199,00	L. 135.145.178,58	L. 261.541.376,19	L. 26.659.871,81	143%	91%
<b>Programa 11: Infraestructura Rural</b>	L. 15.809.640,00	L. 40.465.436,00	L. 19.108.316,00	L. 21.960.678,24	L. 40.195.174,59	L. 270.261,41	115%	99%
<b>Programa 12: Infraestructura Escolar</b>	L. 123.157.419,00	L. 81.069.633,00	L. 33.086.150,00	L. 34.901.434,04	L. 79.762.875,76	L. 1.306.757,24	105%	98%
<b>Programa 14: Fomento al Desarrollo Local</b>	L. 286.794.651,00	L. 180.539.924,00	L. 108.851.955,00	L. 106.438.328,69	L. 168.758.801,93	L. 11.781.122,07	98%	93%
<b>Programa 17: Infraestructura Productiva</b>	L. 35.409.703,00	L. 30.909.703,00	L. -	L. 15.341.262,20	L. 30.909.703,00	L. -	0%	100%
<b>TOTAL</b>	<b>L. 781.024.973,00</b>	<b>L. 621.185.944,00</b>	<b>L. 255.286.620,00</b>	<b>L. 313.786.881,75</b>	<b>L. 581.167.931,47</b>	<b>L. 40.018.012,53</b>	<b>123%</b>	<b>94%</b>

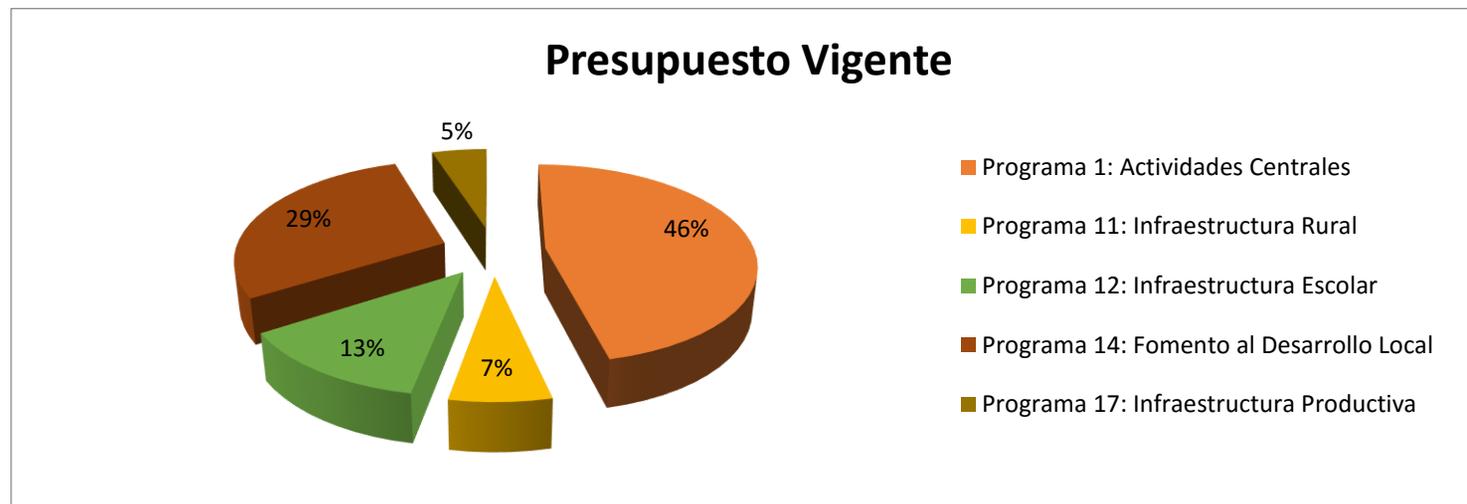


### Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2019

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente 2019	Devengado del IV Trimestre	Devengado Acumulado 2019	% Ejecución al IV Trimestre / Presupuesto Vigente
Gasto Operativo/Gobierno	L. 319.853.560,00	L. 288.201.248,00	L. 135.145.178,58	L. 261.541.376,19	91%
Proyecto de Infraestructura Rural 1736-BCIE	L. 15.809.640,00	L. 34.274.786,00	L. 15.995.452,46	L. 34.213.605,05	100%
Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras	L. -	L. 6.190.650,00	L. 5.965.225,78	L. 5.981.569,54	97%
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar, KfW VIII	L. 123.157.419,00	L. 81.069.633,00	L. 34.901.434,04	L. 79.762.875,76	98%
Proyecto Municipios Mas Seguros, MMS	L. -	L. 1.533.789,00	L. 1.512.403,09	L. 1.512.403,09	99%
Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jovenes CONVIVIR	L. 62.796.573,00	L. 33.661.644,00	L. 14.074.427,59	L. 30.786.651,68	91%
Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana	L. 106.281.669,00	L. 60.781.669,00	L. 29.367.499,64	L. 60.781.669,00	100%
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	L. 117.716.409,00	L. 84.562.822,00	L. 61.483.998,37	L. 75.678.078,16	89%
Programa de Oportunidades para el Desarrollo a través de Energía Renovable	L. 35.409.703,00	L. 30.909.703,00	L. 15.341.262,20	L. 30.909.703,00	100%
<b>TOTAL</b>	<b>L. 781.024.973,00</b>	<b>L. 621.185.944,00</b>	<b>L. 313.786.881,75</b>	<b>L. 581.167.931,47</b>	<b>94%</b>

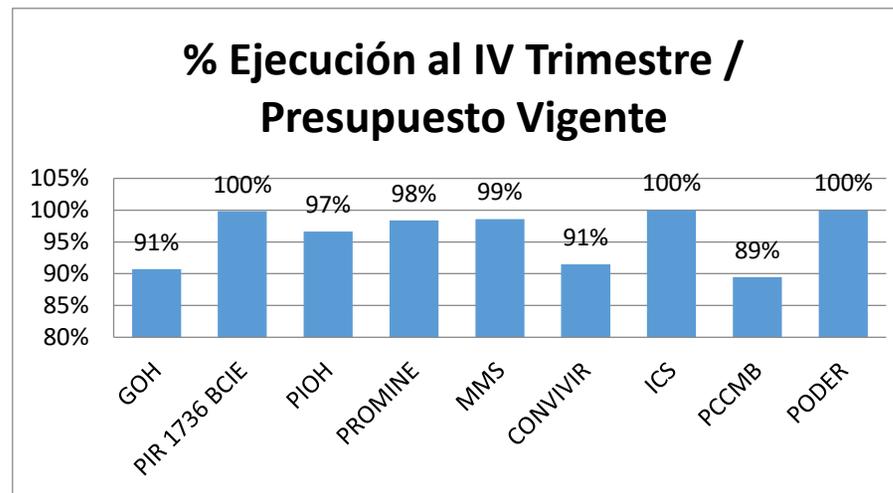

### Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Cuarto Trimestre 2019

Grupo	Aprobado	Presupuesto Vigente por Grupo	Devengado IV Trimestre	Devengado Acumulado al IV Trimestre	Disponible	% Ejecución IV Trimestre/ Presupuesto Vigente	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
SERVICIOS PERSONALES	L. 154.452.754,00	L. 150.322.023,00	L. 42.218.883,11	L. 144.447.145,04	L. 5.874.877,96	28%	96%
SERVICIOS NO PERSONALES	L. 126.293.052,00	L. 97.048.768,00	L. 36.562.528,17	L. 93.885.536,08	L. 3.163.231,92	38%	97%
MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 7.526.183,00	L. 4.364.999,00	L. 1.801.929,36	L. 3.807.519,09	L. 557.479,91	41%	87%
BIENES CAPITALIZABLES	L. 484.680.444,00	L. 348.576.568,00	L. 232.446.628,84	L. 325.425.176,01	L. 23.151.391,99	67%	93%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. 8.072.540,00	L. 7.704.443,00	L. 756.912,27	L. 1.417.051,65	L. 6.287.391,35	10%	18%
OTROS GASTOS	L. -	L. 13.169.143,00	L. -	L. 12.185.503,60	L. 983.639,40	0%	93%
<b>Total</b>	<b>L. 781.024.973,00</b>	<b>L. 621.185.944,00</b>	<b>L. 313.786.881,75</b>	<b>L. 581.167.931,47</b>	<b>L. 40.018.012,53</b>	<b>51%</b>	<b>94%</b>

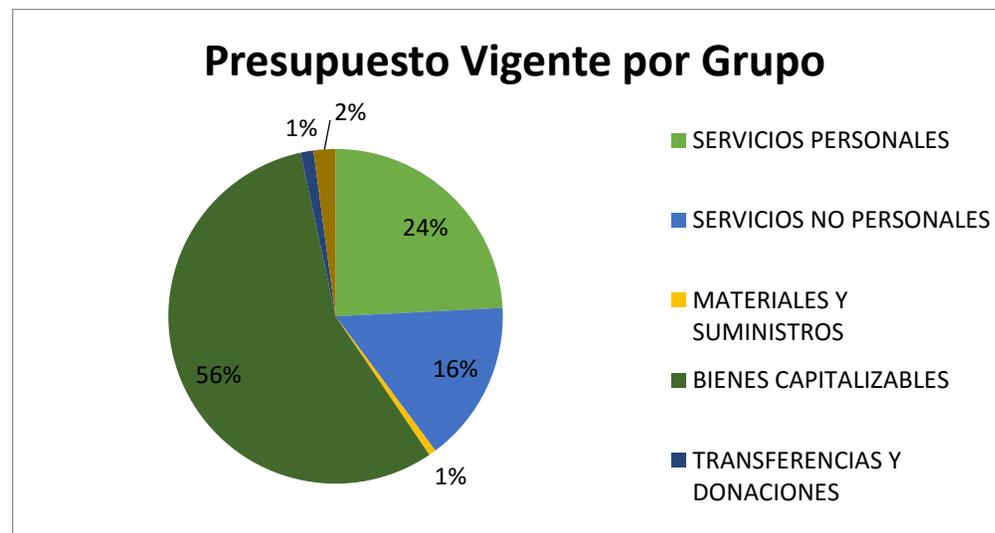



## Ejecución Gasto Operativo Cuarto Trimestre del 2019

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
11100	Sueldos Básicos	17.266.552,00	17.266.551,33	0,67
11400	Adicionales	1.159.626,00	1.149.213,96	10.412,04
11510	Decimotercer Mes	1.432.368,00	1.432.368,00	0,00
11520	Decimocuarto Mes	1.432.368,00	1.432.368,00	0,00
11600	Complementos	1.161.810,00	1.161.809,57	0,43
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	2.605.949,00	2.505.243,56	100.705,44
11750	Contribuciones para Seguro Social	593.473,00	551.603,30	41.869,70
26110	Pasajes Nacionales	7.547,00	7.546,88	0,12
26210	Viáticos Nacionales	178.308,00	177.869,99	0,51
29100	Ceremonial y Protocolo	62.564,00	62.563,96	0,04
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	111.154.188,00	92.152.608,22	19.001.579,78
51220	Ayuda Social a Personas	68.200,00	68.000,00	200,00
51310	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fines De Lucro	1.656,00	0,00	1.656,00
11100	Sueldos Básicos	17.541.385,00	17.357.318,20	0,13
11400	Adicionales	867.121,00	867.120,60	0,40
11510	Decimotercer Mes	1.497.889,00	1.497.888,56	0,44
11520	Decimocuarto Mes	1.497.889,00	1.497.888,56	0,44
11600	Complementos	1.041.884,00	1.041.883,57	0,43
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	2.677.054,00	2.557.016,42	120.037,58
11750	Contribuciones para Seguro Social	1.117.852,00	890.844,95	227.007,05
12100	Sueldos Básicos	28.316.997,00	28.316.996,65	0,35
12410	Decimotercer Mes	2.317.809,00	2.317.808,58	0,42
12420	Decimocuarto Mes	2.317.934,00	2.317.934,00	0,00
12550	Contribuciones para Seguro Social	1.266.912,00	1.266.912,00	0,00
12910	Contratos Especiales	13.754.698,00	13.754.697,39	0,61
16200	Compensaciones	5.621.156,00	957.051,38	4.664.104,62
21110	Suministro De Energía Eléctrica	210.956,00	111.738,95	99.217,05
21200	Agua	56.160,00	19.600,00	36.560,00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	739.510,00	451.483,40	168.026,60
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	42.652,00	42.651,90	0,10
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	21610,00	21.609,51	0,49
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	69.078,00	69.077,15	0,85
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	454.188,00	454.187,50	0,50
24500	Servicios de Capacitación	86.400,00	86.400,00	0,00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	3.738.267,00	3.738.266,67	0,33
25100	Servicio de Transporte	7.560,00	7.560,00	0,00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1.999.419,00	1.781.518,94	217.900,06
25400	Primas y Gastos de Seguro	609.508,00	609.507,52	0,48
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	16.905,00	16.905,00	0,00
26210	Viáticos Nacionales	719.968,00	719.670,23	0,89
27210	Tasas	261.475,00	261.474,92	0,08
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	275.508,00	215.868,02	59.639,98



OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
33100	Productos De Papel Y Cartón	194.861,00	194.860,81	0,19
33300	Productos de Artes Gráficas	23.000,00	23.000,00	0,00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	23.760,00	23.760,00	0,00
35100	Productos Químicos	12.025,00	12.025,00	0,00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	56.223,00	56.222,26	0,74
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	12.971,00	12.970,70	0,30
35620	Diesel	150.000,00	150.000,00	0,00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	131.342,00	98.566,50	32.775,50
36400	Herramientas Menores	691,00	690,80	0,20
36930	Elementos de Ferretería	21.591,00	21.590,72	0,28
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	93.358,00	93.357,75	0,25
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	117.370,00	117.369,78	0,22
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	318.13,00	318.12,11	0,89
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	2.034,00	2.033,02	0,98
39600	Repuestos y Accesorios	518.710,00	460.363,95	57.527,27
99720	Para Erogaciones de Capital por Devolución de Prestamos	13.169.143,00	12.185.503,60	983.639,40
11100	Sueldos Básicos	4.003.459,00	4.003.458,91	0,09
11400	Adicionales	261.000,00	251.015,00	9.985,00
11510	Decimotercer Mes	313.205,00	313.204,91	0,09
11520	Decimocuarto Mes	332.400,00	332.400,00	0,00
11600	Complementos	241.200,00	241.200,00	0,00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	697.268,00	588.033,00	109.235,00
11750	Contribuciones para Seguro Social	118.784,00	118.784,00	0,00
26210	Viáticos Nacionales	99.820,00	99.381,52	0,98
11100	Sueldos Básicos	2.271.350,00	2.271.349,49	0,51
11400	Adicionales	126.500,00	107.400,00	19.100,00
11510	Decimotercer Mes	156.434,00	156.433,33	0,67
11520	Decimocuarto Mes	189.900,00	189.900,00	0,00
11600	Complementos	129.734,00	129.733,11	0,89
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	450.115,00	333.050,50	117.064,50
11750	Contribuciones para Seguro Social	84.846,00	84.846,00	0,00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	107.787,00	104.086,58	3.700,42
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	1.265,00	1.265,00	0,00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	188.868,00	188.867,33	0,67
11100	Sueldos Básicos	2.449.995,00	2.449.994,81	0,19
11400	Adicionales	96.400,00	87.963,33	8.436,67
11510	Decimotercer Mes	186.900,00	186.900,00	0,00
11520	Decimocuarto Mes	186.900,00	186.900,00	0,00
11600	Complementos	121.053,00	121.052,13	0,87
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	446.651,00	354.670,00	91.981,00
11750	Contribuciones para Seguro Social	84.846,00	84.846,00	0,00
26210	Viáticos Nacionales	149.943,00	149.942,23	0,77

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
1100	Sueldos Básicos	21546.954,00	21546.953,60	0,40
11400	Adicionales	1288.602,00	1271292,81	17.309,19
11510	Decimotercer Mes	1740.163,00	1740.162,20	0,80
11520	Decimocuarto Mes	1792.810,00	1792.809,80	0,20
11600	Complementos	1445.873,00	1445.872,97	0,03
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	3.224.825,00	3.152.754,06	72.070,94
11750	Contribuciones para Seguro Social	845.130,00	763.646,50	81483,50
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	182.245,00	182.245,00	0,00
26210	Viáticos Nacionales	1808.778,00	1808.207,73	570,27
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>288.201.248,00</b>	<b>261.541.376,19</b>	<b>26.353.814,48</b>

### Cuadro por Sector 2019 (Ejecutado)

SECTOR	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios directos 2019
AGUA Y SANEAMIENTO	1	10.280.033,83	20	2.004
ELECTRIFICACION	2	1.096.825,26	21	414
INFRAESTRUCTURA VIAL	9	20.658.283,05	194	12.158
EMPENDIMIENTO Y VALORES	0	8.090.361,97	27	0
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	0	55.244.063,40	235	3.805
PREVENCION SITUACIONAL/CONVIVIENCIA	10	39.385.130,68	226	23.723
EDUCACION	10	94.430.161,40	289	11.357
ENERGIA RENOVABLE	13	18.429.609,26	1174	4.591
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>247.614.468,85</b>	<b>2.186</b>	<b>58.052</b>

### Cuadro por Departamento 2019 (Ejecutado)

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios directos 2019
ATLANTIDA	4	22.988.781,68	108	5.072
COMAYAGUA	2	12.773.765,76	33	2.750
COPAN	1	9.046.958,98	0	589
CORTES	7	15.434.865,92	68	12.414
FRANCISCO MORAZAN	4	72.622.179,90	401	13.297
GRACIAS A DIOS	0	30.054,00	0	0
INTIBUCÁ	7	43.759.974,44	1.221	2.390
LA PAZ	1	8.636.221,14	13	2617
LEMPIRA	16	25.298.832,94	300	18.141
OCOTEPEQUE	0	26.481.366,03	0	144
SANTA BARBARA	3	10.541.468,06	42	638
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>247.614.468,85</b>	<b>2.186</b>	<b>58.052</b>

### Cuadro por Otras Inversiones 2019 (Ejecutado)

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2019
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	26.705.048,28
GASTO OPERATIVO DE PROGRAMAS	45.307.038,15
ACTIVIDADES CENTRALES FHIS	261.541.376,19
<b>TOTAL</b>	<b>333.553.462,62</b>

## **CARTERA BANCO MUNDIAL**

### ✓ **Proyecto Municipios más Seguros**



#### **i. Objetivo**

Los objetivos de desarrollo del Proyecto son apoyar a Honduras para (i) mejorar las capacidades del gobierno central y de los gobiernos locales en la prevención de la violencia; (ii) abordar factores de riesgo de crimen y violencia en las Municipalidades Seleccionadas; y (iii) mejorar su capacidad de responder de manera rápida y efectiva ante una emergencia elegible.

#### **ii. Focalización:**

El Proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región Norte: La Ceiba, Choloma y El Progreso. Esto refleja la selección realizada por el Programa Municipios más Seguros que prioriza acciones en zonas con alta concentración de delincuencia y violencia. Para este Proyecto, los municipios fueron seleccionados por la clasificación en orden decreciente, tomando aquellos con poblaciones urbanas menores a 250.000 habitantes y con una tasa de homicidios mayor a 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual es aproximadamente el promedio nacional.

#### **iii. Tipología de Proyectos**

##### **Componente 1: Iniciativas Nacionales, Apoyo a SEDS, IUDPAS**

Subcomponente 1.1 Fortalecimiento de las capacidades de la Secretaría de Seguridad para orientar, coordinar y supervisar actividades de prevención de la violencia a nivel municipal; Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de las capacidades de la Secretaría de Seguridad y de las Municipalidades Seleccionadas para recolectar y procesar datos sobre violencia para la formulación de políticas basadas en la evidencia.

##### **Componente 2: Iniciativas Municipales**

Intervenciones de prevención social dirigidos a las poblaciones en riesgo, incluyendo aquellas:

- Orientadas a la familia (por ejemplo, capacitación para padres, programas de desarrollo para niños víctimas de maltrato en edad preescolar (0-5 años) y proveerán capacitación para estilos de crianza, disciplina y comunicación padre-niño, habilidades para manejo sin violencia de situaciones familiares, supervisión de padres de familia y actividades de desarrollo para preparación de la escuela y mejoramiento de capacidades cognitivas);

- Basadas en género (por ejemplo, consejerías y remisiones de mujeres víctimas de violencia interpersonal, doméstica y/o sexual, educación sobre salud reproductiva y salud sexual, masculinidad y el rol de los géneros, y fortalecimiento de redes locales de prevención de violencia de género);
- Basadas en la prevención de violencia escolar (por ejemplo, programas para después de clase que involucren deportes, música y arte, además de habilidades para la vida, y promoción de conductas propositivas; la promoción de habilidades para la resolución de conflictos y promoción de relaciones positivas entre estudiantes; intervenciones para estudiantes con problemas de aprendizaje o conducta; prevención y reducción del “bullying” y desarrollo de espacios escolares)
- Orientadas a los jóvenes (por ejemplo, Sub proyectos de mentoría (contacto sostenido con un adulto para proveer aprendizaje, acompañamiento y establecimiento de roles positivos a seguir) para jóvenes en situación de riesgo; servicios integrados para jóvenes de (15 -34 años) que cubran desarrollo de capacidades para obtención de trabajos incluyendo una mezcla de habilidades para la vida (auto-control, manejo de ira, mejora a la auto-estima y toma de decisiones así como pasantías laborables. También se prevé educación técnica vocacional, mediación en el mercado laboral y programas de rehabilitación de drogas.

Intervenciones de prevención situacional incluyendo:

- La construcción de infraestructura comunitaria en pequeña escala que reduce las oportunidades de cometer delitos o crea espacios seguros comunitarios (parques, jardines comunitarios, parques infantiles, alumbrado público y pavimentación de algunas calles);
- La construcción y/o rehabilitación de espacios que podrían servir como centro para la entrega de los servicios sociales para acciones de prevención de violencia.

Acceso a servicios básicos incluyendo:

- Intervenciones de mejoramiento urbano tales como conexiones de agua y saneamiento, alumbrado público, calles de acceso y obras de mitigación de riesgos.

Resolución alternativa de conflictos para ampliar los sistemas municipales de resolución de conflictos, incluyendo:

- La formación de mediadores municipales;
- Fortalecimiento de sistemas de registro de casos;
- Expansión de redes de mediadores voluntarios.

**Componente 3: Administración del Proyecto y Monitoreo y Evaluación**

Subcomponente 3.1. Apoyo a la Administración del Proyecto; Subcomponente 3.2. Monitoreo y Evaluación del Proyecto, incluyendo (a) el establecimiento de sistemas y capacidades para el proceso de monitoreo de las actividades del Proyecto, (b) la recopilación de datos de línea de base y de seguimiento para la evaluación de impacto del Proyecto, y (c) el desarrollo de la evaluación de impacto de al menos dos tipos de intervenciones.

#### **Componente 4: Mecanismo de Respuesta Inmediata (MRI) para Contingencias por Emergencias**

Este componente incluye la entrega de apoyo para responder de forma inmediata ante una Emergencia Elegible.

El Monto del convenio original fue de \$15, 000,000.00, pero el 22 de septiembre del 2015 la sub secretaria de Inversión Publica notificó al Ministro Director de IDECOAS, mediante oficio DGIP-212-2015, la reestructuración de los fondos de financiamiento, que significó una disminución de 2.3 millones de Dólares, siendo el nuevo monto del convenio de US\$ 12,700,000.00.

**Fecha de Firma del Convenio:** 18 de Diciembre de 2012

**Fecha de Finalización:** 31 de diciembre de 2018, conforme el periodo de gracias para cierre administrativo y financiero hasta 31 de mayo de 2019.

#### **iv. Avance Financiero**

<b>Año</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Eficiencia</b>
<b>2013</b>	19.288.000,00	11.605.763,23	60,17%
<b>2014</b>	43.046.050,00	22.346.049,32	51,91%
<b>2015</b>	54.222.419,00	51.468.890,89	94,92%
<b>2016</b>	57.912.834,00	55.876.475,87	96,48%
<b>2017</b>	63.829.671,00	58.882.919,96	92,25%
<b>2018</b>	36.999.449,00	31.839.370,88	86,05%
<b>2019</b>	1.533.789,00	1.512.403,09	98,61%

#### **v. Otras Inversiones**

<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>Mto. Ejecutado 2019</b>
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	1.512.403,09
<b>TOTAL</b>	<b>1.512.403,09</b>

## CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO



### ✓ Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)



#### i. Antecedentes

Actualmente el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y la Secretaría de Seguridad ejecutan conjuntamente la operación BID 4518/BL-HO denominada “Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios” el cual es un préstamo por un monto total de US\$60,000,000.00 la operación fue aprobada por el Banco Interamericano de Desarrollo en el mes de abril de 2018, posteriormente aprobada por el Congreso Nacional en el mes de octubre de 2018, y fue efectivo a partir del 28 de noviembre de 2018, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta

#### ii. Objetivo

Contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

#### iii. Componentes

**Componente 1.** Mejoramiento del hábitat de barrios urbanos vulnerables (US\$18.219 millones). El propósito de este componente es mejorar el acceso a servicios de infraestructura urbana y generar espacios con condiciones de seguridad, para incentivar una mejor convivencia y aumentar la capacidad de los ciudadanos para el cumplimiento pacífico de normas. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Infraestructura básica: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios en los siguientes barrios del Distrito Central: Monte de los Olivos, Nueva Jerusalén; Australia; 25 de Enero; Nueva

España; Brisas del Mogote y Nueva Galilea teniendo como marco para las intervenciones el Plan Integral de Mejoramiento de Barrios, el cual incluye los correspondientes diseños urbanísticos, de ingeniería, la programación y presupuestos. Este instrumento es crítico para la adecuada programación de las inversiones y para facilitar el diálogo con la comunidad sobre las actividades a desarrollar. Se financiará consultorías y contratación de obras para: (i) la preparación de los Planes Integrales de Mejoramiento de Barrios (PIMB); y (ii) las inversiones en obras de infraestructura básica de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, pavimentación, drenaje pluvial, plazas y parques, equipamientos sociales y otras necesidades detectadas en los PIMB. Se promoverá la recuperación de escuelas públicas y centros de salud (operados por las entidades estatales específicas).

Convivencia y Emprendimiento a nivel barrial: promueve la participación de los vecinos en el mejoramiento de las condiciones de su entorno, así como el fortalecimiento de sus redes sociales y vecinales para mejorar el tejido social en los barrios. Se financiará: (i) capacitación de líderes, programa de deportes y valores, apoyado por el Comité Olímpico Internacional; (ii) capacitación de vecinos en áreas de empleabilidad dentro y fuera del barrio mediante la asistencia técnica de las Universidades y su vinculación con el sector empresarial, (iii) organización para utilización de sistemas de alerta temprana para desastres naturales. Todas las actividades tendrán enfoque de género.

**Componente 2:** Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios (US\$22.130 millones). Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios de prevención social de la violencia al ciudadano y brindar una atención oportuna a las víctimas de violencias y delitos, fortaleciendo la gestión local. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

**Fortalecimiento de capacidades de actores municipales.** Se financiará: (i) capacitación y asistencia técnica a las autoridades locales para promover la participación ciudadana en la preparación de planes locales de prevención social de la violencia; (ii) fortalecimiento de las capacidades de los responsables de los observatorios locales, para el análisis estratégico de estadísticas del crimen y delito -incluyendo la desagregación por género-; y (iii) estrategia de comunicación a través de campañas y consultas sociales para promover medidas y valores para la reducción de violencias, respeto por las normas legales, morales, culturales y el uso de la oferta de servicios disponibles de prevención y atención a víctimas.

**Intervenciones de prevención social de la violencia a nivel municipal.** Se financiará: (i) programas para la atención a víctimas de VIF a través del módulo de Atención Integral Especializado (MAIE); (ii) desarrollo de protocolos para homologar la actuación de primeros respondientes para atención a víctimas, (iii) programa de prevención social de la violencia para jóvenes en situación de riesgo; (iii) modelo innovador de policía comunitaria y patrullaje policial sistemático -Hot Spots-; y (iv) mejoramiento de la infraestructura de las Jefaturas Departamentales, para ofrecer servicios policiales a la comunidad.

**Componente 3:** Efectividad policial. (US\$16 millones). Con el propósito de mejorar el desempeño y la calidad en la prestación de los servicios policiales, se apoyará la consolidación del sistema nacional de formación y profesionalización, así como su sistema de integridad. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Consolidación del sistema educativo policial basado en la filosofía de Policía Comunitaria. Se financiará: (i) diseño del modelo de Sistema de Formación y Profesionalización Policial, articulando sus diferentes instancias de formación (Instituto Técnico Policial -ITP-, ANAPO, Universidad y educación continua y entrenamiento), incluye mecanismos de evaluación continua del personal. Lo anterior, deberá estar sujeto a promover principios de meritocracia y transparencia en el desarrollo de la carrera policial; (ii) modernización del currículum académico para los medios y altos mandos policiales, certificado bajo la filosofía de policía comunitaria y orientando la formación a competencias para la toma de decisiones operativas. Lo anterior, incluyendo la redefinición del perfil de ingreso de candidatos a la ANAPO. Esto considerará la incorporación de nuevos cadetes, provenientes del ITP y otros candidatos que ya hayan cursado licenciaturas y tecnicaturas en otras universidades; modernizar el régimen de formación de oficiales en el nuevo campus universitario y generar una nueva estructura de gobierno y planta de profesores-investigadores de tiempo completo (teóricos y prácticos) (iii) fortalecimiento de las capacidades pedagógicas para docentes; (iv) fortalecimiento de la integridad policial a través de la consolidación de un sistema de evaluación y rendición de cuentas; y (v) modernización de la infraestructura física y tecnológica de la Academia Nacional de Policía y el Centro de Investigación y Desarrollo Policial.

Fortalecimiento de las capacidades en investigación criminal. Se financiará: (i) programa de capacitación y especialización continua en investigación criminal en coordinación con el MP; (ii) capacitación técnica en el uso de tecnologías de la información para análisis estratégicos delictuales; e (iii) implementación de un sistema integrado de información delictiva y criminal para mejorar la resolución del delito -integrando estadísticas por categoría de género.

#### **iv. Mecanismo de Ejecución.**

Se propone contar con dos organismos ejecutores independientes, pero con responsabilidades compartidas en el diseño, implementación y evaluación de iniciativas que se realicen en la misma área geográfica. El componente 1 de esta operación será ejecutado por SEDECOAS-FHIS y el componente 2 y 3 por la Secretaría de Seguridad.

**v. Monto del Convenio:**

US\$ 60,000,000.00 Millones de Dólares, según convenio de préstamo el cual se desglosa de la siguiente manera: SEDECOAS- FHIS le corresponde US\$ 20, 000,000.00 Millones de Dólares y a la Secretaria de Seguridad le corresponde US\$ 40,000,000.00 Millones de Dólares.

La duración del convenio es por 5 años después de la publicación de diario La Gaceta Acuerdo Ejecutivo No. 114-2018.

**vi. Avance financiero**

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	17.749.164,00	14.959.789,44	84%
2019	84.562.822,00	75.678.087,16	89%

**vii. Avance por Sector**

SECTOR	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios Directos 2019
EMPREDIMIENTO Y VALORES	0	3.616.347,17	27	0
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	0	55.244.063,40	235	3.805
PREVENCION SITUACIONAL/CONVIVENCIA	0	1.049.137,69	40	3.632
EDUCACION	0	595.999,99	27	3.198
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>60.505.548,25</b>	<b>329</b>	<b>10.635</b>

**viii. Avance por Departamento**

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios directos 2019
FRANCISCO MORAZAN	0	60.505.548,25	329	10.635
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>60.505.548,25</b>	<b>329</b>	<b>10.635</b>

**ix. Otras Inversiones**

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2019
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	1.268.334,28
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	13.904.195,63
<b>TOTAL</b>	<b>15.172.529,91</b>

x. AVANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

<i>Avances Programa</i>		
<b>Componente 1 Mejoramiento del hábitat de barrios urbanos vulnerables</b>		
<b>1.0</b>	<b>PRODUCTO 1.1 Nueve proyectos integrales de mejoramiento de barrios (red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, equipamiento social y pavimentación), completados y siendo utilizados</b>	
<b>1.1</b>	<i>Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se han diseñado al 100% 4 proyectos integrales de mejoramiento de barrio que incluye: mejora, reparación y/o construcción del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y sistema vial para las colonias: Nueva España, Nueva Australia, Nueva Galilea y 25 de Enero.</li> <li>Se tiene la licencia ambiental para 4 proyectos integrales y la aprobación del SANAA y ENEE del diseño de sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y sistema eléctrico de 4 proyectos integrales de mejoramiento de barrio.</li> <li>Se contrató la ejecución y supervisión del Proyecto de Integración Urbana, incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y obras de mitigación de riesgos para 1071 predios en las siguientes colonias: Nueva Australia, Nueva Galilea, Nueva España y 25 de Enero.</li> <li>Se ha contratado la ejecución y supervisión de proyecto de 6 obras de equipamiento social Reparación de Cancha Polideportiva, Colonia Nueva Galilea, Construcción de Centro Comunal, Colonia Nueva Galilea, ampliación de Jardín de Niños; Colonia Nueva España, ampliación Escuela David Corea Sánchez, Colonia Australia, construcción Centro Comunal, Colonia Australia, y Construcción Centro Comunal, Colonia 25 de Enero; se espera el inicio de las obras a finales del mes de octubre de 2019.</li> <li>Se está ejecutando la consultoría para el diseño de 5 proyectos integrales de mejoramiento de barrio: <i>Proyecto de Integración Urbana Incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario, Agua Potable, Drenaje Pluvial, Red de Alumbrado Público, Mejoramiento Vial, Espacios de Recreación y Obras de Mitigación de Riesgos para 3035 predios , en las siguientes colonias: Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén No. 2, Brisas del Mogote, Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble y Altos del Mirador;</i> ya se ha realizado el informe de diagnóstico de barrios y se están realizando los diseños preliminares de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, pavimentación, alumbrado público y equipamiento social.</li> </ul>
<b>2.0</b>	<b>PRODUCTO 1.2 Jóvenes de los barrios intervenidos capacitados</b>	
<b>2.1</b>	<i>Programa de Deportes y Valores</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se ha ejecutado el Programa de entrenamiento deportes olímpicos y Valores en las disciplinas de: Taekwondo, Tenis de Mesa, y Levantamiento de pesas, con una participación de 900 niños y jóvenes de las colonias beneficiarias.</li> </ul>
<b>1.2</b>	<i>Capacitaciones en valores y emprendimiento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se ha obtenido la asistencia de <b>2015 personas</b> capacitadas en el programa de valores y emprendimiento en los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Organización Comunitaria.</li> <li>Normas Parlamentarias.</li> <li>Derechos humanos, derechos del niño y adolescencia.</li> <li>Derechos humanos, derechos de la mujer y adulto mayor.</li> <li>Prevención en Drogas.</li> <li>Higiene laboral y comunitario.</li> <li>Elaboración y envasado de encurtidos.</li> <li>Elaboración de arroz chino.</li> <li>Elaboración de piñatas.</li> <li>Elaboración de tres leches.</li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confección de bisutería.</li> <li>• Elaboración de adornos navideños.</li> <li>• Elaboración de alimentos para navidad.</li> <li>• Elaboración de tortillas de harina.</li> <li>• Elaboración de empanadas de jamón y queso.</li> </ul> <p>Para la ejecución de actividades de capacitación se adjudicó la compra de un bus mediano.</p>
<b>3.0</b>	<b>PRODUCTO 1.3 Mujeres de los barrios intervenidos capacitadas en emprendedurismo y empleo</b>	
<b>3.1</b>	<i>Capacitaciones en empleabilidad.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 mujeres se capacitan a través del programa Empleando Futuros en las siguientes especialidades: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Operario Textil (3).</li> <li>○ Panadería (4).</li> <li>○ Auxiliar de Bodega (2).</li> <li>○ Diseño Gráfico (5).</li> <li>○ Operario de Restaurante (6).</li> </ul> </li> </ul>

#### xi. PROBLEMÁTICA:

Problema	Acciones de mitigación, comentarios, necesidades de apoyo
No contar con la licencia Ambiental para los proyectos de las colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén, y Brisas del Mogote.	Estas colonias se encuentran ubicadas en la cuenca del río Guacerique, la cual abastece el embalse de los Laurales, una de las tres fuentes de abastecimiento de la ciudad. El Saneamiento de estas colonias es imperativo para detener la contaminación del embalse. Sin embargo, se espera dificultades por parte de MiAmbiente en brindar el licenciamiento ambiental. Es por eso que se ha indicado a la firma consultora incorporar en su diseño todas medidas de mitigación necesarias para garantizar la viabilidad técnica y ambiental del proyecto. Asimismo se requiere la actualización del Plan de manejo de la Cuenca de Guacerique, de manera que se actualice el uso de suelo, se identifiquen los asentamientos informales que se han establecido en los últimos años (incluidas las colonias en referencia) y se defina el plan de manejo de la zona.
Cierre temprano del sistema SIAFI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No se realizó el pago de 1.5 millones de lempiras por la adquisición de un bus mediano por el cierre anticipado del sistema SIAFI, acción que afectará el presupuesto del año 2020 ya que esta inversión no estaba en la solicitud presupuestaria.</li> <li>• No se pudo realizar el pago a proveedores de bienes por compras menores.</li> <li>• Se realizó la adjudicación de equipo de cómputo para la capacitación de jóvenes en animación digital, el cual nos pudo realizar el pago de 3.6 millones de lempiras por el cierre temprano del sistema SIAFI.</li> </ul>

## **CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA**



### ✓ **Proyecto de Infraestructura Rural BCIE**



#### **i. Objetivo General**

Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local. Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son de L. 283 millones aproximadamente.

#### **ii. Focalización:**

En base a la metodología de selección de la mancomunidades ejecutado por PIR, que toma en consideración el índice de desarrollo humano, la capacidad de gerenciamiento de la Unidades técnicas Municipales en cada mancomunidad y no más de una mancomunidad por departamento, fueron seleccionadas las mancomunidades de los departamentos de Lempira (CAFEG), Intibucá (AMFI) y Francisco Morazán (MANOFM).

#### **iii. Tipología de Proyectos**

- Electrificación Rural: proyectos para habilitar o mejorar el acceso a electricidad teniendo los beneficiarios que aportar el 15% del monto total del proyecto.
- Agua y Saneamiento: proyectos de rehabilitación, expansión y construcción de sistemas comunales de agua y saneamiento y facilidades en áreas rurales, de las mancomunidades previamente seleccionadas.
- Caminos Rurales: proyectos de rehabilitación y mejoramiento de los caminos municipales eficientemente y utilizando métodos de empleo masivo de mano de obra aportando las comunidades beneficiadas el 15% del total del proyecto.

**iv. Monto del Convenio:**

L.285.0 Millones de Lempiras aproximadamente, según convenio de préstamo el tiempo de ejecución del proyecto es de 60 meses.

**v. Avance Financiero**

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2011	37.790.000,00	0,00	0,00%
2012	6.393.674,00	0,00	0,00%
2013	33.774.273,00	33.771.086,72	99,99%
2014	42.465.271,00	32.714.051,57	77,04%
2015	32.683.893,00	32.295.225,85	98,81%
2016	95.056.511,00	93.906.331,81	98,79%
2017	89.155.169,00	86.922.798,37	97,50%
2018	37.332.495,00	36.390.084,05	97,48%
2019	34.274.786,00	34.213.605,05	99,82%

**vi. Avance por Sector**

SECTOR	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios Directos 2019
AGUA Y SANEAMIENTO	1	10.280.033,83	20	2.004
ELECTRIFICACION	2	1.096.825,26	21	414
INFRAESTRUCTURA VIAL	7	14.955.522,32	166	3.222
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>26.332.381,41</b>	<b>207</b>	<b>5.640</b>

**vii. Avance por Departamento**

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios directos 2019
FRANCISCO MORAZAN	2	2.266.714,18	30	2.292
INTIBUCÁ	2	10.826.566,42	43	880
LEMPIRA	6	13.239.100,81	134	2.468
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>26.332.381,41</b>	<b>207</b>	<b>5.640</b>

**viii. Otras Inversiones**

<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>Mto. Ejecutado 2019</b>
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	1.665.348,43
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	6.215.875,21
<b>TOTAL</b>	<b>7.881.223,64</b>

**ix. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO**

El presente documento hace referencia a los movimientos que corresponden a la ejecución física y financiera del Programa PIR durante el cuarto trimestre del año 2019, para cada sector de inversión y para la fuente de financiamiento activa actualmente.

Con fondos del Préstamo BCIE No. 1736, se interviene en los sectores de Agua y Saneamiento, Caminos Rurales y Electrificación Rural por Extensión de Red en la Mancomunidades de Consejo Intermunicipal CAFEG (municipios de Candelaria, Gualcinse, Piraera, San Andrés, San Francisco y Santa Cruz), departamento de Lempira; Mancomunidad de los municipios del Norte y Occidente de Francisco Morazán MANOFM (municipios de Vila de San Francisco, El Porvenir, Guaimaca, Marale, Orica, San Ignacio, Cantarranas, Valle de Ángeles y Vallecillo) departamento de Francisco Morazán y Asociación de Municipios Fronterizos de Intibucá AMFI (municipios de Camasca, Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de la Sierra y Santa Lucía) en el departamento de Intibucá.

**x. EJECUCIÓN FINANCIERA**

Ejecución presupuestaria al 31 de diciembre 2019

Código	Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO 2019				Disponible	% Ejecución
		Lempiras					
		Aprobado	Decremento Incremento	Vigente	Ejecutado		
47	Préstamo BCIE- 1736	15,809,640.00	22,157,612.00	<b>34,274,786.00</b>	34,213,605.05	61,180.95	<b>99.82%</b>
	<b>Total</b>	<b>15,809,640.00</b>	<b>22,157,612.00</b>	<b>34,274,786.00</b>	<b>34,213,605.05</b>	<b>61,180.95</b>	

La UCP/PIR solicitó a la SEFIN estructura presupuestaria SIAFI para ejecutar los pagos de subproyectos en ejecución durante el I trimestre 2020, sustentada en la ampliación de fecha de cierre y justificación del Fondo Rotatorio al 31 de marzo del 2020, aprobada por el BCIE en agosto 2019. Se están coordinando acciones a lo interno del SEDECOAS/FHIS para solicitar aprovechamiento de espacio presupuestario, disminuyendo así el espacio del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) y creando espacio para PIR, con el fin de mantener el equilibrio presupuestario a nivel institucional.

## 1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Durante el IV trimestre 2019, se aprobó una (1) modificación:

Modificación tipo traslado presupuestario entre actividades y objetos del gasto por L 125,073.00 aprobada en octubre de 2019.

## 2. EJECUCIÓN FISICA

En el sector de **Agua y Saneamiento**, actualmente se encuentran en ejecución tres (3) subproyectos de construcción de sistemas de agua potable mediante microcaptación pluvial y saneamiento. A continuación se presenta el porcentaje de avance de obra del subproyecto mencionado y el detalle de los subproyecto a ejecutarse durante el 2019:

N	Cód. de Proyecto	Nombre de Proyecto	Ubicación		Porcentaje de Ejecución
			Municipio	Departamento	
1	107196	Construcción de Sistema Integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico Comunidad El Coyolar	San Marcos de la Sierra	Intibucá	65%
2	107181	Construcción de Sistema de Micro captación Pluvial y Saneamiento, Comunidades de Guasquin, La Puebla, El Triunfo y San Matías	Piraera	Lempira	60%
3	107182	Construcción de Sistema de Micro captación Pluvial y Saneamiento, Comunidad de El Derrumbado	San Marcos de la Sierra	Intibucá	70%

Durante el IV Trimestre 2019, se realizaron actividades de mejoramiento de viviendas, reparaciones de techos e instalación de canales de captación de agua lluvias, fundiciones de piso y suministro e instalación de sistemas solares de litio. A la fecha, el avance físico se reporta en un 65%.

En el sector de **Caminos Rurales**, se encuentra en ejecución un (1) subproyecto que corresponde a la Pavimentación de Casco Urbano del Municipio de Magdalena, en el departamento de Intibucá. A la fecha, se está realizando una orden de cambio para incorporar algunas actividades necesarias para el buen funcionamiento del pavimento:

N	Cód. de Proyecto	Nombre de Proyecto	Ubicación		Porcentaje de Ejecución
			Municipio	Departamento	
1	105600	Pavimentación de Casco Urbano del Municipio de Magdalena	Magdalena	Intibucá	2%

En el sector de **Electrificación Rural** por extensión de red, a la fecha, no se tienen subproyectos en ejecución, ya que han sido finalizados todos los programados a ejecutarse.

### **3. SITUACIÓN DE CONTRATOS Y LICITACIONES**

Durante el IV trimestre 2019, se dio seguimiento al proceso de firma de contrato de un subproyecto del sector de caminos rurales, que fue contratado en el mes de septiembre, posteriormente, se suscribió una modificación de contrato al subproyecto Construcción de Sistema de Microcaptación Pluvial y Saneamiento, Aldea El Derrumbado, Municipio de San Marcos de la Sierra, Departamento de Intibucá, Código 107182, que incrementó el monto del mismo en L 630,464.50, siendo el nuevo monto de contrato de L 4,488,517.03, misma que fue suscrita el 06 de diciembre de 2019.

A la fecha, no se encuentran procesos de contratación de obra o consultorías activos ni pendientes de publicación.

### **4. RESULTADOS DE GESTION (FP02)**

Con fondos del Préstamo del BCIE-1736, durante el IV trimestre del año 2019, se ha incrementado la cobertura a mejores vías de acceso a 908 personas, con la rehabilitación de 11.515 km de camino rural del tramo Calle Agua Zarca en el Municipio de Camasca y Azacualpa- Buena Vista en el municipio de Candelaria, pertenecientes a la red terciaria del país. Con esta intervención se ha incrementado el turismo y la prestación de servicios de transporte y la a vez reduciendo los costos, horas de traslado hacia comunidades cercanas y mantenimiento de vehículos. Además, se ha brindado empleo directo temporal a 51 personas durante las actividades constructivas.

### **5. DESCENTRALIZACIÓN A LAS MANCOMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL PIR**

Con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE Préstamo No. 1736, desde el inicio del Proyecto al 31 de diciembre del 2019, se han transferido las Mancomunidades beneficiarias MANOFM, CAFEG y AMFI un monto de L 147.6 Millones para la ejecución de subproyectos de infraestructura de los sectores Agua & Saneamiento, Electrificación Rural y Caminos Rurales y fortalecimiento institucional.

La UCP/PIR ha dado seguimiento a los fondos transferidos a las Mancomunidades para que sean utilizados única y exclusivamente para los fines autorizados expresamente en los respectivos convenios interinstitucionales FHIS-Mancomunidades y en los términos y condiciones establecidos en el Manual Operativo de FHIS, al tenor de las condiciones convenidas entre el Gobierno de Honduras y el BCIE bajo el Convenio de Préstamo No. 1736.

**TRANSFERENCIAS PARA EJECUCIÓN DE SUBPROYECTOS DESCENTRALIZADOS Y FORTALECIMIENTO  
INSTITUCIONAL**

**ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2019\***

MANCOMUNIDAD	AGUA Y SANEAMIENTO	ELECTRIFICACION RURAL	CAMINOS RURALES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	TOTAL LEMPIRAS
AMFI	L 15,190,873.37	L 11,761,414.15	L 18,870,853.47	L 461,678.00	L 46,284,818.99
CAFEG	L 19,261,737.39	L 19,238,407.47	L 13,083,063.16	L 707,658.00	L 52,290,866.02
MANOFM	L 19,839,490.05	L 9,378,993.64	L 18,359,222.24	L 1,475,730.00	L 49,053,435.93
<b>Total</b>	<b>L 54,292,100.81</b>	<b>L 40,378,815.26</b>	<b>L 50,313,138.87</b>	<b>L 2,645,066.00</b>	<b>L 147,629,120.94</b>
	37%	27%	34%	1.8%	100.00%

\*Nota: valores netos ajustados al 31 de diciembre 2019, incluyen devoluciones en concepto de obra no ejecutada y rescisión de contratos.

## 6. DESEMBOLSOS DEL PIR

El 21 de noviembre del 2018, se registró el último desembolso por un monto de USD\$ 1,775,884.55, y que corresponde a la séptima Restitución del Fondo Rotatorio, completando así el 100% del monto del Préstamo.

## 7. PROBLEMÁTICA FÍSICA Y FINANCIERA

- El congelamiento presupuestario aplicado por la SEFIN en la actividad de Obras, afectó la ejecución programada para el IV trimestre.
- El subproyecto de Construcción de Sistema de Micro captación Pluvial y Saneamiento, Comunidades de Guasquin, La Puebla, El Triunfo y San Matias, en el municipio de San Marcos de la Sierra, se ha presentado desfase en la ejecución de las obras, debido a que el Contratista no cuenta la logística necesaria para el desarrollo de las obras (materiales y personal calificado), por lo que se ha notificado vía bitácora y vía correo electrónico la necesidad incorporar más personal y materiales al día para recuperar tiempo y obra desfasada, de lo contrario, se seguirán aplicando multas por sobrepasar la fecha de terminación estipulada en el contrato.
- Las actividades constructivas del subproyecto Rehabilitación de Caminos Rurales Azacualpa – Buena Vista, se vieron retrasadas debido a las fuertes lluvias en la zona, por lo que se consideró ampliar el plazo de ejecución contractual a 30 días para concluir las actividades programadas, finalizando a conformidad a finales del mes de diciembre.

## **8. CARGA DE TRABAJO EN LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS**

En el sector Agua y Saneamiento, actualmente continúan se desarrollan actividades de campo y gabinete: elaboración de perfectibilidades, levantamientos topográficos para los estudios de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, levantamiento de información de encuestas técnicas y socioeconómicas, diseño y formulación de ampliaciones y nuevos sistemas de agua potable convencionales y no convencionales (micro captación pluvial), sistemas de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento, así también en el sector Electrificación Rural se desarrollan actividades de diseño y formulación de nuevos sistemas por extensión de red, sin embargo, fueron eliminados del listado de carga de trabajo proyectos que ya fueron ejecutados, según datos Municipales.

## **CARTERA KfW Entwicklungsbank**



### ✓ **Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE III y IV**

#### **i. Objetivo General**



El objetivo del Programa consiste en fortalecer la Rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la SE y la gestión local participativa así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres a CE de calidad que operan de manera sostenible. De esta manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre básico y básico).

#### **ii. Focalización**

Fase III. El área de intervención para del Programa comprende principalmente los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara.

Fase IV. El Área de intervención abarcará los departamentos que están siendo intervenidos en las fases anteriores (Zona de Occidente): 1) Copán, 2) Santa Bárbara, 3) Intibucá, 4) Lempira, 5) La Paz, 6) Ocotepeque. 7) Centros a nivel nacional en casos de emergencia (catástrofes naturales). La información de estos centros deberá ser actualizada en el plan maestro y sólo si se determina su precariedad, podrán ser intervenidos previo a No Objeción del KfW. 8) Adicionalmente se extenderá el área de intervención a los departamentos adyacentes a la zona de occidente, delimitando el área de intervención a través de la Carretera Panamericana. Los municipios a ser beneficiados se encuentran al oeste de la misma en los siguientes departamentos: 1) Choluteca, 2) Valle, 3) Francisco Morazán (exceptuando el núcleo urbano de Tegucigalpa), 4) Comayagua y adicionalmente 5) Gracias a Dios.

#### **iii. Priorización de los Centros Educativos**

Esta es realizada por la Secretaria de Educación apoyados en la herramienta del Plan Maestro de Infraestructura Educativa.

#### **iv. Descripción del Proyecto**

El Programa PROMINE Fase III que se enmarca en el área de educación básica con un componente de infraestructura que complementa al Plan EfA-FTI (Education for All / Fast Track Initiative) y contribuye al logro de las Metas del Milenio en Educación en la República de Honduras y por lo tanto en general se rige por los acuerdos ya definidos para la ejecución de la primera y segunda fase. Se financia infraestructura educativa en estrecha articulación con el Sector. La ejecución del Programa es responsabilidad de la Secretaría de Educación (SE) como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) como ente ejecutor. Los recursos del Programa se utilizan principalmente para financiar la construcción, ampliación y/o el mejoramiento de los Centros Educativos (CE) así como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan mediante la modalidad descentralizada con énfasis en la ejecución comunitaria (Proyectos Ejecutados por la Comunidad – PEC-FHIS) empleada con éxito en el programa FHIS VI y VII, aplicada de forma general en todos los proyectos, indistinto de su monto financiero, excepto los altamente complejos.

El Programa PROMINE Fase IV se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y en la planificación estratégica para los años 2014 – 2018 de la Secretaría de Educación (SE). El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las tres fases previas PROMINE I, II y III. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

#### **v. Monto del Proyecto:**

##### **Fase III:**

Fondos de Crédito por un monto de € 10,000,000.00 euros, Contrapartida Nacional para SEDECOAS/FHIS de €495,000 euros, Contrapartida Nacional para SE de € 250,000 euros, Contrapartida Municipal de € 600,000 euros y Contrapartida Comunitaria de € 600,000 euros.

Fecha de Firma de Contrato de Préstamo: 30/12/2013

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 15/12/2014

Fecha de Inicio: 16 de Septiembre 2015 (Se considera la fecha de inicio de la Consultoría)

Fecha de Finalización de Convenio: 31/12/2019

#### **Fase IV:**

Fondos de Donación por un monto de € 15,000,000.00 euros, Contrapartida Nacional para SEDECOAS/FHIS de € 424,000 euros, Contrapartida Nacional para SE de € 218,000 euros, Contrapartida Municipal de € 515,000 euros y Contrapartida Comunitaria de € 514,000 euros

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 03/12/2015

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 17/02/2017

Fecha de Inicio: 02 de Abril 2018 (Se considera la fecha de inicio de la Consultoría)

Fecha de Finalización de convenio: 30/11/2020

#### **vi. Avance Financiero PROMINE FASE III y IV**

<b>Año</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Eficiencia</b>
<b>2016</b>	145.687.475,00	142.916.817,45	98,10%
<b>2017</b>	107.279.375,00	96.731.967,93	90,17%
<b>2018</b>	53.035.502,00	50.951.601,81	96,07%
<b>2019</b>	81.069.633,00	79.762.875,76	98,39%
<b>Presupuesto 2019 Fase III y Fase IV</b>			

#### **vii. Avance Físico por Sector PROMINE FASE III y IV**

<b>SECTOR</b>	<b>Proyectos Finalizados 2019</b>	<b>Mto. Ejecutado 2019</b>	<b>Empleos Generados 2019</b>	<b>Beneficiarios Directos 2019</b>
EDUCACION	4	68.722.956,11	107	1.921
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>68.722.956,11</b>	<b>107</b>	<b>1.921</b>

#### **viii. Avance Físico por Departamento PROMINE FASE III y IV**


<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>Proyectos Finalizados 2019</b>	<b>Mto. Ejecutado 2019</b>	<b>Empleos Generados 2019</b>	<b>Beneficiarios directos 2019</b>
COPAN	0	8.255.230,37	0	0
FRANCISCO MORAZAN	0	406.523,55	0	0
GRACIAS A DIOS	0	30.054,00	0	0
INTIBUCÁ	1	22.029.900,71	16	57
LA PAZ	0	5.242.185,69	0	0
LEMPIRA	2	66.308,25	71	1.366
OCOTEPEQUE	0	24.683.438,04	0	0
SANTA BARBARA	1	8.009.315,50	20	498
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>68.722.956,11</b>	<b>107</b>	<b>1.921</b>

**ix. Otras Inversiones**

<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>Mto. Ejecutado 2019</b>
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	9.438.656,71
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA*	1.601.262,94
<b>TOTAL</b>	<b>11.039.919,65</b>
*Viaticos y Combustible	


**AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS POR FASE**

**FASE III**

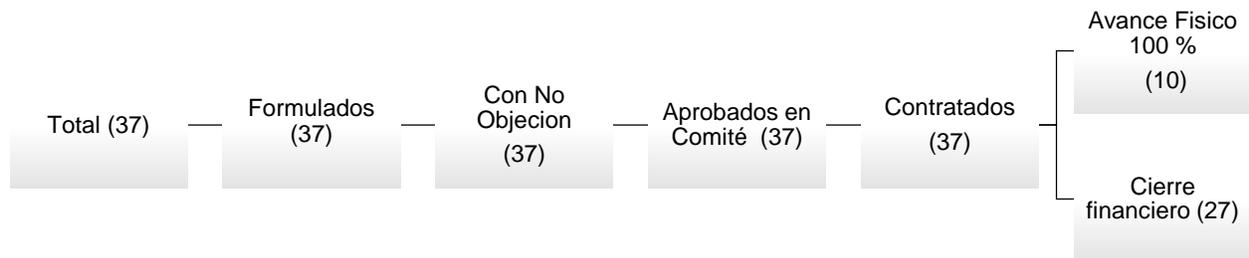

Estos 37 proyectos corresponden a 34 proyectos que incluyen infraestructura y equipamiento y 3 únicamente de equipamiento.

**FASE IV.**

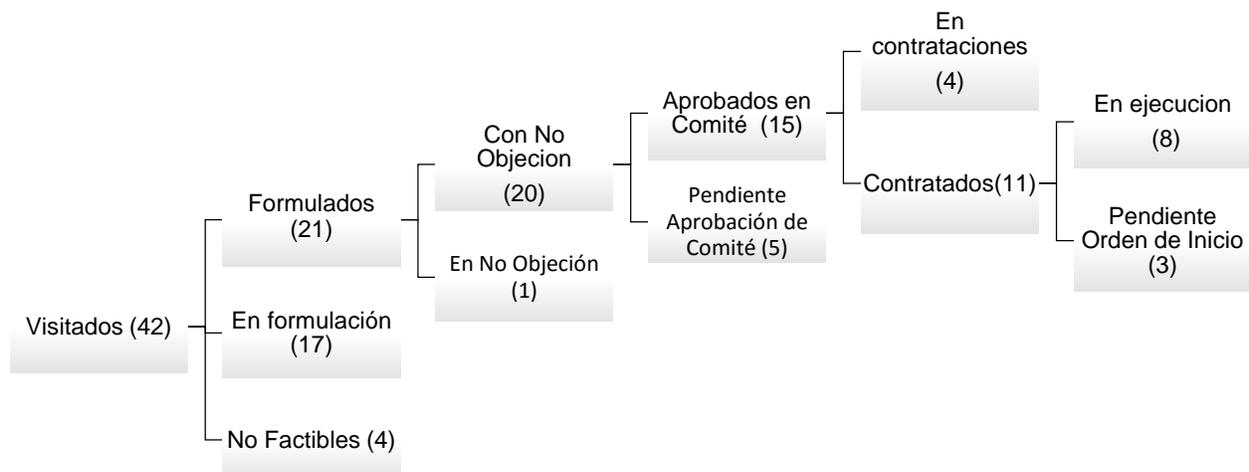

**x. LOGROS IV TRIMESTRE**

- Se ejecutó el 98.39 % de los fondos asignados en el presupuesto vigente
- Cierre del PROMINE fase III

**xi. RETOS PROXIMOS**

Entre los principales retos que enfrenta el PROMINE-KfW:

- Ejecución de Proyectos: Impulsar la formulación y evaluación de proyectos en la fase IV.
- Inversión Departamento de Gracias a Dios: Iniciar ejecución bajo la modalidad PEC en el mes enero
- Contrapartes Nacional: Monto definido según AS y gastos en campo

## ✓ Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)



### vi. Objetivo General

Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).

### vii. Focalización

A través de un proceso de concurso con criterios de selección predefinidos en el acuerdo separado y evaluación de propuestas técnicas alineadas a los componentes del programa fueron seleccionados 3 municipios en donde se está realizando la intervención del CONVIVIR a través de obras de infraestructura y medidas de alcance social para beneficio enfocado en la juventud. Así mismo se definieron los barrios, colonias o comunidades urbanas en donde se focaliza las acciones y en donde ya se ha realizado una labor de socialización de los alcances, compromisos y beneficios para la población. Los municipios seleccionados son:

- Municipio de Gracias, departamento de Lempira
- Municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua
- Municipio de La Lima, departamento de Cortes.

### viii. Descripción del Proyecto

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

### ix. Monto del Proyecto:

Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son Euros 10,000,000.00. El tipo de financiamiento es un contrato de Préstamo.

**Fecha de Firma de convenio:** 08/11/2012

**Fecha de Finalización de convenio:** 30/06/2020

**x. Avance Financiero**

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2014	21.289.204,00	18.316.427,97	86,04%
2015	38.873.159,00	34.024.198,74	87,53%
2016	88.796.503,00	83.460.868,42	93,99%
2017	51.288.495,00	48.071.886,28	93,73%
2018	65.657.852,00	43.535.738,65	66,31%
2019	33.661.644,00	30.786.651,68	91,46%

**xi. Avance por Sector**

SECTOR	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios Directos 2019
EMPREDIMIENTO Y VALORES	0	4.474.014,80	0	0
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	6	21.114.333,02	137	18.444
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>25.588.347,82</b>	<b>137</b>	<b>18.444</b>

**xii. Avance por Departamento**

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios directos 2019
COMAYAGUA	2	12.773.765,76	33	2.750
CORTES	1	4.722.959,52	9	1.506
LEMPIRA	3	8.091.622,54	95	14.188
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>25.588.347,82</b>	<b>137</b>	<b>18.444</b>

**xiii. Otras Inversiones**

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2019
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	5.198.303,86
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	0
<b>TOTAL</b>	<b>5.198.303,86</b>

#### xiv. INFORMACION FINANCIERA

En el presente cuadro se observa la ejecución financiera que ha tenido el Programa CONVIVIR desde su creación a la fecha, en el Cuarto Trimestre del año 2019 lo ejecutado se distribuye de la siguiente manera:

##### Ejecución financiera del 4to trimestre

Componente	Presupuesto Ejecutado 2014	Presupuesto Ejecutado 2015	Presupuesto Ejecutado 2016	Presupuesto Ejecutado 2017	Presupuesto Ejecutado 2018	Presupuesto Ejecutado IV Trimestre 2019
<b>01-Gasto Operativo</b>	L. 536,459.53	L. 4011,908.76	L8,186,328.38	L. 7,484,899.00	L. 6,977,244.45	-
<b>02- Construcción</b>	L. 4134,589.44	L. 14781,805.43	L. 53,726,357.68	L. 21,533,793.15	L. 9,885,956.39	L. 19,765,281.37
<b>03- Fortalecimiento de Habilidades de Jóvenes</b>	L. 0.00	L. 2011,078.63	L. 8,078,022.83	L.3,972,943.74	L. 6,175,521.00	L. 443,284.80
<b>04- Mejoramiento Capacidades de Actores Relevantes</b>	L. 0.00	L. 4114,456.01	L. 2,137,666.23	L. 2,906,038.90	L. 3,210,648.09	L. 4,030,730.00
<b>05-Materiales y Equipos</b>	L. 0.00	L. 820,323.53	L. 3,142,655.66	L. 3,383,553.95	L. 5,733,027.16	L. 1,349,051.65
<b>06-Consultoria internacional</b>	L. 13645,379.00	L. 8284,626.38	L. 8,189,837.64	L. 8,790,657.54	L. 11,553,341.56	L. 5,198,303.86
<b>Total</b>	<b>L. 18,316,427.97</b>	<b>L. 34,024,198.74</b>	<b>L. 83,460,868.42</b>	<b>L. 48,071,886.28</b>	<b>L. 43,535,738.65</b>	<b>L. 30,786,651.66</b>

Al cierre del período del periodo de Octubre a Diciembre del año 2019 la ejecución financiera del programa alcanza a un 91.46% Entre las razones más importantes para este porcentaje (%) de ejecución, es debido a que los proyectos algunos se encuentran en ejecución y otros comenzaron su proceso administrativo después de ser aprobada la ampliación de tiempo a finales del mes de noviembre, desfasando los procesos de contratación y ejecución de los proyectos.

Los procesos de resolución de contrato de los proyectos “Casa de la Cultura” y “mediana Sitraterco” aún se encuentran en proceso para la recuperación de los fondos a la cuenta del programa CONVIVIR, a finales del mes de diciembre se recibió la noticia y el F01 del depósito de una parte de estos fondos a las cuentas del SEDECOAS/FHIS.

#### COMPONENTE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA- AVANCE FISICO

En el componente de Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura el Programa CONVIVIR, la gestión del IDECOAS/FHIS está orientada a lograr la buena ejecución de cada obra priorizada. Para ello, durante este período se ha continuado con el trabajo conjunto con la Dirección de Control y Seguimiento y el apoyo de la Asistencia Técnica. Se ha logrado dar término de un número de 26 obras de infraestructura.

La institución es también responsable de la tramitación de documentación para lograr la aprobación de órdenes de cambio, y desembolsos de fondos para construcción.

Actualmente se tiene una cartera de 37 proyectos de infraestructura aprobados para ejecutar con el monto del convenio. De dichos proyectos ya se terminaron 26 obras, 8 proyectos en ejecución, 3 proyectos en proceso de Licitación y 2 proyectos en proceso de resolución de contrato debido a la falta de voluntad política del municipio y factibilidad social de las obras estas se encuentran ubicados en La Lima, Cortes.

Se continúa trabajando en el proceso de equipamiento de los proyectos priorizando los que están terminados y los que están próximos a inaugurar.

El IDECOAS/FHIS ha actuado por medio de su equipo de Control y Seguimiento, inspectores sociales y técnicos, y apoyo del equipo de Asistencia Técnica dando seguimiento a la ejecución de los proyectos en construcción, como también trabajando en el seguimiento a las gestiones administrativas relacionadas con desembolsos, ordenes de cambio ingresados en el ciclo de proyectos del IDECOAS/FHIS.

A continuación se anexan los tres cuadros que corresponden a la ejecución física de cada una de las obras de infraestructura.

**No. 1 Obras priorizadas en el municipio de Siguatepeque, Comayagua**

No.	Código FHIS	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado	ESTADO	
					Avance Físico	Avance Financiero
1	105175	Construcción Cancha Multiuso Parque Bosque Calanterique	Suyapita	L. 3104,790.79	CONCLUIDO	
2	106002	Construcción Salón Multiusos Y Cancha Deportiva Noé Cruz Villeda	Col. Noé Cruz Villeda	L. 3012,043.70	CONCLUIDO	
3	106347	Construcción Centro De Calidad De Vida	La Crucita	L. 2956,701.47	CONCLUIDO	
4	106181	Construcción Centro De Calidad De Vida Bo. El Carmen	Bol El Carmen	L. 3767,167.59	CONCLUIDO	
5	106094	Remodelación Centro De Capacitación Digital	Bo. El Centro	L. 410,327.27	CONCLUIDO	
6	105928	Construcción De Obras Complementarias Campo De Futbol Col. Mata	Col. Mata	L. 2721,312.41	CONCLUIDO	
7	106308	Construcción Centro De Calidad De Vida	Bo. San Juan	L. 3598,956.85	CONCLUIDO	
8	107303	Construcción Oficina Municipal De La Juventud	Barrio El Centro	L. 3638,941.50	CONCLUIDO	
9	107324	Remodelación Centro De Aprender Para Emprender - Infop	Suyapita	L. 986,493.87	100.00%	93.99%
10	107546	Construcción Obras Complementarias Plaza Del Bosque Calanterique	Suyapita	L. 1805,135.54	55.00%	30.78%
11	107317	Construcción Casa De La Cultura	Bol El Carmen	L. 11012,069.37	3.00%	8.00%
12	107547	Remodelación De Biblioteca Municipal, Siguatepeque	Bo. El Centro	L. 461,153.55	35.00%	15.00%
13	107483	Construcción Plaza Turística de Artesanos EL Porvenir	Aldea El Porvenir	L. 4760,463.87	En proceso de Licitación Pública	
<b>TOTAL INVERSION</b>				<b>L. 42,235,557.78</b>		

**No. 2 Obras priorizadas en el municipio de Gracias, Lempira**

No.	Código FHIS	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado	ESTADO	
					Avance Físico	Avance Financiero
1	105174	Construcción Plaza Recreativa Colonia Borjas	Col. Borjas	L. 3225,774.53	CONCLUIDO	
2	106006	Construcción Plaza De Recreación Para La Convivencia Pinalito Y Bella Vista	Pinalito	L. 2147,440.69	CONCLUIDO	
3	106145	Remodelación Centro De Capacitación Digital	La Merced	L. 56,983.16	CONCLUIDO	
4	106090	Ampliación Plaza Boulevard Marco Tulio Rodriguez	El Progreso	L. 2454,714.29	CONCLUIDO	
5	106062	Construcción Casa De La Cultura	Mercedes	L. 8169,443.80	CONCLUIDO	
6	106007	Construcción Escuela De Música Mejicapa	Bo. Mejicapa	L. 2590,324.49	CONCLUIDO	
7	105994	Reposición Polideportivo Villas Del Rosario	Villas del Rosario	L. 7868,528.04	CONCLUIDO	
8	106003	Construcción Parque Recreativo Col. Moreno Y Hércules	Col. Moreno	L. 5459,590.31	CONCLUIDO	
9	106004	Remodelación Plaza San Sebastián	Gracias	L. 4029,707.82	CONCLUIDO	
10	106136	Construcción Salón Multiusos Bella Vista Y Pinalito	Col. Bella Vista	L. 2979,546.19	CONCLUIDO	
11	105992	Construcción Campo De Pelota Bella Vista Y Pinalito	Col. Bella Vista	L. 3197,439.41	CONCLUIDO	
12	105713	Ampliación Casa De La Juventud	Villas del Rosario	L. 6619,560.57	CONCLUIDO	
13	106328	Construcción Centro De Calidad De Vida Villami	Villami	L. 2447,597.92	CONCLUIDO	
14	107489	Centro De Aprender Para Emprender, Inst. Ramón Rosa	Barrio Mejicapa	L. 4776,414.85	En proceso de Licitación Pública	
<b>TOTAL INVERSION</b>				<b>L. 56,023,066.07</b>		

**No. 3 Obras priorizadas en el municipio de La Lima, Cortés**

No.	Código FHIS	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado	ESTADO	
					Avance Físico	Avance Financiero
1	105173	Construcción Centro Juvenil De Desarrollo Integral	Centro Sula	L. 3262,220.20	CONCLUIDO	
2	106182	Construcción Centro De Calidad De Vida Col. Nuevo San Juan	Col. Nuevo San Juan	L. 2961,528.33	100%	100%
3	106184	Construcción Centro De Calidad De Vida	Col Álvarez Martínez	L. 3068,158.19	93%	95%
4	105893	Remodelación Casa De La Cultura	Col. Sitraterco	L. 9605,935.76	En proceso de resolución de contrato	
5	105895	Remodelación Camino De Los Gatos Paseo Del Puente Y Áreas Aledañas	Bo. Centro Sur	L. 2831,897.23	93%	99%
6	106093	Remodelación Centro De Capacitación Digital	Bo. Centro Norte	L. 225,080.18	CONCLUIDO	
7	105738	Ampliación Plaza Juventud Barrio Centro Sur	Bo. Centro Sur	L. 7036,616.12	CONCLUIDO	
8	105897	Remodelación Mediana Sitraterco	Col Sitraterco	L. 8518,858.49	En proceso de resolución de contrato	
9	105900	Construcción Cancha Multiusos Colonia El Maestro	El Maestro	L. 2687,523.23	CONCLUIDO	
10	105902	Remodelación Parque De Los Pinos	Col. Los Pinos	L. 1775,191.17	CONCLUIDO	
11	107488	Remodelación Biblioteca Municipal	Bo. Centro Sur	L. 1500,285.33	Ejecución	
12	107610	Remodelación Centro de Aprender para Emprender, Instituto Técnico Vocacional Valle de Sula	Col. Oro Verde	L. 4168,239.85	En proceso de Licitación Pública	
<b>TOTAL INVERSION</b>				<b>L. 29,516,739.83</b>		

A la Cartera de proyectos del Programa CONVIVIR se le adicionaran 8 obras de las cuales, 1 se encuentra terminada, 4 en ejecución y 3 en proceso de licitación.

Nota: De los 30 proyectos actualmente aprobados en la cartera del Programa CONVIVIR, 2 proyectos en el Municipio de La Lima, Cortes se encuentran en el proceso para rescindirlos debido a que no hay factibilidad social ni apoyo por parte del municipio para continuar con la Ejecución de los mismos, dichos proyectos son: Mediana Sitraterco y Casa de la Cultura.

## AVANCE DEL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES Y LABORALES DE JÓVENES Y COMPONENTE MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES RELEVANTES

En el Cuarto Trimestre del año 2019, se continuó con la formulación de procesos y ejecución de procesos de igual manera con la selección de participantes para estos dos (2) componentes esenciales del programa CONVIVIR, el cual se detalle a continuación un cuadro resumen de la situación de cada uno de ellos:

#	ACTIVIDADES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS	DIFICULTADES
<b>CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL IDECOAS/FHIS Y FIPADEH PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES CON ACTORES RELEVANTES:</b> Porcentaje de ejecución Adendum No. 05: 70% Situación Actual: En ejecución Adendum No. 05: Modelo de Gestión y Mantenimiento ORMAG <b>Adendum de Tiempo: Mayo del 2020</b>				
1	<b>Proceso de Capacitación de las ORMAG barriales de los tres Municipios, en el Modelo de Gestión, mantenimiento y operación</b>	Se desarrollaron 5 módulos de capacitación enfocados en el Modelo de Gestión, Mantenimiento y Gestión:  <b>Módulo I:</b> Realidad Nacional, Proyecto CONVIVIR y conformación de la ORMAG-Municipal y Barrial. <b>Módulo II:</b> Organización Comunitaria (Liderazgo y Normas parlamentarias) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración de Mapas Parlane.</li> <li>• Elaboración de los FODAS de las ORMAG-Barriales</li> </ul> <b>Módulo III:</b> Elaboración del Plan de gestión, revitalización, operación y mantenimiento. <b>Módulo IV:</b> Operación, mantenimiento y Gestión de Riesgo <b>Módulo V:</b> Administración, controles básicos, compras y contrataciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 líderes comunitarios (Miembros de ORMAG Municipales) capacitados en el Modelo de Gestión y Mantenimiento enfocado en la sostenibilidad y funcionamiento de los Proyectos construidos por el Programa.</li> <li>• 15 jornadas de Capacitación-desarrolladas en los tres municipios del Programa (5 por municipio), para trasladar los conocimientos básicos en el mantenimiento y sostenibilidad de los proyectos del Programa.</li> <li>• Insumos para los documentos de Planes de revitalización de espacios públicos</li> </ul>	Contar con la disponibilidad de tiempo de los participantes para el proceso de capacitación , se buscaron horarios disponibles para los participantes, se realizaron las actividades por la tarde noche
2		Legalización y personería jurídica de las ORMAG – MUNICIPAL : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento legal por un profesional especializado para este tema en los despachos correspondientes de Gobernación.</li> </ul>		
3	<b>b. Pendiente de revisar Metodología PEC Módulos del bloque 2.</b>	Se desarrollaron las siguientes actividades con las ORMAG Municipales:  1. Capacitación para la formulación de los estatutos de las ORMAG Municipales de Siguatepeque, Gracias y La lima. Se realizó un evento de retiro  2. Jornadas de trabajo con cada municipio para la elaboración del reglamento de funcionamiento de la ORMAG		

#	ACTIVIDADES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS	DIFICULTADES
		Se revisaron nuevamente los módulos del Bloque 1 de la Metodología PEC, al igual que realizar los cambios correspondientes por los cambios de nombres institucionales y de logos		
<p><b>CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL IDECOAS/FHIS Y EL CENET PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD JUVENIL</b></p> <p>Porcentaje de ejecución: 50% (Tentativo)</p> <p><b>Adendum de Tiempo (Mayo 2020)</b></p>				
01	Revisión de los documentos de la Estrategia de Empleabilidad, análisis de contexto y Oportunidades productivas de los 3 municipios	Se realizó una serie de reuniones entre los equipos de SEDECOAS y el CENET para coordinar las acciones de ejecución de Convenio entre SEDECOAS	3 documentos de estrategia de empleabilidad juvenil revisados 3 documentos de Oportunidades productivas revisados 3 documentos de Análisis de contexto económico de los municipios revisados	Los informes presentados para el Municipio de la Lima tienen mucha debilidad en el diagnóstico e investigación a profundidad de la realidad económica del municipio, por lo tanto es un documento que aún está en proceso de definición. Se identificó debilidad en los procesos de coordinación a nivel institucional, de igual manera los componentes operativos como los Diplomados en facilitación de la inserción laboral, la estrategia de emprendimiento de jóvenes en Kioscos aun esta sin ejecutarse., al igual que la aprobación de la Estrategia de Empleabilidad por la Corporación Municipal.
	Gira de remisión de observaciones de técnicos municipales para la revisión de la estrategia y documentos soporte. Reuniones con el equipo técnico de SEDECOAS y CENET para reorganizar cronograma de trabajo de los tres municipios.	Se realizó una gira de remisión de observaciones de la estrategia de empleabilidad en los tres municipios del Programa, con la participación de los equipos técnicos municipales		
<p><b>CONVENIO DE COOPERACION ENTRE E IDECOAS/FHIS Y LA FUNDACION ANED PARA E DESAROLO DE LA SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS DEL PROGRAMA Y EL LINEA DE BASE FASE CUATRO:</b></p> <p><b>Adendum de Tiempo: 30 de Marzo 2020</b></p> <p>% de ejecución 80%</p>				
4	<p><b>Fundacion ANED.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión a profundidad del informe de sistematización</li> <li>Revisión a profundidad de las historias de éxito de los 15 jóvenes de los municipios.</li> <li>Revisión a profundidad de los videos</li> <li>Gira de socialización de resultados de línea de base y revisión a</li> </ul>	En esta etapa se realizaron revisiones a profundidad en oficina de parte del equipo de SEDECOAS de todos los productos remitidos por ANED, de igual manera se realizaron revisiones de dos versiones más de la Sistematización proceso que aún está pendiente de mejorar, en el mes de diciembre se definieron estrategias para mejorar el documentos ya que no reunía las	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un Documento de Línea de Base revisado y validado en los 3 municipios</li> <li>50 personas participaron en la socialización de la línea base en los municipios, 27 en Gracias, 8 en la lima, 15 en Siguatepeque.</li> </ul>	Las mayores dificultades se han encontrado en el documento final de sistematización, ha sido compleja la comprensión del programa, con los cambios de coordinación de este proceso de parte de ANED al igual que la no disposición de tiempo completo para terminar con dicho proceso



#	ACTIVIDADES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS	DIFICULTADES
	profundidad de datos, al igual que verificación final.	condiciones finales esperadas por el Programa. Referente a la revisión de la Línea base se realizó una gira por los 3 municipios, y se obtuvo las revisiones finales de los documentos, los técnicos municipales colaboraron en enviar los datos verificables finales, en total participaron 50 personas de las socializaciones Historias de Éxito: Se realizó la tercera revisión de las Historias de Éxito, y una reunión directa con la consultora, la tercera versión ha sido mejorada considerablemente.		
5	<b>Seguimiento de la cafetería Café de La Lima en reuniones en la Lima Elaboración del Plan de Negocios conjuntamente con el equipo municipal. Adendum de tiempo al contrato del Consultor al 30 de mayo del 2020</b>	Se realizó una jornada de dos días con el equipo técnico municipal para trabajar a profundidad el Plan de Negocios de la Cafetería Café y definir la estrategia de mercadeo de la cafetería	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un borrador de Plan de negocios de la cafetería Café,</li> <li>• Voluntad política de parte del alcalde con la asignación de alrededor de L.800.000.00 para el Plan de Negocios de la Cafetería Café.</li> </ul>	La mayor dificultad se ha encontrado en la compra del equipamiento especializado para barismo, ya que en el país no se encuentran con proveedores que brinde todos los requerimientos para barismo al igual que el seguimiento optimo a este tipo de equipamiento
6	Diseño de la Estrategia de sostenibilidad de las Casa de la Cultura de Siguatepeque y Gracias. Proceso de adjudicación de un consultor especialista en Gestión cultural	Se realizó el proceso de selección del consultor especializado en el área de Gestión Cultural, quedando como propuesta ganadora la del Lic. Mario Hernán quien ha sido Director de la dirección de Cultura de la UNAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjudicación del Proceso de consultoría.</li> <li>• Afinación de cronograma de trabajo para dar inicio en los municipios.</li> </ul>	_____

## **CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)**



### ✓ **Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a Través de las Energías Renovables (PODER)**

#### **i. Objetivo General**

El Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a través de las Energías Renovables (PODER), tiene como objetivo principal, mejorar las condiciones de vida del sector rural de Honduras más pobre del país. La falta de energía limita las oportunidades económicas y las opciones alimenticias disponibles en los hogares hondureños. Sin energía, familias rurales no tienen la capacidad de refrigerar y almacenar alimentos nutritivos, operar sistemas de irrigación y llevar a cabo procesos que les de valor agregado para generar ingresos adicionales, o incluso que les permita finalizar las tareas escolares por la noche. La meta de esta Actividad es proporcionar acceso a energías renovables (incluyendo las tecnologías que pueden resultar en la entrega de energía eléctrica) a por lo menos 10,000 familias rurales de Honduras, aproximadamente 50,000 beneficiarios en el occidente de Honduras en comunidades de la iniciativa de Alimentando el Futuro del Gobierno de Estados Unidos, a través de los proyectos, y de esta manera abordar algunas de las causas fundamentales de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición.

#### **ii. Focalización**

Proyectos que mejoran la posibilidad para generar el ingreso de los residentes de las comunidades del área de influencia en los departamentos de La Paz, Lempira, Intibucá, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque.

#### **iii. Descripción del Proyecto**

Soluciones y tecnologías haciendo uso de las energías renovables orientados a la mejora de los procesos productivos logrando atacar las causas de pobreza e inseguridad alimentaria.

Actualmente se están ejecutando proyectos de construcción de secadoras solares tipo domo para pequeños productores de café, que a su vez son apoyados con asistencia técnica de otros implementadores de USAID como ser Alianza para el Corredor Seco (USAID –ACS). A su vez, se está construyendo un biodigestor para pequeñas cooperativas de café, y están listos para iniciar cinco proyectos de Centros de Entrenamiento para Energías Renovables, un Centro de Educación en Nutrición y cinco secadoras solares industriales y entre otros.

**iv. Monto del Convenio**

Los fondos destinados para la ejecución de este Programa es de 29.04 millones de lempiras para el año 2019. Estos fondos son donación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

**v. Avance Financiero**

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2015	10.860.882,00	9.750.284,62	89,77%
2016	16.406.200,00	16.406.199,26	100,00%
2017	22.636.218,00	22.589.168,01	99,79%
2018	20.820.000,00	20.819.999,68	100,00%
2019	30.909.703,00	30.909.703,00	100,00%

**vi. Avance por Sector**

SECTOR	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios Directos 2019
ENERGIA RENOVABLE	13	18.429.609,26	1.174	4.591
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>18.429.609,26</b>	<b>1174</b>	<b>4.591</b>

**vii. Avance por Departamento**

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios directos 2019
COPAN	1	791.728,61	0	589
INTIBUCÁ	4	9.003.926,75	1.152	1.205
LA PAZ	1	2.200.000,00	0	2.538
LEMPIRA	5	3.901.801,34	0	119
SANTA BARBARA	2	2.532.152,56	22	140
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>18.429.609,26</b>	<b>1.174</b>	<b>4.591</b>

**viii. Otras Inversiones**

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2019
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	1.962.709,36
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	10.517.384,38
<b>TOTAL</b>	<b>12.480.093,74</b>

## ix. Principales Logros (Octubre a Diciembre de 2019)

### EJECUCIÓN DE PROYECTOS:

Se ejecutaron todos los proyectos planificados para este trimestre. El proyecto realiza su cierre operativo el 31 de Diciembre de 2019.

- Terminados 16 sistemas de riego y 35 proyectos de energía renovable.

No.	Tipo de Proyecto	Ubicación	Status	% de Ejecución
1	Sistema de riego	San Antonio del Norte, San Antonio del Norte, La Paz	Finalizado	100%
2	Sistema de riego	Grupo Mixto, Azacualpa, Yamaranguila, Intibucá	Finalizado	100%
3	Sistema de riego	Togopala, Intibucá, Intibucá	Finalizado	100%
4	Sistema de riego	Las Mesas, Yamaranguila, Intibucá	Finalizado	100%
5	Sistema de Riego	El Tablón, Yamaranguila, Intibucá	Finalizado	100%
6	Sistema de Riego	Los Olivos, Yamaranguila, Intibucá	Finalizado	100%
7	Sistema de Riego	La Rinconada, Intibucá, Intibucá	Finalizado	100%
8	Sistema de Riego	Las Lagunas, Intibucá, Intibucá	Finalizado	100%
9	Sistema de Riego	Las Quebradas, Yamaranguila, Intibucá	Finalizado	100%
10	Sistema de Riego	Belén, Intibucá, Intibucá	Finalizado	100%
11	Sistema de Riego	Panina, Intibucá, Intibucá	Finalizado	100%
12	Sistema de Riego	El Cerrón, Cabañas, La Paz	Finalizado	100%
13	Secadoras solares tipo domo para pequeños productores	Departamento de Ocotepeque	Finalizado	100%
14	Secadoras solares tipo domo para pequeños productores	Departamento de Copán	Finalizado	100%
15	Estufas mejoradas en el Departamento de Copán	Departamento de Copán	Finalizado	100%
16	Estufas mejoradas en el Departamento de Santa Bárbara	Departamento de Santa Bárbara	Finalizado	100%
17	Estufas mejoradas en el Departamento de Ocotepeque	Departamento de Ocotepeque	Finalizado	100%
18	Estufas mejoradas en el Departamento de Lempira	Departamento de Lempira	Finalizado	100%
19	Estufas mejoradas en el Departamento de Intibucá	Departamento de Intibucá	Finalizado	100%
20	Estufas mejoradas en el Departamento de La Paz	Departamento de La Paz	Finalizado	100%
21	Proyecto de secadoras solares y eco-estufas para pequeños productores de café	Departamento de La Paz e Intibucá	Finalizado	100%
22	Secadoras solares tipo domo para pequeños productores	Departamento de Santa Bárbara	Finalizado	100%



23	Secadoras solares tipo domo para pequeños productores	Departamento de Copán	Finalizado	100%
24	Secadoras solares tipo domo para pequeños productores	Departamento de Ocotepeque	Finalizado	100%
25	Secadoras solares tipo domo para pequeños productores	Departamento de La Paz	Finalizado	100%
26	Riego por Goteo Nueva Yamalá	Nueva Yamalá, San Luis, Santa Bárbara	Finalizado	100%
27	Riego por Goteo Las Flores	Las Flores, Colomoncagua, Intibucá	Finalizado	100%
28	Sistema de Riego Fase II	Panina, Intibucá, Intibucá	Finalizado	100%
29	Sistema de riego Fase II	Togopala, Intibucá, Intibucá	Finalizado	100%
30	Estufas mejoradas varias comunidades	Departamento de Copán	Finalizado	100%
31	Estufas mejoradas varias comunidades	Departamento de Santa Bárbara	Finalizado	100%
32	Estufas mejoradas varias comunidades	Departamento de Ocotepeque	Finalizado	100%
33	Estufas mejoradas varias comunidades	Departamento de Lempira	Finalizado	100%
34	Estufas mejoradas varias comunidades	Departamento de Intibucá	Finalizado	100%
35	Estufas mejoradas varias comunidades	Departamento de La Paz	Finalizado	100%
36	Secadoras solares tipo domo para pequeños productores en Jesús de Otoro, Intibucá	Jesús de Otoro, Intibucá	Finalizado	100%
37	Centro de Entrenamiento Nutricional	El Portillo, Yamaranguila, Intibucá	Finalizado	100%
38	Centro de Entrenamiento Nutricional	Azacualpa, Yamaranguila, Intibucá	Finalizado	100%
39	Microgeneración en sistema de riego por goteo – Llanito Verde	Llanito Verde, Lempira	Finalizado	100%
40	Sistema de biodigestión a partir de residuos de café en la Cooperativa Montaña Verde	San Luis, Santa Bárbara	Finalizado	100%
41	Secadoras solares tipo Domo para pequeños productores (121)	Gracias, Lempira	Finalizado	100%
42	Secadoras solares tipo Domo para pequeños productores (85)	Santa Bárbara, Santa Bárbara	Finalizado	100%
43	Centro de Entrenamiento y Capacitación en Energías Renovables	Lepaera, Lempira	Finalizado	100%
44	Secadoras solares tipo Domo para pequeños productores	Intibucá, Intibucá	Finalizado	100%
45	Sistemas solares domiciliarios	Carrizalito y Valle de la Cruz	Finalizado	100%
46	Proyecto de secadoras solares industriales en el Departamento de Intibucá	Departamento de Intibucá	Finalizado	100%
47	Proyecto de secadoras solares tipo domo en el Departamento de Intibucá	Departamento de Intibucá	Finalizado	100%
48	Centro de Entrenamiento y Capacitación de Energía	Cucuyagua, Copán	Finalizado	100%

	Renovables - Cucuyagua, Cucuyagua, Copán			
49	Centro de Entrenamiento y Capacitación de Energía Renovables - Jesús de Otoro, Otoro, Intibucá	Jesús de Otoro, Otoro, Intibucá	Finalizado	100%
50	Centro de Entrenamiento Nutricional (CEN) Semané, Yamaranguila, Intibucá	Semané, Yamaranguila, Intibucá	Finalizado	100%
51	Kits tecnológicos para Centros de Entrenamiento Nutricional	Intibucá/La Paz/Lempira	Finalizado	100%

**x. Actividades relevantes en el período**

Se ejecutaron todos los proyectos planificados y el proyecto PODER fue finalizado al 30 de septiembre del 2019.

**xi. Problemática en la ejecución**

Se tuvieron atrasos en la ejecución en vista que la exoneración fue dada hasta el mes de junio del 2019, en ese momento se reactivaron procesos de compra, proyectos, entre otros.

Acciones realizadas por la DIM:

La Dirección de Infraestructura Mayor aumentó los frentes de trabajo en los proyectos.

## ✓ Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)

### i. Objetivo General

El propósito de esta Actividad es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

### ii. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en las cinco municipalidades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Tela y La Ceiba. Las comunidades específicas de intervención serán identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

### iii. Descripción del Proyecto

Esta Actividad ayudará al GdeH (representado a través de FHIS) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otras partes interesadas. La Actividad incluye dos resultados complementarios: Resultado 1: Mejora de la infraestructura comunitaria, las actividades responderán a las prioridades de infraestructura comunitaria para abordar la seguridad ciudadana. Resultado 2: Aumento de la cohesión comunitaria, considera que la forma en que las intervenciones de infraestructura son concebidas, diseñadas y ejecutadas pueden desempeñar un papel directo en el aumento de la cohesión social y comunitaria y promover un marco holístico de prevención de la violencia. Los proyectos bajo la Actividad incluirán instalaciones educativas, centros de salud, alumbrado público, espacios comunitarios más seguros, centros de alcance y comunitarios, centros vocacionales, jardines comunitarios, parques, espacios recreativos, paradas de buses, accesos peatonales, mejoras al alumbrado de calles, señalización, instalaciones para el sector seguridad y justicia, así como otros proyectos de infraestructura de pequeña escala que se acuerde entre las Partes.

#### iv. Monto del Convenio

Presupuesto total estimado: \$14,637, 541.74, de los cuales, fondos de donación de USAID: \$11, 710,033.39; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$ 2, 927,508.35 (efectivo: \$ 2,127,508.35 y especies: \$ 800,000.00).

#### v. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	23.226.555,00	21.906.553,68	94,32%
2019	60.781.669,00	60.781.669,00	100,00%

#### vi. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios Directos 2019
INFRAESTRUCTURA VIAL	2	5.702.760,73	28	8.936
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	4	17.221.659,97	49	1.647
EDUCACION	6	20.219.661,30	132	5.767
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>43.144.082,00</b>	<b>209</b>	<b>16.350</b>

#### vii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios directos 2019
ATLANTIDA	4	22.988.781,68	108	5.072
CORTES	6	10.711.906,40	59	10.908
FRANCISCO MORAZAN	2	9.443.393,92	42	370
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>43.144.082,00</b>	<b>209</b>	<b>16.350</b>

#### viii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2019
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	5.187.517,00
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	12.450.070,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.637.587,00</b>

## ix. Principales Logros (Octubre a Diciembre 2019)

### A. PROYECTOS EJECUTADOS:

A continuación se presentan los proyectos ejecutados y en ejecución:

No.	Tipo de Proyecto	Ubicación	Monto del Proyecto	Status
1	CEB Miguel Paz Barahona	Sector Bonitillo, La Ceiba	L. 100,396.80	Cierre Financiero
2	CEB Carlos Rivera López	Colonia Central, Sector Rivera Hernández, San Pedro Sula	L. 2,577,284.86	Cierre Financiero
3	CEB Marco Antonio Ponce	La Ceiba, Atlántida	L. 4,823,387.33	Cierre Financiero
4	Mejoras Instituto Triunfo de la Cruz	Col. San Alejo, Tela	L. 974,243.14	Cierre Financiero
5	Mejoras Instituto Triunfo de la Cruz Fase II	Col. San Alejo, Tela	L. 778,230.40	En Ejecución
6	CEB José Antonio Peraza	Col. 6 de Mayo, Sector Rivera Hernández, San Pedro Sula	L.2,431,860.79	Cierre Financiero
7	Instituto Reynaldo Narváez	M.D.C. Francisco, Morazán	L. 2,030,936.05	En Ejecución
8	Reparación Claudio Barrera	La Ceiba, Atlántida	L. 1,498,331.80	En Ejecución
9	Reparación Marco Aurelio Soto	Tela, Atlántida	L. 759,916.90	En Ejecución
10	Reparación Antonio Jose Coello	Tela, Atlántida	L. 942,212.26	En Ejecución
11	Kínder Miriam Lobo	La Ceiba, Atlántida	L. 2,106,320.61	En Ejecución
12	Escuela Ramón Montoya	La Ceiba, Atlántida	L. 904,752.61	En Ejecución
13	CEB Alfonso Lacayo	SPS, Cortés	L. 1,701,952.03	En Ejecución
14	CDA Las Ayestas	M.D.C. Francisco, Morazán	L. 1,227,969.78	Cierre Financiero
15	CDA Estados Unidos	M.D.C. Francisco, Morazán	L. 2,398,553.51	Cierre Financiero
16	CDA Mercedes	La Ceiba, Atlántida	L. 818,184.36	En Ejecución
17	CDA Arenales	SPS, Cortés	L. 919,553.51	En Ejecución
18	Pavimentación Calle Principal Col. Lopez Arellano (Ruta Segura)	Sector López Arellano, Choloma	L. 2,980,291.32	Cierre Financiero
19	Pavimentación Calle Principal hacia los juzgados (Ruta Segura)	Col. La Granja 1 y 2, Choloma	L. 2,722,469.41	Cierre Financiero
20	Centro Integral Corozal	La Ceiba, Atlántida	L. 3,152,701.83	En Ejecución
21	Casa Alizana	M.D.C. Francisco, Morazán	L. 3,724,221.27	Cierre Financiero
22	Ruta Segura Nueva Suyapa	M.D.C. Francisco, Morazán	L. 2,220,713.31	En Ejecución
23	Construcción Posta Policial de Bonitillo	La Ceiba, Atlántida	L. 3,578,634.33	Cierre Financiero
24	Construcción y Ampliación CEIN	La Ceiba, Atlántida	L 1,340,127.72	En Ejecución
<b>TOTAL EJECUTADO</b>			<b>L. 43,144,082.00</b>	

**x. Actividades relevantes en el período**

Los fondos nacionales y de fuente externa del programa fueron ejecutados al 100% por el programa, sumando un total de L. 60,781,669.00.

**Acciones realizadas por la DIM:**

La Dirección de Infraestructura Mayor gestionó ante SEFIN a la Tesorería General de la República para obtener el apoyo de que las cuotas se transfieran con los montos solicitados.

✓ **Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)**

**i. Antecedente**

Las pobres condiciones sociales y económicas son especialmente pronunciadas en el occidente de Honduras, extrema pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático, bajos niveles educativos, migración, falta de acceso a los servicios básicos y otros retos socioeconómicos son endémicos. La provisión de servicios básicos de educación y nutrición son escasos en la zona de occidente y es difícil el acceso a los ya existentes, así mismo la gestión de servicios de educación, nutrición y agua y saneamiento son deficientes por lo que los ciudadanos cuentan además con pocos espacios de participación para mejorar sus vidas a nivel de hogar y sus vidas productivas, lo que genera una gran brecha de pobreza.

En este sentido se busca a través de proyectos de infraestructura de pequeña escala, la generación de accesos para la comunidad a espacios de participación que sirvan como plataforma para impulsar el desarrollo sostenible de la región, logrando satisfacer necesidades no satisfechas de algunos de los servicios básicos para generar un efecto multiplicador en la zona occidental del país.

Actualmente, la **AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID)** en apoyo al Gobierno de Honduras, ha asignado fondos de donación para la ejecución de proyectos de infraestructura a través de la **SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO, FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (SEDECOAS/FHIS)**, que vengán a mejorar las condiciones en las comunidades seleccionadas en el occidente de Honduras.

En base a lo anterior, surge la Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras, mediante la cual se ha considerado proveer esfuerzos de infraestructura a pequeña escala para mejorar la entrega de servicios a la población, mejorando condiciones de pobreza, vulnerabilidad al cambio climático, bajos niveles educativos e inseguridad alimentaria debido a la falta de acceso a servicios básicos. A su vez con esto se pretende crear una plataforma de participación ciudadana para cimentar las bases de una estructura comunitaria más efectiva, jugando un rol importante en la mejora de la entrega de servicios locales en el Occidente de Honduras.- El área de intervención será enfocada en las zonas de mayor pobreza, específicamente está orientada a seis departamentos del Occidente de Honduras.

Se ha planteado como meta beneficiar comunidades ubicadas en los seis departamentos de la zona de occidente de Honduras, su mayoría de la zona rural, habitantes en comunidades que presentan condiciones de pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático, bajos niveles educativos, migración y falta de acceso a servicios público.

La administración y ejecución de la Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH), financiado con fondos USAID, estará a cargo del SEDECOAS/FHIS, a través de la Dirección de Infraestructura Mayor (DIM).

## ii. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en los departamentos de Ocotepeque, la Paz, Copan, Intibucá, Santa Bárbara y Lempira y zonas occidentales específicas de intervención identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

## iii. Monto del Convenio

Se acaba de incorporar al Presupuesto General de la República L. 6,190,560.00, que se logró con los fondos de contrapartida del Gobierno.

## iv. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2019	6.190.650,00	5.981.569,54	96,62%

## v. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios Directos 2019
EDUCACION	0	4.891.544,00	23	471
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>4.891.544,00</b>	<b>23</b>	<b>471</b>

**vi. Avance por Departamento**

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2019	Mto. Ejecutado 2019	Empleos Generados 2019	Beneficiarios directos 2019
INTIBUCÁ	0	1.899.580,56	10	248
LA PAZ	0	1.194.035,45	13	79
OCOTEPEQUE	0	1.797.927,99	0	144
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>4.891.544,00</b>	<b>23</b>	<b>471</b>

**vii. Otras Inversiones**

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2019
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	471.775,55
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	618.249,99
<b>TOTAL</b>	<b>1.090.025,54</b>

**viii. Principales Logros (Octubre a diciembre, 2019)**

**A. PROYECTOS FINALIZADOS**

A la fecha no se reportan proyectos finalizados en vista que iniciaron en el último trimestre del 2019.

**B. PROYECTOS A INICIAR**

A continuación se presentan los proyectos en proceso previo a ejecución:

No.	Tipo de Proyecto	Ubicación	Monto del Proyecto	Status
1	Ampliación Centro de Educación Básica Mariano Martinez	Valle de Ángeles, Opatoro, La Paz	L 5.500.000,00	Formulado, pendiente dar inicio
2	Ampliación Escuela Jose Cecilio Del Valle	Yaunera, San Pedro, Copán	L 2.100.000,00	Formulado, pendiente dar inicio
3	Reposición Escuela Nueva Generación Sur	La Estancia, Santa Ana, La Paz	L 2.500.000,00	Formulado, pendiente dar inicio
4	Ampliación Centro De Educación Básica Tiburcio Carias Andino	Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro, Intibucá	L 5.600.000,00	Formulado, pendiente dar inicio
5	Construcción Letrinas de Cierre Hidráulico en Comunidades Varias	Comunidades Varias, Nuevo Celilac, Santa Bárbara	L 5.600.000,00	Formulado, pendiente dar inicio
6	Ampliación Escuela José Olivo Tercero	El Descansadero, San Nicolás, Santa Bárbara	L 2.000.000,00	Formulado, pendiente dar inicio
7	Ampliación Centro de Salud Rural (CESAR) ARCAMON	Arcamon, San Marcos de Caiquín, Lempira	L 2.500.000,00	Formulado, pendiente dar inicio
8	Reposición Escuela Ramón Amaya Amador	Planes Arriba, Cucuyagua, Copán	L 2.800.000,00	Formulado, pendiente dar inicio
9	Ampliación Escuela Eusebio Amaya Gomez	La Puerta, Belén, Lempira	L 5.700.000,00	Formulado, pendiente dar inicio

10	Ampliación Centro de Educación Básica Prudencio Arita	Llano Largo, La Labor, Ocotepeque	L 5.550.000,00	Formulado, pendiente dar inicio
11	Ampliación Escuela Luis Alonzo Ayala	La Meande, San Manuel de Colohete, Lempira	L 5.200.000,00	Formulado, pendiente dar inicio
<b>TOTAL PROYECTOS POR INICIAR</b>			<b>L. 45,050,000.00</b>	

### C. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

A continuación se presentan los proyectos en ejecución:

No.	Tipo de Proyecto	Ubicación	Monto del Proyecto	Status
1	Ampliación Centro de Educación Básica Alvaro Contreras	Aldea Azacualpa, Sensenti, Ocotepeque	L 4.494.819,97	8% avance físico
2	Ampliación Centro de Educación Básica Francisco Morazán	Planes, Yamaranguila, Intibucá	L 4.748.951,39	19% avance físico
3	Reposición Escuela Unión Y Fe	Cerro Bueno, San José, La Paz	L 3.618.292,58	0% avance físico, proyecto dio inicio el 19 de diciembre del 2019, según orden de inicio.
<b>TOTAL PROYECTOS</b>			<b>L. 12, 862,063.94</b>	

#### ix. Actividades relevantes en el período

Se tuvo que hacer un cambio en las líneas presupuestarias de SEFIN para poder aumentar los fondos para inversión.

#### Acciones realizadas por la DIM:

La Dirección de Infraestructura Mayor gestionó ante SEFIN a la Tesorería General de la República para hacer el respectivo cambio aumento de presupuesto en la línea de inversión.
