



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
(SEDECOAS/FHIS)

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan
Operativo Anual POA-Presupuesto

I Trimestre 2020



Indicé

Introducción.....	3
Antecedentes	3
Misión:.....	4
Visión:.....	4
Valores:	4
Resumen Ejecutivo.....	5
Situación Actual de los Programas:.....	6
Proyectos FHIS.....	7
Ejecución Presupuestaria por Programas 2020	8
Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2020.....	9
Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Cuarto Trimestre 2020	10
Ejecución Gasto Operativo Primer Trimestre del 2020	11
Cuadro por Sector 2020 (Ejecutado).....	13
CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14
✓ Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)	14
CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA.....	22
✓ Proyecto de Infraestructura Rural BCIE	22
CARTERA KfW Entwicklungsbank.....	29
✓ Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V	29
✓ Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)..	34
CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)44	
✓ Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS).....	44
✓ Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)	49



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS

Introducción



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS

El presente informe es la recopilación de las actividades e inversiones realizadas por el SEDECOAS/FHIS durante el primer trimestre de 2020.

Antecedentes

De acuerdo al Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-056-2019 se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), la cual debe de promover el Desarrollo Comunitario por medio de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos, en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerables de Honduras quien para el desarrollo de sus funciones debe contar con una Subsecretaría de Estado.

Se adscribe a dicha Secretaría de Estado, El Instituto Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS).

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es un organismo Desconcentrado de la Presidencia de la República, creado el 22 de febrero de 1990 y extendida su vida legal hasta el año 2022 según decreto No. 222-2010 cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados, en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social y/o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Asimismo, asesorará a los gobiernos locales con respecto a los procesos de captación de recursos de las fuentes de financiamiento nacionales y/o externas y las asiste en la transferencia de las capacidades técnicas y administrativas, para convertir a estos gobiernos locales en administradores eficientes de sus programas y proyectos, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Nación en aplicación del principio de Descentralización.

Misión:

“Somos una Institución estatal, desconcentrada, técnica y captadora de recursos que promueve el desarrollo local sostenible, participativo e incluyente mediante el fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, en alianza con socios estratégicos para desarrollar obras de infraestructura y proyectos de orientación social de acuerdo al plan de nación y visión de país de forma transparente y eficiente, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable de Honduras”.

Visión:

“Ser para el año 2022, la Institución líder en gestión y fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, para la ejecución de proyectos, que contribuya equitativamente al desarrollo sustentable nacional”.

Valores:

- **Ética:** Ejercicio de las funciones con sujeción a las normas morales que promuevan la confianza de la población hondureña.
- **Integridad:** Actuación sustentada en la honradez, prudencia, entereza, rectitud y firmeza.
- **Compromiso:** Ejecución de proyectos que coadyuven al desarrollo local.
- **Transparencia:** Amplia difusión de información sobre nuestras actuaciones. Rendición de cuentas ante la sociedad.
- **Lealtad:** Actuar con fidelidad y rectitud hacia el FHIS y compañeros de trabajo, con el objetivo de identificarse con la institución.
- **Equidad:** El FHIS no hace distinción de credo, raza, de ninguna otra forma de discriminación humana.

Resumen Ejecutivo

SEDECOAS/FHIS, llega hasta los lugares más recónditos del país, para contribuir a mitigar las necesidades de la población más pobre y vulnerable a través de respuestas rápidas y concretas con proyectos de Agua y Saneamiento, Educación, Electrificación Rural, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural.

El presupuesto del FHIS para la gestión 2020 al 31 de marzo asciende a 862.7 Millones de Lempiras:

Fuente	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	% de Participación en el Presupuesto Vigente
BID	L. 134,871,251.00	L. 129,871,251.00	15%
BCIE	L. -	L. 5,000,000.00	1%
USAID	L. 210,905,387.00	L. 210,905,387.00	24%
GOH*	L. 525,792,513.00	L. 358,615,900.00	42%
KfW	L. 158,382,933.00	L. 158,382,933.00	18%
TOTAL	L. 1,029,952,084.00	L. 862,775,471.00	100%

* Incluye costo Operativo del FHIS



Situación Actual de los Programas:


1. Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), La programación en la ejecución de obras se verá afectada debido a la pandemia del coronavirus. Esta condición de fuerza mayor evidentemente afectará el plazo contractual de entrega de los proyectos en ejecución.
2. Programa Infraestructura Rural (BCIE), A partir del 16 de marzo del 2020, se han suspendidos todas las actividades dentro del SEDECOAS/FHIS por mandato del SINAGER, por lo que las empresas contratistas no pueden ingresar ningún documento de estimaciones de pago, hasta que el SEDECOAS indique cual será el mecanismo para honrar los compromisos ya entregados en los sitios de las obras, por lo tanto, el ingreso de documentación de cierre y presentación de estimaciones y pagos finales a las diferentes direcciones del SEDECOAS se mantienen paralizadas (proyectos Código 107196, 107181, 107182 y 105600).
3. Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE III y IV: La suspensión de los proyectos en campo debido a COVID 19, la poca asignación de cuota de compromiso en lo referente al gasto operativo lo cual limitó las actividades en el mes de febrero y marzo
4. Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR), Al cierre del período del periodo de enero a marzo del año 2020 la ejecución financiera del programa alcanza a un 3.95% Entre las razones más importantes para este porcentaje (%) de ejecución, es debido a que todo lo programado para el primer trimestre no culminó al final del periodo debido a la situación actual de la Pandemia del COVID-19, por lo que varios procesos y proyectos se suspendieron su ejecución hasta nuevo aviso.
5. Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS), Por el estado de emergencia a nivel nacional emitido mediante Decreto, se suspendió la ejecución de proyectos, lo que conllevó a una reprogramación de las actividades.
6. Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH): Las actividades de capacitación, ejecución física y financiera han sido suspendidas, por el toque de queda absoluto decretado por el Gobierno de la República por la Pandemia del COVID-19.

Proyectos FHIS

Fuente	Nombre del Proyecto	Nombre Corto	Sector	Modalidad Ejecucion
BID	Programa Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	PCCMB 4518/BL-HO	Infraestructura Social	Centralizados
BCIE	Proyectos de Infraestructura Rural	PIR BCIE 1736	Agua y Sanemiento, Eletrificacion y Caminos Rurales	Descentralizados/ Centralizados
KFW	Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar SE-FHIS FASE III y IV	PROMINE	Infraestructura Escolar	Descentralizados
	Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras	CONVIVIR	Infraestructura Social y Fortalecimiento de las Capacidades de los Jóvenes	Descentralizados
USAID	Programa de Infreestructura para la Seguridad Ciudadana	ICS	Recuperacion de espacio públicos e infraestructura escolar para la mejora de la seguridad ciudadana	PEC/Centralizados
	Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras	PIOH	Mejorar las condiciones de Infraestructura Básica para contribuir al desarrollo en el Occidente de Honduras.	PEC/Centralizados


Ejecución Presupuestaria por Programas 2020

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Monto Planificado I Trimestre	Devengado del I Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% Ejecución I Trimestre/ Planificado I Trimestre	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
Programa 1: Actividades Centrales	L. 525,792,513.00	L. 358,615,900.00	L. 89,653,975.00	L. 77,805,877.21	L. 77,805,877.21	L. 280,810,022.79	87%	22%
Programa 11: Infraestructura Rural	L. 65,583,096.00	L. 70,583,096.00	L. 10,735,648.00	L. -	L. -	L. 70,583,096.00	0%	0%
Programa 12: Infraestructura Escolar	L. 135,907,777.00	L. 135,907,777.00	L. 31,999,015.00	L. 22,649,504.26	L. 22,649,504.26	L. 113,258,272.74	71%	17%
Programa 14: Fomento al Desarrollo Local	L. 302,668,698.00	L. 297,668,698.00	L. 44,733,503.00	L. 10,467,869.73	L. 10,467,869.73	L. 287,200,828.27	23%	4%
TOTAL	L. 1,029,952,084.00	L. 862,775,471.00	L. 177,122,141.00	L. 110,923,251.20	L. 110,923,251.20	L. 751,852,219.80	63%	13%

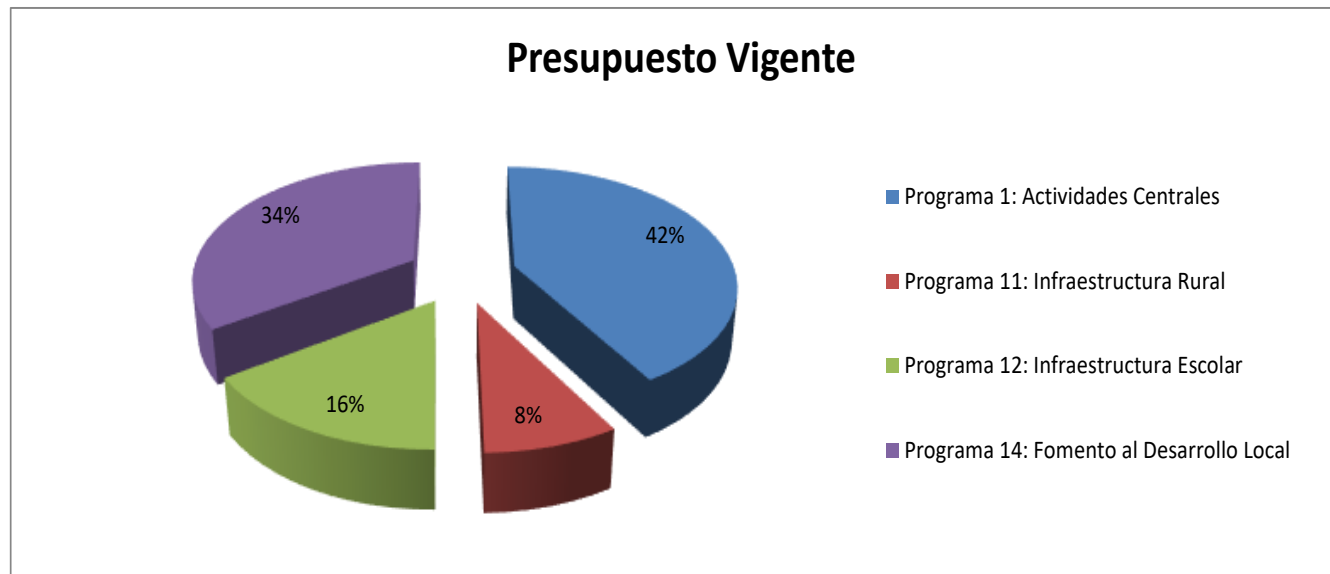


Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2020

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente 2020	Devengado del I Trimestre	Devengado Acumulado 2020	% Ejecución al I Trimestre / Presupuesto Vigente
Gasto Operativo/Gobierno	L. 525,792,513.00	L. 358,615,900.00	L. 77,805,877.21	L. 77,805,877.21	22%
Proyecto de Infraestructura Rural 1736-BCIE	L. -	L. 5,000,000.00	L. -	L. -	0%
Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras	L. 65,583,096.00	L. 65,583,096.00	L. -	L. -	0%
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar, KfW VIII	L. 135,907,777.00	L. 135,907,777.00	L. 22,649,504.26	L. 22,649,504.26	17%
Proyecto Convivencia y Especios Seguros para los Jovenes CONVIVIR	L. 22,475,156.00	L. 22,475,156.00	L. 887,266.08	L. 887,266.08	4%
Programa de Infreestructura para la Seguridad Ciudadana	L. 145,322,291.00	L. 145,322,291.00	L. 5,461,620.49	L. 5,461,620.49	4%
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	L. 134,871,251.00	L. 129,871,251.00	L. 4,118,983.16	L. 4,118,983.16	3%
TOTAL	L. 1,029,952,084.00	L. 862,775,471.00	L. 110,923,251.20	L110,923,251.20	13%

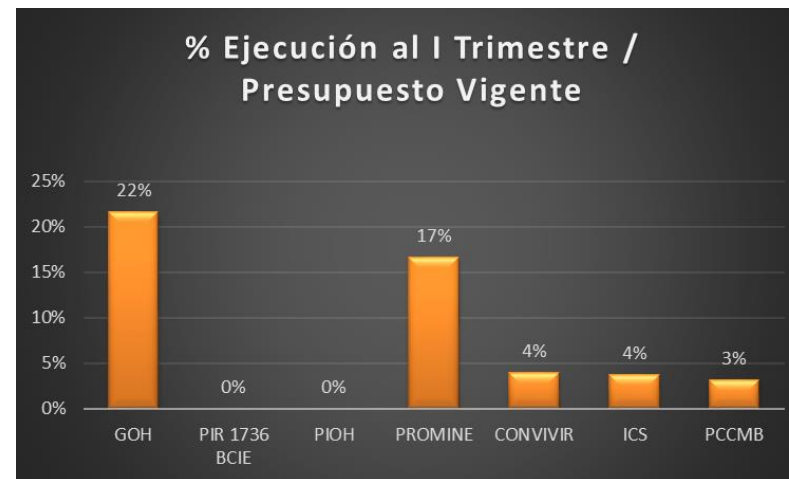

Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Cuarto Trimestre 2020

Grupo	Aprobado	Presupuesto Vigente por Grupo	Devengado I Trimestre	Devengado Acumulado al I Trimestre	Disponible	% Ejecución I Trimestre/ Presupuesto Vigente	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
SERVICIOS PERSONALES	L. 192,891,707.00	L. 153,715,094.00	L. 28,620,561.69	L. 28,620,561.69	L. 125,094,532.31	19%	19%
SERVICIOS NO PERSONALES	L. 121,548,289.00	L. 210,592,815.00	L. 44,965,118.42	L. 44,965,118.42	L. 165,627,696.58	21%	21%
MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 17,766,434.00	L. 18,221,908.00	L. 200,075.27	L. 200,075.27	L. 18,021,832.73	1%	1%
BIENES CAPITALIZABLES	L. 635,706,536.00	L. 478,201,536.00	L. 37,137,495.82	L. 37,137,495.82	L. 441,064,040.18	8%	8%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. 62,044,118.00	L. 2,044,118.00	L. -	L. -	L. 2,044,118.00	0%	0%
Total	L. 1,029,957,084.00	L. 862,775,471.00	L. 110,923,251.20	L. 110,923,251.20	L. 751,852,219.80	13%	13%

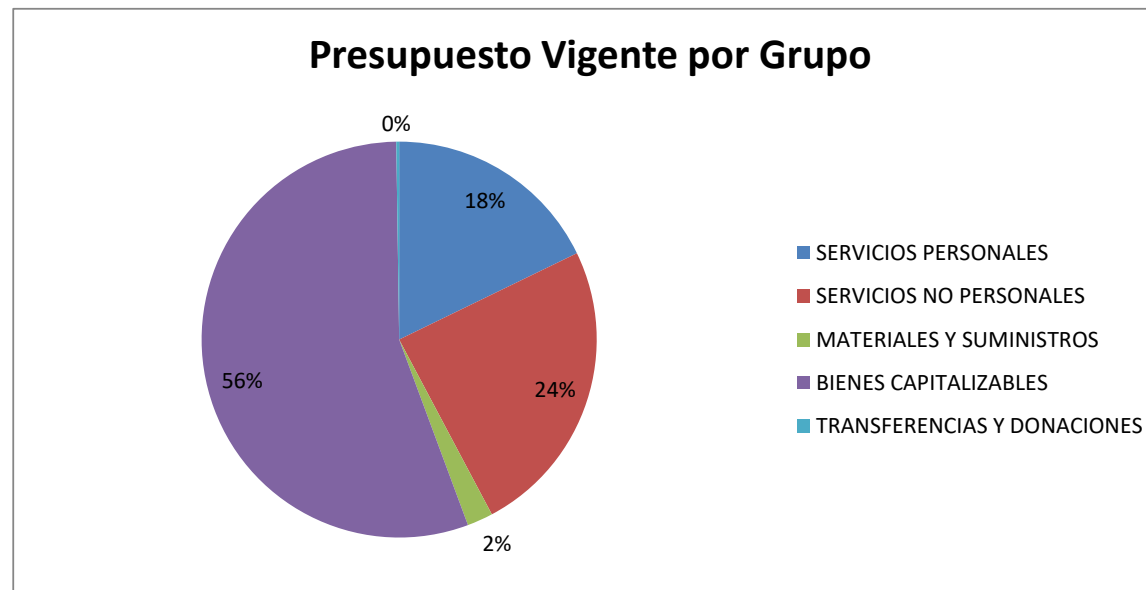



Ejecución Gasto Operativo Primer Trimestre del 2020

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
1100	Sueldos Básicos	18,480,936.00	4,448,612.74	165,1594.76
11400	Adicionales	1,540,078.00	454,301.73	788,502.53
11510	Decimotercer Mes	1,540,078.00	4,909.17	1382346.61
11520	Decimocuarto Mes	1,540,078.00	202,855.56	124483162
11600	Complementos	1,245,043.00	586,873.47	0.86
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	2,679,737.00	650,489.66	1,723,442.34
11750	Contribuciones para Seguro Social	669,713.00	146,584.30	480,811.90
12100	Sueldos Básicos	37,800,485.00	4,498,384.53	28081827.45
12410	Decimotercer Mes	3,150,041.00	335,107.85	2385803.76
12420	Decimocuarto Mes	3,150,041.00	812,901.63	2100805.37
12550	Contribuciones para Seguro Social	2,274,110.00	316,136.44	1,755,721.32
16200	Compensaciones	1,951,987.00	0.00	1951987.00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
26110	Pasajes Nacionales	84,189.00	0.00	35933.61
27500	Gastos Judiciales	70,000,000.00	35,000,000.00	35000000.00
29100	Ceremonial y Protocolo	300,000.00	148,300.00	1700.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000,000.00	11,309,822.20	38690177.80
1100	Sueldos Básicos	19,836,384.00	4,325,126.28	13820138.82
11400	Adicionales	1,653,032.00	237,391.91	1210,422.61
11510	Decimotercer Mes	1,653,032.00	1,226.51	1,541,137.30
11520	Decimocuarto Mes	1,653,032.00	249,537.47	1320171.15
11600	Complementos	1,343,986.00	332,413.92	0.51
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	2,876,279.00	636,644.34	2108097.40
11750	Contribuciones para Seguro Social	1,146,758.00	242,500.70	844865.30
21200	Agua	37,009.00	3,200.00	33809.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	25,000.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	900,000.00	178,026.50	121,973.50
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	100,000.00	0.00	44,300.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	0.00
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	25,000.00	0.00	0.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	25,000.00	0.00	0.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	0.00	50000.00
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	100,000.00	0.00	50000.00
24300	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	25000.00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	2,452,800.00	710,333.33	2466.67
24500	Servicios de Capacitación	86,600.00	0.00	43300.00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	75,000.00	0.00	0.00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	15,500,000.00	500,000.00	14000000.00
25100	Servicio de Transporte	12,000.00	1,820.00	4180.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,165,300.00	313,047.25	234575.75
25400	Primas y Gastos de Seguro	2,013,551.00	131,426.44	813950.56
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	190,404.00	33,810.00	61,392.00

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
27210	Tasas	154,262.00	0.00	77132.00
3110	Productos Alimenticios Y Bebidas	190,946.00	52,828.63	189.37
33100	Productos De Papel Y Cartón	139,734.00	0.00	9419.16
33700	Especies Timbradas y Valores	38,030.00	0.00	19016.00
35620	Diesel	392,000.00	33,866.00	136785.90
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	161,000.00	1,109.22	39390.78
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	84,000.00	238.00	21762.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	690.93	49,309.07
39600	Repuestos y Accesorios	651421.00	8062.82	69767.18
51220	Ayuda Social a Personas	72,540.00	0.00	36270.00
11100	Sueldos Básicos	4,198,800.00	1,012,396.86	2993066.34
11400	Adicionales	349,900.00	92,696.94	257203.06
11510	Decimotercer Mes	349,900.00	0.00	349900.00
11520	Decimocuarto Mes	349,900.00	9,257.50	340642.50
11600	Complementos	283,000.00	74,155.77	0.23
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	608,826.00	145,246.50	463,579.50
11750	Contribuciones para Seguro Social	140,309.00	32,219.60	108089.40
11100	Sueldos Básicos	2,566,800.00	552,313.00	1,903,940.70
11400	Adicionales	213,900.00	38,594.17	175305.83
11510	Decimotercer Mes	213,900.00	0.00	200316.67
11520	Decimocuarto Mes	213,900.00	16,785.83	191030.84
11600	Complementos	173,100.00	46,475.33	0.67
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	372,186.00	82,171.50	266089.50
11750	Contribuciones para Seguro Social	125,324.00	21492.10	95665.50
11100	Sueldos Básicos	2,544,000.00	628,319.85	1786780.18
11400	Adicionales	212,000.00	74,706.66	137,293.34
11510	Decimotercer Mes	212,000.00	0.00	212000.00
11520	Decimocuarto Mes	212,000.00	15,129.72	196870.28
11600	Complementos	171,800.00	79,869.80	0.20
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	368,880.00	92,220.00	276,660.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	102,893.00	25,315.40	77577.60
11100	Sueldos Básicos	22,336,512.00	5,194,560.75	15,387,366.61
11400	Adicionales	1,861,376.00	429,693.02	1391682.98
11510	Decimotercer Mes	1,861,376.00	1,374.17	1788829.60
11520	Decimocuarto Mes	1,861,376.00	89,483.27	1737720.50
11600	Complementos	1,508,241.00	401,150.13	0.87
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	3,238,796.00	760,472.32	2392043.68
11750	Contribuciones para Seguro Social	879,269.00	222,463.29	639730.51
26210	Viáticos Nacionales	2,625,020.00	758,734.20	389428.99
TOTAL PROGRAMA		358,615,900.00	77,805,877.21	204,848,125.04

Cuadro por Sector 2020 (Ejecutado)

SECTOR	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios directos 2020
AGUA Y SANEAMIENTO	3	-	24	1,212
EMPRENDIMIENTO Y VALORES	0	2,023,689.83	27	1,262
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	0	1,522,611.76	235	3,805
PREVENCION SITUACIONAL/CONVIVENCIA	3	3,108,756.64	33	21,185
EDUCACION	1	22,147,828.91	80	518
TOTAL	7	28,802,887.14	399	27,982

Cuadro por Departamento 2020 (Ejecutado)

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios directos 2020
ATLANTIDA	2	2,478,390.56	30	832
COMAYAGUA	1	630,366.08	11	19,100
COPAN	0	5,163,417.74	0	0
CORTES	0	128,450.00	0	0
FRANCISCO MORAZAN	1	4,601,892.19	277	6,367
GRACIAS A DIOS	0	376,668.00	0	0
INTIBUCÁ	2	6,243,177.79	30	962
LA PAZ	0	-	22	79
LEMPIRA	1	136,997.12	9	498
OCOTEPEQUE	0	9,043,527.66	20	144
TOTAL	7	28,802,887.14	399	27,982

Cuadro por Otras Inversiones 2020 (Ejecutado)

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2020
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	3,261,089.93
GASTO OPERATIVO DE PROGRAMAS	1,053,396.82
ACTIVIDADES CENTRALES FHIS	77,805,877.21
TOTAL	82,120,363.96

CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO



✓ Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)



i. Antecedentes

Actualmente el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y la Secretaría de Seguridad ejecutan conjuntamente la operación BID 4518/BL-HO denominada “Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios” el cual es un préstamo por un monto total de US\$60,000,000.00 la operación fue aprobada por el Banco Interamericano de Desarrollo en el mes de abril de 2018, posteriormente aprobada por el Congreso Nacional en el mes de octubre de 2018, y fue efectivo a partir del 28 de noviembre de 2018, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta

ii. Objetivo

Contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

iii. Componentes

Componente 1. Mejoramiento del hábitat de barrios urbanos vulnerables (US\$18.219 millones). El propósito de este componente es mejorar el acceso a servicios de infraestructura urbana y generar espacios con condiciones de seguridad, para incentivar una mejor convivencia y aumentar la capacidad de los ciudadanos para el cumplimiento pacífico de normas. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Infraestructura básica: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios en los siguientes barrios del Distrito Central: Monte de los Olivos, Nueva Jerusalén; Australia; 25 de Enero; Nueva

España; Brisas del Mogote y Nueva Galilea teniendo como marco para las intervenciones el Plan Integral de Mejoramiento de Barrios, el cual incluye los correspondientes diseños urbanísticos, de ingeniería, la programación y presupuestos. Este instrumento es crítico para la adecuada programación de las inversiones y para facilitar el diálogo con la comunidad sobre las actividades a desarrollar. Se financiará consultorías y contratación de obras para: (i) la preparación de los Planes Integrales de Mejoramiento de Barrios (PIMB); y (ii) las inversiones en obras de infraestructura básica de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, pavimentación, drenaje pluvial, plazas y parques, equipamientos sociales y otras necesidades detectadas en los PIMB. Se promoverá la recuperación de escuelas públicas y centros de salud (operados por las entidades estatales específicas).

Convivencia y Emprendimiento a nivel barrial: promueve la participación de los vecinos en el mejoramiento de las condiciones de su entorno, así como el fortalecimiento de sus redes sociales y vecinales para mejorar el tejido social en los barrios. Se financiará: (i) capacitación de líderes, programa de deportes y valores, apoyado por el Comité Olímpico Internacional; (ii) capacitación de vecinos en áreas de empleabilidad dentro y fuera del barrio mediante la asistencia técnica de las Universidades y su vinculación con el sector empresarial, (iii) organización para utilización de sistemas de alerta temprana para desastres naturales. Todas las actividades tendrán enfoque de género.

Componente 2: Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios (US\$22.130 millones). Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios de prevención social de la violencia al ciudadano y brindar una atención oportuna a las víctimas de violencias y delitos, fortaleciendo la gestión local. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Fortalecimiento de capacidades de actores municipales. Se financiará: (i) capacitación y asistencia técnica a las autoridades locales para promover la participación ciudadana en la preparación de planes locales de prevención social de la violencia; (ii) fortalecimiento de las capacidades de los responsables de los observatorios locales, para el análisis estratégico de estadísticas del crimen y delito -incluyendo la desagregación por género-; y (iii) estrategia de comunicación a través de campañas y consultas sociales para promover medidas y valores para la reducción de violencias, respeto por las normas legales, morales, culturales y el uso de la oferta de servicios disponibles de prevención y atención a víctimas.

Intervenciones de prevención social de la violencia a nivel municipal. Se financiará: (i) programas para la atención a víctimas de VIF a través del módulo de Atención Integral Especializado (MAIE); (ii) desarrollo de protocolos para homologar la actuación de primeros respondientes para atención a víctimas, (iii) programa de prevención social de la violencia para jóvenes en situación de riesgo; (iii) modelo innovador de policía comunitaria y patrullaje policial sistemático -Hot Spots-; y (iv) mejoramiento de la infraestructura de las Jefaturas Departamentales, para ofrecer servicios policiales a la comunidad.

Componente 3: Efectividad policial. (US\$16 millones). Con el propósito de mejorar el desempeño y la calidad en la prestación de los servicios policiales, se apoyará la consolidación del sistema nacional de formación y profesionalización, así como su sistema de integridad. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Consolidación del sistema educativo policial basado en la filosofía de Policía Comunitaria. Se financiará: (i) diseño del modelo de Sistema de Formación y Profesionalización Policial, articulando sus diferentes instancias de formación (Instituto Técnico Policial -ITP-, ANAPO, Universidad y educación continua y entrenamiento), incluye mecanismos de evaluación continua del personal. Lo anterior, deberá estar sujeto a promover principios de meritocracia y transparencia en el desarrollo de la carrera policial; (ii) modernización del currículum académico para los medios y altos mandos policiales, certificado bajo la filosofía de policía comunitaria y orientando la formación a competencias para la toma de decisiones operativas. Lo anterior, incluyendo la redefinición del perfil de ingreso de candidatos a la ANAPO. Esto considerará la incorporación de nuevos cadetes, provenientes del ITP y otros candidatos que ya hayan cursado licenciaturas y tecnicaturas en otras universidades; modernizar el régimen de formación de oficiales en el nuevo campus universitario y generar una nueva estructura de gobierno y planta de profesores-investigadores de tiempo completo (teóricos y prácticos) (iii) fortalecimiento de las capacidades pedagógicas para docentes; (iv) fortalecimiento de la integridad policial a través de la consolidación de un sistema de evaluación y rendición de cuentas; y (v) modernización de la infraestructura física y tecnológica de la Academia Nacional de Policía y el Centro de Investigación y Desarrollo Policial.

Fortalecimiento de las capacidades en investigación criminal. Se financiará: (i) programa de capacitación y especialización continua en investigación criminal en coordinación con el MP; (ii) capacitación técnica en el uso de tecnologías de la información para análisis estratégicos delictuales; e (iii) implementación de un sistema integrado de información delictiva y criminal para mejorar la resolución del delito -integrando estadísticas por categoría de género.

iv. Mecanismo de Ejecución.

Se propone contar con dos organismos ejecutores independientes, pero con responsabilidades compartidas en el diseño, implementación y evaluación de iniciativas que se realicen en la misma área geográfica. El componente 1 de esta operación será ejecutado por SEDECOAS-FHIS y el componente 2 y 3 por la Secretaría de Seguridad.

v. Monto del Convenio:

US\$ 60,000,000.00 Millones de Dólares, según convenio de préstamo el cual se desglosa de la siguiente manera: SEDECOAS- FHS le corresponde US\$ 20, 000,000.00 Millones de Dólares y a la Secretaria de Seguridad le corresponde US\$ 40,000,000.00 Millones de Dólares.

La duración del convenio es por 5 años después de la publicación de diario La Gaceta Acuerdo Ejecutivo No. 114-2018.

vi. Avance financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	17,749,164.00	14,959,789.44	84%
2019	84,562,822.00	75,678,087.16	89%
2020	129,871,251.00	4,118,983.16	3%

vii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios Directos 2020
EMPRENDIMIENTO Y VALORES	0	1,766,789.83	27	1,262
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	0	1,522,611.76	235	3,805
TOTAL	0	3,289,401.59	262	5,067

viii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios directos 2020
FRANCISCO MORAZAN	0	3,289,401.59	262	5,067
TOTAL	0	3,289,401.59	262	5,067

ix. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2020
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	829,581.57
TOTAL	829,581.57

x. AVANCES AL 31 DE MARZO DE 2020

<i>Avances Programa</i>		
Componente 1 Mejoramiento del hábitat de barrios urbanos vulnerables		
1.0	PRODUCTO 1.1 NUEVE PROYECTOS INTEGRALES DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS (RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PÚBLICO, EQUIPAMIENTO SOCIAL Y PAVIMENTACIÓN), COMPLETADOS Y SIENDO UTILIZADOS	
1.1	<i>Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios</i>	<ul style="list-style-type: none"> Los Proyectos de integración urbana el cual incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y obras de mitigación de riesgos, colonias 25 de enero, Australia, Nueva España, Nueva Galilea, inicio la ejecución de obras el día 20 de diciembre de 2019. La duración prevista del proyecto es de doce meses finalizan en el mes de diciembre del año 2020. En los meses de noviembre a diciembre 2019, se realizaron las actividades preliminares: entrega de sitio, construcción de bodegas, levantamientos topográficos, toma de muestras para estudios de suelos (calicatas) y capacitación de personal en la aplicación de medidas del PGAS (Plan de Gestión Ambiental y Social) y seguridad en barrios socialmente vulnerables al mes de marzo de 2020 se tiene la instalación de servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y pavimentación de calles en sectores de los barrios beneficiados; el porcentaje de avance físico de este producto es de un 14% y tiene un avance financiero de 40% en relación al monto contratado que es de L. 128,592,322.09. <p>La consultoría de supervisión de estas obras, inició el día 06 de octubre de 2019. Se recibió el primer producto, informe inicial, en cual se revisó técnicamente el diseño de obras. La firma consultora concluyó que los diseños y cantidades de obras estaban correctos y que no era necesario incorporar correcciones para iniciar la etapa de supervisión de obras, a la fecha la consultoría de supervisión tiene un avance financiero del 10% en relación al monto contratado que es de L. 12,326,842.75.</p> <ul style="list-style-type: none"> El proyecto de equipamiento social el cual incluye, Reparación de Cancha Polideportiva, Colonia Nueva Galilea, Construcción de Centro Comunal, Colonia Nueva Galilea, Ampliación de Jardín de Niños; Colonia Nueva España, Ampliación Escuela David Corea Sánchez, Colonia Australia, Construcción Centro Comunal, Colonia Australia y Construcción Centro Comunal, Colonia 25 de enero, inició el día 23 de noviembre de 2019. Al mes de marzo de 2020 se tiene un avance físico promedio del 48% y un avance financiero del 28% en relación al monto contratado que es de L. 10,967,584.51. <p>Los servicios de consultoría para supervisión de obras se iniciaron día 11 de noviembre de 2019. Se espera finalizar en el segundo semestre del año 2020 al mes de marzo de 2020 se tiene un avance financiero de 15% en relación al monto contratado que es de L. 602,493.06.</p> <ul style="list-style-type: none"> La consultoría para el diseño de obras del Proyecto de Integración Urbana en colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén No. 2, Brisas del Mogote Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador, ha entregado los primeros dos productos de la consultoría que consisten en: <ul style="list-style-type: none"> 1. Diagnóstico urbano de las redes de servicios públicos y equipamiento social existentes.

		<p>2. Informe Intermedio: Diseño preliminar de redes de servicios públicos y equipamiento social; en esta actividad se realizaron múltiples reuniones comunitarias en las cuales la comunidad identificó sus necesidades y requerimientos de diseño, quedando pendiente en los productos de esta consultoría la aprobación de los diseños finales por el Servicio Nacional Autónomo de Acueductos de Alcantarillado SANAA y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE.</p> <p>A la fecha el avance físico es del 70% y el avance financiero es de 64% en relación al monto del contrato que es de L. 8,878,240.54.</p>
2.0	PRODUCTO 1.2 Jóvenes de los barrios intervenidos capacitados	
2.1	<i>Programa de Deportes y Valores</i>	<ul style="list-style-type: none"> Este proyecto consiste en la enseñanza de disciplinas deportivas implementando los valores olímpicos; al semestre se imparten seis (6) disciplinas olímpicas: taekwondo, levantamiento de Pesas, tenis de Mesa, atletismo, balonmano y lucha olímpica; también, se atiende niños y/o jóvenes con discapacidad y mujeres que practican el baile de Zumba. <p>En el programa participan 1,337 niños y jóvenes en 16 secciones deportivas de 2 horas, impartidas de lunes a viernes.</p>
1.2	<i>Capacitaciones en valores y emprendimiento</i>	<ul style="list-style-type: none"> En este producto se provee la capacitación en valores y emprendimiento, que iniciarán en el mes de abril del año 2020; la meta a alcanzar es 2,000 asistencias a capacitación.
3.0	PRODUCTO 1.3 Mujeres de los barrios intervenidos capacitadas en emprendimiento y empleo	
3.1	<i>Capacitaciones en empleabilidad.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Las actividades a incluir dentro de este producto serán diseñadas a través de consultorías incluidas en la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-17135-HO. Proyecto de Revitalización Económica y Desarrollo de Barrios Vulnerables de Tegucigalpa; al mes de noviembre el BID contrató la consultoría individual para la realización del estudio de mercado para la empleabilidad, emprendimiento y convenio inter institucional para la formación técnica y empleo, al mes de marzo del año 2020 se elaboró un plan de capacitación y varios convenios para capacitar a 300 jóvenes de los cuales 150 serán mujeres. Al mes de marzo inició el programa de capacitación en programación y animación digital donde participan 14 mujeres.

xi. PROBLEMÁTICA:

Problema	Acciones de mitigación, comentarios, necesidades de apoyo
<p>No contar con la licencia Ambiental para los proyectos de las colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén, y Brisas del Mogote.</p>	<p>Estas colonias se encuentran ubicadas en la cuenca del río Guacerique, la cual abastece el embalse de los Laurales, una de las tres fuentes de abastecimiento de la ciudad. El Saneamiento de estas colonias es imperativo para detener la contaminación del embalse. Sin embargo, se espera dificultades por parte de MiAmbiente en brindar el licenciamiento ambiental. Es por eso que se ha indicado a la firma consultora incorporar en su diseño todas medidas de mitigación necesarias para garantizar la viabilidad técnica y ambiental del proyecto. Asimismo, se requiere la actualización del Plan de manejo de la Cuenca de Guacerique, de manera que se actualice el uso de suelo, se identifiquen los asentamientos informales que se han establecido en los últimos años (incluidas las colonias en referencia) y se defina el plan de manejo de la zona.</p> <p>En los meses de enero y febrero del año 2020 se han realizado varias reuniones con el SANAA en las cuales se ha acordado la aprobación técnica de diseños de sistemas de agua potable y saneamientos quedando sujetos a la aprobación del proyecto por parte de MiAmbiente en donde también se ha expuesto la problemática para la atención de los problemas de saneamiento en la zona de intervención.</p>
<p>Paro en ejecución de obras y actividades por epidemia COVID 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La programación en la ejecución de obras se verá afectada debido a la pandemia del coronavirus. Esta condición de fuerza mayor evidentemente afectará el plazo contractual de entrega de los proyectos en ejecución. • Se recortará el alcance de los productos: <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Programa de Deportes y Valores. 1.2 Capacitaciones en valores y emprendimiento. <p>Debido a las restricciones para realizar reuniones el programa se abstendrá de realizar capacitaciones de los productos 2.1 y 1.2 mencionados; así mismo, la adquisición de implementos deportivos y alimentos para la ejecución de dichos productos no será posible en el tiempo requerido.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La consultoría para el diseño de obras del Proyecto de Integración Urbana en colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén No. 2, Brisas del Mogote Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador se ha detenido a causa de la emergencia por el corona virus 19, este producto tendrá un retraso significativo para el programa, ya que es el punto de partida para el ingreso de solicitudes de licenciamiento ambiental de los proyectos que se espera iniciar al año 2021. • Al mes de marzo de 2020 se recibieron hojas de vida para la contratación de los siguientes servicios de consultoría y servicios de no consultoría: <ul style="list-style-type: none"> ○ Motorista Conserje. ○ Entrenador Deportivo. ○ Inspector de Obras. <p>El paro de labores por la emergencia de corona virus ha retrasado la contratación de dichos servicios que son esenciales para el desarrollo de capacitaciones del producto 1.2 Jóvenes de los barrios intervenidos capacitados y la ejecución de obras de infraestructura correspondientes al producto 1.1 Nueve proyectos integrales de mejoramiento de barrios (red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, equipamiento social y pavimentación), completados y siendo utilizados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se han elaborado los términos de referencia para la contratación de consultorías: <ul style="list-style-type: none"> ○ Servicios Especialista Ambiental. ○ Especialista en gestión de empleo.

Sin embargo, el paro de labores ha frenado los procesos para la adquisición de dichos servicios de consultoría.

Cancelación de licitaciones por la emergencia COVID 19

- Debido a la pandemia del coronavirus, se cancelarán los siguientes procesos de licitación:

Categoría	Descripción	Monto total a contratar	Monto a ser ejecutado en el año 2020 (\$)	Fecha estimada de entrega final del producto	Estado actual
Bienes	LPN ADQUISICIÓN DE EQUIPO DEPORTIVOS PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEL PROGRAMA DE DEPORTES Y VALORES	L.2,500,000.00	L.2,500,000.00	6/6/2020	No Objeción Base
	LPN ADQUISICIÓN DE MERIENDAS EMPAQUETADAS PARA TALLERES Y ACTIVIDADES DE DEPORTES	L.1,250,000.00	L.1,250,000.00	10/12/2020	Revisión Legal
Servicios de No Consultoría	LPN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y TALLERES	L.1,875,000.00	L.1,875,000.00	10/12/2020	Elaboración Base

Dichos insumos son requeridos para el cumplimiento de los productos:

2.1 Programa de Deportes y Valores: en este sentido, los jóvenes del programa no participarán en competencias deportivas; los entrenamientos estarán limitados por la falta de equipo especializado en los deportes que se imparten en los barrios intervenidos adicionalmente la restricción gubernamental que prohíbe la realización de reuniones en este caso capacitaciones limitará los entrenamientos que se realizaban.

1.2 Capacitaciones en valores y emprendimiento: no se podrán repartir meriendas para los jóvenes capacitados en valores y emprendimiento.

Los fondos destinados para estos procesos licitatorios se han reorientado a la atención de la emergencia del corona virus 19; la secretaría de finanzas realizó un recorte de L.5,000,000.00 del presupuesto anual; y el programa para el mes de mayo realizará la compra de alimentos y elementos de higiene para las colonias beneficiadas por un monto aproximado de L.1,867,080.00.

Retraso en pagos de estimaciones de obra por la emergencia COVID 19

- Debido al cierre de labores en las instituciones gubernamentales, se retrasará el pago de estimaciones a contratistas, empresas supervisoras y diseñadoras; a la fecha las estimaciones representan un monto neto de **L. 7,898,344.71**; en este sentido, se debe obtener la aprobación de cuotas de compromiso para realizar los pagos a la brevedad posible.

CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA



✓ **Proyecto de Infraestructura Rural BCIE**



i. Objetivo General

Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local. Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son de L. 283 millones aproximadamente.

ii. Focalización:

En base a la metodología de selección de la mancomunidades ejecutado por PIR, que toma en consideración el índice de desarrollo humano, la capacidad de gerenciamiento de la Unidades técnicas Municipales en cada mancomunidad y no más de una mancomunidad por departamento, fueron seleccionadas las mancomunidades de los departamentos de Lempira (CAFEG), Intibucá (AMFI) y Francisco Morazán (MANOFM).

iii. Tipología de Proyectos

- Electrificación Rural: proyectos para habilitar o mejorar el acceso a electricidad teniendo los beneficiarios que aportar el 15% del monto total del proyecto.
- Agua y Saneamiento: proyectos de rehabilitación, expansión y construcción de sistemas comunales de agua y saneamiento y facilidades en áreas rurales, de las mancomunidades previamente seleccionadas.
- Caminos Rurales: proyectos de rehabilitación y mejoramiento de los caminos municipales eficientemente y utilizando métodos de empleo masivo de mano de obra aportando las comunidades beneficiadas el 15% del total del proyecto.

iv. Monto del Convenio:

L.285.0 Millones de Lempiras aproximadamente, según convenio de préstamo el tiempo de ejecución del proyecto es de 60 meses.

v. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2011	37,790,000.00	0.00	0.00%
2012	6,393,674.00	0.00	0.00%
2013	33,774,273.00	33,771,086.72	99.99%
2014	42,465,271.00	32,714,051.57	77.04%
2015	32,683,893.00	32,295,225.85	98.81%
2016	95,056,511.00	93,906,331.81	98.79%
2017	89,155,169.00	86,922,798.37	97.50%
2018	37,332,495.00	36,390,084.05	97.48%
2019	34,274,786.00	34,213,605.05	99.82%
2020	5,000,000.00	0.00	0.00%

vi. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios Directos 2020
AGUA Y SANEAMIENTO	3	24	1,212
TOTAL	3	24	1,212

vii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios directos 2020
INTIBUCÁ	2	15	714
LEMPIRA	1	9	498
TOTAL	3	24	1,212

viii. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

El presente documento hace referencia a los movimientos que corresponden a la ejecución física y financiera del Programa PIR durante el primer trimestre del año 2020, para cada sector de inversión y para la fuente de financiamiento activa actualmente.

Con fondos del Préstamo BCIE No. 1736, se interviene en los sectores de Agua y Saneamiento, Caminos Rurales y Electrificación Rural por Extensión de Red en la Mancomunidades de Consejo Intermunicipal CAFEG (municipios de Candelaria, Gualcinse, Piraera, San Andrés, San Francisco y Santa Cruz), departamento de Lempira; Mancomunidad de los municipios del Norte y Occidente de Francisco Morazán MANOFM (municipios de Vila de San Francisco, El Porvenir, Guaimaca, Marale, Orica, San Ignacio, Cantarranas, Valle de Ángeles y Vallecillo) departamento de Francisco Morazán y Asociación de Municipios Fronterizos de Intibucá AMFI (municipios de Camasca, Colomocagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de la Sierra y Santa Lucía) en el departamento de Intibucá.

ix. EJECUCIÓN FINANCIERA

Ejecución presupuestaria al 31 de marzo 2020

Código	Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO 2019				Disponible	% Ejecución
		Lempiras					
		Aprobado	Decremento Incremento	Vigente	Ejecutado		
47	Préstamo BCIE-1736	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00%
	Total	5,000,000.0	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	

La UCP/PIR solicitó a la SEFIN estructura presupuestaria SIAFI para ejecutar los pagos de subproyectos en ejecución durante el I trimestre 2020, sustentada en la ampliación de fecha de cierre y justificación del Fondo Rotatorio al 31 de marzo del 2020, aprobada por el BCIE en agosto 2019. Se solicitó a lo interno del SEDECOAS/FHIS una modificación de aprovechamiento de espacio presupuestario, disminuyendo así el espacio del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) y creando espacio para PIR, con el fin de mantener el equilibrio presupuestario a nivel institucional.

Al 16 de marzo 2020, la UCP/PIR, no contaba con la estructura presupuestaria solicitada, la cual fue autorizada/habilitada hasta el 18 de marzo de 2020, periodo en el cual nos encontrábamos en estado de excepción total, provocado por la pandemia del COVID-19 en el país, esta situación impide a la UCP realizar los pagos correspondientes a estimaciones de obra, viáticos y gastos de viaje, capacitaciones entre otros, programados su pago al 31 de marzo de 2020. Por otra parte, estaba finalizando el I trimestre para la solicitud

de cuota y los perfiles respectivos estaban desactivados, lo que tomo más de dos semanas la activación de los perfiles. Se solicitará a la SEFIN la cuota para el II trimestre en la primera semana de abril.

1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Durante el I trimestre 2020, no se realizaron modificaciones presupuestarias ya que no se contaba con la estructura presupuestaria asignada al Proyecto.

2. EJECUCIÓN FÍSICA

En el sector de **Agua y Saneamiento**, se han finalizado tres (3) subproyectos de construcción de sistemas de agua potable mediante microcaptación pluvial y saneamiento. A continuación, se el detalle de los subproyectos mencionados y las actividades que se desarrollaron:

N	Cód. de Proyecto	Nombre de Proyecto	Ubicación		Porcentaje de Ejecución
			Municipio	Departamento	
1	107196	Construcción de Sistema Integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico Comunidad El Coyolar	San Marcos de la Sierra	Intibucá	97%
2	107181	Construcción de Sistema de Micro captación Pluvial y Saneamiento, Comunidades de Guasquin, La Puebla, El Triunfo y San Matías	Piraera	Lempira	100%
3	107182	Construcción de Sistema de Micro captación Pluvial y Saneamiento, Comunidad de El Derrumbado	San Marcos de la Sierra	Intibucá	100%

El subproyecto de *Construcción Sistema Integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico Comunidad El Coyolar*, ubicado en el municipio de San Marcos de la Sierra, Intibucá, durante el I periodo 2020, se finalizaron con las actividades de mejoramiento de viviendas, reparaciones de techos e instalación de canales de captación de agua lluvias. A la fecha, el avance físico se reporta en un 97%. Una vez la Inspectoría de FHIS realice la supervisión y de conformidad a las correcciones se proseguirá a la entrega del acta definitiva entre los beneficios entregados a los pobladores se encuentra el mejoramiento a 14 de las viviendas más vulnerables de la comunidad, dotación de saneamiento básico mediante la construcción de 31 letrinas, construcción de pisos de concreto en 29 viviendas, instalación de 25 sistemas solares de baterías de litio incluyendo la reinstalación de 10 sistemas existentes, mejoramiento de techos en 16 viviendas y la dotación de sistemas de microcaptación pluvial para 45 viviendas con tanques de almacenamiento de 6 mil litros de capacidad y bomba para facilitar al beneficiario la extracción del agua.

Para el subproyecto 107181 de las *Comunidades Guasquin, La Puebla, El Triunfo y San Matías* consistente en la construcción del sistema de microcaptación pluvial y saneamiento y con duración contractual de 90 días para su ejecución. Los alcances del proyecto consistieron en la dotación de 83 sistemas de microcaptación de aguas lluvias con tanques de almacenamiento de 6 mil litros, cobertura de saneamiento básico con la

construcción de letrinas para 55 viviendas y mejoramiento de techos de 3 viviendas ya que no cumplían los requerimientos necesarios para la recolección de aguas lluvias.

Por otra parte, el subproyecto 107182 de la comunidad El Derrumbado, consistente en un sistema integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico, contaba contractualmente con 135 días para su ejecución y por aumento en los alcances del proyecto en las actividades de mejoramiento de viviendas y construcción de pisos, entre otras actividades se amplió 21 días a consideración de la Supervisión. Actualmente se encuentra finalizado, con recepción definitiva a conformidad de la Supervisión e Inspectoría de FHIS. En este proyecto se realizó el mejoramiento de 4 viviendas que fueron evaluadas durante la etapa de prefactibilidad como las más vulnerables, además se dotó a las 74 viviendas de la comunidad de sistemas de microcaptación pluvial que incluyen canal de recolección de agua, tanque de almacenamiento y bomba, se logró la cobertura de saneamiento básico con la construcción de 35 letrinas, mejoramiento de techo en 20 viviendas, construcción de pisos en 58 viviendas e instalación de 33 sistemas solares y reinstalación de 2 sistemas solares existentes.

En el sector de **Caminos Rurales**, se encuentra en ejecución un (1) subproyecto que corresponde a la Pavimentación de Casco Urbano del Municipio de Magdalena, en el departamento de Intibucá. Se consideró la incorporación de una orden de cambio para el mejoramiento de algunas actividades necesarias para el buen funcionamiento del pavimento:

N	Cód. de Proyecto	Nombre de Proyecto	Ubicación		Porcentaje de Ejecución
			Municipio	Departamento	
1	105600	Pavimentación de Casco Urbano del Municipio de Magdalena	Magdalena	Intibucá	79%

En el sector de **Electrificación Rural** por extensión de red, a la fecha, no se tienen subproyectos en ejecución, ya que han sido finalizados todos los programados a ejecutarse.

3. RESULTADOS DE GESTION (FP02)

Con fondos del Préstamo del BCIE-1736, durante el I trimestre del año 2020, se ha incrementado el acceso al agua potable a 202 viviendas en la zona rural de los departamentos de Lempira e Intibucá, asimismo, se mejoró sustancialmente las condiciones de vida para 18 familias que fueron beneficiadas con mejoramiento de viviendas, construcción de pisos, mejoramiento de techos, cobertura a saneamiento mediante letrinas, acceso a la electricidad mediante energía solar. Se benefician un total de 1,212 personas en 6 comunidades vulnerables del país. Además, se ha brindado empleo directo temporal a 24 personas durante las actividades constructivas.

4. DESCENTRALIZACIÓN A LAS MANCOMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL PIR

Con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE Préstamo No. 1736, desde el inicio del Proyecto al 31 de marzo del 2020, se han transferido las Mancomunidades beneficiarias MANOFM, CAFEG y AMFI un monto de L 147.6 Millones para la ejecución de subproyectos de infraestructura de los sectores Agua & Saneamiento, Electrificación Rural y Caminos Rurales y fortalecimiento institucional.

TRANSFERENCIAS PARA EJECUCIÓN DE SUBPROYECTOS DESCENTRALIZADOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ACUMULADO AL 31 MARZO 2020*

MANCOMUNIDAD	AGUA Y SANEAMIENTO	ELECTRIFICACION RURAL	CAMINOS RURALES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	TOTAL LEMPIRAS
AMFI	L 15,190,873.37	L 11,761,414.15	L 18,870,853.47	L 461,678.00	L 46,284,818.99
CAFEG	L 19,261,737.39	L 19,238,407.47	L 13,083,063.16	L 707,658.00	L 52,290,866.02
MANOFM	L 19,839,490.05	L 9,378,993.64	L 18,359,222.24	L 1,475,730.00	L 49,053,435.93
Total	L 54,292,100.81	L 40,378,815.26	L 50,313,138.87	L 2,645,066.00	L 147,629,120.94
	37%	27%	34%	1.8%	100.00%

*Nota: valores netos ajustados al 31 de diciembre 2019, incluyen devoluciones en concepto de obra no ejecutada y rescisión de contratos.

5. DESEMBOLSOS DEL PIR

El 21 de noviembre del 2018, se registró el último desembolso por un monto de USD\$ 1,775,884.55, y que corresponde a la séptima Restitución del Fondo Rotatorio, completando así el 100% del monto del Préstamo.

6. PROBLEMÁTICA FÍSICA Y FINANCIERA

Ya que no se contaba con la estructura presupuestaria habilitada del año 2020 en el Sistema de Administración Financiera Integrada - SIAFI sino hasta el 18 de marzo del 2020, sumado a la emergencia de sanitaria decretada a nivel internacional y nacional a causa de la pandemia del COVID-19 y cumpliendo con las disposiciones del Gobierno de la República de Honduras, la Secretaria de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) suspendió las ejecuciones y avances de todos los programas y proyectos administrados por la Secretaría a partir del 16 de marzo 2020, por lo tanto, esta situación impide a la UCP/PIR realizar los pagos correspondientes a estimaciones de obra, viáticos y gastos de viaje, capacitaciones, entre otros, asimismo, para los subproyectos finalizados (proyectos Código 107196 y 107181) los cuales cuentan con acta de recepción provisional de las obras, las actividades de correcciones menores y subsanación de calidad de obra descritas en estas actas han sido suspendidas por lo que se espera se finalicen una vez se restablezca el tránsito de personas y reactivación del comercio a nivel nacional.

A partir del 16 de marzo del 2020, se han suspendidos todas las actividades dentro del SEDECOAS/FHIS por mandato del SINAGER, por lo que las empresas contratistas no pueden ingresar ningún documento de estimaciones de pago, hasta que el SEDECOAS indique cual será el mecanismo para honrar los compromisos ya entregados en los sitios de las obras, por lo tanto, el ingreso de documentación de cierre y presentación de estimaciones y pagos finales a las diferentes direcciones del SEDECOAS se mantienen paralizadas (proyectos Código 107196, 107181, 107182 y 105600).

Para el proyecto Código 105600, que se encontraba en ejecución, actualmente la empresa ejecutora suspendió actividades en base a las medidas establecidas por el gobierno central, así como las ferreterías y negocios locales quienes suministran los materiales.

7. CARGA DE TRABAJO EN LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS

En el sector Agua y Saneamiento, durante el periodo se desarrollan actividades de campo y gabinete: elaboración de prefactibilidades, diseño y formulación de ampliaciones y nuevos sistemas de agua potable convencionales y no convencionales (microcaptación pluvial), sistemas de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento, así también en el sector Electrificación Rural se desarrollan actividades de diseño y formulación de nuevos sistemas por extensión de red, sin embargo, estos proyectos no cuentan con financiamiento para ser ejecutados, por lo que se entregaran los diseños finales a las Autoridades Municipales correspondientes para que ellos gestionen la construcción de los mismos.

CARTERA KfW Entwicklungsbank



✓ Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V

i. Objetivo General



Consiste en la utilización de centros educativos mejorados, ampliados o nuevos y equipados bajo conceptos pedagógicos que operan de manera sostenible por la comunidad educativa. De esta manera se pretende contribuir a que niños/as y jóvenes de regiones pobres utilicen una oferta de alta calidad educativa, tanto formal como de educación vocacional.

ii. Focalización

Fase IV: El Área de intervención abarcará los departamentos que están siendo intervenidos en las fases anteriores (Zona de Occidente): 1) Copán, 2) Santa Bárbara, 3) Intibucá, 4) Lempira, 5) La Paz, 6) Ocotepeque. 7) Centros a nivel nacional en casos de emergencia (catástrofes naturales). La información de estos centros deberá ser actualizada en el plan maestro y sólo si se determina su precariedad, podrán ser intervenidos previo a No Objeción del KfW. 8) Adicionalmente se extenderá el área de intervención a los departamentos adyacentes a la zona de occidente, delimitando el área de intervención a través de la Carretera Panamericana. Los municipios a ser beneficiados se encuentran al oeste de la misma en los siguientes departamentos: 1) Choluteca, 2) Valle, 3) Francisco Morazán (exceptuando el núcleo urbano de Tegucigalpa), 4) Comayagua y adicionalmente 5) Gracias a Dios.

Fase V: El Área de intervención abarcará los departamentos de: Ocotepeque, Lempira y Copan, en la zona de Occidente. Además, los departamentos al oeste de la carretera CA-5 de los departamentos de Francisco Morazán (exceptuando el Distrito Central), Valle, Choluteca, Comayagua. También seguirá formando parte del Programa el Departamento de Gracias a Dios (siempre y cuando no se alcance un mínimo de infraestructura en este departamento y según las experiencias de la fase IV del PROMINE).

iii. Priorización de los Centros Educativos

Esta es realizada por la Secretaria de Educación apoyados en la herramienta del Plan Maestro de Infraestructura Educativa.

iv. Descripción del Proyecto

Fase IV: El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y en la planificación estratégica para los años 2014 - 2018 de la Secretaría de Educación (SE). El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las tres fases previas PROMINE I, II y III. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

Fase V: El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y el Plan Estratégico del Sector de Educación para los años 2017 - 2030 de la Republica de Honduras. El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las cuatro fases previas PROMINE I, II, III y IV. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

v. Monto del Proyecto:

Fase IV:

Fondos de Donación por un monto de € 15,000,000.00 euros, Contrapartida Nacional para SEDECOAS/FHIS de € 424,000 euros, Contrapartida Nacional para SE de € 218,000 euros, Contrapartida Municipal de € 515,000 euros y Contrapartida Comunitaria de € 514,000 euros.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 03/12/2015

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 17/02/2017

Fecha de Inicio: 02 de Abril 2018 (Se considera la fecha de inicio de la Consultoría)

Fecha de Finalización de convenio: 30/11/2020

Fase V:

Fondos de Donación por un monto de 10, 000,000.00 euros, Contrapartida Nacional para IDECOAS/FHIS de 495,000 euros, Contrapartida Nacional para SE de 250,000 euros, Contrapartida Municipal de 600,000 euros Contrapartida Comunitaria de 600,000 euros.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 06/07/2018

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 21/03/2019

Fecha de Inicio: Inicio tentativo IV trimestre 2020

Fecha de Finalización de convenio: 37 meses a partir del inicio de la consultoría

vi. Avance Financiero PROMINE FASE III y IV

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2016	145,687,475.00	142,916,817.45	98.10%
2017	107,279,375.00	96,731,967.93	90.17%
2018	53,035,502.00	50,951,601.81	96.07%
2019	81,069,633.00	79,762,875.76	98.39%
2020	135,907,777.00	22,649,504.26	16.67%
Presupuesto 2020 Fase IV y Fase V			

vii. Avance Físico por Sector PROMINE FASE IV y V

SECTOR	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020
EDUCACION	0	20,908,596.51
TOTAL	0	20,908,596.51

viii. Avance Físico por Departamento PROMINE FASE IV y V


DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020
COPAN	0	5,163,417.74
FRANCISCO MORAZAN	0	73,295.32
GRACIAS A DIOS	0	376,668.00
INTIBUCÁ	0	6,243,177.79
LEMPIRA	0	8,510.00
OCOTEPEQUE	0	9,043,527.66
TOTAL	0	20,908,596.51

ix. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2020
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	1,627,455.93
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA*	113,451.82
TOTAL	1,740,907.75
*Viaticos y Combustible	

x. AVANCES GENERALES

▪ **FASE IV.**

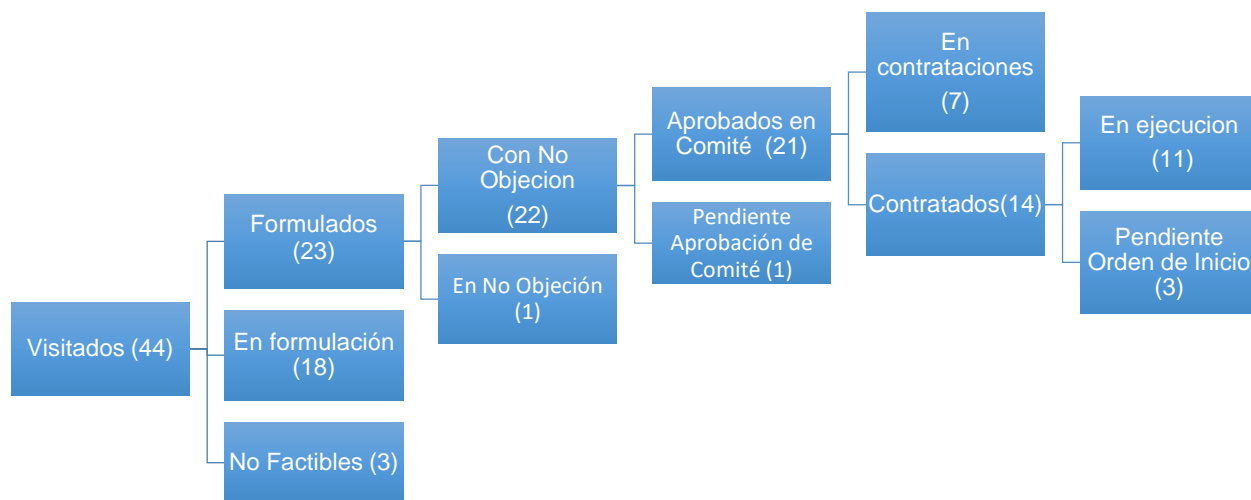

xi. AVANCE FINANCIERO SEGÚN PRESUPUESTO ASIGNADO FASE VI Y FASE V

Año	Planificado al I Trimestre	Ejecutado	Eficiencia
2020	L. 31,659,815.00	22,649,504.26	71.54%

La variación con respecto a lo planificado corresponde a:

- La suspensión de los proyectos en campo debido a COVID 19
- A la poca asignación de cuota de compromiso en lo referente al gasto operativo lo cual limitó las actividades en el mes de febrero y marzo.

xii. LOGROS I TRIMESTRE

- Se comenzaron actividades de capacitación en algunos municipios del departamento de Gracias a Dios
- Se finalizó la formulación de los seis proyectos de infraestructura para el departamento de Gracias a Dios.

xiii. RETOS PROXIMOS

Entre los principales retos que enfrenta el PROMINE-KfW:

- **Ejecución de Proyectos:** i) Impulsar la formulación y ejecución de los proyectos financiados en el marco de la fase IV, una vez se reactive las actividades en el país.
- **Inversión Departamento de Gracias a Dios:** Iniciar ejecución bajo la modalidad PEC de los seis proyectos de infraestructura.
- **Contraparte Nacional:** Concretar la modificación presupuestaria a fin de contar con recursos para el gasto operativo del Programa una vez se reinicien actividades en campo.

✓ Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)



i. Objetivo General

Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).

ii. Focalización

A través de un proceso de concurso con criterios de selección predefinidos en el acuerdo separado y evaluación de propuestas técnicas alineadas a los componentes del programa fueron seleccionados 3 municipios en donde se está realizando la intervención del CONVIVIR a través de obras de infraestructura y medidas de alcance social para beneficio enfocado en la juventud. Así mismo se definieron los barrios, colonias o comunidades urbanas en donde se focaliza las acciones y en donde ya se ha realizado una labor de socialización de los alcances, compromisos y beneficios para la población. Los municipios seleccionados son:

- Municipio de Gracias, departamento de Lempira
- Municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua
- Municipio de La Lima, departamento de Cortes.

iii. Descripción del Proyecto

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

iv. Monto del Proyecto:

Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son Euros 10,000,000.00. El tipo de financiamiento es un contrato de Préstamo.

Fecha de Firma de convenio: 08/11/2012

Fecha de Finalización de convenio: 30/06/2020

v. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2014	21,289,204.00	18,316,427.97	86.04%
2015	38,873,159.00	34,024,198.74	87.53%
2016	88,796,503.00	83,460,868.42	93.99%
2017	51,288,495.00	48,071,886.28	93.73%
2018	65,657,852.00	43,535,738.65	66.31%
2019	33,661,644.00	30,786,651.68	91.46%
2020	22,475,156.00	887,266.08	3.95%

vi. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios Directos 2020
EMPREDIMIENTO Y VALORES	0	256,900.00	0	0
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	1	630,366.08	11	19,100
TOTAL	1	887,266.08	11	19,100

vii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios directos 2020
COMAYAGUA	1	630,366.08	11	19,100
CORTES	0	128,450.00	0	0
LEMPIRA	0	128,450.00	0	0
TOTAL	1	887,266.08	11	19,100

viii. INFORMACION FINANCIERA

En el presente cuadro se observa la ejecución financiera que ha tenido el Programa CONVIVIR desde su creación a la fecha, en el Primer Trimestre del año 2020 lo ejecutado se distribuye de la siguiente manera:

Ejecución financiera del 1er trimestre

Componente	Presupuesto Ejecutado 2014	Presupuesto Ejecutado 2015	Presupuesto Ejecutado 2016	Presupuesto Ejecutado 2017	Presupuesto Ejecutado 2018	Presupuesto Ejecutado 2019	Presupuesto Ejecutado I Trimestre 2020
01-Gasto Operativo	L. 536,459.53	L. 4011,908.76	L.8,186,328.38	L. 7,484,899.00	L. 6,977,244.45	L. 0.00	L. 0.00
02- Construcción	L. 4134,589.44	L. 14781,805.43	L. 53,726,357.68	L. 21,533,793.15	L. 9,885,956.39	L. 19,765,281.37	L. 630,366.08
03- Fortalecimiento de Habilidades de Jóvenes	L. 0.00	L. 2011,078.63	L. 8,078,022.83	L.3,972,943.74	L. 6,175,521.00	L. 443,284.80	L. 256,900.00
04- Mejoramiento Capacidades de Actores Relevantes	L. 0.00	L. 4114,456.01	L. 2,137,666.23	L. 2,906,038.90	L. 3,210,648.09	L. 4,030,730.00	L. 0.00
05-Materiales y Equipos	L. 0.00	L. 820,323.53	L. 3,142,655.66	L. 3,383,553.95	L. 5,733,027.16	L. 1,349,051.65	L. 0.00
06-Consultoria internacional	L. 13645,379.00	L. 8284,626.38	L. 8,189,837.64	L. 8,790,657.54	L. 11,553,341.56	L. 5,198,303.86	L. 0.00
Total	L. 18,316,427.97	L. 34,024,198.74	L. 83,460,868.42	L. 48,071,886.28	L. 43,535,738.65	L. 30,786,651.66	L. 887,266.08

Al cierre del período del periodo de enero a marzo del año 2020 la ejecución financiera del programa alcanza a un **3.95%** Entre las razones más importantes para este porcentaje (%) de ejecución, es debido a que todo lo programado para el primer trimestre no culminó al final del periodo debido a la situación actual de la Pandemia del COVID-19, por lo que varios procesos y proyectos se suspendieron su ejecución hasta nuevo aviso.

Los procesos de resolución de contrato de los proyectos “Casa de la Cultura” y “mediana Sitraterco” aún se encuentran en proceso para la recuperación de los fondos a la cuenta del programa CONVIVIR, a finales del mes de diciembre del año 2019 se recibió la noticia y el F01 del depósito y a finales de febrero del año en curso de una parte de estos fondos a las cuentas del SEDECOAS/FHIS, restando un monto de L. 8,139,334.38.

COMPONENTE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA- AVANCE FISICO

En el componente de Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura el Programa CONVIVIR, la gestión del SEDECOAS/FHIS está orientada a lograr la buena ejecución de cada obra priorizada. Para ello, durante este período se ha continuado con el trabajo conjunto con la Dirección de Control y Seguimiento y el apoyo de la Asistencia Técnica. Se ha logrado dar término de un número de 26 obras de infraestructura.

La institución es también responsable de la tramitación de documentación para lograr la aprobación de órdenes de cambio, y desembolsos de fondos para construcción.

Actualmente se tiene una cartera de **37 proyectos** de infraestructura aprobados para ejecutar con el monto del convenio. De dichos proyectos ya se terminaron 26 obras, 9 proyectos en ejecución, 2 proyectos adjudicados listos para dar inicio y 2 proyectos en proceso de resolución de contrato debido a la falta de voluntad política del municipio y factibilidad social de las obras estas se encuentran ubicados en La Lima, Cortes.

Se continúa trabajando en el proceso de equipamiento de los proyectos priorizando los que están terminados y los que están próximos a inaugurar.

El SEDECOAS/FHIS ha actuado por medio de su equipo de Control y Seguimiento, inspectores sociales y técnicos, y apoyo del equipo de Asistencia Técnica dando seguimiento a la ejecución de los proyectos en construcción, como también trabajando en el seguimiento a las gestiones administrativas relacionadas con desembolsos, ordenes de cambio ingresados en el ciclo de proyectos del SEDECOAS/FHIS.

A continuación, se anexan los tres cuadros que corresponden a la ejecución física de cada una de las obras de infraestructura *No. 1 Obras priorizadas en el municipio de Siguatepeque, Comayagua*

No.	Código FHIS	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado	ESTADO	
					Avance Físico	Avance Financiero
1	105175	Construcción Cancha Multiuso Parque Bosque Calanterique	Suyapita	L. 3104,790.79	CONCLUIDO	
2	106002	Construcción Salón Multiusos Y Cancha Deportiva Noé Cruz Villeda	Col. Noé Cruz Villeda	L. 3012,043.70	CONCLUIDO	
3	106347	Construcción Centro De Calidad De Vida	La Crucita	L. 2956,701.47	CONCLUIDO	
4	106181	Construcción Centro De Calidad De Vida Bo. El Carmen	Bol El Carmen	L. 3767,167.59	CONCLUIDO	
5	106094	Remodelación Centro De Capacitación Digital	Bo. El Centro	L. 410,327.27	CONCLUIDO	
6	105928	Construcción De Obras Complementarias Campo De Futbol Col. Mata	Col. Mata	L. 2721,312.41	CONCLUIDO	
7	106308	Construcción Centro De Calidad De Vida	Bo. San Juan	L. 3598,956.85	CONCLUIDO	
8	107303	Construcción Oficina Municipal De La Juventud	Barrio El Centro	L. 3638,941.50	CONCLUIDO	
9	107324	Remodelación Centro De Aprender Para Emprender - Infop	Suyapita	L. 986,493.87	CONCLUIDO	
10	107546	Construcción Obras Complementarias Plaza Del Bosque Calanterique	Suyapita	L. 1805,135.54	95.00%	8150%
11	107317	Construcción Casa De La Cultura	Bol El Carmen	L. 11012,069.37	25.12%	16.76%
12	107547	Remodelación De Biblioteca Municipal, Siguatepeque	Bo. El Centro	L. 461,153.55	100%	95%
13	107483	Construcción Plaza Turística de Artesanos EL Porvenir	Aldea El Porvenir	L. 4760,463.87	Proyecto adjudicado, listo para dar inicio	
TOTAL INVERSION				L. 42,235,557.78		

No. 2 Obras priorizadas en el municipio de Gracias, Lempira

No.	Código FHIS	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado	ESTADO	
					Avance Físico	Avance Financiero
1	105174	Construcción Plaza Recreativa Colonia Borjas	Col. Borjas	L. 3225,774.53	CONCLUIDO	
2	106006	Construcción Plaza De Recreación Para La Convivencia Pinalito Y Bella Vista	Pinalito	L. 2147,440.69	CONCLUIDO	
3	106145	Remodelación Centro De Capacitación Digital	La Merced	L. 56,983.16	CONCLUIDO	
4	106090	Ampliación Plaza Boulevard Marco Tulio Rodriguez	El Progreso	L. 2454,714.29	CONCLUIDO	
5	106062	Construcción Casa De La Cultura	Mercedes	L. 8169,443.80	CONCLUIDO	
6	106007	Construcción Escuela De Música Mejicapa	Bo. Mejicapa	L. 2590,324.49	CONCLUIDO	
7	105994	Reposición Polideportivo Villas Del Rosario	Villas del Rosario	L. 7868,528.04	CONCLUIDO	
8	106003	Construcción Parque Recreativo Col. Moreno Y Hércules	Col. Moreno	L. 5459,590.31	CONCLUIDO	
9	106004	Remodelación Plaza San Sebastián	Gracias	L. 4029,707.82	CONCLUIDO	
10	106136	Construcción Salón Multiusos Bella Vista Y Pinalito	Col. Bella Vista	L. 2979,546.19	CONCLUIDO	
11	105992	Construcción Campo De Pelota Bella Vista Y Pinalito	Col. Bella Vista	L. 3197,439.41	CONCLUIDO	
12	105713	Ampliación Casa De La Juventud	Villas del Rosario	L. 6619,560.57	CONCLUIDO	
13	106328	Construcción Centro De Calidad De Vida Villami	Villami	L. 2447,597.92	CONCLUIDO	
14	107489	Centro De Aprender Para Emprender, Inst. Ramón Rosa	Barrio Mejicapa	L. 4776,414.85	9.00%	16.00%
TOTAL INVERSION				L. 56,023,066.07		

No. 3 Obras priorizadas en el municipio de La Lima, Cortés

No.	Código FHIS	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado	ESTADO	
					Avance Físico	Avance Financiero
1	105173	Construcción Centro Juvenil De Desarrollo Integral	Centro Sula	L. 3262,220.20	CONCLUIDO	
2	106182	Construcción Centro De Calidad De Vida Col. Nuevo San Juan	Col. Nuevo San Juan	L. 2961,528.33	100%	100%
3	106184	Construcción Centro De Calidad De Vida	Col Álvarez Martínez	L. 3068,158.19	93%	95%
4	105893	Remodelación Casa De La Cultura	Col. Sitraterco	L. 9605,935.76	En proceso de resolución de contrato	
5	105895	Remodelación Camino De Los Gatos Paseo Del Puente Y Áreas Aledañas	Bo. Centro Sur	L. 2831,897.23	93%	99%
6	106093	Remodelación Centro De Capacitación Digital	Bo. Centro Norte	L. 225,080.18	CONCLUIDO	
7	105738	Ampliación Plaza Juventud Barrio Centro Sur	Bo. Centro Sur	L. 7036,616.12	CONCLUIDO	
8	105897	Remodelación Mediana Sitraterco	Col Sitraterco	L. 8518,858.49	En proceso de resolución de contrato	
9	105900	Construcción Cancha Multiusos Colonia El Maestro	El Maestro	L. 2687,523.23	CONCLUIDO	
10	105902	Remodelación Parque De Los Pinos	Col. Los Pinos	L. 1775,191.17	CONCLUIDO	
11	107488	Remodelación Biblioteca Municipal	Bo. Centro Sur	L. 1500,285.33	Ejecución	
12	107610	Remodelación Centro de Aprender para Emprender, Instituto Técnico Vocacional Valle de Sula	Col. Oro Verde	L. 4168,239.85	Proyecto adjudicado, listo para dar inicio	
TOTAL INVERSION				L. 29,516,739.83		

A la Cartera de proyectos del Programa CONVIVIR se le adicionaran 8 obras de las cuales, 1 se encuentra terminada, 5 en ejecución y 2 adjudicadas y listas para dar inicio.

Nota: De los 39 proyectos actualmente aprobados en la cartera del Programa CONVIVIR, 2 proyectos en el Municipio de La Lima, Cortes se encuentran en el proceso para rescindirlos debido a que no hay factibilidad social ni apoyo por parte del municipio para continuar con la Ejecución de los mismos, dichos proyectos son: Mediana Sitraterco y Casa de la Cultura.

AVANCE DEL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES Y LABORALES DE JÓVENES Y COMPONENTE MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES RELEVANTES

En el Primer Trimestre del año 2020, se continuó con la formulación de procesos y ejecución de procesos de igual manera con la selección de participantes para estos dos (2) componentes esenciales del programa CONVIVIR, el cual se detalle a continuación un cuadro resumen de la situación de cada uno de ellos:

#	ACTIVIDADES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS	DIFICULTADES
CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL IDECOAS/FHIS Y FIPADEH PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES CON ACTORES RELEVANTES:				
Porcentaje de ejecución Adendum No. 05: 80%				
Situación Actual: En ejecución Adendum No. 05: Modelo de Gestión y Mantenimiento ORMAG				
Adendum de Tiempo: mayo del 2020				
1	Legalización y personería jurídica de la ORMAG Municipal.	Se realizaron una serie de acciones enfocadas en los procedimientos para legalizar las Organización para la Gestión y Mantenimiento (ORMAG) y conseguir con ello la debida personería jurídica ante la DIRSAG, para ello se revisaron los documentos que rigen las organizaciones de sociedad civil, en este caso los estatutos y el reglamento de funcionamiento de las ORMAG (documentos elaborados en el trimestre pasado) pero que han tenido su debido seguimiento a través de FIPADEH	Tres (03) Documentos de personería jurídica elaborados y aprobados por miembros de la comunidad y miembros de corporación municipal. Las personerías jurídicas de los 3 municipios, han sido ingresadas en las oficinas de la DIRSAG para su debida acreditación como organización de sociedad civil dirigida bajo el enfoque de gestión y desarrollo local, cabe mencionar que las ORMAG como modalidad de participación comunitaria será la primera en el país en su naturaleza de objetivos y funcionamiento.	
2	Planes de Revitalización, gestión y mantenimiento de Espacios Públicos propuestos por las ORMAG	Las ORMAG han sido capacitadas para formular planes enfocados al uso adecuado de los espacios del Programa CONVIVIR, en este sentido conjuntamente con el equipo de FIPADEH y los equipos municipales han formulado un plan de Revitalización, gestión y mantenimiento por proyecto.	Se cuenta con 11 planes de revitalización Gestión y mantenimiento de los siguientes proyectos: En Siguatepeque: 1. Centro de calidad de Vida el Carmen 2. Centro de calidad de vida La Crucita. 3. Centro de calidad de Vida el Porvenir. 4. Centro de calidad de vida, Barrio San Juan. 5. Centro de calidad de vida Noé cruz Villeda. 6. Campo de pelota Col, Mata En La Lima: 1. Plaza Recreativa Col. El Maestro. 2. Parque Los Pinos.	Ha sido un desafío involucrar en proceso de participación a miembros de la comunidad que o poseen experiencia en la implementación de medidas sociales, para ello se requiere un apoyo constante de la municipalidad y otras secretarías de Estado para implementar Programa Sociales enfocados en el desarrollo de la población joven, al igual que medidas de prevención de violencia.
3	Metodología PEC actualizada para su implementación en			Las mayores dificultades se han encontrado en los aportes de todas las partes involucradas, una



#	ACTIVIDADES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS	DIFICULTADES
	contextos urbanos por el Programa CONVIVIR.	Durante este trimestre se concluyó con el proceso de revisión a profundidad de la información contenida de los manuales PEC y se incluyó un guion metodológico para el capacitador, de esta manera el programa deja una guía didáctica específica para inducir los procesos de capacitación comunitaria con el nivel que se requiere	<p>3. Centro de calidad de vida Nuevo San Juan.</p> <p>4. Centro de Calidad de vida Álvarez Martínez.</p> <p>5. Plaza de la juventud, paseo de los gatos y achines</p> <p>El Programa CONVIVIR cuenta para la Fase II con la Metodología PEC que incluye 8 manuales enfocado a la participación de la comunidad, juventud y el abordaje de prevención de violencia comunitario con un Manual Introdutorio que no existía anteriormente.</p>	adaptación de contenidos requiere de la experiencia de haber implementado la metodología, en este sentido los aportes han sido profundos y se ha requerido tiempo para que el equipo asimile y dé a conocer
<p>CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL IDECOAS/FHIS Y EL CENET PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD JUVENIL</p> <p>Porcentaje de ejecución: 70% (Tentativo)</p> <p>Adendúm de Tiempo (mayo 2020)</p>				
01	Ajustes de las estrategias de empleabilidad y documentos de respaldo como el análisis de contexto, análisis de contexto y Oportunidades productivas de los 3 municipios	En este caso el CENET realizó la incorporación de las observaciones realizadas por el equipo Convivir y los técnicos municipales de los municipios. Se cuentan con los documentos de Siguatepeque y Gracias, quedando pendiente la Lima ya que es el municipio que requería mayor incorporación de ajustes.	<p>Dos (02) documentos de estrategia de empleabilidad juvenil con observaciones incorporadas.</p> <p>96 jóvenes han sido identificados con perfil potencial para incorporarse en actividades de emprendimientos en los Kioscos Convivir</p>	Se posponen los diplomados formativos en inserción laboral por la situación provocada por la Pandemia Coronavirus, lastimosamente el diplomado está planificado bajo la modalidad presencial, en este caso por temas de seguridad no es posible realizarlo de esta forma, de igual manera conjuntamente con la Coordinación, la Asistencia Técnica y el CENET tomaron las consultas de los participantes y no poseen las condiciones tecnológicas para conectarse virtualmente, llegando a la conclusión que las condiciones emocionales, sociales y económicas causadas por la pandemia en la población no son las óptimas para desarrollar proceso de enseñanza aprendizaje,
2.	.Jóvenes emprendedores y el uso de los Kioscos CONVIVIR.	El CENET ha desarrollado una serie de acciones para dar seguimiento a los jóvenes identificados como principales emprendedores de los Kioscos, siendo prioridad lo jóvenes formados por el programa, sin embargo, la oportunidad se ha ampliado a jóvenes de todo el municipio que posean el perfil para emprender en los kioscos. De igual manera se ha incorporado elaborar un reglamento para el uso de los kioscos, siendo este un instrumento que ayudara a las ORMAG para activar los kioscos dando prioridad a los jóvenes con los debidos procedimientos administrativos según la ley		

#	ACTIVIDADES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS	DIFICULTADES
CONVENIO DE COOPERACION ENTRE E IDECOAS/FHIS Y LA FUNDACION ANED PARA E DESAROLO DE LA SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS DEL PROGRAMA Y EL LINEA DE BASE FASE CUATRO: Adendum de Tiempo: 30 de marzo 2020 Porcentaje de ejecución 95%.				
4	Finalizados Documentos de Línea Base, sistematización de Experiencia del Programa e Historias de Experiencia de Jóvenes finalizado	Se realizó una revisión exhaustiva de cada uno de los documentos ya que expresan la experiencia vivida en cada uno de los componentes aportando elementos importantes para la implementación del Programa en su Fase II, de igual manera ha sido muy valioso para el Programa escribir los testimonios de los jóvenes y como han impactado en sus vidas las medidas que el Programa ha desarrollado. En esta última etapa de parte de ANED tuvimos el apoyo del Doc. Mario Posas un reconocido sociólogo del país quien dio un aporte importante desde el punto de vista sociológico comunitario del país y como el Programa ha realizado importantes aportes no solo en infraestructura sino a nivel social	Finalizados con su respectiva diagramación los documentos Líneas de Base al igual que las historias de éxito de los jóvenes (Se anexa documentos preliminares de Línea Base e historias de éxito de los jóvenes). Documentadas las experiencias de éxito del Programa con testimonios de 15 jóvenes como participantes directos	Los documentos delimitados en este proceso no solo contribuyen a nivel de información de resultados, sino al cambio de paradigmas sociales que los gobiernos locales y las comunidades han podido experimentar, este trabajo ha llevado un esfuerzo excesivo a nivel técnico y retrasos de tiempo, ya que documentar la experiencia de CONVIVIR implica una combinación de muchos factores no fáciles de concretizar, sin embargo, hemos logrado documentar todas las acciones del Programa
Contrato de un consultor especialista en el are de café Adendum al 30 de mayo. Porcentaje de ejecución: 70%				
5	Seguimiento de la cafetería Café	El consultor especialista en temas de café ha realizado reuniones y seguimiento con los equipos municipales y jóvenes ya que de manera conjunta con los participantes se ha realizado una propuesta de plan de negocios municipal para implementar una estrategia, Se profundizo en el desarrollo del presupuesto municipal para el funcionamiento de la cafetería y de parte de la Coordinación del Programa realizo las especificaciones técnicas para la compra de equipo especializado en barismo.	<ul style="list-style-type: none"> El proceso de compra de equipo especializado en café ha sido ingresado de manera oficial 	Después de hacer una búsqueda extensiva de empresas que ofrezcan equipamientos adecuados en temas de barismo, se llegó a una lista corta de empresas las cuales no fueron fáciles de encontrar y el tiempo para la compra ha sido afectado
Contrato de un consultor especialista en gestión cultural: Adendum de tiempo: 30 de marzo Porcentaje de avances: 30%				
6	<ul style="list-style-type: none"> Reuniones con los gobiernos locales para socializar el proceso y 	Es importante mencionar que se organizó rubrica de contenidos basados en el marco político de la	<ul style="list-style-type: none"> Inicio de los talleres en gestión cultural en siguatepeque con 30 participantes y actores claves 	Debido a la pandemia del coronavirus no fue posible dar inicio con el proceso



#	ACTIVIDADES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS	DIFICULTADES
	<p>tomar decisiones de listado de participantes y de los coordinadores locales a nivel en temas culturales</p> <ul style="list-style-type: none">• Inicio de actividades formativas en el municipio de Siguatepeque y Gracias	<p>gestión cultural del país y como debe ser el manejo y funcionamiento de las Casas de la Cultura, según la ley del patrimonio cultural del país, en ese sentido se realizó una revisión de contenidos. De igual manera por municipio se entrevistó a varios profesionales para coordinar los temas de gestión cultural insitu,</p>	<p>en temas de cultura y participación comunitaria (CEP, CCS y ORMAG)</p>	<p>formativo en Gracias, sin embargo el consultor ha tratado de avanzar en siguatepeque, cabe mencionar que la respuesta vía virtual no está siendo funcional ya que los participantes y la condición del país no predisponen proceso de aprendizaje óptimos</p>

CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)



✓ Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)

i. Objetivo General

El propósito de esta Actividad es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

ii. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en las cinco municipalidades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Tela y La Ceiba. Las comunidades específicas de intervención serán identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

iii. Descripción del Proyecto

Esta Actividad ayudará al GdeH (representado a través de FHIS) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otras partes interesadas. La Actividad incluye dos resultados complementarios: Resultado 1: Mejora de la infraestructura comunitaria, las actividades responderán a las prioridades de infraestructura comunitaria para abordar la seguridad ciudadana. Resultado 2: Aumento de la cohesión comunitaria, considera que la forma en que las intervenciones de infraestructura son concebidas, diseñadas y ejecutadas pueden desempeñar un papel directo en el aumento de la cohesión social y comunitaria y promover un marco holístico de prevención de la violencia. Los proyectos bajo la Actividad incluirán instalaciones educativas, centros de salud, alumbrado público, espacios comunitarios más seguros, centros de alcance y comunitarios, centros vocacionales, jardines comunitarios, parques, espacios

recreativos, paradas de buses, accesos peatonales, mejoras al alumbrado de calles, señalización, instalaciones para el sector seguridad y justicia, así como otros proyectos de infraestructura de pequeña escala que se acuerde entre las Partes.

iv. Monto del Convenio

Presupuesto total estimado: \$14,637, 541.74, de los cuales, fondos de donación de USAID: \$11, 710,033.39; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$ 2, 927,508.35 (efectivo: \$ 2,127,508.35 y especies: \$ 800,000.00).

v. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	23,226,555.00	21,906,553.68	94.32%
2019	60,781,669.00	60,781,669.00	100.00%
2020	145,322,291.00	5,461,260.49	3.76%

vi. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios Directos 2020
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	2	2,478,390.56	22	2,085
EDUCACION	1	1,239,195.28	20	47
TOTAL	3	3,717,585.84	42	2,132

vii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2020	Mto. Ejecutado 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios directos 2020
ATLANTIDA	2	2,478,390.56	30	832
FRANCISCO MORAZAN	1	1,239,195.28	15	1,300
TOTAL	3	3,717,585.84	45	2,132

viii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2020
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	1,633,634.65
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	110,400.00
TOTAL	1,744,034.65

ix. Principales Logros (enero-marzo 2020)

A. PROYECTOS EN FORMULACION:

FORMULACION INTERNA					
	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO EN FORMULACION	STATUS	% DE AVANCE
1	Tela	Centro	UDEP-S TELA Instancia Municipal de Prevención	EN FORMULACION	95%
2	MDC	Varias colonias unidas	UMEP-2 Señalética en el Sector de las colonias de la RECUD	EN FORMULACION	65%
3	MDC	Col. San Martín	UMEP-2 Obras complementarias CDA San Martín	EN FORMULACION	0%
4	MDC	Col. Los Pinos	Reparación CEB Jaime Romero Zuniga	EN FORMULACION	80%
5	MDC	Col. Estados Unidos	UMEP-1 Techos de cancha CDA USA	CONTROL DE CALIDAD	100%
6	Choloma	Col. La Granja	Reparación Jardín de Niños la Unidad	EN FORMULACION	0%
7	SPS	Col. Arenales	Reparación y ampliación CDA Arenales Fase II	EN FORMULACION	95%
8	Tela	Col. San José	Reparación Módulo Sanitario CEB Antonio José Coello	EN FORMULACION	30%
9	MDC	Col. Centeno	Reparación de CEB Felipe de Borbón	EN FORMULACION	90%
10	Tela	Tornabé	CEB Marco Aurelio Soto	EN FORMULACION	10%
11	Tela	Col. San Alejo	Reparación Triunfo de la Cruz Fase III	EN FORMULACION	80%



FORMULACION EXTERNA					
	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO EN FORMULACION	STATUS	% PROYECTADO
1	SPS	Col. Las Brisas	Ampliación Instituto Polivante las Brisas Fase II	EN DISEÑO	50%
2	SPS	Col. Calpules	CEB Alex E. Alanis Lagos-4	EN DISEÑO	50%
3	Choloma	Col. Quebrada	Escuela La Fraternidad-7	EN DISEÑO	50%
4	Choloma	Col. La Granja 1 y 2	Pavimentación e Iluminación Colonia La Granja I y II	EN DISEÑO	100%
5	Choloma	Sector López Arellano	Pavimentación e Iluminación Colonia López Arellano	EN DISEÑO	100%
6	Choloma	Col. Gale	Iluminación y Área recreativa Gale	EN DISEÑO	25%
7	Choloma	Choloma Centro	Construcción Instancia Municipal de Prevención	EN DISEÑO	25%
8	La Ceiba	Barrio El Confite	Reparación CEB José Valentin Vasquez	EN DISEÑO	25%
9	La Ceiba	Setor Bonitillo	Construcción Centro de Alcance Bonitillo	EN DISEÑO	60%
10	MDC	Col. Nueva Suyapa	Mejoras al Centro de Alcance Nueva Suyapa	EN DISEÑO	100%
11	MDC	Col. Nueva Suyapa	Pavimentación y Ruta Segura Nueva Suyapa	EN DISEÑO	100%
12	La Ceiba	Col. La Travesía	Reparación CEB Ramón Montoya Cerrato	EN DISEÑO	65%
13	MDC	Col. Las Torres	Reparación Cancha Multiusos	EN PRE-DISEÑO	15%
14	MDC	Col. El Pedregal	UMEP-3 Ruta Segura Puente el Pedregal-Col. A. Flores mas Cancha de las Torres	EN PRE-DISEÑO	15%

i. Problemática en la ejecución del I trimestre

Por el estado de emergencia a nivel nacional emitido mediante Decreto, se suspendió la ejecución de proyectos, lo que conlleva a una reprogramación de las actividades (ver anexo 1).

Acciones realizadas por la DIM:

La Directiva DIM desarrollo un plan de contingencia para esta etapa de emergencia, con el objetivo de hacer frente a los desafíos que se podrán tener.

✓ **Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)**

ii. Antecedente

Las pobres condiciones sociales y económicas son especialmente pronunciadas en el occidente de Honduras, extrema pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático, bajos niveles educativos, migración, falta de acceso a los servicios básicos y otros retos socioeconómicos son endémicos. La provisión de servicios básicos de educación y nutrición son escasos en la zona de occidente y es difícil el acceso a los ya existentes, así mismo la gestión de servicios de educación, nutrición y agua y saneamiento son deficientes por lo que los ciudadanos cuentan además con pocos espacios de participación para mejorar sus vidas a nivel de hogar y sus vidas productivas, lo que genera una gran brecha de pobreza.

En este sentido se busca a través de proyectos de infraestructura de pequeña escala, la generación de accesos para la comunidad a espacios de participación que sirvan como plataforma para impulsar el desarrollo sostenible de la región, logrando satisfacer necesidades no satisfechas de algunos de los servicios básicos para generar un efecto multiplicador en la zona occidental del país.

Actualmente, la **AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID)** en apoyo al Gobierno de Honduras, ha asignado fondos de donación para la ejecución de proyectos de infraestructura a través de la **SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO, FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (SEDECOAS/FHIS)**, que vengán a mejorar las condiciones en las comunidades seleccionadas en el occidente de Honduras.

En base a lo anterior, surge la Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras, mediante la cual se ha considerado proveer esfuerzos de infraestructura a pequeña escala para mejorar la entrega de servicios a la población, mejorando condiciones de pobreza, vulnerabilidad al cambio climático, bajos niveles educativos e inseguridad alimentaria debido a la falta de acceso a servicios básicos. A su vez con esto se pretende crear una plataforma de participación ciudadana para cimentar las bases de una estructura comunitaria más efectiva, jugando un rol importante en la mejora de la entrega de servicios locales en el Occidente de Honduras.- El área de intervención será enfocada en las zonas de mayor pobreza, específicamente está orientada a seis departamentos del Occidente de Honduras.

Se ha planteado como meta beneficiar comunidades ubicadas en los seis departamentos de la zona de occidente de Honduras, su mayoría de la zona rural, habitantes en comunidades que presentan condiciones de pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático, bajos niveles educativos, migración y falta de acceso a servicios público.

La administración y ejecución de la Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH), financiado con fondos USAID, estará a cargo del SEDECOAS/FHIS, a través de la Dirección de Infraestructura Mayor (DIM).

iii. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en los departamentos de Ocotepeque, la Paz, Copan, Intibucá, Santa Bárbara y Lempira y zonas occidentales específicas de intervención identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

iv. Monto del Convenio

El monto total de la Actividad es de \$3,750,000.00 (USAID \$ 3,000,000.00, Gobierno de Honduras \$ 750,000.00).

v. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2019	6,190,650.00	5,981,569.54	96.62%
2020	65,583,096.00	0.00	0.00%

vi. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios Directos 2020
EDUCACION	0	57	471
TOTAL	0	57	471

vii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2020	Empleos Generados 2020	Beneficiarios directos 2020
INTIBUCÁ	0	15	248
LA PAZ	0	22	79
OCOTEPEQUE	0	20	144
TOTAL	0	57	471

viii. Principales Logros (enero-marzo 2020)

A. PROYECTOS FINALIZADOS

A la fecha no se reportan proyectos finalizados en vista que iniciaron en el primer trimestre del 2020.

B. PROYECTOS A INICIAR

A continuación se presentan los proyectos en proceso previo a ejecución:

No.	Tipo de Proyecto	Ubicación	Monto del Proyecto	Status
1	Ampliación Centro de Educación Básica Mariano Martínez	Valle de Ángeles, Opatoro, La Paz	L 5.500.000,00	Pendiente de dar inicio.
2	Ampliación Escuela Jose Cecilio Del Valle	Yaunera, San Pedro, Copán	L 2.100.000,00	Pendiente de dar inicio.
3	Reposición Escuela Nueva Generación Sur	La Estancia, Santa Ana, La Paz	L 2.500.000,00	Pendiente de dar inicio.
4	Ampliación Centro De Educación Básica Tiburcio Carias Andino	Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro, Intibucá	L 5.600.000,00	Pendiente de dar inicio.
5	Construcción Letrinas de Cierre Hidráulico en Comunidades Varias	Comunidades Varias, Nuevo Celilac, Santa Bárbara	L 5.600.000,00	Pendiente de dar inicio.
6	Ampliación Escuela José Olivo Tercero	El Descansadero, San Nicolás, Santa Bárbara	L 2.000.000,00	Pendiente de dar inicio.
7	Ampliación Centro de Salud Rural (CESAR) ARCAMON	Arcamon, San Marcos de Caiquin, Lempira	L 2.500.000,00	Pendiente de dar inicio.

8	Reposición Escuela Ramón Amaya Amador	Planes Arriba, Cucuyagua, Copán	L 2.800.000,00	Pendiente de dar inicio.
9	Ampliación Escuela Eusebio Amaya Gomez	La Puerta, Belén, Lempira	L 5.700.000,00	Pendiente de dar inicio.
10	Ampliación Centro de Educación Básica Prudencio Arita	Llano Largo, La Labor, Ocotepeque	L 5.550.000,00	Pendiente de dar inicio.
11	Ampliación Escuela Luis Alonzo Ayala	La Meande, San Manuel de Colohete, Lempira	L 5.200.000,00	Pendiente de dar inicio.
TOTAL PROYECTOS POR INICIAR			L. 45,050,000.00	

C. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

A continuación se presentan los proyectos en ejecución:

No.	Tipo de Proyecto	Ubicación	Monto del Proyecto	Status
1	Ampliación Centro de Educación Básica Alvaro Contreras	Aldea Azacualpa, Sensenti, Ocotepeque	L 4.494.819,97	44%
2	Ampliación Centro de Educación Básica Francisco Morazán	Planes, Yamaranguila, Intibucá	L 4.748.951,39	45%
3	Reposición Escuela Unión Y Fe	Cerro Bueno, San José, La Paz	L 3.618.292,58	22%
TOTAL PROYECTOS			L. 12, 862,063.94	

ix. Problemática en la ejecución del I trimestre

Las actividades de capacitación, ejecución física y financiera han sido suspendidas, por el toque de queda absoluto decretado por el Gobierno de la República por la Pandemia del COVID-19. (ver anexo 1)

Acciones realizadas por la DIM:

Se está realizando seguimiento vía teléfono con los CEPS por medio del personal de campo para ir informando sobre las medidas dictadas por el Gobierno de la Republica de Honduras.



ANEXO 1



COMUNICADO

ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL SOBRE LA PROPAGACIÓN DE COVID-19, Y ACATANDO ORDENES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS.

SE COMUNICA QUE QUEDAN SUSPENDIDAS LAS EJECUCIONES DE TODOS LOS PROYECTOS ADMINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS), ESTAS MEDIDAS TIENE VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA LUNES 16 DE MARZO HASTA EL DÍA DOMINGO 22 DE MARZO DEL CORRIENTE AÑO.

RECORDATORIO: DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 186 DEL CÓDIGO PENAL, "SERÁ PENADO CON RECLUSIÓN DE SEIS (06) MESES A DOS (02) AÑOS QUIEN INFRINJA MÁS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD SANITARIA CON EL FIN DE IMPEDIR LA INTRODUCCIÓN O PROPAGACIÓN DE UNA EPIDEMIA, O DE UNA EPIZOOTIA SUSCEPTIBLE DE AFECTAR A LOS SERES HUMANOS. LA PENA SE AUMENTARA EN UNA CUARTA PARTE CUNADO EL AUTOR FUERA FUNCIONARIO O EMPLEADO DE SANIDAD, MÉDICO, FARMACÉUTICO U ODONTÓLOGO O EJERCIERE UNA DE LAS ACTIVIDADES AUXILIARES DE ESTAS PROFESIONES".

A LOS 16 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, COMAYAGÜELA M.D.C.
FRANCISCO MORAZAN



Por:

ING. NELSON MARÓQUEZ EUCEDA
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS





COMUNICADO

ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19 Y ACATANDO LAS DISPOSICIONES Y ORDENES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS.

SE COMUNICA; A TODOS LOS INVOLUCRADOS E INTERESADOS, QUE QUEDAN SUSPENDIDAS LAS EJECUCIONES Y/O AVANCES DE TODOS LOS PROYECTOS ADMINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS). ESTÁS MEDIDAS TIENEN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA LUNES VEINTITRÉS (23) DE MARZO HASTA EL DOMINGO DOCE (12) DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

RECORDATORIO: DE ACUERDO AL ARTÍCULO 186 DEL CÓDIGO PENAL, "SERÁ PENADO CON RECLUSIÓN DE SEIS (06) MESES A DOS (02) AÑOS QUIEN INFRINJA, LAS MEDIDAS ADAPTADAS POR LA AUTORIDAD SANITARIA CON EL FIN DE IMPEDIR LA INTRODUCCIÓN O PROPAGACIÓN DE UNA EPIDEMIA, O DE UNA EPIZOOTIA SUCEPTIBLE DE AFECTAR A LOS SERES HUMANOS. LA PENA SE AUMENTARÁ EN UNA CUARTA PARTE CUANDO EL AUTOR FUERA FUNCIONARIO O EMPLEADO DE SANIDAD, MÉDICO, FARMACÉUTICO U ODONTOLOGO O EJERCIERE UNA DE LAS ACTIVIDADES AUXILIARES DE ESTAS PROFESIONES."

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, A LOS 31 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.

ING. NELSON MARQUEZ EUCEDA

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y
SANEAMIENTO (SEDECOAS).
