



# GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



---

## SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO SEDECOAS

### FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (SEDECOAS/FHIS)

### Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual POA-Presupuesto

**II Trimestre 2021**

## **Indicé**

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introducción .....</b>                                                                                        | <b>3</b>  |
| <b>Antecedentes.....</b>                                                                                         | <b>3</b>  |
| <b>Misión: .....</b>                                                                                             | <b>4</b>  |
| <b>Visión: .....</b>                                                                                             | <b>4</b>  |
| <b>Valores: .....</b>                                                                                            | <b>4</b>  |
| <b>Resumen Ejecutivo .....</b>                                                                                   | <b>5</b>  |
| <b>Situación Actual de los Programas: .....</b>                                                                  | <b>6</b>  |
| <b>Proyectos FHIS .....</b>                                                                                      | <b>8</b>  |
| <b>Ejecución Presupuestaria por Programas 2021 .....</b>                                                         | <b>9</b>  |
| <b>Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2021 .....</b>                                                         | <b>10</b> |
| <b>Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Segundo Trimestre 2021 .....</b>                                      | <b>11</b> |
| <b>Ejecución Gasto Operativo Segundo Trimestre del 2021.....</b>                                                 | <b>12</b> |
| <b>Cuadro por Sector 2021 (Ejecutado) .....</b>                                                                  | <b>14</b> |
| <b>CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.....</b>                                                           | <b>15</b> |
| ✓ <b>Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB).....</b>                                | <b>15</b> |
| <b>CARTERA BANCO MUNDIAL.....</b>                                                                                | <b>21</b> |
| ✓ <b>Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE 6822-HN).....</b> | <b>21</b> |
| <b>CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA .....</b>                                              | <b>28</b> |
| ✓ <b>Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE) .....</b>  | <b>28</b> |
| <b>CARTERA KfW Entwicklungsbank .....</b>                                                                        | <b>31</b> |
| ✓ <b>Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V .....</b>                  | <b>31</b> |
| ✓ <b>Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) ..</b>                       | <b>36</b> |
| <b>CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)46</b>                                      |           |
| ✓ <b>Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS) .....</b>                               | <b>46</b> |
| ✓ <b>Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH) .....</b>             | <b>52</b> |
| <b>PROGRAMA 15: RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA NACIONAL .....</b>                                                | <b>57</b> |
| ✓ <b>Respuesta a Emergencia Generados por los Huracanes Eta e Iota.....</b>                                      | <b>57</b> |

## **Introducción**



El presente informe es la recopilación de las actividades e inversiones realizadas por el SEDECOAS/FHIS durante el segundo trimestre del 2021.

## **Antecedentes**

De acuerdo al Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-056-2019 se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), la cual debe de promover el Desarrollo Comunitario por medio de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos, en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerables de Honduras quien para el desarrollo de sus funciones debe contar con una Subsecretaría de Estado.

Se adscribe a dicha Secretaría de Estado, El Instituto Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS).

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es un organismo Desconcentrado de la Presidencia de la República, creado el 22 de febrero de 1990 y extendida su vida legal hasta el año 2022 según decreto No. 222-2010 cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados, en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social y/o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Asimismo, asesorará a los gobiernos locales con respecto a los procesos de captación de recursos de las fuentes de financiamiento nacionales y/o externas y las asiste en la transferencia de las capacidades técnicas y administrativas, para convertir a estos gobiernos locales en administradores eficientes de sus programas y proyectos, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Nación en aplicación del principio de Descentralización.

### **Misión:**

“Somos una Institución estatal, desconcentrada, técnica y captadora de recursos que promueve el desarrollo local sostenible, participativo e incluyente mediante el fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, en alianza con socios estratégicos para desarrollar obras de infraestructura y proyectos de orientación social de acuerdo al plan de nación y visión de país de forma transparente y eficiente, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable de Honduras”.

### **Visión:**

“Ser para el año 2022, la Institución líder en gestión y fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, para la ejecución de proyectos, que contribuya equitativamente al desarrollo sustentable nacional”.

### **Valores:**

- Ética: Ejercicio de las funciones con sujeción a las normas morales que promuevan la confianza de la población hondureña.
- Integridad: Actuación sustentada en la honradez, prudencia, entereza, rectitud y firmeza.
- Compromiso: Ejecución de proyectos que coadyuven al desarrollo local.
- Transparencia: Amplia difusión de información sobre nuestras actuaciones. Rendición de cuentas ante la sociedad.
- Lealtad: Actuar con fidelidad y rectitud hacia el FHIS y compañeros de trabajo, con el objetivo de identificarse con la institución.
- Equidad: El FHIS no hace distinción de credo, raza, de ninguna otra forma de discriminación humana.


## Resumen Ejecutivo

SEDECOAS/FHIS, llega hasta los lugares más recónditos del país, para contribuir a mitigar las necesidades de la población más pobre y vulnerable a través de respuestas rápidas y concretas con proyectos de Agua y Saneamiento, Educación, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural.

El presupuesto del FHIS para la gestión 2021 al 30 de junio asciende a 1.576 Millones de Lempiras:

| Fuente       | Presupuesto Aprobado       | Presupuesto Vigente        | % de Participación en el Presupuesto Vigente |
|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>BID</b>   | L. 105.265.786,00          | L. 99.272.463,00           | 6%                                           |
| <b>BM</b>    | L. -                       | L. 188.804.388,00          | 12%                                          |
| <b>BCIE</b>  | L. 973.686.940,00          | L. 522.588.163,00          | 33%                                          |
| <b>USAID</b> | L. 249.987.754,00          | L. 149.809.726,00          | 10%                                          |
| <b>GOH*</b>  | L. 307.808.758,00          | L. 401.297.758,00          | 25%                                          |
| <b>KfW</b>   | L. 153.385.842,00          | L. 214.439.643,00          | 14%                                          |
| <b>TOTAL</b> | <b>L. 1.790.135.080,00</b> | <b>L. 1.576.212.141,00</b> | <b>100%</b>                                  |

\* Incluye costo Operativo del FHIS



### **Situación Actual de los Programas:**

1. Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), PROYECTOS: Los Proyectos de integración urbana el cual incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y obras de mitigación, al 31 de junio de 2021 tienen un avance del 62% al 86%.  
Se finalizó el diseño de obras del Proyecto de Integración Urbana en colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén No. 2, Brisas del Mogote Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 3,035, predios. Se ha iniciado el proceso de licenciamiento ambiental.
2. Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE), Cuenta con una estructura presupuestaria vigente por L. 188,804,388.00, su primer desembolso (Anticipo) a la Cuenta Especial por \$ 4,367,894.00 se realizó el 28 de junio de 2021.  
Publicación de expresiones de interés de los primeros puestos claves de la Unidad Ejecutora del Proyecto. Avances en la revisión de documentación de gastos efectuados por SEDIS y COPECO para la atención de damnificados por la emergencia causada por los ciclones ETA e IOTA en Honduras, por un monto de L 285.9 millones que será reembolsado bajo el componente 1 del Proyecto y 41 subproyectos formulados en el sector de educación.
3. Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE), Firma del Plan de Inicio con el PNUD para la compra de tabletas por el monto de \$4.620 millones de dólares, proceso que ya fue realizado y evaluado por el PNUD, donde se estarán desembolsando dicha cantidad una vez se apruebe la modificación presupuestaria solicitada.  
Se realizó el proceso para la contratación de formuladores encontrándose el informe de adjudicación en previa revisión por parte del Organismo Financiador
4. Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE III y IV: Se iniciaron todos los proyectos en el departamento de Gracias a Dios, se han comenzado actividades previas para el inicio de la fase V.
5. Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR), Inicio de CONVIVIR Fase II, un préstamo de 6 millones de Euros que tiene fecha de apertura del 14 de julio del año 2021, el cual inicia con la presencia de la Asistencia Técnica.

Actualmente se reprogramo el POA 2021, tomando en cuenta los tiempos de los procesos para la ejecución de los fondos.

6. Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS) Se gestionó la firma ante USAID y SEFIN para la carta de ejecución 22 de ICS, la cual fue firmada el 26 de marzo del 2021, ampliando la donación hasta marzo del 2022.
7. Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH): Serán regularizados 23.7 Millones correspondientes a la ejecución de Fondos 22 reembolsado por USAID de Enero a Junio 2021.

Considerando los plazos de vencimiento de las cartas de ICS & PIOH, se está trabajando el nuevo plan de Trabajo y Carta de Ejecución con acompañamiento de USAID, para enviar a aprobación y firma, procurando que esto no vaya a generar atrasos en los próximos trimestres.


## Proyectos FHIS

| Fuente       | Nombre del Proyecto                                                                       | Nombre Corto     | Sector                                                                                                       | Modalidad Ejecucion  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>BID</b>   | Programa Conviviencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios                                 | PCCMB 4518/BL-HO | Infraestructura Social                                                                                       | Centralizados        |
| <b>BM</b>    | Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota      | PRE 6822-HN      | Infraestructura Social                                                                                       | Centralizados        |
| <b>BCIE</b>  | Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras | MIFE             | Infraestructura Escolar                                                                                      | PEC-Descentralizados |
| <b>KFW</b>   | Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar SE-FHIS FASE IV y V                      | PROMINE          | Infraestructura Escolar                                                                                      | PEC-Descentralizados |
|              | Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras                       | CONVIVIR         | Infraestructura Social y Fortalecimiento de las Capacidades de los Jóvenes                                   | Descentralizados     |
| <b>USAID</b> | Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana                                   | ICS              | Recuperación de espacio públicos e infraestructura escolar para la mejora de la seguridad ciudadana          | PEC/Centralizados    |
|              | Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras                           | PIOH             | Mejorar las condiciones de Infraestructura Básica para contribuir al desarrollo en el Occidente de Honduras. | PEC/Centralizados    |

### Ejecución Presupuestaria por Programas 2021


| Programa                                             | Presupuesto Aprobado       | Presupuesto Vigente        | Monto Planificado II Trimestre | Devengado del II Trimestre | Devengado Acumulado      | Disponible                 | % Ejecución II Trimestre/ Planificado II Trimestre | % Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Programa 1: Actividades Centrales                    | L. 307.808.758,00          | L. 347.808.758,00          | L. 97.677.194,12               | L. 105.220.123,51          | L. 138.585.596,79        | L. 209.223.161,21          | 108%                                               | 40%                                        |
| Programa 11: Infraestructura Rural                   | L. 51.310.735,00           | L. 59.299.860,00           | L. 16.822.245,00               | L. 1.050.500,00            | L. 1.050.500,00          | L. 58.249.360,00           | 6%                                                 | 2%                                         |
| Programa 12: Infraestructura Escolar                 | L. 1.099.842.778,00        | L. 719.436.802,00          | L. 49.731.493,00               | L. 26.431.222,71           | L. 38.236.268,74         | L. 681.200.533,26          | 53%                                                | 5%                                         |
| Programa 14: Fomento al Desarrollo Local             | L. 331.172.809,00          | L. 207.373.333,00          | L. 79.334.600,00               | L. 45.350.376,66           | L. 66.075.137,19         | L. 141.298.195,81          | 57%                                                | 32%                                        |
| Programa 15: Reconstrucción Infraestructura Nacional |                            | L. 53.489.000,00           | L. 17.829.666,00               | L. 8.400.719,07            | L. 8.400.719,07          | L. 45.088.280,93           | 47%                                                | 0%                                         |
| Programa 16: Reconstrucción Nacional Fuente Externa  |                            | L. 188.804.388,00          | L. 230.850,00                  | L. -                       | L. -                     | L. 188.804.388,00          | 0%                                                 | 0%                                         |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>L. 1.790.135.080,00</b> | <b>L. 1.576.212.141,00</b> | <b>L. 261.626.048,12</b>       | <b>L. 186.452.941,95</b>   | <b>L. 252.348.221,79</b> | <b>L. 1.323.863.919,21</b> | <b>71%</b>                                         | <b>16%</b>                                 |

#### Presupuesto Vigente

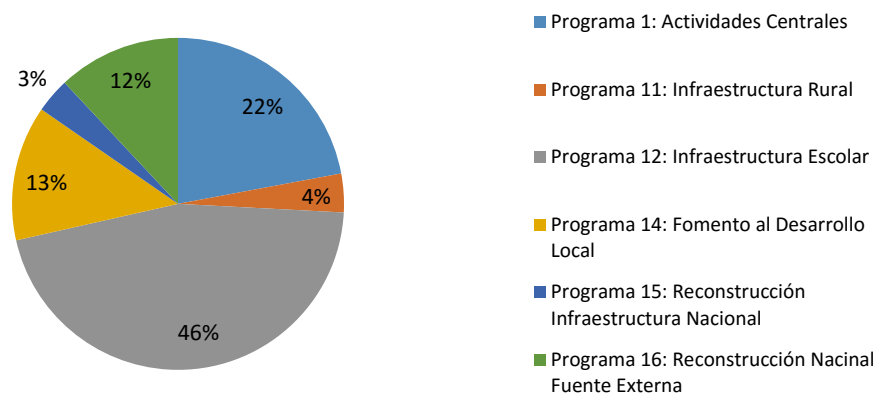


### Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2021

| Programa                                                                                  | Presupuesto Aprobado       | Presupuesto Vigente 2021   | Devengado del II Trimestre | Devengado Acumulado 2021 | % Ejecución al II Trimestre / Presupuesto Vigente |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Gasto Operativo/Gobierno                                                                  | L. 307.808.758,00          | L. 347.808.758,00          | L. 105.220.123,51          | L. 138.585.596,79        | 40%                                               |
| Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras                           | L. 51.310.735,00           | L. 59.299.860,00           | L. 1.050.500,00            | L. 1.050.500,00          | 2%                                                |
| Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V          | L. 126.155.838,00          | L. 196.848.639,00          | L. 26.431.222,71           | L. 38.236.268,74         | 19%                                               |
| Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras | L. 973.686.940,00          | L. 522.588.163,00          | L. -                       | L. -                     | 0%                                                |
| Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para Jovenes en Honduras CONVIVIR                 | L. 27.230.004,00           | L. 17.591.004,00           | L. -                       | L. 817.968,51            | 5%                                                |
| Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana                                   | L. 198.677.019,00          | L. 90.509.866,00           | L. 15.348.780,44           | L. 16.956.482,58         | 19%                                               |
| Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios                               | L. 105.265.786,00          | L. 99.272.463,00           | L. 30.001.596,22           | L. 48.300.686,10         | 49%                                               |
| Programa de Respuesta a Emergencia Generada por los Huracanes ETA e IOTA                  | L. -                       | L. 53.489.000,00           | L. 8.400.719,07            | L. 8.400.719,07          | 16%                                               |
| Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales ETA e IOTA      | L. -                       | L. 188.804.388,00          | L. -                       | L. -                     | 0%                                                |
| <b>TOTAL</b>                                                                              | <b>L. 1.790.135.080,00</b> | <b>L. 1.576.212.141,00</b> | <b>L. 186.452.941,95</b>   | <b>L. 252.348.221,79</b> | <b>16%</b>                                        |

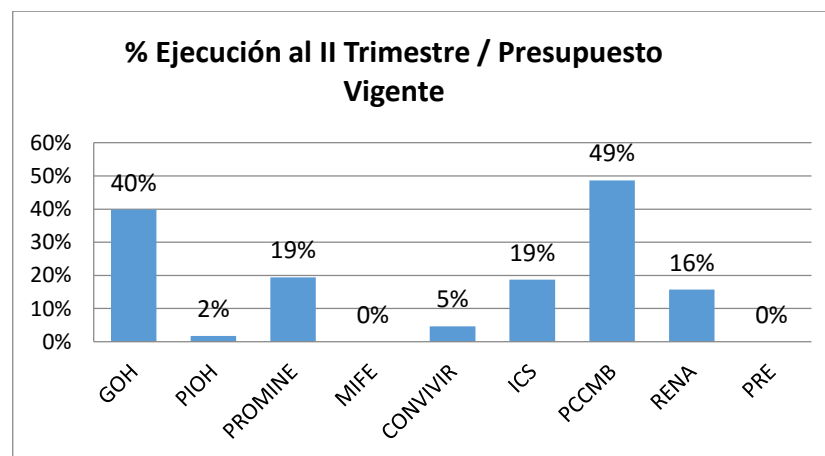

### Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Segundo Trimestre 2021

| Grupo                       | Aprobado                   | Presupuesto Vigente por Grupo | Devengado II Trimestre   | Devengado Acumulado al II Trimestre | Disponible                 | % Ejecución II Trimestre/ Presupuesto Vigente | % Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES        | L. 179.934.430,00          | L. 191.934.430,00             | 40.146.992,07            | L. 71.841.296,10                    | L. 120.093.133,90          | 21%                                           | 37%                                        |
| SERVICIOS NO PERSONALES     | L. 212.914.805,00          | L. 163.964.234,00             | 66.150.038,25            | L. 75.196.795,99                    | L. 88.767.438,01           | 40%                                           | 46%                                        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS    | L. 12.911.438,00           | L. 16.363.621,00              | 283.123,39               | L. 513.732,23                       | L. 15.849.888,77           | 2%                                            | 3%                                         |
| BIENES CAPITALIZABLES       | L. 1.382.531.629,00        | L. 1.164.977.316,00           | 79.851.784,24            | L. 104.768.393,47                   | L. 1.060.208.922,53        | 7%                                            | 9%                                         |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | L. 1.842.778,00            | L. 38.972.540,00              | 21.004,00                | L. 28.004,00                        | L. 38.944.536,00           | 0%                                            | 0%                                         |
| <b>Total</b>                | <b>L. 1.790.135.080,00</b> | <b>L. 1.576.212.141,00</b>    | <b>L. 186.452.941,95</b> | <b>L. 252.348.221,79</b>            | <b>L. 1.323.863.919,21</b> | <b>12%</b>                                    | <b>16%</b>                                 |

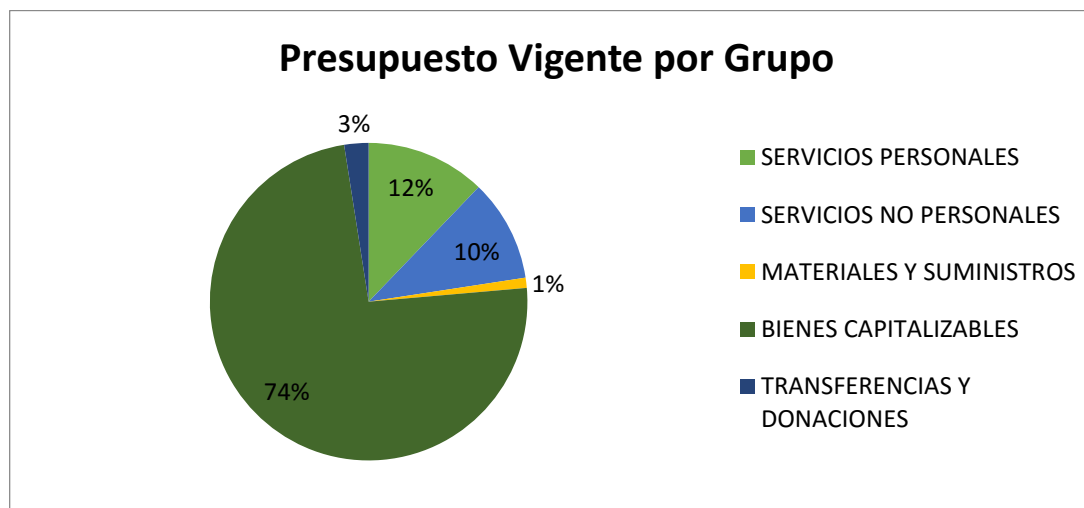

## Ejecución Gasto Operativo Segundo Trimestre del 2021

| OBJETO DEL GASTO | NOMBRE                                                             | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCION     | CREDITO DISPONIBLE |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 11100            | Sueldos Básicos                                                    | 18.952.542,00       | 8.781.493,75  | 10.171.048,25      |
| 11400            | Adicionales                                                        | 1579.378,00         | 848.220,93    | 731.157,07         |
| 11510            | Decimotercer Mes                                                   | 1579.378,00         | 114.919,72    | 1464.458,28        |
| 11520            | Decimocuarto Mes                                                   | 1579.378,00         | 1310.309,81   | 29.068,19          |
| 11600            | Complementos                                                       | 1263.502,00         | 948.937,08    | 314.564,92         |
| 11710            | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d | 2.748.118,00        | 1234.423,70   | 1513.694,30        |
| 11750            | Contribuciones para Seguro Social                                  | 708.292,00          | 295.827,98    | 412.464,02         |
| 12100            | Sueldos Básicos                                                    | 26.500.000,00       | 0,00          | 0,00               |
| 21110            | Suministro De Energía Eléctrica                                    | 100.000,00          | 66.559,63     | 33.440,37          |
| 21200            | Agua                                                               | 100.000,00          | 82.888,17     | 17.111,83          |
| 22100            | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales                         | 1000.000,00         | 0,00          | 347.672,38         |
| 26110            | Pasajes Nacionales                                                 | 84.189,00           | 19.422,96     | 846,04             |
| 27500            | Gastos Judiciales                                                  | 50.000.000,00       | 50.000.000,00 | 0,00               |
| 29100            | Ceremonial y Protocolo                                             | 300.000,00          | 104.389,88    | 26.000,00          |
| 47110            | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado              | 40.000.000,00       | 0,00          | 40.000.000,00      |
| 47210            | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público              | 26.500.000,00       | 14.733.197,93 | 11.766.802,07      |
| 51220            | Ayuda Social a Personas                                            | 72.540,00           | 28.004,00     | 536,00             |
| 54110            | Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)                 | 38.500.000,00       | 0,00          | 38.500.000,00      |
| 11100            | Sueldos Básicos                                                    | 19.707.213,00       | 9.044.812,70  | 10.662.400,30      |
| 11400            | Adicionales                                                        | 1634.280,00         | 603.996,70    | 1039.134,97        |
| 11510            | Decimotercer Mes                                                   | 1642.268,00         | 102.100,06    | 1540.167,94        |
| 11520            | Decimocuarto Mes                                                   | 1634.280,00         | 1566.357,33   | 75.181,84          |
| 11600            | Complementos                                                       | 1307.424,00         | 653.798,11    | 660.707,22         |
| 11710            | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones   | 2.857.546,00        | 1331.423,30   | 1526.122,70        |
| 11750            | Contribuciones para Seguro Social                                  | 1204.098,00         | 540.207,80    | 663.890,20         |
| 12100            | Sueldos Básicos                                                    | 37.800.485,00       | 16.923.058,20 | 15.423.005,80      |
| 12410            | Decimotercer Mes                                                   | 3.150.040,00        | 27.890,00     | 3.122.150,00       |
| 12420            | Decimocuarto Mes                                                   | 3.150.040,00        | 993.040,03    | 2.156.999,97       |
| 12550            | Contribuciones para Seguro Social                                  | 2.307.012,00        | 617.926,62    | 1685.113,26        |
| 16200            | Compensaciones                                                     | 1951.987,00         | 0,00          | 0,00               |
| 23200            | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte       | 10.000,00           | 10.000,00     | 0,00               |
| 24400            | Servicios de Contabilidad y Auditoría                              | 240.000,00          | 240.000,00    | 0,00               |
| 24500            | Servicios de Capacitación                                          | 86.600,00           | 70.000,00     | 0,00               |
| 24710            | Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera    | 2.240.000,00        | 1623.848,25   | 5.817,75           |
| 25100            | Servicio de Transporte                                             | 4.000,00            | 3.000,00      | 0,00               |
| 25300            | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones               | 1265.300,00         | 820.304,80    | 634,20             |
| 25400            | Primas y Gastos de Seguro                                          | 1476.150,00         | 333.518,50    | 5.050,23           |
| 27210            | Tasas                                                              | 154.262,00          | 0,00          | 0,00               |
| 31110            | Productos Alimenticios Y Bebidas                                   | 100.000,00          | 36.606,94     | 14.393,06          |
| 33100            | Productos De Papel Y Cartón                                        | 108.000,00          | 88.957,17     | 0,83               |
| 34400            | Llantas y Cámaras de Aire                                          | 100.000,00          | 0,00          | 0,00               |
| 35620            | Diesel                                                             | 200.000,00          | 30.326,12     | 132.714,00         |



| OBJETO DEL GASTO      | NOMBRE                                                             | PRESUPUESTO VIGENTE     | EJECUCION               | CREDITO DISPONIBLE      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 35650                 | Aceites y Grasas Lubricantes                                       | 100.000,00              | 80.275,75               | 724,25                  |
| 39100                 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                              | 65.797,00               | 4.126,20                | 0,00                    |
| 39200                 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                          | 100.000,00              | 21250,05                | 21500,95                |
| 39600                 | Repuestos y Accesorios                                             | 1290.000,00             | 87.935,60               | 0,28                    |
| 11100                 | Sueldos Básicos                                                    | 4.102.948,00            | 2.003.033,30            | 2.099.914,70            |
| 11400                 | Adicionales                                                        | 349.899,00              | 151671,39               | 198.227,61              |
| 11510                 | Decimotercer Mes                                                   | 341912,00               | 5.590,27                | 336.32173               |
| 11520                 | Decimocuarto Mes                                                   | 349.900,00              | 310.617,49              | 39.282,51               |
| 11600                 | Complementos                                                       | 279.919,00              | 139.373,77              | 140.545,23              |
| 11710                 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d | 594.927,00              | 293.537,00              | 301390,00               |
| 11750                 | Contribuciones para Seguro Social                                  | 151777,00               | 68.753,74               | 83.023,26               |
| 24300                 | Servicios Jurídicos                                                | 86.600,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| 33700                 | Especies Timbradas y Valores                                       | 38.030,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| 11100                 | Sueldos Básicos                                                    | 2.566.800,00            | 1.158.306,08            | 1408.493,92             |
| 11400                 | Adicionales                                                        | 213.900,00              | 66.950,84               | 146.949,16              |
| 11510                 | Decimotercer Mes                                                   | 213.900,00              | 12.286,94               | 201613,06               |
| 11520                 | Decimocuarto Mes                                                   | 213.900,00              | 143.762,78              | 70.137,22               |
| 11600                 | Complementos                                                       | 171.120,00              | 68.597,86               | 102.522,14              |
| 11710                 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d | 372.186,00              | 159.906,04              | 212.279,96              |
| 11750                 | Contribuciones para Seguro Social                                  | 111303,00               | 44.198,32               | 67.104,68               |
| 23350                 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación              | 100.000,00              | 14.260,00               | 0,00                    |
| 23600                 | Mantenimiento de Sistemas Informáticos                             | 100.000,00              | 41549,13                | 0,87                    |
| 24600                 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados                 | 150.000,00              | 20.000,00               | 9.660,00                |
| 11100                 | Sueldos Básicos                                                    | 2.664.000,00            | 1.175.939,00            | 1488.06100              |
| 11400                 | Adicionales                                                        | 222.000,00              | 82.003,62               | 139.996,38              |
| 11510                 | Decimotercer Mes                                                   | 222.000,00              | 0,00                    | 222.000,00              |
| 11520                 | Decimocuarto Mes                                                   | 222.000,00              | 222.000,00              | 0,00                    |
| 11600                 | Complementos                                                       | 177.600,00              | 16131120                | 16.288,80               |
| 11710                 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d | 386.280,00              | 166.753,00              | 219.527,00              |
| 11750                 | Contribuciones para Seguro Social                                  | 12142100                | 49.109,80               | 72.311,20               |
| 11100                 | Sueldos Básicos                                                    | 21692.147,00            | 11016.90148             | 10.675.594,74           |
| 11400                 | Adicionales                                                        | 1807.68100              | 745.120,93              | 1062.560,07             |
| 11510                 | Decimotercer Mes                                                   | 1807.680,00             | 53.554,20               | 1754.125,80             |
| 11520                 | Decimocuarto Mes                                                   | 1807.680,00             | 1801747,14              | 5.932,86                |
| 11600                 | Complementos                                                       | 1446.145,00             | 680.833,43              | 765.31157               |
| 11710                 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d | 3.145.362,00            | 1622.650,10             | 1522.71190              |
| 11750                 | Contribuciones para Seguro Social                                  | 920.782,00              | 463.698,46              | 457.083,54              |
| 25900                 | Otros Servicios Comerciales y Financieros                          | 202.860,00              | 38.208,75               | 0,25                    |
| 26210                 | Viáticos Nacionales                                                | 3.000.000,00            | 1180.014,96             | 56.012,70               |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |                                                                    | <b>L 347.808.758,00</b> | <b>L 138.585.596,79</b> | <b>L 167.939.557,33</b> |

### Cuadro por Sector 2021 (Ejecutado)

| SECTOR                              | Proyectos Finalizados 2021 | Mto. Ejecutado 2021   | Empleos Generados 2021 | Beneficiarios directos 2021 |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| INFRAESTRUCTURA VIAL                | 7                          | 8.400.719,07          | 0                      | 0                           |
| EMPRENDIMIENTO Y VALORES            | 0                          | 5.895.506,79          | 27                     | 1.262                       |
| INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA         | 6                          | 39.274.554,70         | 299                    | 5.039                       |
| PREVENCION SITUACIONAL/CONVIVIENCIA | 1                          | -                     | 31                     | 2.040                       |
| EDUCACION                           | 8                          | 51.266.318,53         | 250                    | 3.418                       |
| HOSPITALES                          | 5                          | 1.050.500,00          | 299                    | 1.186.260                   |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>27</b>                  | <b>105.887.599,09</b> | <b>906</b>             | <b>1.198.019</b>            |

### Cuadro por Departamento 2021 (Ejecutado)

| DEPARTAMENTO      | Proyectos Finalizados 2021 | Mto. Ejecutado 2021   | Empleos Generados 2021 | Beneficiarios directos 2021 |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| ATLANTIDA         | 2                          | 15.331.285,44         | 23                     | 2.352                       |
| CHOLUTECA         | 0                          | 16.981,25             | 0                      | 0                           |
| COMAYAGUA         | 1                          | -                     | 31                     | 2.040                       |
| COPAN             | 3                          | 1.568.108,90          | 59                     | 411.743                     |
| CORTES            | 1                          | 1.625.197,14          | 49                     | 8                           |
| FRANCISCO MORAZAN | 7                          | 49.154.960,19         | 376                    | 6.961                       |
| INTIBUCÁ          | 7                          | 15.475.278,49         | 130                    | 268.248                     |
| LA PAZ            | 1                          | 4.262.071,24          | 20                     | 79                          |
| LEMPIRA           | 1                          | 9.773.054,14          | 50                     | 50.285                      |
| OCOTEPEQUE        | 2                          | 7.630.162,30          | 52                     | 221                         |
| SANTA BARBARA     | 2                          | 1.050.500,00          | 116                    | 456.082                     |
| <b>TOTAL</b>      | <b>27</b>                  | <b>105.887.599,09</b> | <b>906</b>             | <b>1.198.019</b>            |

### Cuadro por Otras Inversiones 2021 (Ejecutado)

| OTRAS INVERSIONES | Mto. Ejecutado 2021   |
|-------------------|-----------------------|
| CONSULTORIAS      | 7.592.262,85          |
| PROGRAMAS         | 282.763,06            |
| FHIS              | 138.585.596,79        |
| <b>TOTAL</b>      | <b>146.460.622,70</b> |



## **CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO**

### ✓ **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)**



#### **i. Antecedentes**

Actualmente el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y la Secretaría de Seguridad ejecutan conjuntamente la operación BID 4518/BL-HO denominada “Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios” el cual es un préstamo por un monto total de US\$60,000,000.00 la operación fue aprobada por el Banco Interamericano de Desarrollo en el mes de abril de 2018, posteriormente aprobada por el Congreso Nacional en el mes de octubre de 2018, y fue efectivo a partir del 28 de noviembre de 2018, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta

#### **ii. Objetivo**

Contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

#### **iii. Componentes**

**Componente 1.** Mejoramiento del hábitat de barrios urbanos vulnerables (US\$18.219 millones). El propósito de este componente es mejorar el acceso a servicios de infraestructura urbana y generar espacios con condiciones de seguridad, para incentivar una mejor convivencia y aumentar la capacidad de los ciudadanos para el cumplimiento pacífico de normas. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Infraestructura básica: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios en los siguientes barrios del Distrito Central: Monte de los Olivos, Nueva Jerusalén; Australia; 25 de Enero; Nueva

España; Brisas del Mogote y Nueva Galilea teniendo como marco para las intervenciones el Plan Integral de Mejoramiento de Barrios, el cual incluye los correspondientes diseños urbanísticos, de ingeniería, la programación y presupuestos. Este instrumento es crítico para la adecuada programación de las inversiones y para facilitar el diálogo con la comunidad sobre las actividades a desarrollar. Se financiará consultorías y contratación de obras para: (i) la preparación de los Planes Integrales de Mejoramiento de Barrios (PIMB); y (ii) las inversiones en obras de infraestructura básica de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, pavimentación, drenaje pluvial, plazas y parques, equipamientos sociales y otras necesidades detectadas en los PIMB. Se promoverá la recuperación de escuelas públicas y centros de salud (operados por las entidades estatales específicas).

Convivencia y Emprendimiento a nivel barrial: promueve la participación de los vecinos en el mejoramiento de las condiciones de su entorno, así como el fortalecimiento de sus redes sociales y vecinales para mejorar el tejido social en los barrios. Se financiará: (i) capacitación de líderes, programa de deportes y valores, apoyado por el Comité Olímpico Internacional; (ii) capacitación de vecinos en áreas de empleabilidad dentro y fuera del barrio mediante la asistencia técnica de las Universidades y su vinculación con el sector empresarial, (iii) organización para utilización de sistemas de alerta temprana para desastres naturales. Todas las actividades tendrán enfoque de género.

**Componente 2:** Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios (US\$22.130 millones). Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios de prevención social de la violencia al ciudadano y brindar una atención oportuna a las víctimas de violencias y delitos, fortaleciendo la gestión local. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

**Fortalecimiento de capacidades de actores municipales.** Se financiará: (i) capacitación y asistencia técnica a las autoridades locales para promover la participación ciudadana en la preparación de planes locales de prevención social de la violencia; (ii) fortalecimiento de las capacidades de los responsables de los observatorios locales, para el análisis estratégico de estadísticas del crimen y delito -incluyendo la desagregación por género-; y (iii) estrategia de comunicación a través de campañas y consultas sociales para promover medidas y valores para la reducción de violencias, respeto por las normas legales, morales, culturales y el uso de la oferta de servicios disponibles de prevención y atención a víctimas.

**Intervenciones de prevención social de la violencia a nivel municipal.** Se financiará: (i) programas para la atención a víctimas de VIF a través del módulo de Atención Integral Especializado (MAIE); (ii) desarrollo de protocolos para homologar la actuación de primeros respondientes para atención a víctimas, (iii) programa de prevención social de la violencia para jóvenes en situación de riesgo; (iii) modelo innovador de policía comunitaria y patrullaje policial sistemático -Hot Spots-; y (iv) mejoramiento de la infraestructura de las Jefaturas Departamentales, para ofrecer servicios policiales a la comunidad.

**Componente 3:** Efectividad policial. (US\$16 millones). Con el propósito de mejorar el desempeño y la calidad en la prestación de los servicios policiales, se apoyará la consolidación del sistema nacional de formación y profesionalización, así como su sistema de integridad. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Consolidación del sistema educativo policial basado en la filosofía de Policía Comunitaria. Se financiará: (i) diseño del modelo de Sistema de Formación y Profesionalización Policial, articulando sus diferentes instancias de formación (Instituto Técnico Policial -ITP-, ANAPO, Universidad y educación continua y entrenamiento), incluye mecanismos de evaluación continua del personal. Lo anterior, deberá estar sujeto a promover principios de meritocracia y transparencia en el desarrollo de la carrera policial; (ii) modernización del currículum académico para los medios y altos mandos policiales, certificado bajo la filosofía de policía comunitaria y orientando la formación a competencias para la toma de decisiones operativas. Lo anterior, incluyendo la redefinición del perfil de ingreso de candidatos a la ANAPO. Esto considerará la incorporación de nuevos cadetes, provenientes del ITP y otros candidatos que ya hayan cursado licenciaturas y tecnicaturas en otras universidades; modernizar el régimen de formación de oficiales en el nuevo campus universitario y generar una nueva estructura de gobierno y planta de profesores-investigadores de tiempo completo (teóricos y prácticos) (iii) fortalecimiento de las capacidades pedagógicas para docentes; (iv) fortalecimiento de la integridad policial a través de la consolidación de un sistema de evaluación y rendición de cuentas; y (v) modernización de la infraestructura física y tecnológica de la Academia Nacional de Policía y el Centro de Investigación y Desarrollo Policial.

Fortalecimiento de las capacidades en investigación criminal. Se financiará: (i) programa de capacitación y especialización continua en investigación criminal en coordinación con el MP; (ii) capacitación técnica en el uso de tecnologías de la información para análisis estratégicos delictuales; e (iii) implementación de un sistema integrado de información delictiva y criminal para mejorar la resolución del delito -integrando estadísticas por categoría de género.

#### **iv. Mecanismo de Ejecución.**

Se propone contar con dos organismos ejecutores independientes, pero con responsabilidades compartidas en el diseño, implementación y evaluación de iniciativas que se realicen en la misma área geográfica. El componente 1 de esta operación será ejecutado por SEDECOAS-FHIS y el componente 2 y 3 por la Secretaría de Seguridad.

**v. Monto del Convenio:**

US\$ 60,000,000.00 Millones de Dólares, según convenio de préstamo el cual se desglosa de la siguiente manera: SEDECOAS- FHIS le corresponde US\$ 20, 000,000.00 Millones de Dólares y a la Secretaria de Seguridad le corresponde US\$ 40,000,000.00 Millones de Dólares.

La duración del convenio es por 5 años después de la publicación de diario La Gaceta Acuerdo Ejecutivo No. 114-2018.

**vi. Avance financiero**

| Año  | Presupuesto    | Ejecutado     | Eficiencia |
|------|----------------|---------------|------------|
| 2018 | 17.749.164,00  | 14.959.784,44 | 84%        |
| 2019 | 84.562.822,00  | 75.678.087,16 | 89%        |
| 2020 | 105.302.450,00 | 71.201.381,99 | 68%        |
| 2021 | 99.272.463,00  | 48.300.686,10 | 49%        |

**vii. Avance por Sector**

| SECTOR                      | Proyectos Finalizados 2021 | Mto. Ejecutado 2021  | Empleos Generados 2021 | Beneficiarios Directos 2021 |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| EMPRENDIMIENTO Y VALORES    | 0                          | 5.895.506,79         | 27                     | 1.262                       |
| INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | 6                          | 39.274.554,70        | 299                    | 5.039                       |
| <b>TOTAL</b>                | <b>6</b>                   | <b>45.170.061,49</b> | <b>326</b>             | <b>6.301</b>                |

**viii. Avance por Departamento**

| DEPARTAMENTO      | Proyectos Finalizados 2021 | Mto. Ejecutado 2021  | Empleos Generados 2021 | Beneficiarios directos 2021 |
|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| FRANCISCO MORAZAN | 6                          | 45.170.061,49        | 326                    | 6.301                       |
| <b>TOTAL</b>      | <b>6</b>                   | <b>45.170.061,49</b> | <b>326</b>             | <b>6.301</b>                |

**ix. Otras Inversiones**

| OTRAS INVERSIONES             | Mto. Ejecutado 2021 |
|-------------------------------|---------------------|
| BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS | 2.945.111,55        |
| GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO  | 185.513,06          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>3.130.624,61</b> |

x. AVANCES AL 30 DE JUNIO DE 2021

| Avances Programa                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTE 1 MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.0                                                                  | <b>PRODUCTO 1.1 NUEVE PROYECTOS INTEGRALES DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS (RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PÚBLICO, EQUIPAMIENTO SOCIAL Y PAVIMENTACIÓN), COMPLETADOS Y SIENDO UTILIZADOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1                                                                  | Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los Proyectos de integración urbana el cual incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y obras de mitigación, al 31 de junio de 2021 tienen el siguiente avance:<br/> <b>PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA 25 DE ENERO 86%</b><br/> <b>PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA NUEVA AUSTRALIA 79%</b><br/> <b>PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA NUEVA ESPAÑA 55%</b><br/> <b>PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA NUEVA GALILEA 62%</b><br/> Al mes de junio se tiene un avance financiero del 75% se espera el cierre financiero al mes de agosto de 2021.</li> <li>El proyecto de equipamiento social el cual incluye las siguientes obras y avance físico:<br/> <b>AMPLIACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS COLONIA NUEVA ESPAÑA. 100%</b><br/> <b>AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA DAVID COREA SÁNCHEZ 100%</b><br/> <b>CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL COLONIA 25 DE ENERO. 100%</b><br/> <b>CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL COLONIA AUSTRALIA. 100%</b><br/> <b>CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL COLONIA NUEVA GALILEA. 100%</b><br/> <b>REPARACIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA NUEVA GALILEA. 100%</b><br/> Al mes de junio se tiene un avance financiero del 76% se espera el cierre financiero al mes de agosto de 2021.</li> </ul> <p>Se finalizó el diseño de obras del Proyecto de Integración Urbana en colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén No. 2, Brisas del Mogote Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 3,035, predios. Se ha iniciado el proceso de licenciamiento ambiental.</p> |
| 2.0                                                                  | <b>PRODUCTO 1.2 JÓVENES DE LOS BARRIOS INTERVENIDOS CAPACITADOS</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1                                                                  | Programa de Deportes y Valores                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Este proyecto consiste en la enseñanza de disciplinas deportivas implementando los valores olímpicos; al semestre se imparten seis (6) disciplinas olímpicas: taekwondo, levantamiento de Pesas, tenis de Mesa, atletismo, balonmano y lucha olímpica; también, se atiende niños y/o jóvenes con discapacidad y mujeres que practican el baile de Zumba.</li> </ul> <p>Desde enero 2021 se han retomado los entrenamientos presenciales con 13 secciones deportivas y se continúan las clases virtuales para el entrenamiento en deportes y a estas sólo tienen acceso quienes en sus viviendas cuentan con un servicio de internet; en este sentido se ha creado un canal en YouTube <a href="https://www.youtube.com/channel/UC5mxsM-qXz6wAdCsBzzufYA">https://www.youtube.com/channel/UC5mxsM-qXz6wAdCsBzzufYA</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2                                                                  | Capacitaciones en valores y emprendimiento                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se capacitaron a 180 personas en el tema de valores; se espera capacitar 1260 al final del año 2021.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.0                                                                  | <b>PRODUCTO 1.3 MUJERES DE LOS BARRIOS INTERVENIDOS CAPACITADAS EN EMPRENDEDURISMO Y EMPLEO</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.1                                                                  | Capacitaciones en empleabilidad.                                                                                                                                                                         | <b>Ejecución con fondos ATN/OC-17135-HO Proyecto de Revitalización Económica y Desarrollo de Barrios Vulnerables de Tegucigalpa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A través de la fundación CADERH, el Programas Hondureños para el mundo y el SEDECOAS/FHIS se capacitaron 21 jóvenes en diseño gráfico y programación.</li> <li>2. A través de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa se capacitaron 109 jóvenes en emprendimiento a quienes se les brindó un kit de herramientas y un plan completo de negocio para iniciar el emprendimiento.</li> </ol> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### xi. PROBLEMÁTICA:

| PROBLEMA                                                                                                                                                                                                      | ACCIONES DE MITIGACIÓN, COMENTARIOS, NECESIDADES DE APOYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No contar con la licencia Ambiental para los proyectos de las colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén, la Huerta, Brisas del Roble, Altos del Mirador, Altos de la Quezada y Brisas del Mogote.</b> | Estas colonias se encuentran ubicadas en la cuenca del río Guacerique, la cual abastece el embalse de los Laurales, una de las tres fuentes de abastecimiento de la ciudad. El Saneamiento de estas colonias es imperativo para detener la contaminación del embalse. Sin embargo, se considera el alto grado de dificultad y complejidad para gestionar el licenciamiento ante MiAmbiente. La firma diseñadora Cinsa ha incorporado en su diseño medidas de mitigación y compensación necesarias para garantizar la viabilidad técnica y ambiental del proyecto. Se están realizando reuniones previas con MiAmbiente, SANAA, ICF y Municipalidad del Distrito Central para reducir los tiempos de licenciamiento ambiental.         |
| <b>Incrementos en los tiempos de ejecución de las Obras</b>                                                                                                                                                   | <p>Se espera que las obras tengan incrementos de costos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los tiempos de ejecución de obra serán mayores a los esperados. Se espera que los rendimientos de la mano de obra serán menores por las medidas de distanciamiento en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, todos los trabajadores de las obras deben realizarse pruebas de Covid 2019, y sólo los que obtengan resultados negativos podrán reincorporarse a los frentes de trabajo.</li> <li>2. Incremento en los cobros municipales y del SANAA de la tasa de desagüe y derechos de conexión a los sistemas de agua potable y alcantarillado. La tasa fue ajustada a 1.5% del costo total del proyecto.</li> </ol> |

## **CARTERA BANCO MUNDIAL**



### **✓ Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE 6822-HN)**



#### **i. Antecedentes**

Entre el 1º y el 18 de noviembre de 2020, dos ciclones tropicales consecutivos, Eta e Iota, sacudieron a todos los países de Centroamérica, con una magnitud de impacto comparable a la del huracán Mitch de 1998. Honduras, Nicaragua y Guatemala sufrieron lo peor del impacto.

De todos los países golpeados, Honduras es sin duda el más afectado por Eta e Iota. Si bien ambos ya se habían degradado a tormentas tropicales al ingresar en el territorio hondureño, generaron precipitaciones catastróficas que dieron lugar a inundaciones, erosión y deslizamientos de tierra generalizados y a la consiguiente destrucción o daños graves de infraestructuras públicas esenciales (puentes, escuelas, infraestructura sanitaria), viviendas particulares y cultivos, así como pérdidas humanas en todo el país. Una de las zonas más castigadas fue el Valle de Sula, algunas partes de San Pedro Sula y La Lima, donde cientos de personas esperaron el rescate en los techos y el segundo piso de edificios (en algunos casos por más de 72 horas). Los niveles de las aguas del río Ulúa, en el occidente de Honduras, se elevaron 13 pies más que el pico alcanzado durante el huracán Mitch en 1998. Según las últimas cifras del GdH, más de 3 millones de personas a nivel nacional resultaron damnificadas por el huracán Eta, el que provocó 77 muertes y la evacuación de 179,614 personas, de las cuales 69,254 se aglomeraron en refugios. Siguiendo de cerca al Eta, en la noche del 16 de noviembre Iota tocó tierra como huracán categoría 4 en el norte de Nicaragua e ingresó al territorio hondureño el 17 de noviembre ya degradado como Tormenta Tropical (TT) al sur del Departamento El Paraíso con impactos también catastróficos. Los dos desastres empeoraron la vulnerabilidad del país, que ya enfrentaba graves problemas por la pandemia del COVID-19 y el actual fenómeno de La Niña - Oscilación del Sur, que según los pronósticos inducirá graves sequías en el primer semestre del 2021, lo que repercutirá en los sistemas fiscales y financieros y limitará la capacidad del país para prepararse mejor y responder ante futuros desastres.

Es así que el proyecto propuesto de 150 millones de dólares tiene por objeto apoyar las necesidades de respuesta y recuperación de Honduras y fortalecer la capacidad institucional para gestionar la reconstrucción y la recuperación resiliente de los desastres.

La operación complementa varias actividades en curso financiadas por el Grupo Banco Mundial, destinadas a mejorar la resiliencia ante los desastres y el riesgo climático en Honduras. Los componentes contemplados en la operación propuesta complementan el programa general de préstamos y asistencia técnica del Banco Mundial para el país. En particular, las siguientes operaciones han contribuido a forjar el diseño de la operación propuesta: Crédito para Políticas de Desarrollo con Opción de Desembolso Diferido ante Riesgos de Catástrofes (P172567), Proyecto de Gestión de Riesgos de Desastres (P121094); Gestión Integral Agua Urbana en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa (P125903); Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras (P169901); Proyecto para el Fortalecimiento del Servicio Urbano de Agua Potable en Honduras (P173125), Fortalecimiento de los servicios de Hydromet, preparación para desastres y resiliencia urbana en Honduras (P172149); y Fortalecimiento de la capacidad de financiación del riesgo de desastres en los países de CA (P157413).

Las actividades financiadas en el marco de la presente operación contribuirán a alcanzar el doble objetivo del GBM de erradicar la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida en Honduras. Las reformas tienen por objeto reducir la vulnerabilidad ante los desastres y los riesgos climáticos que limitan el crecimiento económico; reducir los elevados costos económicos y fiscales de los desastres; y estabilizar los medios de subsistencia de los más vulnerables. Los componentes contenidos en la operación propuesta también elevarán la efectividad de los programas de desarrollo, así como la estrategia de desarrollo del Gobierno para reducir la pobreza extrema y aumentar la prosperidad compartida.

La operación propuesta se ajusta a la Política Centroamericana de GIRD (PCGIR) dirigida por el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPRENAC). La operación apoya los siguientes objetivos de la PCGIR: a) fortalecer la gestión de los riesgos de desastre; e b) invertir en una mejor preparación para las emergencias.

## **ii. Objetivo General**

Apoyar y financiar las necesidades de respuesta y de recuperación de Honduras y fortalecer la capacidad institucional para gestionar una recuperación y reconstrucción resiliente e inclusiva.

## **iii. Descripción**

**Componente 1: Operaciones de asistencia y respuesta de emergencia, salud y seguridad pública (10 millones de dólares)**

**El Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas de asistencia y respuesta inmediata para anticipar, aliviar y mitigar los efectos de los dos huracanes en la población, tales como acciones de evacuación y rescate**

de emergencia, alquiler de medios de transporte privados y pago de combustible, distribución de alimentos, artículos no alimentarios y equipos de protección personal a las poblaciones afectadas, albergues a corto y largo plazo, etc. Se estima que 74,952 personas se encontraban en albergues tras el paso de los huracanes Eta e Iota, de las cuales se espera que cierto número sigan necesitando de albergues (tomando las medidas de prevención de COVID) y de una nutrición básica durante un período prolongado, ya que no pueden regresar a sus hogares a causa de la destrucción, los graves daños o la inundación persistente de sus viviendas. Entre las medidas adicionales admisibles cabe mencionar la limpieza de aguas y de escombros, y medidas para combatir los brotes previstos de malaria, dengue u otras enfermedades infecciosas.

**El componente financiará los gastos incurridos en la preparación y respuesta arriba señalada ante los efectos de los huracanes.** Se espera que el Gobierno adopte en gran medida las medidas de asistencia y respuesta inmediata antes o en los primeros momentos de la entrada en vigencia del Proyecto.

## **Componente 2: Rehabilitación y reconstrucción resiliente de la infraestructura pública y comunitaria y restablecimiento de los servicios públicos (129 millones de dólares)**

**Durante la ocurrencia de un desastre, el funcionamiento continuo y la inmediata rehabilitación de la infraestructura crítica son elementos fundamentales para brindar una respuesta y recuperación eficiente.**

Una cantidad considerable de carreteras y puentes, así como de edificios públicos, entre ellos escuelas públicas, infraestructura de salud, instalaciones de gobiernos locales y servicios de primeros auxilios, sufrieron graves daños, si es que no fueron destruidos. El subcomponente financiará la preparación técnica (incluidos requerimientos técnicos, especificaciones, diseños y dibujos técnicos, etc), la adquisición y la ejecución de reparaciones y rehabilitaciones urgentes de la infraestructura pública y comunitaria de alta prioridad, el costo de la reubicación temporal y el estudio/diseño de algunas instalaciones prioritarias que precisen una restauración considerable o construcción nueva. En algunos casos, se requerirá obras de demolición para dar lugar a una reconstrucción y eliminar con urgencia los peligros que representan los escombros. Otras medidas elegibles adicionales, emprendidas antes de la vigencia del Proyecto, pueden incluir reparaciones urgentes a edificios públicos y viviendas dañadas, medidas temporales y para restaurar los servicios básicos y el uso de la infraestructura pública, como puentes modulares o de muralla. La ejecución de este subcomponente correrá a cargo de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) (entidad del Gobierno). Pudieran ser necesarios acuerdos interinstitucionales en caso de que la SEDECOAS necesite el apoyo técnico y coordinación con otros Ministerios.

**Dado que las necesidades de reconstrucción exceden con creces el presupuesto disponible de este componente, el Gobierno de Honduras (GdH) facilitará una lista de infraestructuras públicas prioritarias que se abordarán en el marco de esta actividad y que se ultimarán en consenso con el Banco Mundial.**

Criterios indicativos de priorización para la infraestructura pública crítica incluyen los siguientes: (a) identificación de daños y niveles de criticidad para asegurar que se prioricen las estructuras más vulneradas por el ciclón tropical, asegurando la máxima seguridad; (b) hacer hincapié en la relevancia sectorial para centrar las inversiones en los objetivos de resultados del sector y las necesidades de prestación de servicios; (c) evaluar la elegibilidad técnica y financiera para asegurar que se considere debidamente la reparación y rehabilitación de la infraestructura parcialmente dañada, en contraposición a la construcción nueva; e (d) identificar los riesgos y oportunidades ambientales y sociales para asegurar que las inversiones no causen impactos ambientales o sociales imprevistos significativos y aprovechar las oportunidades sociales para el desarrollo inclusivo. Las autoridades supervisando el proceso de selección de las inversiones, así como la metodología y los criterios de selección se detallarán en el MOP. Además, se espera que los procesos participativos para definir las inversiones prioritarias cuenten con la participación de las autoridades locales (municipios) y los Comités de Emergencia Local/Municipal (CODEL/CODEM), entre otros, adaptables a las particularidades culturales, sociales y geográficas de las zonas afectadas con poblaciones indígenas y afrodescendientes, tal como se describe en el Plan para Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Proyecto. Las actividades también se centrarán en apoyar las operaciones de mano de obra local intensiva para impulsar el empleo y adoptar técnicas de ingeniería eficientes como el uso de puentes modulares o Bailey para garantizar el rápido restablecimiento de las conexiones vitales. La evaluación social del Proyecto identificará los posibles grupos comunitarios que puedan aportar esta mano de obra, así como la capacitación de corto plazo que pueda necesitar y que se les podría dar antes de arrancar con la construcción de las obras. Otras fuentes de financiación de estas actividades podrían ser proyectos en curso o nuevos del Banco Mundial y de las IFI con las que será necesario entablar coordinación.

**Las actividades financiadas en el marco del subcomponente se construirán con capacidad de resistencia al cambio climático y de manera inclusiva e informada en temas de género,** utilizando normas de diseño resilientes e incorporando en el diseño aspectos que promuevan la participación de la mujer. En todas las obras de rehabilitación y reconstrucción se seguirán los principios de diseño universal para facilitar el acceso de las personas con discapacidad.

**El componente también podrá financiar la adquisición de equipos.** Cuando sea una necesidad crítica y en la medida en que el Banco lo considere aceptable, equipo esencial para la reanudación de servicios públicos, como vehículos, materiales de tecnologías de la información y comunicación, equipos contra incendios y de primeros auxilios también podrán ser elegibles en el marco del presente componente, incluido servicios de elaboración de las especificaciones técnicas de los equipamientos si hacen falta.

### **Componente 3: Apoyo institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción (11 millones de dólares)**

**El componente cubrirá los costos de la capacidad técnica e institucional del organismo ejecutor del Proyecto**, inclusive la gestión del proyecto, a, las adquisiciones, el manejo de contratos, la transparencia, las actividades de gestión financiera, las auditorías técnicas, el seguimiento del cumplimiento de las obras de construcción, la supervisión del cumplimiento de las normas sociales y ambientales, la fiscalización del cumplimiento de los estándares sociales y ambientales, las actividades de M&E y los mecanismos de atención y resolución de quejas y denuncias. El M&E entraña, entre otras cosas, la preparación de informes sobre el Proyecto, del informe correspondiente a la evaluación de mitad de periodo y el informe final, estudios de líneas de base, auditorías (financieras, técnicas, ambientales y sociales, según sea necesario). Se prevé también que este componente sea ejecutado por la SEDECOAS. Este componente también incluye los costos de equipos (alquiler o compra según corresponda), servicios y pequeñas obras necesarias para el buen desempeño de las tareas de la agencia, tales como vehículos, equipos de información y comunicación (incluyendo laptops, impresoras, etc.), mobiliario y materiales de oficina, alquiler de locales, obras de mejora / acondicionamiento, entre otros.

**El subcomponente también financiaría servicios de consultoría para fortalecer la capacidad técnica de la SEDECOAS y otros organismos claves participantes como la Secretaría de Finanzas.** En particular, el componente experimentará en calidad de piloto con enfoques integrados para una mejor gestión de los activos de infraestructura, consistentes en un análisis de la criticidad, normas técnicas y de diseños mejorados y programas de mantenimiento preventivo, todo ello con miras a reducir la vulnerabilidad ante futuros fenómenos naturales adversos. El subcomponente también tendrá como objetivo el diseño de una política y programa de apoyo financiero para la reconstrucción de viviendas privadas. Determinará cuáles son las opciones de política y ejecución (por ejemplo, impulsadas por el propietario, impulsadas por la institución gubernamental, una mezcla de ambos, etc.) para el programa de reconstrucción. Las opciones que se tomen en cuenta tendrán su basamento en las leyes y políticas nacionales existentes y en el marco de gestión ambiental y social (MGAS) del Banco, e incluirán, entre otras cosas, temas relacionados con el género, la participación ciudadana, los pueblos indígenas y los afrodescendientes, los grupos vulnerables y la sostenibilidad financiera, aprovechando al mismo tiempo las buenas prácticas internacionales. El subcomponente también facilitará recursos para sensibilizar a los asociados para el desarrollo y a proveedores de fondos concesionales a fin de atraer financiación externa para potenciar los efectos del programa. Si bien el Proyecto en sí no proporcionará financiación para este mecanismo directamente, el objetivo es crear un vehículo que atraiga fondos futuros de prestamistas tanto públicos como comerciales, entre ellos, posiblemente, la Corporación Financiera Internacional (CFI).

**Finalmente, el componente hará mucho énfasis en definir y desarrollar una estrategia de comunicación,** diseñada en particular para mantener informados a los beneficiarios directos e indirectos sobre el alcance y plazos de las actividades, a fin de garantizar su apoyo y manejar sus expectativas, un aspecto fundamental en la primera etapa de implementación de los proyectos de recuperación de emergencia.

#### **iv. Beneficiarios**

Las inversiones y actividades propuestas se destinarán a determinadas comunidades afectadas por los ciclones Eta e Iota. Los beneficiarios directos serán los habitantes de las comunidades de los departamentos más golpeados, que se beneficiarán de la restauración y las mejoras de los servicios públicos y de la reconstrucción resiliente de infraestructura crítica. Se espera que los beneficiarios directos alcancen al menos 2.5 millones de habitantes en los departamentos de Cortés, Colón, Atlántida y Gracias a Dios, de los cuales el 51.9% son mujeres, el 48.1% son hombres y allí se cuentan a las comunidades indígenas y afrodescendientes. La población total del país también se beneficiará indirectamente con el aumento de la capacidad de las autoridades para "reconstruir mejor" la infraestructura y responder con mayor eficacia ante los desastres. Los funcionarios gubernamentales de las secretarías competentes, de los 18 departamentos y 298 municipios se beneficiarán gracias a la mayor capacidad de planificación y ejecución de acciones de recuperación en casos de desastres.

#### **v. Localización:**

Cortés, Colón, Atlántida y Gracias a Dios

#### **vi. Duración del Proyecto:**

El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de 5 años y medio incluyendo actividades de gestión, socialización, adquisiciones, etc.

#### **vii. Avance Financiero**

| Año  | Presupuesto    | Ejecutado | Eficiencia |
|------|----------------|-----------|------------|
| 2021 | 188.804.388,00 | 0,00      | 0%         |

**viii. Logros y avances**

- ✚ A continuación le detallo los avances del PRE, al 30 de junio de 2021:
- ✚ Estructura presupuestaria vigente por L 188,804,388.00
- ✚ Primer desembolso (Anticipo) a la Cuenta Especial por \$4,367,894.00 , el 28 de junio de 2021.
- ✚ Publicación de expresiones de interés de los primeros puestos claves de la Unidad Ejecutora del Proyecto.
- ✚ Avances en la revisión de documentación de gastos efectuados por SEDIS y COPECO para la atención de damnificados por la emergencia causada por los ciclones ETA e IOTA en Honduras, por un monto de L 285.9 millones que será reembolsado bajo el componente 1 del Proyecto.
- ✚ 41 subproyectos formulados en el sector de educación.

## **CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA**



### ✓ **Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)**

#### **i. Antecedentes**

El Estado de Honduras ha revalorizado la educación como elemento fundamental para el desarrollo integral de todos los hondureños, mediante la implementación de la Tercera Reforma Educativa, que responde a las expectativas de la sociedad, cuyos alcances se enmarcan en los objetivos No.1 y No.4 de la Visión de País 2010-2038; Plan de Nación 2010-2022; que estipulan: “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidados de previsión social” y “Honduras con un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo. Para la ejecución de esta Tercera Reforma, se aprueba en el año 2012, la Ley Fundamental de Educación y en el año 2014 sus 22 Reglamentos.

Según el Plan Estratégico del Sector Educativo 2018-2030, para poder cumplir con la Ley Fundamental de Educación, el sistema educativo en Honduras se enfrenta a los siguientes retos:

-Fortalecimiento de la Secretaría de Educación conforme a la Ley Fundamental de Educación (LFE), principalmente en dos aspectos: i) descentralizar funciones operativas en las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de Educación; y ii) fomentar la participación comunitaria en la gestión educativa, formulación y coordinación de los planes estratégicos, que apunten a mejorar la calidad educativa.

El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Educación, garantiza el derecho fundamental a la educación, el acceso a una educación de calidad en condiciones de equidad, sin discriminación de ninguna naturaleza en todos sus niveles. La Ley Fundamental de Educación recupera el espíritu de garantizar este derecho, estableciendo el compromiso de brindar educación gratuita en todos sus niveles; un año obligatorio en Educación Pre-Básica (tercer grado) y tres ciclos de Educación Básica (I, II y III ciclo). Con ello, se logra la meta establecida de país, que para el año 2038, Honduras debe elevar la escolaridad promedio a 9 años (1º a 9º grado), reconociendo que es necesario formar educandos para la convivencia, derechos humanos, responsabilidad social, cuidado de las personas, entendimiento del entorno, protección del medio ambiente y la educación media ha sido considerada, hasta finales del siglo XX, como el período de preparación de los jóvenes para el ingreso a la educación superior y también como la enseñanza que proporciona entrenamiento técnico-vocacional, preparando a los jóvenes para

su inserción en la vida productiva. En general, la educación media tiene como propósito ofrecer la experiencia formativa para incorporarse al mundo del trabajo y/o proseguir estudios en el nivel de educación superior.

## **ii. Objetivo General**

Fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros Educativos Media y sean promovidos con la calidad requerida.

## **iii. Focalización**

El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.

## **iv. Beneficiarios**

El Programa beneficiará 480 niños de Educación pre-básica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes.

## **v. Duración**

La duración del programa es de 3 años desde el 2021 hasta el 2023 donde habrá un desarrollo gradual de la infraestructura y la dotación de equipo, así como la formación permanente y la plataforma virtual para emprendimiento.

## **vi. Costo Total del Programa**

US\$80, 000,000.00

Este es un esfuerzo de la Republica de Honduras, a través de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por US\$80,000,000.00 que tiene como meta llegar a la población educativa de los diferentes niveles que atiende el sistema educativo nacional.

## **vii. Avance Financiero**

| Año  | Presupuesto    | Ejecutado | Eficiencia |
|------|----------------|-----------|------------|
| 2021 | 522.588.163,00 | 0,00      | 0%         |

## **viii. Principales Logros**

Programa MIFE a nivel de ejecución financiera no tiene ninguna que reportar y según su proyección iniciará ejecución hasta el III trimestre. Sin embargo ha tenido otros avances en otras actividades como:

1. Firma del Plan de Inicio con el PNUD para la compra de tabletas por el monto de \$4.620 millones de dólares, proceso que ya fue realizado y evaluado por el PNUD, donde se estarán desembolsando dicha cantidad una vez se apruebe la modificación presupuestaria solicitada.
2. Se realizó el proceso para la contratación de formuladores encontrándose el informe de adjudicación en previa revisión por parte del Organismo Financiador.

Adicionalmente el Programa cuenta con los siguientes retos:

1. Contratación de la Unidad Coordinadora con énfasis en el Coordinador General, Coordinador de Adquisiciones y Coordinador Financiero. Los términos de referencia están en revisión Institucional y del Organismo Financiador.
2. Traslado de los recursos que el programa no ejecutará en el año 2021 actualmente se está haciendo la revisión de dicho monto y se estima que puede aproximarse a 350 millones de lempiras.
3. Realizar el desembolso al PNUD para la compra de las tabletas.

## **CARTERA KfW Entwicklungsbank**

### **✓ Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V**



#### **i. Objetivo General**

Consiste en la utilización de centros educativos mejorados, ampliados o nuevos y equipados bajo conceptos pedagógicos que operan de manera sostenible por la comunidad educativa. De esta manera se pretende contribuir a que niños/as y jóvenes de regiones pobres utilicen una oferta de alta calidad educativa, tanto formal como de educación vocacional.

#### **ii. Focalización**

**Fase IV:** El Área de intervención abarcará los departamentos que están siendo intervenidos en las fases anteriores (Zona de Occidente): 1) Copán, 2) Santa Bárbara, 3) Intibucá, 4) Lempira, 5) La Paz, 6) Ocotepeque. 7) Centros a nivel nacional en casos de emergencia (catástrofes naturales). La información de estos centros deberá ser actualizada en el plan maestro y sólo si se determina su precariedad, podrán ser intervenidos previo a No Objeción del KfW. 8) Adicionalmente se extenderá el área de intervención a los departamentos adyacentes a la zona de occidente, delimitando el área de intervención a través de la Carretera Panamericana. Los municipios a ser beneficiados se encuentran al oeste de la misma en los siguientes departamentos: 1) Choluteca, 2) Valle, 3) Francisco Morazán (exceptuando el núcleo urbano de Tegucigalpa), 4) Comayagua y adicionalmente 5) Gracias a Dios.

**Fase V:** El Área de intervención abarcará los departamentos de: Ocotepeque, Lempira y Copan, en la zona de Occidente. Además, los departamentos al oeste de la carretera CA-5 de los departamentos de Francisco Morazán (exceptuando el Distrito Central), Valle, Choluteca, Comayagua. También seguirá formando parte del Programa el Departamento de Gracias a Dios (siempre y cuando no se alcance un mínimo de infraestructura en este departamento y según las experiencias de la fase IV del PROMINE).

#### **iii. Priorización de los Centros Educativos**

Esta es realizada por la Secretaria de Educación apoyados en la herramienta del Plan Maestro de Infraestructura Educativa.

#### **iv. Descripción del Proyecto**

**Fase IV:** El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y en la planificación estratégica para los años 2014 - 2018 de la Secretaría de Educación (SE). El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las tres fases previas PROMINE I, II y III. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

**Fase V:** El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y el Plan Estratégico del Sector de Educación para los años 2017 - 2030 de la Republica de Honduras. El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las cuatro fases previas PROMINE I, II, III y IV. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

#### **v. Monto del Proyecto:**

##### **Fase IV:**

Fondos de Donación por un monto de € 15,000,000.00 euros, Contrapartida Nacional para SEDECOAS/FHIS de € 424,000 euros, Contrapartida Nacional para SE de € 218,000 euros, Contrapartida Municipal de € 515,000 euros y Contrapartida Comunitaria de € 514,000 euros.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 03/12/2015

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 17/02/2017

Fecha de Inicio: 02 de Abril 2018 (Se considera la fecha de inicio de la Consultoría)

Fecha de Finalización de convenio: 30/11/2022

##### **Fase V:**

Fondos de Donación por un monto de 10, 000,000.00 euros, Contrapartida Nacional para IDECOAS/FHIS de 495,000 euros, Contrapartida Nacional para SE de 250,000 euros, Contrapartida Municipal de 600,000 euros Contrapartida Comunitaria de 600,000 euros.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 06/07/2018

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 21/03/2019

Fecha de Inicio: Inicio de la Consultoría 17 de marzo

Fecha de Finalización de convenio: 37 meses a partir del inicio de la consultoría

**vi. Avance Financiero PROMINE FASE III y IV**

| Año                               | Presupuesto    | Ejecutado      | Eficiencia |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------|
| 2016                              | 145.687.475,00 | 142.916.817,45 | 98%        |
| 2017                              | 107.279.375,00 | 96.731.967,93  | 90%        |
| 2018                              | 53.035.502,00  | 50.951.601,81  | 96%        |
| 2019                              | 81.069.633,00  | 79.762.875,76  | 98%        |
| 2020                              | 134.608.478,00 | 123.221.616,32 | 92%        |
| 2021                              | 196.848.639,00 | 38.236.268,74  | 19%        |
| Presupuesto 2021 Fase IV y Fase V |                |                |            |

**vii. Avance Físico por Sector PROMINE FASE IV y V**

| SECTOR       | Proyectos Finalizados 2021 | Mto. Ejecutado 2021  | Empleos Generados 2021 | Beneficiarios Directos 2021 |
|--------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| EDUCACION    | 1                          | 34.309.835,95        | 92                     | 559                         |
| <b>TOTAL</b> | <b>1</b>                   | <b>34.309.835,95</b> | <b>92</b>              | <b>559</b>                  |

**viii. Avance Físico por Departamento PROMINE FASE IV y V**


| DEPARTAMENTO      | Proyectos Finalizados 2021 | Mto. Ejecutado 2021  | Empleos Generados 2021 | Beneficiarios Directos 2021 |
|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| CHOLUTECA         | 0                          | 16.981,25            | 0                      | 0                           |
| COPAN             | 1                          | -                    | 29                     | 298                         |
| FRANCISCO MORAZAN | 0                          | 3.984.898,70         | 0                      | 0                           |
| INTIBUCÁ          | 0                          | 10.210.777,22        | 0                      | 0                           |
| LA PAZ            | 0                          | 4.262.071,24         | 0                      | 0                           |
| LEMPIRA           | 0                          | 8.204.945,24         | 0                      | 0                           |
| SANTA BARBARA     | 1                          | -                    | 36                     | 191                         |
| OCOTEPEQUE        | 1                          | 7.630.162,30         | 27                     | 70                          |
| <b>TOTAL</b>      | <b>3</b>                   | <b>34.309.835,95</b> | <b>92</b>              | <b>559</b>                  |

**ix. Otras Inversiones**

| OTRAS INVERSIONES                |  | Mto. Ejecutado<br>2021 |
|----------------------------------|--|------------------------|
| BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS    |  | 3.829.182,79           |
| GASTO OPERATIVO DEL PROGRAMA*    |  | 97.250,00              |
| <b>TOTAL</b>                     |  | <b>3.926.432,79</b>    |
| *Viaticos, pasajes y Combustible |  |                        |

**x. AVANCES GENERALES**

■ **FASE IV.**

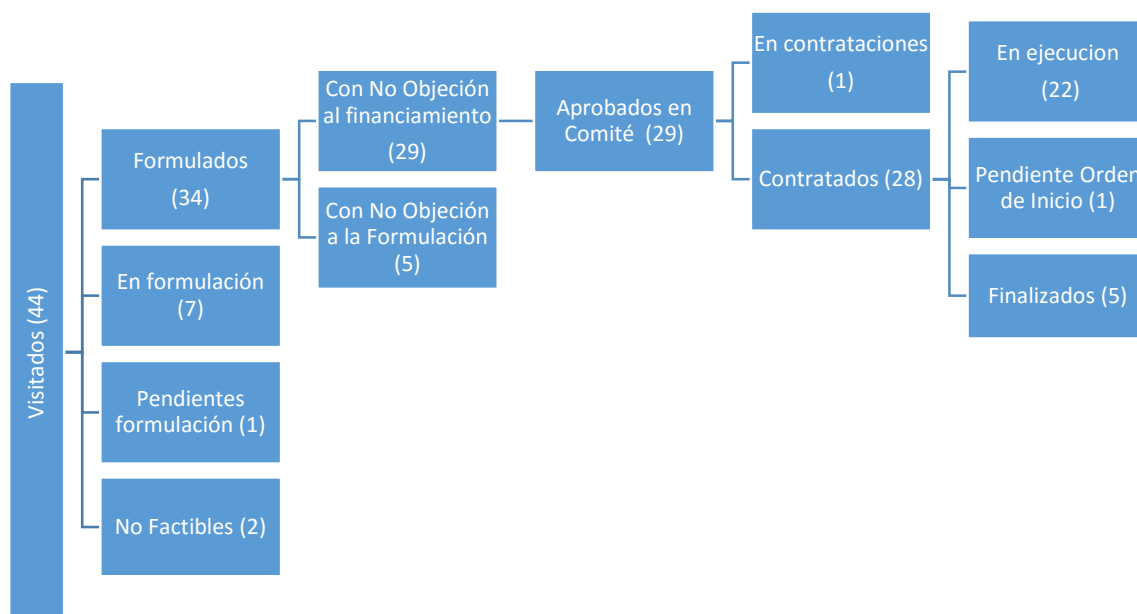

Actualmente se cuenta con una ejecución normal en los proyectos del occidente, sin embargo, los proyectos ejecutándose en el departamento de Gracias a Dios se presentan proyectos observaciones en la calidad de obras las cuales las correcciones serán evaluadas en la segunda semana de julio.

A nivel general en todos los proyectos se ha visto dificultad en conseguir la mano de obra calificada, por lo cual se han estado pagando más de lo considerado para lograr continuar con la ejecución.

**xi. AVANCE FINANCIERO SEGÚN PRESUPUESTO ASIGNADO FASE VI Y FASE V**

| Año         | Planificado al II Trimestre | Ejecutado     | Eficiencia |
|-------------|-----------------------------|---------------|------------|
| <b>2021</b> | 50.581.493,00               | 34.309.835,95 | 68%        |

Las diferencias con respecto a lo planificado en su mayoría corresponden a pagos que se realizaron en el primer trimestre y a dos pagos que realiza el KfW que se encuentran en proceso. Con respecto a los CE a entregar se han tenido dificultades en uno por casos de COVID y en otro porque ha sido dificultoso la mano de obra en el proyecto. Esta última justificación está pasando en todos los proyectos en ejecución.

Con respecto a los proyectos a entregar, para el segundo trimestre se contemplaban 5 proyectos, sin embargo, se han tenido dificultades en uno por casos de COVID y en otro porque ha sido dificultoso la mano de obra en el proyecto. Esta última justificación está pasando en todos los proyectos en ejecución como se reportó anteriormente.

## **xii. LOGROS II TRIMESTRE**

- ✓ Se iniciaron todos los proyectos en el departamento de Gracias a Dios
- ✓ Se han comenzado actividades previas para el inicio de la fase V.

## **xiii. RETOS PROXIMOS**

Entre los principales retos que enfrenta el PROMINE-KfW:

- Reparación de los vehículos del Programa
- Solventar los inconvenientes en la administración y ejecución física de los proyectos en los departamentos de Gracias a Dios.

## ✓ Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)



### i. Objetivo General

Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).

### ii. Focalización

A través de un proceso de concurso con criterios de selección predefinidos en el acuerdo separado y evaluación de propuestas técnicas alineadas a los componentes del programa fueron seleccionados 3 municipios en donde se está realizando la intervención del CONVIVIR a través de obras de infraestructura y medidas de alcance social para beneficio enfocado en la juventud. Así mismo se definieron los barrios, colonias o comunidades urbanas en donde se focaliza las acciones y en donde ya se ha realizado una labor de socialización de los alcances, compromisos y beneficios para la población. Los municipios seleccionados son:

- Municipio de Gracias, departamento de Lempira
- Municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua
- Municipio de La Lima, departamento de Cortes.

### iii. Descripción del Proyecto

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

### iv. Monto del Proyecto:

Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son Euros 10,000,000.00. El tipo de financiamiento es un contrato de Préstamo.

**Fecha de Firma de convenio:** 08/11/2012

**Fecha de Finalización de convenio:** 31/07/2021

**v. Avance Financiero**

| Año                               | Presupuesto   | Ejecutado     | Eficiencia |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 2014                              | 21.289.204,00 | 18.316.427,97 | 86%        |
| 2015                              | 38.873.159,00 | 34.024.198,74 | 88%        |
| 2016                              | 88.796.503,00 | 83.460.868,42 | 94%        |
| 2017                              | 51.288.495,00 | 48.071.886,28 | 94%        |
| 2018                              | 65.657.852,00 | 43.535.738,65 | 66%        |
| 2019                              | 33.661.644,00 | 30.786.651,68 | 91%        |
| 2020                              | 38.080.614,00 | 30.674.408,45 | 81%        |
| 2021                              | 17.591.004,00 | 817.968,51    | 5%         |
| Presupuesto 2021 Fase IV y Fase V |               |               |            |

**vi. Avance por Sector**

| SECTOR                              | Proyectos Finalizados 2021 | Empleos Generados 2021 | Beneficiarios Directos 2021 |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA | 1                          | 31                     | 2.040                       |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>1</b>                   | <b>31</b>              | <b>2.040</b>                |

**vii. Avance por Departamento**

| DEPARTAMENTO | Proyectos Finalizados 2021 | Empleos Generados 2021 | Beneficiarios directos 2021 |
|--------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| COMAYAGUA    | 1                          | 31                     | 2.040                       |
| <b>TOTAL</b> | <b>1</b>                   | <b>31</b>              | <b>2.040</b>                |

**viii. Otras Inversiones**

| OTRAS INVERSIONES             | Mto. Ejecutado 2021 |
|-------------------------------|---------------------|
| BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS | 817.968,51          |
| GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO  | 0                   |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>817.968,51</b>   |

## **ix. INFORMACION FINANCIERA**

Al cierre del periodo de Abril a Junio del año 2021, el Programa CONVIVIR solicito una ampliación de tiempo al 31 de enero del 2022 para la ejecución de los fondos sobrantes para reconstrucción de los proyectos de La Lima, Cortes que fueron afectados por el paso de las Tormentas ETA e IOTA, sin embargo, la Secretaria de Finanzas (SEFIN), no aprobó dicha solicitud y por ende la ejecución de dichos fondos, la ampliación de tiempo fue aprobada hasta el 31 de julio del año en curso, únicamente para la devolución de fondos al KfW, el cual se encuentra en proceso de trámite cumpliendo los pasos correspondientes para dicha devolución en tiempo y forma.

## **x. COMPONENTE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA- AVANCE FISICO**

En el componente de Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura el Programa CONVIVIR, la gestión del SEDECOAS/FHIS está orientada a lograr la buena ejecución de cada obra priorizada. Para ello, durante este período se ha continuado con el trabajo conjunto con la Dirección de Control y Seguimiento. Se ha logrado dar término de un número de 37 obras de infraestructura.

La institución es también responsable de la tramitación de documentación para lograr la aprobación de órdenes de cambio, y desembolsos de fondos para construcción.

Actualmente se tiene una cartera de 37 proyectos de infraestructura aprobados para ejecutar con el monto del convenio. De dichos proyectos ya se terminaron 37 obras, siendo el último proyecto cerrado “Casa de la Cultura”, Siguatepeque, Comayagua

Todos los proyectos de infraestructura fueron debidamente equipados, el proyecto próximo a inaugurar es el proyecto “Casa de la Cultura”, Siguatepeque, Comayagua.

El SEDECOAS/FHIS ha actuado por medio de su equipo de Control y Seguimiento, inspectores sociales y técnicos, dando seguimiento a la ejecución y cierre de los proyectos en construcción, como también trabajando en el seguimiento a las gestiones administrativas relacionadas con desembolsos, ordenes de cambio ingresados en el ciclo de proyectos del SEDECOAS/FHIS.

A continuación se anexan los tres cuadros que corresponden a la ejecución física de cada una de las obras de infraestructura

**No. 1 Obras priorizadas en el municipio de Siguatepeque, Comayagua**

| No.             | Código FHIS | Nombre del Proyecto                                              | Ubicación             | Monto Aprobado   | ESTADO        |                   |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
|                 |             |                                                                  |                       |                  | Avance Físico | Avance Financiero |
| 1               | 105175      | Construcción Cancha Multiuso Parque Bosque Calanterique          | Suyapita              | L. 3,104,790.79  | CONCLUIDO     |                   |
| 2               | 106002      | Construcción Salón Multiusos Y Cancha Deportiva Noé Cruz Villeda | Col. Noé Cruz Villeda | L. 3,012,043.70  | CONCLUIDO     |                   |
| 3               | 106347      | Construcción Centro De Calidad De Vida                           | La Crucita            | L. 2,956,701.47  | CONCLUIDO     |                   |
| 4               | 106181      | Construcción Centro De Calidad De Vida Bo. El Carmen             | Bol El Carmen         | L. 3,767,167.59  | CONCLUIDO     |                   |
| 5               | 106094      | Remodelación Centro De Capacitación Digital                      | Bo. El Centro         | L. 410,327.27    | CONCLUIDO     |                   |
| 6               | 105928      | Construcción De Obras Complementarias Campo De Futbol Col. Mata  | Col. Mata             | L. 2,721,312.41  | CONCLUIDO     |                   |
| 7               | 106308      | Construcción Centro De Calidad De Vida                           | Bo. San Juan          | L. 3,598,956.85  | CONCLUIDO     |                   |
| 8               | 107303      | Construcción Oficina Municipal De La Juventud                    | Barrio El Centro      | L. 3,638,941.50  | CONCLUIDO     |                   |
| 9               | 107324      | Remodelación Centro De Aprender Para Emprender - Infop           | Suyapita              | L. 986,493.87    | CONCLUIDO     |                   |
| 10              | 107546      | Construcción Obras Complementarias Plaza Del Bosque Calanterique | Suyapita              | L. 1,805,135.54  | CONCLUIDO     |                   |
| 11              | 107317      | Construcción Casa De La Cultura                                  | Bol El Carmen         | L. 11,012,069.37 | CONCLUIDO     |                   |
| 12              | 107547      | Remodelación De Biblioteca Municipal, Siguatepeque               | Bo. El Centro         | L. 461,153.55    | CONCLUIDO     |                   |
| 13              | 107483      | Construcción Plaza Turística de Artesanos EL Porvenir            | Aldea El Porvenir     | L. 3,870,593.12  | CONCLUIDO     |                   |
| TOTAL INVERSION |             |                                                                  |                       | L. 41,386,687.31 |               |                   |

**No. 2 Obras priorizadas en el municipio de Gracias, Lempira**

| No. | Código FHIS | Nombre del Proyecto                                                         | Ubicación          | Monto Aprobado  | ESTADO        |                   |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------------|
|     |             |                                                                             |                    |                 | Avance Físico | Avance Financiero |
| 1   | 105174      | Construcción Plaza Recreativa Colonia Borjas                                | Col. Borjas        | L. 3,225,774.53 | CONCLUIDO     |                   |
| 2   | 106006      | Construcción Plaza De Recreación Para La Convivencia Pinalito Y Bella Vista | Pinalito           | L. 2,147,440.69 | CONCLUIDO     |                   |
| 3   | 106145      | Remodelación Centro De Capacitación Digital                                 | La Merced          | L. 56,983.16    | CONCLUIDO     |                   |
| 4   | 106090      | Ampliación Plaza Boulevard Marco Tulio Rodriguez                            | El Progreso        | L. 2,454,714.29 | CONCLUIDO     |                   |
| 5   | 106062      | Construcción Casa De La Cultura                                             | Mercedes           | L. 8,169,443.80 | CONCLUIDO     |                   |
| 6   | 106007      | Construcción Escuela De Música Mejicapa                                     | Bo. Mejicapa       | L. 2,590,324.49 | CONCLUIDO     |                   |
| 7   | 105994      | Reposición Polideportivo Villas Del Rosario                                 | Villas del Rosario | L. 7,868,528.04 | CONCLUIDO     |                   |
| 8   | 106003      | Construcción Parque Recreativo Col. Moreno Y Hércules                       | Col. Moreno        | L. 5,459,590.31 | CONCLUIDO     |                   |
| 9   | 106004      | Remodelación Plaza San Sebastián                                            | Gracias            | L. 4,029,707.82 | CONCLUIDO     |                   |
| 10  | 106136      | Construcción Salón Multiusos Bella Vista Y Pinalito                         | Col. Bella Vista   | L. 2,979,546.19 | CONCLUIDO     |                   |

|                        |        |                                                     |                    |                         |           |
|------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| 11                     | 105992 | Construcción Campo De Pelota Bella Vista Y Pinalito | Col. Bella Vista   | L. 3,197,439.41         | CONCLUIDO |
| 12                     | 105713 | Ampliación Casa De La Juventud                      | Villas del Rosario | L. 6,619,560.57         | CONCLUIDO |
| 13                     | 106328 | Construcción Centro De Calidad De Vida Villami      | Villami            | L. 2,447,597.92         | CONCLUIDO |
| 14                     | 107489 | Centro De Aprender Para Emprender, Inst. Ramón Rosa | Barrio Mejicapa    | L. 4,776,414.85         | CONCLUIDO |
| <b>TOTAL INVERSION</b> |        |                                                     |                    | <b>L. 56,023,066.07</b> |           |

**No. 3 Obras priorizadas en el municipio de La Lima, Cortés**

| No.                    | Código FHIS | Nombre del Proyecto                                                                        | Ubicación            | Monto Aprobado          | ESTADO        |                                                            |
|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
|                        |             |                                                                                            |                      |                         | Avance Físico | Avance Financiero                                          |
| 1                      | 105173      | Construcción Centro Juvenil De Desarrollo Integral                                         | Centro Sula          | L. 3,262,220.20         |               | CONCLUIDO                                                  |
| 2                      | 106182      | Construcción Centro De Calidad De Vida Col. Nuevo San Juan                                 | Col. Nuevo San Juan  | L. 2,961,528.33         |               | CONCLUIDO                                                  |
| 3                      | 106184      | Construcción Centro De Calidad De Vida                                                     | Col Álvarez Martínez | L. 3,068,158.19         |               | CONCLUIDO                                                  |
| 4                      | 105893      | Remodelación Casa De La Cultura                                                            | Col. Sitraterco      | L. 9,605,935.76         |               | Proyecto Rescindido y con recuperación total de los fondos |
| 5                      | 105895      | Remodelación Camino De Los Gatos Paseo Del Puente Y Áreas Aledañas                         | Bo. Centro Sur       | L. 2,831,897.23         |               | CONCLUIDO                                                  |
| 6                      | 106093      | Remodelación Centro De Capacitación Digital                                                | Bo. Centro Norte     | L. 225,080.18           |               | CONCLUIDO                                                  |
| 7                      | 105738      | Ampliación Plaza Juventud Barrio Centro Sur                                                | Bo. Centro Sur       | L. 7,036,616.12         |               | CONCLUIDO                                                  |
| 8                      | 105897      | Remodelación Mediana Sitraterco                                                            | Col Sitraterco       | L. 8,518,858.49         |               | Proyecto Rescindido y con recuperación total de los fondos |
| 9                      | 105900      | Construcción Cancha Multiusos Colonia El Maestro                                           | El Maestro           | L. 2,687,523.23         |               | CONCLUIDO                                                  |
| 10                     | 105902      | Remodelación Parque De Los Pinos                                                           | Col. Los Pinos       | L. 1,775,191.17         |               | CONCLUIDO                                                  |
| 11                     | 107488      | Remodelación Biblioteca Municipal                                                          | Bo. Centro Sur       | L. 1,500,285.33         |               | CONCLUIDO                                                  |
| 12                     | 107610      | Remodelación Centro de Aprender para Emprender, Instituto Técnico Vocacional Valle de Sula | Col. Oro Verde       | L. 4,168,239.85         |               | CONCLUIDO                                                  |
| <b>TOTAL INVERSION</b> |             |                                                                                            |                      | <b>L. 29,516,739.83</b> |               |                                                            |

**xi. AVANCE DEL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES Y LABORALES DE JÓVENES Y COMPONENTE MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES RELEVANTES**

El segundo trimestre del año 2021, se realizaron una serie de actividades enfocadas del modelo de funcionamiento de los municipios, en especial a la etapa de asesoramiento para cada uno de los municipios del Programa:



| # | ACTIVIDADES GENERALES                                                                                                                        | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DIFICULTADES |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Revisión final del Plan maestro de sostenibilidad y seguimiento del Programa CONVIVIR.                                                       | Se realizó una revisión exhaustiva del Plan maestro que propone la lógica de intervención de la fase de sostenibilidad del Programa, (Se adjunta introducción del documento).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Documento de Plan maestro finalizado, quedando pendiente la diagramación del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 2 | Socialización con la unidad técnica de Capacitación (UTC) para dar a conocer los contenidos de los Módulos de capacitación del Modelo ORMAG. | Se solicitó una reunión con la unidad técnica de capacitación para dar a conocer los contenidos de los 6 módulos de capacitación los cuales son la propuesta de capacitaciones para la ORMAG barriales y municipales. Durante la reunión se realizó la entrega oficial de la Metodología PEC por la Ing. Karen caballero y el equipo Convivir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Entrega Oficial de los Módulos de capacitación de la Metodología PEC a la Unidad Técnica de Capacitación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| 3 | Gira de seguimiento en los 3 municipios de la Fase I Convivir,                                                                               | <p>Se realizaron una serie de reuniones de seguimientos con miembros de las ORMAG barriales, ORMAG Municipal y las oficinas de juventud, con el propósito de analizar las diferentes estrategias que facilitan el usos de los espacios de cada proyecto Convivir, en este caso se describen las actividades realizadas:</p> <p>1. Informes de actividades de la OMJ en vinculación de los espacios convivir.</p> <p>2. Reforzamiento del Plan Estratégico de la ORMAG Municipal, donde se aclararon dudas en cuanto a los componentes administrativos y organizativos que contempla el Plan.</p> <p>3. Inducción sobre los procedimientos</p> | <p>El Programa CONVIVIR cuenta con su propia metodología y modelo de desarrollo comunitario enfocado a la Gestión y Desarrollo.</p> <p>Fortalecidos los conocimientos las ORMAG barriales para el manejo de 5% de los fondos de transferencia.</p> <p>Se aclararon las dudas referentes a la estructura organizativa de la ORMAG Municipal.</p> <p>Se reforzó las vinculaciones del trabajo con juventud y los planes de revitalización de los proyectos</p> |              |

| # | ACTIVIDADES GENERALES | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                          | LOGROS OBTENIDOS | DIFICULTADES |
|---|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|   |                       | <p>administrativos sobre el manejo de 5% de las ORMAG barriales, ya que los municipalidades terminara de realizar los desembolsos.</p> <p>4. Entrega del equipamiento de barismo a la Municipalidad de la Lima.</p> |                  |              |

### AVANCES DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE JUVENTUD

Las Oficinas Municipales de Juventud han realizados acciones aun con las dificultades que ha dejado la pandemia para realizar actividades plenamente en los espacios CONVIVIR, es importante destacar que el municipio de La Lima y Siguatepeque han reportado sus logros y avances a la fecha.

#### MUNICIPIO DE LA LIMA:

Cabe mencionar que la OMJ está realizando los esfuerzos para ejecutar la Estrategia de Juventud, Al igual que otras acciones que la OMJ está desarrollando con ONG, Programas de Cooperación entre otras, a continuación se da a conocer las acciones que se están realizando en los siguientes ejes o áreas:

#### Eje de empleabilidad:

- Proyecto de empleabilidad con Alternativa, Grupo Monge y Diunsa.
- Proyecto de Operario Textil, Empleado Futuro con CADERH.
- Proyecto de Taller de Reparación de Celulares con Visión Mundial.
- Proyecto de empleabilidad en la lima-OMJ.
- Proyecto No me detengo – Semprende.
- Proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro con INJ y Embajada de México.
- Plataforma de Observatorio de Empleabilidad con Visión Mundial.
- Jóvenes capacitados por CONVIVIR.

### **Eje de Formación:**

- Clases de Computación en centro digital de la biblioteca pública.
- Gestión de Becas Estudiantiles con el Sr. Alcalde.
- Taller de Barismo con CONVIVIR.
- Clases de Reparación de Celulares con Visión Mundial.
- Capacitación Mundo Joven en Gracias, Lempira con jóvenes limeños.

### **Eje Social:**

- Intervención Psicosocial en zona de campería.
- Conversatorios Juveniles con Sr. Alcalde.
- Gestión de apoyo con víveres a jóvenes afectados por los huracanes.
- Proyecto Futbol con Valores en los barrios, Promotores Deportivos.
- Creación de la Banda de la escuela Manuel Bonilla.
- Apoyo a las ORMAG en rehabilitación de proyectos.
- Actividades con FUNADEH en campaña de igualdad de Género.
- Cabildo juvenil con más de 600 jóvenes. Elección de Madrina de la Plaza de Juventud.
- Celebración del Día de la Bicicleta.

### **MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE:**

#### **▪ Capacitación de políticas públicas para jóvenes:**

Se realizó la capacitación de jóvenes de diferentes edades, escolaridad y diversos barrios de la ciudad de Siguatepeque, con el fin de que los jóvenes sepan y conozcan los objetivos, decisiones y acciones que llevan a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el gobierno consideran prioritarios.

Los jóvenes dieron sus diversas opiniones acerca de los problemas que ellos consideraban son de suma importancia ponerle atención. Como por ejemplo crear fuentes de trabajo para diferentes edades en edad de trabajar, el espacio de ambientes creativos y el poder tener voz para ser escuchados. En donde han más participado más de 30 jóvenes en diferentes jornadas con una duración de 12 horas por jornada distribuidos en tres días.

▪ **Desarrollo de murales artísticos:**

Dicha actividad se llevó a cabo con diversos jóvenes de la ciudad, con el fin de informar a las personas (niños, adolescentes, adultos) que observan dichos murales contenidos que promueven la convivencia y cultura. Con esta actividad los jóvenes pasan un momento divertido y exploran sus diversas aptitudes artísticas. Estos murales se llevaron a cabo en distintos puntos de la ciudad de Siguatepeque. Que ha contado la participación de 25 jóvenes de diversos sectores de la ciudad.

▪ **Capacitación de Jóvenes en Habilidades para la Vida:**

Con el fin de incrementar las habilidades para la vida de los jóvenes y fomentar la capacidad de los jóvenes a tomar decisiones y llevar a cabo las acciones que impactan positivamente en la vida y de quienes los rodean.

Así mismo con el objetivo de promover el bienestar psicológico y físico de los jóvenes. Por lo cual esta capacitación la impartió una licenciada en psicología para tener un mayor acercamiento con los jóvenes, así mismo siguiendo todas las medidas de bioseguridad. Con una participación de 40 jóvenes en dos jornadas.

▪ **Conversatorio con los jóvenes y las distintas autoridades de la ciudad:**

El propósito del conversatorio fue para hacer reflexión sobre un tema de interés. Del cual se genere el dialogo y se compartan ideas.

En donde se creó el espacio de dialogo para los jóvenes que participaron en dicho conversatorio para reflexionar como ellos pueden contribuir en diversos temas de interés.

Creando conciencia de dicha problemática y la necesidad de tener a jóvenes voceros en todos los entornos tanto laborales, sociales y culturales. Con la participación de 30 jóvenes en diferentes días.

▪ **Jornada de sociabilización con jóvenes del proyecto construyendo el futuro:**

Se llevó a cabo una jornada de sociabilización con los jóvenes del proyecto construyendo el futuro, con el fin de conocer cuáles han sido sus experiencias en su entorno laboral a su vez en su crecimiento personal.

Por lo cual dicho proyecto ha tenido un enorme impacto positivo en estos jóvenes de diversas edades, diferentes niveles de escolaridad y diversos barrios y aldeas de la ciudad de Siguatepeque, a su vez este proyecto ha detenido en estas zonas el crecimiento de migración que se había estado experimentado.

A su vez los jóvenes dieron su agradecimiento por esta oportunidad que han tenido y de los cambios que han tenido en sus vidas. En donde han participado una cantidad de 500 jóvenes.

**xii. CONVIVIR FASE II**

El Programa CONVIVIR Fase II, actualmente se encuentra en proceso de inicio, por lo que a continuación se detallan datos importantes de sus avances:

- Es un préstamo de 6 millones de Euros.
- Tiene fecha de inicio del 14 de julio del año 2021, el cual inicia con la presencia de la Asistencia Técnica.
- Actualmente se reprogramo el POA 2021, tomando en cuenta los tiempos de los procesos para la ejecución de los fondos.

**xiii. Avances del inicio de Fase III:**

- ❖ Es una donación de 10 millones de Euros
- ❖ Actualmente se encuentra en proceso a la enmienda a la nota de prioridad para el avance de la Fase III.
- ❖ En el mes de junio se inició con el proceso de evaluación para la selección de los municipios de esta fase en conjunto con la Consultora del KfW y la Coordinación del Programa CONVIVIR.
- ❖ Se logró la revisión de las partes del acuerdo separado y el contrato de aporte financiero, el cual se encuentra en su versión final.

## **CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)**



### **✓ Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)**

#### **A. Objetivo General**

El propósito de esta Actividad es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

#### **B. Focalización**

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en las cinco municipalidades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Tela y La Ceiba. Las comunidades específicas de intervención serán identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

#### **C. Descripción del Proyecto**

Esta Actividad ayudará al GdeH (representado a través de FHIS) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otras partes interesadas. La Actividad incluye dos resultados complementarios: Resultado 1: Mejora de la infraestructura comunitaria, las actividades responderán a las prioridades de infraestructura comunitaria para abordar la seguridad ciudadana. Resultado 2: Aumento de la cohesión comunitaria, considera que la forma en que las intervenciones de infraestructura son concebidas, diseñadas y ejecutadas pueden desempeñar un papel directo en el aumento de la cohesión social y comunitaria y promover un marco holístico de prevención de la violencia. Los proyectos bajo la Actividad incluirán instalaciones educativas, centros de salud, alumbrado público, espacios comunitarios más seguros, centros de

alcance y comunitarios, centros vocacionales, jardines comunitarios, parques, espacios recreativos, paradas de buses, accesos peatonales, mejoras al alumbrado de calles, señalización, instalaciones para el sector seguridad y justicia, así como otros proyectos de infraestructura de pequeña escala que se acuerde entre las Partes.

#### D. Monto del Convenio

Presupuesto total estimado: \$14,637, 541.74, de los cuales, fondos de donación de USAID: \$11, 710,033.39; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$ 2, 927,508.35 (efectivo: \$ 2,127,508.35 y especies: \$ 800,000.00).

##### i. Avance Financiero

| Año  | Presupuesto    | Ejecutado     | Eficiencia |
|------|----------------|---------------|------------|
| 2018 | 23.226.555,00  | 21.906.553,68 | 94%        |
| 2019 | 60.781.669,00  | 60.781.669,00 | 100%       |
| 2020 | 145.322.291,00 | 60.678.681,68 | 42%        |
| 2021 | 90.509.866,00  | 16.956.482,58 | 19%        |

##### ii. Avance por Sector

| SECTOR       | Proyectos Finalizados 2021 | Mto. Ejecutado 2021  | Empleos Generados 2021 | Beneficiarios Directos 2021 |
|--------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| EDUCACION    | 2                          | 16.956.482,58        | 23                     | 2.352                       |
| <b>TOTAL</b> | <b>2</b>                   | <b>16.956.482,58</b> | <b>23</b>              | <b>2.352</b>                |

##### iii. Avance por Departamento

| DEPARTAMENTO | Proyectos Finalizados 2021 | Mto. Ejecutado 2021  | Empleos Generados 2021 | Beneficiarios directos 2021 |
|--------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| ATLANTIDA    | 2                          | 15.331.285,44        | 23                     | 2.352                       |
| CORTES       | 0                          | 1.625.197,14         | 0                      | 0                           |
| <b>TOTAL</b> | <b>2</b>                   | <b>16.956.482,58</b> | <b>23</b>              | <b>2.352</b>                |

#### iv. Principales Logros (abril-junio 2021)

##### COMPONENTE SOCIAL

Se llevaron a cabo capacitaciones a los comités y personal de mano de obra en temas de Bioseguridad, también se ha fortalecido a la comunidad en temas de Género, cumpliendo los indicadores del Plan de monitoreo y Plan de Género del programa.

Con las cartas de ejecución CdE 04 y CdE 11 Se financiaron desde el 2017 al 2021 31 proyectos de cartera regular y 04 proyectos de Covid-19.

##### Proyectos de Inversión Cartera Regular

| N. | Tipo | Descripción                                                                      | Estatus    | Departamento      | Municipio      | Total           |               |                 |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|    |      |                                                                                  |            |                   |                | USAID           | NAC           | Costo Total     |
| 1  | CDA  | Mejoras al Centro de Alcance (CDA) Las Ayestas 107124                            | Finalizado | Francisco Morazán | MDC            | L. 1,144,389.39 | L. 0.00       | L. 1,144,389.39 |
| 2  | CDE  | Rep. Instituto Reynaldo Narvaez Rosales. Col. Las Torres P-107089                | Finalizado | Francisco Morazán | MDC            | L. 3,096,166.40 | L. 0.00       | L. 3,096,166.40 |
| 3  | CDA  | Pavimentación Calle Principal Juzgados (Ruta Segura) 107149                      | Finalizado | Cortés            | Choloma        | L. 2,722,469.41 | L. 0.00       | L. 2,722,469.41 |
| 4  | CDE  | Rep. Escuela Carlos Rivera Lopez, Colonia Central Sector Rivera Hernandez 106826 | Finalizado | Cortés            | San Pedro Sula | L. 2,577,294.86 | L. 0.00       | L. 2,577,294.86 |
| 5  | CDE  | Obras Compl. CEB José Antonio Peraza, Rivera Hernandez 106799                    | Finalizado | Cortés            | San Pedro Sula | L. 2,431,860.79 | L. 0.00       | L. 2,431,860.79 |
| 6  | CDA  | Pavimentación Calle Principal Col. Lopez Arellano (Ruta Segura) 106828           | Finalizado | Cortés            | Choloma        | L. 2,980,291.32 | L. 218,764.58 | L. 3,199,055.90 |
| 7  | CDE  | Ampliación y Mejoras CEB Marco Antonio Ponce 107093                              | Finalizado | Atlántida         | La Ceiba       | L. 4,889,681.52 | L. 8,845.43   | L. 4,898,526.95 |
| 8  | CDE  | Reparación Instituto Triunfo de la Cruz Fase I 107300                            | Finalizado | Atlántida         | Tela           | L. 892,602.62   | L. 0.00       | L. 892,602.62   |
| 9  | CDA  | Construcción Centro de Integral Corozal, 107212                                  | Finalizado | Atlántida         | La Ceiba       | L. 3,291,818.76 | L. 247,776.94 | L. 3,539,595.70 |



| N. | Tipo               | Descripción                                                                                | Estatus           | Departamento      | Municipio      | Total           |              |                 |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|    |                    |                                                                                            |                   |                   |                | USAID           | NAC          | Costo Total     |
| 10 | CDE                | Rep. Techo CEB Miguel Paz Barahona 107356                                                  | Finalizado        | Atlántida         | La Ceiba       | L. 96,114.78    | L. 0.00      | L. 96,114.78    |
| 11 | CDA                | Reparación de Casa Alianza Centro 106856                                                   | Finalizado        | Francisco Morazán | MDC            | L. 4,782,750.30 | L. 0.00      | L. 4,782,750.30 |
| 12 | CDE                | Construcción Kinder Mirian Lobo, Colonia Las Mercedes, La Ceiba, Atlántida, Código 107408  | Finalizado        | Atlántida         | La Ceiba       | L. 2,952,664.72 | L. 43,018.99 | L. 2,995,683.71 |
| 13 | CDA                | UMEP-7 Reparación y Ampliación CDA Arenales 107587                                         | Finalizado        | Cortés            | San Pedro Sula | L. 950,564.43   | L. 28,288.31 | L. 978,852.74   |
| 14 | CDA                | Mejoras Centro de Alcance (CDA) Estados Unidos 107348                                      | Finalizado        | Francisco Morazán | MDC            | L. 151,624.98   | L. 0.00      | L. 151,624.98   |
| 15 | CDA                | Construcción Posta Policial Bonitillo de "Secretaria de Seguridad"                         | Finalizado        | Atlántida         | La Ceiba       | L. 3,438,128.02 | L. 0.00      | L. 3,438,128.02 |
| 16 | CDA                | Ampliación Centro de Alcance, Colonia Las Mercedes, La Ceiba, Atlántida 107378             | Finalizado        | Atlántida         | La Ceiba       | L. 1,797,437.80 | L. 42,880.87 | L. 1,840,318.67 |
| 17 | CDE                | Ampliación CEB Dr. Alfonso Lacayo, Colonia Alfonso Lacayo, Sector Rivera Hernandez, 107404 | Finalizado        | Cortés            | San Pedro Sula | L. 6,000,000.00 | L. 0.00      | L. 6,000,000.00 |
| 18 | CDA                | Ruta Segura a Centro de Alcance Col. Nueva Suyapa 107377                                   | Finalizado        | Francisco Morazán | MDC            | L. 3,588,557.09 | L. 80,265.23 | L. 3,668,822.32 |
| 19 | CDE                | Construcción de Obras de Confianza CEB Marco Aurelio Soto, Tornabe Tela, Atlántida. 107661 | Cierre financiero | Atlántida         | Tela           | L. 274,354.04   | L. 10,005.63 | L. 284,359.67   |
| 20 | CDE                | Reparación modulo Sanitario CEB Antonio Jose Coello Bo. San Jose Tela, Atlántida 107675    | Cierre financiero | Atlántida         | Tela           | L. 377,467.49   | L. 25,254.72 | L. 402,722.21   |
| 21 | CONTRATO No. 63624 | Reparación De CEIN Y Ampliación De Maie Sutrascfo, La Ceiba, Atlántida. Código 107222      | Finalizado        | Atlántida         | La Ceiba       | L. 2,087,122.30 | L. 0.00      | L. 2,087,122.30 |
| 22 | CDE                | Rep Instituto Triunfo de la Cruz Fase II. 107561                                           | Cierre financiero | Atlántida         | Tela           | L. 3,222,347.53 | L. 0.00      | L. 3,222,347.53 |



| N. | Tipo | Descripción                                                                                                         | Estatus              | Departamento         | Municipio      | Total                |                   |                      |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|    |      |                                                                                                                     |                      |                      |                | USAID                | NAC               | Costo Total          |
| 23 | CDA  | Construcción Techo A<br>Cancha Multiusos,<br>Colonia Japón,<br>Choloma, Cortes,<br>Código 107537                    | Finalizado           | Cortés               | Choloma        | L. 1,097,954.75      | L. 0.00           | L. 1,097,954.75      |
| 24 | CDE  | Reparación CEB<br>Claudio Barrera,<br>Colonia San Judas, La<br>Ceiba, Atlántida,<br>Código 107482                   | Finalizado           | Atlántida            | La Ceiba       | L. 5,324,202.09      | L. 0.00           | L. 5,324,202.09      |
| 25 | CDE  | Proy. Obra de Confianza<br>CEB Tte. Alex Edgardo<br>Alanis, Col. Calpules.<br>107718                                | Finalizado           | Cortés               | San Pedro Sula | L. 479,983.48        | L. 16,208.60      | L. 496,192.08        |
| 26 | CDA  | UMEP-1 Iluminación<br>Calle Principal Colonia<br>Izaguirre 107639                                                   | Finalizado           | Francisco<br>Morazán | MDC            | L. 199,014.65        | L. 28,326.70      | L. 227,341.35        |
| 27 | CDE  | Reparación y obras<br>complementarias<br>Escuela Ramón<br>Montoya. 107572                                           | Finalizado           | Atlántida            | La Ceiba       | L. 4,844,426.98      | L. 0.00           | L. 4,844,426.98      |
| 28 | CDA  | Construcción de Centro<br>de Alcance Corozal,<br>Colonia David,<br>Comunidad Corozal, La<br>Ceiba, Atlántida 107503 | Finalizado           | Atlántida            | La Ceiba       | L. 1,979,330.62      | L. 43,950.72      | L. 2,023,281.34      |
| 29 | CDA  | Ampliación Espacio<br>Físico Municipal, Barrio<br>El Centro, La Ceiba,<br>Atlántida, Código<br>107540               | Finalizado           | Atlántida            | La Ceiba       | L. 1,187,894.29      | L. 0.00           | L. 1,187,894.29      |
| 30 | CDA  | Construcción<br>Estacionamiento CEIN-<br>MAIE 108060                                                                | Cierre<br>financiero | Atlántida            | La Ceiba       | L. 250,302.00        | L. 37,545.30      | L. 287,847.30        |
| 31 | CDA  | UDEP La Ceiba<br>Construcción Centro de<br>Alcance Barrio La Isla<br>107616                                         | Finalizado           | Atlántida            | La Ceiba       | L. 613,366.10        | L. 0.00           | L. 613,366.10        |
|    |      | <b>TOTAL</b>                                                                                                        |                      |                      |                | <b>69,722,183.51</b> | <b>831,132.02</b> | <b>69,408,926.14</b> |

### **Proyectos de Inversión Cartera COVID-19**

| N. | Tipo  | Descripción                                                                                                                                                  | Estatus    | Departamento      | Municipio      | Total                   |                      |                      |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|    |       |                                                                                                                                                              |            |                   |                | USAID                   | NAC                  | Costo Total          |
| 1  | COVID | Mejoras Y Acondicionamiento Del Laboratorio De Virología Regional De Cortés (Región 5), San Pedro Sula, Departamento De Cortés”, Código 107888               | Ejecución  | Francisco Morazán | MDC            | L. 2,076,882.04         | L. 117,418.67        | L. 2,194,300.71      |
| 2  | COVID | Construcción De Laboratorio Regional Atlántida De Virología”, Ubicado En El Municipio De La Ceiba, Departamento De Atlántida”, Código 107902                 | Finalizado | Francisco Morazán | MDC            | L. 3,733,514.14         | L. 462,878.32        | L. 4,196,392.46      |
| 3  | COVID | Construcción De Clínicas Y Área De Descanso En Hospital Regional Atlántida”, Ubicado En El Municipio De La Ceiba, Departamento De Atlántida”, Código 107900, | Finalizado | Cortés            | Choloma        | L. 5,893,287.52         | L. 355,284.71        | L. 6,248,572.23      |
| 4  | COVID | Const. de bodega de insumos Regional No.5 y obra complementaria 107977                                                                                       | Ejecución  | Cortés            | San Pedro Sula | L. 3,884.24             | L. 582.64            | L. 4,466.88          |
|    |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                 |            |                   |                | <b>L. 11,707,567.94</b> | <b>L. 936,164.34</b> | <b>12,643,732.28</b> |

#### **v. PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN DEL II TRIMESTRE 2021**

Baja ejecución por la tardanza en la firma de la carta de ejecución 22, por lo cual no se lograron realizar las contrataciones del primer y segundo trimestre debido al vencimiento de la carta de ejecución vigente.

#### **vi. Acciones realizadas por la DIM:**

Se gestionó la firma ante USAID y SEFIN para la carta de ejecución 22 de ICS, la cual fue firmada el 26 de marzo del 2021, ampliando la donación hasta marzo del 2022.

✓ **Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)**

**i. Antecedente**

Las pobres condiciones sociales y económicas son especialmente pronunciadas en el occidente de Honduras, extrema pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático, bajos niveles educativos, migración, falta de acceso a los servicios básicos y otros retos socioeconómicos son endémicos. La provisión de servicios básicos de educación y nutrición son escasos en la zona de occidente y es difícil el acceso a los ya existentes, así mismo la gestión de servicios de educación, nutrición y agua y saneamiento son deficientes por lo que los ciudadanos cuentan además con pocos espacios de participación para mejorar sus vidas a nivel de hogar y sus vidas productivas, lo que genera una gran brecha de pobreza.

En este sentido se busca a través de proyectos de infraestructura de pequeña escala, la generación de accesos para la comunidad a espacios de participación que sirvan como plataforma para impulsar el desarrollo sostenible de la región, logrando satisfacer necesidades no satisfechas de algunos de los servicios básicos para generar un efecto multiplicador en la zona occidental del país.

Actualmente, la **AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID)** en apoyo al Gobierno de Honduras, ha asignado fondos de donación para la ejecución de proyectos de infraestructura a través de la **SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO, FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (SEDECOAS/FHIS)**, que vengán a mejorar las condiciones en las comunidades seleccionadas en el occidente de Honduras.

En base a lo anterior, surge la Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras, mediante la cual se ha considerado proveer esfuerzos de infraestructura a pequeña escala para mejorar la entrega de servicios a la población, mejorando condiciones de pobreza, vulnerabilidad al cambio climático, bajos niveles educativos e inseguridad alimentaria debido a la falta de acceso a servicios básicos. A su vez con esto se pretende crear una plataforma de participación ciudadana para cimentar las bases de una estructura comunitaria más efectiva, jugando un rol importante en la mejora de la entrega de servicios locales en el Occidente de Honduras. - El área de intervención será enfocada en las zonas de mayor pobreza, específicamente está orientada a seis departamentos del Occidente de Honduras.

Se ha planteado como meta beneficiar comunidades ubicadas en los seis departamentos de la zona de occidente de Honduras, su mayoría de la zona rural, habitantes en comunidades que presentan condiciones de pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático, bajos niveles educativos, migración y falta de acceso a servicios público.

La administración y ejecución de la Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH), financiado con fondos USAID, estará a cargo del SEDECOAS/FHIS, a través de la Dirección de Infraestructura Mayor (DIM).

## ii. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en los departamentos de Ocotepeque, la Paz, Copán, Intibucá, Santa Bárbara y Lempira y zonas occidentales específicas de intervención identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

## iii. Monto del Convenio

El monto total de la Actividad es de \$ 3,750,000.00 (USAID \$ 3,000,000.00, Gobierno de Honduras \$ 750,000.00).

## iv. Avance Financiero

| Año  | Presupuesto   | Ejecutado     | Eficiencia |
|------|---------------|---------------|------------|
| 2019 | 6.190.650,00  | 5.981.569,54  | 97%        |
| 2020 | 65.583.096,00 | 13.336.794,49 | 20%        |
| 2021 | 59.299.860,00 | 1.050.500,00  | 2%         |

## v. Avance por Sector

| SECTOR       | Proyectos Finalizados 2021 | Mto. Ejecutado 2021 | Empleos Generados 2021 | Beneficiarios Directos 2021 |
|--------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| EDUCACION    | 3                          | -                   | 135                    | 507                         |
| HOSPITALES   | 5                          | 1.050.500,00        | 299                    | 1.186.260,00                |
| <b>TOTAL</b> | <b>8</b>                   | <b>1.050.500,00</b> | <b>434</b>             | <b>1.186.767</b>            |

**vi. Avance por Departamento**

| DEPARTAMENTO      | Proyectos Finalizados 2021 | Mto. Ejecutado 2021 | Empleos Generados 2021 | Beneficiarios directos 2021 |
|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| COPAN             | 1                          | -                   | 30                     | 411.445                     |
| CORTES            | 1                          | -                   | 29                     | 8                           |
| FRANCISCO MORAZAN | 1                          | -                   | 50                     | 660                         |
| INTIBUCÁ          | 2                          | -                   | 130                    | 268.248                     |
| LA PAZ            | 1                          | -                   | 20                     | 79                          |
| LEMPIRA           | 0                          | -                   | 50                     | 50.285                      |
| OCOTEPEQUE        | 1                          | -                   | 25                     | 151                         |
| SANTA BARBARA     | 1                          | 1.050.500,00        | 80                     | 455.891                     |
| <b>TOTAL</b>      | <b>8</b>                   | <b>1.050.500,00</b> | <b>414</b>             | <b>1.186.767</b>            |

**vii. Principales Logros (abril-junio 2021)**

**PROYECTOS FINALIZADOS**

A la fecha se han finalizado tres proyectos realizados bajo la Metodología PEC y cinco proyectos de emergencia para brindar respuesta ante la pandemia COVID-19.

A continuación se presentan los proyectos PEC en ejecución:

**A. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**

| INVERSIÓN PILOTO DE INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE DE HONDURAS – PIOH                                                  |                   |               |               |                      |               |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|------------|
| Nombre del Proyecto                                                                                                  | Departamento      | Municipio     | Aldea         | Monto según Contrato | Tipo proyecto | Estatus    |
| Ampliación Centro de Educación Básica Álvaro Contreras                                                               | Ocatepeque        | Sensenti      | Azacualpa     | L 4,494,819.97       | PEC           | Finalizado |
| Ampliación Centro de Educación Básica Francisco Morazán                                                              | Intibucá          | Yamaranguila  | Planes        | L 4,748,951.39       | PEC           | Finalizado |
| Reposición Escuela Unión y Fe                                                                                        | La Paz            | San José      | Cerro Bueno   | L 3,618,292.58       | PEC           | Finalizado |
| Construcción de Cisternas y Cambio de Techo Sala de Operaciones y Neumología Instituto Nacional Cardiopulmonar Tórax | Francisco Morazán | M.D.C.        | Tegucigalpa   | L 1,787,515.91       | COVID-19      | Finalizado |
| Construcción Clínicas y Área de Descanso para Médicos del Hospital Santa Bárbara Integrado (HSBI)                    | Santa Bárbara     | Santa Bárbara | Santa Bárbara | L 5,117,997.40       | COVID-19      | Finalizado |

|                                                                                                      |          |                     |                    |                 |          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------|-----------------|----------|------------|
| Construcción de Área de Descanso para Médicos en el Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela (HLMV) | Cortés   | San Pedro Sula      | San Pedro Sula     | L 1,281,688.19  | COVID-19 | Finalizado |
| Construcción de Laboratorio de Virología en la Regional de Salud No.4                                | Copán    | Santa Rosa de Copán | Barrio El Calvario | L 3,877,531.86  | COVID-19 | Finalizado |
| Rehabilitación y Ampliación Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato                                     | Intibucá | La Esperanza        | La Esperanza       | L. 5,381,051.93 | COVID-19 | Finalizado |

A continuación se presentan los proyectos PEC y con Contratista que se encuentran en ejecución durante ese periodo:

| INVERSIÓN PILOTO DE INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE DE HONDURAS – PIOH |                                                       |              |                |                   |                         |                 |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-----------|
| ítem                                                                | Nombre del Proyecto                                   | Departamento | Municipio      | Aldea             | Monto total de contrato | % Avance físico | Estatus   |
| 1                                                                   | Ampliación CEB Tiburcio Carias Andino                 | Intibucá     | Jesús de Otoro | Barrio Santa Cruz | L 4,397,544.84          | 92%             | Ejecución |
| 2                                                                   | Ampliación Escuela Eusebio Amaya Gómez                | Lempira      | Belén          | La Puerta         | L 4,630,980.59          | 72%             | Ejecución |
| 3                                                                   | Ampliación CEB Prudencio Arita                        | Ocatepeque   | La Labor       | Llano Largo       | L 4,836,883.17          | 80%             | Ejecución |
| 4                                                                   | Construcción Clínicas del Hospital Juan Manuel Gálvez | Lempira      | Gracias        | Gracias           | L 4,700,000.00          | 18%             | Ejecución |

#### viii. Problemática en la ejecución del II trimestre 2021

- Se ha mantenido el estado de emergencia decretado por el Gobierno de la Republica de Honduras por la Pandemia de COVID-19, lo cual genera atrasos por las restricciones dadas por algunos municipios donde tiene injerencia PIOH e ICS.
- La firma de la adenda a la carta de ejecución (marzo para ICS y abril para PIOH), lo que generó de alguna manera atrasos ya que algunos proyectos necesitaban la carta con nuevo periodo de vigencia para dar las respectivas formulaciones, ordenes de inicio y ejecutar.
- Se mantiene pendiente por parte de SEFIN realizar las modificaciones presupuestarias para proceder a regularizar los montos pendientes tanto de PIOH como ICS.

**Acciones realizadas por la DIM:**

- Serán regularizados 23.7 Millones correspondientes a la ejecución de Fondos 22 reembolsado por USAID de Enero a Junio 2021.
- Se están coordinando acciones de forma cercana con SEFIN & SEDECOAS, para la aprobación de las modificaciones presupuestas.
- Considerando los plazos de vencimiento de las cartas de ICS & PIOH, se está trabajando el nuevo plan de Trabajo y Carta de Ejecución con acompañamiento de USAID, para enviar a aprobación y firma, procurando que esto no vaya a generar atrasos en los próximos trimestres.

## **PROGRAMA 15: RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA NACIONAL**

### **✓ Respuesta a Emergencia Generados por los Huracanes Eta e Iota**

#### **i. Objetivo General**

Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción del mismo y manejo de desastre, como una estrategia para mejorar la eficiencia en la preparación para la respuesta y la recuperación post desastre naturales.

Atención de la infraestructura dañada por el Huracán y Tormenta Tropical ETA: rehabilitación de pasos y caminos terciarios, reparación y construcción de cajas puentes rehabilitación y construcción de sistemas de drenaje, puentes (Bailey), construcción de calles terciarias, obras de mitigación entre otras.

#### **ii. Focalización**

El Programa realizar intervenciones en los 5 Departamentos Occidente afectados por las tormentas tropicales: Ocotepeque, Copan, Santa Bárbara, Lempira e Intibucá.

#### **iii. Avance Financiero**

| Año  | Presupuesto   | Ejecutado     | Eficiencia |
|------|---------------|---------------|------------|
| 2020 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 100%       |
| 2021 | 53.489.000,00 | 8.400.719,07  | 16%        |

#### **iv. Avance por Sector**

| SECTOR               | Proyectos Finalizados 2021 | Mto. Ejecutado 2021 |
|----------------------|----------------------------|---------------------|
| INFRAESTRUCTURA VIAL | 7                          | 8.400.719,07        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>7</b>                   | <b>8.400.719,07</b> |

**v. Avance por Departamento**

| DEPARTAMENTO | Proyectos Finalizados 2021 | Mto. Ejecutado 2021 |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| COPAN        | 1                          | 1.568.108,90        |
| INTIBUCÁ     | 5                          | 5.264.501,27        |
| LEMPIRA      | 1                          | 1.568.108,90        |
| <b>TOTAL</b> | <b>7</b>                   | <b>8.400.719,07</b> |

**vi. Situación Actual**

**ASIGNACION DE FUENTE CONVENIO FHIS 2021 RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA NACIONAL**

| CODIGO DE PROYECTO | Nombre Proyecto                                            | Nombre Contratista                                                    | Departamento  | Municipio                | Aldea        | Año Aprobacion | Año de Contratacion | Fecha de Contrato | TOTAL APROBADO        | Monto Ejecutado       | Monto por Ejecutar     |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 108362             | CONSTRUCCION DE PUENTE                                     | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. DE R. L. DE C. V (SERICON) | INTIBUCA      | SAN FRANCISCO DE OPALACA | Ojos de Agua | 2021           | 2021                | 02/06/2021        | L 9.853.946,34        | L -                   | L 9.853.946,34         |
| 108222             | CONSTRUCCION CAJA PUENTE                                   | MARCO ANTONIO COELLO FLAMENCO                                         | INTIBUCA      | SAN MIGUELITO            | El Naranjo   | 2021           | 2021                | 21/05/2021        | L 2.602.470,54        | L -                   | L 2.602.470,54         |
| 108107             | CONSTRUCCION MURO DE CONCRETO CICLOPERO Y MURO DE GAVIONES | CORPORACION SOL, S.A. DE C.V.                                         | LEMPIRA       | GRACIAS                  | El Rion      | 2021           | 2021                | 18/03/2021        | L 5.666.374,97        | L 5.366.374,97        | L 300.000,00           |
| 108419             | LIMPIEZA Y REHABILITACION DE CALLE                         | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO S. DE R. L. DE C.V.                | INTIBUCA      | LA ESPERANZA             | La Rinconada | 2021           | 2021                | 17/05/2021        | L 2.153.777,48        | L 258.126,30          | L 1.895.651,18         |
| 108434             | REHABILITACION DE CAMINO                                   | Adjudicacion y Contratacion (Obras, Bienes y Servicios)               | SANTA BARBARA | QUIMISTAN                | La Ceibita   | 2021           | 0                   |                   | L 153.912,00          | L -                   | L 153.912,00           |
| 108435             | REHABILITACION DE CAMINO                                   | Adjudicacion y Contratacion (Obras, Bienes y Servicios)               | SANTA BARBARA | QUIMISTAN                | La Ceibita   | 2021           | 0                   |                   | L 205.216,00          | L -                   | L 205.216,00           |
| 108436             | REHABILITACION DE CAMINO                                   | Adjudicacion y Contratacion (Obras, Bienes y Servicios)               | SANTA BARBARA | QUIMISTAN                | La Ceibita   | 2021           | 0                   |                   | L 153.912,00          | L -                   | L 153.912,00           |
| 108437             | REHABILITACION DE CAMINO                                   | Adjudicacion y Contratacion (Obras, Bienes y Servicios)               | SANTA BARBARA | QUIMISTAN                | Los Limones  | 2021           | 0                   |                   | L 89.782,00           | L -                   | L 89.782,00            |
| 108438             | REHABILITACION DE CAMINO                                   | Adjudicacion y Contratacion (Obras, Bienes y Servicios)               | SANTA BARBARA | QUIMISTAN                | Quimistan    | 2021           | 0                   |                   | L 218.042,00          | L -                   | L 218.042,00           |
| 108439             | REHABILITACION DE CAMINO                                   | Adjudicacion y Contratacion (Obras, Bienes y Servicios)               | SANTA BARBARA | QUIMISTAN                | Piñuelas     | 2021           | 0                   |                   | L 89.782,00           | L -                   | L 89.782,00            |
| 108440             | REHABILITACION DE CAMINO                                   | Adjudicacion y Contratacion (Obras, Bienes y Servicios)               | SANTA BARBARA | QUIMISTAN                | Callejones   | 2021           | 0                   |                   | L 218.042,00          | L -                   | L 218.042,00           |
| 108360             | REHABILITACION DE CAMINO                                   | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO S. DE R. L. DE C.V.                | INTIBUCA      | YAMARANGUILA             | La Colonia   | 2021           | 2021                | 17/05/2021        | L 314.807,24          | L -                   | L 314.807,24           |
| 108456             | REHABILITACION DE CAMINO                                   | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO S. DE R. L. DE C.V.                | INTIBUCA      | SAN MARCOS DE LA SIERRA  | Las Delicias | 2021           | 2021                | 17/05/2021        | L 489.700,43          | L -                   | L 489.700,43           |
| 108525             | CONSTRUCCION MURO DE RETENCION CON CONCRETO CICLOPEO       | CONSTRUCCION E INVERSIONES ARIES S. DE R. L. ARIES                    | COPAN         | SANTA RITA               | Santa Rita   | 2021           | 2021                | 20/05/2021        | L 1.822.810,71        | L -                   | L 1.822.810,71         |
| 108633             | CONSTRUCCION DE PUENTE RIO MARCHALA                        | Adjudicacion y Contratacion (Obras, Bienes y Servicios)               | OCOTEPEQUE    | OCOTEPEQUE               | Ocatepeque   | 2021           | 0                   |                   | L 14.199.873,08       | L -                   | L 14.199.873,08        |
| 108740             | CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE                                | Autorizacion y Aprobacion                                             | EL PARAISO    | TROJES                   | Yamales      | 0              | 0                   |                   | L 1.133.769,27        | L -                   | L 1.133.769,27         |
| <b>Total</b>       |                                                            |                                                                       |               |                          |              |                |                     |                   | <b>L39.366.218,06</b> | <b>L 5.624.501,27</b> | <b>L 33.741.716,79</b> |

## **vii. Problemática**

En relación a la parte de inversión del presupuesto asignado para la reconstrucción de la infraestructura nacional:

- La ejecución se dio en el segundo trimestre de acuerdo a la contratación de los proyectos ya que a la fecha la mayoría se encuentran en fase de autorización y otros en fase de adjudicación y contratación.
- La limitante para efectuar la ejecución de los proyectos por la congelación de presupuesto vigente por la Secretaria de Finanzas.
