



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



---

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS  
DE DESARROLLO COMUNITARIO,  
AGUA Y SANEAMIENTO  
SEDECOAS

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL  
(SEDECOAS/FHIS)

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan  
Operativo Anual POA-Presupuesto

**III Trimestre 2021**

## Indicé

<b>Introducción .....</b>	<b>3</b>
<b>Antecedentes.....</b>	<b>3</b>
<b>Misión: .....</b>	<b>4</b>
<b>Visión: .....</b>	<b>4</b>
<b>Valores: .....</b>	<b>4</b>
<b>Resumen Ejecutivo .....</b>	<b>5</b>
<b>Situación Actual de los Programas: .....</b>	<b>6</b>
<b>Proyectos FHIS .....</b>	<b>8</b>
<b>Ejecución Presupuestaria por Programas 2021 .....</b>	<b>9</b>
<b>Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2021 .....</b>	<b>10</b>
<b>Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Tercer Trimestre 2021 .....</b>	<b>11</b>
<b>Ejecución Gasto Operativo Tercer Trimestre del 2021.....</b>	<b>12</b>
<b>Cuadro por Sector 2021 (Ejecutado) .....</b>	<b>14</b>
<b>CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.....</b>	<b>15</b>
✓ <b>Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB).....</b>	<b>15</b>
<b>CARTERA BANCO MUNDIAL.....</b>	<b>21</b>
✓ <b>Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE 6822-HN).....</b>	<b>21</b>
<b>CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA .....</b>	<b>32</b>
✓ <b>Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE) .....</b>	<b>32</b>
<b>CARTERA KfW Entwicklungsbank .....</b>	<b>35</b>
✓ <b>Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V 35</b>	
✓ <b>Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) ..40</b>	
<b>CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)50</b>	
✓ <b>Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS) .....</b>	<b>50</b>
✓ <b>Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH) 57</b>	
<b>PROGRAMA 15: RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA NACIONAL .....</b>	<b>61</b>
✓ <b>Respuesta a Emergencia Generados por los Huracanes Eta e Iota.....</b>	<b>61</b>

## Introducción

El presente informe es la recopilación de las actividades e inversiones realizadas por el SEDECOAS/FHIS durante el tercer trimestre del 2021.

## Antecedentes

De acuerdo al Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-056-2019 se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), la cual debe de promover el Desarrollo Comunitario por medio de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos, en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerables de Honduras quien para el desarrollo de sus funciones debe contar con una Subsecretaría de Estado.

Se adscribe a dicha Secretaría de Estado, El Instituto Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS).

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es un organismo Desconcentrado de la Presidencia de la República, creado el 22 de febrero de 1990 y extendida su vida legal hasta el año 2022 según decreto No. 222-2010 cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados, en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social y/o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Asimismo, asesorará a los gobiernos locales con respecto a los procesos de captación de recursos de las fuentes de financiamiento nacionales y/o externas y las asiste en la transferencia de las capacidades técnicas y administrativas, para convertir a estos gobiernos locales en administradores eficientes de sus programas y proyectos, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Nación en aplicación del principio de Descentralización.

### **Misión:**

“Somos una Institución estatal, desconcentrada, técnica y captadora de recursos que promueve el desarrollo local sostenible, participativo e incluyente mediante el fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, en alianza con socios estratégicos para desarrollar obras de infraestructura y proyectos de orientación social de acuerdo al plan de nación y visión de país de forma transparente y eficiente, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable de Honduras”.

### **Visión:**

“Ser para el año 2022, la Institución líder en gestión y fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, para la ejecución de proyectos, que contribuya equitativamente al desarrollo sustentable nacional”.

### **Valores:**

- **Ética:** Ejercicio de las funciones con sujeción a las normas morales que promuevan la confianza de la población hondureña.
- **Integridad:** Actuación sustentada en la honradez, prudencia, entereza, rectitud y firmeza.
- **Compromiso:** Ejecución de proyectos que coadyuven al desarrollo local.
- **Transparencia:** Amplia difusión de información sobre nuestras actuaciones. Rendición de cuentas ante la sociedad.
- **Lealtad:** Actuar con fidelidad y rectitud hacia el FHIS y compañeros de trabajo, con el objetivo de identificarse con la institución.
- **Equidad:** El FHIS no hace distinción de credo, raza, de ninguna otra forma de discriminación humana.


## Resumen Ejecutivo

SEDECOAS/FHIS, llega hasta los lugares más recónditos del país, para contribuir a mitigar las necesidades de la población más pobre y vulnerable a través de respuestas rápidas y concretas con proyectos de Agua y Saneamiento, Educación, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural.

El presupuesto de SEDECOAS/FHIS para la gestión 2021 al 30 de septiembre asciende a 1.561 Millones de Lempiras:

Fuente	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	% de Participación en el Presupuesto Vigente
<b>BID</b>	L. 105.265.786,00	L. 120.272.463,00	8%
<b>BM</b>	L. -	L. 188.337.388,00	12%
<b>BCIE</b>	L. 973.686.940,00	L. 505.920.073,00	32%
<b>USAID</b>	L. 249.987.754,00	L. 149.809.726,00	10%
<b>GOH*</b>	L. 307.808.758,00	L. 420.608.758,00	27%
<b>KfW</b>	L. 153.385.842,00	L. 176.634.631,00	11%
<b>TOTAL</b>	<b>L. 1.790.135.080,00</b>	<b>L. 1.561.583.039,00</b>	<b>100%</b>

\* Incluye costo Operativo del FHIS

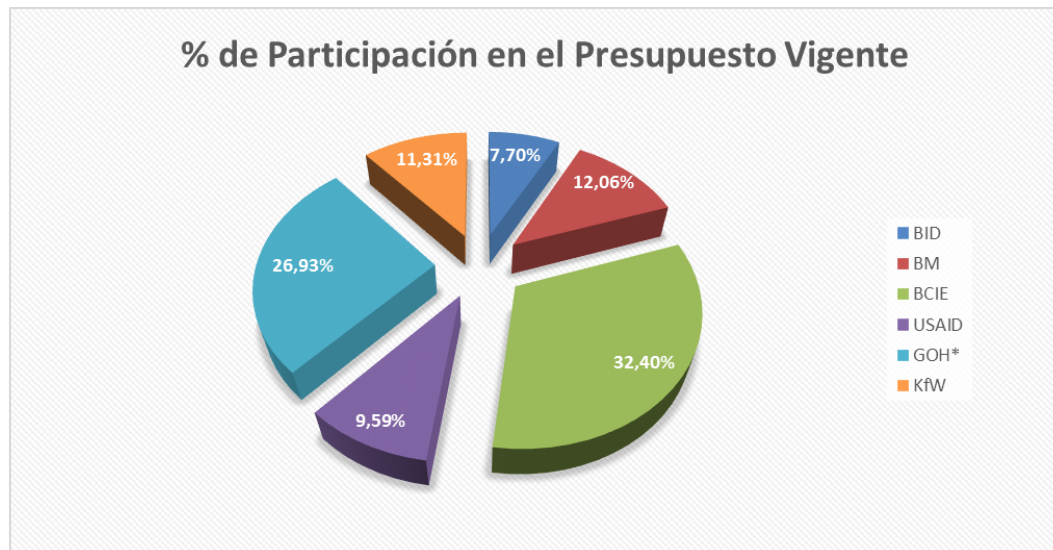

### **Situación Actual de los Programas:**

1. **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)**, Los Proyectos de integración urbana el cual incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y obras de mitigación, al mes de septiembre se tiene un avance financiero del 90% se espera el cierre financiero al mes de diciembre de 2021.

Se finalizó el diseño de obras del Proyecto de Integración Urbana en colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén No. 2, Brisas del Mogote Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 3,035, predios. Se ha iniciado el proceso de licenciamiento ambiental y adquisición de obra y supervisión, se espera la adjudicación (colonias: Brisas del Mogote Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador) al mes de diciembre del año 2021.

2. **Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE)**, El presupuesto aprobado vigente para el periodo 2021 con fondos del Crédito 6822-HN es de L 188, 337,388.00; sin % de ejecución a la fecha. Se han realizado revisiones y reprogramación de actividades en el Plan Operativo Anual (POA), ha sido necesario efectuar modificaciones presupuestarias con el fin de ajustar el presupuesto actual del PRE, permitiendo apoyar presupuestariamente a otros Proyectos al interno de la SEDECOAS.

3. **Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)**, Se realizó la compra de 26,215 tabletas a través del PNUD las cuales fueron entregadas a la Secretaria de Educación para su distribución.

El programa actualmente se encuentra en actividades previas para su ejecución, la diferencia en cuando a producción planificada para este trimestre corresponden a un reajuste de las actividades las cuales se están reprogramando para el año 2022 y la diferencia con respecto a lo financiero corresponde a los diferenciales de tasa de cambio cuando se realizó la planificación.

4. **Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV Y V:** Se han comenzado las formulaciones de proyectos que serán considerados para completar la disponibilidad de la fase IV.

Se han realizado la actualización al Manual PEC -2021.

5. **Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)**, Se solicitó a la SEFIN un decremento presupuestario por un monto de L.7.298 millones, fondo externo y L.2.28 millones fondos nacionales, en los objetos previstos para ejecución y supervisión de obras y transferencias. Al 30 de septiembre queda pendiente su aprobación por la SEFIN.  
Acciones financieras para la devolución de fondos remanentes del Préstamo 2011 65364 a la SEFIN y su posterior transferencia al KfW. Pendiente de concluir proceso de devolución por la SEFIN.
  
6. **Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)**, La DIM/FHIS, gestionó una visita a los proyectos con COPECO a las zonas afectadas por ETA & IOTA, para determinar su viabilidad en su ejecución teniendo en cuenta su ubicación.  
USAID Honduras, ha sostenido reuniones con DIM/FHIS para buscar alternativas que apoyen en la ejecución de los proyectos, es por ello que se ha realizado el fortalecimiento del equipo con personal que brinde seguimiento a aspectos estratégicos.
  
7. **Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)**, A la fecha se han finalizado tres proyectos realizados bajo la Metodología PEC y cinco proyectos de emergencia para brindar respuesta ante la pandemia COVID-19.  
Se están coordinando acciones de forma cercana con SEFIN & SEDECOAS, para la firma de la carta, es por ello que se envió el informe de justificación de ampliación solicitado por SEFIN.


## Proyectos FHIS

Fuente	Nombre del Proyecto	Nombre Corto	Sector	Modalidad Ejecucion
<b>BID</b>	Programa Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	PCCMB 4518/BL-HO	Infraestructura Social	Centralizados
<b>BM</b>	Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota	PRE 6822-HN	Infraestructura Social	Centralizados
<b>BCIE</b>	Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	MIFE	Infraestructura Escolar	PEC-Descentralizados
<b>KFW</b>	Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar SE-FHIS FASE IV y V	PROMINE	Infraestructura Escolar	PEC-Descentralizados
	Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras	CONVIVIR	Infraestructura Social y Fortalecimiento de las Capacidades de los Jóvenes	Descentralizados
<b>USAID</b>	Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana	ICS	Recuperación de espacio públicos e infraestructura escolar para la mejora de la seguridad ciudadana	PEC/Centralizados
	Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras	PIOH	Mejorar las condiciones de Infraestructura Básica para contribuir al desarrollo en el Occidente de Honduras.	PEC/Centralizados




### Ejecución Presupuestaria por Programas 2021

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Monto Planificado III Trimestre	Devengado del III Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% Ejecución III Trimestre/ Planificado III Trimestre	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
Programa 1: Actividades Centrales	L. 307.808.758,00	L. 347.758.703,00	L. 40.248.599,00	L. 79.878.326,87	L. 218.463.923,66	L. 129.294.779,34	198%	63%
Programa 11: Infraestructura Rural	L. 51.310.735,00	L. 59.299.860,00	L. -	L. 27.232.316,86	L. 28.282.816,86	L. 31.017.043,14	0%	48%
Programa 12: Infraestructura Escolar	L. 1.099.842.778,00	L. 664.007.700,00	L. 146.914.818,00	L. 127.126.441,71	L. 165.362.710,45	L. 498.644.989,55	87%	25%
Programa 14: Fomento al Desarrollo Local	L. 331.172.809,00	L. 229.329.333,00	L. 62.234.179,00	L. 47.822.048,96	L. 113.897.186,15	L. 115.432.146,85	77%	50%
Programa 15: Reconstrucción Infraestructura Nacional	L. -	L. 72.850.055,00	L. 38.483.589,00	L. 15.978.342,19	L. 24.379.061,26	L. 48.470.993,74	42%	0%
Programa 16: Reconstrucción Nacional Fuente Externa	L. -	L. 188.337.388,00	L. 78.231.294,00	L. -	L. -	L. 188.337.388,00	0%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>L. 1.790.135.080,00</b>	<b>L. 1.561.583.039,00</b>	<b>L. 366.112.479,00</b>	<b>L. 298.037.476,59</b>	<b>L. 550.385.698,38</b>	<b>L. 1.011.197.340,62</b>	<b>81%</b>	<b>35%</b>

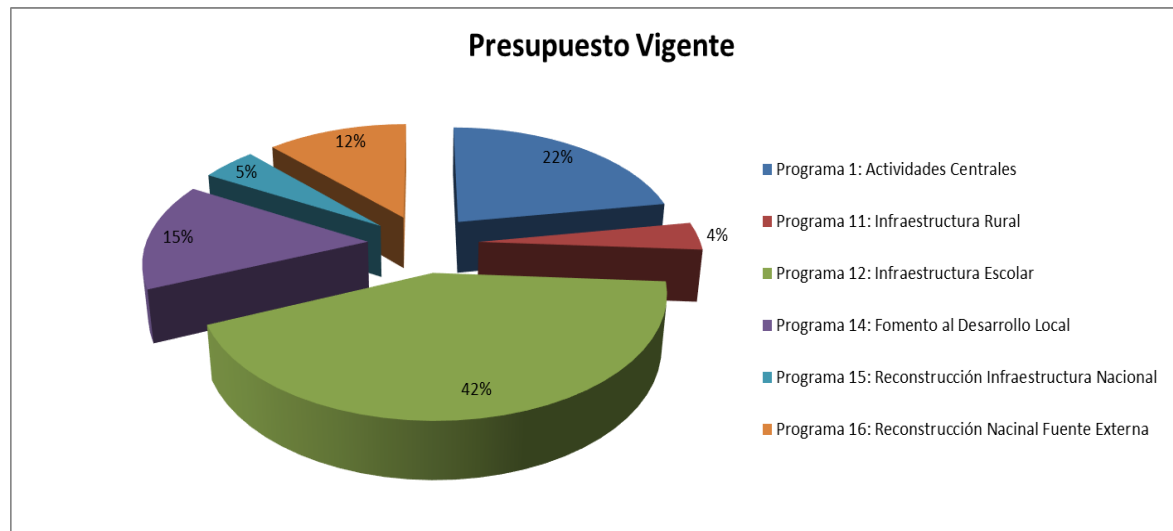


### Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2021

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente 2021	Devengado del III Trimestre	Devengado Acumulado 2021	% Ejecución al III Trimestre / Presupuesto Vigente
Gasto Operativo/Gobierno	L. 307.808.758,00	L. 347.758.703,00	L. 79.878.326,87	L. 218.463.923,66	63%
Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras	L. 51.310.735,00	L. 59.299.860,00	L. 27.232.316,86	L. 28.282.816,86	48%
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar, KfW VIII	L. 126.155.838,00	L. 158.087.627,00	L. 17.562.217,71	L. 55.798.486,45	35%
Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	L. 973.686.940,00	L. 505.920.073,00	L. 109.564.224,00	L. 109.564.224,00	22%
Proyecto Convivencia y Especies Seguros para los Jovenes CONVIVIR	L. 27.230.004,00	L. 18.547.004,00	L. 4.135.052,15	L. 4.953.020,66	27%
Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana	L. 198.677.019,00	L. 90.509.866,00	L. 7.240.484,40	L. 24.196.966,98	27%
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	L. 105.265.786,00	L. 120.272.463,00	L. 36.446.512,41	L. 84.747.198,51	70%
Programa de Respuesta a Emergencia Generada por los Huracanes ETA e IOTA	L. -	L. 72.850.055,00	L. 15.978.342,19	L. 24.379.061,26	33%
Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales ETA e IOTA	L. -	L. 188.337.388,00	L. -	L. -	0%
<b>TOTAL</b>	<b>L. 1.790.135.080,00</b>	<b>L. 1.561.583.039,00</b>	<b>L. 298.037.476,59</b>	<b>L. 550.385.698,38</b>	<b>35%</b>

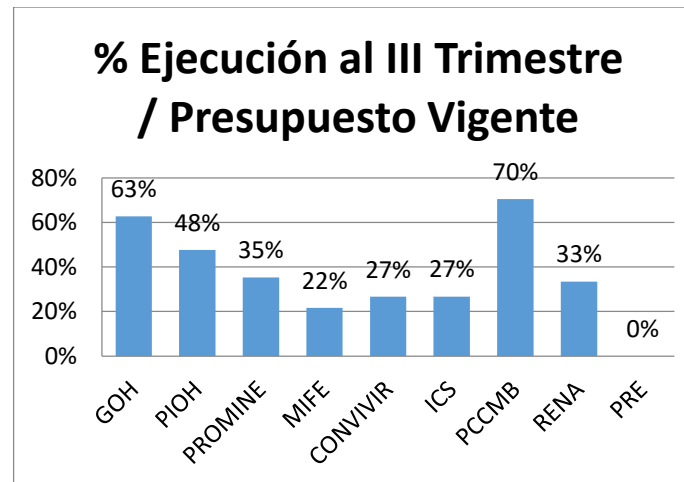

### Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Tercer Trimestre 2021

Grupo	Aprobado	Presupuesto Vigente por Grupo	Devengado III Trimestre	Devengado Acumulado al III Trimestre	Disponible	% Ejecución III Trimestre/ Presupuesto Vigente	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
SERVICIOS PERSONALES	L. 179.934.430,00	L. 181.480.009,00	36.841.315,84	L. 108.682.611,94	L. 72.797.397,06	20%	60%
SERVICIOS NO PERSONALES	L. 212.914.805,00	L. 184.566.261,00	33.910.706,46	L. 109.107.502,45	L. 75.458.758,55	18%	59%
MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 12.911.438,00	L. 12.947.925,00	1.246.516,37	L. 1.760.248,60	L. 11.187.676,40	10%	14%
BIENES CAPITALIZABLES	L. 1.382.531.629,00	L. 1.154.466.359,00	212.205.392,35	L. 316.973.785,82	L. 837.492.573,18	18%	27%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. 1.842.778,00	L. 28.122.485,00	13.833.545,57	L. 13.861.549,57	L. 14.260.935,43	49%	49%
<b>Total</b>	<b>L. 1.790.135.080,00</b>	<b>L. 1.561.583.039,00</b>	<b>L. 298.037.476,59</b>	<b>L. 550.385.698,38</b>	<b>L. 1.011.197.340,62</b>	<b>19%</b>	<b>35%</b>

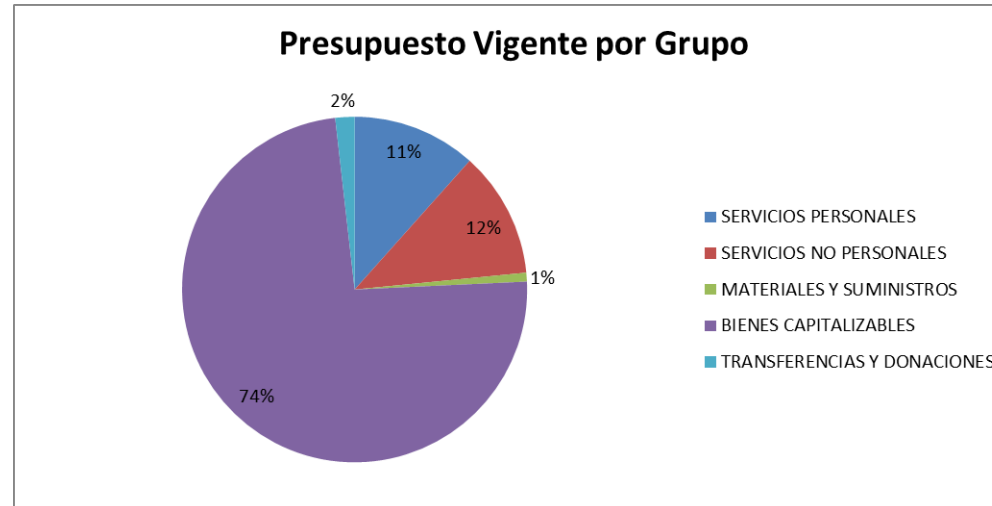

## Ejecución Gasto Operativo Tercer Trimestre del 2021

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
1100	Sueldos Básicos	18.952.542,00	12.942.829,01	5.984.511,11
11400	Adicionales	1579.378,00	943.029,15	636.348,85
11510	Decimotercer Mes	1579.378,00	206.789,07	1372.588,93
11520	Decimocuarto Mes	1439.378,00	1324.601,96	114.776,04
11600	Complementos	1263.502,00	1009.128,97	254.373,03
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	2.748.118,00	1836.365,10	910.562,90
11750	Contribuciones para Seguro Social	708.292,00	444.794,98	263.497,02
12100	Sueldos Básicos	17.220.000,00	3.122.991,68	14.097.008,32
12410	Decimotercer Mes	1435.000,00	0,00	1435.000,00
12420	Decimocuarto Mes	1435.000,00	0,00	1435.000,00
12550	Contribuciones para Seguro Social	1410.000,00	227.175,34	1182.824,66
14300	Gastos de Representacion en el Pais	140.000,00	80.000,00	60.000,00
21110	Suministro De Energía EléCtrica	162.846,00	139.934,49	22.911,51
21200	Agua	100.000,00	82.888,17	17.111,83
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1000.000,00	761.048,89	238.951,11
26110	Pasajes Nacionales	21343,00	21342,96	0,04
27500	Gastos Judiciales	60.454.421,00	60.454.420,06	0,94
29100	Ceremonial y Protocolo	290.000,00	181.923,38	108.076,62
32310	Prendas de Vestir	10.000,00	0,00	10.000,00
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40.000.000,00	11.838.994,82	28.161.005,18
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	37.300.000,00	20.752.561,57	16.547.438,43
51220	Ayuda Social a Personas	72.540,00	36.577,49	35.962,51
54110	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	27.649.945,00	13.824.972,08	13.824.972,92
1100	Sueldos Básicos	19.707.213,00	13.517.103,03	6.190.110,00
11400	Adicionales	1634.280,00	887.951,63	746.328,37
11510	Decimotercer Mes	1642.268,00	253.836,83	1388.431,17
11520	Decimocuarto Mes	1634.280,00	1522.248,50	112.031,50
11600	Complementos	1307.424,00	1012.168,29	295.255,71
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	2.857.546,00	1.973.706,00	883.840,00
11750	Contribuciones para Seguro Social	1204.098,00	803.764,80	400.333,20
12100	Sueldos Básicos	32.346.064,00	25.593.636,17	6.752.427,83
12410	Decimotercer Mes	3.150.040,00	152.315,06	2.997.724,94
12420	Decimocuarto Mes	3.150.040,00	1253.373,38	1896.666,62
12550	Contribuciones para Seguro Social	2.307.012,00	941.234,12	1365.777,88
16200	Compensaciones	1951987,00	0,00	1951987,00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10.000,00	10.000,00	0,00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	240.000,00	240.000,00	0,00
24500	Servicios de Capacitación	86.600,00	70.000,00	16.600,00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	2.240.000,00	1.891.058,87	348.941,13
25100	Servicio de Transporte	4.000,00	3.600,00	400,00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1265.300,00	1259.355,48	5.944,52
25400	Primas y Gastos de Seguro	1476.150,00	957.340,40	518.809,60

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
27210	Tasas	154.262,00	0,00	154.262,00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	100.000,00	4132194	58.678,06
33100	Productos De Papel Y Cartón	108.000,00	99.362,83	0,17
34400	Llantas y Cámaras de Aire	100.000,00	0,00	0,20
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	30.000,00	0,00	0,00
35620	Diesel	200.000,00	96.54123	0,77
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	100.000,00	80.275,75	0,25
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	65.797,00	4.126,20	0,80
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100.000,00	45.224,13	11477,12
39600	Repuestos y Accesorios	1260.000,00	515.325,30	306.164,82
11100	Sueldos Básicos	4.102.948,00	3.001.433,30	1.10154,70
11400	Adicionales	349.899,00	227.316,36	122.582,64
11510	Decimotercer Mes	341.912,00	30.143,33	311768,67
11520	Decimocuarto Mes	349.900,00	310.617,49	39.282,51
11600	Complementos	279.919,00	237.521,78	42.397,22
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	594.927,00	438.305,00	156.622,00
11750	Contribuciones para Seguro Social	151.777,00	103.130,74	48.646,26
24300	Servicios Jurídicos	86.600,00	0,00	86.600,00
33700	Especies Timbradas y Valores	38.030,00	0,00	0,00
11100	Sueldos Básicos	2.566.800,00	1.709.706,08	857.093,92
11400	Adicionales	213.900,00	93.220,57	120.679,43
11510	Decimotercer Mes	213.900,00	29.428,05	184.471,95
11520	Decimocuarto Mes	213.900,00	143.762,78	70.137,22
11600	Complementos	171.120,00	69.616,74	101503,26
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	372.186,00	239.859,04	132.326,96
11750	Contribuciones para Seguro Social	111.303,00	66.297,82	45.005,18
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	100.000,00	14.260,00	85.740,00
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	100.000,00	41.549,13	58.450,87
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	150.000,00	20.000,00	130.000,00
11100	Sueldos Básicos	2.664.000,00	1.770.639,00	870.283,39
11400	Adicionales	222.000,00	100.103,62	121896,38
11510	Decimotercer Mes	222.000,00	0,00	222.000,00
11520	Decimocuarto Mes	222.000,00	222.000,00	0,00
11600	Complementos	177.600,00	170.005,78	7.594,22
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	386.280,00	252.984,50	131680,50
11750	Contribuciones para Seguro Social	121.421,00	74.483,30	46.937,70
11100	Sueldos Básicos	21.692.147,00	16.304.265,75	5.376.320,48
11400	Adicionales	1.807.681,00	1.222.844,32	584.836,68
11510	Decimotercer Mes	1.807.680,00	184.648,86	1.623.031,14
11520	Decimocuarto Mes	1.807.680,00	1.800.419,02	7.260,98
11600	Complementos	1.446.145,00	1.267.877,84	178.267,16
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	3.145.362,00	2.389.777,92	754.555,58
11750	Contribuciones para Seguro Social	920.782,00	683.056,46	237.725,54
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	202.860,00	99.342,75	103.517,25
26210	Viáticos Nacionales	3.000.000,00	1.688.067,22	995.637,53
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>L 347.758.703,00</b>	<b>L 218.463.923,66</b>	<b>L 127.977.566,73</b>

### Cuadro por Sector 2021 (Ejecutado)

SECTOR	Proyectos Finalizados 2021	Mto. Ejecutado 2021	Empleos Generados 2021	Beneficiarios directos 2021
INFRAESTRUCTURA VIAL	15	24.379.061,26	0	0
EMPRENDIMIENTO Y VALORES	0	5.514.358,80	27	1.262
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	6	76.629.522,03	299	5.039
PREVENCION SITUACIONAL/CONVIVIENCIA	6	948.390,01	81	455.039
EDUCACION	10	194.016.675,85	329	5.418
HOSPITALES	5	-	204	1.186.260
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>301.488.007,95</b>	<b>940</b>	<b>1.653.018</b>

### Cuadro por Departamento 2021 (Ejecutado)

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2021	Mto. Ejecutado 2021	Empleos Generados 2021	Beneficiarios directos 2021
ATLANTIDA	5	13.334.586,23	133	6.118
CHOLUTECA	0	17.956,23	0	0
COMAYAGUA	1	-	31	2.040
COPAN	4	9.358.970,66	84	411.974
CORTES	2	3.937.510,04	71	450.863
FRANCISCO MORAZAN	7	202.176.853,56	356	6.961
INTIBUCÁ	7	27.122.747,28	50	268.248
LA PAZ	2	7.183.142,49	42	226
LEMPIRA	1	11.720.696,95	50	50.285
OCOTEPEQUE	4	11.568.678,51	52	221
SANTA BARBARA	9	15.066.866,00	71	456.082
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>301.488.007,95</b>	<b>940</b>	<b>1.653.018</b>

### Cuadro por Otras Inversiones 2021 (Ejecutado)

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2021
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	26.973.116,80
GASTO OPERATIVO DE PROGRAMAS	3.460.649,97
ACTIVIDADES CENTRALES FHIS	218.463.923,66
<b>TOTAL</b>	<b>248.897.690,43</b>

## CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO



### ✓ Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)



#### i. Antecedentes

Actualmente el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y la Secretaría de Seguridad ejecutan conjuntamente la operación BID 4518/BL-HO denominada “Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios” el cual es un préstamo por un monto total de US\$60,000,000.00 la operación fue aprobada por el Banco Interamericano de Desarrollo en el mes de abril de 2018, posteriormente aprobada por el Congreso Nacional en el mes de octubre de 2018, y fue efectivo a partir del 28 de noviembre de 2018, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta

#### ii. Objetivo

Contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos Los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

#### iii. Componentes

**Componente 1.** Mejoramiento del hábitat de barrios urbanos vulnerables (US\$18.219 millones). El propósito de este componente es mejorar el acceso a servicios de infraestructura urbana y generar espacios con condiciones de seguridad, para incentivar una mejor convivencia y aumentar la capacidad de los ciudadanos para el cumplimiento pacífico de normas. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

**Infraestructura básica:** busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios en los siguientes barrios del Distrito Central: Monte de los Olivos, Nueva Jerusalén; Australia; 25 de Enero; Nueva España; Brisas del Mogote y Nueva Galilea teniendo como marco para las intervenciones el Plan Integral de Mejoramiento de Barrios, el cual incluye los correspondientes diseños urbanísticos, de ingeniería, la programación y presupuestos. Este instrumento es crítico para la adecuada programación de las inversiones y para facilitar el diálogo con la comunidad sobre las actividades a desarrollar. Se financiará consultorías y contratación de obras para: (i) la preparación de los Planes Integrales de Mejoramiento de Barrios (PIMB); y (ii) las inversiones en obras de infraestructura básica de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, pavimentación, drenaje pluvial, plazas y parques, equipamientos sociales y otras necesidades detectadas en los PIMB. Se promoverá la recuperación de escuelas públicas y centros de salud (operados por las entidades estatales específicas).

**Convivencia y Emprendimiento a nivel barrial:** promueve la participación de los vecinos en el mejoramiento de las condiciones de su entorno, así como el fortalecimiento de sus redes sociales y vecinales para mejorar el tejido social en los barrios. Se financiará: (i) capacitación de líderes, programa de deportes y valores, apoyado por el Comité Olímpico Internacional; (ii) capacitación de vecinos en áreas de empleabilidad dentro y fuera del barrio mediante la asistencia técnica de las Universidades y su vinculación con el sector empresarial, (iii) organización para utilización de sistemas de alerta temprana para desastres naturales. Todas las actividades tendrán enfoque de género.

**Componente 2:** Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios (US\$22.130 millones). Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios de prevención social de la violencia al ciudadano y brindar una atención oportuna a las víctimas de violencias y delitos, fortaleciendo la gestión local. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

**Fortalecimiento de capacidades de actores municipales.** Se financiará: (i) capacitación y asistencia técnica a las autoridades locales para promover la participación ciudadana en la preparación de planes locales de prevención social de la violencia; (ii) fortalecimiento de las capacidades de los responsables de los observatorios locales, para el análisis estratégico de estadísticas del crimen y delito -incluyendo la desagregación por género-; y (iii) estrategia de comunicación a través de campañas y consultas sociales para promover medidas y valores para la reducción de violencias, respeto por las normas legales, morales, culturales y el uso de la oferta de servicios disponibles de prevención y atención a víctimas.

**Intervenciones de prevención social de la violencia a nivel municipal.** Se financiará: (i) programas para la atención a víctimas de VIF a través del módulo de Atención Integral Especializado (MAIE); (ii) desarrollo de protocolos para homologar la actuación de primeros respondientes para atención a víctimas, (iii) programa de



prevención social de la violencia para jóvenes en situación de riesgo; (iii) modelo innovador de policía comunitaria y patrullaje policial sistemático -Hot Spots-; y (iv) mejoramiento de la infraestructura de las Jefaturas Departamentales, para ofrecer servicios policiales a la comunidad.

**Componente 3:** Efectividad policial. (US\$16 millones). Con el propósito de mejorar el desempeño y la calidad en la prestación de los servicios policiales, se apoyará la consolidación del sistema nacional de formación y profesionalización, así como su sistema de integridad. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Consolidación del sistema educativo policial basado en la filosofía de Policía Comunitaria. Se financiará: (i) diseño del modelo de Sistema de Formación y Profesionalización Policial, articulando sus diferentes instancias de formación (Instituto Técnico Policial -ITP-, ANAPO, Universidad y educación continua y entrenamiento), incluye mecanismos de evaluación continua del personal. Lo anterior, deberá estar sujeto a promover principios de meritocracia y transparencia en el desarrollo de la carrera policial; (ii) modernización del currículum académico para los medios y altos mandos policiales, certificado bajo la filosofía de policía comunitaria y orientando la formación a competencias para la toma de decisiones operativas. Lo anterior, incluyendo la redefinición del perfil de ingreso de candidatos a la ANAPO. Esto considerará la incorporación de nuevos cadetes, provenientes del ITP y otros candidatos que ya hayan cursado licenciaturas y tecnicaturas en otras universidades; modernizar el régimen de formación de oficiales en el nuevo campus universitario y generar una nueva estructura de gobierno y planta de profesores-investigadores de tiempo completo (teóricos y prácticos) (iii) fortalecimiento de las capacidades pedagógicas para docentes; (iv) fortalecimiento de la integridad policial a través de la consolidación de un sistema de evaluación y rendición de cuentas; y (v) modernización de la infraestructura física y tecnológica de la Academia Nacional de Policía y el Centro de Investigación y Desarrollo Policial.

Fortalecimiento de las capacidades en investigación criminal. Se financiará: (i) programa de capacitación y especialización continua en investigación criminal en coordinación con el MP; (ii) capacitación técnica en el uso de tecnologías de la información para análisis estratégicos delictuales; e (iii) implementación de un sistema integrado de información delictiva y criminal para mejorar la resolución del delito -integrando estadísticas por categoría de género.

#### **iv. Mecanismo de Ejecución.**

Se propone contar con dos organismos ejecutores independientes, pero con responsabilidades compartidas en el diseño, implementación y evaluación de iniciativas que se realicen en la misma área geográfica. El

componente 1 de esta operación será ejecutado por SEDECOAS-FHIS y el componente 2 y 3 por la Secretaría de Seguridad.

**v. Monto del Convenio:**

US\$ 60,000,000.00 Millones de Dólares, según convenio de préstamo el cual se desglosa de la siguiente manera: SEDECOAS- FHIS le corresponde US\$ 20, 000,000.00 Millones de Dólares y a la Secretaria de Seguridad le corresponde US\$ 40,000,000.00 Millones de Dólares.

La duración del convenio es por 5 años después de la publicación de diario La Gaceta Acuerdo Ejecutivo No. 114-2018.

**vi. Avance financiero**

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	17.749.164,00	14.959.784,44	84%
2019	84.562.822,00	75.678.087,16	89%
2020	105.302.450,00	71.201.381,99	68%
2021	120.272.463,00	84.747.198,51	70%

**vii. Avance por Sector**

SECTOR	Proyectos Finalizados 2021	Mto. Ejecutado 2021	Empleos Generados 2021	Beneficiarios Directos 2021
EMPREDIMIENTO Y VALORES	0	5.514.358,80	27	1.262
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	6	76.629.804,03	299	5.039
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>82.144.162,83</b>	<b>326</b>	<b>6.301</b>

**viii. Avance por Departamento**

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2021	Mto. Ejecutado 2021	Empleos Generados 2021	Beneficiarios directos 2021
FRANCISCO MORAZAN	6	82.144.162,83	326	6.301
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>82.144.162,83</b>	<b>326</b>	<b>6.301</b>

**ix. Otras Inversiones**

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2021
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	1.848.450,95
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	754.584,73
<b>TOTAL</b>	<b>2.603.035,68</b>

x. AVANCES AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021

<i>Avances Programa</i>		
<b>COMPONENTE 1 MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES</b>		
<b>1.0</b>	<b>PRODUCTO 1.1 NUEVE PROYECTOS INTEGRALES DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS (RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PÚBLICO, EQUIPAMIENTO SOCIAL Y PAVIMENTACIÓN), COMPLETADOS Y SIENDO UTILIZADOS</b>	
<b>1.1</b>	<i>Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios</i>	<p>Los Proyectos de integración urbana el cual incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y obras de mitigación, al 30 de septiembre de 2021 tienen el siguiente avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA 25 DE ENERO 95%</b></li> <li>• <b>PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA NUEVA AUSTRALIA 94%</b></li> <li>• <b>PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA NUEVA ESPAÑA 90.5%</b></li> <li>• <b>PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA NUEVA GALILEA 92%</b></li> </ul> <p>Al mes de septiembre se tiene un avance financiero del 90% se espera el cierre financiero al mes de diciembre de 2021.</p> <p>El proyecto de equipamiento social el cual incluye las siguientes obras y avance físico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AMPLIACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS COLONIA NUEVA ESPAÑA. 100%</b></li> <li>• <b>AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA DAVID COREA SÁNCHEZ 100%</b></li> <li>• <b>CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL COLONIA 25 DE ENERO. 100%</b></li> <li>• <b>CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL COLONIA AUSTRALIA. 100%</b></li> <li>• <b>CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL COLONIA NUEVA GALILEA. 100%</b></li> <li>• <b>REPARACIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA NUEVA GALILEA.100%</b></li> </ul> <p>Al mes de septiembre se tiene un avance financiero del 100%.</p> <p>Se finalizó el diseño de obras del Proyecto de Integración Urbana en colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén No. 2, Brisas del Mogote Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 3,035, predios. Se ha iniciado el proceso de licenciamiento ambiental y adquisición de obra y supervisión, se espera la adjudicación (colonias: Brisas del Mogote Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador) al mes de diciembre del año 2021.</p>
<b>2.0</b>	<b>PRODUCTO 1.2 JÓVENES DE LOS BARRIOS INTERVENIDOS CAPACITADOS</b>	
<b>2.1</b>	<i>Programa de Deportes y Valores</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Este proyecto consiste en la enseñanza de disciplinas deportivas implementando los valores olímpicos; al semestre se imparten seis (6) disciplinas olímpicas: taekwondo, levantamiento de Pesas, tenis de Mesa, atletismo, balonmano y lucha olímpica; también, se atiende niños y/o jóvenes con discapacidad y mujeres que practican el baile de Zumba.</li> <li>• Desde enero 2021 se han retomado los entrenamientos presenciales con 13 secciones deportivas y se continúan las clases virtuales para el entrenamiento en deportes y a estas sólo tienen acceso quienes en sus viviendas cuentan con un servicio de internet; en este sentido se ha creado un canal en YouTube <a href="https://www.youtube.com/channel/UC5mxsM-qXz6wAdCsBzzufYA">https://www.youtube.com/channel/UC5mxsM-qXz6wAdCsBzzufYA</a>. Se adjudicó la compra de equipo deportivo por un monto de 1,702,159.03; cuyos pagos se realizarán al mes de noviembre de 2021.</li> </ul>
<b>1.2</b>	<i>Capacitaciones en valores y emprendimiento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se capacitaron a 720 personas en el tema de valores; se espera capacitar 1260 al final del año 2021.</li> </ul>
<b>3.0</b>	<b>PRODUCTO 1.3 MUJERES DE LOS BARRIOS INTERVENIDOS CAPACITADAS EN EMPRENDEDURISMO Y EMPLEO</b>	
<b>3.1</b>	<i>Capacitaciones en empleabilidad.</i>	<b>Ejecución con fondos ATN/OC-17135-HO Proyecto de Revitalización Económica y Desarrollo de Barrios Vulnerables de Tegucigalpa</b>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A través de la fundación CADERH, el Programas Hondureños para el mundo y el SEDECOAS/FHIS se capacitaron 21 jóvenes en diseño gráfico y programación.</li> <li>2. A través de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa se capacitaron 109 jóvenes en emprendimiento a quienes se les brindó un kit de herramientas y un plan completo de negocio para iniciar el emprendimiento. Conforme al buen resultado obtenido en estas capacitaciones se realizó una ampliación del convenio suscrito con la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa para capacitar adicionalmente a 200 jóvenes en emprendimiento quienes finalizarán su programa al mes de noviembre del año 2021.</li> </ol>
--	--	--

**xi. PROBLEMÁTICA:**

PROBLEMA	ACCIONES DE MITIGACIÓN, COMENTARIOS, NECESIDADES DE APOYO
<p><b>No contar con la licencia Ambiental para los proyectos de las colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén, la Huerta, Brisas del Roble, Altos del Mirador, Altos de la Quezada y Brisas del Mogote.</b></p>	<p>Estas colonias se encuentran ubicadas en la cuenca del río Guacerique, la cual abastece el embalse de los Laurales, una de las tres fuentes de abastecimiento de la ciudad. El Saneamiento de estas colonias es imperativo para detener la contaminación del embalse. Sin embargo, se considera el alto grado de dificultad y complejidad para gestionar el licenciamiento ante MiAmbiente; a la fecha se obtenido el licenciamiento ambiental de 2 proyectos integrales en las colonias: Villas de San Miguel y Altos de la Quezada; se espera obtener el licenciamiento ambiental de las colonias restantes al mes de diciembre del año 2021.</p>
<p><b>Incrementos en los tiempos de ejecución de las Obras</b></p>	<p>Se espera que las obras tengan incrementos de costos:</p> <p>Los tiempos de ejecución de obra serán mayores a los esperados. Se espera que los rendimientos de la mano de obra serán menores por las medidas de distanciamiento en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, todos los trabajadores de las obras deben realizarse pruebas de Covid 2019, y sólo los que obtengan resultados negativos podrán reincorporarse a los frentes de trabajo.</p> <p>Incremento en los cobros municipales y del SANAA de la tasa de desagüe y derechos de conexión a los sistemas de agua potable y alcantarillado. La tasa fue ajustada a 1.5% del costo total del proyecto.</p>

## CARTERA BANCO MUNDIAL



### ✓ **Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE 6822-HN)**



#### **i. Antecedentes**

Entre el 1º y el 16 de noviembre de 2020, dos ciclones tropicales consecutivos, Eta e Iota, sacudieron a todos los países de Centroamérica, con una magnitud de impacto comparable a la del huracán Mitch de 1998. En respuesta a la emergencia causada, el Gobierno de Honduras (GdH) solicitó al Banco Mundial (BM) un financiamiento de US\$150 millones para un Proyecto de Recuperación de Emergencia.

El 8 de marzo de 2021 el Gobierno de Honduras suscribió con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) el Convenio de Crédito No. 6822 por un monto de US\$150.000.000.00, el cual fue aprobado mediante Decreto Legislativo No.10-2021 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 5 de mayo de 2021, fondos que financiarán el Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE).

De todos los países golpeados, Honduras es sin duda el más afectado por Eta e Iota. Si bien ambos ya se habían degradado a tormentas tropicales al ingresar en el territorio hondureño, generaron precipitaciones catastróficas que dieron lugar a inundaciones, erosión y deslizamientos de tierra generalizados y a la consiguiente destrucción o daños graves de infraestructuras públicas esenciales (puentes, escuelas, infraestructura sanitaria), viviendas particulares y cultivos, así como pérdidas humanas en todo el país. Una de las zonas más castigadas fue el Valle de Sula, algunas partes de San Pedro Sula y La Lima, donde cientos de personas esperaron el rescate en los techos y el segundo piso de edificios (en algunos casos por más de 72 horas). Los niveles de las aguas del río Ulúa, en el occidente de Honduras, se elevaron 13 pies más que el pico alcanzado durante el huracán Mitch en 1998. Según las últimas cifras del GdH, más de 3 millones de personas a nivel nacional resultaron damnificadas por el huracán Eta, el que provocó 77 muertes y la evacuación de 179,614 personas, de las cuales 69,254 se aglomeraron en refugios. Siguiendo de cerca al Eta, en la noche del 16 de noviembre Iota tocó tierra como huracán categoría 4 en el norte de Nicaragua e ingresó al territorio hondureño el 17 de noviembre ya degradado como Tormenta Tropical (TT) al sur del Departamento El Paraíso con impactos también catastróficos. Los dos desastres empeoraron la vulnerabilidad del país, que ya enfrentaba graves problemas por la pandemia del COVID-19 y el actual fenómeno de La Niña - Oscilación del Sur, que según los pronósticos inducirá graves sequías en el primer semestre del 2021, lo que repercutirá en los sistemas fiscales y financieros y limitará la capacidad del país para prepararse mejor y responder ante futuros desastres.

Es así que el proyecto propuesto de 150 millones de dólares tiene por objeto apoyar las necesidades de respuesta y recuperación de Honduras y fortalecer la capacidad institucional para gestionar la reconstrucción y la recuperación resiliente de los desastres.

Para llevar a cabo la implementación del Proyecto, la SEDECOAS contará con la participación activa de su brazo ejecutor especializado en la ejecución técnica de proyectos de inversión: el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), que es parte de su estructura jerárquica y funcional a partir del acuerdo PCM-056-2019. El Secretario de Estado de la SEDECOAS es el Director Ejecutivo del FHIS.

La SEDECOAS ejecutará los procesos siguiendo las actividades descritas en el Manual de Operaciones del Proyecto con apoyo de procesos de ejecución bajo la organización matricial en las siguientes instancias que conforman la plataforma operativa del Ciclo de Proyectos de la SEDECOAS: (i) Dirección Ejecutiva, (ii) Dirección de Proyectos (formulación y evaluación), (iii) Comité de Operaciones, (iv) Dirección Contrataciones, (v) Dirección de Control y Seguimiento, y (vi) Dirección de Administración y Finanzas.

## **ii. Objetivo General**

El PRE tiene por objetivo atender las necesidades identificadas como prioritarias para reactivar la economía y apoyar las más urgentes necesidades de la población afectada por los fenómenos naturales ETA e IOTA, como respuesta de emergencia y recuperación de Honduras, y, en esta perspectiva, fortalecer la capacidad institucional del Estado para gestionar una ejecución eficaz, eficiente y transparente.

## **iii. Objetivos Específicos**

- Realizar operaciones de asistencia y respuesta de emergencia, salud y seguridad pública.
- Realizar la rehabilitación y construcción resiliente de la infraestructura pública y Comunitaria y Restablecimiento de los servicios públicos.
- Mejorar la capacidad instalada del Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.

## **iv. Descripción**

**Componente 1: Operaciones de asistencia y respuesta de emergencia, salud y seguridad pública (10 millones de dólares)**

El Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas de asistencia y respuesta inmediata para anticipar, aliviar y mitigar los efectos de los dos huracanes en la población, tales como acciones de evacuación y rescate de emergencia, alquiler de medios de transporte privados y pago de combustible, distribución de alimentos, artículos no alimentarios y equipos de protección personal a las poblaciones afectadas, albergues a corto y largo plazo, etc. Se estima que 74,952 personas se encontraban en albergues tras el paso de los huracanes Eta e Iota, de las cuales se espera que cierto número sigan necesitando de albergues (tomando las medidas de prevención de COVID) y de una nutrición básica durante un período prolongado, ya que no pueden regresar a sus hogares a causa de la destrucción, los graves daños o la inundación persistente de sus viviendas. Entre las medidas adicionales admisibles cabe mencionar la limpieza de aguas y de escombros, y medidas para combatir los brotes previstos de malaria, dengue u otras enfermedades infecciosas.

El componente financiará los gastos incurridos en la preparación y respuesta arriba señalada ante los efectos de los huracanes. Se espera que el Gobierno adopte en gran medida las medidas de asistencia y respuesta inmediata antes o en los primeros momentos de la entrada en vigencia del Proyecto.

### **Componente 2: Rehabilitación y reconstrucción resiliente de la infraestructura pública y comunitaria y restablecimiento de los servicios públicos (129 millones de dólares)**

Durante la ocurrencia de un desastre, el funcionamiento continuo y la inmediata rehabilitación de la infraestructura crítica son elementos fundamentales para brindar una respuesta y recuperación eficiente. Una cantidad considerable de carreteras y puentes, así como de edificios públicos, entre ellos escuelas públicas, infraestructura de salud, instalaciones de gobiernos locales y servicios de primeros auxilios, sufrieron graves daños, si es que no fueron destruidos. El subcomponente financiará la preparación técnica (incluidos requerimientos técnicos, especificaciones, diseños y dibujos técnicos, etc), la adquisición y la ejecución de reparaciones y rehabilitaciones urgentes de la infraestructura pública y comunitaria de alta prioridad, el costo de la reubicación temporal y el estudio/diseño de algunas instalaciones prioritarias que precisen una restauración considerable o construcción nueva. En algunos casos, se requerirá obras de demolición para dar lugar a una reconstrucción y eliminar con urgencia los peligros que representan los escombros. Otras medidas elegibles adicionales, emprendidas antes de la vigencia del Proyecto, pueden incluir reparaciones urgentes a edificios públicos y viviendas dañadas, medidas temporales y para restaurar los servicios básicos y el uso de la infraestructura pública, como puentes modulares o de muralla. La ejecución de este subcomponente correrá a cargo de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) (entidad del

Gobierno). Pudieran ser necesarios acuerdos interinstitucionales en caso de que la SEDECOAS necesite el apoyo técnico y coordinación con otros Ministerios.

Dado que las necesidades de reconstrucción exceden con creces el presupuesto disponible de este componente, el Gobierno de Honduras (GdH) facilitará una lista de infraestructuras públicas prioritarias que se abordarán en el marco de esta actividad y que se ultimarán en consenso con el Banco Mundial. Criterios indicativos de priorización para la infraestructura pública crítica incluyen los siguientes: (a) identificación de daños y niveles de criticidad para asegurar que se prioricen las estructuras más vulneradas por el ciclón tropical, asegurando la máxima seguridad; (b) hacer hincapié en la relevancia sectorial para centrar las inversiones en los objetivos de resultados del sector y las necesidades de prestación de servicios; (c) evaluar la elegibilidad técnica y financiera para asegurar que se considere debidamente la reparación y rehabilitación de la infraestructura parcialmente dañada, en contraposición a la construcción nueva; e (d) identificar los riesgos y oportunidades ambientales y sociales para asegurar que las inversiones no causen impactos ambientales o sociales imprevistos significativos y aprovechar las oportunidades sociales para el desarrollo inclusivo. Las autoridades supervisando el proceso de selección de las inversiones, así como la metodología y los criterios de selección se detallarán en el MOP. Además, se espera que los procesos participativos para definir las inversiones prioritarias cuenten con la participación de las autoridades locales (municipios) y los Comités de Emergencia Local/Municipal (CODEL/CODEM), entre otros, adaptables a las particularidades culturales, sociales y geográficas de las zonas afectadas con poblaciones indígenas y afrodescendientes, tal como se describe en el Plan para Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Proyecto. Las actividades también se centrarán en apoyar las operaciones de mano de obra local intensiva para impulsar el empleo y adoptar técnicas de ingeniería eficientes como el uso de puentes modulares o Bailey para garantizar el rápido restablecimiento de las conexiones vitales. La evaluación social del Proyecto identificará los posibles grupos comunitarios que puedan aportar esta mano de obra, así como la capacitación de corto plazo que pueda necesitar y que se les podría dar antes de arrancar con la construcción de las obras. Otras fuentes de financiación de estas actividades podrían ser proyectos en curso o nuevos del Banco Mundial y de las IFI con las que será necesario entablar coordinación.

Las actividades financiadas en el marco del subcomponente se construirán con capacidad de resistencia al cambio climático y de manera inclusiva e informada en temas de género, utilizando normas de diseño resilientes e incorporando en el diseño aspectos que promuevan la participación de la mujer. En todas las obras de rehabilitación y reconstrucción se seguirán los principios de diseño universal para facilitar el acceso de las personas con discapacidad.



El componente también podrá financiar la adquisición de equipos. Cuando sea una necesidad crítica y en la medida en que el Banco lo considere aceptable, equipo esencial para la reanudación de servicios públicos, como vehículos, materiales de tecnologías de la información y comunicación, equipos contra incendios y de primeros auxilios también podrán ser elegibles en el marco del presente componente, incluido servicios de elaboración de las especificaciones técnicas de los equipamientos si hacen falta.

### **Componente 3: Apoyo institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción (11 millones de dólares)**

El componente cubrirá los costos de la capacidad técnica e institucional del organismo ejecutor del Proyecto, inclusive la gestión del proyecto, a, las adquisiciones, el manejo de contratos, la transparencia, las actividades de gestión financiera, las auditorías técnicas, el seguimiento del cumplimiento de las obras de construcción, la supervisión del cumplimiento de las normas sociales y ambientales, la fiscalización del cumplimiento de los estándares sociales y ambientales, las actividades de M&E y los mecanismos de atención y resolución de quejas y denuncias. El M&E entraña, entre otras cosas, la preparación de informes sobre el Proyecto, del informe correspondiente a la evaluación de mitad de periodo y el informe final, estudios de líneas de base, auditorías (financieras, técnicas, ambientales y sociales, según sea necesario). Se prevé también que este componente sea ejecutado por la SEDECOAS. Este componente también incluye los costos de equipos (alquiler o compra según corresponda), servicios y pequeñas obras necesarias para el buen desempeño de las tareas de la agencia, tales como vehículos, equipos de información y comunicación (incluyendo laptops, impresoras, etc.), mobiliario y materiales de oficina, alquiler de locales, obras de mejora / acondicionamiento, entre otros.

El subcomponente también financiaría servicios de consultoría para fortalecer la capacidad técnica de la SEDECOAS y otros organismos claves participantes como la Secretaría de Finanzas. En particular, el componente experimentará en calidad de piloto con enfoques integrados para una mejor gestión de los activos de infraestructura, consistentes en un análisis de la criticidad, normas técnicas y de diseños mejorados y programas de mantenimiento preventivo, todo ello con miras a reducir la vulnerabilidad ante futuros fenómenos naturales adversos. El subcomponente también tendrá como objetivo el diseño de una política y programa de apoyo financiero para la reconstrucción de viviendas privadas. Determinará cuáles son las opciones de política y ejecución (por ejemplo, impulsadas por el propietario, impulsadas por la institución gubernamental, una mezcla de ambos, etc.) para el programa de reconstrucción. Las opciones que se tomen en cuenta tendrán su basamento en las leyes y políticas nacionales existentes y en el marco de gestión ambiental

y social (MGAS) del Banco, e incluirán, entre otras cosas, temas relacionados con el género, la participación ciudadana, los pueblos indígenas y los afrodescendientes, los grupos vulnerables y la sostenibilidad financiera, aprovechando al mismo tiempo las buenas prácticas internacionales. El subcomponente también facilitará recursos para sensibilizar a los asociados para el desarrollo y a proveedores de fondos concesionales a fin de atraer financiación externa para potenciar los efectos del programa. Si bien el Proyecto en sí no proporcionará financiación para este mecanismo directamente, el objetivo es crear un vehículo que atraiga fondos futuros de prestamistas tanto públicos como comerciales, entre ellos, posiblemente, la Corporación Financiera Internacional (CFI).

Finalmente, el componente hará mucho énfasis en definir y desarrollar una estrategia de comunicación, diseñada en particular para mantener informados a los beneficiarios directos e indirectos sobre el alcance y plazos de las actividades, a fin de garantizar su apoyo y manejar sus expectativas, un aspecto fundamental en la primera etapa de implementación de los proyectos de recuperación de emergencia.

#### **v. Focalización**

Las obras financiadas bajo el Componente 2 se ejecutaran en los municipios y sectores afectados por las tormentas tropicales Eta e Iota.

Para determinar las zonas y sectores de intervención el Gobierno de Honduras, con la asistencia técnica de organizaciones y agencias internacionales, ha elaborado el documento borrador denominado “Evaluación de daños y pérdidas causadas por las tormentas tropicales Eta e Iota”

También se cuenta con la base de datos del estudio levantado por la SEDECOAS denominado “Plataforma de información de incidencias de la infraestructura dañada por los huracanes Eta e Iota”, que consolida los datos de las tres fuentes del Gobierno. De igual manera, se cuenta con listas de infraestructura que fue levantada por las instituciones sectoriales en las oficinas de COPECO Tegucigalpa, en un centro de acopio instalado luego de los eventos de desastre de los ciclones tropicales Eta e Iota.

#### **vi. Sector de Intervención**

Cortés, Yoro, Santa Bárbara, Francisco Morazán, El Paraíso, La Paz, Comayagua, Atlántida, Islas de Bahía, Lempira, Intibucá, Copan y Ocotepeque.

**vii. Duración del Proyecto:**

El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de 5 años y medio incluyendo actividades de gestión, socialización, adquisiciones, etc.

**viii. Avance Financiero**

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	188.804.388,00	0,00	0%

**ix. Situación presupuestaria**

El presupuesto aprobado vigente para el periodo 2021 con fondos del Crédito 6822-HN es de L 188, 337,388.00; sin % de ejecución a la fecha. Se han realizado revisiones y reprogramación de actividades en el Plan Operativo Anual (POA), ha sido necesario efectuar modificaciones presupuestarias con el fin de ajustar el presupuesto actual del PRE, permitiendo apoyar presupuestariamente a otros Proyectos al interno de la SEDECOAS.

Se ejecutaron 248 Millones que no se reflejan en la ejecución porque son un reembolso a SEFIN y por el procedimiento utilizado no se imputa el gasto por lo que no se refleja en el presupuesto.

**Modificaciones**

En proceso de aprobación ante la SEFIN traslado presupuestario interno entre actividades y objetos por L 1,710, 7671.10. Se solicitó a la SEFIN disminución presupuestaria en el Grupo del Gasto 40000 por L 70, 682,731.00, asignado inicialmente bajo el componente 1- Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia Salud y Seguridad Pública.

Traslado al Programa CONVIVIR: En proceso de aprobación ante la SEFIN traslado presupuestario entre organismo y proyecto por L 467,000.00 y en proceso al interno de la SEDECOAS solicitud de traslado por L 1, 350,000.00.

Traslado al Programa MIFE: En proceso al interno de la SEDECOAS solicitud de traslado presupuestario entre organismo y proyecto por L 4, 805,500.00.

## Desembolsos

A la fecha el monto total desembolsado asciende a US\$ 14, 678,599.27 equivalentes a L 352, 752,050.48 que representa el 9.8% de monto del convenio, detallados así:

No. Solicitud	Tipo solicitud	Cuenta	Fecha	Tasa Cambio	Dólares	Lempiras
1	Anticipo Cuenta Designada	Cuenta Especial E 11101-20-000949-1 (USD\$)	28/06/2021	23,8918	4.367.894,00	104.356.849,87
2A	Reembolso -Retroactivo	CTA SEFIN 11101-20-000952-1 (HNL)	14/09/2021	24,0910	3.210.912,03	77.354.081,76
3A	Reembolso -Regular	CTA SEFIN 11101-20-000952-1 (HNL)	14/09/2021	24,0910	7.099.793,24	171.041.118,85
<b>Total</b>					<b>14.678.599,27</b>	<b>352.752.050,48</b>

Al 30 de septiembre de 2021 se encuentran en revisión, para la obtención de No Objeción por parte del Banco Mundial, procesos por gastos efectuados por la SEDIS, bajo componente 1, que serán sometidos a reembolso por un monto total de L 167, 543,922.23 equivalentes a \$ 6, 980,997.

## Categorías de Inversión

El Componente 1- Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia y Salud y Seguridad Pública permite el reconocimiento de gastos efectuados por acciones de respuesta de socorro y atención a personas afectadas por los Ciclones Tropicales Eta e Iota. La SEDIS y COPECO ha efectuado y presentado gastos que están siendo sometidos a reembolso bajo la Categorías de Inversión 1 (componente 1) por un monto estimado de \$19,400,000.00 , este es superior a lo asignado actualmente bajo esta categoría.

Con el fin de incrementar el monto asignado a la Categoría 1, se encuentra en proceso solicitud de reasignación de montos entre Categoría de Inversión: aumentado la Categoría 1 y disminuyendo la Categoría 2 en \$ 9,400.000.00:

Categoría	Descripción de las categorías	Asignado Convenio Original	Reasignación Propuesta
1	<b>Goods, works, non-consulting services, consulting services, and Operating Costs under Part 1 of the Project.</b>	10.000.000	19.400.000
2	<b>Goods, works, non-consulting services, consulting services, Training and Operating Costs under Part 2 of the Project.</b>	129.000.000	119.600.000
3	<b>Goods, non-consulting services, consulting services, Training and Operating Costs under Part 3 of the Project.</b>	11.000.000	11.000.000
		<b>\$150.000.000,00</b>	<b>\$150.000.000,00</b>

### SUBPROYECTOS

A la fecha se está trabajando en la preparación de expedientes de 52 subproyectos del sector de educación, ya que en los demás sectores no se tiene formulaciones elaboradas por parte de la Dirección de Proyectos de SEDECOAS.


Se han realizado estas y otras actividades al respecto:

- Revisión de 90 expedientes de subproyectos formulados de los cuales 52 subproyectos han sido elegibles de acuerdo a los criterios de BM.
- Subsanación a los expedientes de los 52 subproyectos elegibles de acuerdo a los criterios de Elegibilidad y Priorización del BM.
- Elaboración de ficha técnica conteniendo la información cualitativa y cuantitativa para cada uno de los subproyectos elegibles.
- Categorización de Gestión del Riesgo a Desastres (GRD) a cada uno de los subproyectos elegibles mediante revisión y evaluación de los expedientes en conjunto con la Dirección de Proyectos de SEDECOAS. (Elaboración de Constancias).
- Solicitud de información ambiental y social mediante constancias y fichas de información cuantitativa a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) y Unidad Técnica de Capacitación (UTC).

- Elaboración de una estrategia de intervención de las obras y supervisión de acuerdo a la zona geográfica de estos primeros 52 subproyectos elegibles, planteados en siete paquetes de obra y dos paquetes de supervisión.
- Solicitud de la actualización de los presupuestos de obra de cada subproyecto a la Dirección de Proyectos de la SEDECOAS
- Elaboración y solicitud de No Objeción al BM del Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC).
- Solicitud de revisión y No Objeción por parte del BM de los expedientes en digital del primer paquete de obras (ocho subproyectos).
- Solicitud de revisión y No Objeción por parte del BM del documento base para el primer paquete de Supervisión (incluye paquetes de Obra 1, 4, 6 y 7).
- Se trabaja en la subsanación de las actividades antes mencionadas de los demás paquetes de obra que incluyen los 44 expedientes de subproyectos elegibles.

Se espera la No Objeción por parte del BM para que la Unidad de Contrataciones y Legal procedan a la publicación del primer paquete de obras y del primer paquete de supervisión.

### Esquema del Proceso a la Fecha

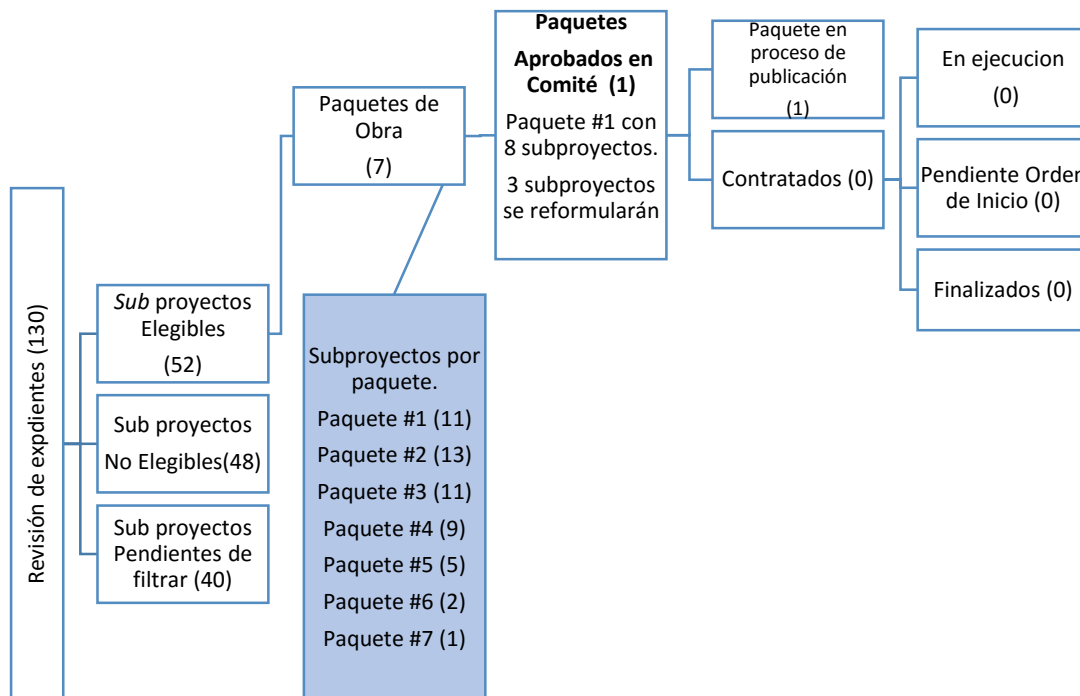

x. **Logros**

- ✚ Se ha desembolsado un 9.8% del monto de Convenio.
- ✚ Conclusión de los expedientes del paquete #1 de obras (8 subproyectos) listo para su publicación.
- ✚ Conclusión del documento base del paquete #1 de Supervisión listo para su publicación.
- ✚ Subsanción a los expedientes de cada una de las formulaciones de los 52 subproyectos elaboradas por la Dirección de proyectos de la SEDECOAS elegibles para ser intervenidos por este convenio de crédito

xi. **Próximos Reto**

Entre los principales retos:

- ✚ Contratación de la Firma Auditora para el PRE a más tardar el 4 de diciembre de 2021.
- ✚ Publicación, Evaluación y Adjudicación del paquete #1 de Obras.
- ✚ Publicación, Evaluación y Adjudicación del paquete #1 de Supervisión
- ✚ Revisión y No Objeción por parte del BM de los paquetes de obra 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
- ✚ Revisión y No Objeción por parte del BM del paquete #2 de Supervisión.

## **CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA**



### ✓ **Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)**

#### **i. Antecedentes**

El Estado de Honduras ha revalorizado la educación como elemento fundamental para el desarrollo integral de todos los hondureños, mediante la implementación de la Tercera Reforma Educativa, que responde a las expectativas de la sociedad, cuyos alcances se enmarcan en los objetivos No.1 y No.4 de la Visión de País 2010-2038; Plan de Nación 2010-2022; que estipulan: “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidados de previsión social” y “Honduras con un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo. Para la ejecución de esta Tercera Reforma, se aprueba en el año 2012, la Ley Fundamental de Educación y en el año 2014 sus 22 Reglamentos.

Según el Plan Estratégico del Sector Educativo 2018-2030, para poder cumplir con la Ley Fundamental de Educación, el sistema educativo en Honduras se enfrenta a los siguientes retos:

-Fortalecimiento de la Secretaría de Educación conforme a la Ley Fundamental de Educación (LFE), principalmente en dos aspectos: i) descentralizar funciones operativas en las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de Educación; y ii) fomentar la participación comunitaria en la gestión educativa, formulación y coordinación de los planes estratégicos, que apunten a mejorar la calidad educativa.

El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Educación, garantiza el derecho fundamental a la educación, el acceso a una educación de calidad en condiciones de equidad, sin discriminación de ninguna naturaleza en todos sus niveles. La Ley Fundamental de Educación recupera el espíritu de garantizar este derecho, estableciendo el compromiso de brindar educación gratuita en todos sus niveles; un año obligatorio en Educación Pre-Básica (tercer grado) y tres ciclos de Educación Básica (I, II y III ciclo). Con ello, se logra la meta establecida de país, que para el año 2038, Honduras debe elevar la escolaridad promedio a 9 años (1º a 9º grado), reconociendo que es necesario formar educandos para la convivencia, derechos humanos, responsabilidad social, cuidado de las personas, entendimiento del entorno, protección del medio ambiente y la educación media ha sido considerada, hasta finales del siglo XX, como el período de preparación de los jóvenes para el ingreso a la educación superior y también como la enseñanza que proporciona entrenamiento



técnico-vocacional, preparando a los jóvenes para su inserción en la vida productiva. En general, la educación media tiene como propósito ofrecer la experiencia formativa para incorporarse al mundo del trabajo y/o proseguir estudios en el nivel de educación superior.

## **ii. Objetivo General**

Fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros Educativos Media y sean promovidos con la calidad requerida.

## **iii. Focalización**

El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.

## **iv. Beneficiarios**

El Programa beneficiará 480 niños de Educación pre-básica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes.

## **v. Duración**

La duración del programa es de 3 años desde el 2021 hasta el 2023 donde habrá un desarrollo gradual de la infraestructura y la dotación de equipo, así como la formación permanente y la plataforma virtual para emprendimiento.

## **vi. Costo Total del Programa**

Este es un esfuerzo de la Republica de Honduras, a través de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por US\$80,000,000.00 que tiene como meta llegar a la población educativa de los diferentes niveles que atiende el sistema educativo nacional.

### vii. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	505.920.073,00	109.564.224,00	22%

### viii. Principales Logros

Año	Planificado al III Trimestre	Ejecutado	Eficiencia
2021	109.603.000,00	109.564.524,00	100%

Se realizó la compra de 26,215 tabletas a través del PNUD las cuales fueron entregadas a la Secretaria de Educación para su distribución.

El programa actualmente se encuentra en actividades previas para su ejecución, la diferencia en cuando a producción planificada para este trimestre corresponden a un reajuste de las actividades las cuales se están reprogramando para el año 2022 y la diferencia con respecto a lo financiero corresponde a los diferenciales de tasa de cambio cuando se realizó la planificación.

### PROXIMOS RETOS

Entre los principales retos que enfrenta:

- Conformación de la Unidad Ejecutora
- Contratación de los 7 formuladores para la realización de 21 pre factibilidades.
- Evaluación del proceso de formuladores según el nuevo proceso lanzado.

## CARTERA KfW Entwicklungsbank

### ✓ Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V

#### i. Objetivo General



Consiste en la utilización de centros educativos mejorados, ampliados o nuevos y equipados bajo conceptos pedagógicos que operan de manera sostenible por la comunidad educativa. De esta manera se pretende contribuir a que niños/as y jóvenes de regiones pobres utilicen una oferta de alta calidad educativa, tanto formal como de educación vocacional.

#### ii. Focalización

**Fase IV:** El Área de intervención abarcará los departamentos que están siendo intervenidos en las fases anteriores (Zona de Occidente): 1) Copán, 2) Santa Bárbara, 3) Intibucá, 4) Lempira, 5) La Paz, 6) Ocotepeque. 7) Centros a nivel nacional en casos de emergencia (catástrofes naturales). La información de estos centros deberá ser actualizada en el plan maestro y sólo si se determina su precariedad, podrán ser intervenidos previo a No Objeción del KfW. 8) Adicionalmente se extenderá el área de intervención a los departamentos adyacentes a la zona de occidente, delimitando el área de intervención a través de la Carretera Panamericana. Los municipios a ser beneficiados se encuentran al oeste de la misma en los siguientes departamentos: 1) Choluteca, 2) Valle, 3) Francisco Morazán (exceptuando el núcleo urbano de Tegucigalpa), 4) Comayagua y adicionalmente 5) Gracias a Dios.

**Fase V:** El Área de intervención abarcará los departamentos de: Ocotepeque, Lempira y Copan, en la zona de Occidente. Además, los departamentos al oeste de la carretera CA-5 de los departamentos de Francisco Morazán (exceptuando el Distrito Central), Valle, Choluteca, Comayagua. También seguirá formando parte del Programa el Departamento de Gracias a Dios (siempre y cuando no se alcance un mínimo de infraestructura en este departamento y según las experiencias de la fase IV del PROMINE).

#### iii. Priorización de los Centros Educativos

Esta es realizada por la Secretaria de Educación apoyados en la herramienta del Plan Maestro de Infraestructura Educativa.

#### iv. Descripción del Proyecto

**Fase IV:** El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y en la planificación estratégica para los años 2014 - 2018 de la Secretaría de Educación (SE). El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las tres fases previas PROMINE I, II y III. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

**Fase V:** El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y el Plan Estratégico del Sector de Educación para los años 2017 - 2030 de la Republica de Honduras. El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las cuatro fases previas PROMINE I, II, III y IV. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

#### v. Monto del Proyecto:

##### **Fase IV:**

Fondos de Donación por un monto de € 15,000,000.00 euros, Contrapartida Nacional para SEDECOAS/FHIS de € 424,000 euros, Contrapartida Nacional para SE de € 218,000 euros, Contrapartida Municipal de € 515,000 euros y Contrapartida Comunitaria de € 514,000 euros.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 03/12/2015

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 17/02/2017

Fecha de Inicio: 02 de Abril 2018 (Se considera la fecha de inicio de la Consultoría)

Fecha de Finalización de convenio: 30/11/2022

##### **Fase V:**

Fondos de Donación por un monto de 10, 000,000.00 euros, Contrapartida Nacional para IDECOAS/FHIS de 495,000 euros, Contrapartida Nacional para SE de 250,000 euros, Contrapartida Municipal de 600,000 euros Contrapartida Comunitaria de 600,000 euros.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 06/07/2018

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 21/03/2019

Fecha de Inicio: Inicio de la Consultoría 17 de marzo

Fecha de Finalización de convenio: 37 meses a partir del inicio de la consultoría

**vi. Avance Financiero PROMINE FASE III y IV**

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2016	145.687.475,00	142.916.817,45	98%
2017	107.279.375,00	96.731.967,93	90%
2018	53.035.502,00	50.951.601,81	96%
2019	81.069.633,00	79.762.875,76	98%
2020	134.608.478,00	123.221.616,32	92%
2021	158.087.627,00	55.798.486,45	35%
Presupuesto 2021 Fase IV y Fase V			

**vii. Avance Físico por Sector PROMINE FASE IV y V**

SECTOR	Proyectos Finalizados 2021	Mto. Ejecutado 2021	Empleos Generados 2021	Beneficiarios Directos 2021
EDUCACION	5	44.821.922,73	139	937
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>44.821.922,73</b>	<b>139</b>	<b>937</b>

**viii. Avance Físico por Departamento PROMINE FASE IV y V**


DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2021	Mto. Ejecutado 2021	Empleos Generados 2021	Beneficiarios Directos 2021
CHOLUTECA	0	17.956,23	0	0
COPAN	2	5.462.984,38	54	529
FRANCISCO MORAZAN	0	8.782.808,73	0	0
INTIBUCÁ	0	12.179.047,28	0	0
LA PAZ	1	4.316.077,49	22	147
LEMPIRA	0	7.319.384,53	0	0
SANTA BARBARA	1	-	36	191
OCOTEPEQUE	1	6.743.664,09	27	70
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>44.821.922,73</b>	<b>139</b>	<b>937</b>

**ix. Otras Inversiones**

OTRAS INVERSIONES		Mto. Ejecutado 2021
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS		9.227.330,82
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA*		1.749.214,90
<b>TOTAL</b>		<b>10.976.545,72</b>
*Viaticos, pasajes y Combustible		

**x. AVANCES GENERALES**

**FASE IV.**

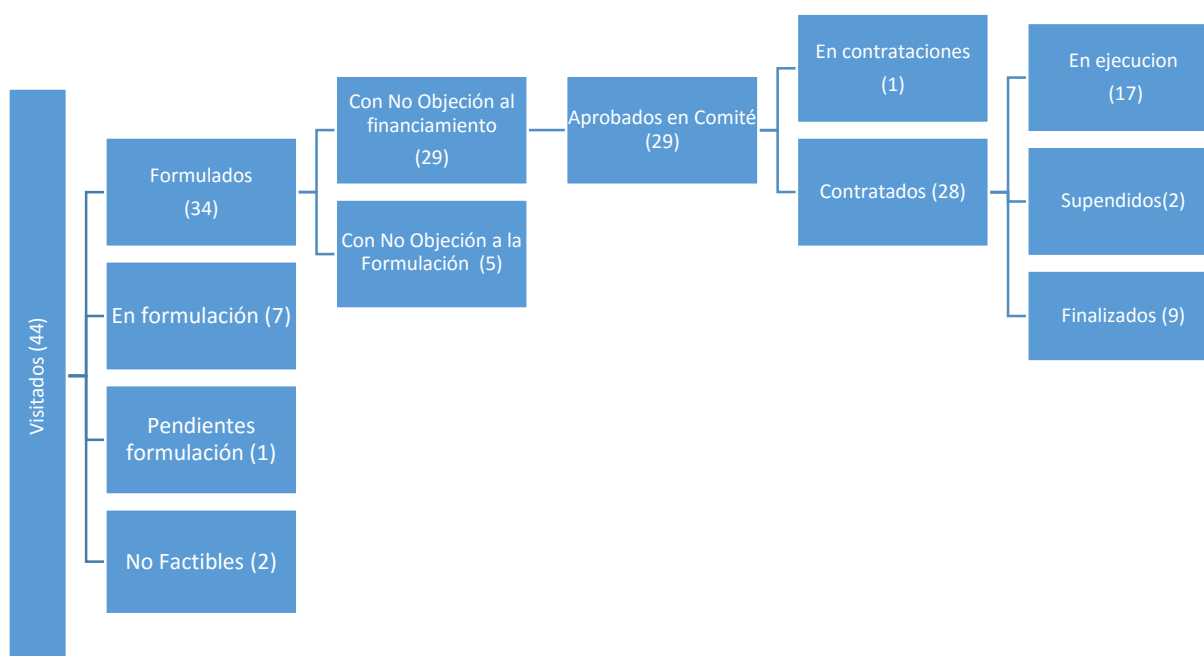

Actualmente se tiene dificultades en la ejecución física y financiera entre otras a los siguientes factores: 1) Incremento de precios: En estos últimos meses se ha tenido un alza a nivel nacional principalmente en insumos de cemento, tubería de PVC, varillas, canaletas, cubierta de techos lo cual ha impactado sobre todo los proyectos que se encuentran en inicio y etapa intermedia de actividades, ya que se reporta un alza de un 25% a 30% en algunos insumos. 2) Escasez de insumos: Además del alza en los costos de los insumos, hay una limitada oferta de insumos, más en proveedores que están en zonas relativamente cerca a los proyectos. También se tiene escasez, en los equipamientos, como en el caso de microscopios para talleres de Ciencias Naturales, cuyos proveedores reportan tiempo adicional para proveer los insumos, porque son comprados fuera del país. 3) Escasez e incremento de monto de Mano de Obra Contratada: Sobre todo en lo que se refiere a los albañiles que se contratan, identificándose que algunos están migrando del País o solicitan se les incremente su pago a mucho más a lo establecido en los presupuestos. 4) Disminución de aporte comunitario: Se viene

registrado, una disminución en el aporte comunitario. Se aduce al temor de contagio del COVID-19, los ingresos económicos por familia. Adicionalmente no se realizaron los desembolsos a 2 proyectos ejecutándose en el departamento de Gracias a Dios que se encuentran suspendidos y en revisión de la auditoría interna.

**xi. AVANCE FINANCIERO SEGÚN PRESUPUESTO ASIGNADO FASE VI Y FASE V**

Año	Planificado al III Trimestre	Ejecutado	Eficiencia
2021	62.736.539,03	55.798.468,45	89%

**xii. LOGROS III TRIMESTRE**

- ✓ Se han comenzado las formulaciones de proyectos que serán considerados para completar la disponibilidad de la fase IV.
- ✓ Se han realizado la actualización al Manual PEC -2021

**xiii. RETOS PROXIMOS**

Entre los principales retos que enfrenta el PROMINE-KfW:

- Reparación de los vehículos del Programa
- Solventar los inconvenientes en la administración y ejecución física de los proyectos en los departamentos de Gracias a Dios.
- Impulsar la ejecución física y financiera de los proyectos de occidente y el departamento de Gracias a Dios en ejecución.

## ✓ Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)

### i. Objetivo General



Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).

### ii. Focalización

A través de un proceso de concurso con criterios de selección predefinidos en el acuerdo separado y evaluación de propuestas técnicas alineadas a los componentes del programa fueron seleccionados 3 municipios en donde se está realizando la intervención del CONVIVIR a través de obras de infraestructura y medidas de alcance social para beneficio enfocado en la juventud. Así mismo se definieron los barrios, colonias o comunidades urbanas en donde se focaliza las acciones y en donde ya se ha realizado una labor de socialización de los alcances, compromisos y beneficios para la población. Los municipios seleccionados son:

- Municipio de Gracias, departamento de Lempira
- Municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua
- Municipio de La Lima, departamento de Cortes.

### iii. Descripción del Proyecto

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

### iv. Monto del Proyecto:

Los fondos destinados para la ejecución de este Programa es de 10,000,000.00 Euros. El tipo de financiamiento es un contrato de Préstamo para la Fase I y para la Fase II es de 6,000,000.00 Euros.



**Fecha de Firma de convenio Fase I: 08/11/2012**

**Fecha de Finalización de convenio Fase I: 31/07/2021**

**Fecha de Inicio del Programa de convenio Fase II: 14/07/2021**

**v. Avance Financiero**

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2014	21.289.204,00	18.316.427,97	86%
2015	38.873.159,00	34.024.198,74	88%
2016	88.796.503,00	83.460.868,42	94%
2017	51.288.495,00	48.071.886,28	94%
2018	65.657.852,00	43.535.738,65	66%
2019	33.661.644,00	30.786.651,68	91%
2020	38.080.614,00	30.674.408,45	81%
2021	18.547.004,00	4.953.020,66	27%
Presupuesto 2021 Fase I y Fase II			

**vi. Avance por Sector**

SECTOR	Proyectos Finalizados 2021	Empleos Generados 2021	Beneficiarios Directos 2021
PREVENCION SITUACIONAL/CONVIVIENCIA	1	31	2.040
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>2.040</b>

**vii. Avance por Departamento**

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2021	Empleos Generados 2021	Beneficiarios directos 2021
COMAYAGUA	1	31	2.040
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>2.040</b>

**viii. Otras Inversiones**

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2021
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	4.877.903,45
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO	75.117,21
<b>TOTAL</b>	<b>4.953.020,66</b>

## ix. COMPONENTE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA- AVANCE FISICO

En el componente de Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura el Programa CONVIVIR, la gestión del SEDECOAS/FHIS está orientada a lograr la buena ejecución de cada obra priorizada. Para ello, durante este período se ha continuado con el trabajo conjunto con la Dirección de Control y Seguimiento. Se ha logrado dar término de un número de 37 obras de infraestructura.

La institución es también responsable de la tramitación de documentación para lograr la aprobación de órdenes de cambio, y desembolsos de fondos para construcción.

Actualmente se tiene una cartera de 37 proyectos de infraestructura aprobados para ejecutar con el monto del convenio. De dichos proyectos ya se terminaron 37 obras, siendo el último proyecto cerrado “Casa de la Cultura”, Siguatepeque, Comayagua

Todos los proyectos de infraestructura fueron debidamente equipados, el proyecto próximo a inaugurar es el proyecto “Casa de la Cultura”, Siguatepeque, Comayagua.

El SEDECOAS/FHIS ha actuado por medio de su equipo de Control y Seguimiento, inspectores sociales y técnicos, dando seguimiento a la ejecución y cierre de los proyectos en construcción, como también trabajando en el seguimiento a las gestiones administrativas relacionadas con desembolsos, ordenes de cambio ingresados en el ciclo de proyectos del SEDECOAS/FHIS.

A continuación se anexan los tres cuadros que corresponden a la ejecución física de cada una de las obras de infraestructura

### *No. 1 Obras priorizadas en el municipio de Siguatepeque, Comayagua*

No.	Código FHIS	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado	ESTADO	
					Avance Físico	Avance Financiero
1	105175	Construcción Cancha Multiuso Parque Bosque Calanterique	Suyapita	L. 3,104,790.79	CONCLUIDO	
2	106002	Construcción Salón Multiusos Y Cancha Deportiva Noé Cruz Villeda	Col. Noé Cruz Villeda	L. 3,012,043.70	CONCLUIDO	
3	106347	Construcción Centro De Calidad De Vida	La Crucita	L. 2,956,701.47	CONCLUIDO	
4	106181	Construcción Centro De Calidad De Vida Bo. El Carmen	Bol El Carmen	L. 3,767,167.59	CONCLUIDO	
5	106094	Remodelación Centro De Capacitación Digital	Bo. El Centro	L. 410,327.27	CONCLUIDO	
6	105928	Construcción De Obras Complementarias Campo De Futbol Col. Mata	Col. Mata	L. 2,721,312.41	CONCLUIDO	
7	106308	Construcción Centro De Calidad De Vida	Bo. San Juan	L. 3,598,956.85	CONCLUIDO	

8	107303	Construcción Oficina Municipal De La Juventud	Barrio El Centro	L. 3,638,941.50	CONCLUIDO
9	107324	Remodelación Centro De Aprender Para Emprender - Infop	Suyapita	L. 986,493.87	CONCLUIDO
10	107546	Construcción Obras Complementarias Plaza Del Bosque Calanterique	Suyapita	L. 1,805,135.54	CONCLUIDO
11	107317	Construcción Casa De La Cultura	Bol El Carmen	L. 11,012,069.37	CONCLUIDO
12	107547	Remodelación De Biblioteca Municipal, Siguatepeque	Bo. El Centro	L. 461,153.55	CONCLUIDO
13	107483	Construcción Plaza Turística de Artesanos EL Porvenir	Aldea El Porvenir	L. 3,870,593.12	CONCLUIDO
<b>TOTAL INVERSION</b>				<b>L. 41,386,687.31</b>	

**No. 2 Obras priorizadas en el municipio de Gracias, Lempira**

No.	Código FHIS	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado	ESTADO	
					Avance Físico	Avance Financiero
1	105174	Construcción Plaza Recreativa Colonia Borjas	Col. Borjas	L. 3,225,774.53	CONCLUIDO	
2	106006	Construcción Plaza De Recreación Para La Convivencia Pinalito Y Bella Vista	Pinalito	L. 2,147,440.69	CONCLUIDO	
3	106145	Remodelación Centro De Capacitación Digital	La Merced	L. 56,983.16	CONCLUIDO	
4	106090	Ampliación Plaza Boulevard Marco Tulio Rodríguez	El Progreso	L. 2,454,714.29	CONCLUIDO	
5	106062	Construcción Casa De La Cultura	Mercedes	L. 8,169,443.80	CONCLUIDO	
6	106007	Construcción Escuela De Música Mejicapa	Bo. Mejicapa	L. 2,590,324.49	CONCLUIDO	
7	105994	Reposición Polideportivo Villas Del Rosario	Villas del Rosario	L. 7,868,528.04	CONCLUIDO	
8	106003	Construcción Parque Recreativo Col. Moreno Y Hércules	Col. Moreno	L. 5,459,590.31	CONCLUIDO	
9	106004	Remodelación Plaza San Sebastián	Gracias	L. 4,029,707.82	CONCLUIDO	
10	106136	Construcción Salón Multiusos Bella Vista Y Pinalito	Col. Bella Vista	L. 2,979,546.19	CONCLUIDO	
11	105992	Construcción Campo De Pelota Bella Vista Y Pinalito	Col. Bella Vista	L. 3,197,439.41	CONCLUIDO	
12	105713	Ampliación Casa De La Juventud	Villas del Rosario	L. 6,619,560.57	CONCLUIDO	
13	106328	Construcción Centro De Calidad De Vida Villami	Villami	L. 2,447,597.92	CONCLUIDO	
14	107489	Centro De Aprender Para Emprender, Inst. Ramón Rosa	Barrio Mejicapa	L. 4,776,414.85	CONCLUIDO	
<b>TOTAL INVERSION</b>				<b>L. 56,023,066.07</b>		

**No. 3 Obras priorizadas en el municipio de La Lima, Cortés**

No.	Código FHIS	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado	ESTADO	
					Avance Físico	Avance Financiero
1	105173	Construcción Centro Juvenil De Desarrollo Integral	Centro Sula	L. 3,262,220.20	CONCLUIDO	

2	106182	Construcción Centro De Calidad De Vida Col. Nuevo San Juan	Col. Nuevo San Juan	L. 2,961,528.33	CONCLUIDO
3	106184	Construcción Centro De Calidad De Vida	Col Álvarez Martínez	L. 3,068,158.19	CONCLUIDO
4	105893	Remodelación Casa De La Cultura	Col. Sitraterco	L. 9,605,935.76	Proyecto Rescindido y con recuperación total de los fondos
5	105895	Remodelación Camino De Los Gatos Paseo Del Puente Y Áreas Aledañas	Bo. Centro Sur	L. 2,831,897.23	CONCLUIDO
6	106093	Remodelación Centro De Capacitación Digital	Bo. Centro Norte	L. 225,080.18	CONCLUIDO
7	105738	Ampliación Plaza Juventud Barrio Centro Sur	Bo. Centro Sur	L. 7,036,616.12	CONCLUIDO
8	105897	Remodelación Mediana Sitraterco	Col Sitraterco	L. 8,518,858.49	Proyecto Rescindido y con recuperación total de los fondos
9	105900	Construcción Cancha Multiusos Colonia El Maestro	El Maestro	L. 2,687,523.23	CONCLUIDO
10	105902	Remodelación Parque De Los Pinos	Col. Los Pinos	L. 1,775,191.17	CONCLUIDO
11	107488	Remodelación Biblioteca Municipal	Bo. Centro Sur	L. 1,500,285.33	CONCLUIDO
12	107610	Remodelación Centro de Aprender para Emprender, Instituto Técnico Vocacional Valle de Sula	Col. Oro Verde	L. 4,168,239.85	CONCLUIDO
<b>TOTAL INVERSION</b>				<b>L. 29,516,739.83</b>	

**x. AVANCE DEL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES Y LABORALES DE JÓVENES Y COMPONENTE MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES RELEVANTES**

El tercer trimestre del año 2021, se realizaron una serie de actividades enfocadas del modelo de funcionamiento de los municipios, en especial a la etapa de asesoramiento para cada uno de los municipios del Programa:

#	ACTIVIDADES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS
1	Revisión final del Plan maestro de sostenibilidad y seguimiento del Programa CONVIVIR.	Se realizó una revisión exhaustiva del Plan maestro que propone la lógica de intervención de la fase de sostenibilidad del Programa, (Se adjunta introducción del documento).	Documento de Plan maestro finalizado, quedando pendiente la diagramación del mismo.
2	Socialización con la unidad técnica de Capacitación (UTC) para dar a conocer los contenidos de los Módulos de capacitación del Modelo ORMAG.	Se solicitó una reunión con la unidad técnica de capacitación para dar a conocer los contenidos de los 6 módulos de capacitación los cuales son la propuesta de capacitaciones para la ORMAG barriales y municipales. Durante la reunión se realizó la entrega oficial de la Metodología PEC por la Ing. Karen caballero y el equipo Convivir.	Entrega Oficial de los Módulos de capacitación de la Metodología PEC a la Unidad Técnica de Capacitación.
3	Gira de seguimiento en los 3 municipios de la Fase I Convivir,	Se realizaron una serie de reuniones de seguimientos con miembros de las ORMAG barriales, ORMAG Municipal y las oficinas de juventud, con el propósito de analizar las diferentes estrategias que facilitan el usos de los espacios de cada proyecto Convivir, en este caso se describen las actividades realizadas:  1. Informes de actividades de la OMJ en vinculación de los espacios convivir.  2. Reforzamiento del Plan Estratégico de la ORMAG Municipal, donde se aclararon dudas en cuanto a los componentes administrativos y organizativos que contempla el Plan.  3. Inducción sobre los procedimientos administrativos sobre el manejo de 5% de las ORMAG barriales, ya que los municipalidades terminara de realizar los desembolsos.  4. Entrega del equipamiento de barismo a la Municipalidad de la Lima.	El Programa CONVIVIR cuenta con su propia metodología y modelo de desarrollo comunitario enfocado a la Gestión y Desarrollo.  Fortalecidos los conocimientos las ORMAG barriales para el manejo de 5% de los fondos de transferencia.  Se aclararon las dudas referentes a la estructura organizativa de la ORMAG Municipal.  Se reforzó las vinculaciones del trabajo con juventud y los planes de revitalización de los proyectos

## AVANCES DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE JUVENTUD

Las Oficinas Municipales de Juventud han realizados acciones aun con las dificultades que ha dejado la pandemia para realizar actividades plenamente en los espacios CONVIVIR, es importante destacar que el municipio de La Lima y Siguatepeque han reportado sus logros y avances a la fecha.

### MUNICIPIO DE LA LIMA:

Cabe mencionar que la OMJ está realizando los esfuerzos para ejecutar la Estrategia de Juventud, Al igual que otras acciones que la OMJ está desarrollando con ONG, Programas de Cooperación entre otras, a continuación se da a conocer las acciones que se están realizando en los siguientes ejes o áreas:

#### Eje de empleabilidad:

- Proyecto de empleabilidad con Alternativa, Grupo Monge y Diunsa.
- Proyecto de Operario Textil, Empleado Futuro con CADERH.
- Proyecto de Taller de Reparación de Celulares con Visión Mundial.
- Proyecto de empleabilidad en la lima-OMJ.
- Proyecto No me detengo – Semprende.
- Proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro con INJ y Embajada de México.
- Plataforma de Observatorio de Empleabilidad con Visión Mundial.
- Jóvenes capacitados por CONVIVIR.

#### Eje de Formación:

- Clases de Computación en centro digital de la biblioteca pública.
- Gestión de Becas Estudiantiles con el Sr. Alcalde.
- Taller de Barismo con CONVIVIR.
- Clases de Reparación de Celulares con Visión Mundial.
- Capacitación Mundo Joven en Gracias, Lempira con jóvenes limeños.

#### Eje Social:

- Intervención Psicosocial en zona de campería.
- Conversatorios Juveniles con Sr. Alcalde.
- Gestión de apoyo con víveres a jóvenes afectados por los huracanes.

- Proyecto Fútbol con Valores en los barrios, Promotores Deportivos.
- Creación de la Banda de la escuela Manuel Bonilla.
- Apoyo a las ORMAG en rehabilitación de proyectos.
- Actividades con FUNADEH en campaña de igualdad de Género.
- Cabildo juvenil con más de 600 jóvenes. Elección de Madrina de la Plaza de Juventud.
- Celebración del Día de la Bicicleta.

### **MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE:**

#### **▪ Capacitación de políticas públicas para jóvenes:**

Se realizó la capacitación de jóvenes de diferentes edades, escolaridad y diversos barrios de la ciudad de Siguatepeque, con el fin de que los jóvenes sepan y conozcan los objetivos, decisiones y acciones que llevan a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el gobierno consideran prioritarios.

Los jóvenes dieron sus diversas opiniones acerca de los problemas que ellos consideraban son de suma importancia ponerle atención. Como por ejemplo crear fuentes de trabajo para diferentes edades en edad de trabajar, el espacio de ambientes creativos y el poder tener voz para ser escuchados. En donde han más participado más de 30 jóvenes en diferentes jornadas con una duración de 12 horas por jornada distribuidos en tres días.

#### **▪ Desarrollo de murales artísticos:**

Dicha actividad se llevó a cabo con diversos jóvenes de la ciudad, con el fin de informar a las personas (niños, adolescentes, adultos) que observan dichos murales contenidos que promueven la convivencia y cultura. Con esta actividad los jóvenes pasan un momento divertido y exploran sus diversas aptitudes artísticas. Estos murales se llevaron a cabo en distintos puntos de la ciudad de Siguatepeque. Que ha contado la participación de 25 jóvenes de diversos sectores de la ciudad.

#### **▪ Capacitación de Jóvenes en Habilidades para la Vida:**

Con el fin de incrementar las habilidades para la vida de los jóvenes y fomentar la capacidad de los jóvenes a tomar decisiones y llevar a cabo las acciones que impactan positivamente en la vida y de quienes los rodean.

Así mismo con el objetivo de promover el bienestar psicológico y físico de los jóvenes. Por lo cual esta capacitación la impartió una licenciada en psicología para tener un mayor acercamiento con los jóvenes, así mismo siguiendo todas las medidas de bioseguridad. Con una participación de 40 jóvenes en dos jornadas.

▪ **Conversatorio con los jóvenes y las distintas autoridades de la ciudad:**

El propósito del conversatorio fue para hacer reflexión sobre un tema de interés. Del cual se genere el diálogo y se compartan ideas.

En donde se creó el espacio de diálogo para los jóvenes que participaron en dicho conversatorio para reflexionar como ellos pueden contribuir en diversos temas de interés.

Creando conciencia de dicha problemática y la necesidad de tener a jóvenes voceros en todos los entornos tanto laborales, sociales y culturales. Con la participación de 30 jóvenes en diferentes días.

▪ **Jornada de sociabilización con jóvenes del proyecto construyendo el futuro:**

Se llevó a cabo una jornada de sociabilización con los jóvenes del proyecto construyendo el futuro, con el fin de conocer cuáles han sido sus experiencias en su entorno laboral a su vez en su crecimiento personal.

Por lo cual dicho proyecto ha tenido un enorme impacto positivo en estos jóvenes de diversas edades, diferentes niveles de escolaridad y diversos barrios y aldeas de la ciudad de Siguatepeque, a su vez este proyecto ha detenido en estas zonas el crecimiento de migración que se había estado experimentado.

A su vez los jóvenes dieron su agradecimiento por esta oportunidad que han tenido y de los cambios que han tenido en sus vidas. En donde han participado una cantidad de 500 jóvenes.

**xii. Actividades Cierre del Programa Fase**

- Acciones financieras para la devolución de fondos remanentes del Préstamo 2011 65364 a la SEFIN y su posterior transferencia al KfW. Pendiente de concluir proceso de devolución por la SEFIN.
- El 14 septiembre se presenta al KfW la Justificación de fondos No.14. por US\$311,591.86. Pendiente su aprobación.
- Se recibe de la Firma Grant Thornton el Informe de Auditoría a los Estados Financieros año 2020. Pendiente la aprobación por el KfW.



### **xiii. CONVIVIR FASE II**

El Programa CONVIVIR Fase II, actualmente se encuentra en proceso de inicio, por lo que a continuación se detallan datos importantes de sus avances:

- Es un préstamo de 6 millones de Euros.
- Tiene fecha de inicio del 14 de julio del año 2021, el cual inicia con la presencia de la Asistencia Técnica.
- Actualmente se reprogramo el POA 2021, tomando en cuenta los tiempos de los procesos para la ejecución de los fondos.

### **CONVIVIR FASE III:**

- ❖ Es una donación de 10 millones de Euros
- ❖ Actualmente se encuentra en proceso a la enmienda a la nota de prioridad para el avance de la Fase III.
- ❖ En el mes de junio se inició con el proceso de evaluación para la selección de los municipios de esta fase en conjunto con la Consultora del KfW y la Coordinación del Programa CONVIVIR.
- ❖ Se logró la revisión de las partes del acuerdo separado y el contrato de aporte financiero, el cual se encuentra en su versión final.

### **xi. Logros del III Trimestre:**

- El 14 de septiembre la SEFIN mediante Oficio DGIP-PRE-0123-2021 aprueba la Enmienda a la Nota de Prioridad para agregar la Fase III.
- El 14 de julio 2021 se dio Orden de Inicio a la Empresa FICHTNER WATER & TRANSPORTATION (GMBH), por los servicios como Asistencia Técnica para la fase II del CONVIVIR. Se ejecuta el pago por Anticipo del contrato (Euros 143,932.62).
- Se define con la Asistencia Técnica reprogramar la ejecución física de proyectos hasta conocer los resultados de los Estudios y Diagnósticos municipales y de Juventud.
- Se solicitó a la SEFIN un decremento presupuestario por un monto de L.7.298 millones, fondo externo y L.2.28 millones fondos nacionales, en los objetos previstos para ejecución y supervisión de obras y transferencias. Al 30 de septiembre queda pendiente su aprobación por la SEFIN.
- Se solicita la Dotación Inicial a la cuenta especial BCH por Euros 77,914.72.

## **CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)**



### **✓ Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)**

#### **A. Objetivo General**

El propósito de esta Actividad es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

#### **B. Focalización**

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en las cinco municipalidades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Tela y La Ceiba. Las comunidades específicas de intervención serán identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

#### **C. Descripción del Proyecto**

Esta Actividad ayudará al GdeH (representado a través de FHIS) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otras partes interesadas. La Actividad incluye dos resultados complementarios: Resultado 1: Mejora de la infraestructura comunitaria, las actividades responderán a las prioridades de infraestructura comunitaria para abordar la seguridad ciudadana. Resultado 2: Aumento de la cohesión comunitaria, considera que la forma en que las intervenciones de infraestructura son concebidas, diseñadas y ejecutadas pueden desempeñar un papel directo en el aumento de la cohesión social y comunitaria y promover un marco holístico de prevención de la violencia. Los proyectos bajo la Actividad incluirán instalaciones educativas, centros de salud, alumbrado público, espacios comunitarios más seguros,

centros de alcance y comunitarios, centros vocacionales, jardines comunitarios, parques, espacios recreativos, paradas de buses, accesos peatonales, mejoras al alumbrado de calles, señalización, instalaciones para el sector seguridad y justicia, así como otros proyectos de infraestructura de pequeña escala que se acuerde entre las Partes.

#### D. Monto del Convenio

Presupuesto total estimado: \$14,637, 541.74, de los cuales, fondos de donación de USAID: \$11, 710,033.39; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$ 2, 927,508.35 (efectivo: \$ 2,127,508.35 y especies: \$ 800,000.00).

##### i. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	23.226.555,00	21.906.553,68	94%
2019	60.781.669,00	60.781.669,00	100%
2020	145.322.291,00	60.678.681,68	42%
2021	90.509.866,00	24.196.966,98	27%

##### ii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2021	Mto. Ejecutado 2021	Empleos Generados 2021	Beneficiarios Directos 2021
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	5	948.390,01	50	452.999
EDUCACION	1	15.165.372,26	125	3.974
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>16.113.762,27</b>	<b>175</b>	<b>456.973</b>

##### iii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2021	Mto. Ejecutado 2021	Empleos Generados 2021	Beneficiarios directos 2021
ATLANTIDA	5	13.334.586,23	133	6.118
CORTES	1	2.779.176,04	42	450.855
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>16.113.762,27</b>	<b>175</b>	<b>456.973</b>

iv. **Otras Inversiones**

OTRAS INVERSIONES		Mto. Ejecutado 2021
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS		7.893.793,58
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA		189.411,13
<b>TOTAL</b>		<b>8.083.204,71</b>

v. **Principales Logros (julio-septiembre 2021)**

**COMPONENTE SOCIAL**

Se llevaron a cabo capacitaciones a los comités y personal de mano de obra en temas de Bioseguridad, también se ha fortalecido a la comunidad en temas de Género, cumpliendo los indicadores del Plan de monitoreo y Plan de Género del programa.

Con las cartas de ejecución CdE 04 y CdE 11 Se financiaron desde el 2017 al 2021 31 proyectos de cartera regular y 04 proyectos de Covid-19

**Proyectos de Inversión Cartera Regular**

N.	Tipo	Descripción	Estatus	Departamento	Municipio	Total		
						USAID	NAC	Costo Total
		<b>Proyectos de Inversión Cartera Regular</b>						
1	CDA	Mejoras al Centro de Alcance (CDA) Las Ayestas 107124	Finalizado	Francisco Morazán	MDC	L. 1,144,389.39	L. 0.00	L. 1,144,389.39
2	CDE	Rep. Instituto Reynaldo Narvaez Rosales. Col. Las Torres P-107089	Finalizado	Francisco Morazán	MDC	L. 3,096,166.40	L. 0.00	L. 3,096,166.40
3	CDA	Pavimentación Calle Principal Juzgados (Ruta Segura) 107149	Finalizado	Cortés	Choloma	L. 2,722,469.41	L. 0.00	L. 2,722,469.41
4	CDE	Rep. Escuela Carlos Rivera Lopez, Colonia Central Sector Rivera Hernandez 106826	Finalizado	Cortés	San Pedro Sula	L. 2,577,294.86	L. 0.00	L. 2,577,294.86
5	CDE	Obras Compl. CEB José Antonio Peraza, Rivera Hernandez 106799	Finalizado	Cortés	San Pedro Sula	L. 2,431,860.79	L. 0.00	L. 2,431,860.79
6	CDA	Pavimentación Calle Principal Col. Lopez Arellano (Ruta Segura) 106828	Finalizado	Cortés	Choloma	L. 2,980,291.32	L. 218,764.58	L. 3,199,055.90

7	CDE	Ampliación y Mejoras CEB Marco Antonio Ponce 107093	Finalizado	Atlántida	La Ceiba	L. 4,889,681.52	L. 8,845.43	L. 4,898,526.95
8	CDE	Reparación Instituto Triunfo de la Cruz Fase I 107300	Finalizado	Atlántida	Tela	L. 892,602.62	L. 0.00	L. 892,602.62
9	CDA	Construcción Centro de Integral Corozal, 107212	Finalizado	Atlántida	La Ceiba	L. 3,291,818.76	L. 247,776.94	L. 3,539,595.70
10	CDE	Rep. Techo CEB Miguel Paz Barahona 107356	Finalizado	Atlántida	La Ceiba	L. 96,114.78	L. 0.00	L. 96,114.78
11	CDA	Reparación de Casa Alianza Centro 106856	Finalizado	Francisco Morazán	MDC	L. 4,782,750.30	L. 0.00	L. 4,782,750.30
12	CDE	Construcción Kinder Mirian Lobo, Colonia Las Mercedes, La Ceiba, Atlántida, Código 107408	Finalizado	Atlántida	La Ceiba	L. 2,952,664.72	L. 43,018.99	L. 2,995,683.71
13	CDA	UMEP-7 Reparación y Ampliación CDA Arenales 107587	Finalizado	Cortés	San Pedro Sula	L. 950,564.43	L. 28,288.31	L. 978,852.74
14	CDA	Mejoras Centro de Alcance (CDA) Estados Unidos 107348	Finalizado	Francisco Morazán	MDC	L. 151,624.98	L. 0.00	L. 151,624.98
15	CDA	Construcción Posta Policial Bonitillo "Secretaria de Seguridad"	Finalizado	Atlántida	La Ceiba	L. 3,438,128.02	L. 0.00	L. 3,438,128.02
16	CDA	Ampliación Centro de Alcance, Colonia Las Mercedes, La Ceiba, Atlántida 107378	Finalizado	Atlántida	La Ceiba	L. 1,797,437.80	L. 42,880.87	L. 1,840,318.67
17	CDE	Ampliación CEB Dr. Alfonso Lacayo, Colonia Alfonso Lacayo, Sector Rivera Hernandez, 107404	Finalizado	Cortés	San Pedro Sula	L. 6,000,000.00	L. 0.00	L. 6,000,000.00
18	CDA	Ruta Segura a Centro de Alcance Col. Nueva Suyapa 107377	Finalizado	Francisco Morazán	MDC	L. 3,588,557.09	L. 80,265.23	L. 3,668,822.32
19	CDE	Construcción de Obras de Confianza CEB Marco Aurelio Soto, Tornabe Tela, Atlántida. 107661	Cierre financiero	Atlántida	Tela	L. 274,354.04	L. 10,005.63	L. 284,359.67
20	CDE	Reparación modulo Sanitario CEB Antonio Jose Coello Bo. San Jose Tela, Atlántida 107675	Cierre financiero	Atlántida	Tela	L. 377,467.49	L. 25,254.72	L. 402,722.21
21	CONTRATO No. 63624	Reparación De CEIN Y Ampliación De Maie Sutrasfco, La Ceiba, Atlántida. Código 107222	Finalizado	Atlántida	La Ceiba	L. 2,087,122.30	L. 0.00	L. 2,087,122.30
22	CDE	Rep. Instituto Triunfo de la Cruz Fase II. 107561	Cierre financiero	Atlántida	Tela	L. 3,222,347.53	L. 0.00	L. 3,222,347.53

23	CDA	Construcción Techo A Cancha Multiusos, Colonia Japón, Choloma, Cortes, Código 107537	Finalizado	Cortés	Choloma	L. 1,097,954.75	L. 0.00	L. 1,097,954.75
24	CDE	Reparación CEB Claudio Barrera, Colonia San Judas, La Ceiba, Atlántida, Código 107482	Finalizado	Atlántida	La Ceiba	L. 5,324,202.09	L. 0.00	L. 5,324,202.09
25	CDE	Proy. Obra de Confianza CEB Tte. Alex Edgardo Alanis, Col. Calpules. 107718	Finalizado	Cortés	San Pedro Sula	L. 479,983.48	L. 16,208.60	L. 496,192.08
26	CDA	UMEP-1 Iluminación Calle Principal Colonia Izaguirre 107639	Finalizado	Francisco Morazán	MDC	L. 199,014.65	L. 28,326.70	L. 227,341.35
27	CDE	Reparación y obras complementarias Escuela Ramón Montoya. 107572	Finalizado	Atlántida	La Ceiba	L. 4,844,426.98	L. 0.00	L. 4,844,426.98
28	CDA	Construcción de Centro de Alcance Corozal, Colonia David, Comunidad Corozal, La Ceiba, Atlántida 107503	Finalizado	Atlántida	La Ceiba	L. 1,979,330.62	L. 43,950.72	L. 2,023,281.34
29	CDA	Ampliación Espacio Físico Municipal, Barrio El Centro, La Ceiba, Atlántida, Código 107540	Finalizado	Atlántida	La Ceiba	L. 1,187,894.29	L. 0.00	L. 1,187,894.29
30	CDA	Construcción Estacionamiento CEIN-MAIE 108060	Cierre financiero	Atlántida	La Ceiba	L. 250,302.00	L. 37,545.30	L. 287,847.30
31	CDA	UDEP La Ceiba Construcción Centro de Alcance Barrio La Isla 107616	Finalizado	Atlántida	La Ceiba	L. 613,366.10	L. 0.00	L. 613,366.10
<b>TOTAL</b>						<b>69,722,183.51</b>	<b>831,132.02</b>	<b>69,408,926.14</b>

### **Proyectos de Inversión Cartera COVID-19**

N.	Tipo	Descripción	Estatus	Departamento	Municipio	Total		
						USAID	NAC	Costo Total
		<b>Proyectos de Inversión Cartera COVID-19</b>						
1	COVID	Mejoras Y Acondicionamiento Del Laboratorio De Virología Regional De Cortés (Región 5), San Pedro Sula, Departamento De Cortes”, Código 107888	Ejecución	Francisco Morazán	MDC	L. 2,076,882.04	L. 117,418.67	L. 2,194,300.71
2	COVID	Construcción De Laboratorio Regional Atlántida De Virología”, Ubicado En El Municipio De La Ceiba, Departamento De Atlántida”, Código 107902	Finalizado	Francisco Morazán	MDC	L. 3,733,514.14	L. 462,878.32	L. 4,196,392.46
3	COVID	Construcción De Clínicas Y Área De Descanso En Hospital Regional Atlántida”, Ubicado En El Municipio De La Ceiba, Departamento De Atlántida”, Código 107900,	Finalizado	Cortés	Choloma	L. 5,893,287.52	L. 355,284.71	L. 6,248,572.23
4	COVID	Const. de bodega de insumos Regional No.5 y obra complementaria 107977	Ejecución	Cortés	San Pedro Sula	L. 3,884.24	L. 582.64	L. 4,466.88
<b>TOTAL</b>						<b>L. 11,707,567.94</b>	<b>L. 936,164.34</b>	<b>12,643,732.28</b>

Los proyectos que se encuentran en ejecución actualmente son doce los cuales se presentan a continuación:

Código	Tipo	Nombre de proyecto	Municipio	Estatus	% Avance Físico	Presupuesto	Avance financiero según
108118	ESCUELA	Reparación y obras complementarias Escuela Ramón Montoya fase II. Barrio La Isla	La Ceiba	Ejecución	5%	L2000,000.00	L. 100,000.00
108233	ESCUELA	Reparación CEB José Valentín Vásquez, Colonia el Confite	La Ceiba	Ejecución	95%	L4000,000.00	L. 3800,000.00
108117	PREVENCIÓN	Construcción de obras complementarias colonia Las Mercedes	La Ceiba	Ejecución	75%	L400,000.00	L. 300,000.00
108116	ESCUELA	Reparación CEB Claudio Barrera fase II, Colonia San Judas	La Ceiba	Ejecución	90%	L2900,000.00	L. 2610,000.00
107864	ESCUELA	Reparación Instituto Triunfo de la Cruz, Colonia San Alejo Fase III	Tela	Ejecución	3%	L1480,000.00	L. 44,400.00
108586	ESCUELA	Ampliación de Instituto Polivalente, Colonia Las Brisas Fase III	SPS	Ejecución	90%	L1000,000.00	L. 900,000.00
108119	CDA	Construcción de Centro de Alcance Barrio la Isla Fase II	La Ceiba	Ejecución	90%	L400,000.00	L. 360,000.00
107779	CDA	UMEP-1 Techado e Iluminación de Cancha CDA Estados Unidos (Obra de Confianza)	Tegucigalpa	Ejecución	0%	L750,000.00	L. -
107977	COVID-19	Construcción de bodega de insumos de la regional de salud # 5 y obras adicionales	SPS	Ejecución	100%	L1000,000.00	L. 1000,000.00
108278	COVID-19	Reparación Almacén Nacional de Biológicos Teg, M.D.C. - San Felipe M.D.C.	Tegucigalpa	Ejecución	60%	L2700,000.00	L. 1620,000.00
N/A	PREVENCIÓN	Suministro e instalación de juegos infantiles, área recreativa en Cerro Juana Lainez	Tegucigalpa	Ejecución	0%	L1500,000.00	L. -
108209	CDA	Reparación CDA Divanna, Colonia Divanna, D.C. Francisco Morazán	Tegucigalpa	Ejecución	25%	L900,000.00	L. 225,000.00

#### v. PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN DEL III TRIMESTRE 2021

- Se ha mantenido el estado de emergencia decretado por el Gobierno de la República de Honduras por la Pandemia de COVID-19, lo cual genera atrasos por las restricciones dadas por algunos municipios donde tiene injerencia PIOH e ICS.
- Los proyectos ETA & IOTA, se encuentran en proceso de licitación y adjudicación, a esperas de un dictamen técnico de COPECO.
- Los proyectos han presentado suspensiones por trámites internos referentes a desembolsos, ampliaciones de tiempo.

#### Acciones realizadas por la DIM:

- La DIM/FHIS, gestionó una visita a los proyectos con COPECO a las zonas afectadas por ETA & IOTA, para determinar su viabilidad en su ejecución teniendo en cuenta su ubicación.
- USAID Honduras, ha sostenido reuniones con DIM/FHIS para buscar alternativas que apoyen en la ejecución de los proyectos, es por ello que se ha realizado el fortalecimiento del equipo con personal que brinde seguimiento a aspectos estratégicos.



✓ **Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)**

**i. Antecedente**

Las pobres condiciones sociales y económicas son especialmente pronunciadas en el occidente de Honduras, extrema pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático, bajos niveles educativos, migración, falta de acceso a los servicios básicos y otros retos socioeconómicos son endémicos. La provisión de servicios básicos de educación y nutrición son escasos en la zona de occidente y es difícil el acceso a los ya existentes, así mismo la gestión de servicios de educación, nutrición y agua y saneamiento son deficientes por lo que los ciudadanos cuentan además con pocos espacios de participación para mejorar sus vidas a nivel de hogar y sus vidas productivas, lo que genera una gran brecha de pobreza.

En este sentido se busca a través de proyectos de infraestructura de pequeña escala, la generación de accesos para la comunidad a espacios de participación que sirvan como plataforma para impulsar el desarrollo sostenible de la región, logrando satisfacer necesidades no satisfechas de algunos de los servicios básicos para generar un efecto multiplicador en la zona occidental del país.

Actualmente, la **AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID)** en apoyo al Gobierno de Honduras, ha asignado fondos de donación para la ejecución de proyectos de infraestructura a través de la **SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO, FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (SEDECOAS/FHIS)**, que vengán a mejorar las condiciones en las comunidades seleccionadas en el occidente de Honduras.

En base a lo anterior, surge la Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras, mediante la cual se ha considerado proveer esfuerzos de infraestructura a pequeña escala para mejorar la entrega de servicios a la población, mejorando condiciones de pobreza, vulnerabilidad al cambio climático, bajos niveles educativos e inseguridad alimentaria debido a la falta de acceso a servicios básicos. A su vez con esto se pretende crear una plataforma de participación ciudadana para cimentar las bases de una estructura comunitaria más efectiva, jugando un rol importante en la mejora de la entrega de servicios locales en el Occidente de Honduras. - El área de intervención será enfocada en las zonas de mayor pobreza, específicamente está orientada a seis departamentos del Occidente de Honduras.

Se ha planteado como meta beneficiar comunidades ubicadas en los seis departamentos de la zona de occidente de Honduras, su mayoría de la zona rural, habitantes en comunidades que presentan condiciones de pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático, bajos niveles educativos, migración y falta de acceso a servicios público.

La administración y ejecución de la Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH), financiado con fondos USAID, estará a cargo del SEDECOAS/FHIS, a través de la Dirección de Infraestructura Mayor (DIM).

## ii. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en los departamentos de Ocotepeque, la Paz, Copan, Intibucá, Santa Bárbara y Lempira y zonas occidentales específicas de intervención identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

## iii. Monto del Convenio

El monto total de la Actividad es de \$ 3,750,000.00 (USAID \$ 3,000,000.00, Gobierno de Honduras \$ 750,000.00).

## iv. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2019	6.190.650,00	5.981.569,54	97%
2020	65.583.096,00	13.336.794,49	20%
2021	59.299.860,00	28.282.816,86	48%

## v. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2021	Mto. Ejecutado 2021	Empleos Generados 2021	Beneficiarios Directos 2021
EDUCACION	4	24.464.856,86	65	507
HOSPITALES	5	-	204	1.186.260
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>24.464.856,86</b>	<b>269</b>	<b>1.186.767</b>

vi. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2021	Mto. Ejecutado 2021	Empleos Generados 2021	Beneficiarios directos 2021
COPAN	1	2.042.587,86	30	411.445
CORTES	1	1.158.334,00	29	8
FRANCISCO MORAZAN	1	1.685.358,00	30	660
INTIBUCÁ	2	6.667.502,00	50	268.248
LA PAZ	1	2.867.065,00	20	79
LEMPIRA	0	2.547.914,00	50	50.285
OCOTEPEQUE	2	2.971.898,00	25	151
SANTA BARBARA	1	4.524.198,00	35	455.891
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>24.464.856,86</b>	<b>269</b>	<b>1.186.767</b>

vii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	3.125.638,00
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	692.322,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.817.960,00</b>

viii. Principales Logros (julio-septiembre 2021)

**PROYECTOS FINALIZADOS**

A la fecha se han finalizado tres proyectos realizados bajo la Metodología PEC y cinco proyectos de emergencia para brindar respuesta ante la pandemia COVID-19.

A continuación se presentan los proyectos PEC en ejecución:

A. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Aldea	Monto según Contrato	Tipo proyecto	Estatus
Ampliación Centro de Educación Básica Álvaro Contreras	Ocotepeque	Sensenti	Azacualpa	4,494,819.97	PEC	Finalizado
Ampliación Centro de Educación Básica Francisco Morazán	Intibucá	Yamaranguila	Planes	4,748,951.39	PEC	Finalizado
Reposición Escuela Unión Y Fe	La Paz	San José	Cerro Bueno	3,618,292.58	PEC	Finalizado
Ampliación CEB Tiburcio Carías Andino	Intibucá	Otoro	Jesús de Otoro	4953438.1	PEC	Finalizado
Construcción de Cisternas y Cambio de Techo Sala de Operaciones y Neumología Instituto Nacional Cardiopulmonar Tórax	Francisco Morazán	M.D.C.	Tegucigalpa	1,787,515.91	COVID-19	Finalizado
Construcción Clínicas y Área de Descanso para Médicos del Hospital Santa Bárbara Integrado (HSBI)	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Santa Bárbara	5,117,997.40	COVID-19	Finalizado
Construcción de Área de Descanso para Médicos en el Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela (HLMV)	Cortés	San Pedro Sula	San Pedro Sula	1,281,688.19	COVID-19	Finalizado
Construcción de Laboratorio de Virología en la Regional de Salud No.4	Copán	Santa Rosa de Copán	Barrio El Calvario	3,877,531.86	COVID-19	Finalizado
Rehabilitación y Ampliación Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato	Intibucá	La Esperanza	La Esperanza	5,381,051.93	COVID-19	Finalizado

A continuación se presentan los proyectos PEC y con Contratista que se encuentran en ejecución durante ese periodo:

INVERSIÓN PILOTO DE INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE DE HONDURAS – PIOH							
ítem	Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Aldea	Monto total de contrato	% Avance físico	Estatus
1	Reposición Escuela Nueva Generación Sur	La Paz	Santa Ana	La Estancia	2,500,000.00	92%	Ejecución
2	Ampliación Escuela Eusebio Amaya Gómez	Lempira	Belén	La Puerta	4,630,980.59	72%	Ejecución
3	Ampliación CEB Prudencio Arita	Ocotepeque	La Labor	Llano Largo	4,836,883.17	80%	Ejecución
4	Construcción Clínicas del Hospital Juan Manuel Gálvez	Lempira	Gracias	Gracias	4,700,000.00	18%	Ejecución
5	Ampliación Escuela José Cecilio Del Valle	Copán	San Pedro	Yaunera	2,100,000.00	10%	Ejecución

#### ix. Problemática en la ejecución del III trimestre 2021

- Se ha mantenido el estado de emergencia decretado por el Gobierno de la Republica de Honduras por la Pandemia de COVID-19, lo cual genera atrasos por las restricciones dadas por algunos municipios donde tiene injerencia PIOH e ICS.
- Se encuentra en proceso de firma la carta de ejecución de PIOH por parte de SEFIN, misma que ya ha sido firmada por SEDECOAS & USAID Honduras.
- Los proyectos han presentado suspensiones por trámites internos referentes a desembolsos, ampliaciones de tiempo.

#### Acciones realizadas por la DIM:

- Se están coordinando acciones de forma cercana con SEFIN & SEDECOAS, para la firma de la carta, es por ello que se envió el informe de justificación de ampliación solicitado por SEFIN.
- USAID Honduras, ha sostenido reuniones con DIM/FHIS para buscar alternativas que apoyen en la ejecución de los proyectos, es por ello que se ha realizado el fortalecimiento del equipo con personal que brinde seguimiento a aspectos estratégicos.
- Considerando los plazos de vencimiento de las cartas de ICS & PIOH, se está trabajando el nuevo plan de Trabajo y Carta de Ejecución con acompañamiento de USAID, para enviar a aprobación y firma, procurando que esto no vaya a generar atrasos en los próximos trimestres.

## **PROGRAMA 15: RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA NACIONAL**

### ✓ **Respuesta a Emergencia Generados por los Huracanes Eta e Iota**

#### **i. Objetivo General**

Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción del mismo y manejo de desastre, como una estrategia para mejorar la eficiencia en la preparación para la respuesta y la recuperación post desastre naturales.

Atención de la infraestructura dañada por el Huracán y Tormenta Tropical ETA: rehabilitación de pasos y caminos terciarios, reparación y construcción de cajas puentes rehabilitación y construcción de sistemas de drenaje, puentes (Bailey), construcción de calles terciarias, obras de mitigación entre otras.

#### **ii. Focalización**

El Programa realizar intervenciones en los 5 Departamentos Occidente afectados por las tormentas tropicales: Ocotepeque, Copan, Santa Bárbara, Lempira e Intibucá.

#### **iii. Avance Financiero**

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2020	45.000.000,00	45.000.000,00	100%
2021	72.850.055,00	24.379.061,26	33%

#### **iv. Avance por Sector**

SECTOR	Proyectos Finalizados 2021	Mto. Ejecutado 2021
INFRAESTRUCTURA VIAL	15	24.379.061,26
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>24.379.061,26</b>

v. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2021	Mto. Ejecutado 2021
COPAN	1	1.853.398,42
INTIBUCÁ	5	8.276.198,00
LEMPIRA	1	1.853.398,42
OCOTEPEQUE	1	1.853.398,42
SANTA BARBARA	7	10.542.668,00
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>24.379.061,26</b>

vi. Situación Actual

ASIGNACION DE FUENTE CONVENIO FHIS 2021 RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA NACIONAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO	CODIGO DE PROYECTO	Nombre Proyecto	Nombre Contratista	Departamento	Municipio	Aldea	Año de Aprobacion	Año de Contratacion	Fecha de Contrato	TOTAL APROBADO	Monto Ejecutado	Monto por Ejecutar
INVERSION	70313	108362	CONSTRUCCION DE PUENTE	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. DE R. L. DE C. V. (SERICON)	INTIBUCA	SAN FRANCISCO DE OPALACA	Ojos de Agua	2021	2021	02/06/2021	L. 10.353.946,34	L. 1.478.091,95	L. 8.875.854,39
INVERSION	70188	108222	CONSTRUCCION CAJA PUENTE	MARCO ANTONIO COELLO FLAMENCO	INTIBUCA	SAN MIGUELITO	El Naranjo	2021	2021	21/05/2021	L. 2.791.319,08	L. 390.370,58	L. 2.400.948,50
INVERSION	70323	108107	CONSTRUCCION MURAO DE CONCRETO CICLOPERO Y MURO DE GAVIONES	CORPORACION SOL, S.A. DE C.V.	LEMPIRA	GRACIAS	El Rion	2021	2021	18/03/2021	L. 5.786.387,91	L. 5.366.374,97	L. 420.012,94
INVERSION	70362	108419	LINIEZA Y REHABILITACION DE CALLE	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO S. DE R. L. DE C.V.	INTIBUCA	LA ESPERANZA	La Rinconada	2021	2021	17/05/2021	L. 2.203.777,48	L. 1.776.754,92	L. 427.022,56
INVERSION	70340	108434	REHABILITACION DE CAMINO	OBRAS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIAS ALVAREZ S. DE R. L. DE C.V. (OCCA)	SANTA BARBARA	QUIMISTAN	La Celbita	2021	2021	24/08/2021	L. 153.912,00	L. 76.956,00	L. 76.956,00
INVERSION	70341	108435	REHABILITACION DE CAMINO	OBRAS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIAS ALVAREZ S. DE R. L. DE C.V. (OCCA)	SANTA BARBARA	QUIMISTAN	La Celbita	2021	2021	24/08/2021	L. 205.216,00	L. 102.608,00	L. 102.608,00
INVERSION	70342	108436	REHABILITACION DE CAMINO	OBRAS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIAS ALVAREZ S. DE R. L. DE C.V. (OCCA)	SANTA BARBARA	QUIMISTAN	La Celbita	2021	2021	24/08/2021	L. 153.912,00	L. 76.956,00	L. 76.956,00
INVERSION	70347	108437	REHABILITACION DE CAMINO	OBRAS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIAS ALVAREZ S. DE R. L. DE C.V. (OCCA)	SANTA BARBARA	QUIMISTAN	Los Limones	2021	2021	24/08/2021	L. 89.782,00	L. 44.891,00	L. 44.891,00
INVERSION	70343	108438	REHABILITACION DE CAMINO	OBRAS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIAS ALVAREZ S. DE R. L. DE C.V. (OCCA)	SANTA BARBARA	QUIMISTAN	Quimistan	2021	2021	24/08/2021	L. 218.042,00	L. 109.021,00	L. 109.021,00
INVERSION	70346	108439	REHABILITACION DE CAMINO	OBRAS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIAS ALVAREZ S. DE R. L. DE C.V. (OCCA)	SANTA BARBARA	QUIMISTAN	Piñuelas	2021	2021	24/08/2021	L. 89.782,00	L. 44.891,00	L. 44.891,00
INVERSION	70345	108440	REHABILITACION DE CAMINO	OBRAS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIAS ALVAREZ S. DE R. L. DE C.V. (OCCA)	SANTA BARBARA	QUIMISTAN	Callejones	2021	2021	24/08/2021	L. 218.042,00	L. 109.021,00	L. 109.021,00
INVERSION	70303	108360	REHABILITACION DE CAMINO	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO S. DE R. L. DE C.V.	INTIBUCA	YAMARANGUILA	La Colonia	2021	2021	17/05/2021	L. 314.807,24	L. 314.807,24	L. -
INVERSION	70382	108456	REHABILITACION DE CAMINO	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO S. DE R. L. DE C.V.	INTIBUCA	SAN MARCOS DE LA SIERRA	Las Delicias	2021	2021	17/05/2021	L. 489.700,43	L. 489.700,43	L. -
INVERSION	70425	108525	CONSTRUCCION MURO DE RETENCION CON CONCRETO CICLOPERO	CONSTRUCCION E INVERSIONES ARIES S. DE R. L. ARIES	COPAN	SANTA RITA	Santa Rita	2021	2021	20/05/2021	L. 1.822.810,71	L. 1.604.304,82	L. 218.505,89
INVERSION	70510	108633	CONSTRUCCION DE PUENTE RIO MARCHALA	R & M Y ASOCIADOS S DE R. L. DE C. V.	OCOTEPEQUE	OCOTEPEQUE	Ocotepaque	2021	2021	11/08/2021	L. 24.006.179,80	L. 6.961.792,14	L. 17.044.387,66
<b>Total</b>	<b>15</b>										<b>L. 48.897.616,99</b>	<b>L. 18.946.541,05</b>	<b>L. 29.951.075,94</b>

## vii. Problemática

En relación a la parte de inversión del presupuesto asignado para la reconstrucción de la infraestructura nacional:

- La ejecución se dio en el tercer trimestre de acuerdo a la contratación de los proyectos, que a la fecha la mayoría se encuentran en fase de autorización y otros en fase de adjudicación y contratación.
- También con la limitante para efectuar la ejecución de los proyectos por la congelación de presupuesto vigente por la Secretaria de Finanzas.
