

Tegucigalpa, M.D.C.,
21 de octubre de 2022

SAG-1512-2022

Comisionada
Ivonne Lizeth Ardón
Instituto de Acceso a la Información Pública
Tegucigalpa, M.D.C.
Su Oficina

Estimada Comisionada:

Me complace saludarle y desearle éxitos en sus importantes funciones.

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al **III Trimestre (30 de septiembre)** del Año 2022.

No obstante, la persona responsable de subir la información al portal de transparencia de SAG no se encuentra en la Institución, razón por la que estamos presentando a usted el Informe en formato digital y en físico, y muy respetuosamente solicitamos su apoyo para subir la información a dicho portal.

Aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi alta consideración y estima.

Atentamente.

Ing. José Ángel Acosta Zavala
Secretario de Estado por Ley
Acuerdo de Delegación No. SAG 253-2022



Cc: Dra. Laura Suazo, Secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería
Cc: Ing. Olman Valeriano, Seguimiento, Monitoreo y Evaluación UPEG.
Cc: Lic. Lessy Guifarro, Técnico de Planificación
Cc: Ing. Jonathan Canales, Técnico de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación

Informe del Estatus de Cartera de Proyectos Ejecutados



Índice

1	PRESENTACIÓN	3
2	GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	4
3	RESUMEN EJECUTIVO	5
4	PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA	7
4.1	Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	7
	Objetivo	7
	Descripción del proyecto	7
	Principales actividades realizadas en el mes de septiembre	10
	Problemática que afectó la ejecución en el mes de septiembre:	10
4.2	Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego del Valle de Jamastrán	10
	Objetivo	10
	Descripción del proyecto	10
	Principales actividades realizadas en el mes de Septiembre:	12
	Problemática que afectó la ejecución en el mes de Septiembre:	12
4.3	Proyecto para la Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental (PROLENCA)	12
	Objetivo	12
	Descripción del proyecto	12
	Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de Septiembre:	14
	Problemática que afectó la ejecución en el mes de septiembre:	15
4.4	Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE)	15
	Objetivo	15
	Descripción del proyecto	15
	Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de septiembre:	17
	Problemática que afectó la ejecución en el mes de septiembre:	17
5	CONCLUSIONES	18
6	RECOMENDACIONES	18

1 Presentación

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al 30 de septiembre del Año 2022.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2022, Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026 y las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este informe tiene como propósito suministrar información oportuna, que facilite la toma de decisiones por parte de autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, además de mostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los Proyectos.


Lic. Edith Consuelo Larjos Sierra
Asesora Ministerial UPEG-SAG



2 Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 del 17 de diciembre de 1996 de conformidad a lo establecido en la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA).

El objetivo general de la SAG es la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas relacionadas con la producción, conservación y comercialización de alimentos.

Impulsa procesos que permiten agregar valor para contribuir a la reducción de la pobreza y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, respondiendo a una economía globalizada y a las necesidades del mercado interno integrado en un esquema de desarrollo humano, social, ambiental y productivo basado en la autogestión, la participación comunitaria con enfoque de género y manejo sostenible de los recursos.

Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados estratégicos y lineamientos de política, se basan en la promoción de un modelo económico alternativo orientado a fortalecer el rol del Estado en la economía, especialmente en las áreas estratégicas y servicios públicos, y formulación y ejecución de políticas públicas dirigidas a fortalecer los diferentes tipos de empresas y de propiedad: Estatal, Mercantil/Privada y Social, como las cooperativas, cajas rurales, y los emprendimientos solidarios. En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel:

- a) Ejercer acciones como coordinadora del sector público agroalimentario;
- b) Atender las funciones institucionales específicas; y,
- c) Representar al sector agroalimentario nacional a escala regional e internacional.

La SAG perteneciente al Gabinete Económico, para el presente año contempla 4 proyectos que se detallan en el presente documento.

3 Resumen Ejecutivo

Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 4 proyectos:


- a) Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)
- b) Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN)
- c) Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Suroccidental de Honduras (PROLENCA).
- d) Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE).

Estos proyectos son financiados con fondos Nacionales, fondos del BCIE, FIDA, OFID y Exim Bank, de la India, mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores. En su conjunto los Proyectos de inversión cuentan con un presupuesto vigente de **L 632,826,233.00** representando un **30.10%** del presupuesto total de la institución **L 2,102,573,096.00**. Los Proyectos de inversión reflejan una ejecución al 30 de septiembre 2022 de **L 9, 463,688.42**

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos (En Lempiras)			
FUENTE	Proyectos de Inversión Pública		
	Presupuesto Vigente	Ejecución Septiembre	Ejecución acumulada al 30 de septiembre
Fuente 11: Fondos Nacionales	34,974,001.00	303,650.41	1,038,507.30
Fuente 21: Crédito Externo	585,852,232.00	9,160,038.01	160,595,819.63
BCIE	216,604,399.00	7,258,415.81	109,306,350.12
OFID	60,797,831.00	-	-
FIDA	118,949,002.00	1,901,622.20	51,289,469.51
INDIA	189,501,000.00	-	-
Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)	12,000,000.00	-	-
	632,826,233.00	9,463,688.42	161,634,326.93

Fuente: SIAFI

Presupuesto Vigente vrs Presupuesto Mensual y
Acumulado al 30 de Septiembre de 2022

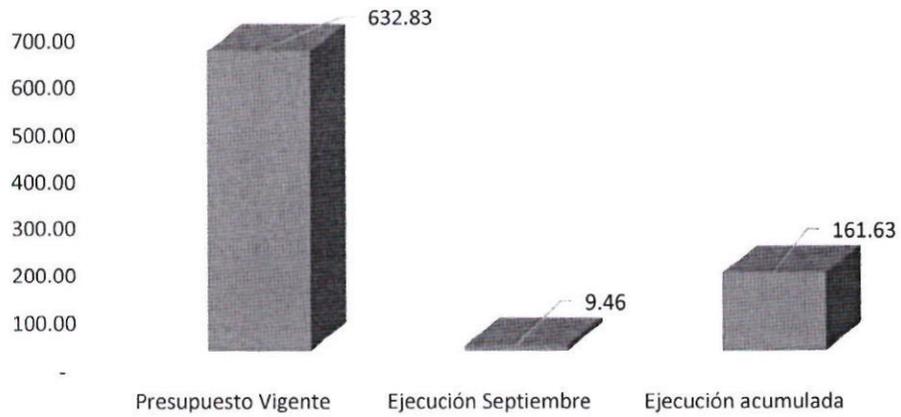

4 Programa de Inversión Pública

4.1 Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Objetivo

El PDABR tiene como principal objetivo mejorar el nivel de vida de las familias beneficiarias mediante el incremento de los ingresos, generación de empleo y seguridad alimentaria, fomentando el desarrollo agrícola bajo riego, con enfoque de inclusión social y equidad de género.

Descripción del proyecto

El Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) ejecutará cinco subproyectos que se detallan a continuación:

1. Construcción y rehabilitación del Sistema de Riego de San Sebastián.
2. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Selguapa.
3. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Olomán.
4. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Sulaco.
5. Diseño y construcción de Pequeño Riego.

El programa beneficiará a 3,371 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 8,476 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.1,118,047,750.00. El Proyecto inició el 30/11/2013 y su fecha de finalización es el 30/11/2019. Es relevante destacar que se le ha autorizado a dicho Proyecto una ampliación por 24 meses adicionales (29/11/2021), mediante la Resolución N°. PRE-99/2019 por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) del plazo para el retiro de la totalidad de los fondos del préstamo N° 2101 otorgado a la Republica de Honduras para financiar la ejecución del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), mediante Resolución N°. DI-89/2012. Es oportuno mencionar que nuevamente se ha dado una nueva ampliación a la ejecución del Proyecto mediante Resolución de Directorio No. DI-160/2021, del 18 de noviembre de 2021, el Directorio del BCIE autorizó ampliar hasta el 29 de noviembre del 2023 el plazo para el retiro de la totalidad de los fondos del préstamo No. 2101, autorizado a la República de Honduras para financiar el Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR).

Localización: La zona de intervención del Proyecto es en los departamentos de Comayagua y Yoro.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mes de septiembre, 2022:

Secretaría de Agricultura y Ganadería
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR (En Lempiras)							
FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Septiembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	27,262,801.00	27,262,801.00	303,650.41	1.11	1,038,507.30	3.81	26,224,293.70
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	216,604,399.00	216,604,399.00	7,258,415.81	3.35	109,306,350.12	50.46	107,295,861.38
Total	243,867,200.00	243,867,200.00	7,562,066.22	3.10	110,344,857.42	45.25	133,520,155.08

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2022 PDABR								
Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada		
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego, en parcelas de los productores / as.	Hectárea	0	0	0	1,300	0	0
	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en parcelas de productores / as.	Hectárea	50	0	0	110	0	0
	Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas en parcelas de los productores / as.	Hectárea	0	0	0	2,755	2755	100
	Sistemas de riego instalados en parcelas de tierra agrícolas de los Productores/as.	Sistema de Riego	50	0	0	110	0	0
	Represas construidas para los sistemas de riego instalados, en tierras agrícolas de los productores /as.	Obra de Infraestructura	0	0	0	2	1	0
	Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales en parcelas de tierra agrícola de los productores/as.	Hectárea	20	0	0	130	0	0
	Grupos empresariales de productores/as organizados, de acuerdo a la producción agrícola.	Grupo	0	0	0	5	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual	
							14	

Secretaría de Agricultura y Ganadería
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada			
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%	
Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de Riego	Líneas de tubería instaladas (conducción, distribución y terciarias)	Kilómetro	0	0	0	13	3.89	30	
Asistencia Técnica y Comercialización	Capacitaciones impartidas en diversificación agrícola (administración financiera, organización, canon de agua, desarrollo agroempresarial). Aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	2	0	0	16	0	0	
	Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	2	0	0	20	0	0	
Organización y Desarrollo Local	Capacitaciones brindadas a Productores y productoras de asociaciones de regantes (Organización, administración, producción, asistencia técnica y normas parlamentarias), aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	0	0	0	2	0	0	
Gestión Ambiental	Capacitación impartidas en prácticas amigables con el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas. Aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	0	0	0	50	49	98	
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual		26

Fuente: SIAFI

Principales actividades realizadas en el mes de septiembre

- a) Entre otras actividades, durante el mes de septiembre se firmó la adenda 1 para la ampliación de tiempo del contrato para la elaboración de Planes de Ordenación Y Manejo de Recursos Naturales de Subcuencas de los Proyectos del PDABR. Se ha trabajado arduamente en la gestión de constancias de respaldo municipal y las constancias de "Consulta Previa Libre e Informada" con los Consejos Directivos de Tribu (CDT), para los planes de Olomán, Cuyamapa y Tascalapa en Yoro y para Jupua y Selguapa en Comayagua. Actualmente, todos los planes están en revisión en las Regiones Forestales Yoro y Comayagua respectivamente.
- b) Este mes de septiembre de 2022 se ha avanzado mucho en camino hacia aprobación de los Planes de Ordenación y Manejo de Recursos Naturales de las Subcuencas de los Proyectos del PDABR, con la gestión de las constancias municipales de respaldo que han otorgado varias municipalidades residentes en las subcuencas objeto de manejo del PDABR.

Problemática que afectó la ejecución en el mes de septiembre:

- a) El atraso en la firma de las adendas en el Proyecto de San Sebastián.

4.2 Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego del Valle de Jamastrán

Objetivo

Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.

Descripción del proyecto

Cada módulo tendrá una obra de derivación, un estanque construido de acuerdo con las condiciones topográficas, una estación de bombeo, las líneas de conducción y distribución hasta las cabeceras de las parcelas, los mecanismos de control, filtrado y regulación. El programa beneficiará a 1,259 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 2,276 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.609,235,000.00.

El Proyecto inició 01/12/2016 y su fecha de finalización es 28/08/2022.

Localización: La zona de intervención del Proyecto es el departamento de El Paraíso, Municipio de Danlí, Valle de Jamastrán.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mes de Septiembre:

Secretaría de Agricultura y Ganadería
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos JAMASTRAN (En Lempiras)							
FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Septiembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Septiembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (India)	189,501,000.00	189,501,000.00	-	0.00	-	0.00	189,501,000.00
TOTAL	189,501,000.00	189,501,000.00	-	0.00	-	0.00	189,501,000.00

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2022 JAMASTRÁN									
Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada			
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%	
Proyecto Desarrollo Agrícola bajo Riego Valle de Jamastrán Fase I	Estaciones de Bombeo y Equipamiento instalado en los módulos de riego, en las parcelas agrícolas de los productores /as integrados en la asociación de regantes del Valle de Jamastran .	Estación	20	0	0	60	0	0	
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual		0
Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada			
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%	
Infraestructura de Riego	Proceso de construcción de los módulos de riego.	Porcentaje	33	0	0	100	0	0	
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales actividades realizadas en el mes de Septiembre:

- No se cuenta con ninguna actividad relevante para este mes de septiembre.

Problemática que afectó la ejecución en el mes de Septiembre:

- A pesar de solucionada la fecha en el sistema SIGADE, no se pudo realizar el desembolso respectivo.
- Se han comenzado con las perforaciones de pozo, sin embargo, aún no se tiene el reporte del caudal.

4.3 Proyecto para la Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental (PROLENCA)

Objetivo

Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad agroalimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género y con miras a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.

Descripción del proyecto

El grupo objetivo del Proyecto incluye: (a) pequeños productores agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados; (b) artesanos rurales con organización incipiente y débilmente vinculadas a los mercados; y (c) micro-empresarios rurales y comerciantes de pequeña escala.

La población considerada como beneficiarios directos del Proyecto, la conformarán 11,000 familias rurales pobres localizadas en 36 municipios de los departamentos de Lempira, La Paz e Intibucá, que además incluye las 826 familias rurales de los 11 municipios de los departamentos de Atlántida, Cortés y Santa Bárbara, correspondientes a Horizontes del Norte (estimándose la totalidad de beneficiarios en 33,000 familias/264,000 personas) que están asociados a organizaciones rurales legalmente constituidas.

El Proyecto tiene un costo total de L.574,086,000. El Proyecto inició 15/04/2016 y su fecha de finalización es 30/09/2022.

Localización: La zona de intervención del proyecto se localiza en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira. Adicionalmente se incluyen 11 municipios para acciones concretas dejadas por el Proyecto Horizontes del Norte: Atlántida, Cortés y Santa Bárbara.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mes de Septiembre:

Secretaría de Agricultura y Ganadería
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROLENCA (En Lempiras)							
FUENTE	Ejecucion Presupuestaria al 30 de Septiembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Septiembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	118,949,002.00	118,949,002.00	1,901,622.20	1.60	51,289,469.51	43.12	67,659,532.49
Total	118,949,002.00	118,949,002.00	1,901,622.20	1.60	51,289,469.51	43.12	67,659,532.49
Fuente: SIAFI							

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2022 PROLENCA								
Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada		
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%
Programa de Competitividad Rural	Planes de inversión implementándose por organizaciones beneficiarias	Plan de Inversión	10	0	0	65	42	65
	Desembolsos realizados a las Organizaciones Beneficiadas (OB) con planes de inversión aprobados.	Cantidad	10	0	0	65	50	77
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual	
								71

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada		
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales	Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos financiadores.	Plan de Inversión	0	0	0	65	44	68
	Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas.	Plan	0	0	0	65	0	0

Secretaría de Agricultura y Ganadería
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada		
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%
Desarrollo Productivo y de Negocios	Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.	Convenio	0	0	0	25	25	100
	Asistencia técnica a Productores(as) rurales de las organizaciones beneficiarias, aplicando medidas de bioseguridad.	Asistencia técnica	0	0	0	65	0	0
Desarrollo Productivo y de Negocios FIDA II	Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión. FIDA II	Convenio	10	0	0	40	26	65
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social FIDA II	Rehabilitación de líneas de conducción tuberías para sistemas de riego instalado en parcelas de tierra agrícola	Kilómetro	0	0	0	1	0	0
	Rehabilitación de líneas de conducción tuberías para sistemas de riego instalado en parcelas de tierra agrícola (FIDA II)	Kilómetro	0	0	0	19	0	0
	Rehabilitadas hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego (FIDA II)	Hectárea	0	0	0	50	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual	
								29

Fuente: SIAFI

Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de Septiembre:

- Se ha dado seguimiento a las organizaciones que ejecutan sus planes de inversión, 50 organizaciones que han iniciado con la ejecución de sus planes de inversión y se les brinda asistencia técnica orientada al área organizativa, empresarial, área productiva, genero, inclusión social y comercialización mediante la asistencia técnica y financiera

Problemática que afectó la ejecución en el mes de septiembre:

- No reportaron ninguna problemática relevante para este mes de septiembre.

4.4 Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE)

Objetivo

Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las Cadenas de Valor priorizadas y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático.

Descripción del proyecto

Mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en la región noroeste de Honduras, fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas, de procesamiento y comercialización, aumentando sus ingresos y generando empleo a los pobladores del área de influencia.

La población considerada como beneficiarios directos del proyecto, la conformaran 15,000 familias rurales pobres localizadas en 22 municipios de los departamentos de Atlántida, Yoro, Olancho y Colón.

El Proyecto tiene una inversión total de L. 1, 026,645,518.00.

El Proyecto inició 03/01/2022 y su fecha de finalización es al 31/12/2027.

Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en:

- **Departamento de Atlántida:** Jutiapa.
- **Departamento de Yoro:** Olanchito, Jacón y Arenal.
- **Departamento de Colón:** Balfate, Tocoa, Sonaguera, Trujillo; Sabá, Limón, Bonito Oriental, Santa Rosa de Agúan y Santa Fé.
- **Departamento de Olancho:** Guata, Gualaco, Yocón, Jano, Esquipulas del Norte, Mangulile, El Rosario, San Esteban y La Unión.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mes de septiembre:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROINORTE (En Lempiras)							
FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Septiembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	7,711,200.00	7,711,200.00	-	0.00	-	0.00	7,711,200.00
Fuente 21: Crédito Externo FIDA	66,797,831.00	60,797,831.00	-	0.00	-	0.00	60,797,831.00
Fuente 21: Crédito Externo OFID	240,000.00	240,000.00	-	0.00	-	0.00	240,000.00
Fuente 22: Donaciones Externas	12,000,000.00	12,000,000.00	-	0.00	-	0.00	12,000,000.00
Total	86,749,031.00	80,749,031.00	-	0.00	-	0.00	80,749,031.00

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2022 PROINORTE

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada			
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%	
Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)	Alianzas comerciales inclusivas y sostenibles suscritas con las organizaciones beneficiadas.	Contrato	0	0	0	1	0	0	
	Inversiones productivas financiadas a las organizaciones con el fondo de capitalización.	Plan de Inversión	0	0	0	1	0	0	
	Estaciones agroclimáticas instaladas en territorios de las organizaciones beneficiadas.	Estación	0	0	0	1	0	0	
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual		0

Secretaría de Agricultura y Ganadería
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada			
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%	
Alianzas Comerciales, Fortalecimiento, Organizacional e Innovación.	Diagnósticos Territoriales elaborados.	Diagnostico	3	0	0	15	0	0	
	Cadenas de valor productivas priorizadas.	Análisis	0	0	0	3	0	0	
	Diseño de campaña de concientización implementada.	Campaña	0	0	0	1	0	0	
Desarrollo Productivo y Resiliencia	Inversiones productivas aprobadas por el comité de inversiones.	Plan de Inversión	0	0	0	1	0	0	
	Planes productivos de Inversión Formulados.	Plan de Inversión	0	0	0	1	0	0	
	Capacitaciones brindadas a los administradores de las estaciones agroclimáticas.	Capacitación	0	0	0	1	0	0	
	Estudio de microcuencas (alta vulnerabilidad y riesgo) elaborados.	Estudio	0	0	0	1	0	0	
	Kits de herramientas entregados a las Unidades Municipales Ambientales (UMA) entregados.	Kits	0	0	0	2	0	0	
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de septiembre:

- No se cuenta con ninguna actividad relevante para este mes de septiembre.

Problemática que afectó la ejecución en el mes de septiembre:

- No se ha podido realizar ninguna acción administrativa directa del proyecto por falta de finalización de condiciones previas para desembolso.
- No se tiene aún las condiciones previas para poder obtener el desembolso y realizar pagos.
- No se ha podido realizar ejecución técnica.

5 Conclusiones

- El presupuesto ejecutado en el mes de septiembre es de L 9, 463,688.42 de la cartera de proyectos vigente correspondiente a L 632, 826,233.00. Es importante mencionar que la ejecución financiera acumulada al mes de septiembre es de L 161, 634,326.93 la cual corresponde a un 25.54% del vigente.
- Los Proyectos NO lograron la ejecución física y financiera esperada para este mes del presente año. Cabe resaltar que los proyectos en general presentan baja ejecución debido a la falta de personal técnico, ya que la mayoría de estos empleados laboraban bajo la modalidad de contrato que finalizó el 31 de diciembre del 2021. No obstante, la ejecución financiera de algunos proyectos reflejada en el mes de septiembre 2022 corresponde a gastos administrativos de sueldos y salarios, pago de estimaciones, viáticos.

6 Recomendaciones

- Continuar con un seguimiento constante en conjunto con los Proyectos de Inversión, la Unidad Administradora de Proyectos, la Gerencia Administrativa y la UPEG, a fin de identificar los cuellos de botella que desfasen la ejecución, tanto financiera como física de todos los proyectos de la Cartera de esta Secretaría de Estado.
- Para el año 2022, se debe dar una mayor celeridad a los procesos de adquisiciones para obtener un mejor nivel de ejecución, tanto físico como financiero en los proyectos.

Fecha de Elaboración: 18 de octubre de 2022

Elaborado por: Olman Valeriano Coello / Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

Cargo: Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.
