

	"PROGRAMAS Y PROYECTOS 2022"		
	JULIO, 2022		
<i>Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)</i>			
TRIMESTRE: 03			
Número de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del Programa	% Acumulado Ejecutado Mensual del Monto
No se registra ejecución de fondos en programas y proyectos para el mes de Julio, 2022			



Lic. Ronny Valdivia Garza
Director de Proyectos



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)

DIRECCIÓN DE PROYECTOS



**INFORME NARRATIVO SOBRE PROYECTOS DESARROLLADOS
POR EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO,
UNO, (911).**


TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

JULIO, 2022



**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911
PROTEGEMOS TU VIDA**

 www.911.gob.hn

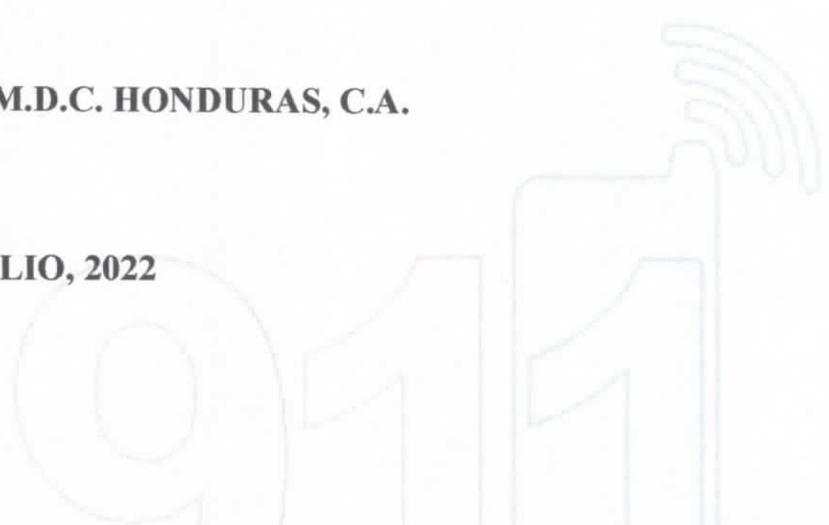

INTRODUCCIÓN



El presente documento contiene información relacionada a los proyectos que se ejecutan por el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (SNE911), para el Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras. La Dirección de Proyectos de la institución, es la principal responsable de supervisar y dar control, diseño, ejecución y seguimiento a las actividades que se desarrollan en cada uno de ellos.

Los proyectos institucionales son desarrollados conforme el ciclo de vida de estos, mismo que comprende: fase de inicio, planificación, implementación, control y seguimiento, monitoreo, evaluación y culminación o cierre del mismo. Los procesos técnicos y administrativos de los proyectos que aquí se mencionan son desarrollados por el equipo técnico de la institución, conforme los lineamientos establecidos por la Dirección de Proyectos del SNE911.

OBJETIVO DE LOS PROYECTOS

Los proyectos que ejecuta el SNE911 referentes al “Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras”, tienen como propósito brindar un aporte a la sociedad hondureña en cuanto a la mejora de las condiciones de seguridad pública en ciertas ciudades del país, como ser: Tegucigalpa, Francisco Morazán, San Pedro Sula, Cortés, Santa Rosa de Copán, Copán, Tela, Atlántida y Choluteca, Choluteca, zonas donde actualmente se cuenta con un centro de Coordinaciones y Operaciones del SNE911. Mismos que efectúan la implementación de un sistema de seguridad pública adaptado a las necesidades de las ciudades que se encuentran dentro de las zonas de influencias del SNE911.



DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CARACTERÍSTICAS	INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN
Propietario	Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911).
Sector	Seguridad/ Seguridad Ciudadana.
Proyecto en ejecución	Ciudad Segura Comayagua, Siguatepeque.
Zona de Influencia	Comayagua, Siguatepeque y Villa de San Antonio, en el departamento de Comayagua.
Empresa ejecutora	Dynamic Corporation.
Propósito de ejecución	Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras.
Patrocinador principal	Gobierno de la República de Honduras, por medio de la Tasa de Seguridad Poblacional.
Patrocinador Secundario	Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (SNE911).
Director de Proyecto	Lic. Ronny García
Descripción del proyecto	Construcción de obra civil (centro de operaciones) y ejecución de actividades prioritarias, relacionadas con proceso de socialización, selección de sitios para ubicación de dispositivos de seguridad y validación de estos lugares, para el óptimo funcionamiento y operatividad del SNE911, conforme los lineamientos establecidos por el Gobierno de la República de Honduras.



DATOS ESPECIFICOS DE LOS PROYECTOS

CARACTERÍSTICAS	INFORMACIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS QUE ACTUALMENTE SE EJECUTAN
Alcance del proyecto	Construcción del edificio para el funcionamiento del Centro de Coordinaciones y operaciones de la ciudad de Comayagua e hincado de postes para la instalación de dispositivos de seguridad (cámaras), cajas utilitarias (UB) y brazos para realizar transmisión en tiempo real.
Datos de Contacto	Lic. Ronny García, Director de Proyectos del SNE911.
Fuente de Financiamiento	Tasa de Seguridad Poblacional.
Presupuesto de proyecto	Bajo administración y responsabilidad económica, financiera y gerencial de Tasa de Seguridad.
Fecha de aprobación (inicio).	01 de septiembre de 2021.
Estado actual del proyecto (etapa/fase)	Fase de ejecución e implementación.
Fecha estimada de finalización del proyecto	Se tiene contemplado culminar la obra civil (construcción del edificio), en el tercer trimestre del año 2022 y comenzar con la operatividad y funcionamiento de la plataforma tecnológica durante el resto del año 2022, ya que el proyecto en su totalidad tiene una duración aproximada de 07 años y 04 meses (2021-2028).
Observaciones al proyecto	Durante el presente mes (julio, 2022), se registró la culminación en la fundición de las columnas, encofrado y fundición de la viga intermedia, se construyó la cisterna de almacenamiento de agua potable, se culminaron los muros de retención, el fundido del estacionamiento, también del firme, las paredes registran un avance del 95% y se trabaja en los detalles (Instalación de ACM). Y en campo se energizaron alrededor de doce (12) dispositivos.




ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS EN LOS PROYECTOS DEL SNE911

Durante el mes de julio de 2022, el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), continúa avanzando en la fase de ejecución e implementación del Proyecto Ciudad Segura Comayagua y Siguatepeque (construcción de la obra civil, trabajo con la plataforma tecnológica por medio del diseño, implementación, configuración e integración de esta).

Las actividades que se ejecutan a la fecha son: Culminación de la estructura de concreto del edificio que comprende cimentación, columnas, vigas y losas y avances en levantamiento de paredes, actividad que registra un progreso de 95% aproximadamente. Se trabaja en repellos en las paredes internas del edificio, gradas y firme de concreto, así como en la instalación de tubería, cajas y cableado de la parte eléctrica e instalación de tubería de la parte hidrosanitaria. Se dio inicio a los trabajos de energía y fuerza del edificio y se tiene culminada la construcción estructural del cuarto eléctrico principal.

En exteriores se observan avances en el fundido del estacionamiento, el firme, las paredes que registran un avance del 95% y se trabaja en los detalles (Instalación de ACM), se encuentran pendientes los bordillos y se registra como culminadas las actividades relacionadas al muro de contención. Al cierre del presente mes el avance general de la obra es de 75% de la construcción aproximadamente.

El equipo técnico del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno, efectuó actividades técnicas de campo, previo a la energización de los ciento dieciocho (118) sitios que comprende el proyecto, se tienen avances en lo referente a la Plataforma CAD-HEXAGON y en la configuración y pruebas de este sistema para testeo final del SNE911, las pruebas e integraciones se realizan desde el Cecop San Pedro Sula. Durante el presente mes se continuo con los trabajos de instalación de cajas utilitarias, Ub y brazos y adecuación de postes en las diferentes ciudades de incidencia del proyecto.

↳ **Responsable de la ejecución de los proyectos:** Lic.  Fanny Adame García.

↳ **Cargo:** Director de Proyectos del Sistema Nacional de Emergencias 911.

↳ **Firma y Sello:** _____

