



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan
Operativo Anual POA-Presupuesto

IV Trimestre 2022

INDICE

Introducción.....	3
Antecedentes	3
▪ Misión:	4
▪ Visión:	4
▪ Valores:.....	5
Resumen Ejecutivo	6
Proyectos FHIS	7
Avance Ejecución Física de Proyectos de Inversión.....	8
Ejecución Presupuestaria por Programas 2022.....	0
Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2022.....	1
Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Cuarto Trimestre 2022	0
Ejecución Gasto Operativo Cuarto Trimestre del 2022.....	0
Cuadro por Sector 2022 (Ejecutado)	3
CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	4
▪ ✓ Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)	4
▪ ✓ Programa de Emergencia en Respuesta a la Tormenta Tropical ETA (BID-ETA).....	11
CARTERA BANCO MUNDIAL	15
▪ ✓ Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE 6822-HN).....	15
CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	29
▪ ✓ Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)	29
▪ ✓ Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira.	34
CARTERA KfW Entwicklungsbank.....	37
▪ ✓ Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V	37
▪ ✓ Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) Fase II	45
CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID).....	52
▪ ✓ Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS).....	52

- ✓ **Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)**
..... 60
- FONDOS NACIONALES**..... 64
- ✓ **Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en
varios departamentos de Honduras Convenio BCH-24798-1**..... 64

Introducción

El presente informe es la recopilación de las actividades e inversiones realizadas por el FHIS durante el cuarto trimestre del 2022.

Antecedentes

De acuerdo al Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-056-2019 se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), la cual debe de promover el Desarrollo Comunitario por medio de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos, en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerables de Honduras quien para el desarrollo de sus funciones debe contar con una Subsecretaría de Estado.

Se adscribe a dicha Secretaría de Estado, El Instituto Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), que fue creado mediante Decreto Ejecutivo PCM-013-2014 publicado el 30 de Mayo del 2014 y tiene como propósito la integración institucional del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y del Servicio Autónomo Nacional de Acueducto y Alcantarillados (SANAA) y demás afines al sector, Independiente de su integración estas instituciones continuaron cumpliendo los objetivos establecidos en sus leyes constitutivas. Y en la práctica el SANAA no se adscribió al IDECOAS

En PCM-05-2022 se adscribe el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y a la vez se crea el Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos que se adscribe a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y aglutina todos los entes relacionados al sector.

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es un organismo Desconcentrado de la Presidencia de la República, creado el 22 de febrero de 1990 y extendida su vida legal hasta el año 2022 según decreto No. 222-2010 cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados, en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social y/o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Asimismo, asesorará a los gobiernos locales con respecto a los procesos de captación de recursos de las fuentes de financiamiento nacionales y/o externas y las asiste en la transferencia de las capacidades técnicas y administrativas, para convertir a estos gobiernos locales en administradores eficientes de sus programas y proyectos, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Nación en aplicación del principio de Descentralización.

Misión:

Somos una institución estatal, centralizada, técnica y captadora de recursos que promueve el desarrollo local sostenible, participativo e incluyente a través del fortalecimiento municipal y comunitario, por medio de programas y proyectos de infraestructura básica, social y especial coordinados, diseñados y ejecutados en las comunidades en condiciones de pobreza y alta vulnerabilidad para descentralizar la gestión y ejecución de proyectos en Honduras, en alianza con los gobiernos locales y socios estratégicos.

Visión:

Consolidarnos al 2030, como la institución líder en gestión, captación y ejecución de programas y proyectos orientados al fortalecimiento municipal y comunitario que contribuya de forma equitativa al desarrollo sostenible de las comunidades en todo el territorio nacional.

Valores:

- **Ética:** Ejercicio de las funciones con sujeción a las normas morales que promuevan la confianza de la población hondureña.
- **Integridad:** Actuación sustentada en la honradez, prudencia, entereza, rectitud y firmeza.
- **Compromiso:** Ejecución de proyectos que coadyuven al desarrollo local.
- **Transparencia:** Amplia difusión de información sobre nuestras actuaciones. Rendición de cuentas ante la sociedad.
- **Lealtad:** Actuar con fidelidad y rectitud hacia el FHIS y compañeros de trabajo, con el objetivo de identificarse con la institución.
- **Equidad:** El FHIS no hace distinción de credo, raza, de ninguna otra forma de discriminación humana.


Resumen Ejecutivo

SEDECOAS/FHIS, llega hasta los lugares más recónditos del país, para contribuir a mitigar las necesidades de la población más pobre y vulnerable a través de respuestas rápidas y concretas con proyectos de Agua y Saneamiento, Educación, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural.

El presupuesto de SEDECOAS/FHIS para la gestión 2022 al 31 de diciembre asciende a 2.021 Mil Millones de Lempiras financiado tanto por fondos del Tesoro Nacional, como de Créditos y Donaciones de Organismos Internacionales, y cuya distribución, así como su participación porcentual en el presupuesto general de la institución se describe a continuación:

Fuente	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	% de Participación en el Presupuesto Vigente
BID	L. 75.224.516,00	L. 71.849.516,00	4%
BM	L. 732.341.690,00	L. 259.608.231,00	13%
BCIE	L. 692.639.879,00	L. 631.251.798,00	31%
USAID	L. 10.612.131,00	L. 95.215.640,00	5%
GOH*	L. 285.234.819,00	L. 813.186.819,00	40%
KfW	L. 233.031.656,00	L. 147.127.797,00	7%
TOTAL	L. 2.029.084.691,00	L. 2.021.614.801,00	100%

* Incluye costo Operativo del FHIS

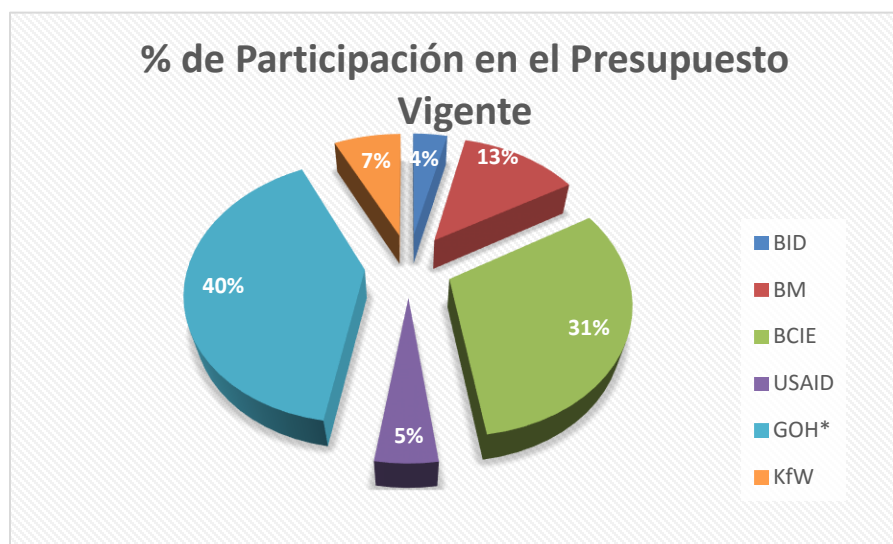

Proyectos FHIS

Fuente	Nombre del Proyecto	Nombre Corto	Sector	Modalidad Ejecución
BID	Programa Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	PCCMB 4518/BL-HO	Infraestructura Social	Centralizados
	Programa de Emergencias en la Respuesta a la Tormenta Tropical ETA	BID-ETA 5328 BL/HO	Infraestructura Social	Centralizados
BM	Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota	PRE 6822-HN	Infraestructura Social	Centralizados
BCIE	Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	BCIE No. 2239	Infraestructura Escolar	PEC-Descentralizados
	Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira.	BCIE No. 2261	Agua y Saneamiento	Centralizados
KFW	Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar SE-FHIS FASE IV y V	PROMINE	Infraestructura Escolar	PEC-Descentralizados
	Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras	CONVIVIR	Infraestructura Social y Fortalecimiento de las Capacidades de los Jóvenes	Descentralizados
USAID	Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana	ICS	Recuperación de espacio públicos e infraestructura escolar para la mejora de la seguridad ciudadana	PEC/Centralizados
	Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras	PIOH	Mejorar las condiciones de Infraestructura Básica para contribuir al desarrollo en el Occidente de Honduras.	PEC/Centralizados
Fondos Nacionales	Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras.	PROMIDESH	Rehabilitación de la infraestructura escolar, infraestructura social y servicios comunitarios, construcción de puentes vehiculares, infraestructura sanitaria, diseño y estudios de laboratorio de medicamentos y hospital oncológico, obras de protección hídrica y reparación de embaulamiento, fortalecimiento institucional y por último, gestión y administración del programa	Centralizados


Avance Ejecución Física de Proyectos de Inversión

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Metas			Ubicación y Observaciones
			Programación 2022	Ejecución Física al IV Trimestre 2022		
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	
PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	Construcción de vías pavimentadas	KILOMETRO	2	1,7	85%	al final del mes del año 2022 se tuvo un avance físico del 48% y se espera finalizar las obras en el mes de julio del año 2023; debido a los retrasos, a la fecha se han logrado 402 conexiones al sistema de alcantarillado sanitario y 1.7 km de vías pavimentadas.
	Construcción de conexiones de sistemas de agua potable	CONEXIÓN	297	250	84%	al final del mes del año 2022 se tuvo un avance físico del 48% y se espera finalizar las obras en el mes de julio del año 2023; debido a los retrasos, a la fecha se han logrado 250 conexiones del sistema de agua potable.
	Construcción de conexiones de sistemas de saneamiento	CONEXIÓN	297	402	135%	al final del mes del año 2022 se tuvo un avance físico del 48% y se espera finalizar las obras en el mes de julio del año 2023; debido a los retrasos, a la fecha se han logrado 402 conexiones al sistema de alcantarillado sanitario y 1.7 km de vías pavimentadas.
	Talleres de Valores y/o emprendimiento para jóvenes	TALLERES	6	3	50%	Dos (2) Cursos de Educación Financiera donde participaron un total de 93 jóvenes y Un (1) Curso de emprendimiento de negocios 79 jóvenes. IV Trimestre se realizaron tres (3) capacitaciones en temas de iniciar tu negocio, habilidades para la vida y fortalecer las habilidades para la inserción socio laboral, donde participaron un total de 223 jóvenes.
PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS	Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos	CENTRO EDUCATIVO	27	0	0%	Se han adjudicado los procesos de licitación y cotización para 27 subproyectos de infraestructura pública (Centros educativos). Una (1) de las empresas adjudicadas, renunció a la adjudicación. Las obras iniciaron en el mes de noviembre, 2022. Al cierre del año 2022, se obtuvo un avance en conjunto del 27% y el subproyecto con mayor avance fue del 65%.
	Adjudicación de Sistemas de Agua Rehabilitados y/o Reconstruidos	LICITACION	10	0	0%	Se encuentran en No Objeción del Banco Mundial 3 expedientes de subproyectos de agua, requisito previo al lanzamiento de las licitaciones. Se encuentran en reformulación 7 subproyectos de agua y saneamiento.
	Adjudicación de Sistemas de Saneamiento y/o Reconstruidos	LICITACION	2	0	0%	Se encuentran en reformulación 2 subproyectos de saneamiento.
	Formulación de Expedientes de Infraestructura en Centros de Salud	EXPEDIENTES	2	0	0%	Se han recibido 4 solicitudes puntuales para rehabilitar y/o reconstruir infraestructura de salud. Durante el 1er trimestre del 2023 se iniciará la formulación de estos proyectos. El personal que realizará estos diseños fue contratada en septiembre, 2022 y se han enfocado en otras solicitudes prioritizadas.
	Formulación de Expedientes de Infraestructura Comunitaria Rehabilitada y/o Reconstruidas	EXPEDIENTES	2	0	0%	Se han revisado las solicitudes de los posibles subproyectos presentados, para conocer la factibilidad de la formulación de los expedientes.
	Formulación de Expedientes de Infraestructura Pública y Comunitaria	EXPEDIENTES	2	0	0%	Se han revisado las solicitudes de los posibles subproyectos presentados, para conocer la factibilidad de la formulación de los expedientes.
	Adjudicación de Infraestructura Vial Rehabilitada y/o Reconstruida	LICITACION	5	0	0%	Se encuentran en reformulación 5 subproyectos de infraestructura vial. Se planifica el lanzamiento de estos subproyectos durante el 1er trimestre del año 2023.

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Metas			Ubicación y Observaciones
			Programación 2022	Ejecución Física al IV Trimestre 2022		
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	Centros Educativos Rehabilitados y/o Recontruidos	CENTRO EDUCATIVO	3	0	0%	El Programa no presento comentarios
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE IV y V)	Centros Educativos Rehabilitados y/o Recontruidos	CENTRO EDUCATIVO	13	0	0%	A la fecha se continua en proceso de la aprobación de los proyectos y consultorias en el Congreso Nacional, lo cual ha probacado en un desfase fisico y financiero en la ejecución del Programa en la fase IV y en el caso de la fase V se esta en proceso de formulación de los nuevos proyectos. Tambien se solicitó una modificacion interna tanto financiera como en produccion y un traslado de recursos a otro Programa, sin embargo la Institucion ya habia completado las modificaciones permitidas por lo cual este POA de seguimiento esta con base un planificacion no ajustada.
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	Espacios públicos recuperados para la seguridad ciudadana.	OBRA	1	0	0%	Se desembolso el 50% de 7 obras de infraestructura, se había solicitado un decremento en este renglón pero no fue aprobado, sin embargo, se logro desembolsar lo programado
	Capacitaciones en habilidades sociales y laborales a jovenes de ambos sexos entre las edades de 12-30 años	CAPACITACION	180	0	0%	Se logro firmar convenio convenio con FIPADEH, sin embargo, los talleres daran inicio en el primer trimestre del año 2023
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	Espacios públicos recuperados para la seguridad ciudadana.	OBRA	10	5	50%	Se produjo un desfase en 1 de los proyectos planificados para el 2022, por lo cual pasara para el I trimestre 2023
	Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados	CENTRO EDUCATIVO	7	9	129%	
	Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud	OBRA	2	2	100%	
ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados	CENTRO EDUCATIVO	4	2	50%	El programa cuenta con Producción completa
	Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud	OBRA	0	0	0%	


Ejecución Presupuestaria por Programas 2022

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Monto Planificado IV Trimestre	Devengado del IV Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% Ejecución IV Trimestre/ Planificado IV Trimestre	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
Programa 1: Actividades Centrales	L 285.234.819,00	L 534.186.819,00	L 354.246.704,75	L 378.686.004,28	L 520.620.973,50	L 13.565.845,50	107%	97%
Programa 11: Infraestructura Rural	L -	L 37.504.624,00	L 19.969.349,00	L 20.343.947,38	L 35.478.196,70	L 2.026.427,30	102%	95%
Programa 12: Infraestructura Escolar	L 687.780.338,00	L 540.836.748,00	L 484.266.114,00	L 62.592.823,32	L 67.647.516,17	L 473.189.231,83	13%	13%
Programa 14: Fomento al Desarrollo Local	L 130.555.384,00	L 173.930.919,00	L 99.276.400,00	L 78.386.552,53	L 141.946.690,56	L 31.984.228,44	79%	82%
Programa 16: Reconstrucción Nacional Fuente Externa	L 732.341.690,00	L 262.983.231,00	L 204.395.525,00	L 47.172.790,11	L 55.542.763,75	L 207.440.467,25	23%	21%
Programa 17: Programa de Agua y Saneamiento	L 193.172.460,00	L 193.172.460,00	L 115.903.476,00	L 28.412.086,07	L 28.412.086,07	L 164.760.373,93	0%	15%
Programa 18: Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en varios deptos de Honduras	L -	L 279.000.000,00	L 155.302.500,00	L 270.575.628,24	L 270.575.628,24	L 8.424.371,76	174%	97%
TOTAL	L 2.029.084.691,00	L 2.021.614.801,00	L 1.278.057.568,75	L 886.169.831,93	L 1.120.223.854,99	L 901.390.946,01	69%	55%

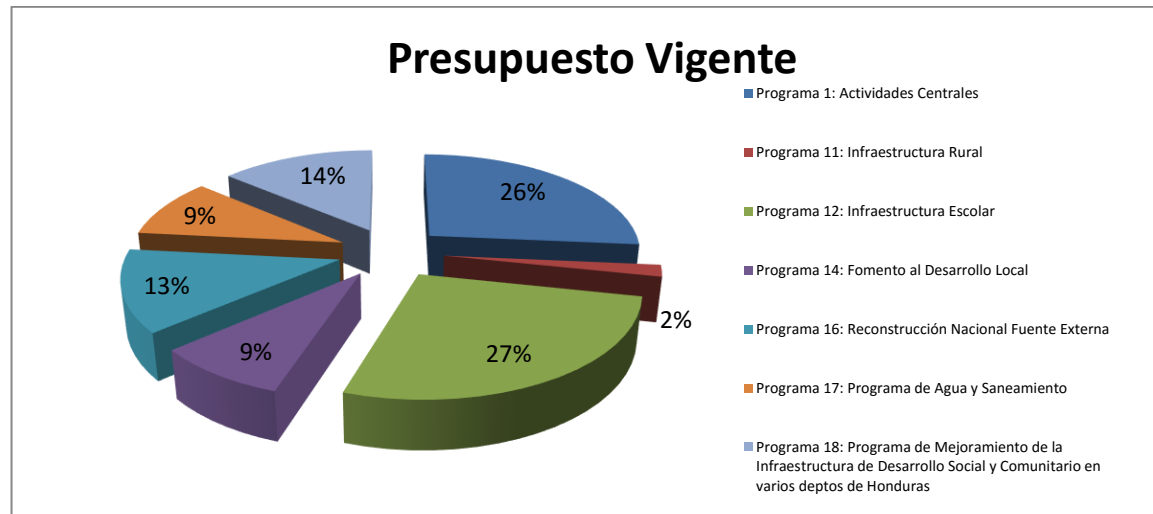


Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2022

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente 2022	Devengado del IV Trimestre	Devengado Acumulado 2022	% Ejecución al IV Trimestre / Presupuesto Vigente
Gasto Operativo/Gobierno	L. 285.234.819,00	L. 534.186.819,00	L. 378.686.004,28	L. 520.620.973,50	97%
Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras	L. -	L. 37.504.624,00	L. 20.343.947,38	L. 35.478.196,70	95%
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar, KfW VIII	L. 188.312.919,00	L. 102.757.410,00	L. 61.771.608,89	L. 66.787.201,74	65%
Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	L. 499.467.419,00	L. 438.079.338,00	L. 821.214,43	L. 860.314,43	0%
Proyecto Convivencia y Especies Seguros para los Jovenes CONVIVIR	L. 44.718.737,00	L. 44.370.387,00	L. 21.920.832,87	L. 26.573.808,83	60%
Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana	L. 10.612.131,00	L. 57.711.016,00	L. 37.902.016,57	L. 55.047.658,54	95%
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	L. 75.224.516,00	L. 71.849.516,00	L. 18.563.703,09	L. 60.325.223,19	84%
Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales ETA e IOTA	L. 732.341.690,00	L. 259.608.231,00	L. 44.657.177,11	L. 53.027.150,75	20%
Programa de Emergencia en Respuesta a la Tormenta ETA	L. -	L. 3.375.000,00	L. 2.515.613,00	L. 2.515.613,00	75%
Programa de Ampliación del sistema de Abastecimiento de agua Potable en la Ciudad de Gracias	L. 193.172.460,00	L. 193.172.460,00	L. 28.412.086,07	L. 28.412.086,07	15%
Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras	L. -	L. 279.000.000,00	L. 270.575.628,24	L. 270.575.628,24	97%
TOTAL	L. 2.029.084.691,00	L. 2.021.614.801,00	L. 886.169.831,93	L. 1.120.223.854,99	55%

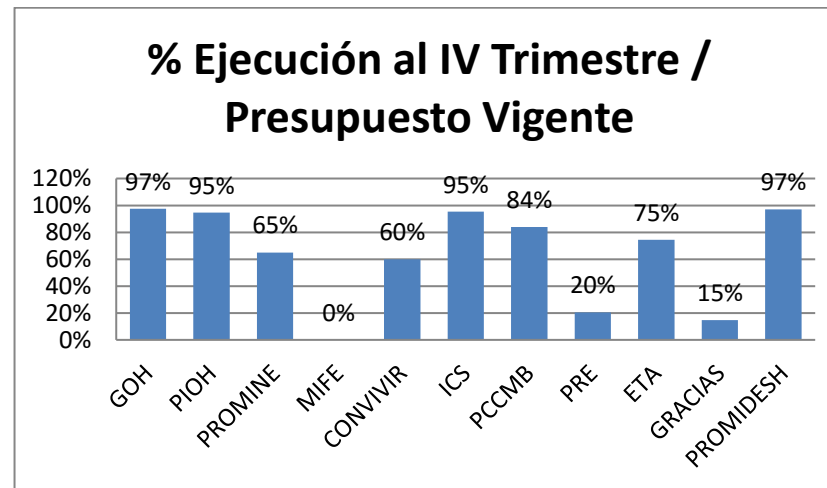

Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Cuarto Trimestre 2022

Grupo	Aprobado	Presupuesto Vigente por Grupo	Devengado IV Trimestre	Devengado Acumulado al IV Trimestre	Disponibile	% Ejecución IV Trimestre/ Presupuesto Vigente	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
SERVICIOS PERSONALES	L. 152.860.491,00	L. 197.034.132,00	L. 88.723.224,71	L. 190.874.570,22	L. 6.159.561,78	45%	97%
SERVICIOS NO PERSONALES	L. 285.659.052,00	L. 269.270.284,00	L. 81.185.594,50	L. 124.259.704,50	L. 145.010.579,50	30%	46%
MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 80.985.014,00	L. 13.495.219,00	L. 2.761.939,88	L. 5.399.125,35	L. 8.096.093,65	20%	40%
BIENES CAPITALIZABLES	L. 1.505.129.454,00	L. 1.534.484.486,00	L. 710.639.967,72	L. 796.783.349,80	L. 737.701.136,20	46%	52%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. 4.450.680,00	L. 4.450.680,00	L. 24.540,00	L. 72.540,00	L. 4.378.140,00	1%	2%
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	L. -	L. 2.880.000,00	L. 2.834.565,12	L. 2.834.565,12	L. 45.434,88	98%	98%
Total	L. 2.029.084.691,00	L. 2.021.614.801,00	L. 886.169.831,93	L. 1.120.223.854,99	L. 901.390.946,01	44%	55%

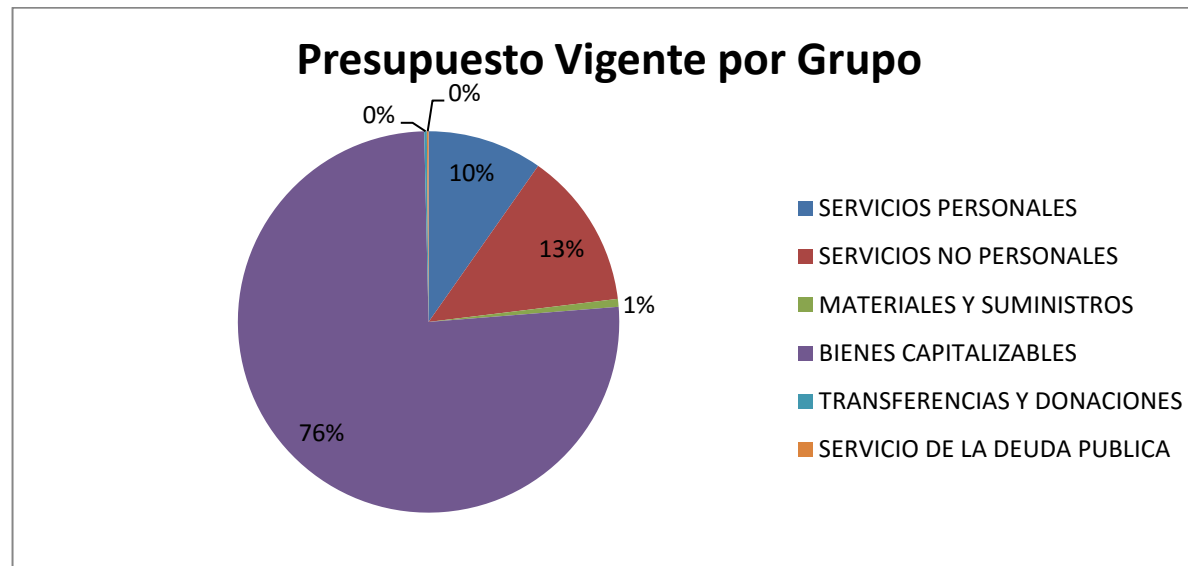

Ejecución Gasto Operativo Cuarto Trimestre del 2022

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
1100	Sueldos Básicos	15.240.407,00	15.240.406,86	0,14
11400	Adicionales	1.192.214,00	1.192.213,14	0,86
11510	Decimotercer Mes	980.776,00	980.775,88	0,12
11520	Decimocuarto Mes	1.488.478,00	1.485.391,36	3.086,64
11600	Complementos	1.240.782,00	1.240.782,00	0,00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	2.589.952,00	2.203.950,93	386.001,07
11750	Contribuciones para Seguro Social	711.808,00	575.663,97	136.144,03
16200	Compensaciones	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
21110	Suministro De Energía Eléctrica	421.000,00	381.760,53	39.239,47
21200	Agua	240.000,00	182.379,92	57.620,08
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1.363.655,00	1.363.364,64	290,36
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	950.000,00	950.000,00	0,00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	551.000,00	551.000,00	0,00
25700	Servicio de Internet	1.200,00	0,00	1.200,00
26110	Pasajes Nacionales	10.189,00	9.950,00	239,00
26210	Viáticos Nacionales	1.169.000,00	1.155.404,96	13.595,04
27500	Gastos Judiciales	8.326.359,00	2.500.000,00	5.826.359,00
29100	Ceremonial y Protocolo	123.000,00	93.943,01	29.056,99
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	89.000,00	22.412,00	66.588,00
33300	Productos de Artes Gráficas	5.000,00	0,00	5.000,00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	6.000,00	0,00	6.000,00
39600	Repuestos y Accesorios	304.294,00	273.041,73	31.252,27
42710	Muebles y Equipos Educativos	3.400.000,00	3.057.764,91	342.235,09
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	89.852.000,00	89.693.633,63	158.366,37
51220	Ayuda Social a Personas	72.540,00	72.540,00	0,00
11100	Sueldos Básicos	18.611.040,00	18.611.039,67	0,33
11400	Adicionales	1.626.215,00	1.626.214,76	0,24
11510	Decimotercer Mes	1.027.809,00	1.027.808,46	0,54
11520	Decimocuarto Mes	1.474.551,00	1.474.550,29	0,71
11600	Complementos	1.369.929,00	1.349.910,13	20.018,87
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	2.914.346,00	2.702.380,64	211.965,36
11750	Contribuciones para Seguro Social	1.264.256,00	1.153.982,95	110.273,05
12100	Sueldos Básicos	37.483.485,00	37.482.998,12	486,88
12410	Decimotercer Mes	3.150.040,00	3.058.001,23	92.038,77
12420	Decimocuarto Mes	3.150.040,00	3.083.556,79	66.483,21
12510	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	432.325,00	432.324,44	0,56
12550	Contribuciones para Seguro Social	1.161.237,00	881.754,66	279.482,34
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35.000,00	28.625,00	6.375,00
24500	Servicios de Capacitación	38.800,00	37.400,00	1.400,00



**Fondo Hondureño
de Inversión Social
FHIS**

Gobierno de la República



HONDURAS
ICA

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
24710	Servicios De Consultoría Administrativa Y Financiera	1000.000,00	955.000,00	45.000,00
25100	Servicio de Transporte	1200,00	1200,00	0,00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1753.273,00	1747.394,56	5.878,44
25400	Primas y Gastos de Seguro	1529.046,00	1404.096,45	124.949,55
25700	Servicio de Internet	12.800,00	1621,66	11.178,34
27210	Tasas	111.183,00	111.182,67	0,33
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	100.000,00	99.943,06	56,94
33100	Productos De Papel Y Cartón	100.000,00	94.011,70	5.988,30
34400	Llantas y Cámaras de Aire	125.000,00	124.799,93	200,07
35620	Diesel	841517,00	832.650,57	8.866,43
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	78.444,00	78.443,97	0,03
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	31691,00	31690,69	0,31
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	85.773,00	85.772,07	0,93
39600	Repuestos y Accesorios	575.131,00	516.119,83	59.011,17
11100	Sueldos Básicos	3.843.600,00	3.364.633,02	478.966,98
11400	Adicionales	332.800,00	292.865,37	39.934,63
11510	Decimo tercer Mes	302.800,00	197.348,21	105.451,79
11520	Decimo cuarto Mes	332.800,00	322.314,21	10.485,79
11600	Complementos	346.240,00	266.240,00	80.000,00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	579.072,00	496.818,10	82.253,90
11750	Contribuciones para Seguro Social	148.736,00	128.011,18	20.724,82
24300	Servicios Jurídicos	600	0,00	600,00
33700	Especies Timbradas y Valores	30	0,00	30,00
11100	Sueldos Básicos	2.373.600,00	2.030.814,58	342.785,42
11400	Adicionales	197.800,00	179.824,73	17.975,27
11510	Decimo tercer Mes	197.800,00	98.305,07	99.494,93
11520	Decimo cuarto Mes	197.800,00	197.800,00	0,00
11600	Complementos	188.240,00	158.239,80	30.000,20
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	344.172,00	294.935,78	49.236,22
11750	Contribuciones para Seguro Social	106.240,00	94.526,10	11.713,90
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20.000,00	19.550,00	450,00
11100	Sueldos Básicos	2.530.800,00	2.282.613,71	248.186,29
11400	Adicionales	210.900,00	206.220,83	4.679,17
11510	Decimo tercer Mes	210.900,00	178.365,53	32.534,47
11520	Decimo cuarto Mes	210.900,00	210.541,67	358,33
11600	Complementos	212.720,00	180.210,00	32.510,00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	366.966,00	331.574,67	35.391,33
11750	Contribuciones para Seguro Social	116.864,00	100.550,97	16.313,03
11100	Sueldos Básicos	22.976.968,00	21078.774,95	1898.193,05
11400	Adicionales	1902.249,00	1847.800,89	54.448,11
11510	Decimo tercer Mes	1932.249,00	1407.362,50	524.886,50
11520	Decimo cuarto Mes	1902.249,00	1695.373,89	206.875,11
11600	Complementos	1587.799,00	1537.799,00	50.000,00

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-81311

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	3.309.911,00	3.043.910,19	266.000,81
11750	Contribuciones para Seguro Social	1.009.280,00	919.527,79	89.752,21
16200	Compensaciones	1.951.987,00	1.927.561,20	24.425,80
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	130.000,00	96.669,00	33.331,00
26210	Viáticos Nacionales	2.998.962,00	2.998.961,50	0,50
TOTAL PROGRAMA		L 3.134.868.190,00	L 3.004.468.898,21	L 13.039.920,79

Cuadro por Sector 2022 (Ejecutado)

SECTOR	Proyectos Finalizados 2022	Mto. Ejecutado 2022	Empleos Generados 2022	Beneficiarios directos 2022
AGUA Y SANEAMIENTO	10	10.914.361,29	26	12.940
BORDOS LIMPIEZA/CANALIZACIÓN	34	90.558.747,18	124	818.558
INFRAESTRUCTURA VIAL	47	91.251.355,69	405	750.318
EMPREDIMIENTO Y VALORES	0	12.187.005,46	27	1.262
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	19	51.764.275,44	525	238.271
PREVENCION SITUACIONAL/CONVIVIENCIA	12	44.710.864,95	219	2.759.103
EDUCACION	23	168.039.760,88	906	58.887
SALUD	2	6.340.989,00	49	420.045
TOTAL	147	475.767.359,89	2.281	5.059.384

Cuadro por Departamento 2022 (Ejecutado)

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2022	Mto. Ejecutado 2022	Empleos Generados 2022	Beneficiarios directos 2022
ATLANTIDA	11	22.165.551,61	208	1.511.291
CHOLUTECA	8	19.472.440,20	112	12.940
COMAYAGUA	18	21.814.467,65	105	284.788
COPAN	6	33.982.269,45	109	421.731
CORTES	32	102.180.434,60	364	827.642
EL PARAISO	2	1.530.378,71	3	7.115
FRANCISCO MORAZAN	28	117.055.506,12	557	1.320.848
GRACIAS A DIOS	0	6.690.902,89	0	0
INTIBUCA	4	16.170.800,90	156	1.260
LA PAZ	3	20.004.954,11	66	7.459
LEMPIRA	7	36.642.563,15	91	53.987
OCOTEPEQUE	6	15.347.488,20	113	30.978
OLANCHO	11	27.883.272,13	200	317.328
SANTA BARBARA	6	19.213.028,30	193	26.956
YORO	1	6.468.711,42	2	5.000
VALLE	4	9.144.590,45	2	230.061
TOTAL	147	475.767.359,89	2.281	5.059.384

Cuadro por Otras Inversiones 2022 (Ejecutado)

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2022
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	103.039.324,79
GASTO OPERATIVO DE PROGRAMAS	20.794.196,78
ACTIVIDADES CENTRALES FHIS	520.620.973,50
TOTAL	644.454.495,07

CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO



✓ Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)



i. Antecedentes

Actualmente el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y la Secretaría de Seguridad ejecutan conjuntamente la operación BID 4518/BL-HO denominada “Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios” el cual es un préstamo por un monto total de US\$60,000,000.00 la operación fue aprobada por el Banco Interamericano de Desarrollo en el mes de abril de 2018, posteriormente aprobada por el Congreso Nacional en el mes de octubre de 2018, y fue efectivo a partir del 28 de noviembre de 2018, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta

ii. Objetivo

Contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

iii. Componentes

Componente 1. Mejoramiento del hábitat de barrios urbanos vulnerables (US\$18.219 millones). El propósito de este componente es mejorar el acceso a servicios de infraestructura urbana y generar espacios con condiciones de seguridad, para incentivar una mejor convivencia y aumentar la capacidad

de los ciudadanos para el cumplimiento pacífico de normas. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Infraestructura básica: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios en los siguientes barrios del Distrito Central: Monte de los Olivos, Nueva Jerusalén; Australia; 25 de Enero; Nueva España; Brisas del Mogote y Nueva Galilea teniendo como marco para las intervenciones el Plan Integral de Mejoramiento de Barrios, el cual incluye los correspondientes diseños urbanísticos, de ingeniería, la programación y presupuestos. Este instrumento es crítico para la adecuada programación de las inversiones y para facilitar el diálogo con la comunidad sobre las actividades a desarrollar. Se financiará consultorías y contratación de obras para: (i) la preparación de los Planes Integrales de Mejoramiento de Barrios (PIMB); y (ii) las inversiones en obras de infraestructura básica de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, pavimentación, drenaje pluvial, plazas y parques, equipamientos sociales y otras necesidades detectadas en los PIMB. Se promoverá la recuperación de escuelas públicas y centros de salud (operados por las entidades estatales específicas).

Convivencia y Emprendimiento a nivel barrial: promueve la participación de los vecinos en el mejoramiento de las condiciones de su entorno, así como el fortalecimiento de sus redes sociales y vecinales para mejorar el tejido social en los barrios. Se financiará: (i) capacitación de líderes, programa de deportes y valores, apoyado por el Comité Olímpico Internacional; (ii) capacitación de vecinos en áreas de empleabilidad dentro y fuera del barrio mediante la asistencia técnica de las Universidades y su vinculación con el sector empresarial, (iii) organización para utilización de sistemas de alerta temprana para desastres naturales. Todas las actividades tendrán enfoque de género.

Componente 2: Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios (US\$22.130 millones). Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios de prevención social de la violencia al ciudadano y brindar una atención oportuna a las víctimas de violencias y delitos, fortaleciendo la gestión local. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Fortalecimiento de capacidades de actores municipales. Se financiará: (i) capacitación y asistencia técnica a las autoridades locales para promover la participación ciudadana en la preparación de planes locales de prevención social de la violencia; (ii) fortalecimiento de las capacidades de los responsables de los observatorios locales, para el análisis estratégico de estadísticas del crimen y delito -incluyendo la desagregación por género-; y (iii) estrategia de comunicación a través de campañas y consultas

sociales para promover medidas y valores para la reducción de violencias, respeto por las normas legales, morales, culturales y el uso de la oferta de servicios disponibles de prevención y atención a víctimas.

Intervenciones de prevención social de la violencia a nivel municipal. Se financiará: (i) programas para la atención a víctimas de VIF a través del módulo de Atención Integral Especializado (MAIE); (ii) desarrollo de protocolos para homologar la actuación de primeros respondientes para atención a víctimas, (iii) programa de prevención social de la violencia para jóvenes en situación de riesgo; (iii) modelo innovador de policía comunitaria y patrullaje policial sistemático -Hot Spots-; y (iv) mejoramiento de la infraestructura de las Jefaturas Departamentales, para ofrecer servicios policiales a la comunidad.

Componente 3: Efectividad policial. (US\$16 millones). Con el propósito de mejorar el desempeño y la calidad en la prestación de los servicios policiales, se apoyará la consolidación del sistema nacional de formación y profesionalización, así como su sistema de integridad. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Consolidación del sistema educativo policial basado en la filosofía de Policía Comunitaria. Se financiará: (i) diseño del modelo de Sistema de Formación y Profesionalización Policial, articulando sus diferentes instancias de formación (Instituto Técnico Policial -ITP-, ANAPO, Universidad y educación continua y entrenamiento), incluye mecanismos de evaluación continua del personal. Lo anterior, deberá estar sujeto a promover principios de meritocracia y transparencia en el desarrollo de la carrera policial; (ii) modernización del currículum académico para los medios y altos mandos policiales, certificado bajo la filosofía de policía comunitaria y orientando la formación a competencias para la toma de decisiones operativas. Lo anterior, incluyendo la redefinición del perfil de ingreso de candidatos a la ANAPO. Esto considerará la incorporación de nuevos cadetes, provenientes del ITP y otros candidatos que ya hayan cursado licenciaturas y tecnicaturas en otras universidades; modernizar el régimen de formación de oficiales en el nuevo campus universitario y generar una nueva estructura de gobierno y planta de profesores-investigadores de tiempo completo (teóricos y prácticos) (iii) fortalecimiento de las capacidades pedagógicas para docentes; (iv) fortalecimiento de la integridad policial a través de la consolidación de un sistema de evaluación y rendición de cuentas; y (v) modernización de la infraestructura física y tecnológica de la Academia Nacional de Policía y el Centro de Investigación y Desarrollo Policial.

Fortalecimiento de las capacidades en investigación criminal. Se financiará: (i) programa de capacitación y especialización continua en investigación criminal en coordinación con el MP; (ii) capacitación técnica en el uso de tecnologías de la información para análisis estratégicos delictuales; e (iii) implementación de un sistema integrado de información delictiva y criminal para mejorar la resolución del delito -integrando estadísticas por categoría de género.

iv. Mecanismo de Ejecución.

Se propone contar con dos organismos ejecutores independientes, pero con responsabilidades compartidas en el diseño, implementación y evaluación de iniciativas que se realicen en la misma área geográfica. El componente 1 de esta operación será ejecutado por SEDECOAS-FHIS y el componente 2 y 3 por la Secretaría de Seguridad.

v. Monto del Convenio:

US\$ 60,000,000.00 según convenio de préstamo el cual se desglosa de la siguiente manera: SEDECOAS- FHIS le corresponde US\$ 15, 000,000.00 millones de dólares y a la Secretaría de Seguridad le corresponde US\$ 40,000,000.00 millones de dólares.

La duración del convenio es de 5 años después de la publicación de diario La Gaceta Acuerdo Ejecutivo No. 114-2018.

vi. Avance financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	17.749.164,00	14.959.784,44	84%
2019	84.562.822,00	75.678.087,16	89%
2020	105.302.450,00	71.201.381,99	68%
2021	120.272.463,00	112.275.707,10	93%
2022	71.849.516,00	60.325.223,19	84%

vii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2022	Mto. Ejecutado 2022	Empleos Generados 2022	Beneficiarios Directos 2022
EMPRENDIMIENTO Y VALORES	0	12.187.005,46	27	1.262
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	8	41.070.985,37	150	3.210
TOTAL	8	53.257.990,83	177	4.472

viii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2022	Mto. Ejecutado 2022	Empleos Generados 2022	Beneficiarios directos 2022
FRANCISCO MORAZAN	8	53.257.990,83	177	4.472
TOTAL	8	53.257.990,83	177	4.472

ix. Otras Inversión

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2022
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	6.009.293,68
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	1.057.938,68
TOTAL	7.067.232,36

x. AVANCES AL 31 DICIEMBRE DE 2022

Avances Programa

COMPONENTE 1 MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES

1.0	PRODUCTO 1.1 NUEVE PROYECTOS INTEGRALES DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS (RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PÚBLICO, EQUIPAMIENTO SOCIAL Y PAVIMENTACIÓN), COMPLETADOS Y SIENDO UTILIZADOS	
1.1	<i>Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios</i>	<p>El día 20 de junio de 2022 inició la ejecución de obras del Proyecto de Integración Urbana en colonias Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 633 predios; el monto del contrato es de L. 55,100,000.000 se tiene un avance físico del 55% que corresponde a la construcción de pozos e instalación de tuberías del sistema de alcantarillado sanitario, instalación de tubería para el sistema de agua potable y pavimentación de calles con un avance financiero del 63.7%.</p> <p>La supervisión de la obra inició el día 05 de junio de 2022, el monto del contrato es de 4,744,032.28 y tienen una ejecución financiera del 55.6%.</p>
2.0	PRODUCTO 1.2 JÓVENES DE LOS BARRIOS INTERVENIDOS CAPACITADOS	
2.1	<i>Programa de Deportes y Valores</i>	<ul style="list-style-type: none"> Este proyecto consiste en la enseñanza de disciplinas deportivas implementando los valores olímpicos; al semestre se imparten seis (6) disciplinas olímpicas: taekwondo, levantamiento de Pesas, tenis de Mesa, atletismo, balonmano y lucha olímpica; también, se atiende niños y/o jóvenes con discapacidad, este programa está en ejecución continua y participan aproximadamente 700 jóvenes de las colonias intervenidas por el programa.
3.0	PRODUCTO 1.3 MUJERES DE LOS BARRIOS INTERVENIDOS CAPACITADAS EN EMPRENDEDURISMO Y EMPLEO	
3.1	<i>Capacitaciones en empleabilidad.</i>	<ol style="list-style-type: none"> Al mes de junio de 2022 inició el curso de panadería a través de la fundación CADERH, donde participan 20 jóvenes el cual finalizó el 29 de agosto de 2022. Al mes de junio de 2022 inició el curso de diseño gráfico a través de la fundación CADERH, donde participan 20 jóvenes el cual se prevé finalizar al mes de mayo del año 2023. A finales del mes de agosto, inició el curso en educación financiera en donde participaron 36 jóvenes, este curso finalizó al mes de septiembre de 2022 A finales del mes de julio dio inicio un curso de emprendimiento en el cual se beneficiaron a 72 jóvenes, a través de convenio con la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa; en el curso se emprendimiento se impartieron técnicas de mercadeo, compra de suministros, cálculo de precio y utilidad, habilidades blandas, punto de equilibrio etc; adicionalmente se le brindó un kit de emprendimiento a cada joven que apruebe su proyecto de negocio; el curso finalizó en el mes de noviembre del año 2022. En los meses de noviembre y diciembre se realizaron tres (3) capacitaciones en temas de iniciar tu negocio, habilidades para la vida y fortalecer las habilidades para la inserción socio laboral, donde participaron un total de 223 jóvenes.

xi. PROBLEMATICA:

PROBLEMA	ACCIONES DE MITIGACIÓN, COMENTARIOS, NECESIDADES DE APOYO
<p>Retrasos en el inicio de ejecución de obras</p>	<p>Se adjudicó en el mes de enero de 2022 el Proyecto de Integración Urbana en colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén No. 2, Brisas del Mogote Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 633, predios; debido a que este proyecto sobrepasa el período de gobierno, se gestionó la aprobación del contrato de ejecución de obras en el Congreso Nacional acorde al artículo 114 de las disposiciones generales del presupuesto del año 2022; en este sentido, se retrasó el inicio de ejecución de obras por un período de 4 meses, lo cual incrementará los costos estimados al presupuesto destinado para tal fin, ya que ha aumentado la inflación en los materiales de construcción (cemento, acero y combustible) y no se cuentan con recursos adicionales para enfrentar el escalamiento en materiales de construcción.</p>



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
 Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
 Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-81311

✓ **Programa de Emergencia en Respuesta a la Tormenta Tropical ETA (BID-ETA)**

I. Objetivo

El objetivo del programa es apoyar el proceso de transición de la población afectada por la tormenta tropical ETA hacia la recuperación de sus actividades sociales y económicas regulares, por medio del restablecimiento del nivel de acceso a la provisión de servicios públicos básicos y la remoción de escombros.

II. Objetivo Especifico

El objetivo específico del programa restaurar parte de la infraestructura vial y de servicios básicos de agua potable dañados, remover y disponer los escombros causados por la tormenta tropical ETA.

III. COMPONENTES:

1) COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA VIAL (US\$9,060,802.00)

Con el fin de solucionar la interrupción de la circulación en diversas vías de la Red Vial Nacional atendidas por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Secretaría de Estado en Los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) en los Municipios, que fueron afectados por las intensas lluvias y el desborde de ríos y arroyos, se realizarán obras de rehabilitación de la red vial.

Los tramos específicos serán intervenidos con retiro de escombros o de derrumbes, terraceo y/o protección geotécnica de taludes, recomposición de la base, pavimentación, así como, con la rehabilitación de puentes, de sus apoyos o de estructuras de aproximación, alcantarillas, obras hidráulicas de protección y de drenaje de acuerdo a las necesidades puntuales de cada intervención,

esperando que se recupere la funcionalidad de las vías de las zonas afectadas y mejore la conectividad a las rutas nacionales o secundarias.

SEDECOAS e SIT ejecutarán dichas actividades y se reconocerá por medio de financiamiento retroactivo con las que se espera atender al menos el 446 (80%) de 543 kilómetros de la red vial afectados.

2) COMPONENTE 2 REMOCIÓN DE ESCOMBROS EN ZONAS URBANAS (\$5,541,701.00)

En las principales áreas urbanas afectadas por las inundaciones, que incluyen municipios como Choloma, La Lima, San Pedro Sula, Progreso y Villanueva se removerán los escombros depositados en las calles por estas inundaciones. Se financiará los servicios de maquinaria para cargar y disponer los escombros, el material de relleno para nivelar las calles y la contratación de firmas supervisoras que certifiquen el cumplimiento y la calidad técnica de la actividad; estas actividades serán realizadas por el Comité Permanente de Contingencias de Honduras (COPECO), considerando la remoción 296,381 metros cúbicos de escombros.

3) COMPONENTE 3. REANUDACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (US\$701,203.00)

Las actividades se concentrarán en el restablecimiento expedito del servicio de agua potable que comprenden los estudios y diseños de las Rehabilitación, la limpieza de presas y pozos, reparación de equipos de bombeo de líneas de conducción y distribución y de sistemas de saneamiento y la contratación de firmas y consultores individuales para la supervisión.

Las reparaciones serán ejecutadas por SEDECOAS. Se estima que se cubrirán las necesidades inmediatas para poner en servicio 2 sistemas de 201 sistemas afectados por el huracán ETA.

4) COMPONENTE 4. APOYO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA (US\$167,351.00)

Con los recursos del préstamo se podrá financiar el apoyo a la gestión del programa, incluyendo entre otros la contratación de una firma para que realice una auditoría de Aseguramiento Razonable, costos de desplazamiento y el costo de la evaluación del programa.

Tabla 1. Monto por componente

COMPONENTE	MONTO
Infraestructura vial	9,060,802.00
Remoción de escombros en zonas urbanas	5,541,701.00
Reanudación del servicio de agua potable	701,203.00
Apoyo a la gestión del programa	167,351.00
Total	15,471,057.00

i. Avance financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2022	3.375.000,00	2.515.613,00	75%

ii. Otras Inversión

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2022
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	2.515.613,00
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	-
TOTAL	2.515.613,00

iii. AVANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Este programa consiste en el reconocimiento de gastos incurridos en la ejecución de proyectos para la rehabilitación de caminos, rehabilitación de sistemas de agua potable y remoción de escombros; dañados por la tormenta tropical ETA. Para lograr el reconocimiento y reembolso de gastos, se contrató en marzo 2022 la auditoría de aseguramiento razonable; en este sentido la firma auditora Deloitte realizó la revisión de expedientes de ejecución de pagos de las Secretarías: SIT, SEDECOAS Y COPECO; y ha entregado dos informes de los cuales definió que el reconocimiento de fondos elegibles corresponde a la ejecución de gastos por servicios de consultoría para el diseño de obras: 7 puentes, rehabilitación de 7 tramos carretera Santa Bárbara y la 7rehabilitación de sistemas de agua potable y/o saneamiento cuyo reconocimiento de gastos se hará efectivo en el primer trimestre de 2023.

La ejecución financiera del programa corresponde al pago de servicios de auditoría que representan el 100% de la ejecución financiera del contrato.

iv. **PROBLEMATICA:**

Al finalizar el trimestre se requerirá una ampliación para la fecha del último desembolso en virtud de realizar una revisión conjunta de los informes de auditoría para el reconocimiento de gastos.

CARTERA BANCO MUNDIAL



✓ **Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE 6822-HN)**



i. Antecedentes

Entre los días 1 y 16 de noviembre de 2020, dos tormentas tropicales consecutivas, Eta e Iota, devastaron a Honduras con una magnitud de impacto económico y social comparable a la del huracán Mitch de 1998. En respuesta a la emergencia causada, el Gobierno de Honduras (GdH) solicitó al Banco Mundial (BM) un financiamiento de US\$150 millones para un Proyecto de Recuperación de Emergencia.

El 8 de marzo de 2021 el Gobierno de Honduras suscribió con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) el Convenio de Crédito No. 6822-HN, por un monto de US\$150.000.000.00, aprobado mediante Decreto Legislativo No.10-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 5 de mayo de 2021, fondos que financiaran el Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE), habiéndose cumplido con las condiciones de efectividad el 4 de junio de 2021 y efectuándose el Primer Desembolso el 28 de junio de 2021 por un monto de USD\$ 4.36 Millones.

El Proyecto se enfoca en la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública en salud, educación, agua y saneamiento, vial, comunitaria y vivienda en las zonas geográficas del país afectadas por los ciclones tropicales Eta e Iota.

La implementación, coordinación, planificación y seguimiento general del Proyecto se llevará de manera centralizada en la SEDECOAS, a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), quien contará con personal especializado en diferentes áreas que garanticen el cumplimiento de los estándares del BM.

ii. Objetivo General

El PRE tiene por objetivo atender las necesidades identificadas como prioritarias para reactivar la economía y apoyar las más urgentes necesidades de la población afectada por los fenómenos naturales ETA e IOTA, como respuesta de emergencia y recuperación de Honduras, y, en esta perspectiva, fortalecer la capacidad institucional del Estado para gestionar una ejecución eficaz, eficiente y transparente.

iii. Objetivos Específicos

- Realizar operaciones de asistencia y respuesta de emergencia, salud y seguridad pública.
- Realizar la rehabilitación y construcción resiliente de la infraestructura pública y Comunitaria y Restablecimiento de los servicios públicos.
- Mejorar la capacidad instalada del Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.

iv. Descripción

Componente 1: Operaciones de asistencia y respuesta de emergencia, salud y seguridad pública (US\$ 17.3 MILLONES)

Bajo este componente se financian actividades y acciones de respuesta y seguridad pública como resultado de los daños causados por los ciclones Eta e Iota. Son elegibles actividades de respuesta inmediata realizadas por el Gobierno de Honduras previo a la fecha de efectividad del Crédito.

Componente 2: Rehabilitación y reconstrucción resiliente de la infraestructura pública y comunitaria y restablecimiento de los servicios públicos (US\$121.7 MILLONES)

Este componente se financia la preparación técnica, la implementación de reparaciones urgentes, rehabilitación y reconstrucción resiliente de la infraestructura pública y comunitaria de alta prioridad,

incluido el costo de la reubicación temporal y la inspección o actividades de diseño necesarias para instalaciones de alta prioridad que requieran una nueva construcción

Componente 3: Apoyo institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción (US\$11.0 MILLONES)

El componente se financia la gestión de Proyecto (financiero y fiduciario), la capacidad técnica e institucional, auditorías técnicas, financieras y sociales, monitoreo y seguimiento, cumplimiento social y ambiental, mecanismo de atención y resolución de quejas y denuncias, preparaciones informes, evaluación de medio términos, estudios de línea base.

v. Focalización

Para determinar las zonas y sectores de intervención, el Gobierno de Honduras con la asistencia técnica de organizaciones y agencias internacionales, ha elaborado el documento borrador denominado “Evaluación de daños y pérdidas causadas por las tormentas tropicales Eta e Iota”¹

También se cuenta con la base de datos del estudio levantado por la SEDECOAS denominado “Plataforma de información de incidencias de la infraestructura dañada por las tormentas Eta e Iota”, que consolida los datos de las tres fuentes del Gobierno. De igual manera, se cuenta con listas de infraestructura que fue levantada por las instituciones sectoriales en las oficinas de COPECO Tegucigalpa, en un centro de acopio instalado luego de los eventos de desastre de las tormentas tropicales Eta e Iota.

Las acciones de respuesta de socorro y atención a personas están siendo financiadas bajo el Componente 1 y, las obras de reconstrucción y rehabilitación, elegibles y priorizadas, serán financiadas bajo el Componente 2, estas se ejecutarán en los municipios y sectores afectados por las tormentas tropicales Eta e Iota.

vi. Sector de Intervención

Los sectores por intervenir son:

- *Infraestructura de Salud:* Rehabilitación, reconstrucción, construcción de obras de mitigación de centros de salud, clínicas, unidades de salud CESAMO, CESAR, hospitales, entre otros.
- *Infraestructura Vial:* Habilitación, reposición de carreteras primarias, secundarias, carreteras terciarias (caminos vecinales), Habilitación, Reposición y reparación de puentes, puentes de doble vía cajas puentes, vados en caminos, construcción de obras de mitigación para proteger estructuras viales, rehabilitación de calles (pavimentadas y no pavimentadas), Rehabilitación de caminos rurales de terracería, Mantenimiento en los causes de los ríos (incluye limpieza, dragado, etc.).
- *Infraestructura Escolar:* Rehabilitación, reparación y reposición de Centros de Educación de manera integral incluyendo obras ambientales y de mitigación.
- *Infraestructura Agua y Saneamiento:* Reparación o rehabilitación en estructuras de sistemas de agua. potables (obras tomas, desarenadores, pases aéreos, tanques de almacenamiento, cajas de registro, rompe cargas, cajas distribuidoras de caudal, etc.), plantas de tratamiento y sistemas de aguas residuales, construcción de obras de mitigación para la protección de estructuras de los sistemas de agua potable y residuales, equipamiento de agua potable y residuales.
- *Infraestructura Comunitaria:* Rehabilitación de centros comunitarios y servicios públicos básicos (estación de bomberos, estaciones policiales, albergues, alcaldías, etc.), reposición de centros comunitarios, equipamiento para rehabilitación de centros comunitarios y servicios públicos básicos.

vii. Duración del Proyecto:

El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de 5 años y medio incluyendo actividades de gestión, socialización, adquisiciones, etc.

viii. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	175.537.263,00	1.116.987,87	1%
2022	259.608.231,00	53.027.150,75	20%

ix. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2022	Mto. Ejecutado 2022
EDUCACION	0	20.338.150,81
TOTAL	0	20.338.150,81

x. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2022	Mto. Ejecutado 2022
COMAYAGUA	0	1.803.245,43
COPAN	0	739.084,97
CORTES	0	8.776.772,24
EL PARAISO	0	556.048,52
FRANCISCO MORAZAN	0	2.415.229,11
INTIBUCÁ	0	486.008,31
LA PAZ	0	642.577,36
LEMPIRA	0	639.768,32
SANTA BARBARA	0	740.406,52
YORO	0	3.539.010,03
TOTAL	0	20.338.150,81

xi. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2022
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	25.466.726,14
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	7.222.273,80
TOTAL	32.688.999,94

xii. Situación presupuestaria

El presupuesto inicialmente aprobado para el año 2022 fue L732,341,690.00; durante el periodo ha sufrido ajustes por un monto total de L 472,733,459.00, reflejando al cierre del tercer trimestre un presupuesto vigente de L 259,608,231.00 y una ejecución de L 8,369,973.64 (3.2%).

Así mismo, a partir de las revisiones y reprogramaciones de actividades en el Plan Operativo Anual (POA) y en el Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC), se solicitaron modificaciones presupuestarias internas entre actividades y objetos del gasto, estas no modificaron el presupuesto global vigente.

El 78.44% del presupuesto está concentrado en el Componente 2 para ejecución de obras.

La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) se está completando con nuevas contrataciones. Al cierre del IV Trimestre se han adjudicado a 23 consultores y se encuentran en evaluación 12 nuevas contrataciones de consultores administrativos y técnicos.

Los trabajos de remodelación y amueblado de las nuevas oficinas de la UEP han sido culminados. La Unidad Ejecutora del Proyecto ya se encuentra trabajando en las nuevas oficinas.

xiii. Reducción Presupuestaria

A solicitud de la SEFIN y con el propósito de apoyar a la Secretaría de Salud para atender emergencia de vacunas, se gestionaron disminuciones presupuestarias: a) en los grupos del gasto 20000 y 30000 por L 112,193,465.00 en su mayoría asignado bajo el componente 1. Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia Salud y Seguridad Pública y b) en el grupo 40000 por L 325,539,994.00 y L 35,000.00 bajo el componente 2, después de esto, el presupuesto ajustado del PRE es de L 259,608,231.00.

xiv. Ejecución Financiera

Al 31 de diciembre del 2022 la ejecución financiera acumulada del Proyecto asciende a L 459,219,048 equivalentes a USD 18,911,537, que representa el 13% del monto de Convenio.

Lo comprometido por ejecutar corresponde a contratos celebrados en el 2022, y que trascienden al 2023, como ser: inversión de 26 subproyectos del sector de educación, 2 contratos de supervisión de obra, adquisición de equipo de cómputo y de vehículos, contrato de auditoría externa, alquiler de las oficinas del PRE.

Para fines de control y seguimiento al costo administrativo (10%) del proyecto, el componente 3. se subdividió en el Sistema UEPEX/SIAFI en dos componentes/actividad presupuestaria (3. y 4.) con el nombre “Gestión y Administración del Proyecto”.

xv. Desembolsos

Al 31 de diciembre se ha desembolsado la cantidad de USD\$ 21,186,453.38 equivalente a L 512,065,007.29; representa el 14.1% del total del Crédito. Del total desembolsado USD\$ 16.8 millones equivalente a L 407,7 millones, corresponde a reembolso bajo el Componente 1. mediante pago directo a la SEFIN por actividades de respuesta inmediata realizadas por la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS).

Desembolso	Dólares	Lempiras
Anticipo Cuenta Designada del Proyecto Cta. 11101-20-000949-1 BCH)	4,367,894.00	104,356,849.87
Reembolso bajo Componente 1, con Pago Directo a la SEFIN. (Cta. 11101-20-000952-1)	16,818,559.38	407,708,157.42
Total	21,186,453.38	512,065,007.29

xvi. Estado de la Cuenta Especial

Al 31 de diciembre de 2022 se ha ejecutado el 48% del monto total desembolsado a la Cuenta Especial del Proyecto, presentándose Justificaciones de Gastos por un total de \$ 152,158.91, que representa el 3% de monto del anticipo.

Los gastos efectuados y no documentados al 31 diciembre de 2022 corresponden en su mayoría a servicios de consultorías, bienes, anticipos y primeras estimaciones de inversión de subproyectos y anticipos de supervisión de obras:

Anticipo a la Cuenta Especial **USD 4,367,894.00**

Menos:

Gastos documentados (SOE 8 y 9)	152,158.91	
Gastos efectuados aun no documentados	1,940,819.92	<u>2,092,978.83</u>
Saldo en cuentas bancarias del Proyecto*		USD 2,274,915.17

***Saldo en cuentas bancarias**

Cuenta Especial No. 11101-20-000949-1 (BCH)	2,110,034.39
Libreta Pagadora en lempiras SIAFI No. 00220022130	<u>164,880.78</u>
Total	USD 2,274,915.17

xvii. Reasignación de fondos entre Categorías de Inversión.

Mediante Oficio No. SE-SEDECOAS-FHIS-620/2021 se solicita la primera reasignación de fondos entre Categorías de Inversión respaldada en Dictámenes Técnicos Favorables No. 057-2021 (septiembre 2021) y 068-2021 (noviembre 2021) emitidos por la SEFIN y aprobada por el Banco Mundial el 16 de diciembre de 2021.

La reasignación cubre el sobregiro de USD\$ 7,300,000 en el monto original asignado bajo la Categoría 1. del Componente 1. el cual es cubierto con el presupuesto de la Categoría 2. del Componente 2., tal como se muestra en el cuadro siguiente.

Categoría	Descripción de las categorías	Asignado Convenio Original	Reasignación	Asignación Actual
(1)	Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, y costos operativos bajo la Parte 1 del Proyecto.	10,000,000	7,300,000	17,300,000
(2)	Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 2 del Proyecto.	129,000,000	-7,300,000	121,700,000
(3)	Bienes, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 3 del Proyecto.	11,000,000	-	11,000,000
Total		\$150,000,000.00	\$0.00	\$150,000,000.00

xviii. Reembolso gastos efectuados bajo el Componente 1- Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia y Salud y Seguridad Pública.

Mediante Memorando 207-2021 SE-SEDECOAS-FHS del 11 de junio de 2021, se nombró Comité Interino para la revisión de documentación para reembolso del Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras, en cumplimiento a esto, al 31 de diciembre de 2021 se revisó documentación de procesos por un monto total de L591,952,044.29, de gastos ejecutados por la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS) y la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), en acciones de respuesta de socorro y atención a personas, así:

Institución	Lempiras
SEDIS	415.939.122,84
COPECO	176,012,921.45
Total	591,952,044.29

SEDIS: Del total de los gastos presentados, al 30 de junio de 2022 se han reembolsado con pago directo a la SEFIN un total de L 407,708,157.42 equivalente a USD 16,818,559.38, a través de Sistema de Desembolso (Client Connection). No se efectuarán más reembolsos.

COPECO: A la fecha ningún gasto se ha sometido a reembolso. Contratos de limpieza de calles están en proceso de revisión, y de ser elegibles, serán sometidos a reembolso con fondos del Contrato de Préstamo 5328 BL-HO, Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

xix. ADQUISICIONES

Durante el IV trimestre se encuentran en evaluación los procesos para la contratación de 12 consultores que complementarán el equipo de la unidad ejecutora del proyecto, durante el trimestre se contrataron a las empresas constructoras para la ejecución de 26 reparaciones y/o reposiciones de centros educativos y a las dos empresas que supervisan los trabajos y se adjudicó la adquisición de Equipo Informático, Video y Sonido.

Evaluación, No Objeción y Adjudicación de Contratos:

- ✓ En proceso de evaluación de las consultorías: 1) Oficiales de Adquisiciones de la UEP, 2) Asistente Coordinador General, 3) Oficial de Fuente Enlace UEP-Dirección de Finanzas de la SEDECOAS-FHIS, 4) Operador de Terminal de Contrataciones UEP, 5) Enlace Contable de la Unidad UEP, 6) Formulación de subproyecto de infraestructura - Control de Calidad, 7) Consultores en levantamientos topográficos, 8) Ingeniero en Hidrología y 9) Gestor en Licenciamiento Ambiental.

xx. AVANCE DE ACTIVIDADES

i. Componente 1 - Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia y Salud y Seguridad Pública.

A través de la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS) fueron atendidas 60,000 familias (equivalente a 300,000 personas) con kit de cocina, kit de higiene personal de niños y adultos, kit de limpieza, camas, estufas, filtros de agua, pañales, material de bioseguridad, toallas de baño, baldes plásticos, entre otros).

El componente 1, estuvo vigente del 2 de noviembre de 2020 al 8 marzo de 2021. Por tanto, durante la duración del proyecto no tendrá nuevas actividades a ejecutarse.

ii. Componente 2 - Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos (Obras).

Con el financiamiento de otras fuentes, el FHIS ha identificado zonas y sitios afectados por la tormenta Eta e Iota, con el fin de formular diseños finales para la rehabilitación y/o reconstrucción en infraestructura educativa, infraestructura vial (puentes) y en el sector de agua y saneamiento.

La Unidad Ejecutora del Proyecto a través de su personal técnico y con el apoyo de la Dirección de **Proyectos** del FHIS-SEDECOAS ha realizado revisiones a la formulación de los subproyectos priorizados, para verificar que estos estén cumpliendo con los lineamientos técnicos, ambientales, sociales, y otros relevantes que son parte de los compromisos adquiridos con el Banco Mundial.

A continuación, se detalla el estado de los avances y asuntos pendientes por sectores de intervención.

Infraestructura Educativa

- a. 27 subproyectos de reposición, reparación y ampliación de centros educativos adjudicados por un monto de L 84,785,016.69 y para la supervisión L 9,862,732.25. La ejecución al cierre del año 2022 es de L. 20,330,150.81.

- b. Un segundo paquete de 63 subproyectos a los que se les aplicó Ficha de Criterios de elegibilidad y priorización y con el siguiente estado:

20 subproyectos se encuentran en reformulación para incluir obras de mitigación y medidas ambientales. Dentro de los criterios sociales se está revisando la documentación de la legalidad y sostenibilidad de la intervención. El presupuesto inicial para obra es de L 117,065,606.16 y para la supervisión L 11,202,226.18.

43 Subproyectos devueltos a la Dirección de Proyectos por no cumplir con las condiciones para su financiamiento.

- c. Un tercer y cuarto paquete de 58 subproyectos y 65 subproyectos respectivamente a los que se les aplicó Ficha de Criterios de elegibilidad y priorización y con el siguiente estado:

32 Subproyectos y 20 subproyectos respectivamente fueron devueltos a la Dirección de Proyectos por no cumplir con las condiciones para su financiamiento.

Los 71 subproyectos que pueden ser ejecutados han sido organizados según su ubicación para lo que se han organizado los siguientes dos lotes. Los subproyectos requieren un análisis de Gestión de Riesgo, debido a que no fue considerado en la etapa de formulación, asimismo, se debe proponer obras de mitigación y medidas ambientales. Dentro de los criterios sociales se debe revisar la documentación de la legalidad y sostenibilidad de la intervención.

Sector de Agua y Saneamiento

- a. 11 subproyectos de agua y saneamiento; con categorización ambiental emitida por la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) y aplicación de ficha de criterios de elegibilidad. Se requiere de medidas ambientales y de mitigación a cada subproyecto, y la revisión y actualización de costos, actividades y cantidades de obra. A la fecha se ha logrado la revisión de 10 subproyectos de agua y saneamientos con apoyo de la unidad BID-SEDECOAS-FHIS, esos se encuentran en proceso de subsanación por parte de los formuladores externos. El subproyecto restante se encuentra pendiente de levantamiento de información faltante para su próxima reformulación. El presupuesto inicial para obra es de L 298,240,669.54 y para la supervisión L 18,487,341.54.
- b. 22 subproyectos de agua y saneamiento diseñados con fondos de China - Taiwán, se encuentran en proceso de subsanación por parte de los formuladores. El presupuesto inicial para obra es de L 394,476,135.07 y para la supervisión L 20,480,433.25.

Infraestructura vial

- a. 5 subproyectos de reposición puentes se encuentran en proceso de reformulación para incluir actividades de medidas ambientales y de mitigación. El presupuesto inicial para obra es de L 68,735,907.45 y para la supervisión L 3,460,167.66.

Resultados

- 26 subproyectos de infraestructura educativa en ejecución, los cuales culminaran entre febrero y mayo de 2023.
- La supervisión de los 26 subproyectos se desarrolla a la par de la ejecución.
- Priorización de lista de subproyectos que requieren intervención enviado por la Dirección de Proyectos para siguiente fase de rehabilitación y reconstrucción de escuelas.
- En reformulación 10 subproyectos de agua y saneamiento (Sistemas de agua potable 8 y Sistemas de alcantarillado sanitario 2).
- Caracterización ambiental y social de 14 subproyectos de centros educativos en elaboración de sus respectivos PGAS.

iii. Componente 3 - Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.

- Seguimiento de inspectoría, ambiental, social y de seguridad social a los 26 subproyectos en ejecución.
- Seguimiento al Mecanismo de Quejas, Marco de Reasentamiento y Plan de Participación de Partes Interesadas.
- En proceso de Evaluación de los siguientes procesos de contratación de consultores:
 - ✓ CPN-FHIS-06-2022 Oficial de Adquisiciones
 - ✓ CPN-FHIS-07-2022 Enlace - Oficial de Fuente
 - ✓ CPN-FHIS-08-2022 Operador de Terminal de Contrataciones
 - ✓ CPN-FHIS-10-2022 Asistente Contable de la Unidad Ejecutora del Proyecto
 - ✓ CPN-FHIS-17-2022 Consultor Ingeniero en Hidrología
 - ✓ CPN-FHIS-18-2022 Gestor Licenciamiento Ambiental
 - ✓ CPN-FHIS-19-2022 Consultores Servicios de Topógrafo
 - ✓ CPN-FHIS-20-2022 Técnico en Control de Calidad
 - ✓ CPN-FHIS-21-2022 Asistente Coordinador General
- Entregado y en uso el local para el funcionamiento de las oficinas de la UEP.

xxi. PROBLEMÁTICA

Al final del IV Trimestre, ya se cuenta con los primeros subproyectos en ejecución, 26 centros educativos. Sin embargo, el inicio de obras no se dio con la agilidad programada. Primero, las empresas supervisoras debían iniciar operaciones antes del inicio de los subproyectos y la contratación de la misma, demoró más de lo esperado debido a la modalidad de contratación la cual incluye negociaciones que exceden a los tiempos planificados. Segundo, las empresas constructoras demoraron en presentar los requisitos solicitados por la institución para proceder con las firmas de contratos. Por último, las condiciones climáticas en el país retrasan el inicio de las obras debido a carreteras incomunicadas y a zonas de intervención en condiciones vulnerables.

Los subproyectos de agua y saneamiento están en proceso de revisión con el Banco Mundial, quienes han agregado requerimientos de información a los expedientes y a los Planes de Gestión

Ambiental y Social (PGAS). Subsancar estos documentos está tomando tiempo que no estaba planificado por lo que se retrasa el lanzamiento de los respectivos procesos de adjudicación.

En conclusión, la UEP del proyecto PRE debe cumplir con los requerimientos del Banco Mundial y de la institución FHIS-SEDECOAS. Dicho cumplimiento, conlleva varias sesiones de revisión y subsanación lo que ralentiza el inicio de la ejecución de los subproyectos. Se considera que esto continuará sucediendo en los primeros subproyectos de cada tipología ya que cada uno conlleva sus particularidades que no se han abordado anteriormente.

La mayoría de las formulaciones de los subproyectos efectuadas por formuladores externos y recibidas por el proyecto PRE carecen de análisis de gestión de riesgos: accesibilidad; obras de mitigación; hidrosanitarios; estabilización de taludes; medidas compensatorias, contra incendios, de comunicación y de señalización, y, requieren actualización de costos y cantidades de obra.

El atraso en la conformación de la Unidad Ejecutora del Proyecto ha afectado el cumplimiento de metas físicas y financieras.

xxii. RETOS

- ✓ Lanzamiento de procesos de adquisición de los subproyectos de agua y saneamiento y viales.
- ✓ Definir con el Banco Mundial estrategias para la simplificación de requisitos y procesos para la eficiente ejecución de subproyectos de emergencia.

CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA



✓ **Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)**

i. Antecedentes

El Estado de Honduras ha revalorizado la educación como elemento fundamental para el desarrollo integral de todos los hondureños, mediante la implementación de la Tercera Reforma Educativa, que responde a las expectativas de la sociedad, cuyos alcances se enmarcan en los objetivos No.1 y No.4 de la Visión de País 2010-2038; Plan de Nación 2010-2022; que estipulan: “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidados de previsión social” y “Honduras con un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo. Para la ejecución de esta Tercera Reforma, se aprueba en el año 2012, la Ley Fundamental de Educación y en el año 2014 sus 22 Reglamentos.

-Fortalecimiento de la Secretaría de Educación conforme a la Ley Fundamental de Educación (LFE), principalmente en dos aspectos: i) descentralizar funciones operativas en las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de Educación; y ii) fomentar la participación comunitaria en la gestión educativa, formulación y coordinación de los planes estratégicos, que apunten a mejorar la calidad educativa.

El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Educación, garantiza el derecho fundamental a la educación, el acceso a una educación de calidad en condiciones de equidad, sin discriminación de ninguna naturaleza en todos sus niveles. La Ley Fundamental de Educación recupera el espíritu de garantizar este derecho, estableciendo el compromiso de brindar educación gratuita en todos sus niveles; un año obligatorio en Educación Pre-Básica (tercer grado) y tres ciclos de Educación Básica (I, II y III ciclo). Con ello, se logra la meta establecida de país, que para el año 2038, Honduras debe elevar la escolaridad promedio a 9 años (1º a 9º grado), reconociendo que es necesario formar educandos para la

convivencia, derechos humanos, responsabilidad social, cuidado de las personas, entendimiento del entorno, protección del medio ambiente y la educación media ha sido considerada, hasta finales del siglo XX, como el período de preparación de los jóvenes para el ingreso a la educación superior y también como la enseñanza que proporciona entrenamiento técnico-vocacional, preparando a los jóvenes para su inserción en la vida productiva. En general, la educación media tiene como propósito ofrecer la experiencia formativa para incorporarse al mundo del trabajo y/o proseguir estudios en el nivel de educación superior.

ii. Objetivo General

Fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros Educativos Media y sean promovidos con la calidad requerida.

iii. Focalización

El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.

iv. Beneficiarios

El Programa beneficiará 480 niños de Educación pre-básica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes.

v. Duración

La duración del programa es de 3 años desde el 2021 hasta el 2023 donde habrá un desarrollo gradual de la infraestructura y la dotación de equipo, así como la formación permanente y la plataforma virtual para emprendimiento.

vi. Costo Total del Programa

Este es un esfuerzo de la Republica de Honduras, a través de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por US\$80,000,000.00 que tiene como meta llegar a la población educativa de los diferentes niveles que atiende el sistema educativo nacional.

vii. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	507.311.663,00	114.393.414,00	23%
2022	438.079.338,00	860.314,43	0%

viii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2022
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	L 786.794,43
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	L 73.520,00
TOTAL	L 860.314,43

ix. Principales Logros IV Trimestre

A la fecha del presente informe se tiene aprobados 62 Proyectos por el Comité de Operaciones, y 43 en etapa de formulación. De los 62 proyectos que se encuentran aprobados 52 Proyectos se encuentran en proceso de contratación, 8 proyectos se están en proceso de preparación de bases de licitación y 2 que serán dados de baja uno por estar incluido en otro programa y otro a petición de SEDUC.

De los proyectos que se encuentran en etapa de formulación 25 de ellos están en etapa de revisión y atención de observaciones por SEDUC, 12 proyectos están en diseño de 4 formuladores externos contratados por el Programa, 4 de ellos fueron dados de baja por problemas de legalidad del terreno y 2 se encuentran listos para enviar a aprobación del Comité de Operaciones.

A manera de ejemplo a continuación se presenta un cuadro resumen con el estado de los procesos y proyección del inicio y fin de los mismos.

		Monto	Fecha Prevista Inicio	Fecha Prevista Fin	# de Centros Escolares
Proceso 1	Supervisión	L 3,210,898.68	24/1/2023	21/8/2023	8
	Construcción	L 30,649,124.43	7/2/2023	7/8/2023	
Proceso 2	Supervisión	L 12,340,855.47	13/2/2023	11/8/2023	16
	Construcción	L 66,189,768.86	27/2/2023	21/7/2023	
Proceso 3	Supervisión	L 638,638.23	13/2/2023	11/9/2023	1
	Construcción	L 9,825,203.52	27/2/2023	27/7/2023	
Proceso 4	Supervisión	L 7,835,852.23	3/5/2023	15/2/2024	27
	Construcción	L 119,106,839.47	17/5/2023	30/1/2024	
TOTAL	Supervisión	L 24,026,244.61			52
	Construcción	L 225,770,936.28			

1. Se han aprobado 52 proyectos en comité de inversiones por un monto de **L 287,591,563.12** de los cuales **L 244,359,524.03** se encuentran proceso de contratación.
2. Se ha iniciado con la contratación de 10 personas que vendrán a fortalecer la Unidad Ejecutora del Programa, los cuales se tiene previsto iniciar a inicios del mes de febrero del año 2023.
3. Se ha iniciado la gestión para la priorización de 23 Centros Educativos más con el BCIE, mismos que vendrá a dinamizar el ciclo de contratación para el primer trimestre del año 2023.
4. Se ha avanzado con la negociación para la revisión de auditoría para los periodos 2021 y 2022, con la firma auditora, se tiene previsto solicitar No Objeción la primera quincena del mes de enero de 2023.
5. Inició funciones la Coordinación Financiera del Programa, misma que ha iniciado gestiones ante la Secretaría de Finanzas para la apertura de códigos, y se ha iniciado a cargar los primeros gastos del Programa.
6. Se resolvió la situación de los contratos de los 4 diseñadores externos, contratos que se venían arrastrando desde el periodo anterior (2021).

x. Próximos Retos

Entre los principales retos que enfrenta:

1. Finalizar con el proceso de contratación de los profesionales que conforman la Unidad Ejecutora del Programa.
2. Se debe concluir con el proceso de contratación de obras y supervisión de obras para los 52 proyectos que se encuentran en diferentes etapas.
3. Concluir con el proceso de Auditoría Externa al programa para los periodos 2021 y 2022.
4. Realizar la programación del año de manera conjunta con SEDUC-FHIS-BCIE, para el año 2023.

✓ **Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira.**

i. Antecedentes.

El Estado de Honduras ha revalorizado la necesidad de mejorar el servicio de suministro de agua potable en la ciudad de Gracias, mediante la implementación de un sistema de abastecimiento de agua potable cuyos alcances se enmarcan en los objetivos No.3 y No.4 de la Visión de País 2010-2038; Plan de Nación 2010-2022; que estipulan: “Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental” y “Honduras con un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo”.

Según la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento, El Estado, como responsable de propiciar el bienestar económico, político, social y cultural de los hondureños, es responsable de cuatro funciones básicas: 1. Garantía de acceso a servicios de Agua Potable y Saneamiento de calidad y con eficiencia a la población. 2. Ampliación de la cobertura del servicio, especialmente en comunidades rurales y en comunidades urbanas de escasos recursos. 3. Garantía, bajo principio de solidaridad, de acceso al agua potable a sectores excluidos del servicio por razones de pobreza. 4. Gestión de recursos para el desarrollo de servicios de agua potable y saneamiento, estableciendo las prioridades, los criterios de recuperación de inversiones, asignación de capital, acorde con capacidades financieras respectivas.

ii. Objetivo

El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los servicios de agua potable para la población del municipio de Gracias, Departamento de Lempira, aumentando la cantidad y la calidad del agua suministrada, a través de la ampliación del sistema de abastecimiento, mediante el desarrollo de la infraestructura hidráulica.

iii. Localización

El Proyecto estará localizado en la Ciudad de Gracias en el Departamento de Lempira.

iv. Beneficiarios

El Proyecto beneficiará 22,681 personas en el año 2022 de los cuales 11,005 son hombres y 11,676 son mujeres y en un periodo de 40 años lo estarían alcanzando un estimado de 76,889 personas.

v. Duración

La duración del Proyecto es de 4.1 años (49.2 meses) incluyendo actividades de gestión, socialización, adquisiciones, ejecución, etc. Y se estima además 2 años para la operación y mantenimiento antes de hacer el traspaso a la UMASG.

vi. Situación Actual del Proyecto

El proyecto ha logrado dar cumplimiento a las condiciones previas al primer desembolso, y el 20 de diciembre se recibió el mismo por US\$1,617,085.33, valor necesario para hacer frente a los compromisos del proyecto en los próximos 6 meses.

Se requiere llevar a cabo la revisión del diseño.

vii. Costo Total del Proyecto

US\$36, 000,000.00, el monto final se definirá en el proceso de formulación.

viii. Fuente Financiera

Este es un esfuerzo de la República de Honduras, a través de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por US\$36,000,000.00 que tiene como meta llegar a la población de Gracias, Lempira.

ix. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2022	193.172.460,00	28.412.086,07	15%

x. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2022
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	25.577.520,95
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	2.834.565,12
TOTAL	28.412.086,07

xi. Principales avances

- Se logró dar cumplimiento a las condiciones previas al primer desembolso
- Se logró efectuar el primer desembolso del proyecto por un monto de US\$1,617,085.33 el pasado 20 de diciembre
- Se realizó la regularización de L28,412,086.07 que corresponden en parte al pago del Diseño del proyecto que debían reconocerse al BCIE y en parte a las comisiones cobradas por el BCIE
- Se tienen listas las adjudicaciones de los primeros 5 procesos de contratación para Unidad Coordinadora del Proyecto, quienes serán contratados a partir del mes de enero.

CARTERA KfW Entwicklungsbank



✓ Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V

i. Objetivo General



Consiste en la utilización de centros educativos mejorados, ampliados o nuevos y equipados bajo conceptos pedagógicos que operan de manera sostenible por la comunidad educativa. De esta manera se pretende contribuir a que niños/as y jóvenes de regiones pobres utilicen una oferta de alta calidad educativa, tanto formal como de educación vocacional.

ii. Focalización

Fase IV: El Área de intervención abarcará los departamentos que están siendo intervenidos en las fases anteriores (Zona de Occidente): 1) Copán, 2) Santa Bárbara, 3) Intibucá, 4) Lempira, 5) La Paz, 6) Ocotepeque. 7) Centros a nivel nacional en casos de emergencia (catástrofes naturales). La información de estos centros deberá ser actualizada en el plan maestro y sólo si se determina su precariedad, podrán ser intervenidos previo a No Objeción del KfW. 8) Adicionalmente se extenderá el área de intervención a los departamentos adyacentes a la zona de occidente, delimitando el área de intervención a través de la Carretera Panamericana. Los municipios a ser beneficiados se encuentran al oeste de la misma en los siguientes departamentos: 1) Choluteca, 2) Valle, 3) Francisco Morazán (exceptuando el núcleo urbano de Tegucigalpa), 4) Comayagua y adicionalmente 5) Gracias a Dios.

Fase V: El Área de intervención abarcará los departamentos de: Ocotepeque, Lempira y Copan, en la zona de Occidente. Además, los departamentos al oeste de la carretera CA-5 de los departamentos de Francisco Morazán (exceptuando el Distrito Central), Valle, Choluteca, Comayagua. También seguirá formando parte del Programa el Departamento de Gracias a Dios (siempre y cuando no se alcance un **mínimo** de infraestructura en este departamento y según las experiencias de la fase IV del PROMINE).

iii. **Priorización de los Centros Educativos**

Esta es realizada por la Secretaría de Educación apoyados en la herramienta del Plan Maestro de Infraestructura Educativa.

iv. **Descripción del Proyecto**

Fase IV: El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y en la planificación estratégica para los años 2014 - 2018 de la Secretaría de Educación (SE). El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las tres fases previas PROMINE I, II y III. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

Fase V: El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y el Plan Estratégico del Sector de Educación para los años 2017 - 2030 de la Republica de Honduras. El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las cuatro fases previas PROMINE I, II, III y IV. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

v. **Monto del Proyecto:**

Fase IV:

Fondos de Donación por un monto de EUR 15,000,000.00, Contrapartida Nacional para SEDECOAS/FHIS de EUR 424,000, Contrapartida Nacional para SE de EUR 218,000, Contrapartida Municipal de EUR 515,000 y Contrapartida Comunitaria de EUR 514,000.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 03/12/2015

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 17/02/2017

Fecha de Inicio: 02 de abril 2018 (Se considera la fecha de inicio de la Consultoría)

Fecha de Finalización de convenio: 30/11/2022

Fase V:

Fondos de Donación por un monto de EUR 10,000,000.00, Contrapartida Nacional para IDECOAS/FHIS de EUR 495,000, Contrapartida Nacional para SE de EUR 250,000, Contrapartida Municipal de EUR 600,000 Contrapartida Comunitaria de EUR 600,000.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 06/07/2018

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 21/03/2019

Fecha de Inicio: Inicio de la Consultoría 18/3/2021

Fecha de Finalización de convenio: 37 meses a partir del inicio de la consultoría

vi. Avance Financiero PROMINE FASE IV y V

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2016	145.687.475,00	142.916.817,45	98%
2017	107.279.375,00	96.731.967,93	90%
2018	53.035.502,00	50.951.601,81	96%
2019	81.069.633,00	79.762.875,76	98%
2020	134.608.478,00	123.221.616,32	92%
2021	139.936.980,00	119.695.679,72	86%
2022	102.757.410,00	66.787.201,74	65%

vii. Avance Físico por Sector PROMINE FASE IV y V

SECTOR	Proyectos Finalizados 2022	Mto. Ejecutado 2022	Empleos Generados 2022	Beneficiarios Directos 2022
EDUCACION	2	57.896.651,75	85	807
TOTAL	2	57.896.651,75	85	807

viii. Avance Físico por Departamento PROMINE FASE IV y V

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2021	Mto. Ejecutado 2022	Empleos Generados 2022	Beneficiarios Directos 2022
COPAN	0	18.363.174,74	0	0
GRACIAS A DIOS	0	6.690.902,89	0	0
INTIBUCA	2	1.432.929,92	85	807
LA PAZ	0	6.245.305,53	0	0
LEMPIRA	0	17.525.683,21	0	0
OCOTEPEQUE	0	7.638.655,46	0	0
TOTAL	2	57.896.651,75	85	807


i. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2021
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	6.854.431,77
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA *	2.036.118,22
TOTAL	8.890.549,99

*Viaticos, pasajes y Combustible

ii. AVANCES GENERALES

FASE IV.

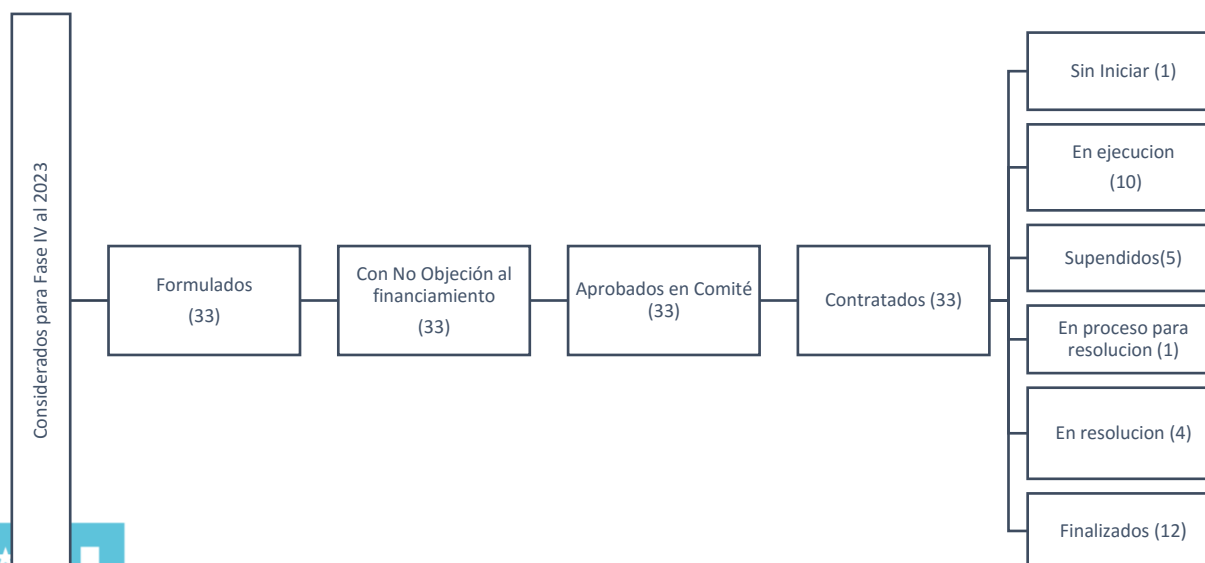


Al finalizar el 2023 y comprometiendo todo el componente de Infraestructura se han considerado 33 proyectos, quedando un remanente para ordenes de cambio, clausula por incremento de precios y/o revaluaciones de convenio. A continuación, se detallan el estatus y el monto que corresponde:

Estatus	%	N° de Proyectos	Total, Contratado	Total, Ejecutado	Total, por Ejecutar
Sin Iniciar	3.03%	1	L12,951,927.03	L6,487,960.72	L6,463,966.31
En ejecución	30.30%	10	L132,552,469.67	L118,678,438.76	L13,874,030.91
En proceso para envío a resolución de contrato	3.03%	1	L3,428,106.14	L5,971,215.41	L2,543,109.27
En resolución de contratos	12.12%	4	L18,623,674.36	L28,094,373.49	L9,470,699.13
Finalizado	36.36%	12	L112,071,759.92	L112,071,759.32	L0.60
Suspendido	15.15%	5	L65,296,288.80	L60,857,437.97	L4,438,850.83
Total, general	100.00%	33	L344,924,225.92	L332,161,185.67	L12,763,040.25

iii. Avance Físico FASE V.

Al finalizar el 2022 se tienen proyectos con avances significativos en la formulación los cuales se podrán iniciar ejecución en el 2023, también se tiene un proyecto al cual ya se le desembolso sin embargo iniciaría hasta el 2023 al finalizar el primer bloque de capacitación.

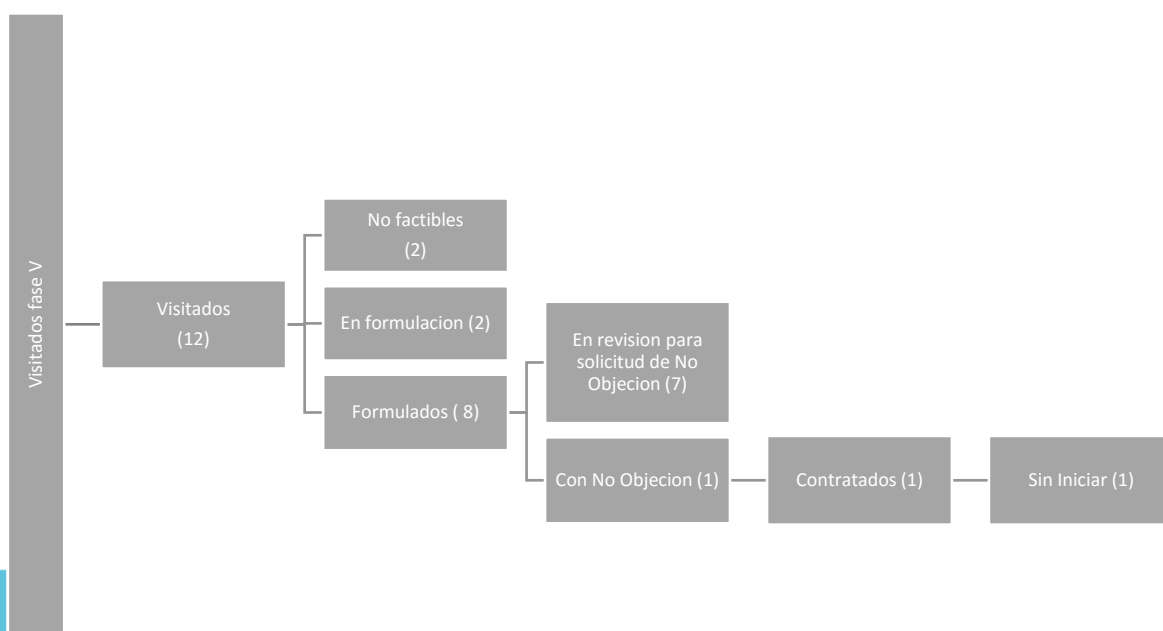

A continuación, se presenta el detalle de montos y estatus de los proyectos:

Estatus	N° de Proyectos	Total, Formulado	Total Contratado	Total Ejecutado	Total por Ejecutar
En formulación	2	L20,355,786.29	L0.00	L0.00	L0.00
Formulación finalizada	7	L120,801,803.12	L0.00	L0.00	L0.00
No factible	2	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00
Sin Iniciar	1	L13,467,743.88	L13,467,743.88	L6,782,591.81	L6,685,152.07
Total general	12	L154,625,333.29	L13,467,743.88	L6,782,591.81	L6,685,152.07

iv. AVANCE FINANCIERO SEGÚN PRESUPUESTO ASIGNADO FASE VI Y FASE V

Año	Planificado al IV Trimestre	Ejecutado	Eficiencia
2022	97.741.819,00	66.787.201,74	68%

El inicio de la gestión del PROMINE en el 2022 se vio impactada por:

Para la fase IV.

- La aprobación por el Congreso Nacional de los proyectos que trascendieron el periodo de Gobierno que se realizó hasta el 11 de octubre, lo cual mantuvo a los proyectos suspendidos, pudiendo iniciar la ejecución financiera de ellos hasta en el mes de noviembre.
- El incremento de precios en materiales y mano de obra, genero la necesidad de realizar análisis para la conclusión de los proyectos, considerando que los contratos no estiman cláusula por incremento, para lo cual se definió un procedimiento dentro de la metodología PEC que considere incrementos en los rubros indicados, sin embargo, se pudo iniciar a desembolsar hasta en el mes de noviembre ya que los proyectos requerían de la aprobación del Congreso Nacional indicada en el inciso anterior.
- Considerando el inciso a y b, la modalidad de ejecución PEC y la necesidad de reestructuración de algunos comités de proyectos, la reactivación de los proyectos

suspendidos se ha visto impactada, por lo cual a la fecha existen proyectos que se podrán reiniciar hasta enero 2023.

- d. Adicionalmente la formulación, contratación e inicio de los nuevos proyectos para comprometer la totalidad de los recursos del componente de Infraestructura tuvo su impacto ya que fue necesario revisar alcances, verificar factibilidades y nuevas socializaciones con los actores locales.
- e. También existen 5 proyectos en resolución de contrato en los cuales ha tenido que realizarse la revisión de la obra reconocido, los gastos reconocidos e iniciar un proceso de resolución y posterior la recuperación de los fondos de los proyectos que están en proceso de resolución.

Para la fase V.

- a. La formulación y contratación de los primeros proyectos al igual que en fase IV tuvo su impacto ya que fue necesario revisar alcances, verificar factibilidades y nuevas socializaciones con los actores locales.
- b. También fue necesario la reformulación de los 5 proyectos en resolución de contrato para que estas terminaciones sean finalizadas con fase V bajo una modalidad centralizada.

Dado lo anterior se realizaron en el transcurso del año varios ajustes presupuestarios y de programación física y al finalizar el año se tiene lo siguiente:

La ejecución financiera considerando el presupuesto vigente la ejecución del PROMINE es del 65%, sin embargo, la nota técnica para el decremento de 26,245,872.00 está en proceso interno de la SEFIN y se nos ha informado que esta se concluirá, pero a la fecha únicamente se mira reflejado en el disponible del presupuesto, partiendo de este decremento la ejecución podrías ser del 87.5.

La ejecución física considerando la meta ajustada para entrega de centros educativos era de 5 proyectos sin embargo partiendo de las dificultades de la reactivación únicamente se finalizaron 2, quedando el resto para su finalización en enero 2023.

v. LOGROS IV TRIMESTRE

- Finalizados dos proyectos en el departamento de Intibucá

RETOS PROXIMOS

Entre los principales retos que enfrenta el PROMINE-KfW:

1. Con base a que el PROMINE no cuenta con una Unidad Ejecutora y que los procesos dependen de cada una de las Direcciones de Línea con el apoyo de la Coordinación y que en este año se realizaron los cambios de autoridades en dichas Direcciones para que el año 2023 se espera que los procesos se realicen con mayor fluidez.
2. La ejecución del PROMINE en el presente año se vio afectada por factores tanto externos como internos, impactando en la ejecución física y financiera del programa, teniendo que hacer constantes reprogramaciones a lo largo del 2022 y lo cual conlleva a que el 2023 será un año en el que se requiere de mayor apoyo en la Dirección de Control y Seguimiento para el impulso de los proyectos.
3. Considerando la modalidad de ejecución del PROMINE la cual es altamente social, esta se mira afectada cuando se presentan atrasos de manera Institucional ya que los actores locales pierden el impulso en la ejecución de los proyectos y el apoyo en los aportes, por lo cual el reto es mantener motivada a las comunidades e impulsar el cumplimiento de los aportes.
4. Impulsar la ejecución física y financiera de los proyectos.
5. Impulsar la formulación de proyectos para la fase V

✓ **Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras
(CONVIVIR) Fase II**



i. Objetivo General

Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).

ii. Focalización

A través de un proceso de concurso con criterios de selección predefinidos en el acuerdo separado y evaluación de propuestas técnicas alineadas a los componentes del programa fueron seleccionados 4 municipios en donde se está realizando la intervención del CONVIVIR a través de obras de infraestructura y medidas de alcance social para beneficio enfocado en la juventud. Así mismo se definieron los barrios, colonias o comunidades urbanas en donde se focaliza las acciones y en donde ya se ha realizado una labor de socialización de los alcances, compromisos y beneficios para la población. Los municipios seleccionados son:

- Municipio de Juticalpa, departamento de Olancho
- Municipio de Intibucá, departamento de Intibucá
- Municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá
- Municipio de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán

iii. Descripción del Proyecto

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

iv. Monto del Proyecto:

Los fondos destinados para la ejecución de este Programa para la Fase II es de EUR 6,000,000.00 Contrapartida Nacional para IDECOAS/FHIS de EUR 600,000.00, Contrapartida Municipal de EUR 300,000 Contrapartida Comunitaria de EUR 300,000.

Fecha de Inicio del Programa de convenio Fase II: 14/07/2021

v. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	19.897.004,00	8.372.701,20	42%
2022	44.370.387,00	26.573.808,83	60%

vi. Avance Físico por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2022	Mto. Ejecutado 2022
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	0	21.413.909,95
TOTAL	0	21.413.909,95

vii. Avance Físico por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2022	Mto. Ejecutado 2022
COMAYAGUA	0	7.059.660,45
INTIBUCÁ	0	7.460.689,03
OLANCHO	0	6.893.560,47
TOTAL	0	21.413.909,95

CONVIVIR FASE II, termino su fase de preparacion el abril del año 2022, sin embargo, dichos proyectos se encuentran en la fase de contratación, por lo antes expuesto no hay proyectos que reportar.

viii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2022
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	3.058.362,93
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	2.101.535,95
TOTAL	5.159.898,88

ix. LOGROS Y AVANCES

**A. COMPONENTE 1 CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA-
AVANCE FISICO**

En el mes de marzo 2022 se finalizó la fase de análisis para la confirmación de los proyectos de infraestructura seleccionados.

Los pasos que se siguieron para la selección de Comunidades/Obras de Infraestructura fueron detallados en el Informe de Finalización de la Etapa de Preparación presentado en el mes de abril 2022.

El Informe antes indicado también incluyó una breve descripción de los alcances preliminarmente identificados para cada una de las obras de infraestructura, los cuales serán consensuados las comunidades durante asambleas generales comunitarias en la etapa de diseño y formulación.

Los proyectos de infraestructura seleccionados para cada uno de los Municipios del Proyecto se encuentran en la Fase de Contratación de Diseñadores y Formuladores.

Los TdR para el Concurso Público Nacional para la contratación de los Diseñadores y Formuladores fueron No Objetados por la Asistencia Técnica en fechas 4 y 12 de julio 2022 (Estos TdR se presentan a manera de ejemplo en el Anexo 3 de este Informe).

Tabla 1: Priorización de Barrios y/o Comunidades a Intervenir en el Municipio de Santa Rosa de Copán

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Plaza Juvenil Brisas de Copán (Obra de Confianza)	Barrio El Duende	3,800,000.00	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el 50%
2.	Casa de la Juventud	Barrio El Carmen	9,000,000.00	➤ SEDECOAS-FHIS realizara la formulación internamente por lo que se estima iniciar en febrero del 2023
3.	Plaza El Mirador – Santa Teresa	Barrio Santa Teresa, sector La Cuchilla	4,400,000.00	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el 50%
Monto Total de Inversión Estimado			17,200,000.00	

Tabla 2: Priorización de Barrios y/o Comunidades a Intervenir en el Municipio de Intibucá

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Parque La Pirámide (Obra de Confianza)	Barrio El Way, Sector No. 1	2,275,000.00	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el 50%
2.	THAU MISHU (Casa de La Juventud)	Colonia Guagua	10,400,000.00	➤ SEDECOAS-FHIS realizara la formulación internamente por lo que ya se inició con el proceso del anteproyecto

3.	Ruta Lenca de la Juventud	Barrio El Way	4,250,000.00	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el 50%
Monto Total de Inversión Estimado			16,925,000.00	

Tabla 3: Priorización de Barrios y/o Comunidades a Intervenir en el Municipio de La Esperanza

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Paseo Cultural Lenca (Obra de Confianza)	Colonia Buenos Aires	4,050,000.00	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el 50%
2.	Plaza de La Juventud Buenos Aires	Colonia Buenos Aires	7,500,000.00	➤ SEDECOAS-FHIS realizara la formulación internamente por lo que se estima iniciar en febrero del 2023
3.	Centro Deportivo Integral San Carlos	Colonia San Carlos	6,850,000.00	➤ SEDECOAS-FHIS tiene previsto iniciar la elaboración de los TdR para la contratación del Diseñador y Formulator en el mes diciembre 2022, con lo cual se estima finalizar dicha contratación a finales de enero 2023.
Monto Total de Inversión Estimado			18,400,000.00	

Tabla 4: Priorización de Barrios y/o Comunidades a Intervenir en Juticalpa

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Cancha ABE y BEN (Obra de Confianza)	Colonia La Solidaridad	2,250,000.00	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el 50%

2.	Centro de Formación Integral Juvenil	Barrio El Centro	10,800,000.00	➤ SEDECOAS-FHIS realizara la formulación internamente por lo que ya se inició con el proceso del anteproyecto
3.	Parque Recreativo de La Juventud	Aldea La Concepción	4,805,000.00	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el 50%
Monto Total de Inversión Estimado			17,855,000.00	

B. COMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES LABORALES Y SOCIALES DE JOVENES

En la semana del 2 al 6 de mayo 2022, SEDECOAS-FHIS realizó nuevamente una gira por los municipios de incidencia del Proyecto con el propósito de brindar acompañamiento a: (i) ANED Consultores, quienes trabajaron en el estudio de Línea Base y el Diagnóstico de Necesidades Formativas para los y las Jóvenes y (ii) Espirállica Research & Consulting, quienes llevaron a cabo la consultoría del Diagnóstico de Necesidades e Intereses de Fortalecimiento para la Mejora de la Gestión Municipal enfocada en el Desarrollo de la Juventud en las comunidades seleccionadas.

En esta gira las empresas consultoras socializaron los resultados de los estudios, diagnósticos y planes de formación, con la participación de Jóvenes, Líderes Comunitarios, Sociedad Civil, Entes Gubernamentales y Representantes de las Municipalidades.

El proceso de investigación de “Línea Base, Diagnóstico de Necesidades de Juventud y Propuesta de Plan para el Fortalecimiento de las Necesidades de Formación para Jóvenes” encargado a la empresa de consultoría ANED Consultores ha concluido con la aprobación de sus productos por parte del equipo de La SEDECOAS-FHIS y La Asistencia Técnica. A la fecha de cierre del presente Informe estos documentos se encuentran en proceso de diagramación final para dar por concluido este proceso de consultoría.

Se realizo convenio con FIPADEH el cual se desembolsó el 70% para la ejecución de los talleres con juventud en los municipios de CONVIVIR.

x. Desafíos de CONVIVIR:

1. Concienciar a la población meta (constituida por la juventud entre 12 y 30 años) para el logro del objetivo general y específico del programa.
2. Lograr la participación ciudadana y los gobiernos locales de los municipios del área de influencia del programa para contribuir a la efectividad del trabajo de los jóvenes participantes.
3. Impulsar iniciativas de capacitación y de proyectos empresariales para generar autoempleo y contrarrestar el flujo migratorio a los centros urbanos del país y al exterior.
4. Lograr el cumplimiento de los plazos establecidos en el ciclo de proyectos FHIS, para la ejecución de los proyectos según lo programado.

**CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL
DEVELOPMENT (USAID)**



✓ **Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)**

A. Objetivo General

El propósito de esta Actividad es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

B. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en las cinco municipalidades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Tela y La Ceiba. Las comunidades específicas de intervención serán identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

C. Descripción del Proyecto

Esta Actividad ayudará al GdeH (representado a través de FHIS) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otras partes interesadas. La Actividad incluye dos resultados complementarios: Resultado 1: Mejora de la infraestructura comunitaria, las

actividades responderán a las prioridades de infraestructura comunitaria para abordar la seguridad ciudadana. Resultado 2: Aumento de la cohesión comunitaria, considera que la forma en que las intervenciones de infraestructura son concebidas, diseñadas y ejecutadas pueden desempeñar un papel directo en el aumento de la cohesión social y comunitaria y promover un marco holístico de prevención de la violencia. Los proyectos bajo la Actividad incluirán instalaciones educativas, centros de salud, alumbrado público, espacios comunitarios más seguros, centros de alcance y comunitarios, centros vocacionales, jardines comunitarios, parques, espacios recreativos, paradas de buses, accesos peatonales, mejoras al alumbrado de calles, señalización, instalaciones para el sector seguridad y justicia, así como otros proyectos de infraestructura de pequeña escala que se acuerde entre las Partes.

D. Monto del Convenio

Presupuesto total estimado: \$14,637, 541.74, de los cuales, fondos de donación de USAID: \$11, 710,033.39; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$ 2, 927,508.35 (efectivo: \$ 2,127,508.35 y especies: \$ 800,000.00).

i. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	23.226.555,00	21.906.553,68	94%
2019	60.781.669,00	60.781.669,00	100%
2020	145.322.291,00	60.678.681,68	42%
2021	67.508.910,00	42.626.620,46	63%
2022	57.711.016,00	55.047.658,54	95%

ii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2022	Mto. Ejecutado 2022	Empleos Generados 2022	Beneficiarios Directos 2022
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	12	21.160.955,00	211	2.758.046
EDUCACION	6	15.459.770,00	190	8.066
TOTAL	18	36.620.725,00	401	2.766.112

iii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2022	Mto. Ejecutado 2022	Empleos Generados 2022	Beneficiarios directos 2022
ATLANTIDA	5	9.796.970,00	148	1.454.976
CORTES	9	18.573.021,00	198	9.084
FRANCISCO MORAZAN	4	8.250.734,00	55	1.302.052
TOTAL	18	36.620.725,00	401	2.766.112

iv. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2022
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	16.060.414,00
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	2.366.519,54
SUB TOTAL	18.426.933,54

v. Principales Logros (octubre-diciembre 2022)

COMPONENTE TECNICO

Proyectos Ejecutados

Con las cartas de ejecución CdE 04 y CdE 11 Se financiaron desde el 2017 al 2022 59 proyecto de cartera regular y proyectos de Covid-19.

No.	Localización Proyecto	Categoría	Aportes en Lempiras
1	Atlántida Reparación y obras complementarias Escuela Ramón Montoya	Centro Educativo	6,250,000.00
2	Atlántida Reparación CEB José Valentín Vásquez	Centro Educativo	4,000,000.00
3	Atlántida Construcción Kínder Mirian Lobo	Centro Educativo	2,999,675.92

4	Atlántida	Ampliación y Mejoras CEB Marco Antonio Ponce	Centro Educativo	4,892,345.36
5	Atlántida	Ampliación Centro de Alcance	Centro de Alcance	1,817,919.06
6	Atlántida	Construcción de Obras Complementarias Las Mercedes	Centros Educativos/Centro de Alcance	400,000.00
7	Atlántida	Reparación CEB Claudio Barrera	Centro Educativo	6,000,000.00
8	Atlántida	Construcción de Centro Integral Corozal	Proyecto Comunitario	3,291,818.76
9	Atlántida	Construcción de Centro de Alcance El Corozal	Centro de Alcance	2,323,481.76
10	Atlántida	Reparación CEIN y Ampliación MAIE	Sector Operadores de Justicia	4,000,000.00
11	Atlántida	Ampliación Espacio Físico Municipal	Proyecto Comunitario	1,920,000.00
12	Atlántida	Construcción Posta Policial Bonitillo	Sector Operadores de Justicia	3,590,634.33
13	Atlántida	Reparación CEB Miguel Paz Barahona	Centro Educativo	137,305.22
14	Atlántida	Reparación Instituto Triunfo de la Cruz Fase I	Centro Educativo	1,967,619.19
15	Atlántida	Reparación Instituto Triunfo de la Cruz Fase II	Centro Educativo	3,782,380.81
16	Cortés	Pavimentación Calle Principal hacia los Juzgados (Ruta Segura)	Proyecto Comunitario/Sector Operadores de Justicia	2,722,469.41
17	Cortés	Pavimentación Calle Principal Col. López Arellano (Ruta Segura)	Proyecto Comunitario	2,980,291.32
18	Cortés	Construcción Techo a Cancha Multiusos	Proyecto Comunitario	1,350,000.00
19	Cortés	Obras Complementarias CEB José Antonio Peraza	Centro Educativo	2,431,860.79
20	Cortés	Reparación Escuela Carlos Rivera López	Centro Educativo	2,577,284.86
21	Cortés	Construcción Obras Complementarias Instituto Polivalente Las Brisas	Centro Educativo	1,100,000.00
22	Cortés	Ampliación CEB Dr. Alfonso Lacayo	Centro Educativo	6,000,000.00
23	Francisco Morazán	Reparación de Casa Alianza Centro	Proyecto Comunitario	4,782,750.30

24	Francisco Morazán	Mejoras Centro de Alcance (CDA) Estados Unidos	Centro de Alcance	240,000.00
25	Francisco Morazán	Mejoras al Centro de Alcance (CDA) Las Ayestas	Centro de Alcance	1,193,312.20
26	Francisco Morazán	Reparación Instituto Reynaldo Narváez Rosales	Centro Educativo	2,922,825.21
27	Francisco Morazán	Construcción Ruta Segura a Centro de Alcance	Proyecto Comunitario	3,588,557.09
28	Atlántida	CEB Antonio Jose Coello-2	Centro Educativo	545,000.00
29	Atlántida	CEB Marco Aurelio Soto-1	Centro Educativo	540,000.00
30	Cortés	Escuela Alex E. Alanis Lagos-4	Centro Educativo	480,000.00
31	Atlántida	UDEP La Ceiba Construcción Centro de Alcance Barrio La Isla (Obra de Confianza)	Centro de Alcance	960,000.00
32	Cortés	UMEP-7 Reparación y Ampliación CDA Arenales (Obra de Confianza)	Centro de Alcance	867,757.38
33	Francisco Morazán	UMEP-1 Iluminación Calle Principal Colonia Izaguirre (Obra de Confianza)	Proyecto Comunitario	278,302.51
34	Atlántida	Construcción Laboratorio Regional Atlántida de Virología	Proyecto relacionado con COVID-19	4,599,577.43
35	Atlántida	Construcción de Clínicas y Áreas de descanso en Hospital Regional Atlántida	Proyecto relacionado con COVID-19	6,248,572.23
36	Cortés	Acondicionamiento y Mejoras al Laboratorio de Virología de SPS	Proyecto relacionado con COVID-19	2,194,300.71
37	Cortés	Construcción de Bodega de Insumos de la Regional de Salud No.5 y Obras Complementarias.	Proyecto relacionado con COVID-19	800,192.42
38	Francisco Morazán	Reparación Almacén Nacional de Biológicos - Bodega Ultra Frío	Proyecto relacionado con COVID-19	2,700,000.00
39	Atlántida	Construcción Centro de Alcance Barrio La Isla, Fase II	Centro de Alcance	400,000.00
40	Francisco Morazán	Reparación CDA Divanna	Centro de Alcance	937,000.00

41	Francisco Morazán	Techado e Iluminación de Cancha CDA Estados Unidos	Centro de Alcance	852,000.00
42	Francisco Morazán	Suministro e Instalación de Juegos Infantiles Área Recreativa Cerro Juana Laínez	Proyecto Comunitario	2,030,000.00
43	Atlántida	Reparación CEB Claudio Barrera - Fase II	Centro Educativo	2,900,000.00
44	Atlántida	Reparación y Obras complementarias Escuela Ramón Montoya Fase II	Centro Educativo	2,000,000.00
45	Atlántida	Reparación Instituto Triunfo de la Cruz III	Centro Educativo	1,736,433.84
46	Atlántida	Construcción de Cocina y Obras Varias en CdeA Bo. La Isla, Fase III Lps.400,000)	Centro de Alcance	350,000.00
47	Atlántida	Construcción de Bodega de Insumos de la Regional de Salud No.1 y Obras Complementarias.	Proyecto relacionado con COVID-19	1,553,321.18
48	Atlántida	Suministro e Instalación de Red de Oxígeno y Obras Varias en Salas COVID19	Proyecto relacionado con COVID-19	2,598,956.22
49	Cortés	Reparación del Centro Nor Occidental de Biológicos - Bodega Ultra Frío	Proyecto relacionado con COVID-19	1,987,473.86
50	Francisco Morazán	Reparación de Techo y Obras Complementarias en Anexo SESAL	Proyecto relacionado con COVID-19	537,328.43
51	Francisco Morazán	Construcción Almacén Regional de Biológicos de la RMDC - Bodega Ultra Frío	Proyecto relacionado con COVID-19	4,340,172.48
52	Cortés	Reparación Instituto Modesto Rodas Alvarado	Centro Educativo	4,968,131.88
53	Cortés	Reparación y Equipamiento CEB José Antonio Peraza	Centro Educativo	1,985,220.77
54	Cortés	Reparación y Equipamiento Escuela Carlos Rivera López	Centro Educativo	2,245,894.66
55	Cortés	Reparación y Equipamiento CDA 23 de Septiembre	Centro de Alcance	1,328,158.43
56	Cortés	Reparación y Equipamiento CDA San Juan	Centro de Alcance	1,541,616.18
57	Cortés	Reparación y Equipamiento CDA 10 de Septiembre	Centro de Alcance	907,882.37

58	Cortés	Reparación y Equipamiento CDA La Esperanza	Centro de Alcance	1,224,753.15
59	Cortés	Reparación y Equipamiento CDA Morales III	Centro de Alcance	1,928,760.86

vi. Proyectos En Ejecución

Los proyectos que se encuentran en ejecución actualmente son 9, los cuales se presentan a continuación:

Localización	Proyecto	% Avance	Categoría	Aportes en Lempiras
Cortés	Reparación y Equipamiento CDA 24 de Abril	23%	Centro de Alcance	1,440,000.00
Francisco Morazán	Suministro e instalación de Generador Almacén Regional de Biológicos de la RMDC - Bodega Ultra Frío	65%	Proyecto relacionado con COVID-19	2,880,000.00
Cortés	Reparación CCPREB "La Unidad" (frente a los Juzgados)	63%	Centro Educativo	1,950,000.00
Cortés	Reparación y Obras Complementarias Escuela y kínder Col. Japón	80%	Centro Educativo	850,000.00
Cortés	Construcción Techado de Cancha y Obras Varias en CEB Dr. Alfonso Lacayo	45%	Centro Educativo	2,250,000.00
Atlántida	Reparación y Obras complementarias Escuela Ramón Montoya Fase III	85%	Centro Educativo	3,000,000.00
Atlántida	Reparación CEB José Valentín Vásquez Fase II	99%	Centro Educativo	2,000,000.00
Atlántida	Reparación CEB Claudio Barrera - Fase III	75%	Centro Educativo	3,000,000.00
Cortés	Reparación CEB Padre Claret	50%	Centro Educativo	6,000,000.00

xi. PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN DEL IV TRIMESTRE 2022

De los 19 proyectos que estaban planificados se realizaron 18, debido a que 1 de los proyectos se desfasó al año 2023 por temas administrativos y de contrato.

✓ **Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)**

i. Objetivo General

El propósito de esta Actividad es mejorar las pobres condiciones sociales y económicas son especialmente pronunciadas en el Occidente de Honduras. Extrema pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático. Bajos niveles educativos, migración, falta de acceso a los servicios básicos y otros retos socioeconómicos son endémicos. La provisión de servicios básicos de educación y nutrición son escasos en la zona de Occidente y es difícil el acceso a los ya existentes, así mismo la gestión de servicios de educación, nutrición y agua y saneamiento son deficientes por lo que los ciudadanos cuentan además con pocos espacios de participación para mejorar sus vidas a nivel de hogar y sus vidas productivas, lo que genera una gran brecha de pobreza.

ii. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en los departamentos de Ocotepeque, la Paz, Copan Intibucá, Santa Bárbara y Lempira y zonas occidente específicas de intervención identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

iii. Descripción del Proyecto

Esta Actividad apoyará al FHIS para construir de al menos 14 proyectos de infraestructura comunitaria que potencien otros esfuerzos de USAID para mejorar los servicios relacionados con nutrición, la educación y el acceso al agua seleccionadas dentro de las municipalidades identificadas bajo el Objetivo de Desarrollo 2 de USAID.

iv. Monto del Convenio

El monto total de la Actividad es de \$ 10,544,130.00 (USAID \$ 8,435,304.00, Gobierno de Honduras \$ 2,108,826.00). Según la carta de ejecución No. 034.

v. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2019	6.190.650,00	5.981.569,54	97%
2020	65.583.096,00	13.336.794,49	20%
2021	58.488.260,00	47.180.270,68	81%
2022	37.504.624,00	35.478.196,70	95%

vi. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2022	Mto. Ejecutado 2022	Empleos Generados 2022	Beneficiarios Directos 2022
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	0	2.136.000,00	8	1.057
EDUCACION	4	21.578.312,00	173	1.236
SALUD	2	6.340.989,00	49	420.045
TOTAL	6	30.055.301,00	230	422.338

vii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2022	Mto. Ejecutado 2022	Empleos Generados 2022	Beneficiarios directos 2022
COPAN	2	6.064.697,00	42	415.106
INTIBUCÁ	1	6.403.382,00	49	337
LA PAZ	1	5.359.484,00	43	259
LEMPIRA	1	5.313.821,00	47	5.209
OCOTEPEQUE	1	1.404.202,00	18	206
SANTA BARBARA	0	5.509.715,00	31	1.221
TOTAL	6	30.055.301,00	230	422.338

viii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2022
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	3.921.314,88
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	1.501.580,82
SUB TOTAL	5.422.895,70

ix. Avances del Proyecto (octubre-diciembre)

A. COMPONENTE TÉCNICO

Proyectos finalizados

A la fecha se han finalizado 16 proyectos realizados:

Localización	Proyecto	Categoría	Aportes en Lempiras
Ocatepeque	Ampliación CEB Álvaro Contreras	Centro Educativo	4,980,248.73
Intibucá	Ampliación CEB Francisco Morazán	Centro Educativo	4,977,557.36
La Paz	Reposición Escuela Unión y Fe	Centro Educativo	3,894,320.46
Intibucá	Ampliación CEB Tiburcio Carías Andino	Centro Educativo	4,953,438.10
Lempira	Ampliación Escuela Eusebio Amaya Gómez	Centro Educativo	4,830,980.59
Ocatepeque	Ampliación CEB Prudencio Arita	Centro Educativo	6,336,883.17
Francisco Morazán	Construcción de Cisternas y Cambio de Techo Sala de Operaciones y Neumología Instituto Nacional Cardiopulmonar Torax	Proyecto relacionado con COVID-19	2,110,029.00
Santa Bárbara	Construcción Clínicas y Área de Descanso para Médicos del Hospital Santa Bárbara Integrado (HSBI)	Proyecto relacionado con COVID-19	6,499,961.81
Cortés	Construcción de Área de Descanso para Médicos en el Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela (HLMV)	Proyecto relacionado con COVID-19	1,344,192.00
Copán	Construcción de Laboratorio de Virología en la Regional de Salud No.4	Proyecto relacionado con COVID-19	4,236,402.00

Intibucá	Rehabilitación y Ampliación Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato	Proyecto relacionado con COVID-19	5,874,676.48
Copán	Ampliación Escuela José Cecilio del Valle	Centro Educativo	2,100,000.00
La Paz	Reposición Escuela Nueva Generación Sur	Centro Educativo	2,745,257.28
Lempira	Clínicas de Aislamiento Pacientes COVID Hospital Dr. Juan Manuel Gálvez	Proyecto relacionado con COVID-19	4,392,990.24
Copán	Construcción Bodega de Insumos de la Regional de Salud No.4 y Obras Complementarias	Proyecto relacionado con COVID-19	1,755,203.09
Santa Bárbara	Ampliación Escuela José Olivo Tercero	Centro Educativo	2,114,275.67

Proyectos En Ejecución

Los proyectos que se encuentran en ejecución actualmente son 4 los cuales se presentan a continuación:

Localización	Proyecto	Monitoreo de Proyectos	% Avance	Categoría	Aportes en Lempiras
La Paz	Ampliación Centro de Educación Básica Mariano Martínez	En Ejecución	85%	Centro Educativo	5,532,660.99
Copán	Reposición Escuela Ramón Amaya Amador	En Ejecución	90%	Centro Educativo	2,623,067.85
Intibucá	Ampliación CEB Mi Independencia	En Ejecución	90%	Centro Educativo	6,550,000.00
Santa Bárbara	Reparación CEB Lempira	En Ejecución	98%	Centro Educativo	2,780,000.00

FONDOS NACIONALES

✓ **Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras Convenio BCH-24798-1.**

i. Introducción

El Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras es el resultado de un proceso de priorización de ocho (8) componentes que tendrán un total de 61 proyectos en 48 municipios del país que aportarán a la reducción de la pobreza y a la mejora del bienestar humano de la población.

ii. Nombre del proyecto

El Programa se denomina: “Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras”, el cual estará compuesto por ocho (8) componentes enfocados en la priorización de proyectos relacionados con el mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura escolar, infraestructura social y servicios comunitarios, construcción de puentes vehiculares, infraestructura sanitaria, diseño y estudios de laboratorio de medicamentos y hospital oncológico, obras de protección hídrica y reparación de embaulamiento, fortalecimiento institucional y por último, gestión y administración del programa.

iii. Localización

El Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras estará compuesto por 61 proyectos de infraestructura localizados en 48 municipios en 16 departamento.

iv. Beneficiarios

Alrededor de 4,003,249 personas serán beneficiadas directa e indirectamente.

v. Institución Ejecutora

La Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento y el Fondo Hondureño de Inversión Social (SEDECOAS-FHIS).

vi. Duración en Meses

El proyecto iniciará en agosto del 2022 y finalizará (algunos de sus componentes) en agosto de 2024. En ese sentido, el **Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras**, tendrá una duración de 24 meses.

vii. Costo total del proyecto

El costo total es de 499,700,000 Lempiras y su equivalente en dólares estadounidense son 20,388,927.88 (con tipo de cambio L.24.51 por cada dólar).

viii. Fuente financiera

Este programa se financiará con Fuentes de Financiamiento Internas (Fondos Nacionales).

ix. Antecedentes

Durante el año 2018 el porcentaje de pobreza en hogares en el país alcanzaba un valor del 61.9%, posteriormente dos años después en 2020, este indicador sufrió un incremento de 8 puntos porcentuales llegando a un valor del 70%. Este indicador muestra que de cada 10 hondureños 7 hondureños vive en situación de pobreza, estos valores han colocado a Honduras como uno de los países más desiguales y

con más pobreza de Latinoamérica. Sumado a esto la inestabilidad política, la crisis sanitaria derivada por el COVID-19 y el paso de los huracanes ETA e IOTA han sido algunas de las causantes de esta situación actual.

Esta brecha de pobreza nos da una idea de que tan pobres son los pobres en el país y, por lo tanto, nos proporciona una idea de la profundidad de las carencias de los ingresos, el patrón de consumo y la inaccesibilidad que poseen estos hogares a poder satisfacer sus necesidades básicas que definen aún más su situación de pobreza de las familias hondureñas.

En este sentido, algunas de estas carencias se han visto reflejadas en el poco acceso y disponibilidad que tienen las familias hondureñas al poder acceder a gozar de los servicios básicos como: el agua potable y saneamiento, el bajo acceso de las comunidades rurales a espacios educativos que cumplan con los estándares internacionales de las aulas de clases que esto ha derivado un alto nivel de deserción escolar por falta de ingresos en los hogares.

En la misma línea, el volumen de enfermedades diarreicas y/o enfermedades producidas por la contaminación del suelo por falta de pavimentación en las comunidades, centros de salud sin el equipamiento básico para atender emergencias, la falta de conexión vehicular entre comunidades que no permiten que las comunidades se desarrollen de forma social y económica, entre otros.

Por lo que, la falta de los servicios de agua y saneamiento, educación y salud, entre otras nos muestra que esta situación aun es una dura realidad para miles de hondureños. Son muchas las personas que no disponen de estos servicios de calidad y de forma continua, lo cual afecta sus actividades diarias y también su economía. Por ejemplo, la alta incidencia que existe en los últimos años con el aumento de casos relacionados a las enfermedades diarreicas agudas (EDA's), las bajas tasas de conectividad económica entre comunidades y la inasistencia escolar en las zonas rurales, está estrechamente relacionada con el propósito de este programa.

En conclusión, a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento, en especial el Fondo Hondureño de Inversión Social (SEDECOAS-FHIS) la cual es una de las instituciones que uno de sus propósitos esenciales es contribuir a la reducción de la pobreza, mediante el acceso a los servicios de infraestructura básica como el mejoramiento de escuelas, centros de salud, pavimentación, conexiones de agua potable, entre otros para ayudar a las diferentes mancomunidades con el objetivo de elevar la calidad de vida y la dignidad humana de los hondureños.

Resumen descriptivo de los componentes Programa 18

NIVELES DE OBJETIVO		NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES	
OBJETIVO CENTRAL		Generar las condiciones en infraestructura que permita el desarrollo social y comunitario de los más pobres y desposeídos en varios departamentos del país	
MEDIOS DIRECTOS /COMPONENTES	1	Nombre:	Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura Escolar
		Descripción:	Construcción de obra, Ampliación, reposición y construcción de sistemas de aguas lluvias, cercos perimetrales, cambio de techos y suministros de mobiliario escolar en 42 escuelas priorizadas.
	2	Nombre:	Infraestructura Social y Servicios Comunitarios de Honduras
		Descripción:	Construcción, ampliación y extensión de servicios de agua y saneamiento, línea primaria, secundaria e instalación de transformadores, pavimentación de concreto hidráulico y puentes peatonales.
	3	Nombre:	Construcción de Puente sobre el Rio Esteban, Colon y El Hormiguero, Olancho.
		Descripción:	Construcción de Puente de 120 metros lineales de longitud sobre el Rio Esteban en el municipio de Balfate, departamento de Colón lo que
	4	Nombre:	Infraestructura Sanitaria
		Descripción:	Construcción de un Hospital Oncológico y Mejoramiento de la infraestructura y ampliación del centro de salud de la colonia la Divanna, en el Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.
5	Nombre:	Diseño y estudios de Laboratorio de Medicamentos y Hospital Oncológico	
	Descripción:	Elaboración del diseño y estudios de prefactibilidad de la primera fase de la construcción del Laboratorio Nacional de Medicamentos.	
6	Nombre:	Obras de Protección Hídrica y Reparación de Embaulado	
	Descripción:	Construcción de 34.1 kilómetros de bordos ubicados en Aliviaderos y Rio Chamelecón, restauración de socavón y embaulado de la Colonia Prados Universitarios en el Distrito Central.	
7	Nombre:	Fortalecimiento Institucional	
	Descripción:	Con este componente se prevé el fortalecimiento de algunas unidades de la institución, relacionadas con los ámbitos de los recursos humanos en apoyo al programa, tecnología y medios de transporte.	
8	Nombre:	Gestión y Administración	
	Descripción:	Este componente se incluye la compra del equipamiento tecnológico necesario para que la Unidad realice sus funciones, alquiler de plantel y bodegas, de materiales y suministros, combustibles y lubricantes, viáticos, software, entre otros insumos y materiales necesarios para el buen funcionamiento de la Unidad Ejecutora.	

x. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2022	279.000.000,00	270.575.628,24	97%

xi. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2022	Mto. Ejecutado 2022	Empleos Generados 2022	Beneficiarios Directos 2022
AGUA Y SANEAMIENTO	10	10.914.361,29	26	12.940
BORDOS LIMPIEZA/CANALIZACIÓN	34	90.558.747,18	124	818.558
INFRAESTRUCTURA VIAL	47	91.251.355,69	405	750.318
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	11	10.693.290,07	375	235.061
EDUCACION	11	52.766.876,32	458	48.778
TOTAL	113	256.184.630,55	1.388	1.865.655

xii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2022	Mto. Ejecutado 2022	Empleos Generados 2022	Beneficiarios directos 2022
ATLANTIDA	6	12.368.581,61	60	56.315
CHOLUTECA	8	19.472.440,20	112	12.940
COMAYAGUA	18	20.011.222,22	105	284.788
COPAN	4	1.755.652,29	67	6.625
CORTES	23	74.830.641,36	166	818.558
EL PARAISO	2	974.330,19	3	7.115
FRANCISCO MORAZAN	16	53.131.552,18	325	14.324
INTIBUCÁ	1	387.791,64	22	116
LA PAZ	2	7.757.587,22	23	7.200
LEMPIRA	6	13.163.290,62	44	48.778
OCOTEPEQUE	5	6.304.630,74	95	30.772
OLANCHO	11	20.989.711,66	200	317.328
SANTA BARBARA	6	12.962.906,78	162	25.735
YORO	1	2.929.701,39	2	5.000
VALLE	4	9.144.590,45	2	230.061
TOTAL	113	256.184.630,55	1.388	1.865.655

xiii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2022
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	12.788.853,01
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	1.602.144,68
TOTAL	14.390.997,69

xiv. Situación Presupuestaria

Mediante una enmienda a la Nota de Prioridad el alcance del programa se redujo a L 279.0 millones, debido a la situación de emergencia provocada por la temporada de tormentas y huracanes en el océano Atlántico, cabe mencionar que bajo el amparo del Decreto de Emergencia PCM 24-2022 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 36,036 del sábado 24 de septiembre de 2022 se realizaron las acciones pertinentes para solicitar una nueva incorporación de fondos para atender las situaciones provocadas por las lluvias, solicitud que aún no ha tenido respuesta.

Ante la situación de emergencia se activaron todos los canales disponibles para la obtención de fondos y poder salvaguardar la vida de las personas, rehabilitar, reconstruir y construir infraestructura social y productiva en las zonas priorizadas, ante ello, se recibió instrucción por parte de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) de reorientar el saldo pendiente del presupuesto modificado por L 220.7 millones, mismos que fueron reasignados al Programa 15 “Reconstrucción de Infraestructura Nacional: Repuesta a Emergencias”.

Así mismo, a partir de las revisiones y reprogramaciones de actividades en el Plan Operativo Anual (POA) y en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) de los programas, se solicitaron modificaciones presupuestarias internas entre actividades y objetos del gasto, por tanto, se modificó el presupuesto global vigente.

El resumen consolidado por objeto del gasto de la asignación presupuestaria del Programa se observa en la Tabla 1; la distribución porcentual del presupuesto modificado del Programa 18 indica que el 3.25% corresponde al grupo de gasto 20000 Servicios No Personales; el 0.33% se asignó a la compra

de Materiales y Suministros (30000) y el 96.42% corresponde a Inversión de los cuales el 3.72% corresponde a la compra de Bienes y el 96.28% se destina para la construcción y supervisión de obras.

Tabla 1 Resumen consolidado por objeto del gasto, Programa 18

Objeto del Gasto	Descripción por objeto del gasto	Otorgado
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	L 500,000.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	L 4,830,000.00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	L 1,500,000.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L 100,000.00
25600	Publicidad y Propaganda	L 330,000.00
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	L 90,000.00
26210	Viáticos Nacionales	L 1,480,000.00
26120	Pasajes al Exterior	L 100,000.00
26220	Viáticos al Exterior	L 150,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas	L 420,000.00
33400	Productos de Papel y Cartón	L 60,000.00
35620	Diesel	L 240,000.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L 50,000.00
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	L 150,000.00
42310	Equipo de Transporte terrestre para personas	L 7,000,000.00
42710	Muebles y Equipos Educativos	L 3,000,000.00
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	L 83,000,000.00
47120	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	L 3,200,000.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	L 170,000,000.00
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	L 2,800,000.00
Total		L 279,000,000.00

La estructura presupuestaria modificada del programa se muestra en la Tabla 2; el Programa 18 sufrió una reducción en promedio del -56.72% cabe mencionar que muchos de los proyectos incluidos en el programa original fueron reorientados para ser ejecutados bajo el paraguas del Programa 15.

Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura Escolar	Aprobado	Modificado
Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	2,500,000.00	900,000.00
Publicidad y Propaganda	450,000.00	40,000.00
Viáticos Nacionales	1,500,000.00	250,000.00
Productos de Artes Gráficas	600,000.00	80,000.00
Diesel	950,000.00	50,000.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,000,000.00	41,000,000.00
Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,000,000.00	1,000,000.00
Muebles y Equipos Educativos	3,000,000.00	3,000,000.00
	147,000,000.00	46,320,000.00

Infraestructura Social y Servicios Comunitarios de Honduras	Aprobado	Modificado
Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	2,450,000.00	900,000.00
Publicidad y Propaganda	250,000.00	40,000.00
Viáticos Nacionales	850,000.00	350,000.00
Productos de Artes Gráficas	250,000.00	80,000.00
Diesel	400,000.00	50,000.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000,000.00	31,000,000.00
Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	1,500,000.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	42,000,000.00	40,000,000.00
Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	1,000,000.00
	86,200,000.00	74,920,000.00

Construcción de Puente sobre el Rio Esteban, Colon y El Hormiguero, Olancho	Aprobado	Modificado
Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1,800,000.00	900,000.00
Publicidad y Propaganda	100,000.00	80,000.00
Viáticos Nacionales	750,000.00	250,000.00
Productos de Artes Gráficas	130,000.00	80,000.00
Diesel	220,000.00	60,000.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000,000.00	20,000,000.00
Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,000,000.00
	114,000,000.00	22,370,000.00

Infraestructura Sanitaria	Aprobado	Modificado
Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1,200,000.00	500,000.00
Publicidad y Propaganda	200,000.00	30,000.00
Viáticos Nacionales	750,000.00	80,000.00
Productos de Artes Gráficas	200,000.00	60,000.00
Diesel	150,000.00	40,000.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	12,000,000.00	11,000,000.00
Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	700,000.00
	16,000,000.00	12,410,000.00

Diseño y estudios de Laboratorio de Medicamentos y Hospital Oncológico	Aprobado	Modificado
Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	L 2,600,000.00	600,000.00
Publicidad y Propaganda	L 50,000.00	50,000.00
Pasajes al Exterior	L 200,000.00	100,000.00
Viáticos Nacionales	L 350,000.00	150,000.00
Viáticos al Exterior	L 700,000.00	150,000.00
Productos de Artes Gráficas	L 50,000.00	30,000.00
Diesel	L 50,000.00	10,000.00
	4,000,000.00	1,090,000.00

Obras de Protección Hídrica y Reparación de Embaulado	Aprobado	Modificado
Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	4,000,000.00	1,000,000.00
Publicidad y Propaganda	450,000.00	90,000.00
Viáticos Nacionales	1,550,000.00	400,000.00
Productos de Artes Gráficas	250,000.00	90,000.00
Productos de Papel y Cartón	100,000.00	60,000.00
Diesel	650,000.00	30,000.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000,000.00	110,000,000.00
Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	800,000.00
	120,000,000.00	112,470,000.00

Fortalecimiento Institucional	Aprobado	Modificado
Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	220,000.00	30,000.00
Equipo de Transporte terrestre para personas	7,000,000.00	7,000,000.00
	7,220,000.00	7,030,000.00

Gestión y Administración	Aprobado	Modificado
Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,200,000.00	500,000.00
Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	2,500,000.00	1,500,000.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	130,000.00	100,000.00
Otros Servicios Comerciales y Financieros	150,000.00	90,000.00
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	50,000.00
Otros Repuestos y Accesorios Menores	1,200,000.00	150,000.00
	5,280,000.00	2,390,000.00

La distribución del presupuesto modificado indica que el 40.31% se concentra en el Componente 6 para ejecución de obras de mitigación en el Valle de Sula, específicamente en la construcción y reparación de obras de protección hídrica (bordos) a finales del III Trimestre previa obtención de la cuota de gasto mensual se inicia el pago de estimaciones y anticipos de obras. Sin embargo, a pesar del atraso en la aprobación y transferencia de los fondos solicitados a la SEFIN, durante el segundo trimestre se realizó el proceso de formulación y adjudicación de los proyectos. En el último trimestre del año se estarán ejecutando el total de los proyectos de este componente.

El Componente 2 representa el 26.85% de los cuales se tienen identificados alrededor de xx proyectos de índole social y productivo como ser: caja puente, vado inundable, centro de salud, centro comunal, y otros. El 16.60% corresponde al Componente 1 en el cual se planificó el mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura social priorizada. La construcción de 2 puentes ubicados en los departamentos Colon y Olancho en su etapa de prefactibilidad y formulación absorben el 8.02% en el Componente 3; para el mejoramiento de infraestructura sanitaria (Componente 4) se destinó el 4.45%; para iniciar el proceso de prefactibilidad del primer laboratorio nacional de medicamentos y el hospital oncológico se planificó el 0.39% (Componente 5) y para los Componentes 7 y 8 diseñados para el fortalecimiento institucional y la gestión y administración del Programa se asignaron el 2.52% y 0.86% respectivamente.

Disminución presupuestaria

Por instrucción de la SEFIN y con el propósito de dar cumplimiento al Artículo 10 del Decreto PCM-024-2022 para atender la emergencia provocada por la temporada de tormentas y huracanes y los impactos en el territorio nacional se solicitó la incorporación de L 220.7 millones del convenio de préstamo con el BCH, cabe resaltar que dicho monto fue reasignado al Programa 15 con la exclusividad de asignación en los objetos del gasto dedicados a la construcción y supervisión de obra civil. La modificación presupuestaria tuvo un impacto directo a las operaciones de la Institución debido a la reformulación de los componentes tanto a nivel de proyectos como readecuación de montos.

xv. Avances del Proyecto

Para el Programa 18 a finales del IV trimestre se tienen identificados y priorizados los proyectos que cumplieron el ciclo de proyectos del FHIS, de los cuales el 2.25% se encuentran en etapa de Adjudicación y Contratación; el monto contratado a la fecha corresponde al 97.57% y el Monto Ejecutado asciende al 73.5%. Cabe recalcar que debido al desembolso tardío de fondos (26 de septiembre) y en el marco de la Ley de Contratación del Estado alrededor del 80% de los proyectos adjudicados se encuentran en proceso de firma de contrato, pago de anticipo de obra y primera estimación.

Objeto del Gasto	Convenio FHIS	Monto Presupuestado	Autorización y Aprobación	Adjudicación y Contratación (Obras, Bienes y Servicios)	Monto Contratado	Monto Ejecutado	Monto Disponible
47110 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	INVERSION	L 52,000,000.00	L -	L 673,164.33	L 51,771,982.10	L 31,663,083.87	L 445,146.43
47120 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	SUPERVISION INVERSION	L -	L -	L -	L -	L -	L -
47210 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	INVERSION	L 200,500,000.00	L -	L 5,156,494.56	L 195,945,932.87	L 157,805,900.09	L 602,427.43
47220 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	SUPERVISION INVERSION	L 6,500,000.00	L -	L -	L 4,976,186.03	L 892,993.50	L 1,523,813.97
Totales		L 259,000,000.00	L -	L 5,829,658.89	L 252,694,101.00	L 190,361,977.46	L 476,240.11

El primer desembolso del Programa 18 corresponde a la Cuota de Compromiso por la cantidad de L 59.6 millones acreditada hasta el 04 de octubre de 2022; representa el 21.36% del total del monto del Programa.



04/10/2022 16:17:30
Gestión: 2022
R_CUC_SOLCUOGA


SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas


Lugar : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Distrito Central	Fecha : 03/10/2022	Nro. Doc.: 000001 Trimestre : 4 Solicitud : Original Modificación: Incremento
Institución : 22 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL		
Gerencia A : 3 FONDOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS		

Unidad Ejecutora	Fuente	Clase de Gasto	Importe Solic. UE	Importe Solic. GA	Importe Asig. TGR
31 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	11	5 Construcciones	59,600,000.00	59,600,000.00	59,600,000.00
Total General :			59,600,000.00	59,600,000.00	59,600,000.00

Según el reporte de ejecución presupuestaria obtenido del SIAFI, antes de finalizar el trimestre se ha ejecutado el 97.98% del presupuesto otorgado del programa.



Fondo Hondureño de Inversión Social
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y PROGRAMA
 TODAS LAS FUENTES



18/01/2023 13:43:15
Gestión: 2022
R_EGA_01_INSPRG
Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/01/2022 HASTA: 31/12/2022
 ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : Fondo Hondureño de Inversión Social

PROGRAMA	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
01	ACTIVIDADES CENTRALES	313,486,819.00	300,446,898.21	13,039,920.79
11	INFRAESTRUCTURA RURAL	37,504,624.00	35,478,196.70	2,026,427.30
12	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	540,836,748.00	67,647,516.17	473,189,231.83
14	PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL	173,930,919.00	141,946,690.56	31,984,228.44
15	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA NACIONAL	220,700,000.00	220,174,075.29	525,924.71
16	PROYECTO DE RECUPERACION DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS	262,983,231.00	55,542,763.75	207,440,467.25
17	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	193,172,460.00	28,412,086.07	164,760,373.93
18	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO EN VARIOS DEPTOS. DE HONDURAS	279,000,000.00	270,575,628.24	8,424,371.76
TOTAL GENERAL :		2,021,614,801.00	1,120,223,854.99	901,390,946.01

xvi. Resultados

- 112 proyectos de infraestructura (construcción y supervisión de obra) distribuidos en varios componentes del programa 18; así como 2 proyectos de prefactibilidad y factibilidad de proyectos de impacto nacional por un monto de L 261,994,239.88 más compras por casi siete millones de Lempiras y el gasto operativo del proyecto por más de L 1.6 millones.

xvii. Problemática

Al final del III Trimestre, se pudo contar con la primera cuota de compromiso, el proceso de formulación en el SNIPH inicio a mediados de mayo y concluyo a finales del mes de agosto lo que se traduce en casi 4 meses sin contar con el presupuesto para ejecución de obras. Sin embargo, el inicio de obras no se ha desarrollado con la agilidad debido a varias externalidades. Primero, las empresas supervisoras deben iniciar operaciones antes de que inicien los proyectos. La contratación de las empresas supervisoras, ha demorado más de lo esperado debido a la modalidad de contratación la cual incluye negociaciones que exceden a los tiempos planificados. Segundo, las empresas constructoras han demorado en presentar los requisitos solicitados por la institución para proceder con las firmas de contratos. Por último, las condiciones climáticas en el país retrasan el inicio de las obras debido a carreteras incomunicadas y a zonas de intervención en condiciones vulnerables.

xviii. Retos

- ✓ Lanzamiento de procesos de contratación de los proyectos con un margen de error menor al 5%
- ✓ Definir con la SEFIN estrategias para la simplificación de procesos para la eficiente ejecución de proyectos de emergencia.
- ✓ Contratación del personal complementario a las Direcciones del FHIS pertinentes al ciclo de proyectos.
