



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan
Operativo Anual POA-Presupuesto

III Trimestre 2022

INDICE

Introducción	2
Antecedentes	2
▪ Misión:	3
▪ Visión:	3
▪ Valores:	3
Resumen Ejecutivo	4
Proyectos FHIS.....	5
Avance Ejecución Física de Proyectos de Inversión.....	6
Ejecución Presupuestaria por Programas 2022	0
Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2022.....	1
Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Tercer Trimestre 2022	0
Ejecución Gasto Operativo Tercer Trimestre del 2022	0
Cuadro por Sector 2022 (Ejecutado)	3
CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	4
▪ ✓ Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)	4
CARTERA BANCO MUNDIAL	11
▪ ✓ Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE 6822-HN)	11
CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	23
▪ ✓ Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)	23
▪ ✓ Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira.	27
CARTERA KfW Entwicklungsbank.....	30
▪ ✓ Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V	30
▪ ✓ Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)	36
CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)	
▪ ✓ Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)	43
▪ ✓ Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)	50
FONDOS NACIONALES	56
▪ ✓ Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras.	56

Introducción

El presente informe es la recopilación de las actividades e inversiones realizadas por el FHIS durante el tercer trimestre del 2022.

Antecedentes

De acuerdo al Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-056-2019 se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), la cual debe de promover el Desarrollo Comunitario por medio de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos, en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerables de Honduras quien para el desarrollo de sus funciones debe contar con una Subsecretaría de Estado.

Se adscribe a dicha Secretaría de Estado, El Instituto Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS).

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es un organismo Desconcentrado de la Presidencia de la República, creado el 22 de febrero de 1990 y extendida su vida legal hasta el año 2022 según decreto No. 222-2010 cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados, en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social y/o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Asimismo, asesorará a los gobiernos locales con respecto a los procesos de captación de recursos de las fuentes de financiamiento nacionales y/o externas y las asiste en la transferencia de las capacidades técnicas y administrativas, para convertir a estos gobiernos locales en administradores eficientes de sus programas y proyectos, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Nación en aplicación del principio de Descentralización.

Misión:

Somos una institución estatal, centralizada, técnica y captadora de recursos que promueve el desarrollo local sostenible, participativo e incluyente a través del fortalecimiento municipal y comunitario, por medio de programas y proyectos de infraestructura básica, social y especial coordinados, diseñados y ejecutados en las comunidades en condiciones de pobreza y alta vulnerabilidad para descentralizar la gestión y ejecución de proyectos en Honduras, en alianza con los gobiernos locales y socios estratégicos.

Visión:

Consolidarnos al 2030, como la institución líder en gestión, captación y ejecución de programas y proyectos orientados al fortalecimiento municipal y comunitario que contribuya de forma equitativa al desarrollo sostenible de las comunidades en todo el territorio nacional.

Valores:

- **Ética:** Ejercicio de las funciones con sujeción a las normas morales que promuevan la confianza de la población hondureña.
- **Integridad:** Actuación sustentada en la honradez, prudencia, entereza, rectitud y firmeza.
- **Compromiso:** Ejecución de proyectos que coadyuven al desarrollo local.
- **Transparencia:** Amplia difusión de información sobre nuestras actuaciones. Rendición de cuentas ante la sociedad.
- **Lealtad:** Actuar con fidelidad y rectitud hacia el FHIS y compañeros de trabajo, con el objetivo de identificarse con la institución.
- **Equidad:** El FHIS no hace distinción de credo, raza, de ninguna otra forma de discriminación humana.

Resumen Ejecutivo


SEDECOAS/FHIS, llega hasta los lugares más recónditos del país, para contribuir a mitigar las necesidades de la población más pobre y vulnerable a través de respuestas rápidas y concretas con proyectos de Agua y Saneamiento, Educación, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural.

El presupuesto de SEDECOAS/FHIS para la gestión 2022 al 30 de septiembre asciende a 1.825 Millones de Lempiras:

Fuente	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		% de Participación en el Presupuesto Vigente
BID	L.	75.224.516,00	L.	71.849.516,00	4%
BM	L.	732.341.690,00	L.	259.608.231,00	14%
BCIE	L.	692.639.879,00	L.	692.639.879,00	38%
USAID	L.	10.612.131,00	L.	53.990.505,00	3%
GOH*	L.	285.234.819,00	L.	532.486.819,00	29%
KfW	L.	233.031.656,00	L.	211.401.282,00	12%
TOTAL	L.	2.029.084.691,00	L.	1.825.351.232,00	100%

* Incluye costo Operativo del FHIS

% de Participación en el Presupuesto Vigente

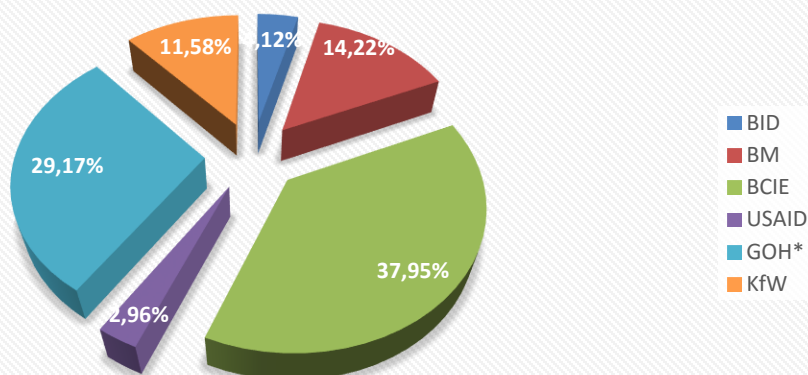

Proyectos FHIS

Fuente	Nombre del Proyecto	Nombre Corto	Sector	Modalidad Ejecución
BID	Programa Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	PCCMB 4518/BL-HO	Infraestructura Social	Centralizados
BM	Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota	PRE 6822-HN	Infraestructura Social	Centralizados
BCIE	Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	MIFE	Infraestructura Escolar	Centralizados
	Programa de Emergencias en la Respuesta a la Tormenta		Infraestructura Social	Centralizados
KFW	Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar SE-FHIS FASE IV y V	PROMINE	Infraestructura Escolar	PEC-Descentralizados
	Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras	CONVIVIR	Infraestructura Social y Fortalecimiento de las Capacidades de los Jóvenes	Descentralizados
USAID	Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana	ICS	Recuperación de espacios públicos e infraestructura escolar para la mejora de la seguridad ciudadana	PEC/Centralizados
	Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras	PIOH	Mejorar las condiciones de Infraestructura Básica para contribuir al desarrollo en el Occidente de Honduras.	PEC/Centralizados
Fondos Nacionales	Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras.	PROMIDESH	Rehabilitación de la infraestructura escolar, infraestructura social y servicios comunitarios, construcción de puentes vehiculares, infraestructura sanitaria, diseño y estudios de laboratorio de medicamentos y hospital oncológico, obras de protección hídrica y reparación de embaulamiento, fortalecimiento institucional y por último, gestión y administración del programa	Centralizados

Avance Ejecución Física de Proyectos de Inversión


Avance Ejecución Física de Proyectos de Inversión

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Metas			Ubicación y Observaciones
			Programación 2022	Ejecución Física al III Trimestre 2022		
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	
PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	Construcción de vías pavimentadas	KILOMETRO	2	0	0%	Productos programados para el IV trimestre 2022, ubicados en Colonias priorizadas del Distrito central, III: Trimestre: dos (2) Cursos de Educación Financiera donde participaron un total de 93 jóvenes y Un (1) Curso de emprendimiento de negocios 79 jóvenes
	Construccion de conexiones de sistemas de agua potable	CONEXIÓN	200	0	0%	
	Construccion de conexiones de sistemas de saneamiento	CONEXIÓN	200	0	0%	
	Talleres de Valores y/o emprendimiento para jovenes	TALLERES	6	3	50%	
PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS	Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos	CENTRO EDUCATIVO	27	0	0%	Productos programados para el IV trimestre 2022 en area afectada por los ciclones Eta e Iota, se han adjudicado los procesos de licitación y cotización para 27 subproyectos de infraestructura publica. Las obras iniciarán en el mes de octubre 2022. .
	Adjudicación de Sistemas de Agua Rehabilitados y/o Reconstruidos	LICITACION	10	0	0%	
	Adjudicación de Sistemas de Saneamiento y/o Reconstruidos	LICITACION	2	0	0%	
	Formulación de Expedientes de Infraestructura en Centros de Salud	EXPEDIENTES	2	0	0%	
	Formulación de Expedientes de Infraestructura Comunitaria Rehabilitada y/o Reconstruidas	EXPEDIENTES	2	0	0%	
	Formulación de Expedientes de Infraestructura Pública y Comunitaria	EXPEDIENTES	2	0	0%	
	Adjudicación de Infraestructura Vial Rehabilitada y/o Reconstruida	LICITACION	5	0	0%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos	CENTRO EDUCATIVO	3	0	0%	Producto programado para el IV Trimestre 2022
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE IV y V)	Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos	CENTRO EDUCATIVO	13	0	0%	A la fecha se continua en proceso de la aprobación de los proyectos y consultorias en el Congreso Nacional, lo cual ha provocado en un desfase físico y financiero en la ejecución del Programa en la fase IV y en el caso de la fase V se esta en proceso de formulación de los nuevos proyectos . Tambien se solicitó una modificación interna tanto financiera como en producción y un traslado de recursos a otro Programa, sin embargo la Institucion ya habia completado las modificaciones permitadas por lo cual este POA de seguimiento esta con base un planificacion no ajustada.
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	Espacios públicos recuperados para la seguridad ciudadana.	OBRA	1	0	0%	Producto programado para el IV Trimestre 2022
	Capacitaciones en habilidades sociales y laborales a jovenes de ambos sexos entre las edades de 12-30 años	CAPACITACION	180	0	0%	En proceso de formulación los mismos iniciarán en el ultimo trimestre del año 2022
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	Espacios públicos recuperados para la seguridad ciudadana.	OBRA	10	5	50%	1) Reparación y Equipamiento CDA 23 de Septiembre, 2) Reparación y Equipamiento CDA San Juan, 3) Reparación y Equipamiento CDA 10 de Septiembre, 4) Reparación y Equipamiento CDA La Esperanza, 5) Reparación y Equipamiento CDA Morales III
	Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados	CENTRO EDUCATIVO	7	6	86%	1) Reparación Instituto Modesto Rodas Alvarado, Reparación y Equipamiento Escuela Carlos Rivera López, Reparación y Equipamiento CEB Jose Antonio Peraza, Reparación CEB Claudio Barrera - Fase II, Reparación y Obras complementarias Escuela Ramón Montoya Fase II y Reparación Instituto Triunfo de la Cruz III
	Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud	OBRA	2	2	100%	1) Construcción de Bodega de Insumos de la Regional de Salud No.1 y 2) Obras Complementaria y Reparación del Centro Nor Occidental de Biológicos - Bodega Ultra Frío
ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados	CENTRO EDUCATIVO	4	2	50%	1) Ampliación Escuela José Cecilio del Valle y 2) Reposición Escuela Nueva Generación Sur
	Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud	OBRA	2	2	100%	1) Clínicas de Aislamiento Pacientes COVID Hospital Dr. Juan Manuel Gálvez y 2) Construcción Bodega de Insumos de la Regional de Salud No.4 y Obras Complementarias

Ejecución Presupuestaria por Programas 2022

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Monto Planificado III Trimestre	Devengado del III Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% Ejecución III Trimestre/ Planificado III Trimestre	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
Programa 1: Actividades Centrales	L. 285.234.819,00	L. 263.486.819,00	L. 69.548.185,00	L. 42.688.148,87	L. 141.934.969,22	L. 121.551.849,78	61%	54%
Programa 11: Infraestructura Rural	L. -	L. 33.312.124,00	L. 17.535.275,00	L. 15.134.249,32	L. 15.134.249,32	L. 18.177.874,68	86%	45%
Programa 12: Infraestructura Escolar	L. 687.780.338,00	L. 666.149.964,00	L. 86.476.363,00	L. 994.804,53	L. 5.054.692,85	L. 661.095.271,15	1%	1%
Programa 14: Fomento al Desarrollo Local	L. 130.555.384,00	L. 137.246.634,00	L. 41.553.950,00	L. 22.877.388,36	L. 63.560.138,03	L. 73.686.495,97	55%	46%
Programa 16: Reconstrucción Nacional Fuente Externa	L. 732.341.690,00	L. 262.983.231,00	L. 54.695.074,00	L. 4.477.340,21	L. 8.369.973,64	L. 254.613.257,36	8%	3%
Programa 17: Programa de Agua y Saneamiento	L. 193.172.460,00	L. 193.172.460,00	L. -	L. -	L. -	L. 193.172.460,00	0%	0%
Programa 18: Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en varios depts de Honduras	L. -	L. 269.000.000,00	L. 123.697.500,00	L. -	L. -	L. 269.000.000,00	0%	0%
TOTAL	L. 2.029.084.691,00	L. 1.825.351.232,00	L. 269.808.847,00	L. 86.171.931,29	L. 234.054.023,06	L. 1.591.297.208,94	32%	13%


Presupuesto Vigente

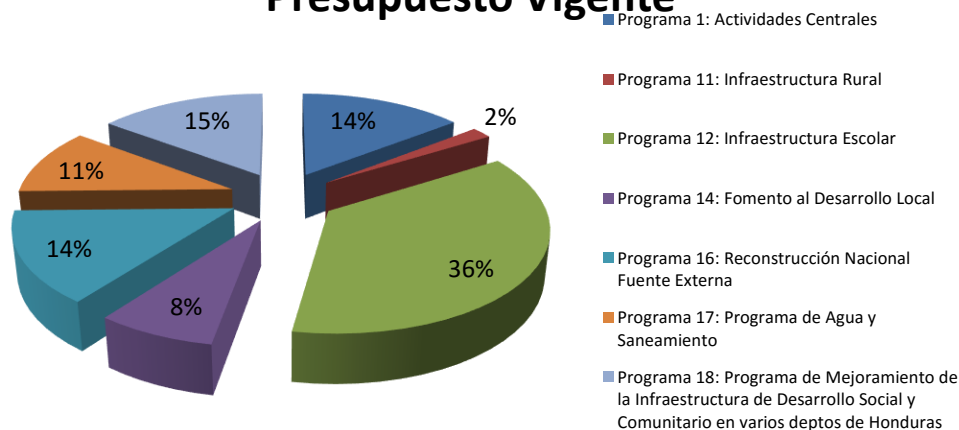

Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2022

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente 2022	Devengado del III Trimestre	Devengado Acumulado 2022	% Ejecución al III Trimestre / Presupuesto Vigente
Gasto Operativo/Gobierno	L. 285.234.819,00	L. 263.486.819,00	L. 42.688.148,87	L. 141.934.969,22	54%
Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras	L. -	L. 33.312.124,00	L. 15.134.249,32	L. 15.134.249,32	45%
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar, KfW VIII	L. 188.312.919,00	L. 166.682.545,00	L. 955.704,53	L. 5.015.592,85	3%
Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	L. 499.467.419,00	L. 499.467.419,00	L. 39.100,00	L. 39.100,00	0%
Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes CONVIVIR	L. 44.718.737,00	L. 44.718.737,00	L. 797.960,13	L. 4.652.975,96	10%
Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana	L. 10.612.131,00	L. 20.678.381,00	L. 7.542.180,84	L. 17.145.641,97	83%
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	L. 75.224.516,00	L. 71.849.516,00	L. 14.537.247,39	L. 41.761.520,10	58%
Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales ETA e IOTA	L. 732.341.690,00	L. 259.608.231,00	L. 4.477.340,21	L. 8.369.973,64	3%
Programa de Emergencia en Respuesta a la Tormenta ETA	L. -	L. 3.375.000,00	L. -	L. -	0%
Programa de Ampliación del sistema de Abastecimiento de agua Potable en la Ciudad de Gracias	L. 193.172.460,00	L. 193.172.460,00	L. -	L. -	0%
Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras		L. 269.000.000,00	L. -	L. -	0%
TOTAL	L. 2.029.084.691,00	L. 1.825.351.232,00	L. 86.171.931,29	L. 234.054.023,06	13%


% Ejecución al III Trimestre / Presupuesto Vigente

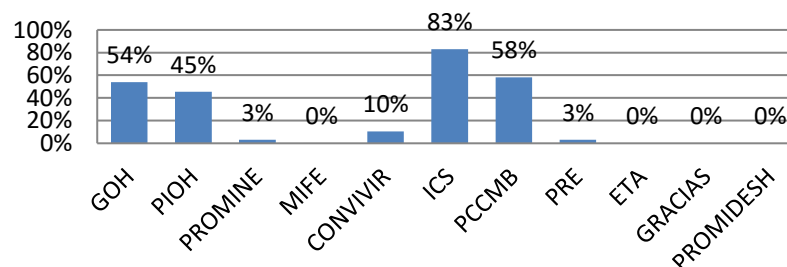

Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Tercer Trimestre 2022

Grupo	Aprobado	Presupuesto Vigente por Grupo	Devengado III Trimestre	Devengado Acumulado al III Trimestre	Disponible	% Ejecución III Trimestre/ Presupuesto Vigente	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
SERVICIOS PERSONALES	L. 152.860.491,00	L. 152.860.491,00	32.524.885,38	L. 102.151.345,51	L. 50.709.145,49	21%	67%
SERVICIOS NO PERSONALES	L. 285.659.052,00	L. 242.663.584,00	15.578.980,05	L. 43.074.110,00	L. 199.589.474,00	6%	18%
MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 80.985.014,00	L. 11.787.017,00	1.737.346,27	L. 2.637.185,47	L. 9.149.831,53	15%	22%
BIENES CAPITALIZABLES	L. 1.505.129.454,00	L. 1.413.589.460,00	36.282.719,59	L. 86.143.382,08	L. 1.327.446.077,92	3%	6%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. 4.450.680,00	L. 4.450.680,00	48.000,00	L. 48.000,00	L. 4.402.680,00	1%	1%
Total	L. 2.029.084.691,00	L. 1.825.351.232,00	L. 86.171.931,29	L. 234.054.023,06	L. 1.591.297.208,94	5%	13%

Presupuesto Vigente por Grupo

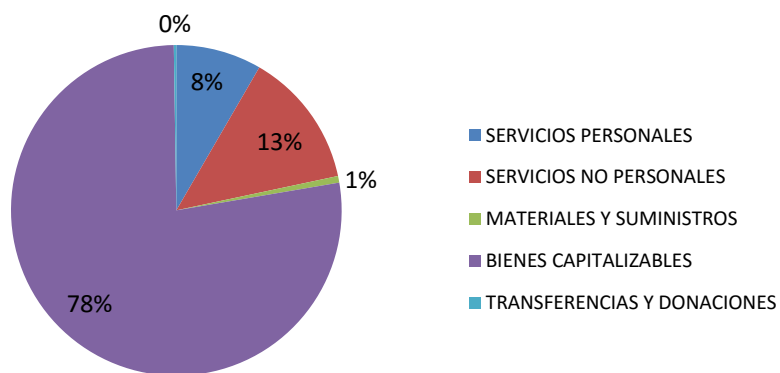

Ejecución Gasto Operativo Tercer Trimestre del 2022

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
11100	Sueldos Básicos	17.861.742,00	11.478.049,44	6.383.692,56
11400	Adicionales	1.488.478,00	1.147.995,92	337.364,86
11510	Decimotercer Mes	1.488.478,00	92.495,93	1.395.982,07
11520	Decimocuarto Mes	1.488.478,00	1.483.225,63	5.252,37
11600	Complementos	1.190.782,00	1.125.777,63	58.542,67
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	2.589.952,00	1.658.805,13	931.146,87
11750	Contribuciones para Seguro Social	711.808,00	427.863,45	283.944,55
21110	Suministro De Energía EléCtrica	374.000,00	282.759,43	49.825,98
21200	Agua	240.000,00	151.443,75	88.556,25
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1.304.655,00	908.909,76	282.131,52
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	950.000,00	0,00	950.000,00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	700.000,00	40.000,00	660.000,00
25700	Servicio de Internet	1.200,00	0,00	1.200,00
26110	Pasajes Nacionales	84.189,00	9.950,00	74.239,00
26210	Viáticos Nacionales	1.185.000,00	362.230,79	813.221,70
27111	Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas	21.000,00	0,00	21.000,00
27500	Gastos Judiciales	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
29100	Ceremonial y Protocolo	200.000,00	93.943,01	106.056,99
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	59.000,00	0,00	45.948,00
32310	Prendas de Vestir	120.000,00	0,00	120.000,00
33300	Productos de Artes Gráficas	45.000,00	0,00	45.000,00
36100	Productos Ferrosos	75.000,00	0,00	75.000,00
38100	Material De Defensa Y Seguridad	35.000,00	0,00	35.000,00
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	15.000,00	0,00	15.000,00
39600	Repuestos y Accesorios	327.592,00	112.610,80	74.981,20
42710	Muebles y Equipos Educativos	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	89.852.000,00	28.089.375,51	0,00
51220	Ayuda Social a Personas	72.540,00	48.000,00	24.540,00
11100	Sueldos Básicos	20.098.940,00	14.236.295,38	5.862.644,62
11400	Adicionales	1.674.911,00	1.423.660,50	251.250,50
11510	Decimotercer Mes	1.674.911,00	37.017,94	1.637.893,06
11520	Decimocuarto Mes	1.674.911,00	1.416.095,70	258.815,30
11600	Complementos	1.339.929,00	1.178.912,95	161.016,05
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	2.914.346,00	2.067.884,62	846.461,38
11750	Contribuciones para Seguro Social	1.264.256,00	872.096,48	392.159,52
12100	Sueldos Básicos	37.800.485,00	27.525.372,88	10.275.112,12
12410	Decimotercer Mes	3.150.040,00	610.866,59	2.539.173,41
12420	Decimocuarto Mes	3.150.040,00	1513.489,89	1.636.550,11
12510	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	432.325,00	432.324,44	0,56
12550	Contribuciones para Seguro Social	1.161.237,00	550.022,40	611.214,60
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	95.000,00	28.625,00	66.375,00
24500	Servicios de Capacitación	53.800,00	37.400,00	16.400,00

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	1000.000,00	585.000,00	415.000,00
25100	Servicio de Transporte	12.000,00	1200,00	10.800,00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1265.300,00	1212.878,47	52.42153
25400	Primas y Gastos de Seguro	1639.694,00	933.95102	705.742,98
25700	Servicio de Internet	12.800,00	162166	11178,34
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	100.000,00	88.423,06	6.767,50
33100	Productos De Papel Y Cartón	100.000,00	58.644,02	22.685,73
34400	Llantas y Cámaras de Aire	135.000,00	124.799,93	10.200,07
35620	Diesel	590.000,00	453.300,51	136.699,49
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	100.000,00	78.443,97	21556,03
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40.797,00	21177,00	0,00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100.000,00	41224,85	36.729,31
39600	Repuestos y Accesorios	626.13100	441338,06	81602,64
11100	Sueldos Básicos	3.993.600,00	2.674.970,52	1168.629,48
11400	Adicionales	332.800,00	266.600,00	66.200,00
11510	Decimotercer Mes	332.800,00	2.59167	300.208,33
11520	Decimocuarto Mes	332.800,00	298.778,77	34.02123
11600	Complementos	266.240,00	266.240,00	0,00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	579.072,00	387.150,00	191922,00
11750	Contribuciones para Seguro Social	148.736,00	97.93183	50.804,17
24300	Servicios Jurídicos	26.600,00	0,00	26.600,00
33700	Especies Timbradas y Valores	18.030,00	0,00	18.030,00
11100	Sueldos Básicos	2.373.600,00	1552.958,50	820.64150
11400	Adicionales	197.800,00	138.369,17	59.430,83
11510	Decimotercer Mes	197.800,00	17.766,67	180.033,33
11520	Decimocuarto Mes	197.800,00	197.800,00	0,00
11600	Complementos	158.240,00	155.244,20	2.995,80
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	344.172,00	220.990,63	123.18137
11750	Contribuciones para Seguro Social	106.240,00	70.47162	35.768,38
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20.000,00	19.550,00	450,00
11100	Sueldos Básicos	2.530.800,00	1703.318,72	827.48128
11400	Adicionales	210.900,00	202.798,33	8.10167
11510	Decimotercer Mes	210.900,00	28.515,55	182.384,45
11520	Decimocuarto Mes	210.900,00	210.54167	358,33
11600	Complementos	168.720,00	168.02100	699,00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	366.966,00	246.166,50	120.799,50
11750	Contribuciones para Seguro Social	116.864,00	78.206,31	38.657,69
11100	Sueldos Básicos	22.826.968,00	15.869.858,15	6.957.109,85
11400	Adicionales	1902.249,00	1750.057,00	152.192,00
11510	Decimotercer Mes	1902.249,00	68.886,13	1833.362,87
11520	Decimocuarto Mes	1902.249,00	1688.29188	213.957,12
11600	Complementos	1521799,00	1515.25195	6.547,05

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	3.309.911,00	2.305.250,52	1004.660,48
11750	Contribuciones para Seguro Social	1009.280,00	690.065,32	319.214,68
16200	Compensaciones	1951987,00	0,00	1951987,00
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	130.000,00	64.239,00	65.76100
26210	Viáticos Nacionales	3.000.000,00	2.992.584,11	29,63
TOTAL PROGRAMA		L 263.486.819,00	L 141.934.969,22	L 59.106.296,46

Cuadro por Sector 2022 (Ejecutado)

SECTOR	Proyectos Finalizados 2022	Mto. Ejecutado 2022	Empleos Generados 2022	Beneficiarios directos 2022
EMPRENDIMIENTO Y VALORES	0	7.435.665,47	27	1.262
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	0	28.781.432,56	150	3.210
PREVENCIÓN SITUACIONAL/CONVIVENCIA	7	8.000.020,66	127	103.687
EDUCACIÓN	10	19.103.897,83	381	9.046
SALUD	2	3.342.195,18	56	421.896
TOTAL	19	66.663.211,70	741	539.101

Cuadro por Departamento 2022 (Ejecutado)

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2022	Mto. Ejecutado 2022	Empleos Generados 2022	Beneficiarios directos 2022
ATLANTIDA	4	4.565.054,00	86	4.210
COPAN	2	4.168.927,10	36	411.551
CORTES	8	5.727.311,38	140	5.747
FRANCISCO MORAZAN	1	39.605.313,53	218	105.324
INTIBUCÁ	2	4.074.704,52	161	11.144
LA PAZ	1	3.380.093,00	43	259
LEMPIRA	1	2.933.823,68	28	526
OCOTEPEQUE	0	938.919,00	18	206
OLANCHO	0	889.065,49	0	0
SANTA BARBARA	0	380.000,00	11	134
TOTAL	19	66.663.211,70	741	539.101

Cuadro por Otras Inversiones 2022 (Ejecutado)

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2022
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	18.946.814,73
GASTO OPERATIVO DE PROGRAMAS	6.509.027,41
ACTIVIDADES CENTRALES FHIS	141.934.969,22
TOTAL	167.390.811,36

CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO



✓ **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)**



i. Antecedentes

Actualmente el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y la Secretaría de Seguridad ejecutan conjuntamente la operación BID 4518/BL-HO denominada “Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios” el cual es un préstamo por un monto total de US\$60,000,000.00 la operación fue aprobada por el Banco Interamericano de Desarrollo en el mes de abril de 2018, posteriormente aprobada por el Congreso Nacional en el mes de octubre de 2018, y fue efectivo a partir del 28 de noviembre de 2018, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta

ii. Objetivo

Contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

iii. Componentes

Componente 1. Mejoramiento del hábitat de barrios urbanos vulnerables (US\$18.219 millones). El propósito de este componente es mejorar el acceso a servicios de infraestructura urbana y generar espacios con condiciones de seguridad, para incentivar una mejor convivencia y aumentar la capacidad

de los ciudadanos para el cumplimiento pacífico de normas. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Infraestructura básica: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios en los siguientes barrios del Distrito Central: Monte de los Olivos, Nueva Jerusalén; Australia; 25 de Enero; Nueva España; Brisas del Mogote y Nueva Galilea teniendo como marco para las intervenciones el Plan Integral de Mejoramiento de Barrios, el cual incluye los correspondientes diseños urbanísticos, de ingeniería, la programación y presupuestos. Este instrumento es crítico para la adecuada programación de las inversiones y para facilitar el diálogo con la comunidad sobre las actividades a desarrollar. Se financiará consultorías y contratación de obras para: (i) la preparación de los Planes Integrales de Mejoramiento de Barrios (PIMB); y (ii) las inversiones en obras de infraestructura básica de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, pavimentación, drenaje pluvial, plazas y parques, equipamientos sociales y otras necesidades detectadas en los PIMB. Se promoverá la recuperación de escuelas públicas y centros de salud (operados por las entidades estatales específicas).

Convivencia y Emprendimiento a nivel barrial: promueve la participación de los vecinos en el mejoramiento de las condiciones de su entorno, así como el fortalecimiento de sus redes sociales y vecinales para mejorar el tejido social en los barrios. Se financiará: (i) capacitación de líderes, programa de deportes y valores, apoyado por el Comité Olímpico Internacional; (ii) capacitación de vecinos en áreas de empleabilidad dentro y fuera del barrio mediante la asistencia técnica de las Universidades y su vinculación con el sector empresarial, (iii) organización para utilización de sistemas de alerta temprana para desastres naturales. Todas las actividades tendrán enfoque de género.

Componente 2: Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios (US\$22.130 millones). Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios de prevención social de la violencia al ciudadano y brindar una atención oportuna a las víctimas de violencias y delitos, fortaleciendo la gestión local. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Fortalecimiento de capacidades de actores municipales. Se financiará: (i) capacitación y asistencia técnica a las autoridades locales para promover la participación ciudadana en la preparación de planes locales de prevención social de la violencia; (ii) fortalecimiento de las capacidades de los responsables de los observatorios locales, para el análisis estratégico de estadísticas del crimen y delito -incluyendo la desagregación por género-; y (iii) estrategia de comunicación a través de campañas y consultas

sociales para promover medidas y valores para la reducción de violencias, respeto por las normas legales, morales, culturales y el uso de la oferta de servicios disponibles de prevención y atención a víctimas.

Intervenciones de prevención social de la violencia a nivel municipal. Se financiará: (i) programas para la atención a víctimas de VIF a través del módulo de Atención Integral Especializado (MAIE); (ii) desarrollo de protocolos para homologar la actuación de primeros respondientes para atención a víctimas, (iii) programa de prevención social de la violencia para jóvenes en situación de riesgo; (iii) modelo innovador de policía comunitaria y patrullaje policial sistemático -Hot Spots-; y (iv) mejoramiento de la infraestructura de las Jefaturas Departamentales, para ofrecer servicios policiales a la comunidad.

Componente 3: Efectividad policial. (US\$16 millones). Con el propósito de mejorar el desempeño y la calidad en la prestación de los servicios policiales, se apoyará la consolidación del sistema nacional de formación y profesionalización, así como su sistema de integridad. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Consolidación del sistema educativo policial basado en la filosofía de Policía Comunitaria. Se financiará: (i) diseño del modelo de Sistema de Formación y Profesionalización Policial, articulando sus diferentes instancias de formación (Instituto Técnico Policial -ITP-, ANAPO, Universidad y educación continua y entrenamiento), incluye mecanismos de evaluación continua del personal. Lo anterior, deberá estar sujeto a promover principios de meritocracia y transparencia en el desarrollo de la carrera policial; (ii) modernización del currículum académico para los medios y altos mandos policiales, certificado bajo la filosofía de policía comunitaria y orientando la formación a competencias para la toma de decisiones operativas. Lo anterior, incluyendo la redefinición del perfil de ingreso de candidatos a la ANAPO. Esto considerará la incorporación de nuevos cadetes, provenientes del ITP y otros candidatos que ya hayan cursado licenciaturas y tecnicaturas en otras universidades; modernizar el régimen de formación de oficiales en el nuevo campus universitario y generar una nueva estructura de gobierno y planta de profesores-investigadores de tiempo completo (teóricos y prácticos) (iii) fortalecimiento de las capacidades pedagógicas para docentes; (iv) fortalecimiento de la integridad policial a través de la consolidación de un sistema de evaluación y rendición de cuentas; y (v) modernización de la infraestructura física y tecnológica de la Academia Nacional de Policía y el Centro de Investigación y Desarrollo Policial.

Fortalecimiento de las capacidades en investigación criminal. Se financiará: (i) programa de capacitación y especialización continua en investigación criminal en coordinación con el MP; (ii) capacitación técnica en el uso de tecnologías de la información para análisis estratégicos delictuales; e (iii) implementación de un sistema integrado de información delictiva y criminal para mejorar la resolución del delito -integrando estadísticas por categoría de género.

iv. Mecanismo de Ejecución.

Se propone contar con dos organismos ejecutores independientes, pero con responsabilidades compartidas en el diseño, implementación y evaluación de iniciativas que se realicen en la misma área geográfica. El componente 1 de esta operación será ejecutado por SEDECOAS-FHIS y el componente 2 y 3 por la Secretaría de Seguridad.

v. Monto del Convenio:

US\$ 60,000,000.00 millones de dólares, según convenio de préstamo el cual se desglosa de la siguiente manera: SEDECOAS- FHIS le corresponde US\$ 15, 000,000.00 millones de dólares y a la Secretaría de Seguridad le corresponde US\$ 40,000,000.00 millones de dólares.

La duración del convenio es por 5 años después de la publicación de diario La Gaceta Acuerdo Ejecutivo No. 114-2018.

vi. Avance financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	17.749.164,00	14.959.784,44	84%
2019	84.562.822,00	75.678.087,16	89%
2020	105.302.450,00	71.201.381,99	68%
2021	120.272.463,00	112.275.707,10	93%
2022	71.849.516,00	41.761.520,10	58%

vii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2022	Mto. Ejecutado 2022	Empleos Generados 2022	Beneficiarios Directos 2022
EMPREDIMIENTO Y VALORES	0	7.435.665,47	27	1.262
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	0	28.781.432,56	150	3.210
TOTAL	0	36.217.098,03	177	4.472

viii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2022	Mto. Ejecutado 2022	Empleos Generados 2022	Beneficiarios directos 2022
FRANCISCO MORAZAN	0	36.217.098,03	177	4.472
TOTAL	0	36.217.098,03	177	4.472

ix. Otras Inversión

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2022
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	5.325.334,46
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	219.087,61
TOTAL	5.544.422,07

x. AVANCES AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022

<i>Avances Programa</i>		
COMPONENTE 1 MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES		
1.0	PRODUCTO 1.1 NUEVE PROYECTOS INTEGRALES DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS (RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PÚBLICO, EQUIPAMIENTO SOCIAL Y PAVIMENTACIÓN), COMPLETADOS Y SIENDO UTILIZADOS	
1.1	<i>Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios</i>	El día 20 de junio de 2022 inició la ejecución de obras del Proyecto de Integración Urbana en colonias Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 633 predios; el monto del contrato es de L. 55,100,000.000 se tiene un avance físico del 23% que corresponde a la construcción de pozos e instalación de tuberías del sistema de alcantarillado sanitario, instalación de tubería para el sistema de agua potable y pavimentación de calles con un avance financiero del 46%. La supervisión de la obra inició el día 05 de junio de 2022, el monto del contrato es de 4,744,032.28 y tienen una ejecución financiera del 30%.
2.0	PRODUCTO 1.2 JÓVENES DE LOS BARRIOS INTERVENIDOS CAPACITADOS	
2.1	<i>Programa de Deportes y Valores</i>	Este proyecto consiste en la enseñanza de disciplinas deportivas implementando los valores olímpicos; al semestre se imparten seis (6) disciplinas olímpicas: taekwondo, levantamiento de Pesas, tenis de Mesa, atletismo, balonmano y lucha olímpica; también, se atiende niños y/o jóvenes con discapacidad, este programa está en ejecución continua y participan aproximadamente 700 jóvenes de las colonias intervenidas por el programa.
3.0	PRODUCTO 1.3 MUJERES DE LOS BARRIOS INTERVENIDOS CAPACITADAS EN EMPRENDEDURISMO Y EMPLEO	
3.1	<i>Capacitaciones en empleabilidad.</i>	- Al mes de junio de 2022 inició el curso de panadería a través de la fundación CADERH, donde participan 20 jóvenes el cual finalizó el 29 de agosto de 2022. - Al mes de junio de 2022 inició el curso de diseño gráfico a través de la fundación CADERH, donde participan 20 jóvenes el cual se prevé finalizar al mes de diciembre del año 2022. - A finales del mes de agosto, inició el curso en educación financiera en donde participaron 36 jóvenes, este curso finalizó al mes de septiembre de 2022 - A finales del mes de julio dio inicio un curso de emprendimiento en el cual se beneficiaron a 72 jóvenes, a través de convenio con la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa; en el curso se emprendimiento se impartieron técnicas de mercadeo, compra de suministros, cálculo de precio y utilidad, habilidades blandas, punto de equilibrio etc; adicionalmente se le brindará un kit de emprendimiento a cada joven que apruebe su proyecto de negocio; el curso finalizará al mes de octubre del año 2022.

xi. PROBLEMÁTICA:

PROBLEMA	ACCIONES DE MITIGACIÓN, COMENTARIOS, NECESIDADES DE APOYO
Retrasos en el inicio de ejecución de obras	Se adjudicó en el mes de enero de 2022 el Proyecto de Integración Urbana en colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén No. 2, Brisas del Mogote Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 633, predios; debido a que este proyecto sobrepasa el período de gobierno, se gestionó la aprobación del contrato de ejecución de obras en el Congreso Nacional acorde al artículo 114 de las disposiciones generales del presupuesto del año 2022; en este sentido, se retrasó el inicio de ejecución de obras por un período de 4 meses, lo cual incrementará los costos estimados al presupuesto destinado para tal fin, ya que ha aumentado la inflación en los materiales de construcción (cemento, acero y combustible) y no se cuentan con recursos adicionales para enfrentar el escalamiento en materiales de construcción.



CARTERA BANCO MUNDIAL



✓ **Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE 6822-HN)**



i. Antecedentes

Entre los días 1 y 16 de noviembre de 2020, dos tormentas tropicales consecutivas, Eta e Iota, devastaron a Honduras con una magnitud de impacto económico y social comparable a la del huracán Mitch de 1998. En respuesta a la emergencia causada, el Gobierno de Honduras (GdH) solicitó al Banco Mundial (BM) un financiamiento de US\$150 millones para un Proyecto de Recuperación de Emergencia.

El 8 de marzo de 2021 el Gobierno de Honduras suscribió con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) el Convenio de Crédito No. 6822-HN, por un monto de US\$150.000.000.00, aprobado mediante Decreto Legislativo No.10-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 5 de mayo de 2021, fondos que financiaran el Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE), habiéndose cumplido con las condiciones de efectividad el 4 de junio de 2021 y efectuándose el Primer Desembolso el 28 de junio de 2021 por un monto de USD\$ 4.36 Millones.

El Proyecto se enfoca en la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública en salud, educación, agua y saneamiento, vial, comunitaria y vivienda en las zonas geográficas del país afectadas por los ciclones tropicales Eta e Iota.

La implementación, coordinación, planificación y seguimiento general del Proyecto se llevará de manera centralizada en la SEDECOAS, a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), quien contará con personal especializado en diferentes áreas que garanticen el cumplimiento de los estándares del BM.

ii. **Objetivo General**

El PRE tiene por objetivo atender las necesidades identificadas como prioritarias para reactivar la economía y apoyar las más urgentes necesidades de la población afectada por los fenómenos naturales

ETA e IOTA, como respuesta de emergencia y recuperación de Honduras, y, en esta perspectiva, fortalecer la capacidad institucional del Estado para gestionar una ejecución eficaz, eficiente y transparente.

iii. **Objetivos Específicos**

- Realizar operaciones de asistencia y respuesta de emergencia, salud y seguridad pública.
- Realizar la rehabilitación y construcción resiliente de la infraestructura pública y Comunitaria y Restablecimiento de los servicios públicos.
- Mejorar la capacidad instalada del Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.

iv. **Descripción**

Componente 1: Operaciones de asistencia y respuesta de emergencia, salud y seguridad pública (US\$ 17.3 MILLONES)

Bajo este componente se financian actividades y acciones de respuesta y seguridad pública como resultado de los daños causados por los ciclones Eta e Iota. Son elegibles actividades de respuesta inmediata realizadas por el Gobierno de Honduras previo a la fecha de efectividad del Crédito.

Componente 2: Rehabilitación y reconstrucción resiliente de la infraestructura pública y comunitaria y restablecimiento de los servicios públicos (US\$121.7 MILLONES)

Este componente se financia la preparación técnica, la implementación de reparaciones urgentes, rehabilitación y reconstrucción resiliente de la infraestructura pública y comunitaria de alta prioridad,

incluido el costo de la reubicación temporal y la inspección o actividades de diseño necesarias para instalaciones de alta prioridad que requieran una nueva construcción

Componente 3: Apoyo institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción (US\$11.0 MILLONES)

El componente se financia la gestión de Proyecto (financiero y fiduciario), la capacidad técnica e institucional, auditorías técnicas, financieras y sociales, monitoreo y seguimiento, cumplimiento social y ambiental, mecanismo de atención y resolución de quejas y denuncias, preparaciones informes, evaluación de medio términos, estudios de línea base.

v. Focalización

Para determinar las zonas y sectores de intervención, el Gobierno de Honduras con la asistencia técnica de organizaciones y agencias internacionales, ha elaborado el documento borrador denominado “Evaluación de daños y pérdidas causadas por las tormentas tropicales Eta e Iota”¹

También se cuenta con la base de datos del estudio levantado por la SEDECOAS denominado “Plataforma de información de incidencias de la infraestructura dañada por las tormentas Eta e Iota”, que consolida los datos de las tres fuentes del Gobierno. De igual manera, se cuenta con listas de infraestructura que fue levantada por las instituciones sectoriales en las oficinas de COPECO Tegucigalpa, en un centro de acopio instalado luego de los eventos de desastre de las tormentas tropicales Eta e Iota.

Las acciones de respuesta de socorro y atención a personas están siendo financiadas bajo el Componente 1 y, las obras de reconstrucción y rehabilitación, elegibles y priorizadas, serán financiadas bajo el Componente 2, estas se ejecutarán en los municipios y sectores afectados por las tormentas tropicales Eta e Iota.

vi. Sector de Intervención

Los sectores por intervenir son:

- *Infraestructura de Salud:* Rehabilitación, reconstrucción, construcción de obras de mitigación de centros de salud, clínicas, unidades de salud CESAMO, CESAR, hospitales, entre otros.
- *Infraestructura Vial:* Habilitación, reposición de carreteras primarias, secundarias, carreteras terciarias (camino vecinales), Habilitación, Reposición y reparación de puentes, puentes de doble vía, cajas puentes, vados en caminos, construcción de obras de mitigación para proteger estructuras viales, rehabilitación de calles (pavimentadas y no pavimentadas), Rehabilitación de caminos rurales de terracería, Mantenimiento en los cauces de los ríos (incluye limpieza, dragado, etc.).
- *Infraestructura Escolar:* Rehabilitación, reparación y reposición de Centros de Educación de manera integral incluyendo obras ambientales y de mitigación.
- *Infraestructura Agua y Saneamiento:* Reparación o rehabilitación en estructuras de sistemas de agua potable (obras tomas, desarenadores, pases aéreos, tanques de almacenamiento, cajas de registro, rompe cargas, cajas distribuidoras de caudal, etc.), plantas de tratamiento y sistemas de aguas residuales, construcción de obras de mitigación para la protección de estructuras de los sistemas de agua potable y residuales, equipamiento de agua potable y residuales.
- *Infraestructura Comunitaria:* Rehabilitación de centros comunitarios y servicios públicos básicos (estación de bomberos, estaciones policiales, albergues, alcaldías, etc.), reposición de centros comunitarios, equipamiento para rehabilitación de centros comunitarios y servicios públicos básicos.

vii. Duración del Proyecto:

El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de 5 años y medio incluyendo actividades de gestión, socialización, adquisiciones, etc.

viii. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	175.537.263,00	1.116.987,87	1%
2022	259.608.231,00	8.369.973,64	3%

ix. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2022
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	6.152.641,74
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	2.217.331,90
TOTAL	8.369.973,64

x. Situación presupuestaria

El presupuesto inicialmente aprobado para el año 2022 fue L732,341,690.00; durante el periodo ha sufrido ajustes por un monto total de L 472,733,459.00, reflejando al cierre del tercer trimestre un presupuesto vigente de L 259,608,231.00 y una ejecución de L 8,369,973.64 (3.2%).

Así mismo, a partir de las revisiones y reprogramaciones de actividades en el Plan Operativo Anual (POA) y en el Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC), se solicitaron modificaciones presupuestarias internas entre actividades y objetos del gasto, estas no modificaron el presupuesto global vigente.

El 78.44% del presupuesto está concentrado en el Componente 2 para ejecución de obras que al III Trimestre no ha sido posible iniciar su ejecución. Sin embargo, a pesar del atraso en la aprobación de requisitos previos solicitados por el Banco Mundial, durante el pasado trimestre se han adjudicado los contratos para la reparación/ reposición de 27 centros educativos. En el último trimestre del año se estarán ejecutando estos subproyectos, junto a otras obras a realizar de los sectores viales y de agua y saneamiento.

La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) se está completando con nuevas contrataciones. Al cierre del III Trimestre se han adjudicado a 23 consultores y se encuentran en evaluación 12 nuevas contrataciones de consultores administrativos y técnicos.

Las nuevas oficinas de la UEP se encuentran en remodelación y mientras tanto se realiza la adquisición del mobiliario y equipo.

xi. Reducción Presupuestaria

A solicitud de la SEFIN y con el propósito de apoyar a la Secretaría de Salud para atender emergencia de vacunas, se gestionaron disminuciones presupuestarias: a) en los grupos del gasto 20000 y 30000 por L112,193,465.00 en su mayoría asignado bajo el componente 1. Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia Salud y Seguridad Pública y b) en el grupo 40000 por L 325,539,994.00 y L 35,000.00 bajo el componente 2, después de esto, el presupuesto ajustado del PRE es de L 259,608,231.00. Al 31 de marzo sigue pendiente la aprobación final por parte de la SEFIN a la disminución.

xii. Ejecución Financiera

Al 30 de septiembre del 2022 la ejecución financiera acumulada del Proyecto asciende a L 412,717,779 equivalentes a USD 17,023,971, que representa el 11.35% del monto de Convenio, así:

Componentes	(a) Asignación Convenio Crédito		(b) = (c + d) Total Comprometido		(c) Comprometido ejecutado		(c) Comprometido por ejecutar **		(e) = (a - b) Disponible
	US\$	* HNL	US\$	HNL	US\$	HNL	US\$	HNL	US\$
Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública	17,300,000	420,390,000	16,818,559	407,708,157	16,818,559	407,708,157	-	-	481,441
1) Categoría : Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, y costos operativos bajo la Parte 1 del Proyecto.	17,300,000	420,390,000	16,818,559	407,708,157	16,818,559	407,708,157	-	-	481,441
Rehabilitación y Construcción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos	121,700,000	2,957,310,000	4,413,579	108,114,310	11,494	263,221	4,402,085	-	117,286,421
2) Categoría: Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 2 del Proyecto	121,700,000	2,957,310,000	4,413,579	108,114,310	11,494	263,221	4,402,085	107,851,089	117,286,421
Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción	11,000,000	267,300,000	1,250,079	14,001,279	386,622	9,445,543	863,457	4,555,736	9,749,921
3) Categoría: Bienes, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 3 del Proyecto	11,000,000	267,300,000	1,250,079	14,001,279	386,622	9,445,543	863,457	4,555,736.21	9,749,921
Total	\$ 150,000,000	HNL 3,645,000,000	\$ 22,482,218	HNL 529,823,747	\$ 17,216,675	HNL 417,416,922	\$ 5,265,543	HNL 4,555,736	\$ 127,517,782

* Se aplica la tasa de L 24.3 establecida en el Documento del Proyecto (PAD) y en el presupuesto global en los Sistemas: SNIPH, UPEX y Sistema Financiero del FHIS.

** Valores comprometidos con contrato

Para fines de control y seguimiento al costo administrativo (10%) del proyecto, el componente 3. se subdividió en el Sistema UEPEX/SIAFI en dos componentes/actividad presupuestaria (3. y 4.) con el nombre “Gestión y Administración del Proyecto”.

xiii. Desembolsos

Al 30 de septiembre se ha desembolsado la cantidad de USD\$ 21,186,453.38 equivalente a L 512,065,007.29; representa el 14.1% del total del Crédito. Del total desembolsado USD\$ 16.8 millones equivalente a L 407,7 millones, corresponde a reembolso bajo el Componente 1. mediante pago directo a la SEFIN por actividades de respuesta inmediata realizadas por la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS).

Desembolso	Dólares	Lempiras
Anticipo Cuenta Designada del Proyecto Cta. 11101-20-000949-1 BCH)	4,367,894.00	104,356,849.87
Reembolso bajo Componente 1, con Pago Directo a la SEFIN. (Cta. 11101-20-000952-1)	16,818,559.38	407,708,157.42
Total	21,186,453.38	512,065,007.29

xiv. Reembolso gastos efectuados bajo el Componente 1- Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia y Salud y Seguridad Pública.

Mediante Memorando 207-2021 SE-SEDECOAS-FHS del 11 de junio de 2021, se nombró Comité Interino para la revisión de documentación para reembolso del Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras, en cumplimiento a esto, al 31 de diciembre de 2021 se revisó documentación de procesos por un monto total de L591,952,044.29, de gastos ejecutados por la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS) y la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), en acciones de respuesta de socorro y atención a personas, así:

Institución	Lempiras
SEDIS	415.939.122,84
COPECO	176,012,921.45
Total	591,952,044.29

SEDIS: Del total de los gastos presentados, al 30 de junio de 2022 se han reembolsado con pago directo a la SEFIN un total de L 407,708,157.42 equivalente a USD 16,818,559.38, a través de Sistema de Desembolso (Client Connection). No se efectuarán más reembolsos.

COPECO: A la fecha ningún gasto se ha sometido a reembolso. Contratos de limpieza de calles están en proceso de revisión, y de ser elegibles, serán sometidos a reembolso con fondos del Contrato de Préstamo 5328 BL-HO, Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

xv. **ADQUISICIONES**

Durante el III trimestre se ha adjudicado la contratación a trece (13) consultores: ocho (8) consultores internos en formulación de subproyectos, cuatro (4) en infraestructura, tres (3) en agua y saneamiento y uno (1) estructural, Gestor Ambiental, dos (2) Inspectores de subproyectos de infraestructura, Asistente Administrativo y Especialista en Comunicaciones. La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) ya contaba con personal clave contratado: Coordinador General, Coordinador Técnico, Especialista Financiero, Especialista Ambiental, Especialista Social y en Genero, Asistente Financiero y de Desembolso, Especialista en Salud y Seguridad Ocupacional, Especialista en Monitoreo y Evaluación, Especialista en Adquisiciones y Técnico en Control de Calidad. Se encuentran en evaluación los procesos para la contratación de 12 consultores que complementarán el equipo del proyecto.

En el tercer trimestre se contrató la Firma Auditora Deloitte & Touche para la auditoria de los fondos ejecutados del periodo de junio a diciembre de 2021.

Durante el trimestre se ha avanzado en los procesos de adjudicación de bienes y obras que se han evaluado durante el año. En cuanto a obras, se han adjudicado los procesos de cotizaciones y licitaciones para 27 reparaciones y/o reposiciones de escuelas. En proceso de adjudicación se encuentra la “Supervisión de Escuelas paquete No. 2 ubicadas en los departamentos de Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz y Lempira”.

Con respecto a los bienes, se han adjudicado 12 Vehículos Tipo Pick-Up de doble tracción (lote 1) y 1 Vehículo Tipo Microbús (lote 2) y el Mobiliario de Oficina para la UEP. En proceso de evaluación se encuentra la adquisición de Equipo Informático, Video y Sonido.

El Plan de Adquisiciones del año 2022 se ha registrado en los sistemas de HonduCompras y STEP del Banco Mundial.

Evaluación, No Objeción y Adjudicación de Contratos:

- ✓ En proceso de evaluación de las consultorías: 1) Oficiales de Adquisiciones de la UEP, 2) Asistente Coordinador General, 3) Oficial de Fuente Enlace UEP-Dirección de Finanzas de la SEDECOAS-FHIS, 4) Operador de Terminal de Contrataciones UEP, 5) Enlace Contable de la Unidad UEP, 6) Formulación de subproyecto de infraestructura - Control de Calidad, 7) Consultores en levantamientos topográficos, 8) Ingeniero en Hidrología y 9) Gestor en Licenciamiento Ambiental.
- ✓ En proceso de adjudicación para la “Supervisión de Escuelas paquete No. 2 ubicadas en los departamentos de Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz y Lempira”.
- ✓ En proceso de evaluación de la adquisición de bienes se encuentra la Adquisición de Equipo Informático, Video y Sonido para uso de la UEP y SEDECOAS.

xvi. AVANCE DE ACTIVIDADES

i. Componente 1 - Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia y Salud y Seguridad Pública.

A través de la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS) fueron atendidas 60,000 familias (equivalente a 300,000 personas) con kit de cocina, kit de higiene personal de niños y adultos, kit de limpieza, camas, estufas, filtros de agua, pañales, material de bioseguridad, toallas de baño, baldes plásticos, entre otros).

El componente 1, estuvo vigente del 2 de noviembre de 2020 al 8 marzo de 2021. Por tanto, durante la duración del proyecto no tendrá nuevas actividades a ejecutarse.

ii. Componente 2 - Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos (Obras).

Con el financiamiento de otras fuentes, el FHIS ha identificado zonas y sitios afectados por la tormenta Eta e Iota, con el fin de formular diseños finales para la rehabilitación y/o reconstrucción en infraestructura educativa, infraestructura vial (puentes) y en el sector de agua y saneamiento.

La Unidad Ejecutora del Proyecto a través de su personal técnico y con el apoyo de la Dirección de Proyectos del FHIS-SEDECOAS ha realizado revisiones a la formulación de los subproyectos priorizados, para verificar que estos estén cumpliendo con los lineamientos técnicos, ambientales, sociales, y otros relevantes que son parte de los compromisos adquiridos con el Banco Mundial.

iii. Componente 3 - Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.

- Preparación y asistencia a Misión de Supervisión del Banco Mundial desarrollada los días 27 y 28 de septiembre.
- Capacitación a personal de la UTC - FHIS en el Mecanismo de Quejas, Marco de Reasentamiento y Plan de Participación de Partes Interesadas.
- En proceso de Evaluación de los siguientes procesos de contratación de consultores:
 - ✓ CPN-FHIS-06-2022 Oficial de Adquisiciones
 - ✓ CPN-FHIS-07-2022 Enlace - Oficial de Fuente
 - ✓ CPN-FHIS-08-2022 Operador de Terminal de Contrataciones
 - ✓ CPN-FHIS-10-2022 Asistente Contable de la Unidad Ejecutora del Proyecto
 - ✓ CPN-FHIS-17-2022 Consultor Ingeniero en Hidrología
 - ✓ CPN-FHIS-18-2022 Gestor Licenciamiento Ambiental
 - ✓ CPN-FHIS-19-2022 Consultores Servicios de Topógrafo
 - ✓ CPN-FHIS-20-2022 Técnico en Control de Calidad
 - ✓ CPN-FHIS-21-2022 Asistente Coordinador General

- En proceso de Evaluación de los siguientes procesos de adquisición de bienes: Adquisición de Equipo Informático, Video y Sonido para uso de la UEP y SEDECOAS.
- Contratado y en acondicionamiento el local para el funcionamiento de las oficinas de la UEP.

xvii. PROBLEMÁTICA

Al final del III Trimestre, ya se cuenta con los primeros subproyectos adjudicados, 27 centros educativos. Sin embargo, el inicio de obras no se ha dado debido a varias situaciones externas e internas. Primero, las empresas supervisoras deben iniciar operaciones antes de que inicien los subproyectos. La contratación de las empresas supervisoras, ha demorado más de lo esperado debido a la modalidad de contratación la cual incluye negociaciones que exceden a los tiempos planificados. Segundo, las empresas constructoras han demorado en presentar los requisitos solicitados por la institución para proceder con las firmas de contratos. Por último, las condiciones climáticas en el país retrasan el inicio de las obras debido a carreteras incomunicadas y a zonas de intervención en condiciones vulnerables.

Los subproyectos de agua y saneamiento están en proceso de revisión con el Banco Mundial, quienes han agregado requerimientos de información a los expedientes y a los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS). Subsanar estos documentos está tomando tiempo que no estaba planificado por lo que se retrasa el lanzamiento de los respectivos procesos de adjudicación.

En conclusión, la UEP del proyecto PRE debe cumplir con los requerimientos del Banco Mundial y de la institución FHIS-SEDECOAS. Dicho cumplimiento, conlleva varias sesiones de revisión y subsanación lo que ralentiza el inicio de la ejecución de los subproyectos. Se considera que esto continuará sucediendo en los primeros subproyectos de cada tipología ya que cada uno conlleva sus particularidades que no se han abordado anteriormente.

La mayoría de las formulaciones de los subproyectos efectuadas por formuladores externos y recibidas por el proyecto PRE carecen de análisis de gestión de riesgos: accesibilidad; obras de mitigación; hidrosanitarios; estabilización de taludes; medidas compensatorias, contra incendios, de comunicación y de señalización, y, requieren actualización de costos y cantidades de obra.

El atraso en la conformación de la Unidad Ejecutora del Proyecto ha afectado el cumplimiento de metas físicas y financieras.

xviii. RETOS

- ✓ Lanzamiento de procesos de adquisición de los subproyectos de agua y saneamiento y viales.
- ✓ Definir con el Banco Mundial estrategias para la simplificación de requisitos y
- ✓ procesos para la eficiente ejecución de subproyectos de emergencia.
- ✓ Traslado a las nuevas oficinas contratadas para funcionamiento de la UEP
- ✓ Contratación del personal complementario de la UEP.

CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION **ECONOMICA**



✓ **Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)**

i. Antecedentes

El Estado de Honduras ha revalorizado la educación como elemento fundamental para el desarrollo integral de todos los hondureños, mediante la implementación de la Tercera Reforma Educativa, que responde a las expectativas de la sociedad, cuyos alcances se enmarcan en los objetivos No.1 y No.4 de la Visión de País 2010-2038; Plan de Nación 2010-2022; que estipulan: “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidados de previsión social” y “Honduras con un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo. Para la ejecución de esta Tercera Reforma, se aprueba en el año 2012, la Ley Fundamental de Educación y en el año 2014 sus 22 Reglamentos.

Según el Plan Estratégico del Sector Educativo 2018-2030, para poder cumplir con la Ley Fundamental de Educación, el sistema educativo en Honduras se enfrenta a los siguientes retos:

-Fortalecimiento de la Secretaría de Educación conforme a la Ley Fundamental de Educación (LFE), principalmente en dos aspectos: i) descentralizar funciones operativas en las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de Educación; y ii) fomentar la participación comunitaria en la gestión educativa, formulación y coordinación de los planes estratégicos, que apunten a mejorar la calidad educativa.

El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Educación, garantiza el derecho fundamental a la educación, el acceso a una educación de calidad en condiciones de equidad, sin discriminación de ninguna naturaleza en todos sus niveles. La Ley Fundamental de Educación recupera el espíritu de garantizar este derecho, estableciendo el compromiso de brindar educación gratuita en todos sus niveles; un año obligatorio en Educación Pre-Básica (tercer grado) y tres ciclos de Educación Básica (I, II y III

ciclo). Con ello, se logra la meta establecida de país, que para el año 2038, Honduras debe elevar la escolaridad promedio a 9 años (1° a 9° grado), reconociendo que es necesario formar educandos para la convivencia, derechos humanos, responsabilidad social, cuidado de las personas, entendimiento del entorno, protección del medio ambiente y la educación media ha sido considerada, hasta finales del siglo XX, como el período de preparación de los jóvenes para el ingreso a la educación superior y también como la enseñanza que proporciona entrenamiento técnico-vocacional, preparando a los jóvenes para su inserción en la vida productiva. En general, la educación media tiene como propósito ofrecer la experiencia formativa para incorporarse al mundo del trabajo y/o proseguir estudios en el nivel de educación superior.

ii. Objetivo General

Fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros Educativos Media y sean promovidos con la calidad requerida.

iii. Focalización

El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.

iv. Beneficiarios

El Programa beneficiará 480 niños de Educación pre-básica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes.

v. Duración

La duración del programa es de 3 años desde el 2021 hasta el 2023 donde habrá un desarrollo gradual de la infraestructura y la dotación de equipo, así como la formación permanente y la plataforma virtual para emprendimiento.

vi. Costo Total del Programa

Este es un esfuerzo de la Republica de Honduras, a través de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por US\$80,000,000.00 que tiene como meta llegar a la población educativa de los diferentes niveles que atiende el sistema educativo nacional.

vii. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	507.311.663,00	114.393.414,00	23%
2022	499.467.419,00	39.100,00	0%

viii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2022
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	-
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	39.100,00
TOTAL	39.100,00

ix. Principales Logros III Trimestre

1. Se han aprobado 18 proyectos en comité de inversiones por un monto de L99,973,412.28 lo cuales se iniciará el proceso de contratación en el último trimestre del año.

2. Se ha solicitado la No Objeción a la modificación del Plan General de Adquisiciones (PGA), se está a la espera de dicha no objeción para iniciar con la contratación de la inversión aprobada en el punto anterior.
3. La secretaría de Educación ha emitido la aprobación de 10 proyectos más, los cuales se estarán sometiendo a aprobación del comité de inversiones para aprobación.
4. Se ha solicitado la priorización al BCIE de 24 Centros Educativos adicionales solicitados por SEDUC, se está a la espera de la No Objeción.

x. Próximos Retos

Entre los principales retos que enfrenta:

1. Concluir con el proceso de contratación COT-FHIS-23-2022, al informe de evaluación se le hicieron observaciones las cuales deben ser incluidas al documento y gestionar la No Objeción al informe para notificar los resultados.
2. Se debe concluir con la declaración de fracasado del proceso de contratación del Coordinador de Adquisiciones del Programa, y volver a lanzar el nuevo proceso de contratación.
3. Se debe concluir con la contratación del Coordinador Financiero del Programa, el cual se encuentra en etapa de evaluación.
4. Concluir con el proceso de concurso CPN-FHIS-31-2022, el cual se encuentra en etapa de evaluación,
5. Iniciar con el proceso de contratación de la Auditoría Externa al programa para los periodos 2021 y 2022, el documento de referencia está en etapa de revisión.
6. Brindar seguimiento a los contratos de los formuladores de proyectos que se encuentran en revisión en el Congreso Nacional.

✓ **Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira.**

i. Antecedentes.

El Estado de Honduras ha revalorizado la necesidad de mejorar el servicio de suministro de agua potable en la ciudad de Gracias, mediante la implementación de un sistema de abastecimiento de agua potable cuyos alcances se enmarcan en los objetivos No.3 y No.4 de la Visión de País 2010-2038; Plan de Nación 2010-2022; que estipulan: “Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental” y “Honduras con un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo”.

Según la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento, El Estado, como responsable de propiciar el bienestar económico, político, social y cultural de los hondureños, es responsable de cuatro funciones básicas: 1. Garantía de acceso a servicios de Agua Potable y Saneamiento de calidad y con eficiencia a la población. 2. Ampliación de la cobertura del servicio, especialmente en comunidades rurales y en comunidades urbanas de escasos recursos. 3. Garantía, bajo principio de solidaridad, de acceso al agua potable a sectores excluidos del servicio por razones de pobreza. 4. Gestión de recursos para el desarrollo de servicios de agua potable y saneamiento, estableciendo las prioridades, los criterios de recuperación de inversiones, asignación de capital, acorde con capacidades financieras respectivas.

ii. Objetivo

El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los servicios de agua potable para la población del municipio de Gracias, Departamento de Lempira, aumentando la cantidad y la calidad del agua suministrada, a través de la ampliación del sistema de abastecimiento, mediante el desarrollo de la infraestructura hidráulica.

iii. Localización

El Proyecto estará localizado en la Ciudad de Gracias en el Departamento de Lempira.

iv. Beneficiarios

El Proyecto beneficiará 22,681 personas en el año 2022 de los cuales 11,005 son hombres y 11,676 son mujeres y en un periodo de 40 años lo estarían alcanzando un estimado de 76,889 personas.

v. Duración

La duración del Proyecto es de 4.1 años (49.2 meses) incluyendo actividades de gestión, socialización, adquisiciones, ejecución, etc. Y se estima además 2 años para la operación y mantenimiento antes de hacer el traspaso a la UMASG.

vi. Situación Actual del Proyecto

En etapa de Pre- Inversión a Nivel de Factibilidad.

vii. Costo Total del Proyecto

US\$36, 000,000.00, el monto final se definirá en el proceso de formulación.

viii. Fuente Financiera

Este es un esfuerzo de la Republica de Honduras, a través de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por US\$36,000,000.00 que tiene como meta llegar a la población de Gracias, Lempira.

ix. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2022	193.172.460,00	0,00	0%

x. Principales avances

- TDR para contratación de la UCP en revisión por el BCIE y el TDR de la consultoría en ajustes y revisiones por parte de la Dirección de contrataciones.

CARTERA KfW Entwicklungsbank



✓ **Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V**



i. Objetivo General

Consiste en la utilización de centros educativos mejorados, ampliados o nuevos y equipados bajo conceptos pedagógicos que operan de manera sostenible por la comunidad educativa. De esta manera se pretende contribuir a que niños/as y jóvenes de regiones pobres utilicen una oferta de alta calidad educativa, tanto formal como de educación vocacional.

ii. Focalización

Fase IV: El Área de intervención abarcará los departamentos que están siendo intervenidos en las fases anteriores (Zona de Occidente): 1) Copán, 2) Santa Bárbara, 3) Intibucá, 4) Lempira, 5) La Paz, 6) Ocotepeque. 7) Centros a nivel nacional en casos de emergencia (catástrofes naturales). La información de estos centros deberá ser actualizada en el plan maestro y sólo si se determina su precariedad, podrán ser intervenidos previo a No Objeción del KfW. 8) Adicionalmente se extenderá el área de intervención a los departamentos adyacentes a la zona de occidente, delimitando el área de intervención a través de la Carretera Panamericana. Los municipios a ser beneficiados se encuentran al oeste de la misma en los siguientes departamentos: 1) Choluteca, 2) Valle, 3) Francisco Morazán (exceptuando el núcleo urbano de Tegucigalpa), 4) Comayagua y adicionalmente 5) Gracias a Dios.

Fase V: El Área de intervención abarcará los departamentos de: Ocotepeque, Lempira y Copan, en la zona de Occidente. Además, los departamentos al oeste de la carretera CA-5 de los departamentos de Francisco Morazán (exceptuando el Distrito Central), Valle, Choluteca, Comayagua. También seguirá formando parte del Programa el Departamento de Gracias a Dios (siempre y cuando no se alcance un mínimo de infraestructura en este departamento y según las experiencias de la fase IV del PROMINE).

iii. Priorización de los Centros Educativos

Esta es realizada por la Secretaría de Educación apoyados en la herramienta del Plan Maestro de Infraestructura Educativa.

iv. Descripción del Proyecto

Fase IV: El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y en la planificación estratégica para los años 2014 - 2018 de la Secretaría de Educación (SE). El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las tres fases previas PROMINE I, II y III. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

Fase V: El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y el Plan Estratégico del Sector de Educación para los años 2017 - 2030 de la Republica de Honduras. El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las cuatro fases previas PROMINE I, II, III y IV. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

v. Monto del Proyecto:

Fase IV:

Fondos de Donación por un monto de € 15,000,000.00 euros, Contrapartida Nacional para SEDECOAS/FHIS de € 424,000 euros, Contrapartida Nacional para SE de € 218,000 euros, Contrapartida Municipal de € 515,000 euros y Contrapartida Comunitaria de € 514,000 euros.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 03/12/2015

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 17/02/2017

Fecha de Inicio: 02 de abril 2018 (Se considera la fecha de inicio de la Consultoría)

Fecha de Finalización de convenio: 30/11/2022

Fase V:

Fondos de Donación por un monto de 10, 000,000.00 euros, Contrapartida Nacional para IDECOAS/FHIS de 495,000 euros, Contrapartida Nacional para SE de 250,000 euros, Contrapartida Municipal de 600,000 euros

Contrapartida Comunitaria de 600,000 euros.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 06/07/2018

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 21/03/2019

Fecha de Inicio: Inicio de la Consultoría 18/3/2021

Fecha de Finalización de convenio: 37 meses a partir del inicio de la consultoría

vi. Avance Financiero PROMINE FASE IV y V

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2016	145.687.475,00	142.916.817,45	98%
2017	107.279.375,00	96.731.967,93	90%
2018	53.035.502,00	50.951.601,81	96%
2019	81.069.633,00	79.762.875,76	98%
2020	134.608.478,00	123.221.616,32	92%
2021	139.936.980,00	119.695.679,72	86%
2022	166.682.545,00	5.015.592,85	3%

vii. Avance Físico por Sector PROMINE FASE IV y V

SECTOR	Proyectos Finalizados 2022	Mto. Ejecutado 2022	Empleos Generados 2022	Beneficiarios Directos 2022
EDUCACION	2	776.657,86	85	807
TOTAL	2	776.657,86	85	807

viii. Avance Físico por Departamento PROMINE FASE IV y V


DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2022	Mto. Ejecutado 2022	Empleos Generados 2022	Beneficiarios Directos 2022
INTIBUCÁ	2	776.657,86	85	807
TOTAL	2	776.657,86	85	807

i. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2022
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	2.571.810,99
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA*	1.667.124,00
TOTAL	4.238.934,99
*Viaticos, pasajes y Combustible	

ii. AVANCES GENERALES

FASE IV.

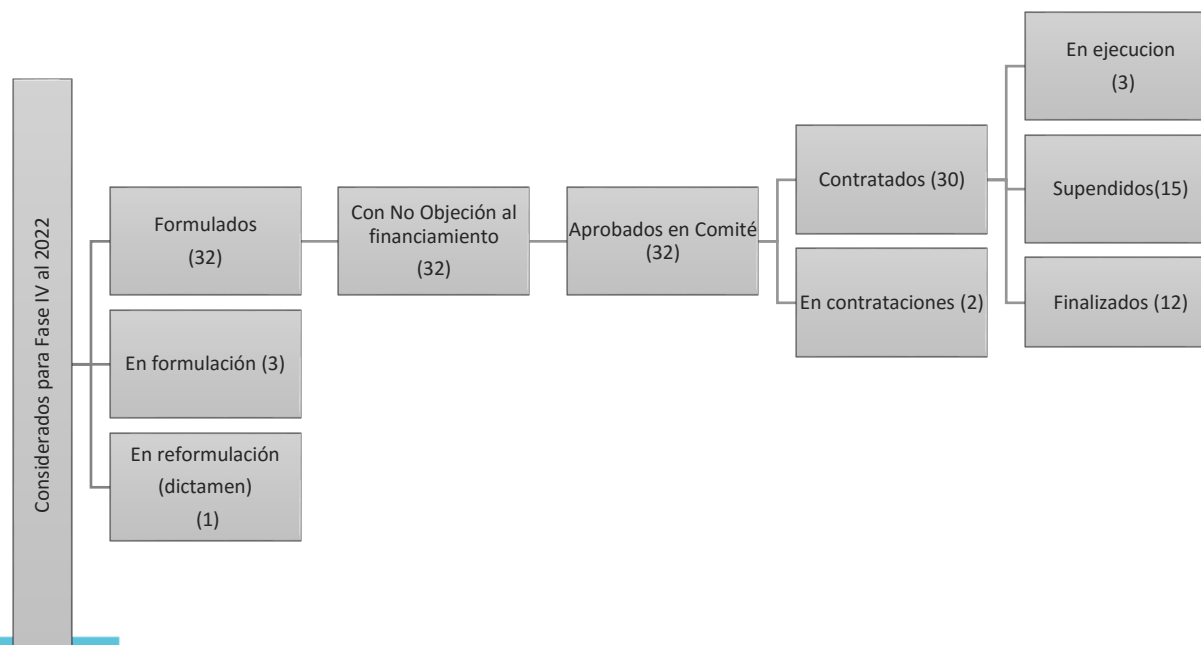

Para comprometer el componente de infraestructura en esta fase se han considerado 36 proyectos dada la rescisión de los cinco proyectos en el departamento de Gracias a Dios. Se mantiene la dificultad en

la ejecución física y financiera entre otras de: 1) Incremento de precios 2) Escasez de insumos 3) Escasez e incremento de monto de Mano de Obra Contratada 4) Disminución de aporte comunitario. Adicionalmente y con mayor importancia que 15 proyectos requieren de la aprobación de los contratos en el Congreso Nacional razón por la cual no se han realizado los desembolsos para continuar su ejecución.

iii. AVANCE FINANCIERO SEGÚN PRESUPUESTO ASIGNADO FASE VI Y FASE V

Año	Planificado al III Trimestre	Ejecutado	Eficiencia
2022	L57.057.622,00	5.015.592,85	9%

Se mantiene el desfase en la ejecución física y financiera del Programa dado lo siguiente:

- 1) Por la aprobación de los proyectos en el Congreso Nacional.
- 2) La aplicación de la cláusula por incremento de precios, para lo cual se tiene proyectado los pagos se efectúen una vez se aprueben los Contratos en el Congreso Nacional.
- 3) La reformulación de los proyectos en Gracias a Dios tiene un avance significativo sin embargo se está avanzado en los procesos de resolución de contratos bajo la metodología PEC.
- 4) El desfase en la planificación original de ejecución para este año a la fecha se ha estimado por aproximadamente 62.00 mm, monto que se ha actualizado y puesto a la disposición de otro programa y otras instituciones para su traslado.

iv. LOGROS III TRIMESTRE

- ✓ Finalizado dos proyectos en el departamento de Intibucá

v. RETOS PROXIMOS

Entre los principales retos que enfrenta el PROMINE-KfW:

- ✚ Aprobación de los proyectos y consultorías que trascendieron el periodo de Gobierno. Para los cuales el Programa ha remitido toda la información solicitada dando cumplimiento a lo indicado.
- ✚ Aplicación de la Cláusula de Incremento de Precios para que estos puedan concluirse los proyectos, esto implica la elaboración de adendas y revisión de montos.
- ✚ Falta de recursos en la Unidad de Transporte para la reparación de los vehículos, considerando que con fondos del Programa se han comprado los repuestos, lo que ha obligado a considerar un nuevo proceso en el mes de octubre para la instalación de los mismos.
- ✚ Estado de los vehículos, los que limita la presencia del programa oportunamente en los proyectos en ejecución, giras de socialización y prefactibilidades, esto limitante está relacionada al punto anterior.
- ✚ Las dificultades presentadas en la ejecución de los proyectos en Gracias a Dios, lo cual hace necesario en la conclusión de los proyectos en formulación para comprometer el componente de Infraestructura de esta fase y la liquidación de los cinco proyectos en Gracias a Dios para la recuperación de los fondos no reconocidos. ii) Los incrementos de los insumos de mano de obra y materiales haciendo de suma importancia la revisión y aprobación de Procedimiento para la Aprobación del incremento de monto financiado en los proyectos considerando la Cláusula de Incremento de Precios Incidentes en los rubros de Insumos y Mano de Obra. iii) Aprobación en el Congreso Nacional los contratos que trascendieron el periodo de Gobierno con lo cual se tienen suspendidos los pagos a los proyectos que no han sido aprobados”
- ✚ Debido a los atrasos en la ejecución dado lo antes descrito, una vez se cuente con la aprobación del Congreso Nacional y los desembolsos a los proyectos que lo requieren será necesario revisar la programación de ejecución del resto del año ya que los retrasos en la ejecución física y financiera impactan en las proyecciones.
- ✚ Considerando que la metodología PEC requiere de un componente de aporte municipal y comunitario y con base a los resultados de la fase IV se requiere de la modificación de lo establecido en el Acuerdo Separado del Programa, lo cual ya ha sido informado al KfW.
- ✚ Se requiere mayor personal técnico calificado en la Dirección de Control y Seguimiento (inspectorías) y Dirección de Administración y Finanzas (oficial de fuente)
- ✚ Impulsar la ejecución física y financiera de los proyectos.
- ✚ Impulsar la formulación de proyectos para comprometer el componente de Infraestructura de la Fase IV e iniciar el de la fase V
- ✚ Reprogramación de las obras a entregar antes consideradas 12 y a la fecha tentativamente.

✓ **Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) Fase II**



i. Objetivo General

Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).

ii. Focalización

A través de un proceso de concurso con criterios de selección predefinidos en el acuerdo separado y evaluación de propuestas técnicas alineadas a los componentes del programa fueron seleccionados 4 municipios en donde se está realizando la intervención del CONVIVIR a través de obras de infraestructura y medidas de alcance social para beneficio enfocado en la juventud. Así mismo se definieron los barrios, colonias o comunidades urbanas en donde se focaliza las acciones y en donde ya se ha realizado una labor de socialización de los alcances, compromisos y beneficios para la población. Los municipios seleccionados son:

- Municipio de Juticalpa, departamento de Olancho
- Municipio de Intibucá, departamento de Intibucá
- Municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá
- Municipio de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán

iii. Descripción del Proyecto

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

iv. Monto del Proyecto:

Los fondos destinados para la ejecución de este Programa para la Fase II es de 6,000,000.00 Euros.

Fecha de Inicio del Programa de convenio Fase II: 14/07/2021

v. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	19.897.004,00	8.372.701,20	42%
2022	44.718.737,00	4.652.975,96	10%

vi. Avance Físico por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2022	Mto. Ejecutado 2022
PREVENCION SITUACIONAL / CONVIVENCIA	0	2.667.196,79
TOTAL	0	2.667.196,79

vii. Avance Físico por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2022	Mto. Ejecutado 2022
COMAYAGUA	0	889.065,60
INTIBUCÁ	0	889.065,70
OLANCHO	0	889.065,49
TOTAL	0	2.667.196,79

CONVIVIR FASE II, termino su fase de preparacion el abril del año 2022, sin embargo, dichos proyectos se encuentran en la fase de contratación, por lo antes expuesto no hay proyectos que reportar.

viii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2022
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	916.694,04
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	1.069.085,13
TOTAL	1.985.779,17

ix. LOGROS Y AVANCES

**A. COMPONENTE 1 CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA-
AVANCE FISICO**

En el mes de marzo 2022 se finalizó la fase de análisis para la confirmación de los proyectos de infraestructura seleccionados.

Los pasos que se siguieron para la selección de Comunidades/Obras de Infraestructura fueron detallados en el Informe de Finalización de la Etapa de Preparación presentado en el mes de abril 2022.

El Informe antes indicado también incluyó una breve descripción de los alcances preliminarmente identificados para cada una de las obras de infraestructura, los cuales serán consensuados las comunidades durante asambleas generales comunitarias en la etapa de diseño y formulación.

Los proyectos de infraestructura seleccionados para cada uno de los Municipios del Proyecto se encuentran en la Fase de Contratación de Diseñadores y Formuladores.

Los TdR para el Concurso Público Nacional para la contratación de los Diseñadores y Formuladores fueron No Objetados por la Asistencia Técnica en fechas 4 y 12 de julio 2022 (Estos TdR se presentan a manera de ejemplo en el Anexo 3 de este Informe).

A continuación, se presentan las tablas resumen de los proyectos de infraestructura seleccionados para cada uno de los municipios, las cuales contienen:

- el nombre del proyecto,
- la comunidad donde se ubica,
- el monto de inversión estimado y

- el estado de avance en su ejecución, que corresponde a los avances en la contratación de Formuladores.

Tabla 1: Priorización de Barrios y/o Comunidades a Intervenir en el Municipio de Santa Rosa de Copán

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Plaza Juvenil Brisas de Copán (Obra de Confianza)	Barrio El Duende	3,800,000.00	➤ En fecha 02.08.2022 se recibieron las Ofertas para la contratación del Diseñador y Formador. ➤ SEDECOAS-FHIS tiene previsto iniciar la evaluación de Ofertas el 17.08.2022, con lo cual se estima finalizar la contratación a finales de agosto 2022.
2.	Casa de la Juventud	Barrio El Carmen	9,000,000.00	➤ SEDECOAS-FHIS tiene previsto iniciar la elaboración de los TdR para la contratación del Diseñador y Formador en el mes de octubre 2022, con lo cual se estima finalizar dicha contratación a finales de enero 2023.
3.	Plaza El Mirador – Santa Teresa	Barrio Santa Teresa, sector La Cuchilla	4,400,000.00	➤ En fecha 02.08.2022 se recibieron las Ofertas para la contratación del Diseñador y Formador. ➤ SEDECOAS-FHIS tiene previsto iniciar la evaluación de Ofertas el 17.08.2022, con lo cual se estima finalizar la contratación a finales de agosto 2022.
Monto Total de Inversión Estimado			17,200,000.00	

Tabla 2: Priorización de Barrios y/o Comunidades a Intervenir en el Municipio de Intibucá

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Parque La Pirámide (Obra de Confianza)	Barrio El Way, Sector No. 1	2,275,000.00	➤ En fecha 02.08.2022 se recibieron las Ofertas para la contratación del Diseñador y Formador. ➤ SEDECOAS-FHIS tiene previsto iniciar la evaluación de Ofertas el 17.08.2022, con

				lo cual se estima finalizar la contratación a finales de agosto 2022.
2.	THAU MISHU (Casa de La Juventud)	Colonia Guagua	10,400,000.00	➤ SEDECOAS-FHIS tiene previsto iniciar la elaboración de los TdR para la contratación del Diseñador y Formulator en el mes de octubre 2022 , con lo cual se estima finalizar dicha contratación a finales de enero 2023.
3.	Ruta Lenca de la Juventud	Barrio El Way	4,250,000.00	➤ Para este proyecto no se contratará un Formulator Externo, ya que su formulación se realizará internamente con personal del FHIS. ➤ SEDECOAS-FHIS tiene previsto iniciar la formulación de este proyecto en el mes de febrero 2023 .
Monto Total de Inversión Estimado			16,925,000.00	

Tabla 3: Priorización de Barrios y/o Comunidades a Intervenir en el Municipio de La Esperanza

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Paseo Cultural Lenca (Obra de Confianza)	Colonia Buenos Aires	4,050,000.00	➤ Para este proyecto no se contratará un Formulator Externo, ya que su formulación se realizará internamente con personal del FHIS. ➤ SEDECOAS-FHIS tiene previsto iniciar la formulación de este proyecto el 22.08.2022 .
2.	Plaza de La Juventud Buenos Aires	Colonia Buenos Aires	7,500,000.00	➤ SEDECOAS-FHIS tiene previsto iniciar la elaboración de los TdR para la contratación del Diseñador y Formulator en el mes de octubre 2022 , con lo cual se estima finalizar dicha contratación a finales de enero 2023.
3.	Centro Deportivo Integral San Carlos	Colonia San Carlos	6,850,000.00	

Monto Total de Inversión Estimado	18,400,000.00	
--	----------------------	--

Tabla 4: Priorización de Barrios y/o Comunidades a Intervenir en Juticalpa

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Cancha ABE y BEN (Obra de Confianza)	Colonia La Solidaridad	2,250,000.00	➤ En fecha 02.08.2022 se recibieron las Ofertas para la contratación del Formulador. ➤ SEDECOAS-FHIS tiene previsto iniciar la evaluación de Ofertas el 17.08.2022, con lo cual se estima finalizar la contratación a finales de agosto 2022.
2.	Centro de Formación Integral Juvenil	Barrio El Centro	10,800,000.00	➤ SEDECOAS-FHIS tiene previsto iniciar la elaboración de los TdR para la contratación del Diseñador y Formulador en el mes de octubre 2022, con lo cual se estima finalizar dicha contratación a finales de enero 2023.
3.	Parque Recreativo de La Juventud	Aldea La Concepción	4,805,000.00	➤ En fecha 02.08.2022 se recibieron las Ofertas para la contratación del Diseñador y Formulador. ➤ SEDECOAS-FHIS tiene previsto iniciar la evaluación de Ofertas el 17.08.2022, con lo cual se estima finalizar la contratación a finales de agosto 2022.
Monto Total de Inversión Estimado			17,855,000.00	

B. COMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES LABORALES Y SOCIALES DE JOVENES

En la semana del 2 al 6 de mayo 2022, SEDECOAS-FHIS realizó nuevamente una gira por los municipios de incidencia del Proyecto con el propósito de brindar acompañamiento a: (i) ANED Consultores, quienes trabajaron en el estudio de Línea Base y el Diagnóstico de Necesidades Formativas para los y las Jóvenes y (ii) Espirálca Research & Consulting, quienes llevaron a cabo la consultoría

del Diagnóstico de Necesidades e Intereses de Fortalecimiento para la Mejora de la Gestión Municipal enfocada en el Desarrollo de la Juventud en las comunidades seleccionadas.

En esta gira las empresas consultoras socializaron los resultados de los estudios, diagnósticos y planes de formación, con la participación de Jóvenes, Líderes Comunitarios, Sociedad Civil, Entes Gubernamentales y Representantes de las Municipalidades.

El proceso de investigación de “Línea Base, Diagnóstico de Necesidades de Juventud y Propuesta de Plan para el Fortalecimiento de las Necesidades de Formación para Jóvenes” encargado a la empresa de consultoría ANED Consultores ha concluido con la aprobación de sus productos por parte del equipo de La SEDECOAS-FHIS y La Asistencia Técnica. A la fecha de cierre del presente Informe estos documentos se encuentran en proceso de diagramación final para dar por concluido este proceso de consultoría.

x. Desafíos de CONVIVIR:

1. Concienciar a la población meta (constituida por la juventud entre 12 y 30 años) para el logro del objetivo general y específico del programa.
2. Lograr la participación ciudadana y los gobiernos locales de los municipios del área de influencia del programa para contribuir a la efectividad del trabajo de los jóvenes participantes.
3. Impulsar iniciativas de capacitación y de proyectos empresariales para generar autoempleo y contrarrestar el flujo migratorio a los centros urbanos del país y al exterior.
4. Lograr el cumplimiento de los plazos establecidos en el ciclo de proyectos FHIS, para la ejecución de los proyectos según lo programado.

CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)



✓ Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)

A. Objetivo General

El propósito de esta Actividad es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.



B. Focalización

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-81311

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en las cinco municipalidades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Tela y La Ceiba. Las comunidades específicas de intervención serán identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

C. Descripción del Proyecto

Esta Actividad ayudará al GdeH (representado a través de FHIS) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otras partes interesadas. La Actividad incluye dos resultados complementarios: Resultado 1: Mejora de la infraestructura comunitaria, las actividades responderán a las prioridades de infraestructura comunitaria para abordar la seguridad ciudadana. Resultado 2: Aumento de la cohesión comunitaria, considera que la forma en que las intervenciones de infraestructura son concebidas, diseñadas y ejecutadas pueden desempeñar un papel directo en el aumento de la cohesión social y comunitaria y promover un marco holístico de prevención de la violencia. Los proyectos bajo la Actividad incluirán instalaciones educativas, centros de salud, alumbrado público, espacios comunitarios más seguros, centros de alcance y comunitarios, centros vocacionales, jardines comunitarios, parques, espacios recreativos, paradas de buses, accesos peatonales, mejoras al alumbrado de calles, señalización, instalaciones para el sector seguridad y justicia, así como otros proyectos de infraestructura de pequeña escala que se acuerde entre las Partes.

D. Monto del Convenio

Presupuesto total estimado: \$14,637, 541.74, de los cuales, fondos de donación de USAID: \$11, 710,033.39; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$ 2, 927,508.35 (efectivo: \$ 2,127,508.35 y especies: \$ 800,000.00).

i. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	23.226.555,00	21.906.553,68	94%
2019	60.781.669,00	60.781.669,00	100%
2020	145.322.291,00	60.678.681,68	42%
2021	67.508.910,00	42.626.620,46	63%
2022	20.678.381,00	17.145.641,97	83%

ii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2022	Mto. Ejecutado 2022	Empleos Generados 2022	Beneficiarios Directos 2022
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	7	5.332.823,87	127	103.687,00
EDUCACION	6	8.347.757,01	140	7.122,00
TOTAL	13	13.680.580,88	267	110.809

iii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2022	Mto. Ejecutado 2022	Empleos Generados 2022	Beneficiarios directos 2022
ATLANTIDA	4	4.565.054,00	86	4.210,00
CORTES	8	5.727.311,38	140	5.747
FRANCISCO MORAZAN	1	3.388.215,50	41	100.852,00
TOTAL	13	13.680.580,88	267	110.809

iv. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2022
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	2.882.756,00
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	582.304,59
TOTAL	3.465.060,59

v. Principales Logros (julio-septiembre 2022)

COMPONENTE SOCIAL

El Componente Social tiene como objetivo fortalecer las capacidades y oportunidades de hombres y mujeres de las comunidades beneficiarias, brindándoles oportunidades de desarrollo en las comunidades, empleo temporal y fortalecimiento de sus capacidades en gestión y administración de proyectos bajo una perspectiva de igualdad y equidad.

En este año se han ejecutado actividades de capacitación en 4 proyectos implementados bajo la metodología PEC brindándose las siguientes capacitaciones:

TEMA: ORGANIZACIÓN COMUNITARIA						
No.	PROYECTO	UBICACION	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	FECHA
1	Reparacion CEB Claudio Barrera	Col. San Judas Tadeo La Ceiba. Atlántida	1	15	16	1/9/22
2	Techado de Cancha y Obras Varias Escuela Ramón Montoya	Barrio la Isla La Ceiba Atlántida	2	18	20	09/08/2022
		Total	1	15	16	
TEMA: BIOSEGURIDAD						
No.	PROYECTO	UBICACIÓN	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	FECHA
1	Const. de Cancha y Obras Varias CEB José Valentin Vasquez	Colonia El Confite la Ceiba , Atlántida	3	17	20	
		Total	3	17	20	
TEMA: ADMINISTRACION COMPRAS Y CONTRATACIONES						
No.	PROYECTO	UBICACIÓN	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	FECHA
1	Reparación y Obras Complementarias Escuela y Kinder Col. Japón	Col. Japón, Choloma, Cortes	2	9	11	03/08/2022
2	Valentin Vasquez	Colonia El Confite La Ceiba Atlántida	3	17	20	13/07/2022
		Total	5	26	31	
TEMA: AMBIENTE HIGIENE Y SEGURIDAD						
No.	PROYECTO	UBICACIÓN	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	FECHA
1	Reparación y Obras Complementarias Escuela y Kinder Col. Japón	Col. Japón. Choloma. Cortes	2	8	10	14/07/2022
2	Reparación CEB Claudio Barrera	Col. San Judas Tadeo. La Ceiba. Atlántida	8	2	10	30/8/2022
3	Valentin Vasquez	Colonia El Confite, La Ceiba Atlántida	7	1	8	15/07/2022
4	Escuela Ramón Montoya	Barrio La Isla , La Ceiba Atlántida	14	4	18	12/08/2022
		Total	31	15	46	
TEMA: CONTRALORIA SOCIAL						
No.	PROYECTO	UBICACIÓN	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	FECHA
1	Construcción de Cancha y Obras varias CEB José Valentin Vasquez	Colonia El Confite, La Ceiba Atlántida	4	13	17	10/08/2022
		Total	4	13	17	
			HOMBRES	MUJERES		
		Total	41	69	110	

COMPONENTE TECNICO

Proyectos de Inversión Cartera Regular

Con las cartas de ejecución CdE 04 y CdE 11 Se financiaron desde el 2017 a los 2022 57 proyectos de cartera regular y proyectos de Covid-19.

Municipio	Proyecto	Monitoreo de Proyectos	% Avance	Categoría	Monto
La Ceiba	Reparación y obras complementarias Escuela Ramón Montoya	Terminado		Centro Educativo	6,250,000.00
La Ceiba	Reparación CEB José Valentín Vasquez	Terminado		Centro Educativo	4,000,000.00
La Ceiba	Construcción Kinder Mirian Lobo	Terminado		Centro Educativo	2,999,675.92
La Ceiba	Ampliación y Mejoras CEB Marco Antonio Ponce	Terminado		Centro Educativo	4,892,345.36
La Ceiba	Ampliación Centro de Alcance	Terminado		Centro de Alcance	1,817,919.06
La Ceiba	Construcción de Obras Complementarias Las Mercedes	Terminado		Centros Educativos/Centro de Alcance	400,000.00
La Ceiba	Reparación CEB Claudio Barrera	Terminado		Centro Educativo	6,000,000.00
La Ceiba	Construcción de Centro Integral Corozal	Terminado		Proyecto Comunitario	3,291,818.76
La Ceiba	Construcción de Centro de Alcance El Corozal	Terminado		Centro de Alcance	2,323,481.76
La Ceiba	Reparación CEIN y Ampliación MAE	Terminado		Sector Operadores de Justicia	4,000,000.00
La Ceiba	Ampliación Espacio Físico Municipal	Terminado		Proyecto Comunitario	1,920,000.00
La Ceiba	Construcción Posta Policial Bonitillo	Terminado		Sector Operadores de Justicia	3,590,634.33
La Ceiba	Reparación CEB Miguel Paz Barahona	Terminado		Centro Educativo	137,305.22
Tela	Reparación Instituto Triunfo de la Cruz Fase I	Terminado		Centro Educativo	1,967,619.19
Tela	Reparación Instituto Triunfo de la Cruz Fase II	Terminado		Centro Educativo	3,782,380.81
Choloma	Pavimentación Calle Principal hacia los Juzgados (Ruta Segura)	Terminado		Proyecto Comunitario/Sector Operadores de Justicia	2,722,469.41
Choloma	Pavimentación Calle Principal Col. Lopez Arellano (Ruta Segura)	Terminado		Proyecto Comunitario	2,980,291.32
Choloma	Construcción Techo a Cancha Multiusos	Terminado		Proyecto Comunitario	1,350,000.00
San Pedro Sula	Obras Complementarias CEB José Antonio Peraza	Terminado		Centro Educativo	2,431,860.79
San Pedro Sula	Reparación Escuela Carlos Rivera López	Terminado		Centro Educativo	2,577,284.86
San Pedro Sula	Construcción Obras Complementarias Instituto Polivalente Las Brisas	Terminado		Centro Educativo	1,100,000.00
San Pedro Sula	Ampliación CEB Dr. Alfonso Lacayo	Terminado		Centro Educativo	6,000,000.00
MDC	Reparación de Casa Alianza Centro	Terminado		Proyecto Comunitario	4,782,750.30
MDC	Mejoras Centro de Alcance (CDA) Estados Unidos	Terminado		Centro de Alcance	240,000.00
MDC	Mejoras al Centro de Alcance (CDA) Las Ajetas	Terminado		Centro de Alcance	1,193,312.20
MDC	Reparación Instituto Reynaldo Narváez Rosales	Terminado		Centro Educativo	2,922,825.21
MDC	Construcción Ruta Segura a Centro de Alcance	Terminado		Proyecto Comunitario	3,588,557.09

Municipio	Proyecto	Monitoreo de Proyectos	Categoría	Monto
Tela	CEB Antonio Jose Coello-2	Terminado	Centro Educativo	545,000.00
Tela	CEB Marco Aurelio Soto-1	Terminado	Centro Educativo	540,000.00
San Pedro Sula	Escuela Alex E. Alanis Lagos-4	Terminado	Centro Educativo	480,000.00
La Ceiba	UDEP La Ceiba Construcción Centro de Alcance Barrio La Isla (Obra de	Terminado	Centro de Alcance	960,000.00
San Pedro Sula	UMEP-7 Reparación y Ampliación CDA Arenales (Obra de Confianza)	Terminado	Centro de Alcance	867,757.38
MDC	UMEP-1 Iluminación Calle Principal Colonia Izaguirre (Obra de	Terminado	Proyecto Comunitario	278,302.51
La Ceiba	Construcción Laboratorio Regional Atlántida de Virología	Terminado	Proyecto relacionado con COVID-19	4,599,577.43
La Ceiba	Construcción de Clínicas y Áreas de descanso en Hospital Regional Atlántida	Terminado	Proyecto relacionado con COVID-19	6,248,572.23
San Pedro Sula	Acondicionamiento y Mejoras al Laboratorio de Virología de SPS	Terminado	Proyecto relacionado con COVID-19	2,194,300.71
San Pedro Sula	Construcción de Bodega de Insumos de la Regional de Salud No.5 y	Terminado	Proyecto relacionado con COVID-19	800,192.42
MDC	Reparación Almacén Nacional de Biológicos - Bodega Ultra Frío	Terminado	Proyecto relacionado con COVID-19	2,700,000.00
La Ceiba	Construcción Centro de Alcance Barrio La Isla, Fase II	Terminado	Centro de Alcance	400,000.00
MDC	Reparación CDA Divanna	Terminado	Centro de Alcance	937,000.00
MDC	Techo e Iluminación de Cancha CDA Estados Unidos	Terminado	Centro de Alcance	852,000.00
MDC	Suministro e Instalación de Juegos Infantiles Área Recreativa Cerro Juana Lainez	Terminado	Proyecto Comunitario	2,030,000.00
La Ceiba	Reparación CEB Claudio Barrera - Fase II	Terminado	Centro Educativo	2,900,000.00
La Ceiba	Reparación y Obras complementarias Escuela Ramón Montoya Fase II	Terminado	Centro Educativo	2,000,000.00
Tela	Reparación Instituto Triunfo de la Cruz III	Terminado	Centro Educativo	1,736,433.84
La Ceiba	Construcción de Cocina y Obras Varias en CdeA Bo. La Isla, Fase III (Lps.400,000)	Terminado	Centro de Alcance	350,000.00
La Ceiba	Construcción de Bodega de Insumos de la Regional de Salud No.1 y	Terminado	Proyecto relacionado con COVID-19	1,553,321.18
La Ceiba	Suministro e Instalación de Red de Oxígeno y Obras Varias en Salas	Terminado	Proyecto relacionado con COVID-19	2,598,956.22
MDC	Reparación de Techo y Obras Complementarias en Anexo SESAL	Terminado	Proyecto relacionado con COVID-19	537,328.43
San Pedro Sula	Reparación Instituto Modesto Rodas Alvarado	Terminado	Centro Educativo	4,968,131.88
San Pedro Sula	Reparación y Equipamiento CEB Jose Antonio Peraza	Terminado	Centro Educativo	1,985,220.77
San Pedro Sula	Reparación y Equipamiento Escuela Carlos Rivera López	Terminado	Centro Educativo	2,245,894.66
La Lima	Reparación y Equipamiento CDA 23 de Septiembre	Terminado	Centro de Alcance	1,328,158.43
San Pedro Sula	Reparación y Equipamiento CDA San Juan	Terminado	Centro de Alcance	1,541,616.18
San Pedro Sula	Reparación y Equipamiento CDA 10 de Septiembre	Terminado	Centro de Alcance	907,882.37
San Pedro Sula	Reparación y Equipamiento CDA La Esperanza	Terminado	Centro de Alcance	1,224,753.15
San Pedro Sula	Reparación y Equipamiento CDA Morales III	Terminado	Centro de Alcance	1,928,760.86

vi. Proyectos En Ejecución

Los proyectos que se encuentran en ejecución actualmente son 10 los cuales se presentan a continuación:

Municipio	Proyecto	Monitoreo de Proyectos	% Avance	Categoría	Monto
San Pedro Sula	Reparación del Centro Nor Occidental de Biológicos - Bodega Ultra Frio	En Ejecución	87%	Proyecto relacionado con COVID-19	1,987,473.86
MDC	Construcción Almacén Regional de Biológicos de la RMDC - Bodega	En Ejecución	97%	Proyecto relacionado con COVID-19	4,340,172.48
MDC	Suministro e instalación de Generador Almacén Regional de Biológicos de la RMDC - Bodega Ultra Frio	En Ejecución	3%	Proyecto relacionado con COVID-19	2,880,000.00
Choloma	Kinder "La Unidad" (frente a los Juzgados)	En Ejecución	16%	Centro Educativo	1,950,000.00
Choloma	Reparación y Obras Complementarias Escuela y Kinder Col. Japón	En Ejecución	5%	Centro Educativo	850,000.00
San Pedro Sula	Construcción Techado de Cancha y Obras Varias en CEB Dr. Alfonso Lacayo	En Ejecución	7%	Centro Educativo	2,250,000.00
La Ceiba	Reparación y Obras complementarias Escuela Ramón Montoya Fase III	En Ejecución	55%	Centro Educativo	3,000,000.00
La Ceiba	Reparación CEB José Valentín Vasquez Fase II	En Ejecución	52%	Centro Educativo	2,000,000.00
La Ceiba	Reparación CEB Claudio Barrera - Fase III	En Ejecución	35%	Centro Educativo	3,000,000.00
San Pedro Sula	Reparación CEB Padre Claret	En Ejecución	9%	Centro Educativo	6,000,000.00

✓ **Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)**

i. Objetivo General

El propósito de esta Actividad es mejorar las pobres condiciones sociales y económicas son especialmente pronunciadas en el Occidente de Honduras. Extrema pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático. Bajos niveles educativos, migración, falta de acceso a los servicios básicos y otros retos socioeconómicos son endémicos. La provisión de servicios básicos de educación y nutrición son escasos en la zona de Occidente y es difícil el acceso a los ya existentes, así mismo la gestión de servicios de educación, nutrición y agua y saneamiento son deficientes por lo que los ciudadanos cuentan además con pocos espacios de participación para mejorar sus vidas a nivel de hogar y sus vidas productivas, lo que genera una gran brecha de pobreza.

ii. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en los departamentos de Ocotepeque, la Paz, Copán, Intibucá, Santa Bárbara y Lempira y zonas occidentales específicas de intervención identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

iii. Descripción del Proyecto

Esta Actividad apoyará al FHIS para construir de al menos 14 proyectos de infraestructura comunitaria que potencien otros esfuerzos de USAID para mejorar los servicios relacionados con nutrición, la educación y el acceso al agua seleccionadas dentro de las municipalidades identificadas bajo el Objetivo de Desarrollo 2 de USAID.

iv. Monto del Convenio

El monto total de la Actividad es de \$ 10,544,130.00 (USAID \$ 8,435,304.00, Gobierno de Honduras \$ 2,108,826.00). Según la carta de ejecución No. 034.

v. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2019	6.190.650,00	5.981.569,54	97%
2020	65.583.096,00	13.336.794,49	20%
2021	58.488.260,00	47.180.270,68	81%
2022	33.312.124,00	15.134.249,32	45%

vi. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2022	Mto. Ejecutado 2022	Empleos Generados 2022	Beneficiarios Directos 2022
EDUCACION	2	9.979.482,96	156	1.117
SALUD	2	3.342.195,18	56	421.896
TOTAL	4	13.321.678,14	212	423.013

vii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2022	Mto. Ejecutado 2022	Empleos Generados 2022	Beneficiarios directos 2022
COPAN	2	3.279.861,50	36	411.551
INTIBUCÁ	0	2.408.980,96	76	10.337
LA PAZ	1	3.380.093,00	43	259
LEMPIRA	1	2.933.823,68	28	526
OCOTEPEQUE	0	938.919,00	18	206
SANTA BARBARA	0	380.000,00	11	134
TOTAL	4	13.321.678,14	212	423.013

viii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2022
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	1.097.577,50
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	714.994,10
TOTAL	1.812.571,60

ix. Avances del Proyecto (julio-septiembre)

A. COMPONENTE SOCIAL

El Componente Social tiene como objetivo fortalecer las capacidades y oportunidades de hombres y mujeres de las comunidades beneficiarias, brindándoles oportunidades de desarrollo en las comunidades, empleo temporal y fortalecimiento de sus capacidades en gestión y administración de proyectos bajo una perspectiva de igualdad y equidad.

En este año se han ejecutado actividades de capacitación en 7 proyectos implementados bajo la metodología PEC brindándose las siguientes capacitaciones:

TEMA: GENERO E INCLUSION SOCIAL

No.	PROYECTO	UBICACIÓN	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	FECHA
1	Ampliación Escuela José Olivo Tercero	El Descansadero San Nicolas Santa Barbara	15	15	30	6/7/22
2	Ampliación Escuela Ramón Amaya Amador	Planes Arriba Cucuyagua Copan	7	8	15	7/7/2022
		Total	22	23	45	

TEMA: DERECHOS HUMANOS

No.	PROYECTO	UBICACIÓN	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	FECHA
1	Ampliación Escuela José Olivo Tercero	El Descansadero San Nicolas Santa Barbara	15	15	30	6/7/22
2	Ampliación Escuela Ramón Amaya Amador	Planes Arriba Cucuyagua Copán	7	8	15	7/7/2022
		Total	22	23	45	

TEMA: LAS NUEVAS MASCULINIDADES

No.	PROYECTO	UBICACIÓN	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	FECHA
1	Ampliación Escuela José Olivo Tercero	San Nicolas Santa Barbara	15	15	30	6/7/22
2	Ampliación Escuela Ramón Amaya Amador	Planes Arriba Cucuyagua Copán	7	8	15	7/7/2022
		Total	22	23	45	

TEMA: MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL

No.	PROYECTO	UBICACIÓN	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	FECHA
1	Ampliación Escuela José Olivo Tercero	San Nicolas Santa Bárbara	15	15	30	6/7/22
2	Ampliación Escuela Ramón Amaya Amador	Planes Arriba Cucuyagua Copán	7	8	15	7/7/2022
		Total	22	23	45	

TEMA: PARTICIPACION DE LA MUJER EN LOS ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES

No.	PROYECTO	UBICACIÓN	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	FECHA
1	Ampliación Escuela José Olivo Tercero	San Nicolas Santa Barbara	15	15	30	6/7/22
2	Ampliación Escuela Ramón Amaya Amador	Planes Arriba Cucuyagua Copan	7	8	15	7/7/2022
		Total	22	23	45	

TEMA: INTRODUCCION A METODOLOGIA PEC.

No.	PROYECTO	UBICACIÓN	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	FECHA
1	Ampliacion CEB Profesor Luis Alonzo Ayala	Lameande San Manuel de Colohete	30	13	43	20/09/2022
2	Ampliacion Centro de Salud Rural (CESAR)	Arcamon San Marcos de Caiquin	38	22	60	21/09/2022
		Total	68	35	103	

TEMA: ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

No.	PROYECTO	UBICACIÓN	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	FECHA
1	Ampliación CEB Mi Independencia	La Laguna San Miguelito, Intibuca	6	7	13	07/09/2022
			6	7	13	

TEMA: AMBIENTE HIGIENE Y SEGURIDAD

No.	PROYECTO	UBICACIÓN	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	FECHA
1	Ampliación CEB Mi Independencia	La Laguna, San Miguelito, Intibuca	26	31	57	09/08/2022
2	Ampliación CEB Mi Independencia	La Laguna, San Miguelito, Intibuca	9	5	14	12/09/2022
3	Ampliación CEB Mariano Martínez Argueta	Valle de Angeles, Opatoro, La Paz.	17	6	23	14/07/2022
		Total	52	42	94	

TEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

No.	PROYECTO	UBICACIÓN	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	FECHA
1	Ampliación Escuela José Cecilio Del Valle	Yaunera San Pedro De Copán	22	28	50	11/08/22
		Total	22	28	50	

TEMA: PREVENCION Y CONVIVENCIA CIUDADANA

No.	PROYECTO	UBICACIÓN	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	FECHA
1	Reparación, Equipamiento y Obras Varias CEB Lempira	Tontolo, El Nispero, Santa Barbara	8	6	14	10/8/22
		Total	8	6	14	

			HOMBRES	MUJERES	TOTAL	
		TOTAL	266	233	499	

B. COMPONENTE TÉCNICO

Proyectos finalizados

A la fecha se han finalizado 15 proyectos realizados:

Localización	Municipio	Proyecto	Monitoreo de Proyectos	Categoría	Monto
Ocatepeque	Sensenti	Ampliación CEB Alvaro Contreras	Terminado	Centro Educativo	4,980,248.73
Intibucá	Yamaranguila	Ampliación CEB Francisco Morazán	Terminado	Centro Educativo	4,977,557.36
La Paz	San José	Reposición Escuela Unión y Fe	Terminado	Centro Educativo	3,894,320.46
Intibucá	Jesús de Otoro	Ampliación CEB Tiburcio Carías Andino	Terminado	Centro Educativo	4,953,438.10
Lempira	Belén	Ampliación Escuela Eusebio Amaya Gómez	Terminado	Centro Educativo	4,830,980.59
Ocatepeque	La Labor	Ampliación CEB Prudencio Arita	Terminado	Centro Educativo	6,336,883.17
Francisco Morazán	M.D.C.	Construcción de Cisternas y Cambio de Techo Sala de Operaciones y Neumología Instituto Nacional Cardiopulmonar Toráx	Terminado	Proyecto relacionado con COVID-19	2,110,029.00
Santa Bárbara	Santa Bárbara	Construcción Clínicas y Área de Descanso para Médicos del Hospital Santa Bárbara Integrado (HSBI)	Terminado	Proyecto relacionado con COVID-19	6,499,961.81
Cortés	San Pedro Sula	Construcción de Área de Descanso para Médicos en el Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela (HLMV)	Terminado	Proyecto relacionado con COVID-19	1,344,192.00
Copán	Santa Rosa de Copán	Construcción de Laboratorio de Virología en la Regional de Salud No.4	Terminado	Proyecto relacionado con COVID-19	4,236,402.00
Intibucá	Intibucá	Rehabilitación y Ampliación Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato	Terminado	Proyecto relacionado con COVID-19	5,874,676.48
Copán	San Pedro	Ampliación Escuela José Cecilio del Valle	Terminado	Centro Educativo	2,100,000.00
La Paz	Santa Ana	Reposición Escuela Nueva Generación Sur	Terminado	Centro Educativo	2,745,257.28
Lempira	Gracias	Clínicas de Aislamiento Pacientes COVID Hospital Dr. Juan Manuel Gálvez	Terminado	Proyecto relacionado con COVID-19	4,392,990.24
Copán	Santa Rosa de Copán	Construcción Bodega de Insumos de la Regional de Salud No.4 y Obras Complementarias	Terminado	Proyecto relacionado con COVID-19	1,755,203.09

Proyectos En Ejecución

Los proyectos que se encuentran en ejecución actualmente son 5 los cuales se presentan a continuación:

Localización	Municipio	Proyecto	Monitoreo de Proyectos	% Avance	Categoría	Monto
La Paz	Opatoro	Ampliación Centro de Educación Básica Mariano Martínez	En Ejecución	70%	Centro Educativo	5,532,660.99
Santa Bárbara	San Nicolás	Ampliación Escuela José Olivo Tercero	En Ejecución	87%	Centro Educativo	2,114,275.67
Copán	Cucuyagua	Reposición Escuela Ramón Amaya Amador	En Ejecución	60%	Centro Educativo	2,623,067.85
Intibucá	San Miguelito	Ampliación CEB Mi Independencia	En Ejecución	72%	Centro Educativo	6,550,000.00
Santa Bárbara	Nispero	Reparación CEB Lempira	En Ejecución	77%	Centro Educativo	2,780,000.00

x. PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN DEL III TRIMESTRE 2022

Las donaciones de la DIM para el programa PIOH carecen de fondos de presupuestarios suficientes para reflejar la ejecución realizada en el III Trimestre de 2022 mediante el método de regularización de F01 ante la Secretaría de Finanzas (SEFIN).

Acciones realizadas por la DIM:

Las regularizaciones del gasto del tercer trimestre serán trasladadas al cuarto trimestre del 2022, Se han realizado las acciones pertinentes ante la SEFIN y FHIS para obtener fondos presupuestarios.

FONDOS NACIONALES

✓ **Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras.**

i. Introducción

El Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras es el resultado de un proceso de priorización de ocho (8) componentes que tendrán un total de 61 proyectos en 48 municipios del país que aportarán a la reducción de la pobreza y a la mejora del bienestar humano de la población.

ii. Nombre del proyecto

El Programa se denomina: “Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras”, el cual estará compuesto por ocho (8) componentes enfocados en la priorización de proyectos relacionados con el mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura escolar, infraestructura social y servicios comunitarios, construcción de puentes vehiculares, infraestructura sanitaria, diseño y estudios de laboratorio de medicamentos y hospital oncológico, obras de protección hídrica y reparación de embaulamiento, fortalecimiento institucional y por último, gestión y administración del programa.

iii. Localización

El Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras estará compuesto por 61 proyectos de infraestructura localizados en 48 municipios en 16 departamento.

iv. Beneficiarios

Alrededor de 4,003,249 personas serán beneficiadas directa e indirectamente.

v. Institución Ejecutora

La Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento y el Fondo Hondureño de Inversión Social (SEDECOAS-FHIS).

vi. Duración en Meses

El proyecto iniciará en agosto del 2022 y finalizará (algunos de sus componentes) en agosto de 2024. En ese sentido, el **Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras**, tendrá una duración de 24 meses.

vii. Costo total del proyecto

El costo total es de 499,700,000 Lempiras y su equivalente en dólares estadounidense son 20,388,927.88 (con tipo de cambio L.24.51 por cada dólar).

viii. Fuente financiera

Este programa se financiará con Fuentes de Financiamiento Internas (Fondos Nacionales).

ix. Antecedentes

Durante el año 2018 el porcentaje de pobreza en hogares en el país alcanzaba un valor del 61.9%, posteriormente dos años después en 2020, este indicador sufrió un incremento de 8 puntos porcentuales llegando a un valor del 70%. Este indicador muestra que de cada 10 hondureños 7 hondureños vive en situación de pobreza, estos valores han colocado a Honduras como uno de los países más desiguales y

con más pobreza de Latinoamérica. Sumado a esto la inestabilidad política, la crisis sanitaria derivada por el COVID-19 y el paso de los huracanes ETA e IOTA han sido algunas de las causantes de esta situación actual.

Esta brecha de pobreza nos da una idea de que tan pobres son los pobres en el país y, por lo tanto, nos proporciona una idea de la profundidad de las carencias de los ingresos, el patrón de consumo y la inaccesibilidad que poseen estos hogares a poder satisfacer sus necesidades básicas que definen aún más su situación de pobreza de las familias hondureñas.

En este sentido, algunas de estas carencias se han visto reflejadas en el poco acceso y disponibilidad que tienen las familias hondureñas al poder acceder a gozar de los servicios básicos como: el agua potable y saneamiento, el bajo acceso de las comunidades rurales a espacios educativos que cumplan con los estándares internacionales de las aulas de clases que esto ha derivado un alto nivel de deserción escolar por falta de ingresos en los hogares.

En la misma línea, el volumen de enfermedades diarreicas y/o enfermedades producidas por la contaminación del suelo por falta de pavimentación en las comunidades, centros de salud sin el equipamiento básico para atender emergencias, la falta de conexión vehicular entre comunidades que no permiten que las comunidades se desarrollen de forma social y económica, entre otros.

Por lo que, la falta de los servicios de agua y saneamiento, educación y salud, entre otras nos muestra que esta situación aun es una dura realidad para miles de hondureños. Son muchas las personas que no disponen de estos servicios de calidad y de forma continua, lo cual afecta sus actividades diarias y también su economía. Por ejemplo, la alta incidencia que existe en los últimos años con el aumento de casos relacionados a las enfermedades diarreicas agudas (EDA's), las bajas tasas de conectividad económica entre comunidades y la inasistencia escolar en las zonas rurales, está estrechamente relacionada con el propósito de este programa.

En conclusión, a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento, en especial el Fondo Hondureño de Inversión Social (SEDECOAS-FHIS) la cual es una de las instituciones que uno de sus propósitos esenciales es contribuir a la reducción de la pobreza, mediante el acceso a los servicios de infraestructura básica como el mejoramiento de escuelas, centros de salud, pavimentación, conexiones de agua potable, entre otros para ayudar a las diferentes mancomunidades con el objetivo de elevar la calidad de vida y la dignidad humana de los hondureños.

x. Avance de Actividades

Para este trimestre el programa PROMIDESH, obtuvo la incorporación de fondos por un total de L. 269,000,000.00.

El programa a nivel de ejecución presupuestaria no presenta ningún monto debido a que la incorporación presupuestaria fue hasta el mes de septiembre, pero cabe resaltar que, si se presenta ejecución física a nivel de diseño, 16 procesos de licitación, 17 obras en bordos entregadas y el inicio de algunas obras de mitigación en los departamentos intervenidos por el programa.
