

2016

INFORME MENSUAL MAYO



MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y
PROYECTOS MENORES
MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES

RESPONSABLE: ING. CLAUDIA ZALDIVAR



INDICE

CONTENIDO	Nº PAG.
1. EVALUACIONES REALIZADAS.....	2
2. PROYECTOS PRESUPUESTADOS.....	4
3. PROYECTOS EN EJECUCION.....	7
4. PROYECTOS RECEPCIONADOS.....	17
5. TRABAJOS REALIZADOS POR TALLER MUNICIPAL	32
6. VARIOS.....	38



1. EVALUACIONES REALIZADAS:

Como una proyección social la Municipalidad de Puerto Cortés, con el consentimiento del Sr. Alcalde el Lic. Allan Ramos y su Corporación Municipal, han aprobado las ayudas a personas de escasos recursos y a algunas instituciones con donación de materiales para la reparación de sus viviendas y sus edificaciones respectivamente.

La Gerencia de Planificación y Desarrollo a través de los Departamentos de Desarrollo Social y Mantenimiento Municipal y Proyectos Menores hacen las evaluaciones de las solicitudes de materiales que ingresan a la Municipalidad, para lo cual se hace un estudio socioeconómico (Promotores) y una visita de campo para constatar que lo solicitado está de acuerdo con las necesidades del solicitante.

A continuación se detallan algunas de las evaluaciones realizadas para ayudas:

- 1.1 Elaboración de Canastas para transporte de materiales, Aldea Kele-Kele, Sector Ramal de Lima,** se acudió al lugar con el promotor de la comunidad para realizar la respectiva evaluación en conjunto con personas de la comunidad, en la cual se verifico que los materiales necesarios son madera, cable de acero de 3/4", cemento, arena y grava.
- 1.2 Reparaciones varias en centro comunal en las Vegas,** se acudió al comunidad con el promotor en la cual se encontraba miembros del patronato y se acordó con ellos la entrega de la cantidad de materiales necesarios para la reparaciones del centro comunal.
- 1.3 Puente peatonal en las Lomas de Medina, Sector Medina,** Se acudió al lugar con el promotor de la zona en el cual se encontraban en el lugar miembros del patronato y se acordó con estos la entrega de los materiales para la construcción de un puente peatonal.
- 1.4 Ampliación de Sanitarios y Construcción de Puertas en Escuela Ramón Rosa, Nueva Ticamaya, sector Ramal de Lima,** Se acudió al lugar con el promotor de la zona en el cual se encontraban en el lugar maestros de la escuela y representantes de padres de familia y se acordó con estos la entrega de los materiales para la construcción ampliación de sanitarios y elaboración de puertas metálicas.



- 1.5 Reparación de Urnas para Elecciones de Patronatos,** Se evaluaron las urnas existentes y se determinó la necesidad de comprar plywood, clavos, pintura de aceite, lijas, diluyente.
- 1.6 Trabajos varios en grupo Génesis, estadio,** Se acudió al lugar en el cual se encontraban miembros del grupo y se acordó con estos la remodelación y mejoramiento de las instalaciones.
- 1.7 Sistema eléctrico en oficina de Administración de Proyectos:** se visita el lugar para realizar las mediciones del espacio para la proyección del sistema eléctrico de la oficina.
- 1.8 Mejoramiento de Sistema Eléctrico en Colonia El Mirador:** se asiste al lugar junto al promotor y el presidente de patronato para la evaluación del sistema eléctrico existente, se realizan mediciones y conteo de abonados conectados al sistema para calcular la demanda que estos generan y así poder determinar las mejoras necesarias.
- 1.9 Mejoramiento de Sistema Eléctrico en Colonia Villa Isabel:** se asiste al lugar junto al promotor y el presidente de patronato para la evaluación del sistema eléctrico existente, se realiza el conteo de abonados conectados al sistema para calcular la demanda que estos generan y así poder determinar las mejoras necesarias.



2. PROYECTOS PRESUPUESTADOS:

2.1 Desarrollo Económico Local:

Nº	PROYECTO	COMUNIDAD	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Ampliación de oficina y construcción de galera en el peaje.	Boulevard salida de Puerto Cortes	Lps 83,766.52 (Costo de Materiales)	Ejecutado con cuadrillas municipales
TOTAL PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				Lps.83,766.52

2.2 Planificación Urbana:

Nº	PROYECTO	COMUNIDAD	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
2	Construcción de Empedrado de calle y Canal Pluvial (Priorizado)	Col. Nueva Puente Alto	-	En proceso de aprobación.
3	Reparación Calles	Col. El Rondón	-	En proceso de aprobación.
4	Construcción de Canal Pluvial	Col. Las Lomitas	L.356,844.03	En proceso de elaboración de contrato.
5	Reparación de adoquinado	Colonia Brisas Del Mar, Sector El Porvenir	L. 14,183.00 (Costos de materiales)	Para hacerse con cuadrillas municipales
TOTAL PROYECTOS DE PLANIFICACION URBANA				L.371,027.03

2.3 Fortalecimiento del Desarrollo y Cohesión Social:

Nº	PROYECTO	COMUNIDAD	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
4	Cerámica para iglesia Adventista del séptimo día	Colonia Fraternidad, Sector Las Delicias	L. 26,400.00 (Costo de Materiales)	Se otorga ayuda con materiales.
7	Caseta de Espera de buses en punto de taxis	Barrio El Porvenir, Sector El Porvenir	-	En proceso de aprobación.
TOTAL PROYECTOS DE FROTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y COHESION SOCIAL				L. 278,683.43





2.4 Infraestructura Básica:

Nº	PROYECTO	COMUNIDAD	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
2	Construcción de Cruce de calle	Col. Colinas del Norte, Sector Pueblo Nuevo	L. 81,019.72	En proceso de elaboración de contrato.
3	Construcción de Cruces de calle de 0.9x0.85 mts L=14.5 MTS, L=9.5MTS	Aldea Lempira, Sector Zapadril	-	En proceso de licitación privada
4	Construcción de Puente Peatonal	Colonia Lomas de Medina	L. 18,901.70 (Costo de materiales)	Ayuda con materiales.
6	Reparación de Alumbrado Publico	Colonia Lomas del Puerto, Sector El Porvenir	L. 69,148.75	Ejecutado
8	Reparación de Alumbrado Publico	Colonia Brisas de La Laguna, Sector Nuevos Horizontes	-	En proceso de aprobación
10	Reparación de Alumbrado Publico	El Cangrejal, Barrio Cienaguita, Sector El Porvenir	L.52,521.00	En proceso de elaboración de contrato.
11	Reparación de Alumbrado Publico	La Bolsa, Barrio Cienaguita, Sector El Porvenir	L. 58,605.00	Ejecutado
17	Reparación de Alumbrado Publico	Barrio Camagüey Calle 15, Sector Península Este	L. 52,822.00	Ejecutado
24	Iluminación de Cancha de Football	Aldea La Uva, Sector Ramal de Lima	-	En proceso de licitación privada.
	Reparación de Alumbrado Publico	Puente Sobre La Laguna, Mercado de Mariscos y Malecón, Sector El Porvenir	L. 202,226.00	En proceso de elaboración de contrato.
	Mejoramiento de la Red de Distribución Eléctrica (Priorizado)	Aldea El Sofoco, Sector Tapón de Los Oros	L. 616,132.00	Ejecutado
	Reparación de Alumbrado Publico	Colonia Campo Verde, Sector Campana	-	En proceso de aprobación.
	Reparación de Alumbrado Publico	Aldea Las Delicias, Sector Las Delicias	-	En proceso de aprobación.
	Reemplazo de Postes de Madera en Mal Estado (Emergencia)	Colonia Fraternidad, Sector Chameleconcito	-	En proceso de aprobación.


Reparación de alumbrado público	Colonia Leones del Bosque e instalación de poste de concreto en Colonia El Triunfo , Aldea Puente Alto	-	En proceso de aprobación.
TOTAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA			L. 1,151,375.17

Nota: Los proyectos que no tienen un monto de contrato, están a nivel de presupuesto base.



3 PROYECTOS EN EJECUCION:



3.1Mejoramiento de la Red de Distribución Eléctrica, Aldea El Sofoco, Sector Tapón de Los Oros. Con un monto de Lps.560,203.00, Consiste en la extensión de 73.60 metros de línea primaria de una fase , construcción de 404.20 metros de red secundaria de dos fases mas neutro sobre postes de concreto, instalación de 15 lamparas de 100 watts, 13 postes de concreto y un transformador de 50 kVA

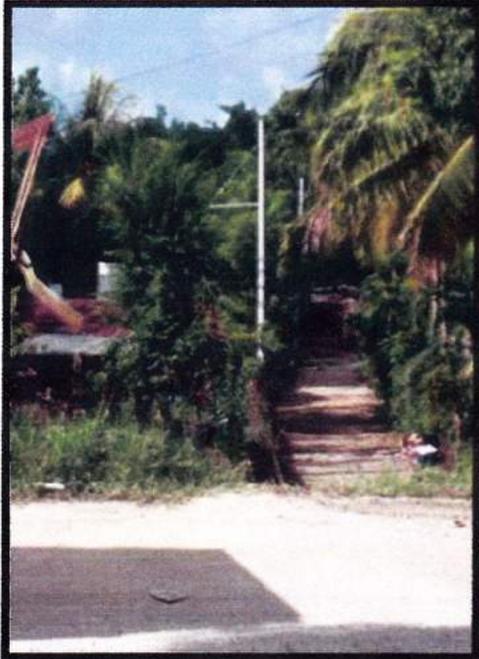

A handwritten signature in black ink, located below the official stamp.

3.2 Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua: Consiste en la demolición de tanque existente, mejoramiento de suelo para darle una mayor capacidad soportante, construcción de tanque de almacenamiento con capacidad de 15,000gln con el cual se pretende abastecer a 200 familias. El proyecto tiene un costo total de Lps. 658,297.10 y actualmente tiene un avance de obra de un 10% lo que nos da un monto invertido de :Lps. 65,829.71 hasta el momento.



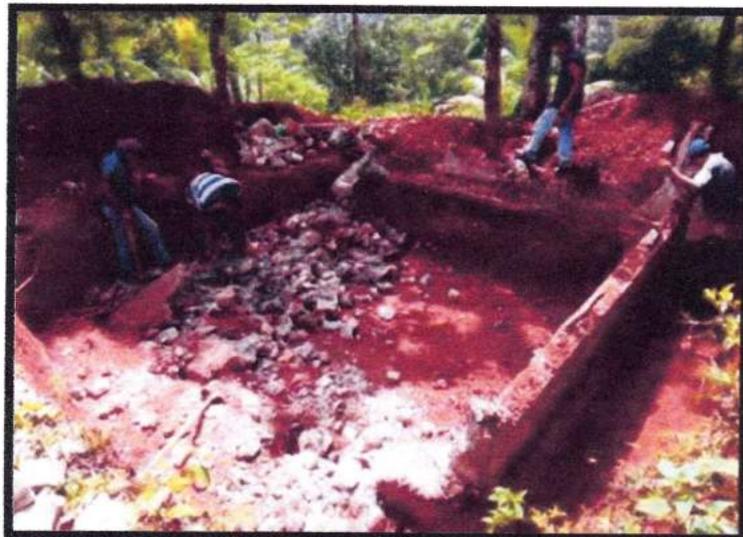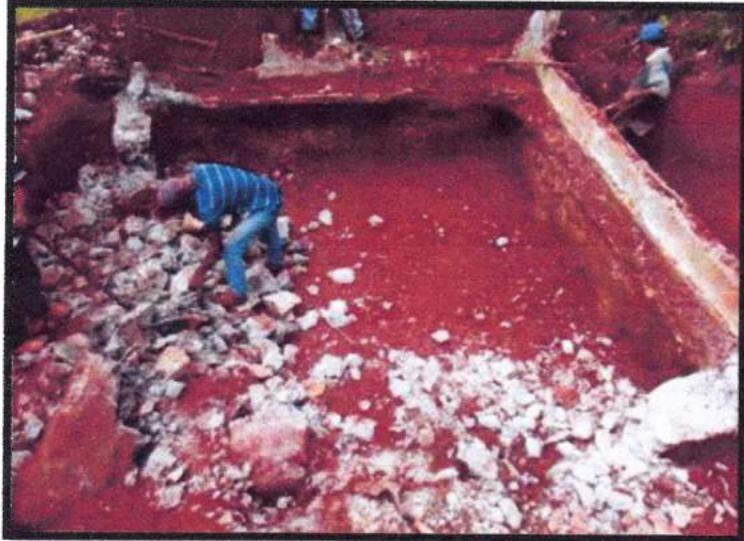

3.3 Construcción de Caja Punte, Colonia La Union, Sector Zapadril:

Consiste en la construcción de una Caja Punte de 16.00ml de largo por 7.00ml de ancho, con cimentación y aletas de concreto ciclópeo, columnas y vigas de concreto armado, losa de concreto armado con un espesor de 20cm, barandales de concreto armado. El proyecto tiene un costo total de L.866,786.50 , con un avance de 70% lo que nos da un monto invertido de L612,750.50



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Claudia Zaldívar".

3.4 Empedrado Gracias a Dios, Sector Puente Alto: Consiste en la pavimentación de 150.00ml de la calle principal de la Colonia Gracias a Dios colocando una capa de piedra de 15cm y fundiendo estas en concreto de 3000psi, dejando sobre la piedra una capa de concreto de 5cm, previo al empedrado se hace la nivelación y conformación de terreno, con un monto total de Lps.673,150.00 y un avance de ejecución del 40% con un Monto Invertido de Lps.269,260.00



3.5 Cabezales en San Juan Zapadril, Sector Zapadril: Consiste en la demolición de cabezales existentes en mal estado, construcción de nuevos cabezales de mampostería a ambos lados de la calle, construcción de un muro de contención con mampostería a un costado de la calle y un cruce de calle con concreto fundido al otro costado de la calle, con un monto total de Lps.379,087.64 y un avance de ejecución del 10% con un Monto Invertido de Lps.37,908.76



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Claudia Zaldívar".



3.6 Mejoramiento del Sistema Eléctrico en Colonia Lomas de Medina, Sector Medina: Consiste en el reemplazo de postes de madera en mal estado por postes nuevos de concreto, reemplazo y extensión de línea secundaria, suministro de lámparas nuevas, con un monto total de Lps.699,884.80 y un avance de ejecución del 75% con un Monto Invertido de Lps.524,913.60





3.7 Empedrado Lomas del Puerto: Consiste en la conformación de terreno y construcción de 206.80 m² de empedrado de calle con 44.00ml de canal para drenaje de aguas lluvias, con un monto total de Lps. 237,150.60 y un avance de ejecución del 95% con un Monto Invertido de Lps.225,293.07



3.8 Tumbos en Barrio El Porvenir, Sector El Porvenir: Consiste en la ampliación de los tumbos de concreto de la calle principal hacia cada uno de los carriles laterales que existen en esta vía, así como también uno ubicado en la calle del tanque. El costo total de este proyecto es de Lps. 48,696.62




3.9 Centro Social (Priorizado), Barrio Camagüey, Sector Península Este:

Consiste en la construcción de un salón de 8m de ancho por 10m de largo, con sobreelevación con bloque de concreto fundido, paredes de bloque de concreto e 6" sisado y lechado, dos baños, gradas de acceso, rampa de acceso para personas con discapacidad, techo de estructura metálica y lamina de aluzinc. Dicho proyecto tiene un monto final de Lps.649,966.10





3.10 Construcción de Centro Social (Priorizado), Colonia Episcopal El Record, Sector El Chile: Consiste en la construcción de un salón de 8m de ancho por 10m de largo, con sobreelevación con bloque de concreto fundido, paredes de bloque de concreto e 6" sisado y lechado, dos baños, gradas de acceso, rampa de acceso para personas con discapacidad, techo de estructura metálica y lamina de aluzinc. Dicho proyecto tiene un monto final de Lps.618,729.65

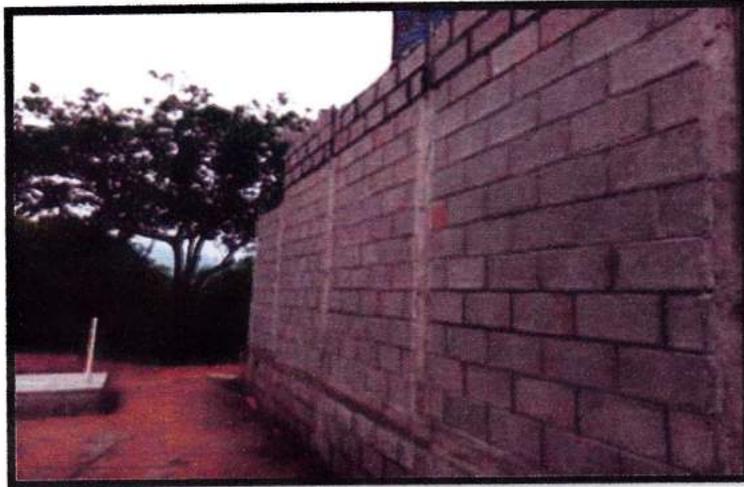

4 PROYECTOS RECEPCIONADOS:

4.1 Construcción de Centro Social, Aldea Nola, Sector Ramal de Lima: Con un Monto de L. 649,322.86. Consiste en la construcción de un salón de 8m de ancho por 10m de largo, con sobreelevación con bloque de concreto fundido, paredes de bloque de concreto e 6" sisado y lechado, dos baños, gradas de acceso, rampa de acceso para personas con discapacidad, techo de estructura metálica y lamina de aluzinc.

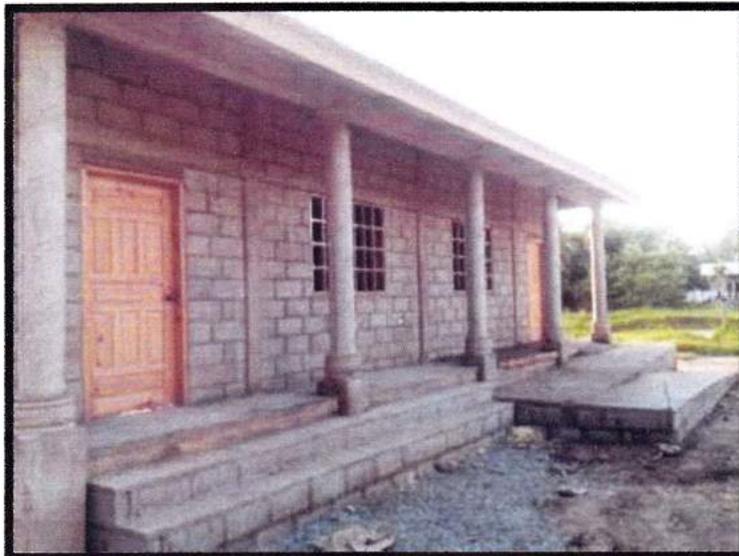

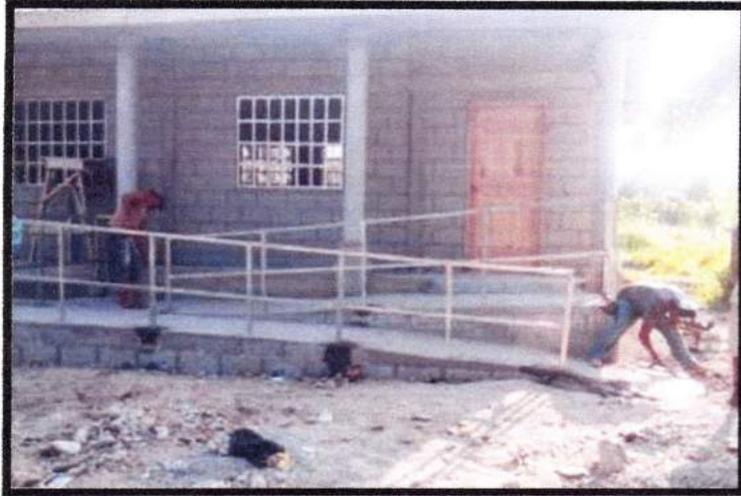

Mayo 2016

Responsable:  Ing. Claudia Zaldívar



4.2 Construcción de Cerco Perimetral y Canal de Bloque en Centro de Salud (Priorizado), Aldea Kele-Kele, Sector Ramal de Lima: con un Monto de L. 799,723.50 consiste en Construcción de cimientos, paredes de bloque sisado, soleras, tallado de elementos, portón de acceso, canal de bloque repellido y pulido





Mayo 2016


Responsable: Ing. Claudia Zaldívar



4.3 Construcción de cabezal y aletas de mampostería, Sector Las Delicias:
con un Monto de L. 254,630.50 consiste en la Construcción de Cabezal y
aleta de mampostería, colocación de alcantarilla.





Mayo 2016




Responsable: Ing. Claudia Zaldívar



4.4 Levantamiento de pared de bloque en cerco del centro básico José Trinidad (Priorizado), Aldea Cedros, Sector Calan: Consiste en Construcción de cimientos, paredes de bloque sisado, soleras, tallado de elementos, portón de acceso, serpentina con un monto final de Lps.496,759.95




4.5 Reparación de Alumbrado Público en Sector Norte de Barrio Pueblo Nuevo, Sector Pueblo Nuevo: Con un monto final de L. 59,879.40

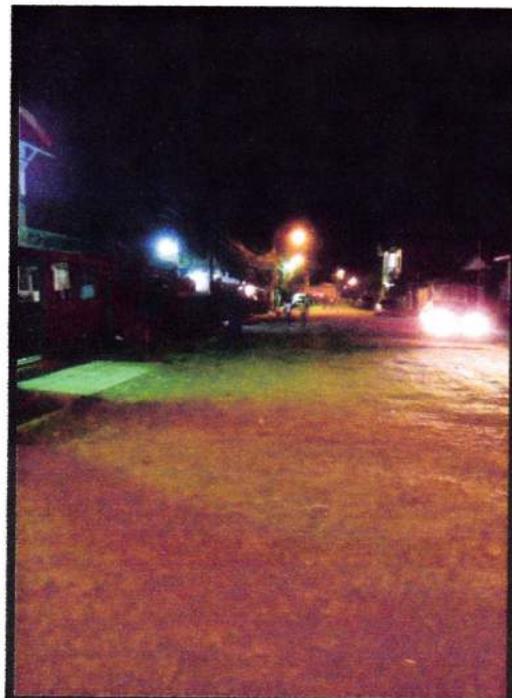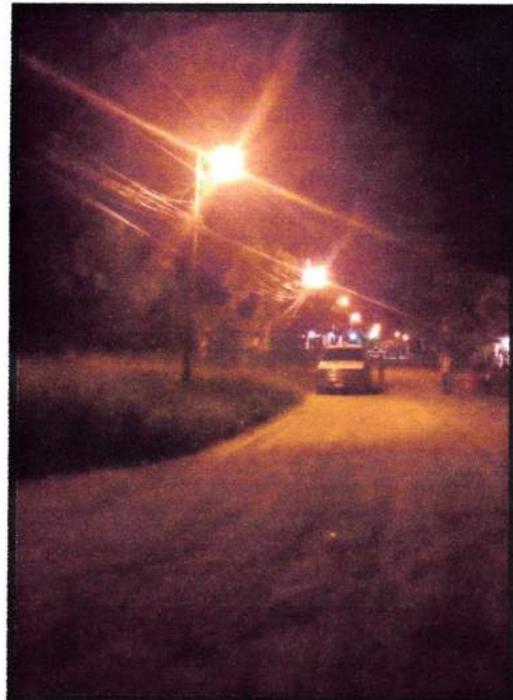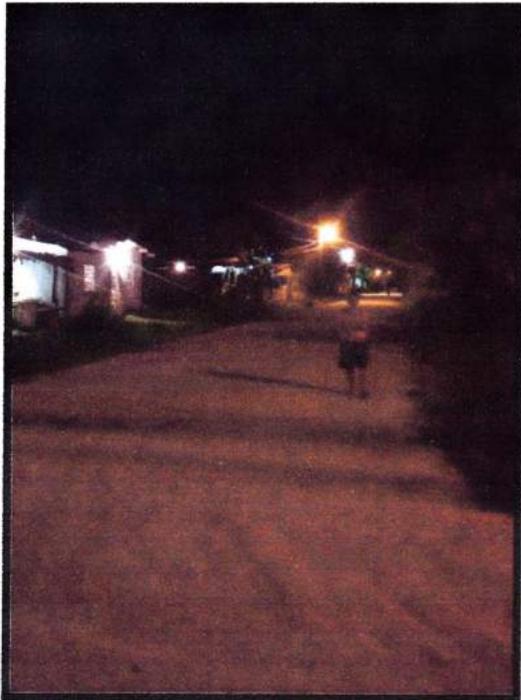

Mayo 2016

Responsable: Ing. Claudia Zaldívar





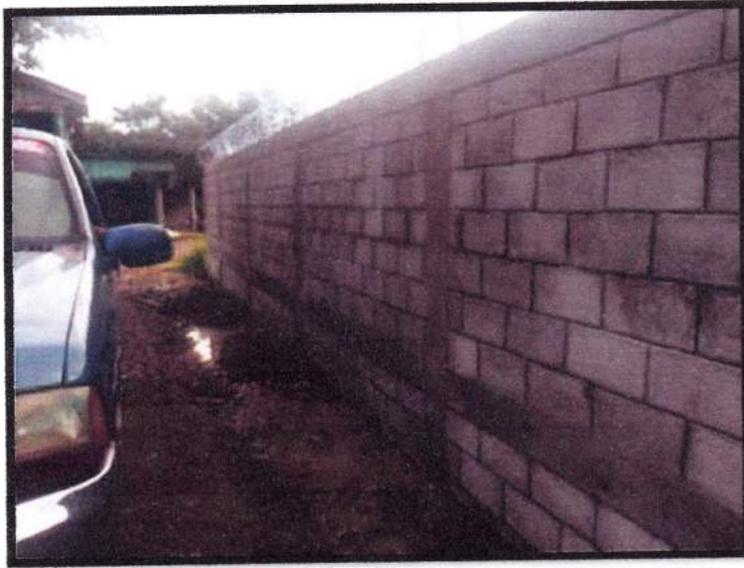


Mayo 2016

Responsable: Ing. Claudia Zaldívar





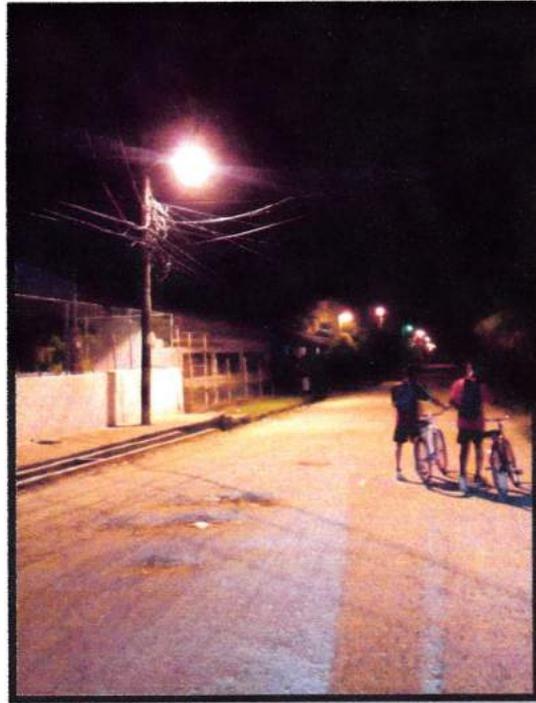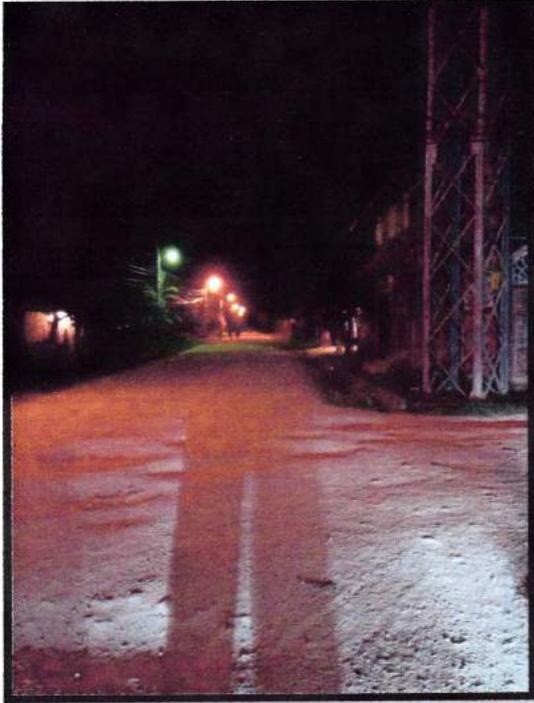





4.6 Reparación de Alumbrado Público en Barrio San Isidro 1,2 y 3 Calle desde 12 a 16 Avenida, Sector Península Oeste: Con un monto final de L.49, 348.30. Consiste en la instalación de 7 lámparas de 100 watts nuevas y la reparación de 27 lámparas en mal estado.

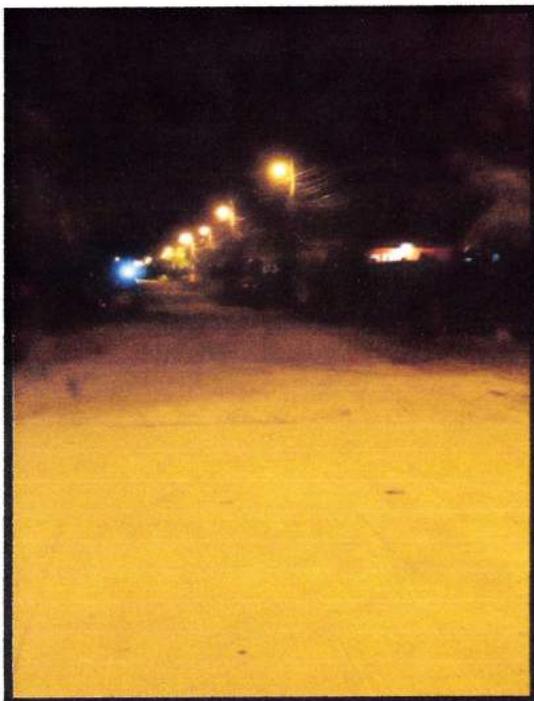

4.7 Suministro e Instalación de Postes y Estructuras para Red Secundaria En Colonia López Bonilla, Sector Baracoa. Consiste en la instalación de 5 postes de concreto con sus herrajes y aisladores para línea secundaria. Monto Lps.79,110.00



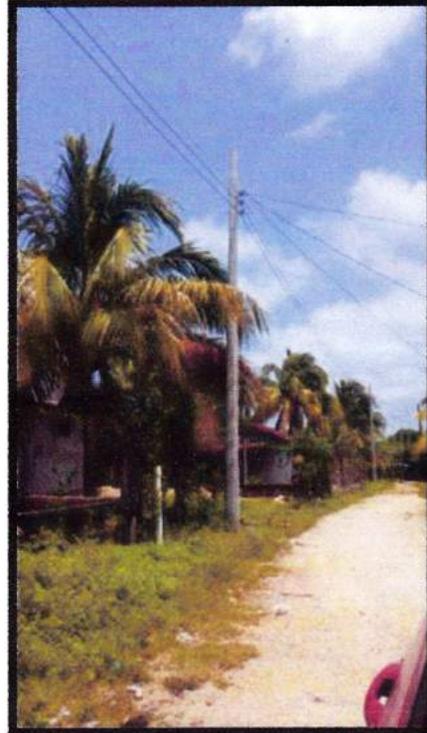
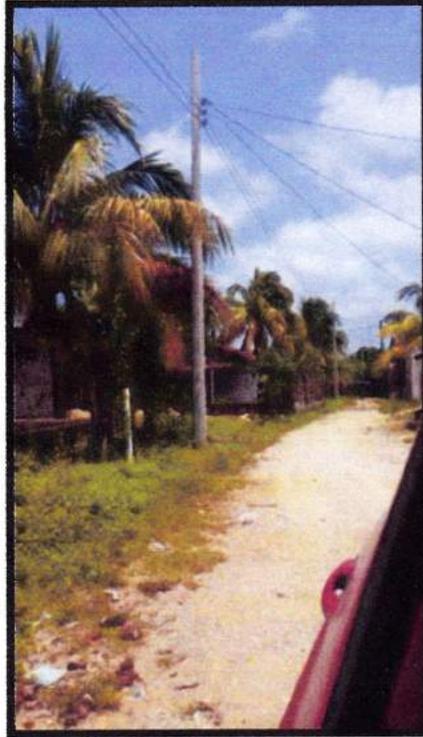


4.8 Reparación De Alumbrado Público En Barrio El Centro 4 Y 5 Avenida, Sector Península Oeste. Consiste en la instalación de 5 lámparas de 100 watts nuevas y la reparación de 18 lámparas en mal estado. Monto Lps.37307.75

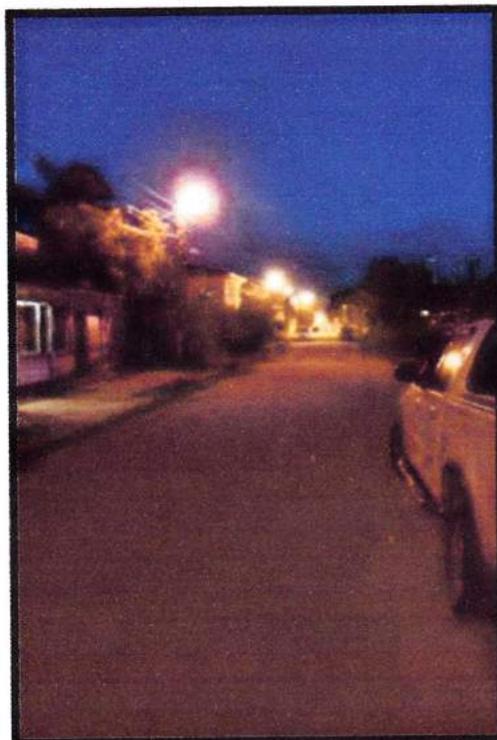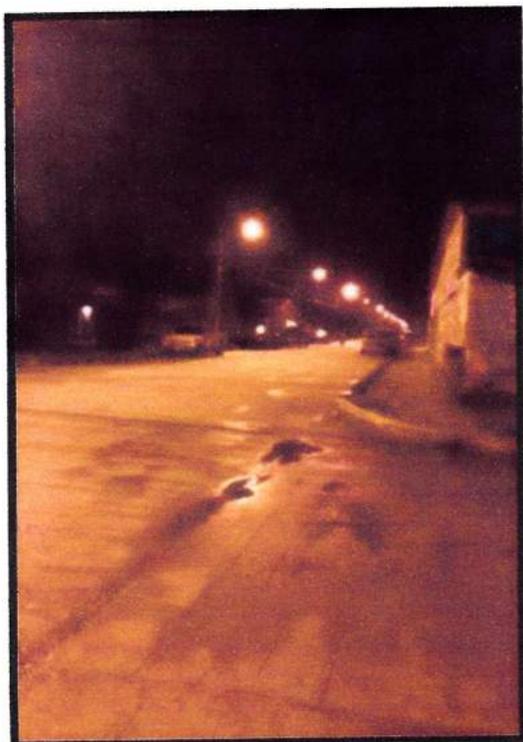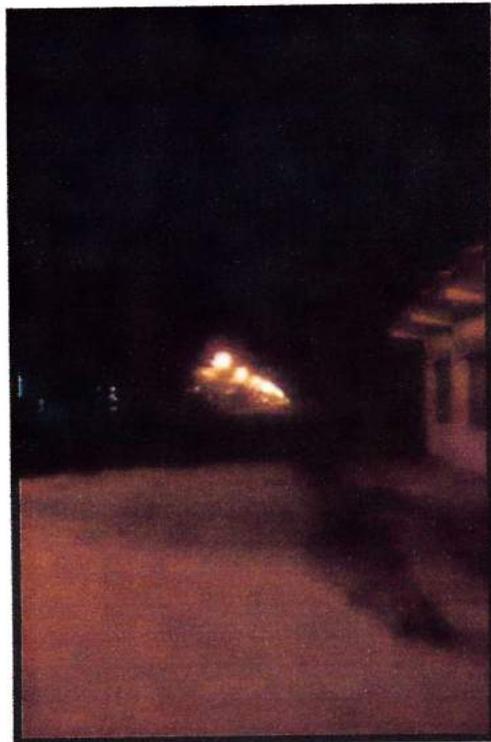
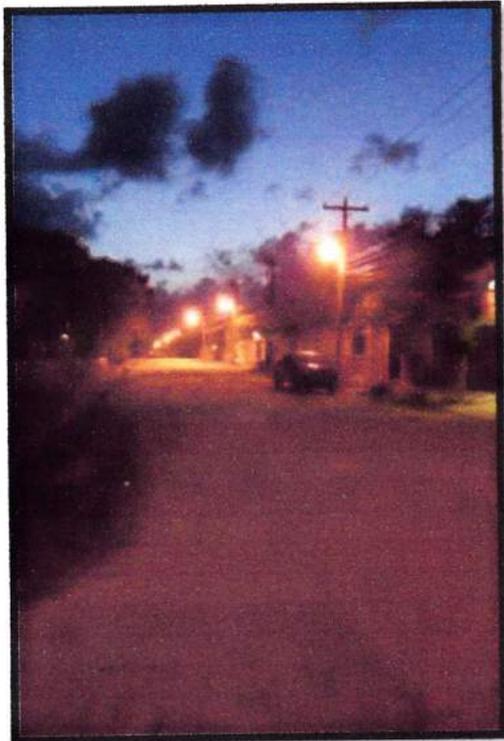


Handwritten signature



4.9 Reparación De Alumbrado Público En Barrio El Faro, Sector Península Oeste. Consiste en la instalación de 12 lámparas de 100 watts nuevas y la reparación de 43 lámparas en mal estado. Monto Lps.83,761.00

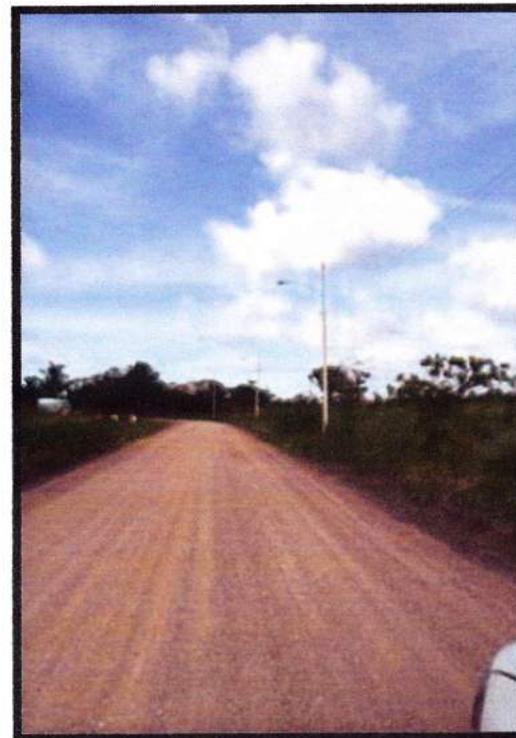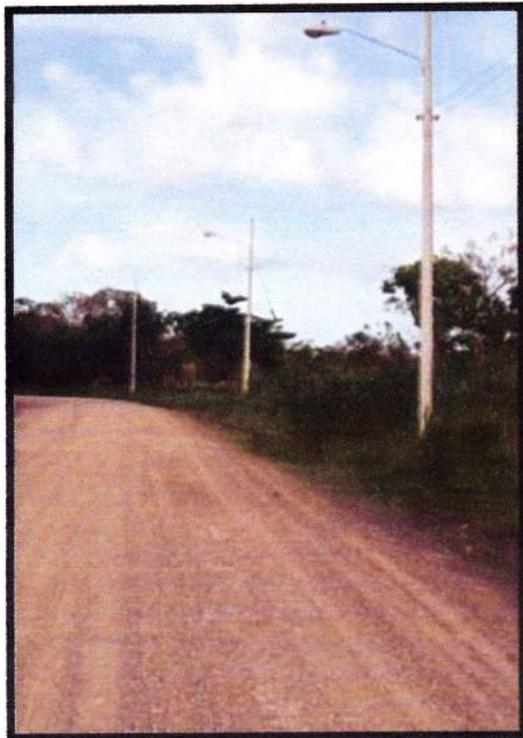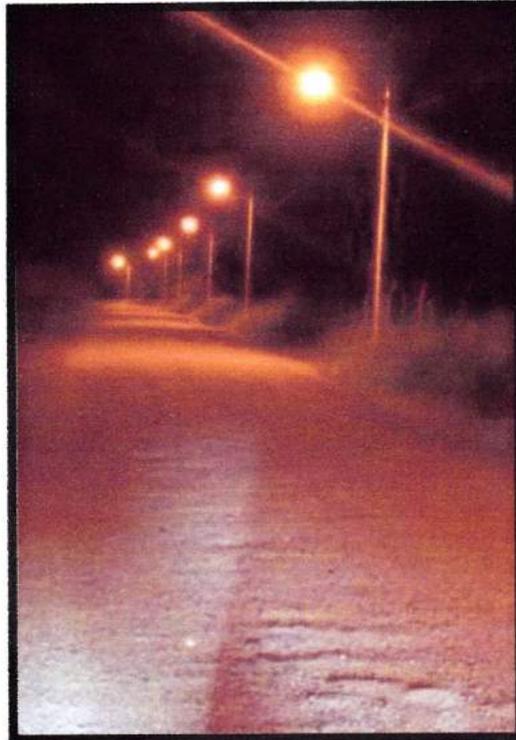
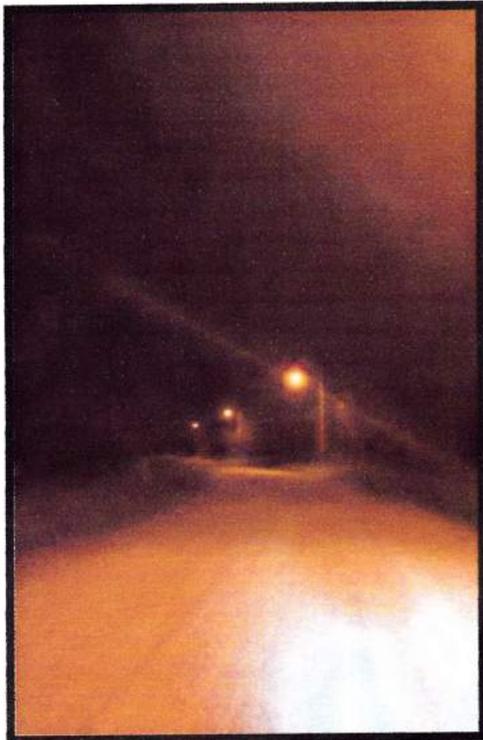


A handwritten signature in black ink, likely belonging to the responsible engineer, Claudia Zaldívar.

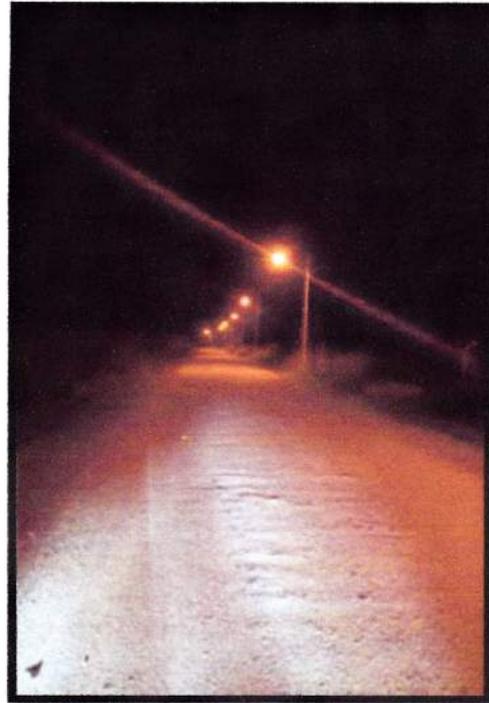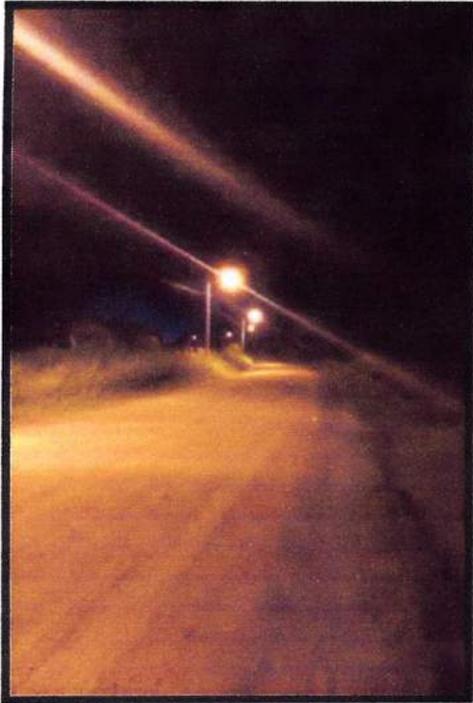

4.10 Reparación de Alumbrado Público, La Bolsa, Barrio Cienaguita, Sector El Porvenir. Consiste en la instalación de 9 lámparas de 100 watts nuevas y la reparación de 33 lámparas en mal estado. Monto Lps.62121.30

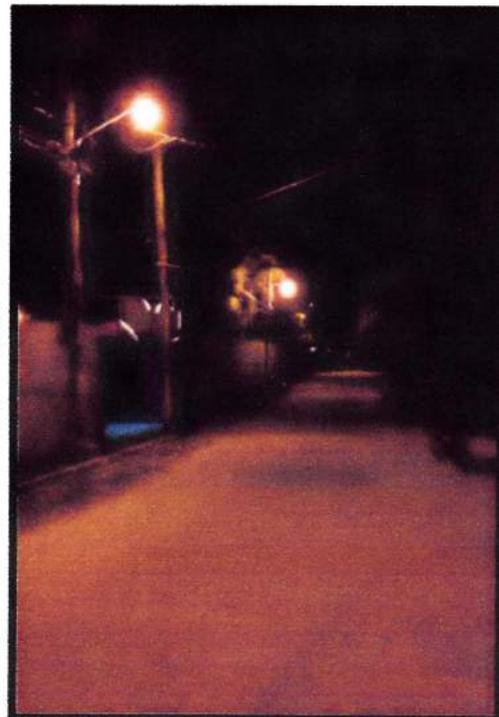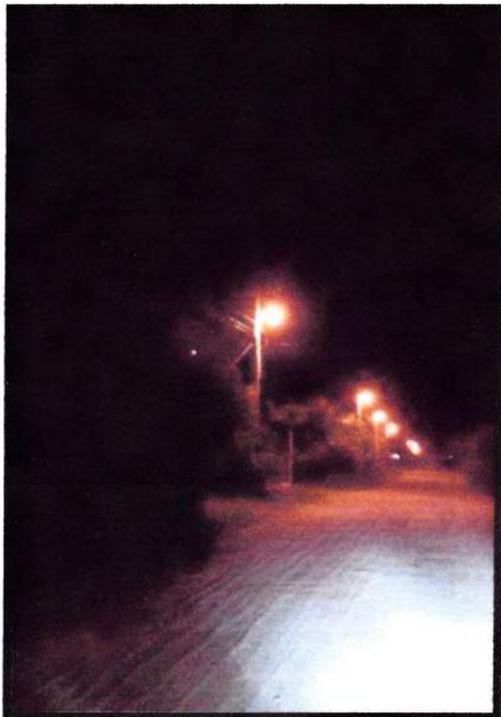

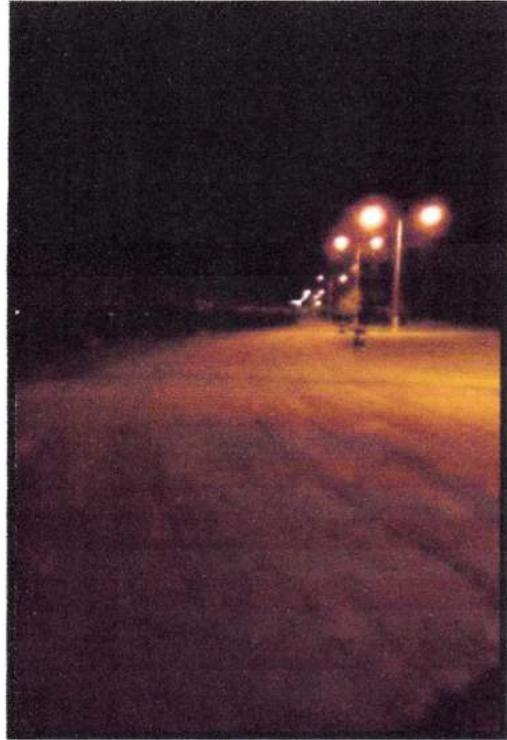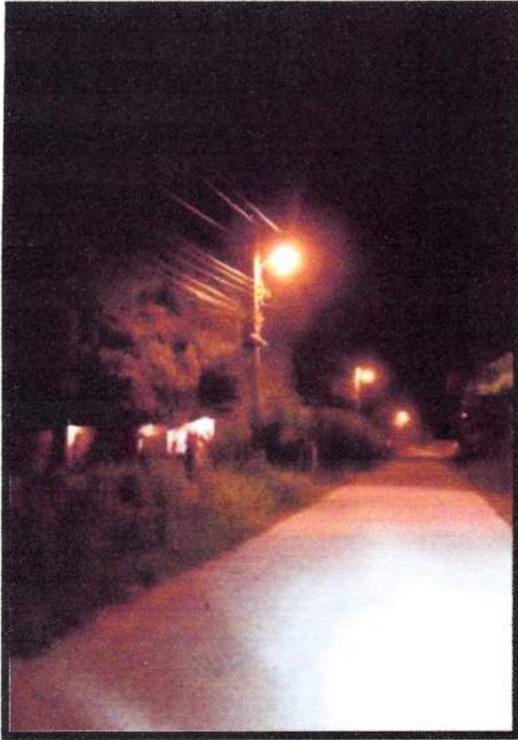

Mayo 2016

Responsable: Ing. Claudia Zaldívar



5 TRABAJOS REALIZADOS POR TALLER MUNICIPAL:


5.1 Elaboración de Ataúdes para donación. Como parte de la proyección social de la Municipalidad de Puerto Cortes, se realiza la entrega de ataúdes para las personas de escasos recursos económicos las cuales no pueden costear el precio de un ataúd.

MES	NUMERO DE ATAÚDES
Mayo	9
Total	9

5.2 Proyecto Pintemos de Color Nuestra Ciudad. Como parte de la proyección social de la Municipalidad de Puerto Cortes, se está llevando a cabo en colaboración con CEPUDO el proyecto "PINTANDO DE COLOR NUESTRA CIUDAD" con el cual se pretende cambiarle la cara al municipio pintando algunos edificios públicos y privados que se encuentran en el centro de la ciudad, así como también la entrada y salida de la misma. Como contraparte municipal se está brindando la mano de obra con cuadrillas municipales y algunas herramientas y equipo básicos.

- **Cerco Perimetral Instituto Oficial Franklin Delano Roosevelt:**



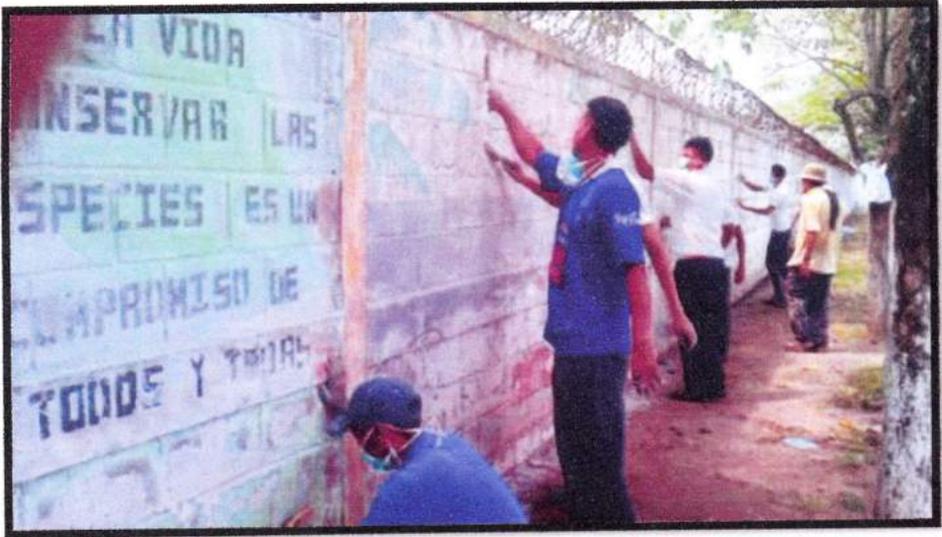

- Cabildo Viejo:



- **Oficina de Administración de Proyectos de la Municipalidad de Puerto Cortes:** Donde se gastaron 3 cubetas de pintura y el costo de mano de obra se estima en Lps5,000.00



Mayo 2016


Responsable: Ing. Claudia Zaldívar






5.3 Construcción de Canal Pluvial en San Juan Zapadril. Es un proyecto en el cual los vecinos de San Juan Zapadril con sus aportes están comprando los materiales para la elaboración de los canales pluviales de una de las calles de la comunidad, y para lo cual solicitaron el apoyo de la municipalidad con una cuadrilla de albañiles y ayudantes para su construcción.



5.4 Mejoramiento de Sistema Alumbrado en Predio de Bodega Municipal:
Como parte del mantenimiento municipal, se cambiaron algunas lámparas tipo canasta en el predio de la bodega y taller mecánico municipal.

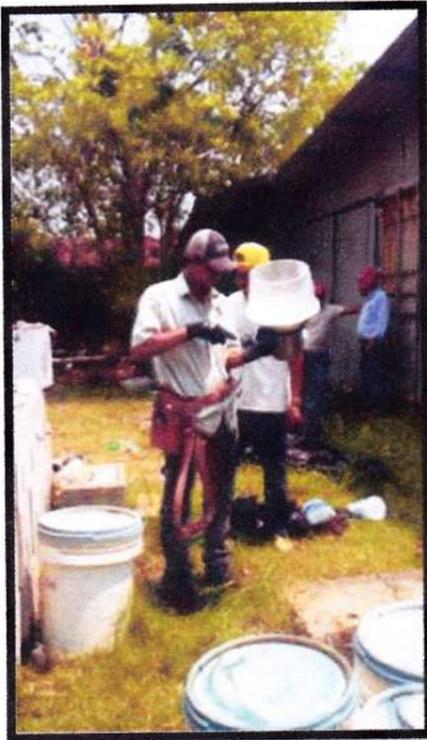

6 VARIOS:

- **Colaboración con la Oficina de Turismo en la supervisión de Parador Turístico:** Como parte de la responsabilidad para mejorar la calidad de las obras desarrollados en el municipio se le dio el apoyo técnico al Departamento Municipal de Turismo en la supervisión de los materiales y mano de obra de los rótulos de bienvenida y parador turístico del municipio.





**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO**

**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES**

Periodo: 01-31 de Mayo del 2016

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
#18/16	Sergio Cardona	Proyectos Sociales	Construcción Centro Social	Aldea Nola, Sector Ramal de Lima	Proveer un área donde los vecinos puedan realizar diversas reuniones o eventos para beneficio de la comunidad	Construcción de Centro Social de 8x12m con bloque de concreto sisado, techo con canaleta y lamina de aluminio, incluye corredor y 2 servicios sanitarios con fosa séptica
#21/16	Fernando Meza	Proyectos Sociales	Construcción de Cerco Perimetral y canal de bloque en centro de salud	Aldea Kele-Kele, Sector Ramal de Lima	Delimitar el predio del centro de salud, para brindar mayor seguridad y evacuar el agua lluvia del predio.	Construcción de cimientos, paredes de bloque sisado, soleras, tallado de elementos, portón de acceso, canal de bloque repellido y pulido
#26/16	Reina María Calix	Seguridad Ciudadana	Mejoramiento del Sistema Eléctrico (Priorizado)	Colonia Lomas de Medina, Sector Medina	mejorar las condiciones de la red de distribución eléctrica existente	Consiste en el mejoramiento de 221.5 metros de línea primaria de una fase, construcción de 340.5 metros de red secundaria de dos fases mas neutro sobre postes de concreto, instalación de 16 lámparas de 100 watts, 11 postes de concreto y un transformador de 75 kVA
#35/16	Santos Mártir Zelaya	Obras de Protección	Construcción de Cabezal y Aletas de Mampostería	Aldea las Delicias, Sector las Delicias	Evitar que la calle se lave debido al agua.	Construcción de Cabezal y aleta de mampostería, colocación de alcantarilla.
#38/16	Heber Eduardo Acosta	Proyectos Sociales	Levantamiento de Pared de Bloque en Cerco del Centro Básico José Trinidad	Aldea Cedros, Sector Calan	delimitar el predio del centro básico y brindar mayor seguridad a los estudiantes	Construcción de cimientos, paredes de bloque sisado, soleras, tallado de elementos, portón de acceso, serpentina




MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES

Periodo: 01-31 de Mayo del 2016

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
#42/16	Maximino Alvarado Ortiz	Seguridad Ciudadana	Reparación de Alumbrado Público	Calle Principal y Callejón Doña Moncha, Barrio Palermo, Sector El Porvenir	Mejorar las condiciones de alumbrado publico del sector	Consiste en la instalación de 18 lámparas de 100 watts nuevas y la reparación de 18 lámparas en mal estado.
#43/16	Williams Benavides	Seguridad Ciudadana	Reparación de Alumbrado Público	Callejón Doña Virginia, Barrio Palermo, Sector El Porvenir	Mejorar las condiciones de alumbrado publico del sector	Consiste en la instalación de 20 lámparas de 100 watts nuevas y la reparación de 13 lámparas en mal estado.
#45/16	Jesser Magdiel Escobar	Seguridad Ciudadana	Reparación de Alumbrado Público	Sector Norte de Barrio Pueblo Nuevo	Mejorar las condiciones de alumbrado publico del sector	Consiste en la instalación de 10 lámparas de 100 watts nuevas y la reparación de 28 lámparas en mal estado.
#47/16	Jorge Adalberto Martínez Solís	Seguridad Ciudadana	Reparación de Alumbrado Público	Barrio San Isidro 1,2 y 3 Calle desde 12 a 16 Avenida, Sector Península Oeste	Mejorar las condiciones de alumbrado publico del sector	Consiste en la instalación de 7 lámparas de 100 watts nuevas y la reparación de 27 lámparas en mal estado.
#48/16	Joel Antonio Trejo Amaya	Seguridad Ciudadana	Mejoramiento de la Red de Distribución Eléctrica	Aldea El Sofoco, Sector Tapón de Los Oros	mejorar las condiciones de la red de distribución eléctrica existente	Consiste en la extensión de 73.60 metros de línea primaria de una fase , construcción de 404.20 metros de red secundaria de dos fases mas neutro sobre postes de concreto, instalación de 15 lámparas de 100 watts, 13 postes de concreto y un transformador de 50 kVA
#49/16	Reina María Calix Mejía	Seguridad Ciudadana	Reparación De 81 Metros De Red Secundaria Y Alumbrado Público	Colonia 1 De Mayo, Sector Nuevos Horizontes	Mejorar las condiciones de alumbrado publico del sector	Consiste en la instalación de 16 lámparas de 100 watts nuevas y 81 metros de línea secundaria de dos fases mas neutro




MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES

Periodo: 01-31 de Mayo del 2016

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
#51/16	David Flores Ordoñez	Seguridad Ciudadana	Suministro E Instalación De Sistema Eléctrico Industrial En Escuela Taller Municipal	Colonia Santa Clara, Sector El Chile	Proveer de sistema eléctrico adecuado para el desarrollo de las actividades industriales de la escuela.	Consiste en la instalación de cableado eléctrico y tomacorrientes para alimentación de equipo de soldadoras, herramientas eléctricas de mano, iluminación y oficinas
#52/16	Geremias David García Lobo	Seguridad Ciudadana	Mejoras al Sistema de Alumbrado Público	Colonia La Unión, Aldea el Bum, Sector Baracoa	Mejorar las condiciones de alumbrado publico del sector	Consiste en la instalación de 150 metros de línea controlada para iluminación, contro y 8 lámparas de 100 watts nuevas
#57/16	Geremias David García Lobo	Seguridad Ciudadana	Suministro e Instalación de Postes y Estructuras para Red Secundaria	Colonia López Bonilla, Sector Baracoa	Mejorar las condiciones de la red eléctrica y alumbrado publico del sector	Consiste en la instalación de 5 postes de concreto con sus herrajes y aisladores para línea secundaria.
#58/16	Jesser Magdiel Escobar	Seguridad Ciudadana	Reparación de Alumbrado Público	Barrio El Faro, Sector Península Oeste	Mejorar las condiciones de alumbrado publico del sector	Consiste en la instalación de 12 lámparas de 100 watts nuevas y la reparación de 43 lámparas en mal estado.
#59/16	David Flores Ordoñez	Seguridad Ciudadana	Reparación de Alumbrado Público	Aldea La Presa, Sector Ecoturístico	Mejorar las condiciones de alumbrado publico del sector	Consiste en la instalación de 28 lámparas de 100 watts nuevas.
#61/16	Jesser Magdiel Escobar	Seguridad Ciudadana	Reparación de Alumbrado Público	Barrio El Centro 4 Y 5 Avenida, Sector Península Oeste	Mejorar las condiciones de alumbrado publico del sector	Consiste en la instalación de 5 lámparas de 100 watts nuevas y la reparación de 18 lámparas en mal estado.
#65/16	Jesser Magdiel Escobar	Seguridad Ciudadana	Reparación de Alumbrado Público	La Bolsa, Barrio Cienaguita, Sector El Porvenir	Mejorar las condiciones de alumbrado publico del sector	Consiste en la instalación de 9 lámparas de 100 watts nuevas y la reparación de 33 lámparas en mal estado.




**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO**

**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES**

Periodo: 01-31 de Mayo del 2016

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
#76/16	Audias Echeverría	Sector Saneamientos	Tanque para Almacenamiento de Agua de 15,000 galones	Aldea Nisperales, Sector Puente Alto	Proveer del Servicio básico de agua para consumo en cantidad a 200 familias en el área rural	Construcción de Tanque Para almacenamiento de agua de ladrillo rafon perforado, hipoclorador, caja de válvulas, tuberías, accesorios y bomba de 5HP




**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO**

**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION/ ELABORACION DE PROYECTO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES**

Periodo: 01-31 de Mayo del 2016



Ítem	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Presupuesto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
#18/16	Proveer un lugar para reuniones y diversos eventos.	NO APLICA	NO APLICA	Sergio Cardona, +504 3324-5563	L. 649,322.86	Fondos Municipales	3/8/2016	100%	L. 649,322.86	5/19/2016
#21/16	Delimitar el predio del centro de salud, para brindar mayor seguridad y evacuar el agua lluvia del predio	NO APLICA	NO APLICA	Fernando Alberto Meza, +504 9628-6338	L. 799,723.50	Fondos Municipales	3/31/2016	100%	L. 799,723.50	6/2/2016
#26/16	mejora la calidad de voltaje suministrado a las viviendas del sector, evitando daños a equipos eléctricos.	NO APLICA	NO APLICA	Reina María Calix Mejía 31554123	L. 699,884.80	Municipalidad de Puerto Cortés	22 de Abril del 2016	50%	L. 699,884.80	10 de Julio de 2016
#35/16	Brindar protección a la calle en ambos extremos del cruce con alcantarillas, evitando que el agua dañe los bordes de la calle	NO APLICA	Debido a la corriente de agua que circula por la calle, esta se va dañando, evitando que los carros puedan transitar	Santos Mártir Zelaya, +504 9994-7582	L. 254,630.50	Fondos Municipales	4/28/2016	100%	L. 254,630.50	6/8/2016
#38/16	delimitar el predio del centro básico y brindar mayor seguridad a los estudiantes	NO APLICA	NO APLICA	Heber Eduardo Acosta	L. 496,759.95	Fondos Municipales	4/28/2016	100%	L. 496,759.95	6/16/2016
#42/16	Mejora del alumbrado publico y los niveles de voltaje para los habitantes	NO APLICA	NO APLICA	Maximino Alvarado Ortiz	L. 73,447.40	Municipalidad de Puerto Cortés		100%	L. 73,447.40	06 de Mayo del 2016
#43/16	Mejorar los niveles de voltaje en la escuela, para el correcto funcionamiento de los equipos eléctricos instalados	NO APLICA	NO APLICA	Williams Benavides	L. 73,076.00	Municipalidad de Puerto Cortés		100%	L. 73,076.00	06 de Mayo del 2016

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO**

**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION/ ELABORACION DE PROYECTO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES**

Periodo: 01-31 de Mayo del 2016



Item	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Presupuesto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
#45/16	Mejorar las condiciones de alumbrado publico para brindar mayor seguridad a los habitantes	NO APLICA	NO APLICA	Jesser Magdiel Escobar	L. 59,879.40	Municipalidad de Puerto Cortés	06 de Mayo del 2016	100%	L. 59,879.40	16 de Mayo del 2016
#47/16	Mejorar las condiciones de alumbrado publico para brindar mayor seguridad a los habitantes	NO APLICA	NO APLICA	Jorge Adalberto Martínez Solís	49, 348.30	Municipalidad de Puerto Cortés	07 de Mayo del 2016	100%	49, 348.30	19 de Mayo del 2016
#48/16	mejora la calidad de voltaje suministrado a las viviendas del sector, evitando daños a equipos eléctricos.	NO APLICA	NO APLICA	Joel Antonio Trejo Amaya 98179826	L. 560,203.00	Municipalidad de Puerto Cortés	12 de Mayo del 2016	60%	L. 560,203.00	16 de Junio del 2016
#49/16	Mejorar las condiciones de alumbrado publico para brindar mayor seguridad a los habitantes	NO APLICA	NO APLICA	Reina María Calix Mejía 31554123	L. 0.00	Municipalidad de Puerto Cortés		100%	L. 0.00	20 de Mayo del 2016
#51/16	permite la conexión a l suministro de energia eléctrica de forma adecuada y segura de los equipos eléctricos utilizados para la enseñanza de las diferentes disciplinas técnicas	NO APLICA	NO APLICA	David Flores Ordoñez 99972899		Municipalidad de Puerto Cortés		65%		17 de Junio del 2016
#52/16	Mejorar las condiciones de alumbrado publico para brindar mayor seguridad a los habitantes	NO APLICA	NO APLICA	Geremias David García Lobo	L. 0.00	Municipalidad de Puerto Cortés		100%	L. 0.00	24 de Mayo del 2016
#57/16	Mejorar las condiciones de alumbrado publico para brindar mayor seguridad a los habitantes	NO APLICA	NO APLICA	Geremias David García Lobo	L. 79,110.00	Municipalidad de Puerto Cortés	17 de Mayo del 2016	100%	L. 79,110.00	24 de Mayo del 2016

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO**

**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION/ ELABORACION DE PROYECTO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES**

Periodo: 01-31 de Mayo del 2016

Ítem	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Presupuesto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
#58/16	Mejorar las condiciones de alumbrado publico para brindar mayor seguridad a los habitantes	NO APLICA	NO APLICA	Jesser Magdiel Escobar	L. 83,761.00	Municipalidad de Puerto Cortés	17 de Mayo del 2016	100%	L. 83,761.00	26 de Mayo del 2016
#59/16	mejora la calidad de voltaje suministrado a las viviendas del sector, evitando daños a equipos eléctricos.	NO APLICA	NO APLICA	David Flores Ordoñez 99972899	L. 81,326.00	Municipalidad de Puerto Cortés		100%	L. 81,326.00	27 de Mayo del 2016
#61/16	Mejorar las condiciones de alumbrado publico para brindar mayor seguridad a los habitantes	NO APLICA	NO APLICA	Jesser Magdiel Escobar	L. 37,307.75	Municipalidad de Puerto Cortés	17 de Mayo del 2016	100%	L. 37,307.75	25 de Mayo del 2016
#65/16	Mejorar las condiciones de alumbrado publico para brindar mayor seguridad a los habitantes	NO APLICA	NO APLICA	Jesser Magdiel Escobar	L. 62,121.30	Municipalidad de Puerto Cortés	20 de Mayo del 2016	100%	L. 62,121.30	31 de Mayo del 2016
#76/16	Abastecer aproximadamente 200 familias de agua potable.	NO APLICA	Debido al terreno se realiza un mejoramiento de suelo con piedra, laja y material selecto	Audias Echeverría, +504 9929-7011	L. 658,297.10	Fondos Municipales	5/20/2016	10%	L. 658,297.10	8/28/2016

