

2016

INFORME MENSUAL JUNIO



MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y
PROYECTOS MENORES
MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTÉS

RESPONSABLE: ING. CLAUDIA ZALDIVAR



INDICE

CONTENIDO	Nº PAG.
1. EVALUACIONES REALIZADAS.....	2
2. PROYECTOS PRESUPUESTADOS.....	5
3. PROYECTOS EN EJECUCION.....	7
4. PROYECTOS RECEPCIONADOS.....	15
5. TRABAJOS REALIZADOS POR TALLER MUNICIPAL	21
6. VARIOS.....	25



1. EVALUACIONES REALIZADAS:

Como una proyección social la Municipalidad de Puerto Cortés, con el consentimiento del Sr. Alcalde el Lic. Allan Ramos y su Corporación Municipal, han aprobado las ayudas a personas de escasos recursos y a algunas instituciones con donación de materiales para la reparación de sus viviendas y sus edificaciones respectivamente.

La Gerencia de Planificación y Desarrollo a través de los Departamentos de Desarrollo Social y Mantenimiento Municipal y Proyectos Menores hacen las evaluaciones de las solicitudes de materiales que ingresan a la Municipalidad, para lo cual se hace un estudio socioeconómico (Promotores) y una visita de campo para constatar que lo solicitado está de acuerdo con las necesidades del solicitante.

A continuación se detallan algunas de las evaluaciones realizadas para ayudas:

1.1 Construcción de Cocina en Iglesia Metodista Libre Faro de Luz, Aldea

Travesía, Sector Garífuna, se acudió al sitio con el promotor en el cual se *encontraban miembros de la comunidad, se evaluaron y se verifico que se necesitan los bloques de concreto que la comunidad solicita para la elaboración de la cocina en la iglesia*

1.2 Reparación de Escenario Comunal, Aldea Travesía, Sector Garífuna, se

acudió al sitio con el promotor en el cual se encontraban miembros de la comunidad, se constato que para su reparación se necesita comprar madera y clavos.

1.3 Reparación de alambrado publico, Colonia Leones del Bosque, sector

Puente Alto, se asistió al sitio para hacer la inspección y se verifico la *necesidad de reparar el sistema para lo cual se necesitan los siguientes materiales, luminarias de sodio, cable #14, conectores de comprensión, fotoceldas, accesorios varios.*

1.4 Suministro de poste de Concreto, Colonia El Triunfo, Sector Puente Alto,

se realizo la visita de campo y se comprobó la necesidad de cambiar un poste en mal estado para lo cual son necesarios los siguientes materiales, poste de concreto de 40', cemento, arena, grava, barril metálico.

1.5 Elaboración de bancas de Madera para Policía Municipal, Barrio Buenos

Aires, sector Península Este, se estableció la necesidad de tener en el *plantel de servicios públicos unas bancas de madera donde el personal pueda*



descansar en los momentos que estén en el plantel, para lo cual es necesario la compra de madera, clavos, barniz, lija, diluyente.

- 1.6 Elaboración de techo de la casa de la Sra. Juana Dolores Sales, Campana,** se acudió al lugar con el promotor de la zona en el cual se encontraban en el lugar la dueña de la casa se acordó con esta la entrega de los materiales la construcción del techo.
- 1.7 Reparación de la casa de la Sra. Fidelia Lanza, Campana,** se acudió al lugar con el promotor de la zona en el cual se encontraban en el lugar la dueña de la casa se acordó con esta la entrega de los materiales la reparación del techo.
- 1.8 Trabajos varios en oficinas municipales fondos externos,** Se acudió al lugar en atención a la solicitud realizada, se acordó la reparación y realización de trabajos varios en la oficina de fondos externos, como ser pintura, mueble, instalación de canaleta para cables, colocación de láminas de cielo falso, entre otros.
- 1.9 Pintura de edificio municipal,** Se acudió al lugar en atención a la solicitud realizada en el cual se acordó la pintura de todo el edificio municipal por su parte externa, además pintura de jardineras, contenedor, parque y cuarto eléctrico.
- 1.10 Pintura de cerco de bodega municipal,** Se acudió al lugar en atención de la solicitud, en el cual se acordó la pintura del cerco por ambas caras con cuadrilla municipal.
- 1.11 Trabajos varios en grupo Génesis, estadio,** Se acudió al lugar en el cual se encontraban miembros del grupo y se acordó con estos la remodelación y mejoramiento de las instalaciones.
- 1.12 Revisión de poste de tendido eléctrico inclinado:** se asiste al lugar para observar las condiciones en que se encuentra uno de los postes de la comunidad, este está peligrosamente inclinado por lo cual requiere reemplazo inmediato, se ve la necesidad de hincar el nuevo poste en el lado opuesto de la calle para minimizar los esfuerzos mecánicos generados por el flechado de las líneas que este soporta.
- 1.13 Revisión de poste de tendido eléctrico en mal estado:** se realiza inspección al lugar por solicitud del patronato para la evaluación del estado de dos postes de madera de la red de distribución eléctrica que se encuentran



quebrados y amenazan con caer sobre las casas cercanas a estos, se considera una emergencia el reemplazo de estos para evitar daño a los habitante del lugar.

- 1.14 Mejoramiento de sistema eléctrico en aula de kínder La Roca:** se realiza inspección para la instalación de 12 máquinas de costura, se hacen las mediciones y se procederá a generar listado de materiales.



2 PROYECTOS PRESUPUESTADOS:



2.1 Desarrollo Económico Local:

Nº	PROYECTO	COMUNIDAD	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Remodelación de Oficina de Policía Comunitaria Municipal	Barrio Pueblo Nuevo	Lps 36,418.93 (Costo de Materiales)	En proceso de compra de materiales para ser ejecutado por Escuela Taller
TOTAL PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				Lps.36,418.93

2.2 Educación:

Nº	PROYECTO	COMUNIDAD	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Construcción de 2 Aulas y Cerco Perimetral(Priorizado)	La Concordia	L. 650,739.90	En Ejecución
2	Construcción de Baños y Fosa Séptica en Esc. Carlos Roberto Flores	Col. La Gran Villa	-	En proceso de aprobación.
3	Obras Complementarias a Proyecto Suministro e Instalación de Banco de Transformadores 3x75 kVA	Escuela Marco Aurelio Soto, Barrio El Porvenir	L.247,026.00	Ejecutado.
TOTAL PROYECTOS DE EDUCACION				L. 897,765.90

2.3 Fortalecimiento del Desarrollo y Cohesión Social:

Nº	PROYECTO	COMUNIDAD	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Construcción Baño y Fosa Séptica en Iglesia La Milagrosa	Barrio Los Mangos, Sector Península Oeste	-	En proceso de aprobación.
2	Reparaciones varias en iglesia católica (priorizado)	Buena vista, sector Ecoturístico	-	En proceso de licitación privada.
TOTAL PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y COHESION SOCIAL				-

2.4 Infraestructura Básica:

Nº	PROYECTO	COMUNIDAD	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
13	Suministro e Instalación de Transformador de 70kVA (Emergencia)	Colonia Emsland, Sector Zapadril	L. 178,440.00	En proceso de elaboración de contrato.
	Sistema Eléctrico en Aula de Costura de Jardín de Niños	Barrio la Roca, Sector Pueblo Nuevo	-	En proceso de aprobación.
	Reparación de alumbrado público	Barrio Campo Rojo, Sector Península Oeste	-	En proceso de aprobación.
	Sistema eléctrico, remodelación y reparaciones en Taller de Costura Grupo Génesis	Estadio Excelsior, Barrio Copen, Sector Península Este.	-	En proceso de aprobación.
	Reparación de alumbrado público	Colonia Planes de Medina, Sector Medina	-	En proceso de aprobación.
	Reparación de alumbrado público.	7 Avenida desde la 8 hasta la 4 calle, 8 avenida desde la 8 calle hasta la 4 calle, Barrio Suyapa, Sector Península Este	-	En proceso de aprobación.
	Reparación de alumbrado público.	9 Avenida desde la Calle 8 hasta la 4 Calle, 10 Avenida desde la 8 Calle hasta la 4 Calle, Calle 8 Barrio Suyapa, Sector Península Este	-	En proceso de aprobación.
TOTAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA				L. 178,440.00

Nota: Los proyectos que no tienen un monto de contrato, están a nivel de presupuesto base.




3 PROYECTOS EN EJECUCION:

3.1 Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua: Consiste en la demolición de tanque existente, mejoramiento de suelo para darle una mayor capacidad soportante, construcción de tanque de almacenamiento con capacidad de 15,000gln con el cual se pretende abastecer a 200 familias. El proyecto tiene un costo total de Lps. 658,297.10 y actualmente tiene un avance de obra de un 12% lo que nos da un monto invertido de :Lps. 78,995.65 hasta el momento.



3.2 Caja puente La Union: Consiste en la construcción de una Caja Puente de 16.00ml de largo por 7.00ml de ancho, con cimentación y aletas de concreto ciclópeo, columnas y vigas de concreto armado, losa de concreto armado con un espesor de 20cm, barandales de concreto armado. El proyecto tiene un costo total de L.866,786.50 , con un avance de 70% lo que nos da un monto invertido de L612,750.50






3.3 Empedrado Gracias a Dios, Sector Puente Alto: Consiste en la pavimentación de 150.00ml de la calle principal de la Colonia Gracias a Dios colocando una capa de piedra de 15cm y fundiendo estas en concreto de 3000psi, dejando sobre la piedra una capa de concreto de 5cm, previo al empedrado se hace la nivelación y conformación de terreno, con un monto total de Lps.673,150.00 y un avance de ejecución del 40% con un Monto Invertido de Lps.269,260.00




3.4 Cabezales en San Juan Zapadril, Sector Zapadril: Consiste en la demolición de cabezales existentes en mal estado, construcción de nuevos cabezales de mampostería a ambos lados de la calle, construcción de un muro de contención con mampostería a un costado de la calle y un cruce de calle con concreto fundido al otro costado de la calle, con un monto total de Lps.379,087.64 y un avance de ejecución del 10% con un Monto Invertido de Lps.37,908.76



3.5 Mejoramiento de Sistema Eléctrico en Colonia Brisas del Mar, Sector El Porvenir: Consiste en el reemplazo de postes de madera por postes de concreto, reemplazo de línea secundaria y el suministro y colocación de algunas lámparas tipo canasta, con un monto total de Lps.636,762.70 y un avance de ejecución del 25% con un Monto Invertido de Lps.159,190.68


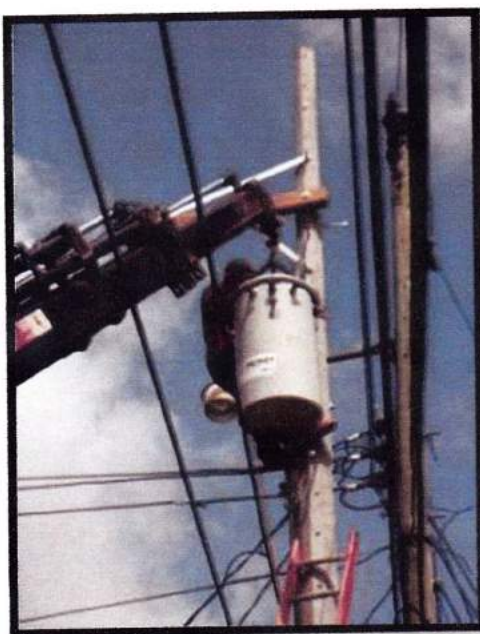


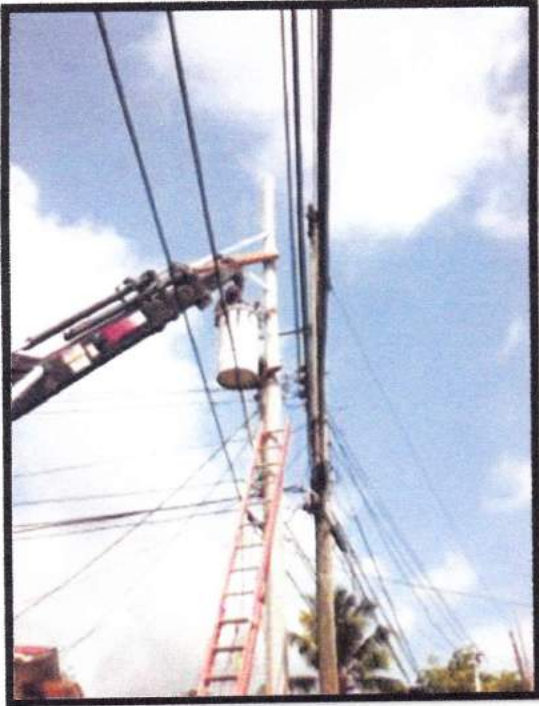


Junio 21016


Responsable: Ing. Claudia Zaldívar



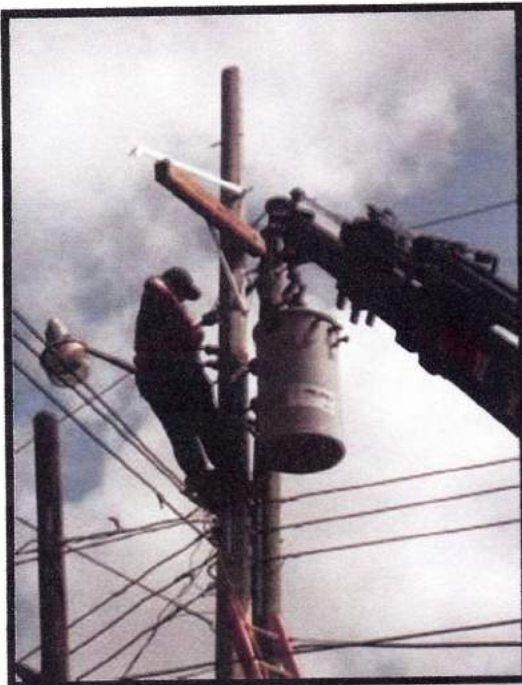
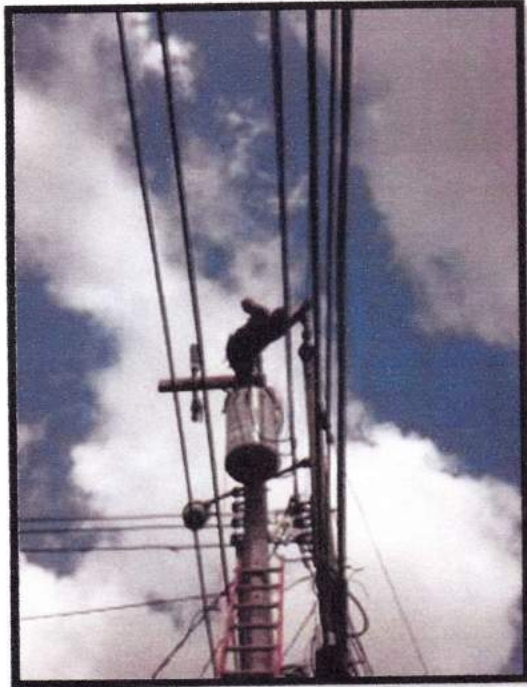



Junio 21016


Responsable: Ing. Claudia Zaldívar



3.6 Mejoramiento del Sistema Eléctrico en Colonia Lomas de Medina, Sector Medina: Consiste en el reemplazo de postes de madera en mal estado por postes nuevos de concreto, reemplazo y extensión de línea secundaria, suministro de lámparas nuevas, con un monto total de Lps.699,884.80 y un avance de ejecución del 75% con un Monto Invertido de Lps.524,913.60

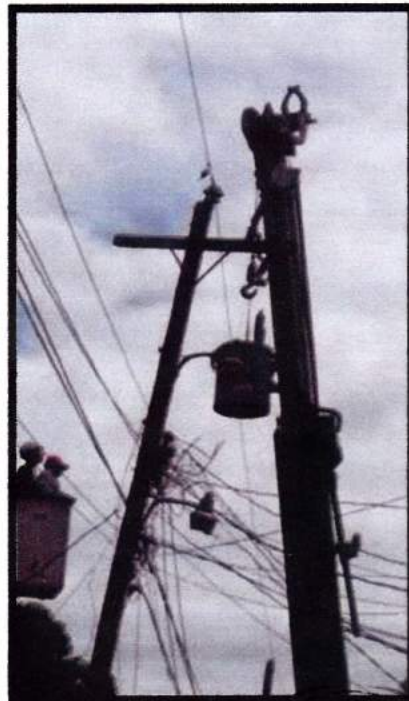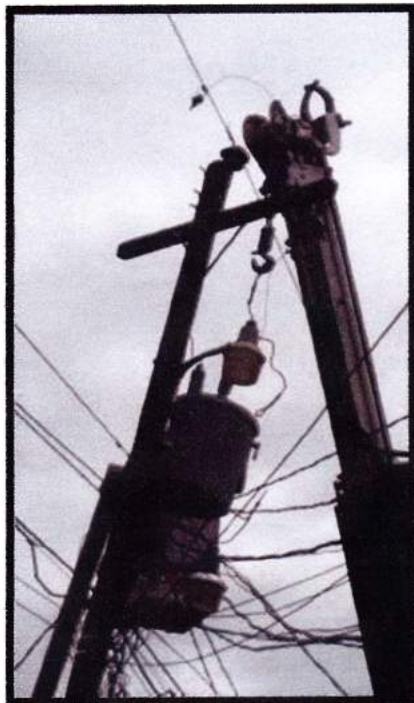

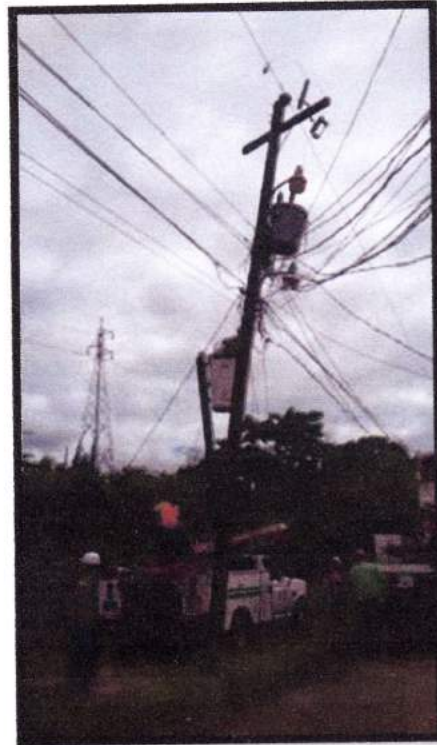


Junio 21016


 Responsable: Ing. Claudia Zaldívar



3.7 Construcción de 2 Aulas y Cerco Perimetral: Consiste la construcción de dos espacios para aulas y el cerco perimetral en los lados que colindan con la calle, con un monto total de Lps.696,165.56 y un avance de ejecución del 40% con un Monto Invertido de Lps.278,466.22

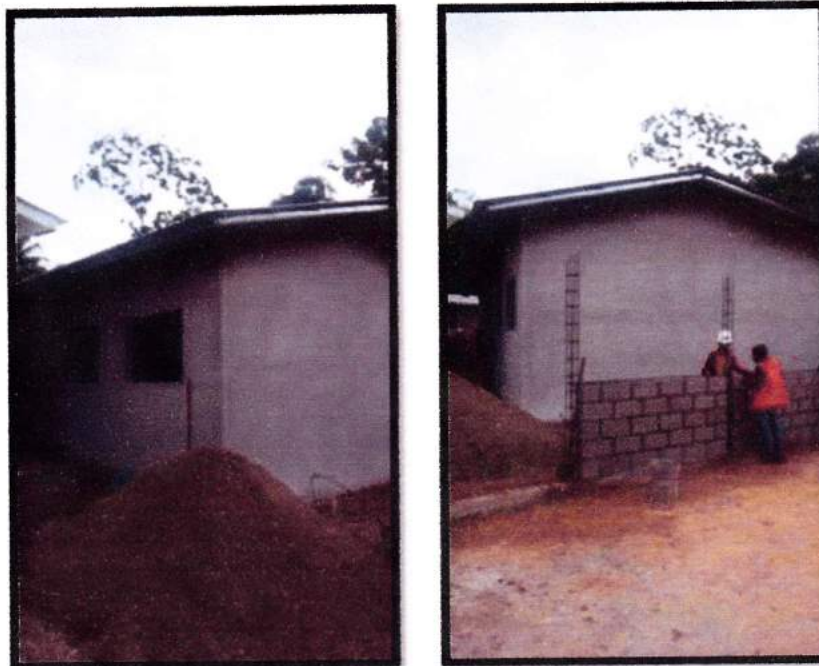


3.8 Empedrado Lomas del Puerto: Consiste en la conformación de terreno y construcción de 206.80 m² de empedrado de calle con 44.00ml de canal para drenaje de aguas lluvias, con un monto total de Lps. 237,150.60 y un avance de ejecución del 95% con un Monto Invertido de Lps.225,293.07



4 PROYECTOS RECEPCIONADOS:

4.1 Centro Social (Priorizado), Barrio Camagüey, Sector Península Este:

Consiste en la construcción de un salón de 8m de ancho por 10m de largo, con sobreelevación con bloque de concreto fundido, paredes de bloque de concreto e 6" sisado y lechado, dos baños, gradas de acceso, rampa de acceso para personas con discapacidad, techo de estructura metálica y lamina de aluzinc. Dicho proyecto tiene un monto final de Lps.649,966.10

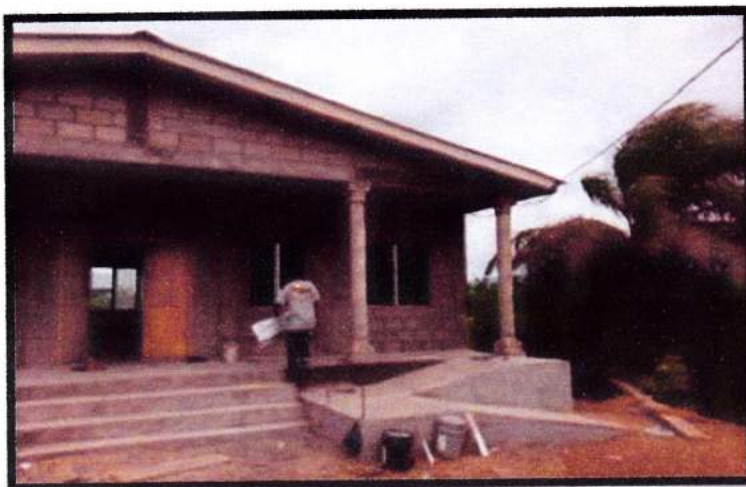

4.2 Centro Social (Priorizado), Colonia Episcopal El Record, Sector El Chile:


Consiste en la construcción de un salón de 8m de ancho por 10m de largo, con sobreelevación con bloque de concreto fundido, paredes de bloque de concreto e 6" sisado y lechado, dos baños, gradas de acceso, rampa de acceso para personas con discapacidad, techo de estructura metálica y lamina de aluzinc. Dicho proyecto tiene un monto final de Lps.618,729.65






4.3 Tumbos en Barrio El Porvenir, Sector El Porvenir: Consiste en la ampliación de los tumbos de concreto de la calle principal hacia cada uno de los carriles laterales que existen en esta vía, así como también uno ubicado en la calle del tanque. El costo total de este proyecto es de Lps. 48,696.62



4.4 Obras Complementarias a Proyecto Suministro e Instalación de Banco de Transformadores 3x75kVA, Escuela Marco Aurelio Soto, Barrio El Porvenir. Consiste en la instalación de la línea de alimentación desde el banco de transformadores a el panel principal en la escuela. Con un costo final de L.247,000.00

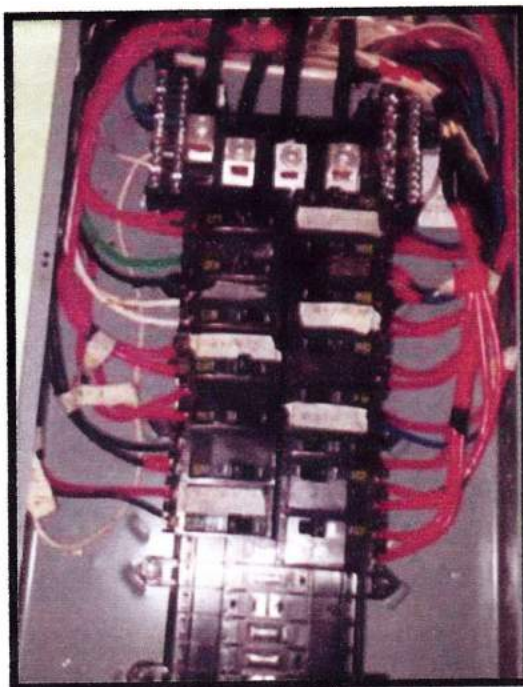

4.5 Suministro e Instalación de 126 Metros de Red Secundaria en Colonia López Bonilla, Sector Baracoa. Consiste en la instalación de 126 metros de red secundaria de dos fases con neutro, con un monto final de Lps.81,075.00

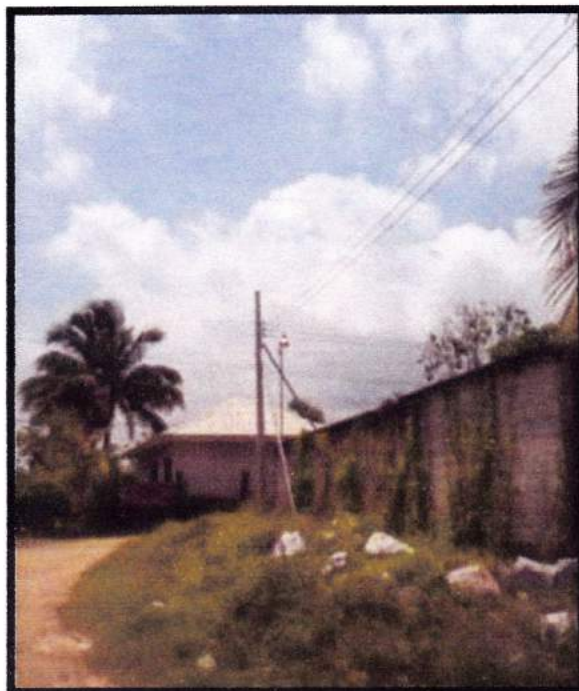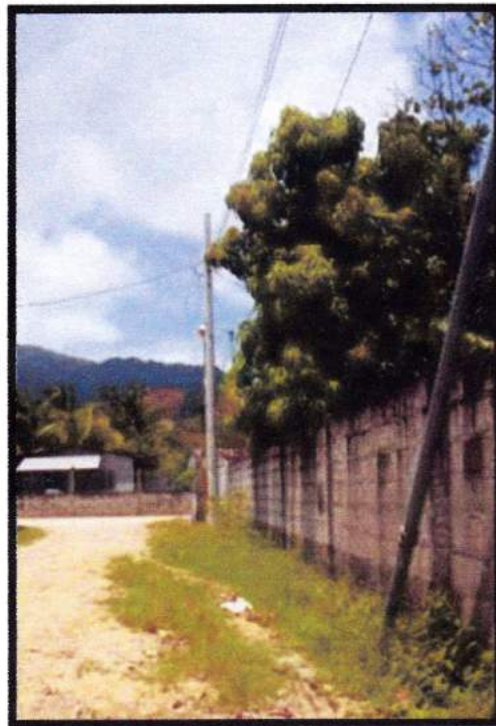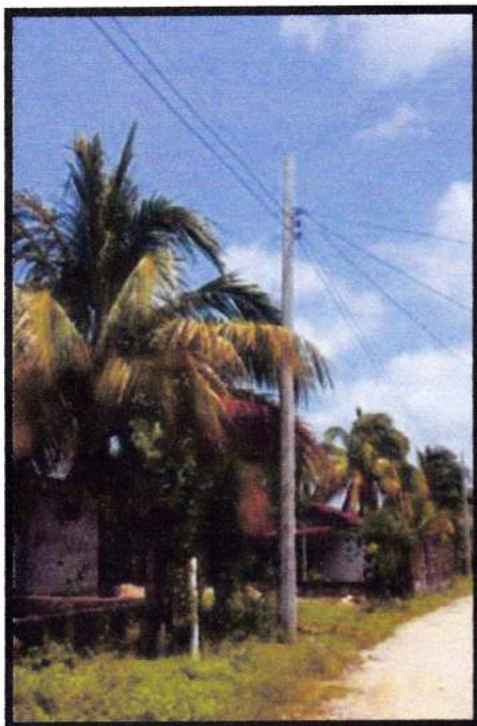

4.6 Reparación de Alumbrado Público en Barrio El Centro 2 y3 Avenida, Sector Península Oeste. Consiste en la instalación de 6 lámparas de 100 watts nuevas y la reparación de 32 lámparas en mal estado, con un monto de Lps. 56,466.20

4.7 Reparación de Alumbrado Público en Barrio Camagüey Calle 15, Sector Península Este. Consiste en la instalación de 7 lámparas de 100 watts nuevas y la reparación de 30 lámparas en mal estado, con un monto de Lps.52,822.00



5 TRABAJOS REALIZADOS POR TALLER MUNICIPAL:

5.1 Elaboración de Ataúdes para donación. Como parte de la proyección social de la Municipalidad de Puerto Cortes, se realiza la entrega de ataúdes para las personas de escasos recursos económicos las cuales no pueden costear el precio de un ataúd.

MES	NUMERO DE ATAÚDES
Junio	15
Total	15





5.2 Proyecto Pintemos de Color Nuestra Ciudad. Como parte de la proyección social de la Municipalidad de Puerto Cortes, se está llevando a cabo en colaboración con CEPUDO el proyecto "PINTANDO DE COLOR NUESTRA CIUDAD" con el cual se pretende cambiarle la cara al municipio pintando algunos edificios públicos y privados que se encuentran en el centro de la ciudad, así como también la entrada y salida de la misma. Como contraparte

municipal se está brindando la mano de obra con cuadrillas municipales y algunas herramientas y equipo básicos.

- **Centro de Salud Hernán Galeano:**



- **Iglesia Católica de Travesía:** Donde se gastaron 3 cubetas de pintura y el costo de mano de obra se estima en Lps5,000.00







6 VARIOS:

6.1 Capacitación Sobre Normas Obligatorias de Seguridad e Higiene en la Construcción en Honduras: Como parte del compromiso para mejorar la calidad de los proyectos desarrollados en el municipio y la seguridad de las personas que trabajan en ellos, la Gerencia de Planificación y Desarrollo organizó una capacitación en coordinación con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras Capitulo Noroccidental, en la cual se invitaron a los Ingenieros Civiles, Arquitectos e Inspectores que trabajan en la alcaldía y en empresas Contratistas Municipales.



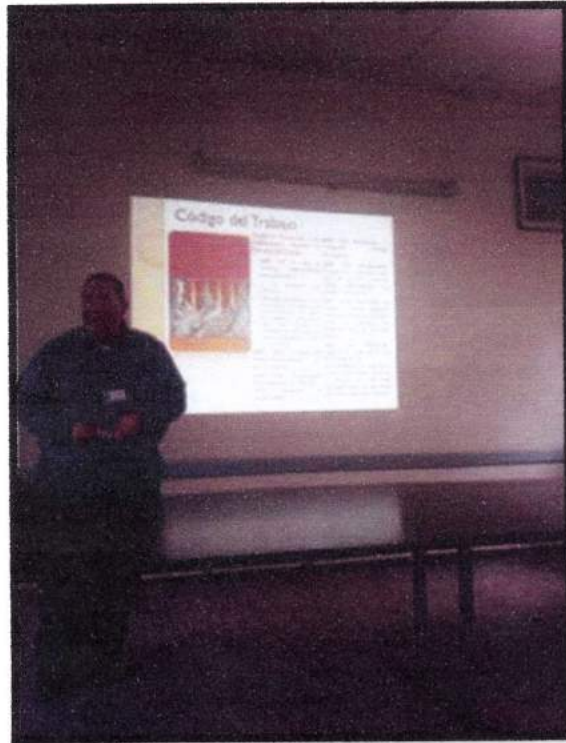

6.2 Colaboración con la Oficina de Fondos Externos en Trabajos Varios:



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES

Periodo: 01-30 de Junio del 2016

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
#20/16	Carlos Vivian Calderón	Proyecto social	Construcción de Centro Social (Priorizado)	Barrio Camagüey, sector península este	Proveer a la población de la comunidad de un lugar con las instalaciones adecuadas para un mejor desarrollo de las reuniones y eventos de la misma.	Construcción de 6.5x12.5 mts mas corredor de 1.5x12.5 mts, modulo de baño de 1.75x3 mts, con dos hiladas de sobreelevación, instalaciones eléctricas y sanitarias completas.
#26/16	Reina María Calix	Seguridad Ciudadana	Mejoramiento del Sistema Eléctrico (Priorizado)	Colonia Lomas de Medina, Sector Medina	mejorar las condiciones de la red de distribución eléctrica existente	Consiste en el mejoramiento de 224.5 metros de línea primaria de una fase , construcción de 340.5 metros de red secundaria de dos fases mas neutro sobre postes de concreto, instalación de 16 lámparas de 100 watts, 11 postes de concreto y un transformador de 75 kVA
#32/16	Dinora Ibeth Blanco	Seguridad Ciudadana	Iluminación de Cancha de Football (Priorizado)	Aldea Manacalito, Sector Ramal de Lima	Proveer iluminación adecuada para el desarrollo de actividades deportivas en horario nocturno	Consiste en la instalación de 18 reflectores de 1000 watts tipo estadio sobre postes de concreto y alimentadas por transformador de 25 kVA
#39/16	Lester Jeovany Maradiaga Davis	Seguridad Ciudadana	Mejoramiento del Sistema Eléctrico (Priorizado)	Colonia Brisas del Mar, Sector El Porvenir	mejorar las condiciones de la red de distribución eléctrica existente	Consiste en la instalación de 246.6 metros de línea primaria de una fase , construcción de 297.7 metros de red secundaria de dos fases, hilo piloto mas neutro, sobre postes de concreto, instalación de 10 lámparas de 100 watts, 10 postes de concreto

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES

Periodo: 01-30 de Junio del 2016

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
#48/16	Joel Antonio Trejo Amaya	Seguridad Ciudadana	Mejoramiento de la Red de Distribución Eléctrica	Aldea El Sofoco, Sector Tapón de Los Oros	mejorar las condiciones de la red de distribución eléctrica existente	Consiste en la extensión de 73.60 metros de línea primaria de una fase , construcción de 404.20 metros de red secundaria de dos fases mas neutro sobre postes de concreto, instalación de 15 lámparas de 100 watts, 13 postes de concreto y un transformador de 50 kVA
#51/16	David Flores Ordoñez	Seguridad Ciudadana	Suministro E Instalación De Sistema Eléctrico Industrial En Escuela Taller Municipal	Colonia Santa Clara, Sector El Chile	Proveer de sistema eléctrico adecuado para el desarrollo de las actividades industriales de la escuela.	Consiste en la instalación de cableado eléctrico y tomacorrientes para alimentación de equipo de soldadoras, herramientas eléctricas de mano, iluminación y oficinas
#53/16	Mirna Patricia Paz Madrid	Seguridad Ciudadana	Electrificación (Priorizado)	Barra De Chamelecón, Sector Garífuna	suministrar energía eléctrica en zonas que carecen del servicio para así impulsar el desarrollo de estas	Consiste en la extensión de 775 metros de línea primaria de una fase , construcción de 154 metros de red secundaria de dos fases mas neutro sobre postes de concreto, instalación de 11 lámparas de 100 watts, 11 postes de concreto y un transformador de 25 kVA
#56/16	MARTA OLGA CARDONA	Obras de Protección	Construcción de muro de contención, calle principal	Aldea San Juan Zapadril, sector zapadril	Evitar el colapso Proteger la vía principal de acceso a las comunidades, de la escorrentía natural del agua	Construcción de muro de contención de concreto ciclópeo (piedra de río ahogada en concreto) con un espesor mínimo de 30cms y un máximo de 1.3 mts.
#60/16	Olvin David Montes	Seguridad Ciudadana	Suministro e Instalación de 40 Lámparas HPS de 100 Watts	Barrio Copen, Sector Península Este	Mejorar las condiciones de alumbrado publico del sector	Consiste en la instalación de 40 lámparas de 100 watts nuevas

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES

Periodo: 01-30 de Junio del 2016

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
#64/16	Olvin David Montes	Seguridad Ciudadana	Suministro e Instalación de 38 Lámparas HPS de 100 Watts	Colonia Banderas III y Colonia 18 de Noviembre y Colonia Episcopal Suyapa II, Sector Chameleconcito	Mejorar las condiciones de alumbrado publico del sector	Consiste en la instalación de 38 lámparas de 100 watts nuevas
#67/16	Geremias David García Lobo	Seguridad Ciudadana	Suministro e Instalación de 126 Metros de Red Secundaria	Colonia López Bonilla, Sector Baracoa	Proveer de servicio de iluminación publica y sistema eléctrico de distribución	Consiste en la instalación de 126 metros de red secundaria de dos fases con neutro
#70/16	INSERCO S. de R.L.	Educación	Obras Complementarias a Proyecto Suministro e Instalación de Banco de Transformadores 3x75kVA.	Escuela Marco Aurelio Soto, Barrio El Porvenir, Sector El Porvenir.	Proveer de servicio electico las instalaciones de la escuela.	Consiste en la instalación de la línea de alimentación desde el banco de transformadores a el panel principal en la escuela.
#73/16	Heber Eduardo Acosta	Seguridad Ciudadana	Iluminación de Cancha de Football (Priorizado)	Aldea La Pita, Sector Ecoturístico.	Proveer iluminación adecuada para el desarrollo de actividades deportivas en horario nocturno	Consiste en la instalación de 14 reflectores de 1000 watts tipo estadio sobre postes de concreto y alimentadas por transformador de 25 kVA
#74/16	Sarahi Esperanza Romero Tovar	Seguridad Ciudadana	Reparación de Alumbrado Público	Colonia Kennedy, Barrio Campo Rojo, Sector Península Oeste	Mejorar las condiciones de alumbrado publico del sector	Consiste en la instalación de 8 lámparas de 100 watts nuevas y la reparación de 14 lámparas en mal estado y desmontaje de 3 postes en mal estado.
#75/16	Gladys Sofia Terreros Hernández	Seguridad Ciudadana	Reparación de Alumbrado Público	Barrio Camagüey Calle 15, Sector Península Este	Mejorar las condiciones de alumbrado publico del sector	Consiste en la instalación de 7 lámparas de 100 watts nuevas y la reparación de 30 lámparas en mal estado.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES

Periodo: 01-30 de Junio del 2016

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
#76/16	Audias Echeverría	Sector Saneamientos	Tanque para Almacenamiento de Agua de 15,000 galones	Aldea Nisperales, Sector Puente Alto	Proveer del Servicio básico de agua para consumo en cantidad a 170 familias en el área rural	Construcción de Tanque Para almacenamiento de agua de ladrillo rafon perforado, hipoclorador, caja de válvulas, tuberías, accesorios y bomba de 5HP
#80/16	Reina María Calix	Seguridad Ciudadana	Reparación de Alumbrado Público	Lomas del Puerto, Sector Medina	Mejorar las condiciones de alumbrado publico del sector	Consiste en la instalación de 25 lámparas de 100 watts nuevas
#82/16	Enguelberth Burgos Rivera	Seguridad Ciudadana	Reparación de Alumbrado Público	El Cangrejal, Barrio Cienaguita, Sector El Porvenir	Mejorar las condiciones de alumbrado publico del sector	Consiste en la instalación de 7 lámparas de 100 watts nuevas y la reparación de 27 lámparas en mal estado.
#86/16	Jorge Adalberto Martínez	Seguridad Ciudadana	Reparación de Alumbrado Público	Barrio San Ramón desde 6 a 9 Avenida, Sector Península Oeste	Mejorar las condiciones de alumbrado publico del sector	Consiste en la instalación de 9 lámparas de 100 watts nuevas y la reparación de 34 lámparas en mal estado.
	María Haydee Quiroz Villalvir	Red vial	Empedrado de 150ml, Gracias a Dios, Sector Puente Alto (Priorizado)	Gracias a Dios, Sector Puente Alto	Proveer a la comunidad de mejores calles, reduciendo considerablemente la reparación de estas.	Construcción de pavimento tipo empedrado con un espesor de 20cms, un total de 1050 m2 .
	Jorge Adalberto Martínez	Seguridad Ciudadana	Reparación de Alumbrado Público	Barrio El Centro 2 y3 Avenida, Sector Península Oeste	Mejorar las condiciones de alumbrado publico del sector	Consiste en la instalación de 6 lámparas de 100 watts nuevas y la reparación de 32 lámparas en mal estado.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION/ ELABORACION DE PROYECTO DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES

Periodo: 01-30 de Junio del 2016

Item	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Presupuesto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
#20/16	proveer de un espacio físico para la realización de reuniones o eventos de la comunidad	No aplica	Debido a que se exige una compactación, estos son mínimos.	Carlos Vivian Calderon 32378261	L. 640,432.10	Fondos Municipales	8 de Abril de 2016	100%	L. 649,966.10	25 de Junio de 2016
#26/16	mejora la calidad de voltaje suministrado a las viviendas del sector, evitando daños a equipos eléctricos.	NO APLICA	NO APLICA	Reina María Calix 31554123	L. 699,884.80	Municipalidad de Puerto Cortés	22 de Abril del 2016	80%	L. 699,884.80	10 de Julio de 2016
#32/16	Permite el desarrollo de actividades deportivas en horas de la noche.	NO APLICA	NO APLICA	Dinora Ibeth Blanco	L. 633,516.00	Municipalidad de Puerto Cortés	26 de Abril del 2016	100%	L. 633,516.00	10 de Junio del 2016
#39/16	mejora la calidad de voltaje suministrado a las viviendas del sector, evitando daños a equipos eléctricos.	NO APLICA	NO APLICA	Lester Jeovany Maradiaga Davis	L. 636,762.70	Municipalidad de Puerto Cortés	28 de Abril del 2016	85%	L. 636,762.70	15 de Julio de 2016
#48/16	mejora la calidad de voltaje suministrado a las viviendas del sector, evitando daños a equipos eléctricos.	NO APLICA	NO APLICA	Joel Antonio Trejo Amaya	L. 560,203.00	Municipalidad de Puerto Cortés	12 de Mayo del 2016	100%	L. 616,132.00	16 de Junio del 2016
#51/16	permite la coexion a l suministro de energía electrica de forma adecuada y segura de los equipos eléctricos utilizados para la enseñanza de las diferentes disciplinas tecnicas	NO APLICA	NO APLICA	David Flores Ordoñez 99972899	L. 0.00	Municipalidad de Puerto Cortés		100%	L. 0.00	17 de Junio del 2016



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION/ ELABORACION DE PROYECTO DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES

Periodo: 01-30 de Junio del 2016

Item	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Presupuesto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
#53/16	Mejora las condiciones de vida de los pobladores al contar con un servicio tan importante como lo es la energía eléctrica	NO APLICA	NO APLICA	Mirna Patricia Paz Madrid	L. 528,025.00	Municipalidad de Puerto Cortés	12 de Mayo del 2016	90%	L. 528,025.00	2 de Julio de 2016
#56/16	Proteger la vía principal de acceso a las comunidades, Evitando el colapso y la rehabilitación de esta.	Protección de laderas, taludes del borde de la calle.	Debido a que se exige una compactación, estos son mínimos.	MARTA OLGA CARDONA 32053729	L. 369,714.83	Fondos Municipales	20 de Mayo del 2016	97%	L. 369,714.83	10 de Septiembre de 2016
#60/16	Mejorar las condiciones de alumbrado público para brindar mayor seguridad a los habitantes	NO APLICA	NO APLICA	Olvin David Montes	L. 0.00	Municipalidad de Puerto Cortés		100%	L. 0.00	17 de Junio del 2016
#64/16	Mejorar las condiciones de alumbrado público para brindar mayor seguridad a los habitantes	NO APLICA	NO APLICA	Olvin David Montes	L. 0.00	Municipalidad de Puerto Cortés		100%	L. 0.00	15 de Junio del 2016
#67/16	Mejora del alumbrado público y los niveles de voltaje para los habitantes	NO APLICA	NO APLICA	Gemias David García Lobo	L. 81,075.00	Municipalidad de Puerto Cortés	20 de Mayo del 2016	100%	L. 81,075.00	03 de Junio del 2016
#70/16	Mejorar los niveles de voltaje en la escuela, para el correcto funcionamiento de los equipos eléctricos instalados	NO APLICA	NO APLICA	INSERCO S. de R.L.	L. 247,000.00	Municipalidad de Puerto Cortés	26 de Mayo del 2016	100%	L. 247,000.00	03 de Junio del 2016
#73/16	Permite el desarrollo de actividades deportivas en horas de la noche.	NO APLICA	NO APLICA	Heber Eduardo Acosta	L. 397,704.15	Municipalidad de Puerto Cortés		100%	L. 436,464.66	23 de Junio del 2016
#74/16	Mejorar las condiciones de alumbrado público para brindar mayor seguridad a los habitantes	NO APLICA	NO APLICA	Sarahi Esperanza Romero Tovar	L. 43,288.00	Municipalidad de Puerto Cortés	26 de Mayo del 2016	100%	L. 43,288.00	10 de Junio del 2016

Ing. Claudia Zaldivar
Jefe de Mantenimiento Municipal
y Proyectos Menores




MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION/ ELABORACION DE PROYECTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES

Periodo: 01-30 de Junio del 2016

Item	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Presupuesto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
#75/16	Mejorar las condiciones de alumbrado publico para brindar mayor seguridad a los habitantes	NO APLICA	NO APLICA	Gladys Sofía Terreros Hernández	L. 52,822.00	Municipalidad de Puerto Cortés		100%	L. 52,822.00	07 de Junio del 2016
#76/16	Abastecer aproximadamente 170 familias de agua potable.	NO APLICA	Debido al terreno se realiza un mejoramiento de suelo con piedra, laja y material selecto	Audias Echeverria, +504 9929-7011	L. 658,297.10	Fondos Municipales	20 de Mayo del 2016	50%	L. 658,297.10	28 de Agosto de 2016
#80/16	Mejorar las condiciones de alumbrado publico para brindar mayor seguridad a los habitantes	NO APLICA	NO APLICA	Reina María Calix 31554123	L. 69,148.75	Municipalidad de Puerto Cortés		100%	L. 69,148.75	16 de Junio del 2016
#82/16	Mejorar las condiciones de alumbrado publico para brindar mayor seguridad a los habitantes	NO APLICA	NO APLICA	Enguelberth Burgos Rivera	L. 0.00	Municipalidad de Puerto Cortés		100%	L. 0.00	21 de Junio del 2016
#86/16	Mejorar las condiciones de alumbrado publico para brindar mayor seguridad a los habitantes	NO APLICA	NO APLICA	Jorge Adalberto Martínez 98007224	L. 64,114.10	Municipalidad de Puerto Cortés		100%	L. 64,114.10	23 de Junio del 2016
	Mejora el acceso a la comunidad, y reduce las reparaciones y daños de esta, evita los acumulamientos de agua y lodo.	No aplica	Debido a que se exige una compactación, estos son minimos.	Maria Haydee Quiroz Villalvir 98889807	L. 673,150.00	Fondos Municipales	16 de Julio de 2015	98%	L. 673,150.00	28 de Julio de 2016
	Mejorar las condiciones de alumbrado publico para brindar mayor seguridad a los habitantes	NO APLICA	NO APLICA	Jorge Adalberto Martínez 98007224	L. 56,466.20	Municipalidad de Puerto Cortés		100%	L. 56,466.20	07 de Junio del 2016




MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES

Periodo: 01-30 de Junio del 2016

CÓDIGO #48/16 -Mejoramiento de la Red de Distribución Eléctrica, Aldea El Sofoco, Sector Tapon de Los Oro
adenda, cambio en el valor del contrato. - L.55,929.00

RAZONES

A petición de los vecinos de la comunidad se decide ampliar el proyecto en el cual se reutilizaran las estructuras y cables existentes para la reubicación del sistema de red secundaria.

CÓDIGO #73/16 -Iluminación de Cancha de Football (Priorizado), Aldea La Pita, Sector Ecoturistico
adenda, cambio en el valor del contrato. - L.38,760.51

RAZONES

Debido a las condiciones de lugar y el tamaño de los postes, se requiere el uso de grúa para la instalacion del transformador y la movilizacion e hincado de los postes en el sitio. Las retenidas R-1 y R-5T fueron instaladas a peticion de la ENEE para mejorar la estabilidad mecanica del proyecto.
