

2016

INFORME MENSUAL MARZO



MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y
PROYECTOS MENORES
MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES
RESPONSABLE: ING. CLAUDIA ZALDIVAR

INDICE

CONTENIDO	Nº PAG.
1. PROYECTOS PRESUPUESTADOS.....	2
2. PROYECTOS EN EJECUCION.....	4
3. PROYECTOS RECEPCIONADOS.....	6
4. TRABAJOS REALIZADOS POR TALLER MUNICIPAL	12



1. PROYECTOS PRESUPUESTADOS:

1.1 Educación:

Nº	PROYECTO	COMUNIDAD	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Suministro e Instalación de Ventanas de Celosía en Esc San José Brisas	Aldea San José Brisas, Sector Calan	–	En proceso de Aprobación.
2	Sistema Eléctrico en de Escuela Dionisio Herrera	Aldea El Chile, Sector El Chile	–	En proceso de Aprobación.
TOTAL PROYECTOS DE EDUCACION				–

1.2 Red Vial:

Nº	PROYECTO	COMUNIDAD	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Construcción de muro de contención (Emergencia)	Calle Principal de Aldea San Juan Zapadril, Sector Zapadril	–	En proceso de Aprobación.
2	Empedrado de 164 ml, canales de bloque y cruce de calle	Aldea Las Delicias, Sector Las delicias	–	En proceso de Aprobación.
TOTAL PROYECTOS DE RED VIAL				–

1.3 Fortalecimiento del Desarrollo y Cohesión Social:

Nº	PROYECTO	COMUNIDAD	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Reparación en Centro Social y Construcción de Baño	Aldea Campana, Sector Campana	–	En proceso de Aprobación.
2	Construcción Centro Social (Priorizado)	Colonia Primero de mayo	–	En proceso de Aprobación.
TOTAL PROYECTOS DE FROTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y COHESION SOCIAL				–

Marzo 2016



Responsable: Ing. Claudia Zaldívar



2

1.4 Seguridad Ciudadana:

Nº	PROYECTO	COMUNIDAD	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Construcción de Sistema Eléctrico de Residencial del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Puerto Cortes, III Etapa	Barrio Rio Mar, Sector El Porvenir	—	En proceso de Aprobación.
2	Electrificación (Priorizado)	Barra de Chamelecón, Sector Garifuna	—	En proceso de Aprobación.
3	Extensión de 76 mts de red de distribución eléctrica primarias 1f mejoramiento de 129 mts de red primaria 3f y 720 metros de secundaria	Callejón el Rastro, Barrio El Porvenir	—	En proceso de Aprobación.
4	Sistema Eléctrico en Escuela Dionisio de Herrera	Aldea El Chile, Sector El Chile	—	En proceso de Aprobación.
TOTAL PROYECTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA				—

Nota: Los proyectos que no tienen un monto de contrato, están a nivel de presupuesto base.

Marzo 2016


Responsable: Ing. Claudia Zaldívar



3

2. PROYECTOS EN EJECUCION:

2.1 Construcción de Galera en Escuela Francisco Morazan, Aldea Bajamar, Sector Garifuna: Consiste en la Construcción de galera con cimiento corrido de concreto armado, sobreelevación, solera inferior, superior, piso de concreto, techo con estructura de madera y laminas de aluzinc con un monto Total de Lps. 387,302.31 y actualmente tiene un avance de obra de un 40% lo que nos da un monto invertido de :Lps. 154,920.09 hasta el momento.

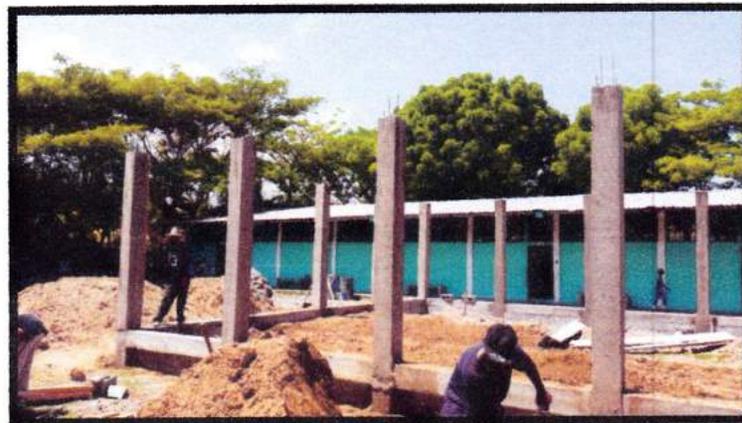

2.2 Construcción de Centro Social, Aldea Nola, Sector Ramal de Lima: Con un Monto de L. 649,322.86. Consiste en la construcción de un salón de 8m de ancho por 10m de largo, con sobreelevación con bloque de concreto fundido, paredes de bloque de concreto e 6" sisado y lechado, dos baños, gradas de acceso, rampa de acceso para personas con discapacidad, techo de estructura metálica y lamina de aluzinc. Con un 10% de ejecución equivalente a un monto de Lps.64,932.29



3 PROYECTOS RECEPCIONADOS:

3.1 Jardín de Niños Gladys Ondina Jhonson (Priorizado), Aldea Banderas Tres, Sector Chameleconcito: Consiste en la construcción de un salón de clases para jardín de niños con paredes de bloques de concreto de 6" repelladas, pulidas y pintadas, estructura de techo metálica y cubierta de techo con lamina de aluzinc, cielo falso de tablayeso, piso de cerámica, cerco perimetral, aula para centro de tecnología infantil, bodega, base para tanque de almacenamiento de agua, tanque de almacenamiento de agua, dos sanitarios, área de juego, rampa de acceso a centro educativo. Dicho proyecto se hizo con contraparte de la fundación Ficohsa siendo el monto total invertido por la Municipalidad de Lps.477,151.62





3.2 Terminación de Construcción de Bodega para usos Múltiples en Platel de Taller de Carpintería, Barrio La Curva, Sector Península Oeste: Con Un Monto de Lps.71,584.10; Consiste en la construcción de área para colocación de ataúdes con estructura de metálica, techo de aluzinc y paredes de panelit, construcción de área para vestidores con paredes de panelit, techo de estructura ,metálica y cubierta de aluzinc, piso de concreto pulido, suministro e instalación de sanitario, instalaciones eléctricas en bodegas y vestidores.



Marzo 2016

Responsable: Ing. Claudia Zaldívar



7

3.3 Reparación de Canales, Suministro de Tapaderas en Calles Aledañas a Playa Municipal, Barrio El Porvenir, Sector El Porvenir: Consiste en la demolición de paredes de canal pluvial en mal estado, reconstrucción de canales pluviales, remoción de tapaderas en mal estado, construcción y colocación de tapaderas nuevas. Con un monto total de Lps.60,064.00

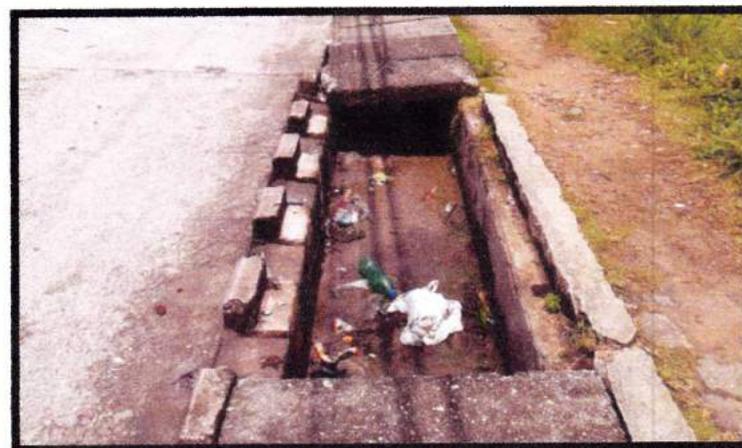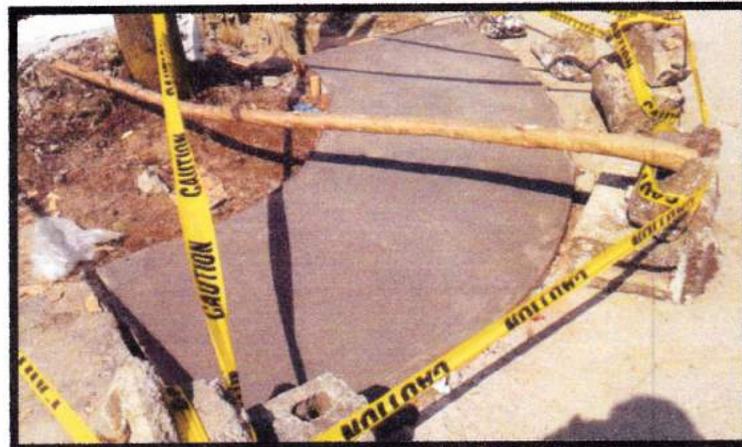


3.4 Reparación de Aceras de Concreto en Calle Frente a Playa Municipal, Barrio El Porvenir, Sector El Porvenir: Consiste en la demolición de aceras en mal estado, mejoramiento de suelo, fundición de aceras con concreto simple. Con un monto final de Lps. 80,419.04



3.5 Reparación de Aceras de Adoquines en La Playa Municipal, Barrio El Porvenir, Sector El Porvenir: Consiste en la remoción de adoquines, limpieza y mejoramiento de suelo, reinstalación de adoquines. Con un monto Total de Lps.59,122.4



3.6 Reparación de Torres Guardavidas y Construcción de Bases para Cadenas en Playas Municipales, Barrio El Porvenir y Barrio Cienaguita, Sector El Porvenir: Consiste en el cambio de laminas de techo, reparación de elementos de tubo HG, construcción de pedestales de concreto, fijación de torres en pedestales, construcción de bases de concreto armado, pintura de bases, suministro e instalación de cadenas. Con un monto total de Lps.46,553.00

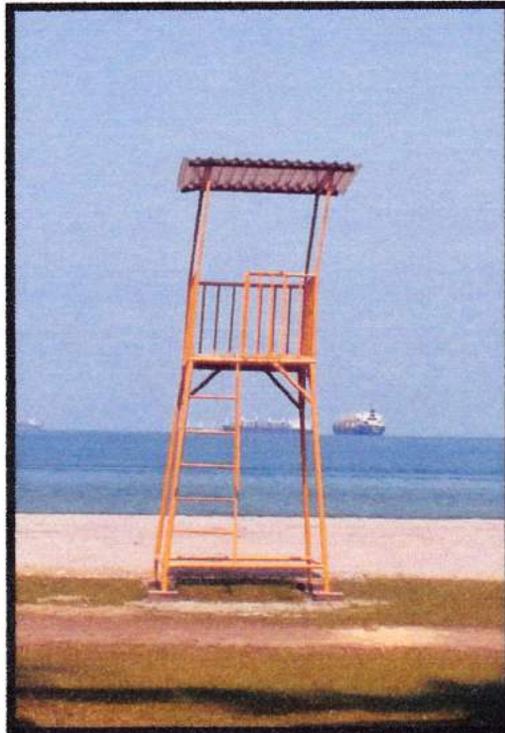

4 TRABAJOS REALIZADOS POR TALLER MUNICIPAL:

4.1 Elaboración de Ataúdes para donación.

Como parte de la proyección social de la Municipalidad de Puerto Cortes, se realiza la entrega de ataúdes para las personas de escasos recursos económicos las cuales no pueden costear el precio de un ataúd.

Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo treinta seis se entregaron ataúdes.

MES	NUMERO DE ATAÚDES
Marzo	16
Total	16




4.2 Proyecto Pintemos de Color Nuestra Ciudad.

Como parte de la proyección social de la Municipalidad de Puerto Cortes, se está llevando a cabo en colaboración con CEPUDO el proyecto "PINTANDO DE COLOR NUESTRA CIUDAD" con el cual se pretende cambiarle la cara al municipio pintando algunos edificios públicos y privados que se encuentran en el centro de la ciudad, así como también la entrada y salida de la misma. Como

contraparte municipal se está brindando la mano de obra con cuadrillas municipales y algunas herramientas y equipo básicos.

- **Parque Central:** Donde se gastaron 3 cubetas de pintura y el costo de mano de obra se estima en Lps5,000.00

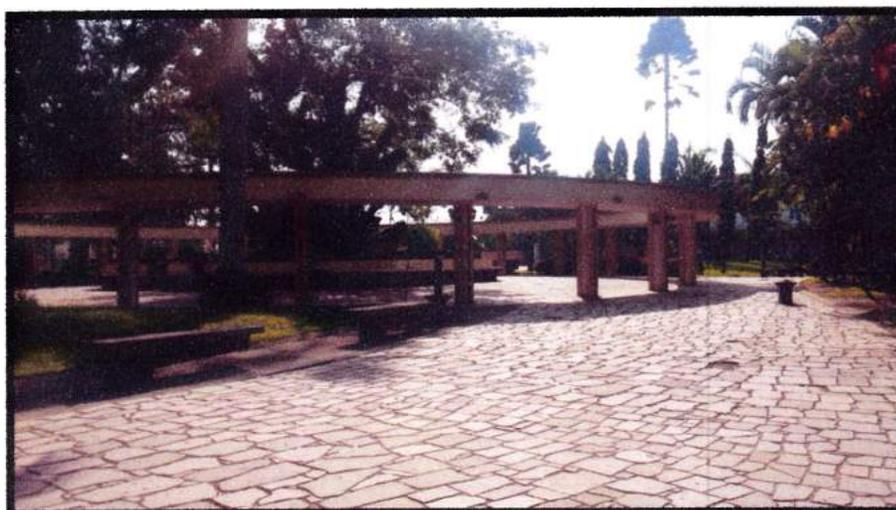



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES

Periodo: 01-31 de Marzo del 2016

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
#8/16	Diana Isolda Flores	Edificaciones de Bienes Municipales	Terminación de Construcción de Bodega para usos Varios en Plantel de Carpintería Municipal	Barrio La Curva, Sector Península Oeste	Tener un lugar donde poder almacenar todos los materiales utilizados por el departamento de turismo en las diferentes actividades que realizan en el año, tener un espacio para almacenar los ataúdes que se construyen en el taller de carpintería, contar con un lugar para que se cambie el personal de cuadrilla	Construcción de área para colocación de ataúdes con estructura de metálica, techo de aluzinc y paredes de panelit, construcción de área para vestidores con paredes de panelit, techo de estructura ,metálica y cubierta de aluzin, piso de concreto pulido, suministro e instalación de sanitario, instalaciones eléctricas en bodegas y vestidores.
#9/16	Santos Miguel Villanueva	Drenaje Pluvial	Reparación de Canales, Suministro de Tapaderas en calles Aledañas a Playa Municipal	Barrio El Porvenir, Sector El Porvenir	Mejorar la infraestructura del canal y dar mayor seguridad a los peatones de la zona suministrando las tapaderas para el canal	Demolición de paredes de canal pluvial en mal estado, reconstrucción de canales pluviales, remoción de tapaderas en mal estado, construcción y colocación de tapaderas nuevas.
#10/16	Jesser Magdiel Escobar	Red Vial	Reparación de Aceras de Concreto en calle frente a Playa Municipal	Barrio El Porvenir, Sector El Porvenir	Mejorar la infraestructura de las aceras peatonales frente a la playa municipal	Demolición de aceras en mal estado, mejoramiento de suelo, fundición de aceras con concreto simple.
#13/16	Jorge Adalberto Martínez	Red Vial	Reparación de Aceras de Adoquines en calle frente a Playa Municipal	Barrio El Porvenir, Sector El Porvenir	Mejorar la infraestructura de las aceras peatonales frente a la playa municipal	Remoción de adoquines, limpieza y mejoramiento de suelo, reinstalación de adoquines.




MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES

Periodo: 01-31 de Marzo del 2016

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
#15/16	Santos Mártir Zelaya	Edificaciones de Bienes Municipales	Reparación de torres guardavidas y construcción de bases para cadenas en playas municipales	Barrio El Porvenir y Barrio Cienaguita, Sector El Porvenir	Asegurar las torres en un lugar fijo en playas municipales, evitar el ingreso de vehículos a la playa	Cambio de laminas de techo, reparación de elementos de tubo HG, construcción de pedestales de concreto, fijación de torres en pedestales, construcción de bases de concreto armado, pintura de bases, suministro e instalación de cadenas
#16/16	Roberto Crespo Montalván	Educación	Construcción de Galera en Escuela Francisco Morazán	Aldea Bajamar, Sector Garifuna	Proveer de un espacio físico para diversas actividades escolares.	Construcción de galera con cimienta corrido de concreto armado, sobreelevación, solera inferior, superior, piso de concreto, techo con estructura de madera y laminas de aluzinc
#18/16	Sergio Cardona	Proyectos Sociales	Construcción Centro Social	Aldea Nola, Sector Ramal de Lima	Proveer un área donde los vecinos puedan realizar diversas reuniones o eventos para beneficio de la comunidad	Construcción de Centro Social de 8x12m con bloque de concreto sisado, techo con canaleta y lamina de aluzinc, incluye corredor y 2 servicios sanitarios con fosa séptica

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION/ ELABORACION DE PROYECTO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES
 Periodo: 01-31 de Marzo del 2016

Item	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Presupuesto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
#8/16	Proveer un lugar adecuado para el acondicionamiento de materiales y estructuras utilizadas por el Departamento Municipal de Turismo, proveer al personal de cuadrillas un lugar adecuado para cambiarse, almacenar los ataúdes de manera mas ordenada y en donde esten mas protegidos.	NO APLICA	NO APLICA	Diana Isolda Flores, 98081667	L. 71,584.10	Municipalidad de Puerto Cortes	18 de Febrero de 2016	100%	L. 71,584.10	23 de Marzo de 2016
#9/16	Optimizar el drenaje de aguas pluviales y brindar mayor seguridad a los peatones con el suministro de tapaderas para el canal	Evitar que las aguas circulen por la calle	NO APLICA	Santos Miguel Villanueva	L. 56,297.80	Municipalidad de Puerto Cortes	8 de Marzo de 2016	100%	L. 60,064.00	20 de Marzo de 2016
#10/16	Proporcionar a los peatones aceras en optimas condiciones para su circulacion	NO APLICA	NO APLICA	Jesser Magdiel Escobar	L. 80,419.04	Municipalidad de Puerto Cortes	8 de Marzo de 2016	100%	L. 80,419.04	20 de Marzo de 2016
#13/16	Proporcionar a los peatones aceras en optimas condiciones para su circulacion	NO APLICA	NO APLICA	Jorge Adalberto Martinez, 9800-7224	L. 55,090.46	Municipalidad de Puerto Cortes	15 de marzo del 2016	100%	L. 59,122.40	26 de Marzo de 2016




MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION/ ELABORACION DE PROYECTO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES
 Periodo: 01-31 de Marzo del 2016

Item	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Presupuesto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
#15/16	Proporcionar al personal de rescate acuatico un lugar con las mejores condiciones para vigilar la playa, dar mayor seguridad a las personas evitando que los vehiculos ingresen a la playa	NO APLICA	NO APLICA	Santos Martir Zelaya, 99947582	L. 42,368.00	Municipalidad de Puerto Cortes	15 de marzo del 2016	100%	L. 46,553.00	19 de Marzo de 2016
#16/16	Proveer de un espacio fisico para diversas actividades escolares.	NO APLICA	NO APLICA	Roberto Crespo Montalvan	L. 387,302.31	Municipalidad de Puerto Cortes	15 de marzo del 2016	40%	L. 398,049.74	01 de mayo del 2016
#18/16	Proveer un lugar para reuniones y diversos eventos.	NO APLICA	NO APLICA	Sergio Cardona, +504 3324-5563	L. 649,322.86	Municipalidad de Puerto Cortes	8 de Marzo de 2016	10%	L. 649,322.86	19 de Mayo de 2016




**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO**

**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES**

Periodo: 01-31 de Marzo del 2016

CÓDIGO #9/16- Reparación de Canales, Suministro de Tapaderas en calles Aledañas a Playa Municipal, Barrio El Porvenir, Sector El Porvenir

Orden de cambio No. 1 , Valor Negativo -L. 3,866.20

RAZONES

A solicitud de los vecinos del sector se realiza ampliacion del acceso de entrada a callejon.

CÓDIGO #13/16 - Reparacion de Aceras de Adoquines en calle frente a Playa Municipal, Barrio El Porvenir, Sector El Porvenir

Orden de cambio No. 1 , Valor Negativo -L. 4,031.94

RAZONES

Al momento de realizar las reparaciones se observa que existen adoquines en mal estado, por lo cual es necesaria la sustitucion de los mismos.

CÓDIGO #15/16 - Reparacion de torres guardavidas y construccion de bases para cadenas en playas municipales, Barrio El Porvenir, Sector El Porvenir

Orden de cambio No. 1 , Valor Negativo -L. 4,185.00

RAZONES

Se decide cambiar el piso de las torres por madera de 2x6 para darle una mayor resistencia.

CÓDIGO #16/16 - Construccion de Galera en Escuela Francisco Morazan, Aldea Bajamar, Sector Garifuna

Orden de cambio No. 1 , Valor Negativo -L. 10,747.43

RAZONES

Debido al material existente en el terreno se ve la necesidad de mayor excavacion y relleno para la construccion de la galera.

