



Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión

Informe del Estatus de la Cartera de Proyectos Ejecutados por la SAG

Julio, 2023

Presentación

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero de los Proyectos de Inversión Pública, correspondientes al 31 de julio del año 2023.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2023, Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026 y las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP); disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este informe tiene como propósito suministrar información oportuna, que facilite la toma de decisiones por parte de las autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, además de mostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los proyectos.



Orlando Lara Pineda
Director Ejecutivo UPEG

Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 del 17 de diciembre de 1996 de conformidad a lo establecido en la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA).

El objetivo general de la SAG es la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas relacionadas con la producción, conservación y comercialización de alimentos. La SAG impulsa procesos que permiten agregar valor para contribuir a la reducción de la pobreza y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, respondiendo a una economía globalizada y a las necesidades del mercado interno; integrado en un esquema de desarrollo humano, social, ambiental y productivo basado en la autogestión, la participación comunitaria con enfoque de género y el manejo sostenible de los recursos.

Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados estratégicos y lineamientos de política, se basan en la promoción de un modelo económico alternativo orientado a fortalecer el rol del Estado en la economía, especialmente en las áreas estratégicas y servicios públicos, y la formulación y ejecución de políticas públicas dirigidas a fortalecer los diferentes tipos de empresas y de propiedad: Estatal, Mercantil/Privada y Social, como las cooperativas, cajas rurales y los emprendimientos solidarios. En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel:

- a) Ejercer acciones como coordinadora del sector público agroalimentario;
- b) Atender las funciones institucionales específicas; y,
- c) Representar al sector agroalimentario nacional a escala regional e internacional.

Resumen Ejecutivo

Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 8 proyectos:


Progr	No. Proyecto	Nombre del Proyecto
11	07	Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)
22	05	Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Suroccidental de Honduras (PROLENCA).
22	13	Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE).
22	14	Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente).
22	15	Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II)
23	01	Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras.
23	02	Proyecto de Abastecimiento de Agua Urbana
23	03	Alianza Para Corredor Seco (USAID-GAFSP) (PROSASUR)

Estos proyectos son financiados con fondos Nacionales, y fondos externos del BCIE, OFID, FIDA, BM, y BID; mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores. En su conjunto los proyectos de inversión cuentan con un presupuesto vigente de **L 1,552,056,235.00** representando un **23.24%** del presupuesto total de la institución. Para el mes de julio los proyectos de inversión reflejan una ejecución de **L 3,039,400.83** y una ejecución acumulada anual al 31 de julio 2023 de **L 205,157,087.02**.

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)**

FUENTE	Proyectos de Inversión Pública		
	Presupuesto Vigente	Ejecución Julio	Ejecución acumulada al 31 de Julio
Fuente 11: Fondos Nacionales	29,154,981.00	458,357.45	3,678,065.09
Fuente 21: Crédito Externo	1,455,508,329.00	2,289,770.64	199,839,439.51
BCIE	184,941,961.00	1,315,621.96	9,945,912.02
OFID	48,368,894.00	-	48,368,894.00
FIDA	183,618,607.00	974,148.68	141,524,633.49
BM	908,822,945.00	-	-
BID	129,755,922.00	-	-
Fuente 22: Donaciones Externas	67,392,925.00	291,272.74	1,639,582.42
	1,552,056,235.00	3,039,400.83	205,157,087.02

Fuente: SIAFI

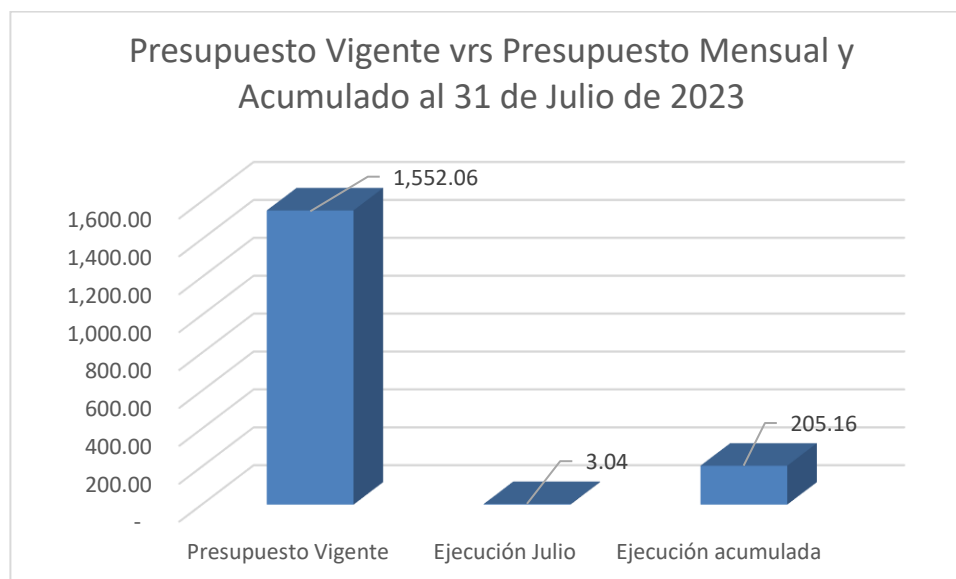

1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) – 11.07

Objetivo: Contribuir a reducir la pobreza y la pobreza extrema en las zonas rurales atendidas. De acuerdo con la problemática analizada en las zonas de influencia del proyecto este contribuirá a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema de acuerdo a los valores que se encuentren en la línea de base. Específicamente se contribuirá a: i) que el sector económico de agricultura, caza, pesca, silvicultura y ganadería tenga incrementos anuales; ii) reducir la tasa de desempleo abierto en el área rural; y iii) reducir la tasa de desnutrición infantil.

Descripción del proyecto: El Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) ejecutará cuatro subproyectos que se detallan a continuación:

1. Construcción y rehabilitación del Sistema de Riego de San Sebastián.
2. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Selguapa.
3. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Sulaco.
4. Diseño y construcción de Pequeño Riego.

El programa beneficiará a 3,371 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 8,476 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.1,118,047,750.00.

El Proyecto inició el 30/11/2013 y su fecha de finalización es el 30/11/2019. Es relevante destacar que se ha autorizado una ampliación por 24 meses adicionales, hasta el 29/11/2021, mediante la Resolución N°.PRE-99/2019 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que determina el plazo para el retiro de la totalidad de los fondos del préstamo N° 2101 otorgado a la Republica de Honduras para financiar la ejecución del Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), mediante Resolución N°. DI-89/2012.

Es oportuno mencionar que se ha dado una nueva ampliación a la ejecución del Proyecto mediante Resolución de Directorio No. DI-160/2021, del 18 de noviembre de 2021, que autorizó una ampliación hasta el 29 de noviembre del 2023 para el retiro de la totalidad de los fondos del préstamo No. 2101.

Localización: La zona de intervención del proyecto es en los departamentos de Comayagua y Yoro.

A continuación, se detallan los avances financieros y físicos del mes de julio, 2023:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Julio						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Julio	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	17,216,651.00	17,216,651.00	94,406.50	0.55	1,389,907.39	8.07	15,826,743.61
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	184,941,961.00	184,941,961.00	1,315,621.96	0.71	9,945,912.02	5.38	174,793,548.98
Total	202,158,612.00	202,158,612.00	1,410,028.46	0.70	11,335,819.41	5.61	190,620,292.59

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023

PDABR

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Julio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Julio	Ejecutado a Julio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Julio	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Nuevas Hectáreas de tierra agrícola con acceso a riego, en parcelas de los productores y productoras.	Hectárea	0	0	0	1,350	1300	96.3
	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en parcelas de productores / as.	Hectárea	0	0	0	38	0	0
	Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas en parcelas de los productores / as.	Hectárea	0	0	0	272	0	0
	Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales en parcelas de tierra agrícola de los productores/as.	Hectárea	0	0	0	38	0	0
	Constituidos los productores y productoras en grupos empresariales, de acuerdo a la producción agrícola.	Documento	0	0	0	10	0	0
	Planes de producción aprobados y entregados a grupos empresariales de productores y productoras organizados.	Plan	0	0	0	5	0	0
	Planes de ordenamiento y manejo de los recursos naturales de las subcuencas Tascalapa, Siguapa, Maralito, Olomán, Cuyamapa, Selguapa y Jupura, socializado con las asociaciones de regantes, alcaldías municipales y actores claves de la gestión ambiental.	Plan de Manejo Ambiental	1	0	0	7	4	57.1
	Capacitación en uso y manejo del agua, mantenimiento del sistema de riego, prácticas amigables con el medio ambiente impartidos a los usuarios en los canales de riego Selguapa y san Sebastián, aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	2	3	150	12	4	33.3
Nivel de Ejecución			Mensual		19	Anual		23

Fuente: SIAFI

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Julio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Julio	Ejecutado a Julio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Julio	%
Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de Riego	Líneas de tubería instaladas (conducción, distribución y terciarias)	Kilómetro	0	0	0	14	0	0
Asistencia Técnica y Comercialización	Talleres de capacitación impartidos en diversificación agrícola (manejo de agua y fertilización), aplicando medidas de bioseguridad.	Tallere de Capacitacion	0	0	0	10	0	0
	Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	1	4	400	6	7	117
Organización y Desarrollo Local	Formulación de planes de producción.	Plan	0	0	0	5	0	0
	Organización de productores y productoras organizados en grupos empresariales, de acuerdo a la producción agrícola.	Grupo	0	0	0	10	0	0
	Expedientes documentados a grupos empresariales organizados para la gestión de la personería jurídica.	Expediente	0	0	0	10	0	0
	Diagnóstico situacional de los grupos empresariales organizados	Diagnostico	0	0	0	10	0	0
Gestión Ambiental	Plan de trabajo para la socialización de los planes de ordenamiento y manejo de los recursos naturales.	Plan de Trabajo	0	0	0	1	1	100
	Plan de capacitación elaborado.	Plan	0	0	0	2	2	100
Nivel de Ejecución			Mensual		44	Anual		35

Fuente: SIAFI

Principales logros realizados en el mes de julio:

- Capacitación a 240 personas de las comunidades de los canales de riego Selguapa y San Sebastián en temas relacionados con la educación ambiental, incluyendo tópicos como: uso y manejo del agua, mantenimiento del sistema de riego, prácticas amigables con el medio ambiente, respeto de la naturaleza y el medio ambiente. Se está desarrollando un plan de educación ambiental, para lo que se realizaron dos talleres en el municipio de Ajuterique, Departamento de Comayagua. Con estos dos eventos se acumulan tres (3) eventos de doce (12) talleres que se desarrollarán para promover la educación ambiental entre los pobladores residentes, contiguo al canal de Selguapa y canal San Sebastián. El primer evento se desarrolló con los alumnos y docentes de la Escuela “Lempira” en la comunidad de Los Pozos. El segundo y el tercer evento se realizaron con estudiantes de Bachillerato Técnico Agrícola y docentes del Centro de Educación Básica “Gracias a Dios”, en la comunidad de Playitas. El fin es formar conciencia entre los pobladores de las comunidades aledañas a los canales de riego y disminuir el impacto por acumulación de desechos sólidos y otros contaminantes en el cauce.
- Apoyo a la asociación de regantes de Sulaco en instalación de riego intrafinca y asesoramiento ambiental. Se está apoyando a la Asociación de Regantes del Distrito de Riego Valle de Sulaco (ARS) en la instalación de riego Intrafinca en las parcelas de algunos productores, para lo que se coordinó con el equipo técnico de la Dirección General de Riego y Drenaje (DGRD), quienes apoyan con el asesoramiento, diseño y en algunos casos, la instalación de los sistemas de riego parcelario. Hasta este mes de julio de 2023 se han instalado al menos 240 manzanas. Igualmente, se ha estado participando en reuniones de seguimiento con la Junta Directiva de la ARS de Sulaco, espacios en los cuales se les asesora en temas de coordinación, ambientales y sociales.
- Se ha participado en un taller de cambio climático, mismo que responde a la iniciativa de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de formar a sus técnicos en el principio de cambio climático relacionado a la agricultura y a la seguridad alimentaria.

Problemática que afectó la Ejecución en el mes y acciones realizadas:

- Se registró una baja ejecución en el mes de julio 2023 debido a la suspensión del proyecto “Construcción y Rehabilitación de Sistema de Riego San Sebastián”. No obstante, después de que la empresa Conash, supervisora del proyecto, ha entregado los respectivos informes para atender las observaciones hechas por el BCIE a la primera adenda enviada a ellos, estos fueron ya remitidos con la nueva versión modificada de la adenda. Se espera, con las

aclaraciones presentadas, obtener la “No Objeción” del banco y así continuar con las obras del proyecto. Al término del mes de julio, estamos a la espera de la resolución de la adenda por el banco.

2. Proyecto para la Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental (PROLENCA) – 22.05

Objetivo: Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad agroalimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género y con miras a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.

Descripción del proyecto: El grupo objetivo del proyecto incluye: (a) pequeños productores agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados; (b) artesanos rurales con organización incipiente y débilmente vinculadas a los mercados; y (c) microempresarios rurales y comerciantes de pequeña escala.

La población considerada como beneficiarios directos del proyecto, la conformarán 11,000 familias rurales pobres localizadas en 36 municipios de los departamentos de Lempira, La Paz e Intibucá, que además incluye las 826 familias rurales de los 11 municipios de los departamentos de Atlántida, Cortés y Santa Bárbara, correspondientes a Horizontes del Norte (estimándose la totalidad de beneficiarios en 33,000 familias/264,000 personas) que están asociadas a organizaciones rurales legalmente constituidas.

El Proyecto tiene un costo total de L.574,086,00, inició el 15/04/2016 y su fecha de finalización es 30/09/2022.

Localización: La zona de intervención del proyecto son los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira. Adicionalmente se incluyen 11 municipios para acciones concretas dejadas por el Proyecto Horizontes del Norte en los departamentos de Atlántida, Cortés y Santa Bárbara.

A continuación, se detallan los avances financieros y físicos del mes de julio:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROLENCA
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Julio						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Julio	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	52,935,274.00	59,435,274.00	974,148.68	1.64	19,551,062.31	32.89	39,884,211.69
Total	52,935,274.00	59,435,274.00	974,148.68	1.64	19,551,062.31	32.89	39,884,211.69

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
PROLENCA

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Julio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Julio	Ejecutado a Julio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Julio	%
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental PRO-LENCA	Planes de Fortalecimiento organizacional implementados a organizaciones	Plan	0	0	0	60	63	105
	Capacitaciones en inclusión social y genero brindadas a organizaciones	Capacitacion	0	0	0	50	50	100
	Asistencia técnica en temas administrativos y financieras brindadas a familias productoras agremiadas en Cajas Rurales de Ahorro y Crédito.	Asistencia Tecnica	0	0	0	100	127	127
	Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego rehabilitadas a productores y productoras contribuyendo a la seguridad alimentaria..	Hectarea	0	0	0	5	0	0
	Documento final de cierre del proyecto dirigido a socios estratégicos, autoridades, beneficiarios y ente financiador.	Documento	0	0	0	1	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		66

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Julio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Julio	Ejecutado a Julio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Julio	%
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales	Planes de fortalecimiento organizacional aprobados.	Plan	0	0	0	60	63	105
	Evaluación de resultados del proyecto.	Informe	1	1	100	1	1	100
	Consultoría aprobada para el fortalecimiento de Organizaciones.	Consultoría	0	0	0	1	1	100
Desarrollo Productivo y de Negocios	Selección de cajas rurales de ahorro y crédito.	Caja Rural	0	0	0	100	127	127
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social	Líneas de tubería instaladas en parcelas agrícolas.	Kilómetro	0	0	0	1	1	100
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social FIDA II	Líneas de tubería instaladas en parcelas agrícolas FIDA II.	Kilómetro	0	0	0	1	1	100
Nivel de Ejecución			Mensual		17	Anual		105

Fuente: SIAFI

Principales logros realizados el mes de julio:

- No hay logros identificados, debido a que el proyecto ya terminó su ejecución y cumplió con las metas planificadas, el mismo se encuentra en el proceso de cierre.

Problemática que afectó la Ejecución en el mes de julio y acciones realizadas:

- No hay problemas técnicos ni financieros identificados, debido a que el proyecto ya finalizó su ejecución técnica y se encuentra en la etapa de cierre financiero.

3. Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE) – 22.13

Objetivo: Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las cadenas de valor priorizadas y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático.

Descripción del proyecto: Mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en la región noroeste de Honduras, fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas, de procesamiento y comercialización, aumentando sus ingresos y generando empleo a los pobladores del área de influencia.

La población considerada como beneficiarios directos del proyecto, la conformarán 15,000 familias rurales pobres localizadas en 22 municipios de los departamentos de Atlántida, Yoro, Olancho y Colón.

El Proyecto tiene una inversión total de L. 1, 026,645,518.00; inició el 03/01/2022 y su fecha de finalización es al 31/12/2027.

Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en el Departamento de Atlántida: Municipios de Jutiapa; Departamento de Yoro: Olanchito, Jacón y Arenal; Departamento de Colón: Balfate, Tocoa, Sonaguera, Trujillo; Sabá, Limón, Bonito Oriental, Santa Rosa de Agúan y Santa Fé; y Departamento de Olancho: Guata, Gualaco, Yocón, Jano, Esquipulas del Norte, Mangulile, El Rosario, San Esteban y La Unión.

A continuación, se detallan los avances financieros y físicos del mes de julio:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROINORTE

(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Julio						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Julio	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	11,938,330.00	11,938,330.00	363,950.95	3.05	2,288,157.70	19.17	9,650,172.30
Fuente 21: Crédito Externo FIDA	130,683,333.00	124,183,333.00		0.00	2,209,761.82	1.78	121,973,571.18
Fuente 21: Crédito Externo OFID	123,740,000.00	48,368,894.00		0.00	-	0.00	48,368,894.00
Fuente 22: Donaciones Externas				0.00	-	0.00	
Total	266,361,663.00	184,490,557.00	363,950.95	0.20	4,497,919.52	2.44	179,992,637.48

Fuente: SIAFI

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Julio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Julio	Ejecutado a Julio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Julio	%
Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)	Plan de fortalecimiento elaborado a organizaciones de productores y productoras.	Plan	0	0	0	1	0	0
	Planes de Negocios Implementados a grupos de productores y productoras(resilientes e inclusivas).	Plan de Negocio	0	0	0	1	0	0
	Kits de herramientas entregados a las Unidades Municipales Ambientales (UMA) entregados.	Kit	0	0	0	5	0	0
	Desembolsos realizados a instituciones u organizaciones seleccionadas.	Cantidad	0	0	0	1	0	0
	Campañas de concientización nutricional y articulación a espacios Seguridad Alimentaria Nutricional SAN con jóvenes especialmente mujeres adolescentes implementadas.	Campaña	0	0	0	1	0	0
	Planes de inversión en servicios ecosistémicos y dinamización territorial implementados con grupo de productores y productoras.	Plan de Inversion	0	0	0	2	0	0
	Red de gestores de innovación Implementado en los municipios de influencia del proyecto.	Red de Innovacion	0	0	0	5	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual	0

Fuente: SIAFI

- No se cuenta con ningún logro relevante para este mes de julio.

Problemática que afectó la ejecución en el mes de julio:

Área	Problemas	Acción Propuesta
Administrativa	- No se ha podido concluir con la contratación de las sedes del proyecto (Tocoa y Olanchito), debido a lo complicado de la zona al momento de solicitar la documentación legal de los representantes legales de los locales, ya que la mayoría se retiró del proceso.	- Se tuvo reunión con FIDA para explicarles lo sucedido ante el proceso de contratación de las sedes y se solicitó una excepción para poder contratar las sedes. Se envió solicitud de No Objeción a FIDA, a la espera de la respuesta.
Técnica	No se ha podido realizar ejecución técnica.	Apenas se completó el equipo técnico del proyecto y se empezará a trabajar en la realización de actividades.

4. Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente) - 22.14

Objetivo: Incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH). El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

Descripción del Proyecto: PROOCIDENTE opera a partir de los convenios financieros de préstamo BID-4936HN y BID-4940HN suscritos el 23 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 55M USD; un fondo de préstamo de 35 M USD del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de la AECID del Gobierno de España; y un fondo de donación WE-FI de 1.4 M USD. El objetivo de este proyecto es incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras y mejorar el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria. El Proyecto tiene una inversión total de 91.4 M USD.

Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en los 88 municipios de los departamentos de Santa Barbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá y La Paz.

A continuación, se detallan los avances financieros y físicos del mes de julio:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROOCCIDENTE
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Julio						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Julio	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BID		129,755,922.00	939,649.65	0.72	5,226,480.20	4.03	23,481,927.02
Fuente 22: Donaciones Externas				0.00	-	0.00	
Total	-	129,755,922.00	939,649.65	0.72	5,226,480.20	4.03	123,481,927.02

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
PROOCCIDENTE**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Julio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Julio	Ejecutado a Julio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Julio	%
Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad	Planes de inversión con la adopción de tecnologías CI (Climáticamente inteligentes) implementados a productores y productoras organizadas (o).	Plan de Inversión	0	0	0	20	0	0
	Planes de manejo de microcuencas implementados.	Plan de Manejos de Microcuencas	0	0	0	5	0	0
	Créditos otorgados a productores rurales.	Credito	0	0	0	55	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Julio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Julio	Ejecutado a Julio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Julio	%
Fortalecimiento del Desarrollo Productivo	Planes de inversión aprobados por el equipo técnico del proyecto	Plan de Inversion	0	0	0	20	0	0
	Asistencia técnica brindada en tecnologías Climáticamente Inteligentes, producción, mercado y/o nutrición	Asistencia Técnica	0	0	0	20	0	0
	Planes de manejo de microcuenca aprobados por el Instituto Conservación Forestal ICF.	Plan de Manejos de Microcuencas	0	0	0	5	0	0
Acceso a Financiamiento	Monto de créditos y garantías aprobados	Lempira	0	0	0	5000000	127	0
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual	0

Fuente: SIAFI

Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de julio:

- **Componente 1. Fortalecimiento Productivo.** La Junta negociadora remitió el borrador de contrato a la firma mejor calificada para sub implementar el componente 1. Se han mantenido reuniones virtuales con representantes de la firma para garantizar condiciones de la propuesta inicial como: personal a cargo, indicadores de cumplimiento, tiempo de fase I, entre otros.
- **Componente 2. Financiamiento Rural.** Se continúa el proceso de apertura de la nueva figura administrativa del fondo para financiamiento rural con BANHPROVI y la liquidación/ transferencia de los fondos desembolsados en 2021.
- **Componente 3. Monitoreo y Evaluación.** Se ha realizado socialización del componente con los técnicos de UAP- SAG y con el director de Infotecnología de la SAG para establecer la ruta de trabajo en el proceso de diagnóstico y diseño del sistema de M&E. Se ha establecido una agenda con el recurso de interés para definir el alcance del sistema.
- **Componente 4. Gestión Administrativa y Otros Gastos Contingentes.** Se han completado los trabajos en campo de la auditoría 2022. El informe final será entregado en agosto 2023.
- **Fondos FONPRODE.** Se realizan tramites y procesos, para el cumplimiento de las condiciones de entrada en vigor y solicitud del primer desembolso al financiamiento de \$35M de dólares, ya han sido incorporados los fondos al sistema SNIPH y a las herramientas de planificación.
- **Conformación de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP).** Se publicaron los TdR de los puestos claves que están pendientes de conformar la UEP. El plazo de recepción venció el 31 de julio. Se recibieron hojas de vida en todas las especialidades: Coordinador General, Especialista en Adquisiciones, Especialista en Asistencia Técnica e Innovación Tecnológica,

Especialista en Financiamiento Rural y Asistente administrativo. Así mismo, se nombraron las comisiones evaluadoras de todos los procesos.

- Se han mantenido reuniones de coordinación y seguimiento para la firma del convenio de donación, IGR HO-G 1261 por \$1.4MM, que serán financiados por la Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (WEF). El objetivo de los fondos será ampliar las actividades de los Subcomponentes 1.1 y 1.2 del Proyecto HO-L1201/HO-L1211: “Adopción de Tecnologías CI y Asistencia Técnica Integral”, respectivamente, atendiendo exclusivamente a MiPyME vinculadas al sector agropecuario lideradas por mujeres.
- Se mantienen reuniones periódicas de coordinación por los oficiales de apoyo del BID para seguimiento y monitoreo de las acciones pendientes.

Problemática que afectó la ejecución en el mes de julio:

Área	Problemas	Acción Propuesta
Administrativa	Completar la Unidad Ejecutora del Proyecto (5 puestos claves) Solicitud de espacio fiscal, para la Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (We-Fi)(WEF) donación de \$1.4 MM. que serán incorporados al proyecto. Solicitud de notificación de firmas para desembolso de los fondos FONPRODE. Apalancamiento de 35.MM /Fase II	Se publicaron y recibieron CV de candidatos para los 5 puestos y se nombraron las comisiones evaluadoras para selección de personal en el mes de agosto. Cumplimiento del marco legal del proyecto y nota de prioridad; gestiones internas en SEFIN. Seguimiento de acciones. Pendiente de notificación de firma para solicitud del primer desembolso de fondos FONPRODE. gestiones internas en SEFIN
Financiera	Reprogramar actividades financieras en base a la implementación de los componentes 1 y 2	Completar requerimientos para Inicio de implementación de los componentes 1 y 2
Técnica	Finalizar proceso de negociación y firma de contrato con la empresa Sub-implementadora. Liquidación de fondos de fideicomiso/nueva figura administrativa del fondo y reintegro del 1er desembolso realizado en 2021. Definir el alcance institucional del sistema	Aceptado el borrador de contrato, envió para no objeción del proceso al BID, firma de contrato y reprogramación de actividades para el cumplimiento de resultados y metas en el tiempo que resta al proyecto/Desembolso de anticipo consensuado una vez se llegue a acuerdos con la firma. Completar el proceso de reintegro de \$4.1MM del primer desembolso a la nueva figura administrativa. Actividad depende de BANHPROVI. Continuar el trabajo de socialización con autoridades de la SAG.

5. Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II) – 22.15

Objetivo: El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los mercados y las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y contribuir a la inclusión económica de los productores beneficiarios y sus familias en el marco de cadenas de valor seleccionadas, en el marco del establecimiento de *alianzas público privadas* y el *fortalecimiento de temas agrologísticos* para el desarrollo del sector agroalimentario.

Descripción del Proyecto: ComRural II opera a partir del Convenio Financiero de préstamo IDA-6448-HN, suscrito el 11 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Mundial por USD 75.0 millones, publicado en Gaceta el 25 de abril de 2020 mediante Decreto Legislativo No. 35-2020.

El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los mercados y las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y contribuir a la inclusión económica de los productores beneficiarios y sus familias en el marco de cadenas de valor seleccionadas.

El Proyecto tiene una inversión total de **USD 100 Millones**

Localización: Departamentos de Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Olancho, Colon, La Paz, Yoro, Atlántida, Lempira, Intibucá, Santa Barbara, Cortes, Copan y Ocotepeque.

A continuación, se detallan los avances financieros y físicos del mes de julio:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos COMRURAL (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Julio						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Julio	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM		476,495,835.00	2,354,425.63	0.49	17,990,223.76	3.78	454,851,807.78
Fuente 22: Donaciones Externas				0.00	-	0.00	
Total	-	476,495,835.00	2,354,425.63	0.49	17,990,223.76	3.78	454,851,807.78

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
COMRURAL

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Julio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Julio	Ejecutado a Julio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Julio	%
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proyecto: Inversión Pública	Planes de Negocios implementados beneficiando Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Plan de Negocio	0	0	0	40	0	0
	Transferencias No Reembolsables (TNR) realizadas a cuenta primaria de las Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Cantidad	0	0	0	40	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual	0

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Julio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Julio	Ejecutado a Julio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Julio	%
Apoyo para Mejorar la Competitividad, la Resiliencia y la Innovación de las Iniciativas Agroindustriales	Planes de Negocios aprobados por el Comité Directivo (CD) del proyecto.	Plan de Negocio	0	0	0	40	0	0
	Perfiles de negocios	Perfil	0	0	0	60	0	0
	Asistencias Técnicas brindadas a las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs)	Asistencia Técnica	10	0	0	92	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual			0		0

Fuente: SIAFI

Principales logros realizados en el mes de julio:

- Aprobación de Plan Operativo Anual (POA) 2023, por el BM.
- Aprobación del Plan de Adquisiciones (PAC) 2023; vía sistema STEP por BM.
- Reactivación de la designación de firmas A y B, interinos para solicitud de desembolsos y ejecución de Planes de Negocios (PNs).
- En proceso de ratificación de 10 planes de negocios, mediante Comité Directivo, incluyendo 881 familias siendo una inversión total de L. 81.3 millones; de los cuales el 57% corresponde a TNR, 32% a AFP y el 11% correspondiente a OPRs, su inversión enfocada a la codena de cafés especiales, hortalizas y granos básicos.

Problemática que afectó la ejecución en el mes de julio:

Área	Problemas	Soluciones (Acciones)	Responsable
Financiero-Administrativo	Corrigendas (gasto operativo) de los acuerdos de financiamiento	SEFIN debe remitir corrigendas a BM para firma y poder realizar pagos: Servicios públicos de las regionales que conforma el proyecto.	BM / UAP-SAG-ComRural
	El proyecto tiene un desfase de ejecución desde de enero 2023, por lo que no se cuenta con avance físico.	Actualmente se dio la aprobación del POA/PAC 2023 por parte de BM; lo que permitirá la operatividad del proyecto.	BM / UAP-SAG-ComRural
Técnico-Operativo	Designación de Firmas A y B interinas, para solicitud de Desembolsos.	Reactivación de designación de firmas interinas A y B con el propósito de aprobación de pagos pendientes y ejecución del PN en el marco del proyecto ComRural.	UAP-SAG-ComRural
	Firma de los convenios interinstitucionales	Proceder a las firmas de los convenios interinstitucionales (ARSA, SENASA, SERNA, SENPRENDE) por un monto de US\$ 4.3 millones. Se espera la No Objeción de BM para continuar con el proceso.	UAP-SAG-ComRural

6. Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras – 23.01

Objetivo: El objetivo de desarrollo del Proyecto es mejorar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del agua en las áreas seleccionadas del Corredor Seco de Honduras, a través de tres componentes:

Componente 1: Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gobernanza y gestión de los recursos hídricos

Componente 2: Ampliación de la infraestructura hidráulica resiliente para la seguridad hídrica en el Corredor Seco.

Componente 3: Gestión de Proyecto y Desarrollo de Capacidades.

Descripción del Proyecto: El proyecto de Seguridad Hídrica opera actualmente bajo el convenio financiero de préstamo IDA-6680-HN, suscrito el 8 de marzo de 2021 entre el Gobierno de Honduras y Banco Mundial por USD 70M y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 5 de mayo de 2021 mediante decreto legislativo N° 10-2021.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del agua en áreas seleccionadas del Corredor Seco de Honduras.

El Proyecto tiene una inversión total de **USD 68.6 Millones**

Localización: Departamento de Francisco Morazán: Municipios de La Venta y Curaren; Departamento de Intibucá: Intibucá; Departamento de La Paz: La Paz; y Departamenteo de Valle, municipio de Nacaome: 18 comunidades

A continuación, se detallan los avances financieros y físicos del mes de julio:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Seguridad Hídrica
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Julio						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Julio	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM		190,041,562.00	572,698.52	0.30	4,500,582.20	2.37	184,907,752.73
Fuente 22: Donaciones Externas				0.00	-	0.00	
Total	-	190,041,562.00	572,698.52	0.30	4,500,582.20	2.37	184,907,752.73

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023

SEGURIDAD HIDRICA

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Julio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Julio	Ejecutado a Julio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Julio	%
Proyecto de Seguridad Hidrica en el Corredor Seco de Honduras	Asistencia Técnica brindada para fortalecer la gobernanza en las municipalidades de los municipios de Intibucá, La Venta, Curaren y La Paz.	Asistencia Técnica	0	0	0	1	0	0
	Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizado para comunidades priorizadas en los municipios de Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz.	Porcentaje	0	0	0	3	0	0
	Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizado para las comunidades priorizadas en los municipios de Intibucá, La Venta, La Paz y Curarén.	Porcentaje	0	0	0	3	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Julio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Julio	Ejecutado a Julio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Julio	%
Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para la Gobernanza y Gestión de los Recursos Hídricos	Empresa Consultora Contratada para iniciar la Asistencia Técnica para fortalecer la gobernanza a nivel: (i) Etapa I: nivel local, Capacitación y Reforestación en Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz.	Contrato	0	0	0	1	0	0
Ampliación de la Infraestructura Hidráulica Resiliente para la Seguridad del Agua del Corredor Ceco	Empresa Consultora Contratada para la Revisión y actualización de la Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS): Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz.	Contrato	0	0	0	1	0	0
	Empresa Consultora Contratada para la Actualización de Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS): Intibucá, La Venta, La Paz y Curarén.	Contrato	0	0	0	1	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de julio:

- Remisión al Banco Mundial de borradores de convenios institucionales para revisión y no Objeción:
 - a) Convenios con las Alcaldías de: Intibucá, La Paz, La Venta y Curaren. Durante el mes de julio continuó la revisión del borrador del convenio con el BM.
 - b) Convenios con SERNA e ICF. Durante el mes de julio continuó la revisión del borrador del convenio por el BM.
- A julio 2023 los siguientes Tdr se encuentran en revisión por parte del Banco Mundial.
 - a) Tdr para Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizado para comunidades priorizadas en los municipios de Intibucá, La Venta, Curaren y La Paz.
 - b) Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizado para las comunidades priorizadas en los municipios de Intibucá, La Venta, La Paz y Curaren.

- c) Asistencia Técnica Etapa I brindada para fortalecer la gobernanza en las municipalidades de los municipios de Intibucá, La Venta, Curaren y La Paz.
- Migración del Sistema STEP del Banco Mundial de la SAG. Se continuó la revisión del Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) por parte del Banco Mundial durante el mes de julio para aprobarlo en el sistema STE. Se recibió la aprobación.

Problemática que afectó la Ejecución en el mes y acciones realizadas:

Área	Problemas	Acción Propuesta
Administrativa	Las cifras consignadas en el presupuesto 2023 por L.190,041,562.00 para fondos externos y L.32,949,800 para fondos nacionales, no corresponden al presupuesto real del Proyecto, ya que, durante la Misión de Apoyo del Banco Mundial a la implementación del Proyecto realizada en diciembre de 2022, se reprogramaron las actividades, por lo que el presupuesto para 2023 se ajustó a L87,171,500.00 para fondos externos y cero fondos nacionales. Con el logro de la efectividad del Proyecto por la SAG el 22 de mayo de 2023, se reprogramaron de nuevo todas las actividades y se discutieron en detalle con la UAP-SAG y el Banco Mundial el 13 de junio de 2023, ajustándose el presupuesto para 2023 a L.55.1 Millones correspondientes a fondos externos. En la misma fecha se	Acciones realizadas: a) Revisión de la programación de actividades 2023-2025 b) Obtención de la No Objeción del Banco Mundial a la reprogramación 2023-2025
Financiera	La SAG logro concluir la creación presupuestaria del Proyecto en mayo 2023 con el cumplimiento de de las condiciones del Banco Mundial para la efectividad, el 22 de mayo de 2023, según estipulado en la Enmienda 1al acuerdo de financiamiento de fecha 6 de enero de 2023. A junio de 2023 se continua a la espera de la modificación presupuestaria solicitada por el Proyecto, para reflejar el presupuesto real según la reprogramación de las actividades.	a) En junio de 2023, se normalizo la gestión financiera del Proyecto. b) Realizar la modificación presupuestaria para 2023.

Técnica	La SAG logro la efectividad del Proyecto el 22 de mayo de 2023, lo cual incidió en la reprogramación de actividades acordada entre la SAG y el BM en diciembre de 2022, durante la Misión de Apoyo del Banco a la Implementación del Proyecto. Al 31 de julio de 2023 continua en proceso la revisión de los términos de referencia por parte del Banco Mundial. Asimismo, el 31 de julio de 2023 el Banco Mundial aprobó el Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) del Proyecto. Con la aprobación del PAC en el sistema STEP se podrán reiniciar los procesos abiertos en el 2023 y	El Proyecto se ha reprogramado y se obtuvo la No Objeción del BM el 13 de junio del 2023.
---------	--	--

7. Proyecto de Abastecimiento de Agua Urbana – 23.02

Objetivo: Mejorar la calidad y eficiencia de la prestación de los servicios de los Prestadores Urbanos de Servicios de Agua Potable (PUSAPs) y apoyar a los municipios a responder a las necesidades de emergencia de suministro de agua y saneamiento generadas por la pandemia COVID-19 en sus cabeceras municipales.

Descripción del Proyecto: El proyecto “Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana” cuenta con recursos del Crédito AIF-6696-HN del Banco Mundial por un monto de USD 45.0 millones y una contraparte municipal por USD 1.5 millones. Se cuenta con un plazo de ejecución al primer semestre de 2023.

El Proyecto tiene una inversión total de **USD 45.0 Millones**

Localización: La zona de intervención del proyecto se localiza en todos los departamentos a nivel nacional.

A continuación, se detallan los avances financieros y físicos del mes de julio:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos AGUA URBANA (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Julio						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Julio	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM		242,285,548.00	539,162.79	0.22	4,209,497.04	1.74	237,366,147.61
Fuente 22: Donaciones Externas				0.00	-	0.00	
Total	-	242,285,548.00	539,162.79	0.22	4,209,497.04	1.74	237,366,147.61

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023

AGUA URBANA

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Julio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Julio	Ejecutado a Julio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Julio	%
Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	Subproyectos de rehabilitación de sistemas urbanos de agua potable en proceso de ejecución beneficiando a 13 cabeceras municipales.	Porcentaje	0	0	0	50	0	0
	Bienes e insumos COVID-19 entregados en municipios del Proyecto para su instalación escuelas y centros de salud urbanos.	Municipio	2	0	0	13	0	0
	Municipios que implementan un modelo de gestión desconcentrado para la prestación del servicio urbano de agua potable beneficiando a 6 cabeceras municipales	Municipio	0	0	0	6	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Julio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Julio	Ejecutado a Julio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Julio	%
Mejoramiento del Abastecimiento de Servicios de Suministro de Agua Potable en Zonas Urbanas	Subproyectos de rehabilitación de sistemas urbanos de agua potable licitados	Proyectos	2	0	0	13	0	0
	Certificación de no requerir licenciamiento ambiental para las obras de rehabilitación.	Certificación	0	0	0	13	1	8
	Licitación de bienes e insumos COVID-19	Licitación	2	0	0	13	0	0
	Evaluaciones de Impacto y Planes de Gestión Ambiental y Social (EIAS y PGAS).	Plan	0	0	0	13	0	0
	Planes de inversión de subproyectos de rehabilitación.	Plan de Inversión	0	0	0	13	0	0
	Formalización de Acuerdos de Asociación SAG-Municipalidad-Prestador	Acuerdo	0	0	0	13	0	0
Fortalecimiento Institucional de ERSAPS	Dictamen de aprobación del modelo por el ERSAPS	Dictamen	2	0	0	6	0	0
	Nombramiento de gerente del proveedor de servicios de agua potable.	Cantidad	0	0	0	6	0	0
	Conformación de Junta Directiva del proveedor de servicios de agua potable.	Cantidad	1	0	0	6	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		1

Fuente: SIAFI

Principales logros realizados en el mes de julio:

- Certificación de cinco (5) nuevos prestadores de servicios urbanos de agua potable (Unidades Municipales Desconcentradas) por el Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable.
- Finalización de cinco (5) planes de inversión para la rehabilitación de rápido impacto de los sistemas de agua potable que administran los prestadores de servicios participantes en el proyecto, lo que constituye el insumo para preparar los procesos de licitación correspondientes.
- “Acuerdos de Asociación” a ser suscritos entre la SAG y las municipalidades del proyecto como requerimiento previo a las inversiones a financiar, revisados por el Banco Mundial y en

revisión por parte de la Dirección Legal de la SAG.

- Adjudicación de contratos a “Especialistas en Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable” (2) para la formulación de ocho subproyectos de inversión en rehabilitación de sistemas urbanos de agua potable.
- Publicación del proceso de contratación del Especialista de Apoyo Técnico a Adquisiciones y Administración de Contratos.
- Adjudicación de los contratos para compra de vehículos de la UGP (3).

Problemática que afectó la ejecución en el mes y acciones realizadas:

Área	Problemas	Acción Propuesta
Administrativa	Retraso en otorgamiento del acceso de la Especialista de Adquisiciones del Proyecto al sistema de HONDUCOMPRAS, para publicación de los procesos de adquisiciones.	Se solicitó el apoyo de la UAP para gestionar ante ONCAE el otorgamiento del acceso.
Financiera	Ninguno	
Técnica	Ninguno	

8. Alianza Para Corredor Seco (USAID-GAFSP) (PROSASUR) – 23.03

Objetivo: Promover la seguridad alimentaria, diversificación de la nutrición en niños y fortalecimiento de centros comunales de salud y el fortalecimiento de grupos de productores, que pueden escalar a temas de competitividad y ser encadenados con otros proyectos para impulsar el desarrollo del corredor seco.

Descripción del Proyecto: El PROSASUR surge con el convenio financiero de donación TF 017904–HN, suscrito el 11 de noviembre de 2015 por 30M USD. El 19 de noviembre de 2021 se firmó un convenio de donación del fondo adicional TF–0B7211 por USD 5M, con el objetivo de promover la seguridad alimentaria, diversificación de la nutrición en niños y el fortalecimiento de centros comunales de salud y ser encadenados con otros proyectos para impulsar el desarrollo del corredor seco.

Localización: La zona de intervención del proyecto se localiza en todo el Corredor Seco del País.

El Proyecto tiene una inversión total de **USD 35.0 Millones**.

A continuación, se detallan los avances financieros y físicos del mes de julio:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos ALIANZA PARA CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)
PROSASUR (En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Julio						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Julio	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 22: Donaciones Externas		67,392,925.00	291,272.74	0.43	1,639,582.42	2.43	65,579,143.50
Fuente 22: Donaciones Externas				0.00	-	0.00	
Total	-	67,392,925.00	291,272.74	0.43	1,639,582.42	2.43	65,579,143.50

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
ALIANZA PARA CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) PROSASUR**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Julio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Julio	Ejecutado a Julio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Julio	%
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)	Planes comunitarios de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema del corredor seco.	Plan	0	0	0	100	0	0
	Planes comunitarios de Higiene en el Hogar (PHH) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema con niños menores de 5 y 2 años y/o madres embarazadas del corredor seco.	Plan	0	0	0	1	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Julio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Julio	Ejecutado a Julio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Julio	%
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y GENERACIÓN DE INGRESOS, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 1	Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FO, Clúster 1	Asistencia Técnica	0	0	0	1	0	0
	Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FO, Cluster 2	Asistencia Técnica	0	0	0	1	0	0
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y GENERACIÓN DE INGRESOS, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 2	Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados. FO, Clúster 1	Kit de Riego	0	0	0	1	0	0
	Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados. FO, Clúster 2	Kit de Riego	0	0	0	750	0	0
EDUCACIÓN NUTRICIONAL E HIGIENE DEL HOGAR, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 1	Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FO, Clúster 1	Asistencia Técnica	0	0	0	1	0	0
	Infraestructura básica (Ecofiltro, ecofogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar) entregada a Hogares del corredor seco. FO, Clúster 1	Cantidad	0	0	0	1	0	0
EDUCACIÓN NUTRICIONAL E HIGIENE DEL HOGAR, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 2	Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FO, Clúster 2	Asistencia Técnica	0	0	0	1	0	0
	Infraestructura básica (Ecofiltro, ecofogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar) entregada a Hogares del corredor seco. FO, Clúster 2	Cantidad	0	0	0	1	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual	0

Fuente:SIAFI

Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de julio:

A nivel de avances para alcanzar las metas 2023 se han realizado las siguientes acciones:

- **Componente 1. Producción de Alimentos y Generación de Ingresos en Hogares Rurales.** No existe programación para el periodo.
- **Componente 2. Educación en Nutrición e Higiene del Hogar.** No existe programación para el periodo.
- **Componente 3. Proyecto de Gestión, Monitoreo y Evaluación.** Se ha dado inicio a pláticas con la firma implementadora, acusando su acuerdo en la mayoría de los términos planteados en los TDR para su contratación, continua el proceso de negociación bajo la dirección de la UAP/SAG.

Problemática que afectó la Ejecución en el mes y acciones realizadas:

Área	Problemas	Acción Propuesta
Administrativa	Completar la Unidad Ejecutora del Proyecto	Preparación de los TdR para para envío a no objeción del BM, para recibir visto bueno para publicación, evaluación de candidatos y selección de profesionales.
Financiera	Reprogramar actividades financieras en base a la implementación de los componentes 1 y 2	Completar requerimientos para Inicio de implementación de los componentes 1 y 2
Técnica	Finalizar proceso de negociación y firma de contrato con la empresa Sub-implementadora.	Reprogramación de actividades para el cumplimiento de resultados y metas en el tiempo que resta al proyecto/Desembolso de anticipo consensuado una vez se llegue a acuerdos con la firma.

Conclusiones

El presupuesto ejecutado en el mes de julio es de **L 3,039,400.83.** de la cartera de proyectos correspondiente a **L1,552,056,235.00.** Es importante mencionar que la ejecución financiera acumulada al mes de julio es **L 205,157,087.02.** que corresponde a un **13.21%** del presupuesto vigente.

Fecha de Elaboración: 14 de agosto de 2023.

Elaborado por: El equipo Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

Cargo: Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.
