



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan
Operativo Anual POA-Presupuesto

II Trimestre 2023

INDICE

Introducción	2
Antecedentes	2
▪ Misión:	3
▪ Visión:	3
▪ Valores:	4
Resumen Ejecutivo	5
Proyectos FHIS	6
Avance Ejecución Física de Proyectos de Inversión	7
Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Segundo Trimestre 2023	0
Cuadro por Sector 2023	3
CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	4
▪ ✓ Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)	4
CARTERA BANCO MUNDIAL	12
✓ Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE 6822-HN)	12
CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	25
▪ ✓ Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)	25
▪ ✓ Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira.	34
CARTERA KfW Entwicklungsbank	39
▪ ✓ Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V	39
▪ ✓ Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) Fase II	46
CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)	53
▪ ✓ Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)	53
▪ ✓ Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)	62
FONDOS BANCO CENTRAL DE HONDURAS	68
▪ ✓ Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras Convenio BCH-24798-1	68

Introducción

Este informe de ejecución física financiera del plan operativo anual es una herramienta esencial para medir el desempeño de la institución en el logro de sus objetivos. Este tipo de informe permite evaluar la efectividad de los recursos asignados y su uso adecuado en relación con los resultados obtenidos. El análisis de la ejecución física y financiera nos ha permitido identificar las fortalezas y debilidades, así como las áreas de oportunidad para la mejora continua. Al proporcionar información detallada sobre el cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas, este informe es la recopilación de las actividades e inversiones realizadas por el FHIS durante el segundo trimestre del 2023.

Antecedentes

De acuerdo al Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-056-2019 se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), la cual debe de promover el Desarrollo Comunitario por medio de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos, en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerables de Honduras quien para el desarrollo de sus funciones debe contar con una Subsecretaría de Estado.

Se adscribe a dicha Secretaría de Estado, El Instituto Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), que fue creado mediante Decreto Ejecutivo PCM-013-2014 publicado el 30 de Mayo del 2014 y tiene como propósito la integración institucional del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y del Servicio Autónomo Nacional de Acueducto y Alcantarillados (SANAA) y demás afines al sector, Independiente de su integración estas instituciones continuaron cumpliendo los objetivos establecidos en sus leyes constitutivas. Y en la práctica el SANAA no se adscribió al IDECOAS

En PCM-05-2022 se adscribe el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y a la vez se crea el Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos que se adscribe a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y aglutina todos los entes relacionados al sector.

 El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es un organismo Desconcentrado de la Presidencia de la República, creado el 22 de febrero de 1990 y extendida su vida legal hasta el año 2026 según decreto No.

118-2022 cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados, en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social y/o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Asimismo, asesorará a los gobiernos locales con respecto a los procesos de captación de recursos de las fuentes de financiamiento nacionales y/o externas y las asiste en la transferencia de las capacidades técnicas y administrativas, para convertir a estos gobiernos locales en administradores eficientes de sus programas y proyectos, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Nación en aplicación del principio de Descentralización.

Misión:

Somos una Institución Estatal, desconcentrada, técnica y captadora de recursos que promueve el desarrollo local sostenible, participativo e incluyente mediante el fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, en municipales y sociedad civil, en alianza con socios estratégicos para desarrollar obras de infraestructura y proyectos de orientación social de acuerdo al plan de nación y visión de país de forma transparente y eficiente, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable de Honduras.

Visión:

Ser para el año 2026, la Institución líder en gestión y fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, para la ejecución de proyectos, que contribuya equitativamente al desarrollo sustentable nacional.

Valores:

- **Ética:** Ejercicio de las funciones con sujeción a las normas morales que promuevan la confianza de la población hondureña.
- **Integridad:** Actuación sustentada en la honradez, prudencia, entereza, rectitud y firmeza.
- **Compromiso:** Ejecución de proyectos que coadyuven al desarrollo local.
- **Transparencia:** Amplia difusión de información sobre nuestras actuaciones. Rendición de cuentas ante la sociedad.
- **Lealtad:** Actuar con fidelidad y rectitud hacia el FHIS y compañeros de trabajo, con el objetivo de identificarse con la institución.
- **Equidad:** El FHIS no hace distinción de credo, raza, de ninguna otra forma de discriminación humana.

Resumen Ejecutivo

SEDECOAS/FHIS, llega hasta los lugares más recónditos del país, para contribuir a mitigar las necesidades de la población más pobre y vulnerable a través de respuestas rápidas y concretas con proyectos de Agua y Saneamiento, Educación, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural.

El presupuesto de SEDECOAS/FHIS para la gestión 2023 al 31 de diciembre asciende a 1.917 Mil Millones de Lempiras y su ejecución acumulada al II trimestre asciende a 432.7 Millones de Lempiras, financiado tanto por fondos del Tesoro Nacional, como de Créditos y Donaciones de Organismos Internacionales, y cuya distribución, así como su participación porcentual en el presupuesto general de la institución se describe a continuación:

Fuente	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada II Trimestre	% de Participación en el Presupuesto Vigente
BID	L. 36,003,735.00	L. 36,003,735.00	L. 19,490,360.75	2%
BM	L. 432,092,852.00	L. 432,092,852.00	L. 74,670,210.35	23%
BCIE	L. 366,936,124.00	L. 366,936,124.00	L. 55,737,851.39	19%
USAID	L. 122,450,478.00	L. 122,450,478.00	L. 46,265,119.48	6%
GOH*	L. 769,637,001.00	L. 469,637,001.00	L. 196,012,704.01	24%
KfW	L. 190,365,204.00	L. 190,365,204.00	L. 38,676,767.77	10%
BCH	L. -	L. 300,000,000.00	L. 1,936,481.76	16%
TOTAL	L. 1,917,485,394.00	L. 1,917,485,394.00	L. 432,789,495.51	100%

* Incluye costo Operativo del FHIS

Los 300 millones de los Fondos BCH fueron trasladados en el II trimestre del GOH de FHIS



Proyectos FHIS

Fuente	Nombre del Proyecto	Nombre Corto	Sector	Modalidad Ejecución
BID	Programa Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	PCCMB 4518/BL-HO	Infraestructura Social	Centralizados
	Programa de Emergencias en la Respuesta a la Tormenta Tropical ETA	BID-ETA 5328 BL/HO	Infraestructura Social	Centralizados
BM	Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota	PRE 6822-HN	Infraestructura Escolar	Centralizados
BCIE	Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	BCIE No. 2239 MIFE	Infraestructura Escolar	PEC-Descentralizados
	Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira.	BCIE No. 2261	Agua y Saneamiento	Centralizados
KFW	Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar SE-FHIS FASE IV y V	PROMINE	Infraestructura Escolar	PEC-Descentralizados
	Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras	CONVIVIR	Infraestructura Social	Descentralizados
USAID	Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana	ICS	Infraestructura Social y Escolar	PEC/Centralizados
	Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras	PIOH	Infraestructura Escolar	PEC/Centralizados
Fondos Nacionales	Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras.	PROMIDESH	Infraestructura Social y Escolar	Centralizados


Avance Ejecución Física de Proyectos de Inversión

Avance Ejecución Física de Proyectos de Inversión						
Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Metas			Ubicación y Observaciones
			Programación 2023	Ejecución Física al II Trimestre 2023		
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	
PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	Construcción de conexiones de sistemas de agua potable	CONEXIÓN	251		0%	Productos programados para el III trimestre 2023, ubicados en las colonias Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. Lo que representa un 40.65% de avances en las obras en año 2023 y cuenta con un acumulado en avances de 86.10%.
	Construcción de conexiones de sistemas de saneamiento	CONEXIÓN	123		0%	Productos programados para el III trimestre 2023, ubicados en las colonias Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. Lo que representa un 66.14% de avances en las obras en año 2023 y cuenta con un acumulado en avances de 83.03%.
	Construcción de vías pavimentadas	KILOMETRO	1		0%	Productos programados para el III trimestre 2023, ubicados en las colonias Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. Lo que representa un 67.05% de avances en las obras en año 2023 y cuenta con un acumulado en avances de 84.59%.
PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS	Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos	CENTRO EDUCATIVO	40	10	25%	Los subproyectos finalizados poseen acta de recepción provisional. Financieramente aun no han sido cerrados, actualmente el Proyecto cuenta con 59% de avance Financiero y 90% de avance físico.
	Sistemas saneamiento rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciciones Eta e Iota.	SISTEMA	1		0%	Productos programados para el IV trimestre 2023 en area afectada por los ciclones Eta e Iota actualmente el Proyecto cuenta con 59% de avance Financiero y 90% de avance físico..
	Sistemas de agua rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciciones Eta e Iota.	SISTEMA DE AGUA	3		0%	
	Infraestructura comunitaria rehabilitada y reconstruida afectados por ciclones Eta e Iota.	PROYECTO	1		0%	
	Infraestructura vial rehabilitada y reconstruida afectados por ciciones Eta e Iota.	PROYECTO	4		0%	
Infraestructura en centros de salud pública rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota.	UNIDAD DE SALUD	1		0%		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos	CENTRO EDUCATIVO	46	4	9%	Finalizado 4 proyectos, todo ubicados en el Departamento de Santa Barbara. Productos programados para el III y IV trimestre 2023
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE IV y V)	Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos	CENTRO EDUCATIVO	9	2	22%	En este periodo se realizo la ejecución conforme a la reprogramación de actividades realizadas. Es importante resaltar que la ejecución del año será fuerte en el ultimo trimestre considerado los procesos de licitación que se lanzaran en el III trimestre, actualmente cuenta con 25% de avance financiero a la fecha.
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	Espacios públicos recuperados para la seguridad ciudadana.	OBRA	7		0%	Productos programados para el IV trimestre 2023, actualmente cuenta con 10% de avance financiero a la fecha.
	Capacitaciones en habilidades sociales y laborales a jóvenes de ambos sexos entre las edades de 12-30 años	CAPACITACION	250		0%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	Espacios públicos recuperados para la seguridad ciudadana.	OBRA	5	1	20%	Para este trimestre se realizo la reparación y Equipamiento CDA24 de Abril, actualmente cuenta con 47% de avance financiero a la fecha.
	Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados	CENTRO EDUCATIVO	16	2	13%	Reparación CEB Claudio Barrera Fase III y Reparación CCPREB La Unidad, los 2 proyectos restantes serán reportados en el siguiente periodo, actualmente cuenta con 47% de avance financiero a la fecha.
	Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud	OBRA	2		0%	Productos programados para el IV trimestre 2023, actualmente cuenta con 47% de avance financiero a la fecha.
ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados	CENTRO EDUCATIVO	7	2	29%	Se finalizados 4 proyectos en el I y II trimestre, para el I trimestre el CEB Ramón Amaya Amador en Copán y CEB Lempira en Santa Bárbara, para el II trimestre se realizaron ampliación CEB Mariano Martínez y Ampliación CEB Mi Independencia, actualmente cuenta con 25% de avance financiero a la fecha.
	Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud	OBRA	1		0%	Productos programados para el III y IV trimestre 2023 , actualmente cuenta con 25% de avance financiero a la fecha..
	Letrinas construidas	OBRA	1		0%	

Ejecución Presupuestaria por Programas 2023


Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Monto Planificado II Trimestre	Devengado al II Trimestre	Devengado Acumulado	Credito Disponible	% Ejecución II Trimestre/ Planificado II Trimestre	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
Programa 1: Actividades Centrales	L 769,637,001.00	L 540,512,629.00	L 119,550,000.00	L 129,083,514.60	L 196,012,704.01	L 332,195,660.70	108%	36%
Programa 11: Infraestructura Rural	L 52,246,428.00	L 52,246,428.00	L 9,320,225.00	L 7,822,036.46	L 13,035,108.05	L 39,211,319.95	84%	25%
Programa 12: Infraestructura Escolar	L 425,076,855.00	L 425,076,855.00	L 115,842,136.00	L 78,516,503.99	L 86,501,204.57	L 158,283,647.84	68%	20%
Programa 14: Fomento al Desarrollo Local	L 168,615,876.00	L 168,615,876.00	L 48,846,380.00	L 29,045,474.48	L 58,986,870.83	L 107,248,548.30	59%	35%
Programa 16: Reconstrucción Nacional Fuente Externa	L 432,092,852.00	L 432,092,852.00	L 87,414,600.00	L 47,175,974.84	L 74,670,210.35	L 356,105,812.96	54%	17%
Programa 17: Programa de Agua y Saneamiento	L 69,816,382.00	L 69,816,382.00	L -	L 1,025,060.14	L 1,646,915.94	L 61,424,629.06	0%	2%
Programa 18: Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitarios en Varios Departamentos de Honduras	L -	L 229,124,372.00	L -	L 1,963,481.76	L 1,963,481.76	L 227,128,037.52	0%	1%
TOTAL	L 1,917,485,394.00	L 1,917,485,394.00	L 380,973,341.00	L 294,632,046.27	L 432,816,495.51	L 1,281,597,656.33	77%	23%

Nota: Se considera el credito disponible ya que cuenta con los fondos reservados de cada proyecto, el saldo al II trimestre es de L. 1,484,668,898.49

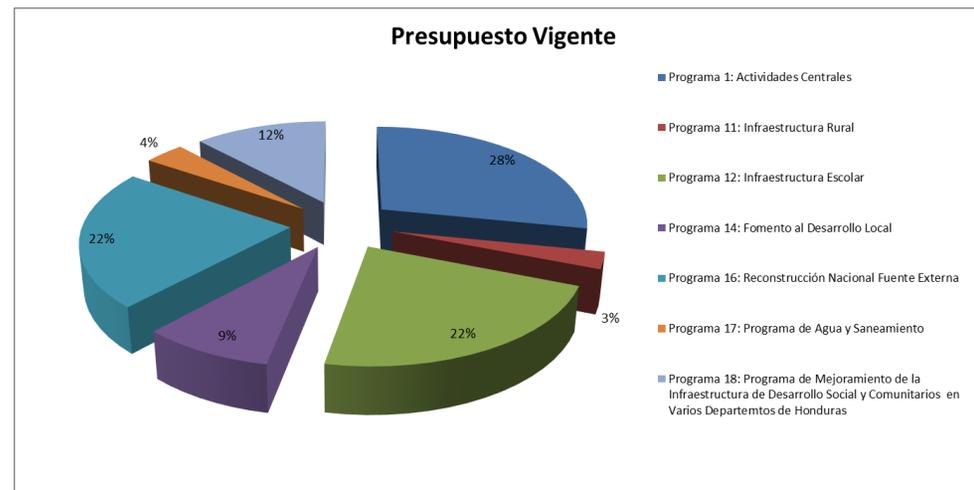

Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2023


Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente 2023	Devengado al II Trimestre	Devengado Acumulado 2023	% Ejecución al II Trimestre / Presupuesto Vigente	% Acumulado I y II Trimestre
Gasto Operativo/Gobierno	L. 769,637,001.00	L. 540,512,629.00	L. 129,083,514.60	L. 196,012,704.01	24%	36%
Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras PIOH	L. 52,246,428.00	L. 52,246,428.00	L. 7,822,036.46	L. 13,035,108.05	15%	25%
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE	L. 127,957,113.00	L. 127,957,113.00	L. 29,965,723.45	L. 32,410,269.12	23%	25%
Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras MIFE	L. 297,119,742.00	L. 297,119,742.00	L. 48,550,780.54	L. 54,090,935.45	16%	18%
Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS	L. 70,204,050.00	L. 70,204,050.00	L. 16,532,236.02	L. 33,230,011.43	24%	47%
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios PCCMB	L. 36,003,735.00	L. 36,003,735.00	L. 8,976,649.03	L. 19,490,360.75	25%	54%
Proyecto Convivencia y Especies Seguros para los Jovenes CONVIVIR	L. 62,408,091.00	L. 62,408,091.00	L. 3,536,589.43	L. 6,266,498.65	6%	10%
Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales ETA e IOTA PRE	L. 432,092,852.00	L. 432,092,852.00	L. 47,175,974.84	L. 74,670,210.35	11%	17%
Programa de Ampliación del sistema de Abastecimiento de agua Potable en la Ciudad de Gracias	L. 69,816,382.00	L. 69,816,382.00	L. 1,025,060.14	L. 1,646,915.94	1%	2%
Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y comunitario en Varios Departamentos de Honduras Convenio BCH-24798-1	L. -	L. 229,124,372.00	L. 1,963,481.76	L. 1,963,481.76	1%	1%
TOTAL	L. 1,917,485,394.00	L. 1,917,485,394.00	L. 294,632,046.27	L. 432,816,495.51	15%	23%

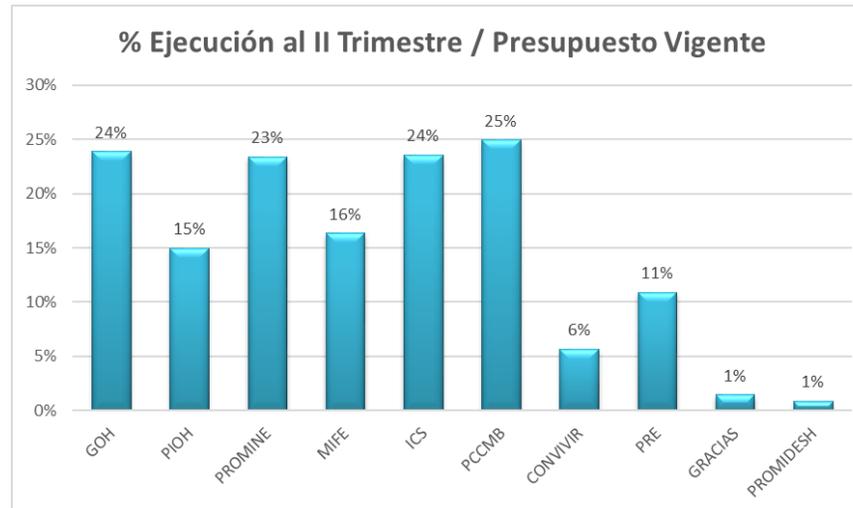

Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Segundo Trimestre 2023

Grupo	Aprobado	Presupuesto Vigente por Grupo	Devengado II Trimestre	Devengado Acumulado al II Trimestre	Credito Disponible	% Ejecución II Trimestre/ Presupuesto Vigente	% Ejecución Acumulado/Presupuesto Vigente
SERVICIOS PERSONALES	L. 152,860,492.00	L. 152,860,492.00	L. 35,577,511.93	L. 66,276,265.87	L. 84,113,704.13	23%	43%
SERVICIOS NO PERSONALES	L. 269,384,793.00	L. 266,022,164.00	L. 44,285,870.10	L. 68,097,281.66	L. 188,539,104.58	17%	26%
MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 9,613,223.00	L. 12,975,852.00	L. 684,734.89	L. 1,471,156.64	L. 11,104,088.15	5%	11%
BIENES CAPITALIZABLES	L. 1,478,438,644.00	L. 1,478,438,644.00	L. 214,083,929.35	L. 296,971,791.34	L. 990,652,517.47	14%	20%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. 7,188,242.00	L. 7,188,242.00	L. -	L. -	L. 7,188,242.00	0%	0%
Total	L. 1,917,485,394.00	L. 1,917,485,394.00	L. 294,632,046.27	L. 432,816,495.51	L. 1,281,597,656.33	15%	23%

Nota: Se considera el credito disponible ya que cuenta con los fondos reservados de cada proyecto, el saldo al II trimestre es de L. 1,484,668,898.49

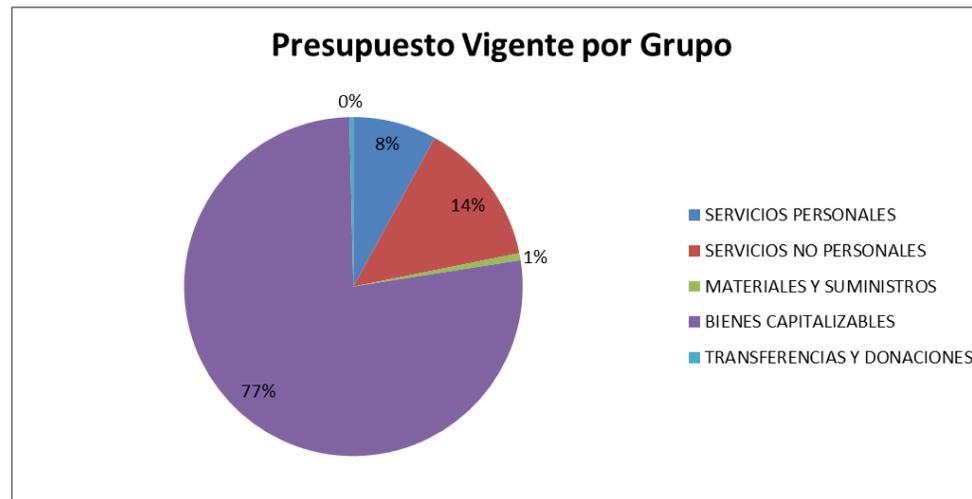

Ejecución por Objeto del Gasto Segundo Trimestre del 2023

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
1100	Sueldos basicos	69,314,094.00	69,314,094.00	30,272,668.43	39,041,425.57
11400	Adicionales	5,776,199.00	5,776,199.00	2,568,939.81	3,207,259.19
11510	Decimotercer mes	5,776,199.00	5,776,199.00	2,10,909.32	5,565,289.68
11520	Decimocuarto mes	5,776,199.00	5,776,199.00	4,364,562.23	1,411,636.77
11600	Complementos	4,621,004.00	4,621,004.00	2,551,356.95	2,069,647.05
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	10,050,587.00	10,050,587.00	4,365,406.81	5,685,180.19
11750	Contribuciones para Seguro Social	3,524,980.00	3,524,980.00	1,447,112.44	2,077,867.56
12100	Sueldos basicos	37,800,485.00	37,800,485.00	18,285,005.49	19,515,479.51
12410	Decimotercer mes	3,150,040.00	3,150,040.00	119,066.64	3,030,973.36
12420	Decimocuarto mes	3,150,040.00	3,150,040.00	1,492,228.98	1,657,811.02
12550	Contribuciones para Seguro Social	1,450,143.00	1,450,143.00	599,008.77	851,134.23
16200	Compensaciones	2,470,522.00	2,470,522.00	0.00	0.00
2110	Suministros de energia electrica	300,000.00	300,000.00	98,374.45	201,625.55
21200	Agua	150,000.00	150,000.00	64,943.26	85,056.74
22100	Alquiler de edificios ,viviendas locales	1,000,000.00	9,430,000.00	4,097,873.21	5,332,126.79
22220	Alquiler de equipos de transporte, traccion y elevacion	500,000.00	2,460,000.00	749,100.54	1,710,899.46
23200	mantenimiento y reparacion de equipos y medios de transporte	830,000.00	856,500.00	107,622.75	708,466.25
23600	Mantenimiento de sistemas informaticos	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
24200	Estudios, investigaciones y analisis de factibilidad	15,934,688.00	31,134,688.00	2,309,570.75	28,825,117.25
24300	Servicios juridicos	480,000.00	600,000.00	273,000.00	327,000.00
24400	Servicios de contabilidad y auditoria	3,320,000.00	760,000.00	139,850.00	620,150.00
24500	servicios de capacitacion	150,000.00	1,300,000.00	240,000.00	1,060,000.00
24710	servicios de consultoria de gestion administrativa y financiera	13,512,754.00	7,453,000.00	2,268,499.99	5,184,500.01
24720	servicios de consultoria de monitoreo y evaluacion	3,275,112.00	8,832,687.00	4,737,433.34	4,095,253.66
25100	Servicio de transporte	35,300.00	35,300.00	15,964.12	19,335.88
25300	Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones	1,500,000.00	2,300,000.00	1,499,982.38	800,017.62
25400	Primas y gastos de seguro	8,150,000.00	8,344,000.00	546,113.46	886.54
25500	Comisiones y Gastos bancarios	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
25600	Publicidad y propaganda	62,400.00	62,400.00	32,200.00	30,200.00
25700	Servicio de internet	7,000.00	7,000.00	4,888.77	2,111.23
25900	Otros servicios comerciales y financieros	300,000.00	393,500.00	116,973.55	276,526.45
26110	Pasajes nacionales	290,000.00	429,672.00	28,883.00	400,789.00
26120	Pasajes al exterior	0.00	160,000.00	150,036.00	9,964.00
26210	Viaticos nacionales	3,978,050.00	7,797,892.00	5,197,367.05	2,560,630.18
26220	Viaticos al exterior	0.00	355,000.00	330,296.89	24,703.11
27210	Tasas	550,000.00	475,000.00	0.00	475,000.00
29100	Ceremonial y Protocolo	300,000.00	300,000.00	25,000.00	275,000.00
31110	Productos alimenticios y bebidas	100,000.00	100,000.00	68,096.00	31,904.00
32310	Prendas de vestir	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
33100	Productos de papel y carton	150,000.00	200,000.00	130,574.45	59,650.55
33300	Productos de artes graficas	100,000.00	100,000.00	22,425.00	77,575.00
33500	Libros, revistas y periodicos	0.00	18,000.00	4,813.00	13,187.00
33700	Especies Timbradas y valores	30,000.00	30,000.00	3,350.00	26,650.00
34400	Llantas y camaras de aire	267,640.00	267,640.00	0.00	267,640.00
35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	0.00	61,000.00	0.00	820.97
35620	Diesel	1,285,000.00	1,337,665.00	236,500.10	1,096,364.90
35650	Aceites y grasas lubricantes	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00
39100	Elementos de limpieza y aseo personal	20,000.00	20,000.00	6,503.76	13,496.24
39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	367,000.00	341,372.00	43,311.30	243,087.20
39300	Utiles y materiales electricos	50,000.00	50,000.00	20,642.50	29,357.50
39400	Utensilios de cocina y comedor	25,000.00	25,000.00	2,064.25	22,935.75
39600	Repuestos y Accesorios	893,550.00	850,550.00	323,942.36	418,765.15
42600	Equipo de comunicacion	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	152,000,000.00	0.00	152,000,000.00
47120	Supervision de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	234,546,319.00	351,421,947.00	117,503,307.31	232,164,460.47
47220	Supervision de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
	Total	445,865,305.00	745,865,305.00	207,675,769.41	525,849,958.58

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
2110	Suministros de energía eléctrica	360,000.00	375,000.00	51,919.19	323,808.09
21200	Agua	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00
21420	Telefonía fija	60,000.00	42,500.00	0.00	42,500.00
22100	Alquileres de edificios, viviendas y locales	3,182,000.00	3,563,000.00	771,643.06	2,432,170.86
22200	Alquileres de equipo de transporte, tracción y elevación	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
23100	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	300,000.00	2,948,500.00	69,224.28	2,879,275.72
23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	800,000.00	700,000.00	11,522.87	688,477.13
23350	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00
23360	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	170,000.00	140,000.00	46,149.52	93,850.48
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	42,020,392.00	40,166,092.00	7,315,929.53	31,611,676.19
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	4,835,957.00	4,781,097.00	885,593.13	3,199,482.15
24500	Servicios de Capacitación	25,280,745.00	17,372,745.00	1,246,996.36	16,125,748.64
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	450,000.00	187,500.00	0.00	187,500.00
24710	Servicios de Consultoría de gestión administrativa y financiera	71,627,502.00	62,846,652.00	18,237,955.78	35,471,131.96
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	13,158,913.00	7,558,913.00	513,545.68	6,603,101.92
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,269,484.00	994,484.00	93,325.95	901,158.05
25400	Primas y Gastos de Seguro	530,000.00	530,000.00	0.00	530,000.00
25700	Servicio de Internet	240,000.00	440,000.00	87,020.52	352,979.48
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	680,000.00	625,000.00	0.00	625,000.00
26110	Pasajes Nacionales	330,000.00	268,810.00	0.00	268,810.00
26120	Pasajes al Exterior	0.00	335,000.00	0.00	335,000.00
26210	Viáticos Nacionales	7,268,469.00	6,681,969.00	249,250.63	6,429,062.12
26220	Viáticos al Exterior	0.00	230,000.00	182,052.05	47,947.95
27210	Tasas	610,000.00	610,000.00	85,510.32	524,489.68
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	62,000.00	626,750.00	0.00	626,750.00
32310	Prendas de Vestir	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00
33100	Productos de papel y cartón	165,000.00	165,000.00	0.00	165,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	64,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00
35620	Diesel	1,278,450.00	2,484,450.00	231,293.99	2,249,930.82
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
35800	Productos de Material Plástico	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
36400	Herramientas Menores	211,099.00	611,099.00	0.00	611,099.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	480,000.00	580,000.00	0.00	580,000.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	2,500.00	6,000.00	0.00	6,000.00
39520	Instrumental y material para laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	1,211,026.00	1,511,026.00	13,659.28	1,497,366.72
42110	Muebles Varios de Oficina	6,578,358.00	6,578,358.00	0.00	6,578,358.00
42120	Equipos Varios de Oficina	8,087,809.00	5,087,809.00	0.00	5,087,809.00
42270	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc)	0.00	129,477.00	129,476.39	0.61
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,750,000.00	4,510,400.00	1,835,400.00	2,675,000.00
42430	Equipo de Laboratorio no Médico	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
42510	Equipo de Comunicación	22,168,713.00	2,768,713.00	0.00	2,768,713.00
42520	Equipo de Señalamiento	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
42600	Equipos para Computación	25,124,198.00	16,777,392.00	8,288,193.05	8,489,198.95
45100	Aplicaciones Informáticas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	23,250,000.00	23,250,000.00	0.00	23,250,000.00
47120	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	32,843,516.00	33,156,533.00	3,587,557.43	20,195,538.15
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	908,681,789.00	635,646,152.00	105,167,320.48	370,690,405.52
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	24,628,966.00	42,360,465.00	5,787,477.55	33,669,406.90
54110	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	7,188,242.00	7,188,242.00	0.00	7,188,242.00
	Total	1,239,058,128.00	939,058,128.00	154,887,289.76	600,225,171.09



OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	432,000.00	432,000.00	172,032.48	259,967.52
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	660,000.00	1,266,500.00	776,874.74	489,625.26
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	384,431.00	100,001.00	0.00	100,001.00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	300,200.00	300,200.00	300,200.00	0.00
24500	Servicios de Capacitación	3,495,000.00	2,760,533.00	518,060.72	2,242,472.28
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa y Financiera	23,468,690.00	23,207,040.00	8,667,012.50	14,540,027.50
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	9,653,098.00	9,566,957.00	3,615,956.85	5,951,000.15
25100	Servicio de Transporte	3,600.00	33,000.00	5,345.70	27,654.30
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	225,853.00	159,303.00	11,600.00	147,703.00
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	3,200.00	4,300.00	0.00	4,300.00
25700	Servicio de Internet	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00
26100	Pasajes Nacionales	200,000.00	117,000.00	0.00	117,000.00
26210	Viáticos Nacionales	2,255,000.00	2,608,708.00	1,149,313.57	1,255,686.43
29100	Ceremonial y Protocolo	140,955.00	140,955.00	0.00	140,955.00
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	140,000.00	140,000.00	30,329.00	109,671.00
32310	Prendas de Vestir	125,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
33100	Productos de Papel y Cartón	26,924.00	26,924.00	19,202.11	7,721.89
33300	Productos de Artes Gráficas	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	75,000.00	208,000.00	0.00	208,000.00
35610	Gasolina	241,658.00	241,658.00	216,329.54	25,328.46
35620	Diesel	25,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	207,376.00	157,376.00	19,510.00	137,866.00
39600	Repuestos y Accesorios	350,000.00	567,530.00	78,610.00	488,920.00
42110	Muebles Varios de Oficina	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	1,250,000.00
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	4,875,000.00	4,875,000.00	1,288,721.74	3,586,278.26
42510	Equipo de Comunicación	250,000.00	250,000.00	0.00	100,000.00
42600	Equipos para Computación	3,725,000.00	3,725,000.00	145,682.00	3,204,318.00
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	4,000,000.00	5,500,000.00	0.00	700,000.00
45100	Aplicaciones Informáticas	550,000.00	550,000.00	0.00	300,000.00
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	93,893,433.00	95,873,415.00	25,054,895.39	69,941,619.61
47120	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	9,300,023.00	5,820,041.00	1,359,718.86	4,429,932.14
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	71,785,520.00	71,785,520.00	26,824,041.14	44,961,478.86
Total General		1,917,485,394.00	1,917,485,394.00	432,816,495.51	1,281,597,656.33



Resumen de Cuadro por Sector 2023

SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
AGUA Y SANEAMIENTO	0	4	17,228,229.82	0	869
EMPRENDIMIENTO Y VALORES	0	0	6,096,682.46	27	1,262
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	0	5	11,035,321.81	150	3,210
PREVENCION SITUACIONAL/CONVIVIENCIA	2	12	8,405,443.12	104	1,206,881
EDUCACION	30	97	129,123,293.34	1,799	22,522
TOTAL	32	118	171,888,970.55	2,080	1,234,744

Nota: El monto total refleja la inversión realizado por los proyectos en Construcción

Resumen de Cuadro por Departamento 2023

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
ATLANTIDA	3	5	6,502,910.36	60	2,990
COMAYAGUA	1	7	29,677,491.65	74	1,699
COPAN	3	4	16,195,619.06	52	284
CORTES	8	28	29,312,694.09	559	12,099
EL PARAISO	1	0	2,085,819.45	24	96
FRANCISCO MORAZAN	3	15	29,578,740.05	334	1,210,511
GRACIAS A DIOS*	0	1	-	0	0
INTIBUCA	3	3	3,660,635.49	68	501
LA PAZ	2	4	5,003,761.29	34	187
LEMPIRA	2	6	2,855,966.41	57	270
OCOTEPEQUE	0	2	435,124.00	13	282
OLANCHO	0	18	15,050,372.08	384	2,101
SANTA BARBARA	6	21	22,332,917.78	374	3,562
YORO	0	4	9,196,918.84	47	162
TOTAL	32	118	171,888,970.55	2,080	1,234,744

Nota: El monto total refleja la inversión realizado por los proyectos en Construcción

***El Proyecto en Gracias a Dios se encuentra en resolución en Secretaria General, Dirección Legal y en Control y Seguimiento FHIS**

Resumen de Cuadro por Otras Inversiones 2023

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	40,266,044.84
GASTO OPERATIVO DE PROGRAMAS	24,648,776.11
ACTIVIDADES CENTRALES FHIS	196,012,704.01
TOTAL	260,927,524.96

CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO



✓ Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)



i. Antecedentes

Actualmente el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y la Secretaría de Seguridad ejecutan conjuntamente la operación BID 4518/BL-HO denominada “Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios” el cual es un préstamo por un monto total de US\$60,000,000.00 la operación fue aprobada por el Banco Interamericano de Desarrollo en el mes de abril de 2018, posteriormente aprobada por el Congreso Nacional en el mes de octubre de 2018, y fue efectivo a partir del 28 de noviembre de 2018, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta

ii. Objetivo

Contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

iii. Componentes

Componente 1. Mejoramiento del hábitat de barrios urbanos vulnerables (US\$18.219 millones). El propósito de este componente es mejorar el acceso a servicios de infraestructura urbana y generar espacios con condiciones de seguridad, para incentivar una mejor convivencia y aumentar la capacidad

de los ciudadanos para el cumplimiento pacífico de normas. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Infraestructura básica: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios en los siguientes barrios del Distrito Central: Monte de los Olivos, Nueva Jerusalén; Australia; 25 de Enero; Nueva España; Brisas del Mogote y Nueva Galilea teniendo como marco para las intervenciones el Plan Integral de Mejoramiento de Barrios, el cual incluye los correspondientes diseños urbanísticos, de ingeniería, la programación y presupuestos. Este instrumento es crítico para la adecuada programación de las inversiones y para facilitar el diálogo con la comunidad sobre las actividades a desarrollar. Se financiará consultorías y contratación de obras para: (i) la preparación de los Planes Integrales de Mejoramiento de Barrios (PIMB); y (ii) las inversiones en obras de infraestructura básica de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, pavimentación, drenaje pluvial, plazas y parques, equipamientos sociales y otras necesidades detectadas en los PIMB. Se promoverá la recuperación de escuelas públicas y centros de salud (operados por las entidades estatales específicas).

Convivencia y Emprendimiento a nivel barrial: promueve la participación de los vecinos en el mejoramiento de las condiciones de su entorno, así como el fortalecimiento de sus redes sociales y vecinales para mejorar el tejido social en los barrios. Se financiará: (i) capacitación de líderes, programa de deportes y valores, apoyado por el Comité Olímpico Internacional; (ii) capacitación de vecinos en áreas de empleabilidad dentro y fuera del barrio mediante la asistencia técnica de las Universidades y su vinculación con el sector empresarial, (iii) organización para utilización de sistemas de alerta temprana para desastres naturales. Todas las actividades tendrán enfoque de género.

Componente 2: Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios (US\$22.130 millones). Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios de prevención social de la violencia al ciudadano y brindar una atención oportuna a las víctimas de violencias y delitos, fortaleciendo la gestión local. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Fortalecimiento de capacidades de actores municipales. Se financiará: (i) capacitación y asistencia técnica a las autoridades locales para promover la participación ciudadana en la preparación de planes locales de prevención social de la violencia; (ii) fortalecimiento de las capacidades de los responsables de los observatorios locales, para el análisis estratégico de estadísticas del crimen y delito -incluyendo la desagregación por género-; y (iii) estrategia de comunicación a través de campañas y consultas

sociales para promover medidas y valores para la reducción de violencias, respeto por las normas legales, morales, culturales y el uso de la oferta de servicios disponibles de prevención y atención a víctimas.

Intervenciones de prevención social de la violencia a nivel municipal. Se financiará: (i) programas para la atención a víctimas de VIF a través del módulo de Atención Integral Especializado (MAIE); (ii) desarrollo de protocolos para homologar la actuación de primeros respondientes para atención a víctimas, (iii) programa de prevención social de la violencia para jóvenes en situación de riesgo; (iii) modelo innovador de policía comunitaria y patrullaje policial sistemático -Hot Spots-; y (iv) mejoramiento de la infraestructura de las Jefaturas Departamentales, para ofrecer servicios policiales a la comunidad.

Componente 3: Efectividad policial. (US\$16 millones). Con el propósito de mejorar el desempeño y la calidad en la prestación de los servicios policiales, se apoyará la consolidación del sistema nacional de formación y profesionalización, así como su sistema de integridad. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Consolidación del sistema educativo policial basado en la filosofía de Policía Comunitaria. Se financiará: (i) diseño del modelo de Sistema de Formación y Profesionalización Policial, articulando sus diferentes instancias de formación (Instituto Técnico Policial -ITP-, ANAPO, Universidad y educación continua y entrenamiento), incluye mecanismos de evaluación continua del personal. Lo anterior, deberá estar sujeto a promover principios de meritocracia y transparencia en el desarrollo de la carrera policial; (ii) modernización del currículum académico para los medios y altos mandos policiales, certificado bajo la filosofía de policía comunitaria y orientando la formación a competencias para la toma de decisiones operativas. Lo anterior, incluyendo la redefinición del perfil de ingreso de candidatos a la ANAPO. Esto considerará la incorporación de nuevos cadetes, provenientes del ITP y otros candidatos que ya hayan cursado licenciaturas y tecnicaturas en otras universidades; modernizar el régimen de formación de oficiales en el nuevo campus universitario y generar una nueva estructura de gobierno y planta de profesores-investigadores de tiempo completo (teóricos y prácticos) (iii) fortalecimiento de las capacidades pedagógicas para docentes; (iv) fortalecimiento de la integridad policial a través de la consolidación de un sistema de evaluación y rendición de cuentas; y (v) modernización de la infraestructura física y tecnológica de la Academia Nacional de Policía y el Centro de Investigación y Desarrollo Policial.

Fortalecimiento de las capacidades en investigación criminal. Se financiará: (i) programa de capacitación y especialización continua en investigación criminal en coordinación con el MP; (ii) capacitación técnica en el uso de tecnologías de la información para análisis estratégicos delictuales; e

(iii) implementación de un sistema integrado de información delictiva y criminal para mejorar la resolución del delito -integrando estadísticas por categoría de género.

iv. Mecanismo de Ejecución.

Se propone contar con dos organismos ejecutores independientes, pero con responsabilidades compartidas en el diseño, implementación y evaluación de iniciativas que se realicen en la misma área geográfica. El componente 1 de esta operación será ejecutado por SEDECOAS-FHIS y el componente 2 y 3 por la Secretaría de Seguridad.

v. Monto del Convenio:

US\$ 60,000,000.00 según convenio de préstamo el cual se desglosa de la siguiente manera: SEDECOAS-FHIS le corresponde US\$ 15, 000,000.00 millones de dólares y a la Secretaría de Seguridad le corresponde US\$ 40,000,000.00 millones de dólares.

La duración del convenio es de 5 años después de la publicación de diario La Gaceta Acuerdo Ejecutivo No. 114-2018.

vi. Avance financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	17,749,164.00	14,959,784.44	84%
2019	84,562,822.00	75,678,087.16	89%
2020	105,302,450.00	71,201,381.99	68%
2021	120,272,463.00	112,275,707.10	93%
2022	71,849,516.00	60,325,223.19	84%
2023	36,003,735.00	19,490,360.75	54%

vii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
EMPRENDIMIENTO Y VALORES	0	0	4,671,786.10	27	1,262
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	0	5	11,035,321.81	150	3,210
TOTAL	0	5	15,707,107.91	177	4,472

viii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios directos 2023
FRANCISCO MORAZAN	0	5	15,707,107.91	177	4,472
TOTAL	0	5	15,707,107.91	177	4,472

ix. Otras Inversión

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	3,703,439.79
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	79,813.05
TOTAL	3,783,252.84

x. AVANCES AL 30 JUNIO DE 2023

<i>Avances Programa</i>		
COMPONENTE 1 MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES		
1.0	PRODUCTO 1.1 NUEVE PROYECTOS INTEGRALES DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS (RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PÚBLICO, EQUIPAMIENTO SOCIAL Y PAVIMENTACIÓN), COMPLETADOS Y SIENDO UTILIZADOS	
1.1	<i>Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios</i>	El día 20 de junio de 2022 inició la ejecución de obras del Proyecto de Integración Urbana en colonias Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 633 predios; el monto del contrato es de L. 55,100,000.000 se tiene un avance físico del 81.50% que corresponde a la construcción de pozos e instalación de tuberías del sistema de alcantarillado sanitario, instalación de tubería para el sistema de agua potable, construcción de cunetas y pavimentación de calles con un avance financiero del 74.4%. La supervisión de la obra inició el día 05 de junio de 2022, el monto del contrato es de 4,744,032.28 y tienen una ejecución financiera del 75.5%.
2.0	PRODUCTO 1.2 JÓVENES DE LOS BARRIOS INTERVENIDOS CAPACITADOS	
2.1	<i>Programa de Deportes y Valores</i>	Este proyecto consiste en la enseñanza de disciplinas deportivas implementando los valores olímpicos; al semestre se imparten seis (6) disciplinas olímpicas: taekwondo, levantamiento de Pesas, tenis de Mesa, atletismo y balonmano; también, se atiende niños y/o jóvenes con

		<p>discapacidad, este programa está en ejecución continua y participan aproximadamente 700 jóvenes de las colonias intervenidas por el programa.</p> <p>Durante el trimestre, la joven Giselle Roque (19 años) beneficiaria del Programa, participó en las olimpiadas especiales en Berlín, obteniendo la medalla de Bronce en el salto largo sin impulso y 4to lugar en la carrera de 50 metros.</p>
3.0	PRODUCTO 1.3 MUJERES DE LOS BARRIOS INTERVENIDOS CAPACITADAS EN EMPRENDEDURISMO Y EMPLEO	
3.1	<i>Capacitación es en empleabilidad</i>	Al mes de junio de 2022 inició el curso de diseño gráfico a través de la fundación CADERH, donde finalizaron 15 participantes graduados en marzo del año 2023, al mes de junio del año 2023 a través de convenios con CADERH se están capacitando 17 personas en alfabetización digital.

xi. PROBLEMATICA:

PROBLEMA	ACCIONES DE MITIGACIÓN, COMENTARIOS, NECESIDADES DE APOYO
Inseguridad en los barrios que dificulten o imposibilite la ejecución de las obras.	<p>Inseguridad en los barrios que dificulten o imposibilite la ejecución de las obras.</p> <p>Se continúa con las actividades realizadas por los enlaces técnicos comunitarios ETEC, fortaleciendo la cohesión social a través de las intervenciones para Promover la Convivencia Ciudadana y emprendimiento a nivel barrial. El programa mantiene actividades de acompañamiento comunitario para la ejecución de las obras para mejorar las condiciones de seguridad para el contratista y la supervisión.</p>
Ejecución de obras de infraestructura	A la fecha se presenta un desfase del 20% en la ejecución de obras de infraestructura; debido a que se sufrió un retraso de dos meses en la importación de tubería para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario;
Sostenibilidad del Programa Deportivo y Valores.	<p>Uno de las iniciativas sociales más exitosas ha sido la implementación de Programa Deportivo y Valores. A la fecha se cuenta con 11 secciones deportivas con equipo deportivo y entrenadores contratados, con una participación de 700 jóvenes.</p> <p>Se cuenta con recursos para mantener los servicios de enseñanza deportiva hasta diciembre de 2023, fecha de finalización del Programa. Es necesario identificar fuentes de financiamiento para continuar con el programa ya que es una actividad de prevención de la violencia ha tenido muy buena aceptación por las comunidades. Se requieren al menos \$75,000.00 dólares anuales; a la fecha se han realizado acercamiento con posibles patrocinadores del sector privado, programas con otras fuentes de financiamientos, sin embargo, no se ha tenido respuesta positiva.</p>

Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-81311

Programa de Deportes y Valores



Atletas catrachos Martínez (izquierda), Roque (centro) y Viera (derecha).

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-81311

CARTERA BANCO MUNDIAL



✓ **Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE 6822-HN)**



i. Antecedentes

Entre los días 1 y 16 de noviembre de 2020, dos tormentas tropicales consecutivas, Eta e Iota, devastaron a Honduras con una magnitud de impacto económico y social comparable a la del huracán Mitch de 1998. En respuesta a la emergencia causada, el Gobierno de Honduras (GdH) solicitó al Banco Mundial (BM) un financiamiento de US\$150 millones para un Proyecto de Recuperación de Emergencia.

El 8 de marzo de 2021 el Gobierno de Honduras suscribió con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) el Convenio de Crédito No. 6822-HN, por un monto de US\$150.000.000.00, aprobado mediante Decreto Legislativo No.10-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 5 de mayo de 2021, fondos que financiarán el Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE), habiéndose cumplido con las condiciones de efectividad el 4 de junio de 2021 y efectuándose el Primer Desembolso el 28 de junio de 2021 por un monto de USD\$ 4.36 Millones.

El Proyecto se enfoca en la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública en salud, educación, agua y saneamiento, vial, comunitaria y vivienda en las zonas geográficas del país afectadas por los ciclones tropicales Eta e Iota.

La implementación, coordinación, planificación y seguimiento general del Proyecto se llevará de manera centralizada en la SEDECOAS, a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), quien contará con personal especializado en diferentes áreas que garanticen el cumplimiento de los estándares del BM.

ii. **Objetivo General**

El PRE tiene por objetivo atender las necesidades identificadas como prioritarias para reactivar la economía y apoyar las más urgentes necesidades de la población afectada por los fenómenos naturales ETA e IOTA, como respuesta de emergencia y recuperación de Honduras, y, en esta perspectiva, fortalecer la capacidad institucional del Estado para gestionar una ejecución eficaz, eficiente y transparente.

iii. **Objetivos Específicos**

- Realizar operaciones de asistencia y respuesta de emergencia, salud y seguridad pública.
- Realizar la rehabilitación y construcción resiliente de la infraestructura pública y Comunitaria y Restablecimiento de los servicios públicos.
- Mejorar la capacidad instalada del Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.

iv. **Descripción**

Componente 1: Operaciones de asistencia y respuesta de emergencia, salud y seguridad pública (US\$ 17.3 MILLONES)

Bajo este componente se financian actividades y acciones de respuesta y seguridad pública como resultado de los daños causados por los ciclones Eta e Iota. Son elegibles actividades de respuesta inmediata realizadas por el Gobierno de Honduras previo a la fecha de efectividad del Crédito.

Componente 2: Rehabilitación y reconstrucción resiliente de la infraestructura pública y comunitaria y restablecimiento de los servicios públicos (US\$121.7 MILLONES)

Este componente se financia la preparación técnica, la implementación de reparaciones urgentes, rehabilitación y reconstrucción resiliente de la infraestructura pública y comunitaria de alta prioridad, incluido el costo de la reubicación temporal y la inspección o actividades de diseño necesarias para instalaciones de alta prioridad que requieran una nueva construcción.

Componente 3: Apoyo institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción (US\$11.0 MILLONES)

El componente se financia la gestión de Proyecto (financiero y fiduciario), la capacidad técnica e institucional, auditorías técnicas, financieras y sociales, monitoreo y seguimiento, cumplimiento social y ambiental, mecanismo de atención y resolución de quejas y denuncias, preparaciones informes, evaluación de medio términos, estudios de línea base.

v. Focalización

Para determinar las zonas y sectores de intervención, el Gobierno de Honduras con la asistencia técnica de organizaciones y agencias internacionales, ha elaborado el documento borrador denominado “Evaluación de daños y pérdidas causadas por las tormentas tropicales Eta e Iota”¹

También se cuenta con la base de datos del estudio levantado por la SEDECOAS denominado “Plataforma de información de incidencias de la infraestructura dañada por las tormentas Eta e Iota”, que consolida los datos de las tres fuentes del Gobierno. De igual manera, se cuenta con listas de infraestructura que fue levantada por las instituciones sectoriales en las oficinas de COPECO Tegucigalpa, en un centro de acopio instalado luego de los eventos de desastre de las tormentas tropicales Eta e Iota.

Las acciones de respuesta de socorro y atención a personas están siendo financiadas bajo el Componente 1 y, las obras de reconstrucción y rehabilitación, elegibles y priorizadas, serán financiadas bajo el Componente 2, estas se ejecutarán en los municipios y sectores afectados por las tormentas tropicales Eta e Iota.

vi. Sector de Intervención

Los sectores por intervenir son:

- *Infraestructura de Salud:* Rehabilitación, reconstrucción, construcción de obras de mitigación de centros de salud, UAPS, CIS, Clínicos y hospitales.

¹ Dalla_Honduras, 2020

- *Infraestructura Vial:* Habilitación, reposición de carreteras primarias, secundarias, carreteras terciarias (caminos vecinales), habilitación, reposición y reparación de puentes, puentes de doble vía cajas puentes, vados en caminos, construcción de obras de mitigación para proteger estructuras viales, rehabilitación de calles (pavimentadas y no pavimentadas), rehabilitación de caminos rurales de terracería, mantenimiento en los cauces de los ríos (incluye limpieza, dragado, etc.).
- *Infraestructura Escolar:* Rehabilitación, reparación y reposición de Centros de Educación de manera integral incluyendo obras ambientales y de mitigación.
- *Infraestructura Agua y Saneamiento:* Reparación o rehabilitación en estructuras de sistemas de agua potables (obras tomas, desarenadores, pases aéreos, tanques de almacenamiento, cajas de registro, rompe cargas, cajas distribuidoras de caudal, etc.), plantas de tratamiento y sistemas de aguas residuales, construcción de obras de mitigación para la protección de estructuras de los sistemas de agua potable y residuales, equipamiento de agua potable y residuales.
- *Infraestructura Comunitaria:* Rehabilitación de centros comunitarios y servicios públicos básicos (estación de bomberos, estaciones policiales, albergues, alcaldías, etc.), reposición de centros comunitarios, equipamiento para rehabilitación de centros comunitarios y servicios públicos básicos.

vii. Duración del Proyecto:

El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de 5 años y medio incluyendo actividades de gestión, socialización, adquisiciones, etc.

viii. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	175,537,263.00	1,116,987.87	1%
2022	259,608,231.00	53,027,150.75	20%
2023	432,092,852.00	74,670,210.35	17%

ix. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
AGUA Y SANEAMIENTO	0	3	16,694,229.82	0	0
EDUCACION	15	18	35,082,687.67	418	3,435
TOTAL	15	21	51,776,917.49	418	3,435

x. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios directos 2023
COMAYAGUA	1	4	16,295,122.40	29	538
COPAN	1	0	799,800.44	13	19
CORTES	5	4	6,599,400.47	126	1,592
EL PARAISO	1	0	2,085,819.45	24	96
FRANCISCO MORAZAN	3	5	10,973,773.01	108	830
INTIBUCÁ	1	0	686,535.63	12	27
LA PAZ	1	3	2,397,942.13	12	26
LEMPIRA	1	1	965,260.38	29	82
SANTA BARBARA	1	0	1,776,344.74	18	63
YORO	0	4	9,196,918.84	47	162
TOTAL	15	21	51,776,917.49	418	3,435

xi. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	7,741,870.30
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	15,151,422.56
TOTAL	22,893,292.86

xii. Situación presupuestaria

El presupuesto vigente aprobado para el año 2023 es de L432,092,852.00, reflejando al cierre del segundo trimestre una ejecución de 74,670,210.35 (17.28 %).

Así mismo, a partir de las revisiones y reprogramaciones de actividades en el Plan Operativo Anual (POA) y en el Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC), se solicitaron modificaciones presupuestarias internas entre actividades y objetos del gasto, sin modificarse el presupuesto global vigente.

El 88% del presupuesto está concentrado en el Componente 2 para ejecución de obras de las cuales 25 obras de reposición/repación de centros educativos iniciaron su ejecución en el IV Trimestre del año 2022. En el II trimestre del presente año se han adjudicados 3 obras de agua y saneamiento y 11 obras de centros educativos. Las formulaciones de nuevas intervenciones se han continuado en todos los sectores, los cuales darán sus productos finales (obras terminadas) en el 2024.

Al 30 de junio del 2023 la ejecución financiera acumulada del Proyecto asciende a L 536,903,551 equivalentes a USD 22,072,213, que representa el 14.7 % del monto de Convenio, así:

Componentes	(a) Asignación Convenio Crédito		(b) = (c + d) Total Comprometido		(c) Comprometido ejecutado		(c) Comprometido por ejecutar **		(e) = (a - b) Disponible
	US\$	HNL	US\$	HNL	US\$	HNL	US\$	HNL	US\$
Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública	17,300,000	420,390,000	16,818,559	407,708,157	16,818,559	407,708,157	-	-	481,441
1) Categoría : Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, y costos operativos bajo la Parte 1 del Proyecto.	17,300,000	420,390,000	16,818,559	407,708,157	16,818,559	407,708,157	-	-	481,441
Rehabilitación y Construcción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos	121,700,000	2,957,310,000	4,380,748	107,821,974	2,025,873	49,897,210	2,354,876	57,924,763	117,319,252
2) Categoría: Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 2 del Proyecto	121,700,000	2,957,310,000	4,380,748	107,821,974	2,025,873	49,897,210	2,354,876	57,924,763	117,319,252
Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción	11,000,000	267,300,000	2,017,526	49,570,562	1,288,290	31,632,972	729,236	17,937,590	8,982,474
3) Categoría: Bienes, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 3 del Proyecto	11,000,000	267,300,000	2,017,526	49,570,562	1,288,290	31,632,972	729,236	17,937,589.65	8,982,474
Total	\$ 150,000,000	HNL 3,645,000,000	\$ 23,216,834	HNL 565,100,693	\$ 20,132,722	HNL 489,238,340	\$ 3,084,111	HNL 75,862,353	\$ 126,783,166

* Se aplica la tasa de L 24.3 establecida en el Documento del Proyecto (PAD) y en el presupuesto global en los Sistemas: SNIPH, UEPEX y Sistema Financiero del FHIS.

** Valores comprometidos con contrato

Para fines de control y seguimiento al costo administrativo (10%) del proyecto, el componente 3. se subdividió en el Sistema UEPEX/SIAFI en dos componentes/actividad presupuestaria (3. y 4.) con el nombre “Gestión y Administración del Proyecto”.

xiii. Desembolsos

Al 30 de junio se ha desembolsado la cantidad de US\$ 30,506,253.38 equivalente a L 741,153,147.13; representa el 20.3% del total del Crédito. Del total desembolsado USD\$ 16.8 millones equivalente a L 407,7 millones, corresponde a reembolso bajo el Componente 1. mediante pago directo a la SEFIN por actividades de respuesta inmediata realizadas por la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS).

Desembolso	Dólares	Lempiras
Anticipo Cuenta Designada del Proyecto Cta. 11101-20-000949-1 BCH)	13,687,694.00	333,444,989.71
Reembolso bajo Componente 1, con Pago Directo a la SEFIN. (Cta. 11101-20-000952-1)	16,818,559.38	407,708,157.42
Total	30,506,253.38	741,153,147.13

xiv. Estado de la Cuenta Especial

Al 30 de junio de 2023 se ha ejecutado el 38% del monto total desembolsado a la Cuenta Especial del Proyecto, presentándose Justificaciones de Gastos por un total de \$ 1,198,131.88, que representa el 8.8 % de monto del anticipo. Los gastos efectuados y no documentados corresponden en su mayoría a servicios de consultorías, anticipos y estimaciones de inversión y supervisión de subproyectos:

Anticipo a la Cuenta Especial		USD 13,687,694
Menos:		
Gastos documentados	1,198,132	
Gastos efectuados aun no documentados	4,055,522	5,253,654
Saldo en cuentas bancarias del Proyecto*		8,434,040
*Saldo en cuentas bancarias		
Cuenta Especial No. 11101-20-000949-1 (BCH)		8,434,039
Libreta Pagadora en lempiras SIAFI No. 00220022130		1
Total		8,434,040

xv. Reasignación de fondos entre Categorías de Inversión.

Mediante Oficio No. SE-SEDECOAS-FHIS-620/2021 se solicita la primera reasignación de fondos entre Categorías de Inversión respaldada en Dictámenes Técnicos Favorables No. 057-2021 (septiembre 2021) y 068-2021 (noviembre 2021) emitidos por la SEFIN y aprobada por el Banco Mundial el 16 de diciembre de 2021.

La reasignación cubre el sobregiro de USD\$ 7,300,000 en el monto original asignado bajo la Categoría 1. del Componente 1. el cual es cubierto con el presupuesto de la Categoría 2. del Componente 2., tal como se muestra en el cuadro siguiente.

Categoría	Descripción de las categorías	Asignado Convenio Original	Reasignación	Asignación Actual
(1)	Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, y costos operativos bajo la Parte 1 del Proyecto.	10,000,000	7,300,000	17,300,000
(2)	Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 2 del Proyecto.	129,000,000	-7,300,000	121,700,000
(3)	Bienes, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 3 del Proyecto.	11,000,000	-	11,000,000
Total		\$150,000,000.00	\$0.00	\$150,000,000.00

xvi. Reembolso gastos efectuados bajo el Componente 1- Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia y Salud y Seguridad Pública.

Mediante Memorando 207-2021 SE-SEDECOAS-FHS del 11 de junio de 2021, se nombró Comité Interino para la revisión de documentación para reembolso del Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras, en cumplimiento a esto, al 31 de diciembre de 2021 se revisó documentación de procesos por un monto total de L591,952,044.29, de gastos ejecutados por la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS) y la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), en acciones de respuesta de socorro y atención a personas, así:

Institución	Lempiras
SEDIS	415.939.122,84
COPECO	176,012,921.45
Total	591,952,044.29

SEDIS: Del total de los gastos presentados, al 30 de junio de 2022 se han reembolsado con pago directo a la SEFIN un total de L 407,708,157.42 equivalente a USD 16,818,559.38, a través de Sistema de Desembolso (Client Connection). No se efectuarán más reembolsos.

COPECO: A la fecha ningún gasto se ha sometido a reembolso. Contratos de limpieza de calles están en proceso de revisión, y de ser elegibles, serán sometidos a reembolso con fondos del Contrato de Préstamo 5328 BL-HO, Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

xvii. **ADQUISICIONES**

Durante el segundo trimestre del 2023, se evaluaron los procesos para la contratación de 5 consultores que complementarán el equipo de la unidad ejecutora del proyecto.

En el tema de obras, se lanzaron los procesos de adquisición de 11 subproyectos educativos, 3 subproyectos de agua y saneamiento y el diseño de infraestructura vial para 25 municipios. Además, se encuentran en evaluación 6 subproyectos educativos.

Evaluación, No Objeción y Adjudicación de Contratos:

- ✓ Consultorías evaluadas y ejecutadas: 1) Auditor Interno, y 2) Inspector de Obras.

- ✓ En proceso de evaluación de las consultorías: Asistente de Coordinación, Gestor en Licenciamiento Ambiental, Control y Seguimiento Ambiental y Social, Ingeniero Electricista y Analista de Preintervención del Gasto.

xviii. **AVANCE DE ACTIVIDADES**

i. **Componente 1 - Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia y Salud y Seguridad Pública.**

A través de la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS) fueron atendidas 60,000 familias (equivalente a 300,000 personas) con kit de cocina, kit de higiene personal de niños y adultos, kit de limpieza, camas, estufas, filtros de agua, pañales, material de bioseguridad, toallas de baño, baldes plásticos, entre otros).

El componente 1, estuvo vigente del 2 de noviembre de 2020 al 8 marzo de 2021. Por tanto, durante la duración del proyecto no tendrá nuevas actividades a ejecutarse.

ii. Componente 2 - Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos (Obras).

Con el financiamiento de otras fuentes, el FHIS ha identificado zonas y sitios afectados por la tormenta Eta e Iota, con el fin de formular diseños finales para la rehabilitación y/o reconstrucción en infraestructura educativa, infraestructura vial (puentes) y en el sector de agua y saneamiento.

La Unidad Ejecutora del Proyecto a través de su personal técnico y con el apoyo de la Dirección de Proyectos del FHIS-SEDECOAS ha realizado revisiones a la formulación de los subproyectos priorizados, para verificar que estos estén cumpliendo con los lineamientos técnicos, ambientales, sociales, y otros relevantes que son parte de los compromisos adquiridos con el Banco Mundial.

A continuación, se detalla el estado de los avances y asuntos pendientes por sectores de intervención.

Infraestructura Educativa

- a) 25 subproyectos de reposición, reparación y ampliación de centros educativos adjudicados por un monto de L85,205,034.43 y para la supervisión L 9,862,732.25. Las obras han dado inicio en noviembre de 2022. La ejecución al cierre del 2do trimestre 2023 es de L25,230,389.86.
- b) Un segundo paquete consta de 11 subproyectos que en el segundo semestre se adjudicaron y darán inicio en el mes de julio por un monto de L74,308,862.15. La ejecución al cierre del 2do trimestre 2023 es de L9,852,297.81.
- c) Un tercer paquete de 33 subproyectos se encuentra en reformulación por los técnicos del proyecto. El monto presupuestado es de L124,900,000.00.
- d) Un cuarto paquete de 41 subproyectos se encuentra pendiente de reformulación próximos a ser abordados por los técnicos del proyecto por un monto aproximado de L134,503,621.56.

Sector de Agua y Saneamiento

- a. 3 subproyectos de agua y saneamiento han sido evaluados y adjudicados en el segundo trimestre el año. El monto de contrato es de L80,013,832.68. Al cierre del segundo semestre se han ejecutado los anticipos, por un monto total de L16,694,229.82
- b. 9 subproyectos de agua y saneamiento se encuentran en reformulación con un monto presupuestado de L. 274,282,300.00.

Infraestructura vial

- a. 8 subproyectos viales se encuentran en proceso de reformulación para incluir actividades de medidas ambientales y de mitigación. El monto de presupuesto es de L. 95,996,000.00.

Infraestructura de salud

- a. Un subproyecto de salud se encuentra en proceso de reformulación. El monto de presupuesto es de L. 5,500,000.00.

Resultados

- 25 subproyectos de infraestructura educativa en ejecución, de los cuales 15 han culminado para el cierre del segundo trimestre.
- La supervisión de los 25 subproyectos se desarrolla a la par de la ejecución.
- Priorización de lista de subproyectos que requieren intervención enviado por la Dirección de Proyectos para siguiente fase de rehabilitación y reconstrucción de escuelas.



En reformulación: 9 subproyectos de agua y saneamiento (Sistemas de agua potable 7 y Sistemas de alcantarillado sanitario 2), 8 subproyectos viales y 1 subproyecto de salud.

- Caracterización ambiental y social con su respectiva elaboración de PGAS para 17 subproyectos de centros educativos, 3 de agua y saneamiento y 5 subproyectos viales.

iii. **Componente 3 - Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.**

- Seguimiento de inspectoría, ambiental, social y de seguridad social a los 25 subproyectos en ejecución.
- Seguimiento al Mecanismo de Quejas, Marco de Reasentamiento y Plan de Participación de Partes Interesadas.
- En proceso de Evaluación de técnicos para complementar al equipo técnico de la Unidad Ejecutora.

xix. **PROBLEMÁTICA**

Al final del II Trimestre 2023, ya se cuenta con los primeros subproyectos culminados, 11 centros educativos de 25 en ejecución desde noviembre de 2022, sin embargo, el inicio de obras no se ha dado con la agilidad esperada, por lo cual ha sido necesario ampliar algunos periodos de ejecución, lo que ha afectado el cumplimiento en la ejecución presupuestaria al II trimestre del 2023, alcanzado un porcentaje inferior a lo programado.

Los requerimientos del Banco Mundial en los expedientes y Planes de Gestión Ambiental y Social son más complejos para los subproyectos de agua y saneamiento por lo que demoró mayor tiempo subsanar estos documentos lo que se retrasó el lanzamiento de los respectivos procesos de adjudicación.

En conclusión, la UEP del proyecto PRE debe cumplir con los requerimientos del Banco Mundial y de la institución FHIS-SEDECOAS. Dicho cumplimiento, conlleva varias sesiones de revisión y subsanación lo que ralentiza el inicio de la ejecución de los subproyectos. Se considera que esto continuará sucediendo en

los primeros subproyectos de cada tipología ya que cada uno conlleva sus particularidades que no se han abordado anteriormente.

La mayoría de las formulaciones de los subproyectos efectuadas por formuladores externos y recibidas por el proyecto PRE carecen de análisis de gestión de riesgos: accesibilidad; obras de mitigación; hidrosanitarios; estabilización de taludes; medidas compensatorias, contra incendios, de comunicación y de señalización, y, requieren actualización de costos y cantidades de obra. Por lo que la reformulación toma bastante tiempo para tener los expedientes listos para licitarles.

CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA



✓ Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)

i. Antecedentes

El Estado de Honduras ha revalorizado la educación como elemento fundamental para el desarrollo integral de todos los hondureños, mediante la implementación de la Tercera Reforma Educativa, que responde a las expectativas de la sociedad, cuyos alcances se enmarcan en los objetivos No.1 y No.4 de la Visión de País 2010-2038; Plan de Nación 2010-2022; que estipulan: “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidados de previsión social” y “Honduras con un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo. Para la ejecución de esta Tercera Reforma, se aprueba en el año 2012, la Ley Fundamental de Educación y en el año 2014 sus 22 Reglamentos.

-Fortalecimiento de la Secretaría de Educación conforme a la Ley Fundamental de Educación (LFE), principalmente en dos aspectos: i) descentralizar funciones operativas en las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de Educación; y ii) fomentar la participación comunitaria en la gestión educativa, formulación y coordinación de los planes estratégicos, que apunten a mejorar la calidad educativa.

El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Educación, garantiza el derecho fundamental a la educación, el acceso a una educación de calidad en condiciones de equidad, sin discriminación de ninguna naturaleza en todos sus niveles. La Ley Fundamental de Educación recupera el espíritu de garantizar este derecho, estableciendo el compromiso de brindar educación gratuita en todos sus niveles; un año obligatorio en Educación Pre-Básica (tercer grado) y tres ciclos de Educación Básica (I, II y III ciclo). Con ello, se logra la meta establecida de país, que para el año 2038, Honduras debe elevar la escolaridad promedio a 9 años (1° a 9° grado), reconociendo que es necesario formar educandos para la

convivencia, derechos humanos, responsabilidad social, cuidado de las personas, entendimiento del entorno, protección del medio ambiente y la educación media ha sido considerada, hasta finales del siglo XX, como

el período de preparación de los jóvenes para el ingreso a la educación superior y también como la enseñanza que proporciona entrenamiento técnico-vocacional, preparando a los jóvenes para su inserción en la vida productiva. En general, la educación media tiene como propósito ofrecer la experiencia formativa para incorporarse al mundo del trabajo y/o proseguir estudios en el nivel de educación superior.

ii. Objetivo General

Fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros Educativos Media y sean promovidos con la calidad requerida.

iii. Focalización

El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.

iv. Beneficiarios

El Programa beneficiará 480 niños de Educación pre-básica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes.

v. Duración

Fecha de inicio de ejecución: 30 de marzo de 2021

Fecha de cierre: 30 de marzo de 2026

vi. Costo Total del Programa

Este es un esfuerzo de la Republica de Honduras, a través de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por US\$80,000,000.00 que tiene como meta llegar a la población educativa de los diferentes niveles que atiende el sistema educativo nacional.

vii. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	507,311,663.00	114,393,414.00	23%
2022	438,079,338.00	860,314.43	0%
2023	297,119,742.00	54,090,935.45	18%

viii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
EDUCACION	4	52	46,581,324.28	1,032	7,195
TOTAL	4	52	46,581,324.28	1,032	7,195

ix. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
COMAYAGUA	0	1	1,784,685.78	24	128
CORTES	0	15	11,899,000.29	312	2,483
OLANCHO	0	16	14,268,576.89	384	2,101
SANTA BARBARA	4	20	18,629,061.32	312	2,483
TOTAL	4	52	46,581,324.28	1,032	7,195

x. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	4,443,578.70
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	3,066,032.47
TOTAL	7,509,611.17

xi. Principales Logros II Trimestre

El periodo reportado que comprende del 01 de abril al 30 de junio del año 2023, se puede resumir a la ejecución:

1. Infraestructura y Equipamiento:

A la fecha, de los 113 Centros Educativos que cuentan con la No Objeción a la priorización por el BCIE, el estado de cada uno de ellos es el siguiente:

CENTROS ESCOLARES, PROGRAMA MIFE DETALLE DE PROYECTOS PRIORIZADOS						
No.	CODIGO FHIS	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE CE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBSERVACIONES
1	108979	ESCUELA	REPOSICIÓN ESCUELA RURAL NUEVA ESPERANZA	OLANCHO	JUTICALPA	
2	109022	ESCUELA	ESC. RURAL MIXTA UNION Y FUERZA	OLANCHO	MANGULILE	
3	108996	ESCUELA	REPARACIÓN ESCUELA RURAL MIGUEL MORAZAN	OLANCHO	MANTO	
4	109025	ESCUELA	REPOSICION ESCUELA RURAL ALVARO CONTRERAS	OLANCHO	MANTO	
5	108978	ESCUELA	REPARACIÓN ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS	OLANCHO	SALAMÁ	
6	108990	ESCUELA	REPARACIÓN ESCUELA LUIS LANDA	OLANCHO	SAN FRANCISCO DE BECERRA	
7	108995	CEB	DIONISIO DE HERRERA	OLANCHO	SAN FRANCISCO DE LA PAZ	
8	108981	ESCUELA	REPARACIÓN ESCUELA JUAN LINDO	SANTA BÁRBARA	ARADA	
9	109002	ESCUELA	REPARACIÓN ESCUELA VICTORIANO PERDOMO	SANTA BÁRBARA	AZACUALPA	
10	108583	CEB	REPARACIÓN CEB FRANCISCO MORAZAN	SANTA BÁRBARA	CHINDA	
11	108980	ESCUELA	REPOSICIÓN ESCUELA GENARO MADRID PAZ	SANTA BÁRBARA	CONCEPCIÓN DEL NORTE	
12	108982	ESCUELA	REPARACIÓN ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS	SANTA BÁRBARA	CONCEPCIÓN DEL NORTE	
13	108983	ESCUELA	REPARACIÓN ESCUELA RURAL MIXTA MISAEAL ARNALDO BUESO MOREL	SANTA BÁRBARA	CONCEPCIÓN DEL NORTE	
14	108418	CEB	REPARACIÓN CEB JOSE CECILIO DEL VALLE	SANTA BÁRBARA	ILAMA	
15	109006	ESCUELA	REPARACIÓN ESCUELA RURAL MIXTA ESCUELA LEONIDAS RIVERA	SANTA BÁRBARA	ILAMA	
16	109011	ESCUELA	REPOSICIÓN ESCUELA OSCAR MEJIA URQUIA	SANTA BÁRBARA	NUEVA FRONTERA	
17	109007	ESCUELA	REPOSICIÓN ESCUELA RURAL MIXTA ESTEBAN GUARDIOLA	OLANCHO	CAMPAMENTO	
18	109016	MEDIA	REPOSICIÓN ESCUELA JUAN J. CASTRO	OLANCHO	CAMPAMENTO	
19	109005	ESCUELA	REPARACIÓN ESCUELA CRISTOBAL COLON	OLANCHO	GUAYAPE	
20	109009	ESCUELA	REPOSICIÓN ESCUELA EFRAIN CRUZ	OLANCHO	JUTICALPA	
21	108993	CEB	REPOSICIÓN CEB MANUEL J. VARGAS	OLANCHO	LA UNION	
22	108999	CEB	REPOSICIÓN CEB 1 DE MAYO	OLANCHO	MANGULILE	
23	109004	CEB	REPARACIÓN C.E.B ANGEL G. HERNANDEZ	OLANCHO	SALAMA	
24	109019	ESCUELA	REPARACIÓN ESCUELA RURAL MIXTA ALEJANDRO AGUILAR	OLANCHO	SAN FCO DE LA PAZ	
25	108994	ESCUELA	REPARACIÓN ESCUELA BENIGNO RAMON IRIAS	OLANCHO	SANTA MARÍA DEL REAL	
26	109014	CEB	REPARACIÓN CEB CORONEL HERNAN ACOSTA MEJIA	OLANCHO	SANTA MARÍA DEL REAL	
27	109029	ESCUELA	REPOSICION ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA	SANTA BÁRBARA	ARADA	
28	109018	CEB	REPARACIÓN CEB DIONISIO DE HERRERA	SANTA BÁRBARA	ATIMA	

No.	CODIGO FHIS	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE CE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBSERVACIONES
29	109001	ESCUELA	REPARACIÓN ESCUELA RURAL MIXTA JUAN LINDO	SANTA BÁRBARA	AZACUALPA	
30	108581	ESCUELA	REPOSICIÓN ESCUELA JOSE ROSENDO MUÑOZ TROCHEZ	SANTA BÁRBARA	CONCEPCIÓN DEL SUR	
31	109030	CEB	CENTRO EDUCACION BASICA EL PROGRESO	SANTA BÁRBARA	NUEVA FRONTERA	
32	108868	ESCUELA	REPARACIÓN ESCUELA URBANA MIXTA MANUEL F. RODRIGUEZ	SANTA BÁRBARA	PETOA	
33	108357	MEDIA	REPARACIÓN CEMGENMANUEL	SANTA BÁRBARA	PETOA	
34	108986	ESCUELA	REPARACIÓN ESCUELA JOSE ANIBAL RAPALO	SANTA BÁRBARA	PROTECCIÓN	
35	107479	MEDIA	LA CEIBA	ATLANTIDA	LA CEIBA	
36		MEDIA	4 DE SEPTIEMBRE	COLON	SABA	
37		MEDIA	ALEJANDRO ALFARO ARRIAGA	COMAYAGUA	ESQUIAS	
38		MEDIA	MARCO AURELIO SOTO	COPAN	CUCUYAGUA	
39		MEDIA	JUVENTUD OCCIDENTAL	COPAN	FLORIDA	
40		MEDIA	EULOGIO GALEANO TREJO	SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	
41		MEDIA	SAN JOSE	COPAN	SAN JOSE	
42		MEDIA	INSTITUTO JULIA ZELAYA	CHOLUTECA	MARCOVIA	
43		MEDIA	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESA	FRANCISCO MORAZÁN	DISTRITO CENTRAL	
44		MEDIA	JOHN F. KENNEDY	INTIBUCA	JESÚS DE OTORO	
45		MEDIA	JOSÉ CECILIO DEL VALLE	OLANCHO	SANTA MARÍA DEL REAL	
46		MEDIA	INSTITUTO SALATIEL ROSALES	OLANCHO	PATUCA	
47	108963	ESCUELA	REPARACIÓN ESCUELA NOHEMI FERRERA DE GARCIA	CORTÉS	CHOLOMA	
48	109038	ESCUELA	REPARACION CEBG MARCO AURELIO SOTO	CORTÉS	OMOA	
49	108956	CEB	REPARACIÓN CEB MERCEDES FLORES CASTILLO	CORTÉS	POTRERILLOS	
50	108957	CEB	REPARACIÓN CEB MIGUEL PAZ BARAHONA	CORTÉS	POTRERILLOS	
51	109036	ESCUELA	REPARACION ESCUELA RAMON ROSA	CORTÉS	PUERTO CORTÉS	
52	108966	CEB	REPOSICIÓN CEB PROF. RAFAEL PINEDA PONCE	CORTÉS	SAN PEDRO SULA	
53	108998	CCEPB	SUMNISTRO DE MOBILIARIO CEPB JARDIN DE NIÑOS DR. ALFONSO LACAYO	CORTÉS	SAN PEDRO SULA	FUE EJECUTADO POR OTRO PROGRAMA DE FHIS
54	108959	CEB	REPARACIÓN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	CORTÉS	VILLA NUEVA	
55	108961	ESCUELA	REPOSICIÓN ESCUELA SUPERACION	CORTÉS	VILLA NUEVA	
56	109026	ESCUELA	REPARACIÓN ESCUELA UNION Y FUERZA	OLANCHO	GUAYAPE	
57	108992	CEB	REPARACIÓN CEB PRESENTACION CENTENO	OLANCHO	LA UNION	
58	109024	ESCUELA	REPARACIÓN ESCUELA MARIA AUXILIADORA	OLANCHO	MANTO	
59	107844	ESCUELA	REPARACIÓN ESCUELA URBANA MIGUEL ANGEL BUESO	SANTA BÁRBARA	CONCEPCIÓN DEL NORTE	
60	108353	ESCUELA	REPOSICIÓN ESC. MANUEL BONILLA	SANTA BÁRBARA	PROTECCIÓN	
61	108997	ESCUELA	REPARACION ESCUELA TIMOTEO SABILLON RIVERA	SANTA BÁRBARA	PROTECCIÓN	

No.	CODIGO FHIS	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE CE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBSERVACIONES
62	109008	ESCUELA	REPARACIÓN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	SANTA BÁRBARA	PROTECCIÓN	
63	108985	ESCUELA	REPOSICION ESCUELA RURAL MIXTA CARLOS RIVERA	SANTA BÁRBARA	QUIMISTAN	
64	108984	ESCUELA	REPARACIÓN ESCUELA RURAL MIXTA 18 DE NOVIEMBRE	SANTA BÁRBARA	QUIMISTAN	
65	109012	CEB	CEB JOSE SANTOS GUARDIOLA + CCEPREBB MUNDO INFANTIL	SANTA BÁRBARA	QUIMISTAN	
66	108572	CEMG	AMPLIACIÓN CEMG SUPERACIÓN	SANTA BÁRBARA	QUIMISTAN	
67	109000	CEB	REPARACIÓN CEB GILBERTO ORLANDO LANZA	SANTA BÁRBARA	SAN JOSE COLINAS	
68	109020	ESCUELA	REPARACION ESCUELA RURAL MIXTA PERFECTO H BOBADILLA	SANTA BÁRBARA	SANT A BARBARA	
69	108460	CEPB	REPARACION CEPB MANUEL DE JESUS VALENCIA	CORTÉS	LA LIMA	
70	108613	CEPB	REPOSICION CEPB ESTEBAN GUARDIOLA	CORTÉS	LA LIMA	
71	108460	CEPB	REPARACION CEPB MANUEL DE JESUS VALENCIA	CORTÉS	LA LIMA	
72	108320	CEB	REPOSICION CEB GUBERNAMENTAL MODESTO RODAS ALVARADO	CORTÉS	LA LIMA	
73	108468	CEB	REPARACION CEB GUBERNAMENTAL DARIO DE TURCIOS	CORTÉS	LA LIMA	
74	108389	CEB	REPARACIÓN CEB FERNANDO NARANJO	CORTÉS	SAN PEDRO SULA	
75	108585	CEB	REPARACIÓN CEBG ESMERALDA QUIROZ DE MADRID	CORTÉS	SAN PEDRO SULA	
76	108388	CEB	REPARACIÓN CEB HÉCTOR GUILLERMO GUILLEN	CORTÉS	SAN PEDRO SULA	
77	108622	ESCUELA	REPARACIÓN ESCUELA ARMANDO ALTAMIRA	CORTÉS	SAN PEDRO SULA	SE DUC PIDIO DESCARTARLO
78	108521	CEB	REPARACIÓN CEB ING. ROBERTO LARIOS SILVA	CORTÉS	SAN PEDRO SULA	
79	108889	CEB	REPARACIÓN CEB GUBERNAMENTAL JOHN F. KENNEDY #2	CORTÉS	SAN PEDRO SULA	
80	108887	CEB	REPARACIÓN CEB JUAN LINDO	CORTÉS	SAN PEDRO SULA	
81	108617	CEB	REPARACIÓN CEB PETRONILA BARRIOS CABAÑAS	CORTÉS	VILLA NUEVA	
82	107298	PRE-BÁSICA-JARDINES	RECONSTRUCCIÓN JARDIN DE NIÑOS SAGRADO CORAZON	COMAYAGUA	COMAYAGUA	
83		MEDIA	CENTRO TECNICO VOCACIONAL PEDRO NUFIO	EL PARAISO	DANLI	
84		MEDIA	INSTITUTO TECNICO ALEJANDRO FLORES	EL PARAISO	EL PARAISO	
85		PRE-BÁSICA-JARDINES	MARIA ELENA I DE HERNANDEZ	LEMPIRA	GUARITA	
86		MEDIA	GABINO VASQUEZ ARGUETA	YORO	SANTA RITA	
87		MEDIA	19 DE DICIEMBRE	COLON	SONAGUERA	
88		MEDIA	6 DE ABRIL	OLANCHO	DULCE NOMBRE DE CULMIN	
89		MEDIA	SAN JORGE DE OLANCHO	OLANCHO	JUTICALPA	
90		MEDIA	AGRICOLA JHON F. KENNEDY	ATLANTIDA	SAN FRANCISCO	
91		BASICA	LUIS LANDA	VALLE	NACAOME	

No.	CODIGO FHIS	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE CE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBSERVACIONES
92		MEDIA	ESC. AGRIC. POMPILIO ORTEGA	SANTA BÁRBARA	MACUELIZO	
93		MEDIA	INST. POLIV. INFANTA CRISTINA DE BORBON	LA PAZ	YARULA	
94		BASICA	ESCUELA AGRICULTURA VALLE DE SULA (ARMANDO ALT AMIRANO PENA)	CORTÉS	SAN PEDRO SULA	
95		MEDIA	TECNICO SANTA CRUZ	CORTÉS	SANTA CRUZ DE YOJOA	
96		MEDIA	INSTITUTO DEPARTAMENTAL LA FRATERNIDAD	OLANCHO	JUTICALPA	
97		MEDIA	AGROTECNICA DE ORIENTE REYNALDO SALINAS LOPEZ	EL PARAISO	JACALEAPA	
98	108987		DOMINGA CHIRINOS DE BONILLA	OLANCHO	SAN FRANCISCO DE BECERRA	
99	109027		LUIS BOGRAN	SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	
100		BASICA	PABLO PEREZ MURIILLO	SANTA BÁRBARA	TRINIDAD	
101		MEDIA	MARCO AURELIO SOTO	VALLE	GOASCORAN	
102		BASICA	JOHN F. KENNEDY	ATLANTIDA	TELA	
103		MEDIA	HIBUERAS	FRANCISCO MORAZÁN	DISTRITO CENTRAL	
104		MEDIA	SISTEMA DE CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y AGRÍCOLA SCITA	COMAYAGUA	COMAYAGUA	
105			RAMONA TEJEDA	OLANCHO	SANTA MARÍA DEL REAL	
106			PATRIA	CORTÉS	VILLA NUEVA	
107			PEDRO NUFIO	OLANCHO	MANTO	
108			INSTITUTO FROYLAN TURCIOS	OLANCHO	SAN FRANCISCO DE BECERRA	
109			DIONISIO DE HERRERA	OLANCHO	SAN FRANCISCO DE BECERRA	
110			OSWALDO LOPEZ ARELLANO	OLANCHO	SAN FRANCISCO DE BECERRA	
111			PROFA. GLADYS EMERITHA MUÑOZ	OLANCHO	SAN FRANCISCO DE BECERRA	
112			ESCUELA FLORENCIO MARTINEZ	SANTA BÁRBARA	PROTECCION	
113			JOHN ARNOL COOK PROHECO	CORTÉS	VILLA NUEVA	

NOTA: De este listado de aprobaciones dos Centros Educativos serán dados de baja

Actualmente, se tiene 25 de proyectos en ejecución y 27 para orden de inicio, 18 proyectos aprobados, 13 está en revisión de control de calidad y el resto de los 113 están en proyección de ser intervenidos por parte del programa; los que cuenta con No Objeción es de acuerdo a la priorización de diseños.

- Se tiene en ejecución los primeros 8 proyectos de obras contratado del lote (Empresas) COT- FHIS-23-2022, por un valor de L 30,649,124.43, y pagado L 9,790,729.98 (32%) de los cuales 3 proyectos están ubicados en el departamento de Olancho y 5 en el departamento de Santa Barbara.
- Seguidamente se tiene 16 proyectos de obras contratos del lote (Empresas) COT-FHIS-28-2022, por un valor contratado de L 66,354,557.84 y una ejecución de L 16,219,178.71 y un proyecto

contratado del lote (Empresa) COT-FHIS-29-2022, por un valor L 8,923,428.89 y una ejecución L 1,784,685.78. De los primero 16 proyectos, 8 están ubicados en el departamento de Olanchó y 8 en el departamento de Santa Bárbara y 1 en el departamento de Comayagua.

- En relación al lote de los 27 proyectos de obras se encuentra en procesos de Orden de Inicio (Empresas) COT-FHIS-32-2022, por un valor Contratado de L 111,920,575.92 ubicación de los proyectos 15 en el departamento de Cortes, 5 en el departamento de Olanchó y 7 en el departamento de Santa Bárbara. Cabe mencionar, con los 4 procesos antes descritos, suman 52 proyectos que generan un compromiso por un monto total de L 217,847,686.38. y pagado L 46,581,324.28.

2. Gestión y Administración:

De Gasto Operativo se ha pagado un total de L 2,374,607.90 por concepto de Honorario profesionales a Recurso Humano que conforma la Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

3. Supervisión y Auditoría:

En relación a la contratación de supervisión, para 8 proyectos lote (Empresas) CPN-FHIS-31-2022, tiene un valor de contratación de L 3,210,698.68 y pagado L 535,764.18, para los 16 proyectos lote (Empresas) CPN-FHIS-43-2022, por un valor contratado de L 9,225,466.52 y pagado L 1,315,162.85, para 1 proyecto lote (Empresa) CPN-FHIS-45-2022 L 1,280,281.10 y para 27 proyectos lote (Empresas) CPN-FHIS-53-2022 L. 9,850,677,59.00, el total de los 4 procesos, tiene un costo total de L 23,475,405.11. y a la fecha se ha pagado L 1,888,744.90

xii. LOGROS

- ✓ 21 proyectos en ejecución.
- ✓ 4 proyectos finalizados
- ✓ 27 proyectos contratados y en proceso de orden de inicio.
- ✓ 14 proyectos formulados y para aprobación del SEDUC y posteriormente para el inicio del proceso de Contratación y Adjudicación.

- ✓ Presentación de propuesta para reducir los tiempos dentro del Ciclo de Proyectos FHIS.
- ✓ Unidad Coordinadora construida en un 70 %.

xiii. PROBLEMATICA

Procesos lento de parte de los contratistas de obras firmadas supervisoras en la presentación en estimaciones de pagos.

✓ **Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira.**

i. Antecedentes.

El Estado de Honduras ha revalorizado la necesidad de mejorar el servicio de suministro de agua potable en la ciudad de Gracias, mediante la implementación de un sistema de abastecimiento de agua potable cuyos alcances se enmarcan en los objetivos No.3 y No.4 de la Visión de País 2010-2038; Plan de Nación 2010-2022; que estipulan: “Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental” y “Honduras con un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo”.

Según la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento, El Estado, como responsable de propiciar el bienestar económico, político, social y cultural de los hondureños, es responsable de cuatro funciones básicas: 1. Garantía de acceso a servicios de Agua Potable y Saneamiento de calidad y con eficiencia a la población. 2. Ampliación de la cobertura del servicio, especialmente en comunidades rurales y en comunidades urbanas de escasos recursos. 3. Garantía, bajo principio de solidaridad, de acceso al agua potable a sectores excluidos del servicio por razones de pobreza. 4. Gestión de recursos para el desarrollo de servicios de agua potable y saneamiento, estableciendo las prioridades, los criterios de recuperación de inversiones, asignación de capital, acorde con capacidades financieras respectivas.

ii. Objetivo

El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los servicios de agua potable para la población del municipio de Gracias, Departamento de Lempira, aumentando la cantidad y la calidad del agua suministrada, a través de la ampliación del sistema de abastecimiento, mediante el desarrollo de la infraestructura hidráulica.

iii. Localización

El Proyecto estará localizado en la Ciudad de Gracias en el Departamento de Lempira.

iv. Beneficiarios

El Proyecto beneficiará 22,681 personas en el año 2022 de los cuales 11,005 son hombres y 11,676 son mujeres y en un periodo de 40 años lo estarían alcanzando un estimado de 76,889 personas.

v. Duración

La duración del Proyecto es de 4.1 años (49.2 meses) incluyendo actividades de gestión, socialización, adquisiciones, ejecución, etc. Y se estima además 2 años para la operación y mantenimiento antes de hacer el traspaso a la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento de Gracias (UMASG).

vi. Situación Actual del Proyecto

El proyecto ha logrado dar cumplimiento a las condiciones previas al primer desembolso, y el 20 de diciembre se recibió el mismo por US\$1,617,085.33, valor necesario para hacer frente a los compromisos del proyecto en los próximos 6 meses.

Se requiere llevar a cabo la revisión del diseño.

vii. Fuente Financiera

Este es un esfuerzo de la República de Honduras, a través de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por US\$36,000,000.00 que tiene como meta llegar a la población de Gracias, Lempira.

viii. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2022	193,172,460.00	28,412,086.07	15%
2023	69,816,382.00	1,646,915.94	2%

ix. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	-
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	1,646,915.94
TOTAL	1,646,915.94

x. Logros y avances del trimestre del proyecto

- En atención al Plan General de adquisiciones del Proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira” se tienen en desarrollo los contratos de las siguientes consultorías:
 - a) Contratación de Especialista en Adquisiciones
 - b) Es preciso destacar que la consultoría de Asistente de Legal ha sido interrumpida debido al fallecimiento de la consultora en fecha 21 de junio de 2023, se estará iniciando nuevamente el proceso de contratación.

- Se envió para aprobación de la Corporación Municipal de Gracias, Lempira el convenio para se suscrito entre la Alcaldía de Gracias, Lempira y el FHIS una vez fue aprobado por la Dirección Legal del FHIS en el marco del Proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”.

- Se recibió el 26 de junio de 2023 por parte de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) del Distrito Central los términos de referencia del proyecto “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sur-Oriente de Tegucigalpa”.

Lo anterior fue recibido con el propósito de preparar la solicitud de propuesta a entregar a las firmas consultoras que el FHIS Precalifico en el 2022, ya que actualmente se cuenta con disponibilidad presupuestaria por **veinte millones de lempiras (L 20,000,000.00)** de fondos nacionales para la contratación de la consultoría de diseño del proyecto “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sur-Oriente de Tegucigalpa”.

- Se continúan con el seguimiento al trámite de reformulación del presupuesto del contrato de préstamo No. 2261 Correspondiente al año 2023, en base a los cambios que se requieren para la ejecución del proyecto.
- Se trabajó en la preparación de documentos para que se inicien los siguientes procesos de adquisiciones del contrato de préstamo N°2261:
 - a) Especificaciones Técnicas para la compra de vehículo.
 - b) Especificaciones Técnicas del equipo de cómputo para consultores la unidad ejecutora
 - c) El 30 de junio se envió a No Objeción al BCIE la lista corta de firmas consultoras evaluadas por el comité respectivo y solicitud de propuesta en el marco del proceso de contratación del “Rediseño y Supervisión de Obras de Construcción para la Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”
 - d) Se elaboro los términos de referencia para la contratación de la auditoría externa del proyecto.

xi. Problemática presentada en el II trimestre 2023

- Hasta inicios del tercer trimestre se logrará iniciar con los procesos de adquisición para proporcionar al personal de la unidad ejecutora, la disponibilidad de vehículos, de equipo de computo a fin de contribuir en el desempeño para el desarrollo de sus funciones, los que no se podía adquirir, ya que se aprobó la disponibilidad presupuestaria hasta finales de II trimestre 2023.
- Se han tenido acercamientos con el BCIE para poder lograr iniciar los tramites preliminares que permitan la reorientación de los fondos remanentes del préstamo No. 2261 que no usarían, ampliando el alcance de los fondos a otros u otros municipios, por lo que se trabaja en mantener informado al BCIE para que apruebe la documentación con la que se harán la contratación de la firma consultora que diseñara el proyecto “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sur-Oriente de Tegucigalpa”, en base a una solicitud de la UMAPS, que permita eliminar el riesgo de requerimiento adicionales.

CARTERA KfW Entwicklungsbank



✓ Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V



i. Objetivo General

Consiste en la utilización de centros educativos mejorados, ampliados o nuevos y equipados bajo conceptos pedagógicos que operan de manera sostenible por la comunidad educativa. De esta manera se pretende contribuir a que niños/as y jóvenes de regiones pobres utilicen una oferta de alta calidad educativa, tanto formal como de educación vocacional.

ii. Focalización

Fase IV: El Área de intervención abarcará los departamentos que están siendo intervenidos en las fases anteriores (Zona de Occidente): 1) Copán, 2) Santa Bárbara, 3) Intibucá, 4) Lempira, 5) La Paz, 6) Ocotepeque. 7) Centros a nivel nacional en casos de emergencia (catástrofes naturales). La información de estos centros deberá ser actualizada en el plan maestro y sólo si se determina su precariedad, podrán ser intervenidos previo a No Objeción del KfW. 8) Adicionalmente se extenderá el área de intervención a los departamentos adyacentes a la zona de occidente, delimitando el área de intervención a través de la Carretera Panamericana. Los municipios a ser beneficiados se encuentran al oeste de la misma en los siguientes departamentos: 1) Choluteca, 2) Valle, 3) Francisco Morazán (exceptuando el núcleo urbano de Tegucigalpa), 4) Comayagua y adicionalmente 5) Gracias a Dios.

Fase V: El Área de intervención abarcará los departamentos de: Ocotepeque, Lempira y Copan, en la zona de Occidente. Además, los departamentos al oeste de la carretera CA-5 de los departamentos de Francisco Morazán (exceptuando el Distrito Central), Valle, Choluteca, Comayagua. También seguirá formando parte del Programa el Departamento de Gracias a Dios (siempre y cuando no se alcance un mínimo de infraestructura en este departamento y según las experiencias de la fase IV del PROMINE).

iii. Priorización de los Centros Educativos

Esta es realizada por la Secretaría de Educación apoyados en la herramienta del Plan Maestro de Infraestructura Educativa.

iv. Descripción del Proyecto

Fase IV: El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y en la planificación estratégica para los años 2014 - 2018 de la Secretaría de Educación (SE). El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las tres fases previas PROMINE I, II y III. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

Fase V: El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y el Plan Estratégico del Sector de Educación para los años 2017 - 2030 de la Republica de Honduras. El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las cuatro fases previas PROMINE I, II, III y IV. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

v. Monto del Proyecto:

Fase IV:

Fondos de Donación por un monto de EUR 15,000,000.00, Contrapartida Nacional para SEDECOAS/FHIS de EUR 424,000, Contrapartida Nacional para SE de EUR 218,000, Contrapartida Municipal de EUR 515,000 y Contrapartida Comunitaria de EUR 514,000.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 03/12/2015

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 17/02/2017

Fecha de Inicio: 02 de abril 2018 (Se considera la fecha de inicio de la Consultoría)

Fecha de Finalización de convenio: 31/07/2024

Fase V:

Fondos de Donación por un monto de EUR 10,000,000.00, Contrapartida Nacional para IDECOAS/FHIS de EUR 495,000, Contrapartida Nacional para SE de EUR 250,000, Contrapartida Municipal de EUR 600,000 Contrapartida Comunitaria de EUR 600,000.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 06/07/2018

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 21/03/2019

Fecha de Inicio: Inicio de la Consultoría 18 de marzo

Fecha de Finalización de convenio: 37 meses a partir del inicio de la consultoría

vi. Avance Financiero PROMINE FASE IV y V

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2016	145,687,475.00	142,916,817.45	98%
2017	107,279,375.00	96,731,967.93	90%
2018	53,035,502.00	50,951,601.81	96%
2019	81,069,633.00	79,762,875.76	98%
2020	134,608,478.00	123,221,616.32	92%
2021	139,936,980.00	119,695,679.72	86%
2022	102,757,410.00	66,787,201.74	65%
2023	127,957,113.00	32,410,269.12	25%

vii. Avance Físico por Sector PROMINE FASE IV y V

SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
EDUCACION	3	6	26,903,274.97	89	709
TOTAL	3	6	26,903,274.97	89	709

viii. Avance Físico por Departamento PROMINE FASE IV y V

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecucion 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
COMAYAGUA	0	0	11,510,084.07	0	0
COPAN	1	2	13,360,433.67	29	223
GRACIAS A DIOS	0	1	-	0	0
INTIBUCA	1	0	-	32	298
LA PAZ	0	1	142,051.20	0	0
LEMPIRA	1	2	1,890,706.03	28	188
TOTAL	3	6	26,903,274.97	89	709

ix. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	4,708,115.89
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA*	798,878.26
TOTAL	5,506,994.15
*Viaticos, pasajes y Combustible	

x. AVANCES GENERALES

▪ FASE IV.

El estatus físico para los 33 proyectos considerados en esta fase se detalla a continuación

Estatus	%	N° de Proyectos	Total, Contratado	Total, Ejecutado	Total, por Ejecutar
En ejecución	18.18%	6	L88,182,763.73	L76,232,459.65	L11,207,454.08
En proceso para envío a resolución de contrato	3.03%	1	L3,652,444.33	L4,204,231.52	L551,787.19
En resolución de contratos	12.12%	4	L18,623,674.36	L28,094,373.49	L9,470,699.13
Finalizado	45.45%	15	L146,202,698.92	L146,202,698.32	L0.00
Sin Iniciar	3.03%	1	L12,951,927.03	L6,487,960.72	L6,463,966.31
Suspendido	18.18%	6	L75,683,704.86	L69,978,802.68	L5,704,902.18
Total, general	100.00%	33	L345,297,213.23	L330,394,201.78	L14,903,010.85

En los proyectos de manera general se indica:

- 1) Los 5 proyectos en procesos de resolución en Gracias a Dios, se encuentran en Secretaria General los cuales estarán siendo remitidos a la Dirección de Control y Seguimiento para la modificación del Dictamen y la Liquidación según la Modificación #1 del Manual PEC- Mosquita. Por los cuales los montos que se detallan en el cuadro anterior podrán variar.
- 2) El proyecto en proceso de resolución de contrato, está siendo revisado conforme la Modificación del Manual PEC-Mosquitia, por la Dirección de Control y Seguimiento.
- 3) Se mantiene lo de los tres proyectos (107541,107492,107571) que presentan un tiempo considerado de ejecución, sin embargo, están suspendidos y en revisión física y financiera por parte de la nueva inspectoría.
- 4) El proyecto ejecutándose en Talgua, Lempira, mantiene el desfase físico con respecto a lo financiero se han aplicado la revisiones y pagos de órdenes de cambio pendientes y clausula por incremento de precios sin embargo siempre se mantiene un despase considerable.

▪ **FASE V.**

Estatus	%	N° de Proyectos	Total Formulado	Total Contratado	Total Ejecutado	Total por Ejecutar
En contrataciones	20.00%	2	L 38,621,759.88	L -	L -	L -
En formulación	10.00%	1	L 15,152,667.30	L -	L -	L -
Formulación finalizada	10.00%	1	L 25,000,000.00	L -	L -	L -
No factible	30.00%	3	L 54,332,393.56	L -	L -	L -
Sin Iniciar	30.00%	3	L 46,518,512.55	L 46,518,512.55	L.12,413,235.35	L12,799,387.97
Total general	100.00%	10	L 179,625,333.29	L 46,518,512.55	L.12,413,235.35	L12,799,387.97

Es estatus de los proyectos en la fase V:

- 1) Los proyectos aprobados en el mes de julio iniciaran su proceso de contrataciones, actualmente se está en la revisión y no objeción de los documentos estándares.

- 2) El proyecto con No Objeción del KfW en el mes de julio se estará sometiendo a aprobación del Comité de Operaciones, para su posterior inicio de proceso de contratación.
- 3) El proyecto de la Cerro Grande, Distrito Central, (formulación finalizada) está en proceso de revisión de la Alcaldía Municipal (AMDC) desde el mes de mayo razón por la cual no se ha solicitado su No Objeción, también se encuentra en revisión de la AMDC el convenio tripartido para los aportes locales.

xi. AVANCE FINANCIERO SEGÚN PRESUPUESTO ASIGNADO FASE VI Y FASE V

En relación a la meta financiera se cumplió conforme a la reprogramación realizada. Es importante resaltar que la ejecución del año será fuerte en el último trimestre considerado los procesos de licitación que se lanzaran en el III trimestre.

xii. LOGROS II TRIMESTRE

1. Se han finalizado los siguientes proyectos:

Código de Proyecto	Descripción Proyecto	Departamento	Municipio	Aldea
107716	AMPLIACION CEB JESUS MARIA RODRIGUEZ Y CEPB LA INDEPENDENCIA	COPAN	SAN JOSE	Vivistorio
107760	AMPLIACION CEB PEDRO NUFIO	INTIBUCA	INTIBUCA	Rio Colorado
107783	REPARACION CEB LUCILA PEREZ ESTRADA Y CEPB HECTOR JUAREZ	LEMPIRA	LA UNION	Las Peñas

2. Se cumplió con la meta de ejecución física y financiera a nivel de Proyecto según los reprogramado.

Descripción del Producto	Meta	REFORMULACION 2023		ESTATUS
		TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	
Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados FASE PROMINE	Financiera (LPS)	L2,032,000.00	L27,745,147.00	PROGRAMADO
	Física (CE)	0	2	
FASE PROMINE	Financiera (LPS)	L2,444,545.67	L29,965,723.45	EJECUTADO
	Física (CE)	1	2	

3. Se cuentan con un documento estándar para la contratación de obras y en ultimas revisiones del KfW los documentos para la contratación de la supervisión.
4. Se cuenta con el Acuerdo para la Implementación de la Modificación #1 del Manual PEC-Mosquita.

5. Se aprobaron 2/5 proyectos de las reformulaciones para los proyectos de Gracias a Dios.

xiii. RETOS PROXIMOS

- 1) Finalización de los proyectos problemas 107541,107492,107571 y 107912
- 2) Presentación del Informe de Auditoría Anual año 2022
- 3) Impulsar la ejecución física y financiera de los proyectos.
- 4) Impulsar la formulación de proyectos para la fase V

xiv. RECOMENDACIONES

- 1) Apoyo de Secretaria General, Dirección de Control y Seguimiento y Dirección Legal para la pronta Resolución de los contratos para los proyectos en Gracias a Dios
- 2) Mayor impulso en las gestiones de la Dirección de Control y Seguimiento para la finalización de los proyectos problema.

✓ **Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)
Fase II**



i. Objetivo General

Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).

ii. Focalización

A través de un proceso de concurso con criterios de selección predefinidos en el acuerdo separado y evaluación de propuestas técnicas alineadas a los componentes del programa fueron seleccionados 4 municipios en donde se está realizando la intervención del CONVIVIR a través de obras de infraestructura y medidas de alcance social para beneficio enfocado en la juventud. Así mismo se definieron los barrios, colonias o comunidades urbanas en donde se focaliza las acciones y en donde ya se ha realizado una labor de socialización de los alcances, compromisos y beneficios para la población. Los municipios seleccionados son:

- Municipio de Juticalpa, departamento de Olancho
- Municipio de Intibucá, departamento de Intibucá
- Municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá
- Municipio de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán

iii. Descripción del Proyecto

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

iv. Monto del Proyecto:

Los fondos destinados para la ejecución de este Programa para la Fase II es de EUR 6,000,000.00 Contrapartida Nacional para IDECOAS/FHIS de EUR 600,000.00, Contrapartida Municipal de EUR 300,000.00 Contrapartida Comunitaria de EUR 300,000.00.

Fecha de Inicio del Programa de convenio Fase II: 14/07/2021

v. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	19,897,004.00	8,372,701.20	42%
2022	44,370,387.00	26,573,808.83	60%
2023	62,408,091.00	6,266,498.65	10%

vi. Avance Físico por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023
EMPREDIMIENTO Y VALORES	0	0	1,424,896.36
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	0	7	1,702,284.40
TOTAL	0	7	3,127,180.76

vii. Avance Físico por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023
COPAN	0	2	781,795.19
INTIBUCÁ	0	3	1,563,590.38
OLANCHO	0	2	781,795.19
TOTAL	0	7	3,127,180.76

viii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	1,861,686.51
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	1,277,631.38
TOTAL	3,139,317.89

ix. LOGROS Y AVANCES

FASE	COMPONENTES			
	Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura	Fortalecimiento de Habilidades de jóvenes para el trabajo habilidades Sociales	Mejoramiento de Capacidades de Actores Relevantes	Materiales y Equipos de Capacitación
II*	7 proyectos en ejecución y con el 50% desembolsados	255 jóvenes fortalecidos en habilidades sociales	24 actores relevantes	-

**A. COMPONENTE 1 CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA-
AVANCE FISICO**

Tabla 1: Priorización de Barrios y/o Comunidades a Intervenir en el Municipio de Santa Rosa de Copán

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Plaza Juvenil Brisas de Copán (Obra de Confianza)	Barrio El Duende	4,256,435.99	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el 50%, en ejecución

2.	Casa de la Juventud	Barrio El Carmen	9,000,000.00	➤ SEDECOAS-FHIS realizara la formulación internamente por lo que se estima iniciar en febrero del 2023
3.	Plaza El Mirador – Santa Teresa	Barrio Santa Teresa, sector La Cuchilla	4,803,327.26	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el 50%
Monto Total de Inversión Estimado			18,059,763.25	

Tabla 2: Priorización de Barrios y/o Comunidades a Intervenir en el Municipio de Intibucá

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Parque La Pirámide (Obra de Confianza)	Barrio El Way, Sector No. 1	2,275,000.00	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el 50%
2.	THAU MISHU (Casa de La Juventud)	Colonia Guagua	10,400,000.00	➤ SEDECOAS-FHIS realizara la formulación internamente por lo que ya se inició con el proceso del anteproyecto
3.	Ruta Lenca de la Juventud	Barrio El Way	4,250,000.00	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el 50%, en ejecución.
Monto Total de Inversión Estimado			16,925,000.00	

Tercer Proyecto de Intibucá

Como se indicó en el Informe Trimestral anterior (Informe de Finalización de la Etapa de Preparación), como tercer proyecto de Intibucá se había identificado el proyecto denominado “*Construcción de Centro Deportivo Sustentable en la Comunidad de Ologosí*”. La Municipalidad realizó gestiones para que el terreno donde se ubicaría el proyecto pasara a ser propiedad de la Alcaldía, sin embargo, estas gestiones no prosperaron, por lo cual fue necesario identificar un proyecto alternativo.

El nuevo proyecto identificado se denomina “*Ruta Lenca de la Juventud*” y consiste en la rehabilitación de la acera peatonal ubicada en la calle principal en la salida a Siguatepeque, con el objetivo de, entre otros, brindar seguridad y movilidad vial a estudiantes, jóvenes y emprendedores del municipio de Intibucá.

Así también, por medio de esta obra se podrán vincular el Parque La Pirámide (Primer proyecto de Intibucá) con la THAU MISHU/Casa de La Juventud (Segundo Proyecto de Intibucá) de forma ordenada y segura.

Cabe mencionar que el proyecto “*Ruta Lenca de la Juventud*” del municipio de Intibucá se ubica frente al proyecto de La Esperanza denominado “Paseo Cultural Lenca”, por lo que está previsto realizar un proyecto integral que permita promover el trabajo en conjunto con las dos alcaldías y sus respectivas comunidades.

Tabla 3: Priorización de Barrios y/o Comunidades a Intervenir en el Municipio de La Esperanza

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Paseo Cultural Lenca (Obra de Confianza)	Colonia Buenos Aires	4,050,000.00	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el 50%
2.	Plaza de La Juventud Buenos Aires	Colonia Buenos Aires	7,500,000.00	➤ SEDECOAS-FHIS realizara la formulación internamente por lo que se estima iniciar en febrero del 2023
3.	Centro Deportivo Integral San Carlos	Colonia San Carlos	6,850,000.00	➤ SEDECOAS-FHIS tiene previsto iniciar la elaboración de los TdR para la contratación del Diseñador y Formulator en el mes diciembre 2022, con lo cual se estima finalizar dicha contratación a finales de enero 2023.
Monto Total de Inversión Estimado			18,400,000.00	

Tabla 4: Priorización de Barrios y/o Comunidades a Intervenir en Juticalpa

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Cancha ABE y BEN (Obra de Confianza)	Colonia La Solidaridad	2,250,000.00	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el 50%
2.	Centro de Formación Integral Juvenil	Barrio El Centro	10,800,000.00	➤ SEDECOAS-FHIS realizara la formulación internamente por lo que ya se inició con el proceso del anteproyecto
3.	Parque Recreativo de La Juventud	Aldea La Concepción	4,805,000.00	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el 50% ejecución.

Monto Total de Inversión Estimado	17,855,000.00	
--	----------------------	--

B. COMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES LABORALES Y SOCIALES DE JOVENES

En la semana del 2 al 6 de mayo 2022, SEDECOAS-FHIS realizó nuevamente una gira por los municipios de incidencia del Proyecto con el propósito de brindar acompañamiento a: (i) ANED Consultores, quienes trabajaron en el estudio de *Línea Base y el Diagnóstico de Necesidades Formativas para los y las Jóvenes* y (ii) Espirállica Research & Consulting, quienes llevaron a cabo la consultoría del *Diagnóstico de Necesidades e Intereses de Fortalecimiento para la Mejora de la Gestión Municipal enfocada en el Desarrollo de la Juventud* en las comunidades seleccionadas.

En esta gira las empresas consultoras socializaron los resultados de los estudios, diagnósticos y planes de formación, con la participación de Jóvenes, Líderes Comunitarios, Sociedad Civil, Entes Gubernamentales y Representantes de las Municipalidades.

El proceso de investigación de “Línea Base, Diagnóstico de Necesidades de Juventud y Propuesta de Plan para el Fortalecimiento de las Necesidades de Formación para Jóvenes” encargado a la empresa de consultoría ANED Consultores ha concluido con la aprobación de sus productos por parte del equipo de La SEDECOAS-FHIS y La Asistencia Técnica. A la fecha de cierre del presente Informe estos documentos se encuentran en proceso de diagramación final para dar por concluido este proceso de consultoría.

Se realizó convenio con FIPADEH el cual se desembolsó el 70% para la ejecución de los talleres con juventud en los municipios de CONVIVIR.

Se inició con la elaboración de lineamientos y propuesta para la suscripción de un convenio con INFOP para el fortalecimiento de habilidades laborales.

x. Desafíos de CONVIVIR:

1. **Concienciar** a la población meta (constituida por la juventud entre 12 y 30 años) para el logro del objetivo general y específico del programa.

2. Lograr la participación ciudadana y los gobiernos locales de los municipios del área de influencia del programa para contribuir a la efectividad del trabajo de los jóvenes participantes.
3. Impulsar iniciativas de capacitación y de proyectos empresariales para generar autoempleo y contrarrestar el flujo migratorio a los centros urbanos del país y al exterior.
4. Lograr el cumplimiento de los plazos establecidos en el ciclo de proyectos FHIS, para la ejecución de los proyectos según lo programado.

CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)



✓ Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)

A. Objetivo General

El propósito de esta Actividad es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

B. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en las cinco municipalidades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Tela y La Ceiba. Las comunidades específicas de intervención serán identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

C. Descripción del Proyecto

Esta Actividad ayudará al GdeH (representado a través de FHIS) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otras partes interesadas. La Actividad incluye dos resultados complementarios: Resultado 1: Mejora de la infraestructura comunitaria, las actividades responderán a las prioridades de infraestructura comunitaria para abordar la seguridad ciudadana.

Resultado 2: Aumento de la cohesión comunitaria, considera que la forma en que las intervenciones de infraestructura son concebidas, diseñadas y ejecutadas pueden desempeñar un papel directo en el aumento de la cohesión social y comunitaria y promover un marco holístico de prevención de la violencia. Los proyectos bajo la Actividad incluirán instalaciones educativas, centros de salud, alumbrado público, espacios comunitarios más seguros, centros de alcance y comunitarios, centros vocacionales, jardines comunitarios, parques, espacios recreativos, paradas de buses, accesos peatonales, mejoras al alumbrado de calles, señalización, instalaciones para el sector seguridad y justicia, así como otros proyectos de infraestructura de pequeña escala que se acuerde entre las Partes.

D. Monto del Convenio

Presupuesto total estimado: \$14,637, 541.74, de los cuales, fondos de donación de USAID: \$11, 710,033.39; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$ 2, 927,508.35 (efectivo: \$ 2,127,508.35 y especies: \$ 800,000.00).

i. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	23,226,555.00	21,906,553.68	94%
2019	60,781,669.00	60,781,669.00	100%
2020	145,322,291.00	60,678,681.68	42%
2021	67,508,910.00	42,626,620.46	63%
2022	57,711,016.00	55,047,658.54	95%
2023	70,204,050.00	33,230,011.43	47%

ii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
PREVENCIÓN SITUACIONAL/CONVIVENCIA	2	5	6,703,158.72	83	1,206,881
EDUCACION	4	16	13,599,503.50	168	10,375
TOTAL	6	21	20,302,662.22	251	1,217,256

iii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
ATLANTIDA	3	5	6,502,910.36	60	2,990
COMAYAGUA	0	2	87,599.40	21	1,033
CORTES	3	9	10,814,293.33	121	8,024
FRANCISCO MORAZAN	0	5	2,897,859.13	49	1,205,209
TOTAL	6	21	20,302,662.22	251	1,217,256

iv. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	11,890,631.05
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	1,036,718.16
TOTAL	12,927,349.21

v. Principales Logros (abril-junio 2023)

A. COMPONENTE TECNICO

Entregables trimestrales correspondientes al año 2023

Categoría	Unidad de medida	Ejecución Física al 28-feb-2023	Proyección 2023				Ejecutado		% de cumplimiento	
			Total I trimestre	Total II trimestre	Total III trimestre	Total IV trimestre	Total I trimestre	Total II trimestre	Total I trimestre	Total II trimestre

Proyectos sector Educación.	Proyectos	25	4	4	7	1	2	2	50%	50%
Proyectos sector Salud.	Proyectos	10	1	1	1	2	1	0	100%	0%
Proyectos sector justicia/Espacios recuperados	Proyectos	26	0	1	0	1	0	1	N/A	100%
		Total 23 Proyectos					7			

Para el Sector Educación se finalizaron 2 de 4 proyectos, Espacios Recuperados 1 proyecto, Sector Salud se finalizó físicamente 1 proyecto, sin embargo, no se ha logrado cerrar debido a un trámite con la ENEE.

PROYECTOS FINALIZADOS ICS							
2DO TRIMESTRE 2023							
Renglón de Inversión	Categoría	Actividad	Modalidad de contratación	Proyectos finalizados en el 2do Trimestre 2023			
				Unidad de Medida	Programado (POA)	% Ejecutado	Comentarios
A Inversión de Proyectos	Proyectos sector Educación	Reparación CEB Claudio Barrera - Fase III 108882	PEC	Obra		1	Inaugurado
		Reparación CCPREB La Unidad (frente a los Juzgados), Col. La Granja, Choloma, Cortes 108861	PEC	Obra		1	Inaugurado
		Subtotal			4	2	
	%				50		
	Proyectos sector justicia/	Reparación y Equipamiento CDA 24 de Abril, Cortes 108888	PEC	Obra		1	

Espacios recuperados	Sub Total			1	1	
	%				100	
Proyectos sector Salud.	Suministro e instalación de Generador Almacén Regional de Biológicos de la RMDC - Bodega Ultra Frío	Contratista	Obra		0	Proyecto finalizado físicamente, en proceso de conexión entre SESAL y ENEE
	Sub Total			1	0	
	%				0	
	TOTAL				50	

Para el segundo trimestre del 2023, se tenía programado dar orden de inicio a 6 proyectos en el sector educación de los cuales solo se pudo dar a 5, en el sector salud se programó y se dio inicio a 1 proyecto, y en el sector justicia se tenía proyectado dar orden de inicio a 3 proyectos de los cuales se le pudo dar a 2. De forma general logramos cumplir el 80 %.

Categorías	Actividades	Modal dad contratación	Proyectos Iniciados en el 2do Trimestre 2023			
			Unidad de Medida	Programado (POA)	Real	Comentarios
Proyectos sector Educación	Reparación del Instituto Modesto Rodas Alvarado y construcción de obras varias FASE II, Cortes, 109161	PEC	Orden de inicio	1	1	
	Reparación del Instituto San José del Pedregal y construcción de obras varias, Francisco Morazán, 109041	PEC	Orden de inicio	1	1	

	Reparación del CEB Porfirio Ruiz y construcción de obras varias, Atlántida, 109079	PEC	Orden de inicio	1	1	
	Reparación del CEB Ramón Rosa y construcción de obras varias, Atlántida, 108942	PEC	Orden de inicio	1	1	
	Reparación del CEB Rafael Pineda Ponce y construcción de obras varias, Atlántida, 108941	Contratista	Orden de inicio	1	1	
	Reparación del CEB Rafela Huete de Rodríguez y construcción de obras varias, Atlántida, 109048	PEC		1	0	Retrasos con la organización del CEP para hacer la solicitud de desembolso.
	Sub Total			6	5	
	%				83.33%	
Proyecto sector Salud	Suministro e Instalación Generador y obras varias Clínicas COVID-19 Hospital Atlántida, 108923	Contratista	Orden de inicio	1	1	
	Sub Total			1	1	
	%				100%	
Proyectos sector justicia/Espacios recuperados	Chamelecón - Oficina Comité Intersectorial, San Pedro Sula, Cortes 109242	PEC	Orden de inicio	1	0	Problemas con la juramentación del CEP, Complicaciones con la apertura de la cuenta, presidenta del CEP debía corregir nombre en documentos personales.

Construcción Área Recreativa, Col. Gale, Choloma, Cortes 109104	PEC	Orden de inicio	1	1	
Rivera Hernández - Oficina Comité Intersectorial, San Pedro Sula, Cortes 108864	PEC	Orden de inicio	1	1	
Sub Total			3	2	
%				66.67%	
TOTAL				80 %	

En la cartera de proyectos en ejecución tenemos 3 categorías, proyectos en el Sector Educativo hay 16 proyectos en ejecución al finalizar el 2do trimestre los cuales presentan un avance del 46% debiendo ser 57%, en el Sector Salud se ejecuta 1 proyecto con un avance del 1%, debiendo ser un 5%, en el sector justicia se ejecutan 3 proyectos, teniendo un avance del 33%, debiendo ser un 37%, de manera general en la cartera de proyectos ICS se tiene un avance del 42.1% debiendo ser un 51.05%, lo que nos representa un desfase aceptable de un 8.95%.

Renglón de Inversión	Categorías	Actividades	Modalidad contratación	Proyectos En ejecución en el 2do Trimestre 2023	
				Ejecución Programado	Real
A Inversión de Proyectos	Proyectos sector Educación	Reparación CEB Rosa Russel Fase II, Cortes, 108931.	Contratista	87%	62.83%
		Construcción Techado de Cancha y Obras Varias en CEB Dr. Alfonso Lacayo, Cortes, 108765.	PEC	73%	44%
		Reparación CEB Padre Claret, Cortes, 108677.	PEC	79%	62%
		Reparación del CEB Abelardo Fortín y construcción de obras varias, Francisco Morazán, 108949.	Contratista	87%	79.00%

	Reparación del Instituto Modesto Rodas Alvarado y construcción de obras varias FASE II, Cortes, 109161.	PEC	16%	7%
	Reparación del CEB Guadalupe Ulloa y construcción de obras varias, Comayagua, 108948.	Contratista	87%	90.00%
	Reparación del CEB José Simón Azcona y construcción de obras varias, Cortes, 108929.	Contratista	72%	88.20%
	Reparación de la Escuela República de Suecia y Centro Básico Pablo Portillo Figueroa y construcción de obras varias, Cortes, 109045.	Contratista	87%	72.40%
	Reparación del CEB Héctor Guillermo Guillen y construcción de obras varias, Cortes, 108977.	Contratista	72%	40%
	Reparación del Instituto San José del Pedregal y construcción de obras varias, Francisco Morazán, 109041.	PEC	10%	1%
	Reparación del CEB Ramón Montoya Cerrato y construcción de obras varias, Francisco Morazán, 108944.	Contratista	87%	62.00%
	Reparación del CEB Ramiro Humberto Moreno y construcción de obras varias, Comayagua, 108943.	Contratista	60%	55.00%
	Reparación del CEB Porfirio Ruiz y construcción de obras varias, Atlántida, 109079.	PEC	1%	10%
	Reparación del CEB Ramón Rosa y construcción de obras varias, Atlántida, 108942.	PEC	15%	1%
	Reparación del CEB Gustavo Adolfo Castañeda y construcción de obras varias, Atlántida, 109108.	Contratista	62%	66%
	Reparación del CEB Rafael Pineda Ponce y construcción de obras varias, Atlántida, 108941.	Contratista	9%	1%
	% de Avance		57%	46%

	Proyecto sector Salud	Suministro e Instalación Generador y obras varias Clínicas COVID-19 Hospital Atlántida, 108923.	Contratista	5%	1%
		% de Avance		5%	1.00%
	Proyectos sector justicia/Espacios recuperados	Construcción Área Recreativa, Col. Gale, Choloma, Cortes 109104.	PEC	10%	1%
		Rutas Seguras a Escuelas, Francisco Morazán, 108955.	PEC	95%	98%
		Rivera Hernández - Oficina Comité Intersectorial, San Pedro Sula, Cortes 108864.	PEC	7%	1%
		% de Avance		37%	33%
		TOTAL			51.05%

✓ **Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras
(USAID/PIOH)**

i. Objetivo General

El propósito de esta Actividad es mejorar las pobres condiciones sociales y económicas son especialmente pronunciadas en el Occidente de Honduras. Extrema pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático. Bajos niveles educativos, migración, falta de acceso a los servicios básicos y otros retos socioeconómicos son endémicos. La provisión de servicios básicos de educación y nutrición son escasos en la zona de Occidente y es difícil el acceso a los ya existentes, así mismo la gestión de servicios de educación, nutrición y agua y saneamiento son deficientes por lo que los ciudadanos cuentan además con pocos espacios de participación para mejorar sus vidas a nivel de hogar y sus vidas productivas, lo que genera una gran brecha de pobreza.

ii. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en los departamentos de Ocotepeque, la Paz, Copan Intibucá, Santa Bárbara y Lempira y zonas occidente específicas de intervención identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

iii. Descripción del Proyecto

Esta Actividad apoyará al FHIS para construir de al menos 14 proyectos de infraestructura comunitaria que potencien otros esfuerzos de USAID para mejorar los servicios relacionados con nutrición, la educación y el acceso al agua seleccionadas dentro de las municipalidades identificadas bajo el Objetivo de Desarrollo 2 de USAID.

iv. Monto del Convenio

El monto total de la Actividad es de \$ 10,544,130.00 (USAID \$ 8,435,304.00, Gobierno de Honduras \$ 2,108,826.00). Según la carta de ejecución No. 034.

v. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2019	6,190,650.00	5,981,569.54	97%
2020	65,583,096.00	13,336,794.49	20%
2021	58,488,260.00	47,180,270.68	81%
2022	37,504,624.00	35,478,196.70	95%
2023	52,246,428.00	13,035,108.05	25%

vi. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
AGUA Y SANEAMIENTO	0	1	534,000.00	0	869
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	0	0	-	21	0
EDUCACION	2	5	6,956,502.92	92	808
TOTAL	2	6	7,490,502.92	113	1,677

vii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
COPAN	1	0	1253589.76	10	42
INTIBUCÁ	1	0	1,410,509.48	24	176
LA PAZ	1	0	2,463,767.96	22	161
LEMPIRA	0	3	-	0	0
OCOTEPEQUE	0	2	435,124.00	13	282
SANTA BARBARA	1	1	1927511.72	44	1,016
TOTAL	4	6	7,490,502.92	113	1,677

viii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES		Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS		4,667,151.85
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA		877,453.28
TOTAL		5,544,605.13

ix. Avances del Proyecto (abril-junio 2023)

A. COMPONENTE TÉCNICO

Se presenta proyección de entregables trimestrales correspondientes al año 2023 los cuales están categorizados y distribuidos de la siguiente manera.

Categoría	Unidad de medida	Ejecución Física al 28-feb-2023	Proyección 2023				Ejecutado		% de cumplimiento	
			Total I Tri	Total II Tri	Total III Tri	Total IV Tri	Total I Tri	Total II Tri	Total I Tri	Total II Tri
Proyectos sector Educación.	Proyectos	11	3	2	2	0	2	2	67%	100%
Proyectos sector Salud.	Proyectos	7	0	0	0	1	0	0	n/a	n/a
Proyectos sector Sanitario	Proyectos	0	0	0	1	0	0	0	n/a	n/a
			3	2	3	1	2	2	67%	100%
			Total 2023 9 Proyectos				4		100%	

Para el Sector Educación se terminaron 2 proyectos, logrando cumplir con el 100% según lo planificado.

EJECUCION DE PROYECTOS PIOH							
2do TRIMESTRE 2023							
Renglón de Inversión	Categoría	Actividad	Modalidad contratación	Proyectos finalizados 2do Trimestre 2023			
				Unidad de Medida	Programado (POA)	Real	Comentarios
A. Inversión de Proyectos.	Proyectos sector Educación	Ampliación Centro de Educación Básica Mariano Martínez, Opatoro La Paz 107390	PEC	Obra		1	
		Ampliación CEB Mi Independencia San Miguelito 107565	PEC	Obra		1	Inaugurado
		SubTotal			2	2	
		%				100%	

Para el segundo trimestre del 2023, se tenía programado dar orden de inicio a 1 proyecto en el sector Salud.

Renglón de Inversión	Categoría	Actividad	Modalidad contratación	Proyectos Iniciados en el 2do Trimestre 2023			
				Unidad de Medida	Programado (POA)	Real	Comentarios
A Inversión de Proyectos.	Proyectos sector Salud	Ampliación Centro de Salud Rural (CESAR) ARCAMON, 107398	PEC	Orden de inicio	1	1	
		Sub Total			1	1	
		%				100	

En la cartera de proyectos en ejecución tenemos 3 categorías, 4 proyectos en el Sector Educativo en ejecución para finalizar el 3er trimestre, con un avance del 70% contra un programado del 69%, en el Sector Salud se ejecuta 1 proyecto con un avance del 28% contra un programado de 38%, en el sector Sanitario se ejecuta 1

proyecto, teniendo un avance del 65%, contra un 74%, de manera general en la cartera de proyectos PIOH se tiene un avance del 62.33% debiendo ser un 64.33%, lo que nos representa un desfase aceptable de un 2%.

Renglón de Inversión	Categoría	Actividad	Modalidad contratación	Proyectos En ejecución en el 2er Trimestre 2023		
				Ejecución Programado	Real	
A Inversión de Proyectos	Proyectos sector Educación	Reparación del CEB JESÚS ORLANDO GUERRA y construcción de obras varias, Ocotepeque, 109061.	PEC	56%	58.00%	
		Reparación del CEB MORAZANICA y construcción de obras varias, Lempira, 109062.	PEC	41%	35%	
		Ampliación CEB Prudencio Arita Fase II, Ocotepeque, 109139.	PEC	82%	98%	
		Ampliación Escuela Luis Alonzo Ayala, Lempira 107395.	PEC	95%	90%	
		% de Avance		69%	70%	
	Proyecto sector Salud	Ampliación Centro de Salud Rural (CESAR) ARCAMON, Lempira, 107398.	PEC	38%	28%	
		% de Avance		38%	28.00%	
	Proyecto sector Sanitario	Construcción Letrinas de cierre hidráulico en Comunidades Varias, Nueva Celilac Santa Bárbara 107399	PEC	74%	65%	
		% de Avance		74%	65.00%	
			TOTAL		64.33%	62.33%

Problemática en la Ejecución Técnica II Trimestre 2023

1. Retraso en la presentación de estimaciones por parte de los contratistas.
2. La violencia que impera en la zona genera complicaciones en el suministro de materiales al proyecto y limitación en los horarios de trabajo.
3. La ejecución de nuevos proyectos los cuales serán aprobados en la nueva Carta de Ejecución del Programa PIOH Convenio de Donación 522-0502, dicha carta presenta un desfase de 2 meses, y a la fecha se proyecta que su firma oficial puede durar 2 meses adicionales.

Acciones realizadas por la DIM:

1. Dar un seguimiento riguroso y continuo del pago de estimaciones por parte de los supervisores hacia los contratistas.
2. Agilizar a lo interno la revisión de las estimaciones, para reducir errores y tiempos en la presentación de las mismas.
3. Como parte del análisis presupuestario, se determina trasladar L10.7 millones al Programa ICS 522-0501, mismo que presenta una necesidad de asignación de presupuesto. Al realizar este traslado de presupuesto entre programas, se proyecta una ejecución de presupuestario equivalente al 93%

FONDOS BANCO CENTRAL DE HONDURAS

✓ Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras Convenio BCH-24798-1.

i. Introducción

El Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras es el resultado de un proceso de priorización de ocho (8) componentes que tendrán un total de 61 proyectos en 48 municipios del país que aportarán a la reducción de la pobreza y a la mejora del bienestar humano de la población.

ii. Nombre del proyecto

El Programa se denomina: “Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras”, el cual estará compuesto por ocho (8) componentes enfocados en la priorización de proyectos relacionados con el mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura escolar, infraestructura social y servicios comunitarios, construcción de puentes vehiculares, infraestructura sanitaria, diseño y estudios de laboratorio de medicamentos y hospital oncológico, obras de protección hídrica y reparación de embaulamiento, fortalecimiento institucional y por último, gestión y administración del programa.

iii. Localización

El Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras estará compuesto por 61 proyectos de infraestructura localizados en 48 municipios en 16 departamento.

iv. Beneficiarios

Alrededor de 4,003,249 personas serán beneficiadas directa e indirectamente.

v. Institución Ejecutora

La Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento y el Fondo Hondureño de Inversión Social (SEDECOAS-FHIS).

vi. Duración en Meses

El proyecto iniciará en agosto del 2022 y finalizará (algunos de sus componentes) en agosto de 2024. En ese sentido, el **Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras**, tendrá una duración de 24 meses.

vii. Costo total del proyecto

El costo total es de 499,700,000 Lempiras y su equivalente en dólares estadounidense son 20,388,927.88 (con tipo de cambio L.24.51 por cada dólar).

viii. Fuente financiera

Este programa se financiará con Fuentes de Financiamiento Internas (Fondos Nacionales).

ix. Antecedentes

Durante el año 2018 el porcentaje de pobreza en hogares en el país alcanzaba un valor del 61.9%, posteriormente dos años después en 2020, este indicador sufrió un incremento de 8 puntos porcentuales llegando a un valor del 70%. Este indicador muestra que de cada 10 hondureños 7 hondureños vive en situación de pobreza, estos valores han colocado a Honduras como uno de los países más desiguales y con

más pobreza de Latinoamérica. Sumado a esto la inestabilidad política, la crisis sanitaria derivada por el COVID-19 y el paso de los huracanes ETA e IOTA han sido algunas de las causantes de esta situación actual.

Esta brecha de pobreza nos da una idea de que tan pobres son los pobres en el país y, por lo tanto, nos proporciona una idea de la profundidad de las carencias de los ingresos, el patrón de consumo y la inaccesibilidad que poseen estos hogares a poder satisfacer sus necesidades básicas que definen aún más su situación de pobreza de las familias hondureñas.

En este sentido, algunas de estas carencias se han visto reflejadas en el poco acceso y disponibilidad que tienen las familias hondureñas al poder acceder a gozar de los servicios básicos como: el agua potable y saneamiento, el bajo acceso de las comunidades rurales a espacios educativos que cumplan con los estándares internacionales de las aulas de clases que esto ha derivado un alto nivel de deserción escolar por falta de ingresos en los hogares.

En la misma línea, el volumen de enfermedades diarreicas y/o enfermedades producidas por la contaminación del suelo por falta de pavimentación en las comunidades, centros de salud sin el equipamiento básico para atender emergencias, la falta de conexión vehicular entre comunidades que no permiten que las comunidades se desarrollen de forma social y económica, entre otros.

Por lo que, la falta de los servicios de agua y saneamiento, educación y salud, entre otras nos muestra que esta situación aun es una dura realidad para miles de hondureños. Son muchas las personas que no disponen de estos servicios de calidad y de forma continua, lo cual afecta sus actividades diarias y también su economía. Por ejemplo, la alta incidencia que existe en los últimos años con el aumento de casos relacionados a las enfermedades diarreicas agudas (EDA's), las bajas tasas de conectividad económica entre comunidades y la inasistencia escolar en las zonas rurales, está estrechamente relacionada con el propósito de este programa.

En conclusión, a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento, en especial el Fondo Hondureño de Inversión Social (SEDECOAS-FHIS) la cual es una de las instituciones que uno de sus propósitos esenciales es contribuir a la reducción de la pobreza, mediante el acceso a los servicios de infraestructura básica como el mejoramiento de escuelas, centros de salud, pavimentación, conexiones de agua potable, entre otros para ayudar a las diferentes mancomunidades con el objetivo de elevar la calidad de vida y la dignidad humana de los hondureños.

x. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2022	279,000,000.00	270,575,628.24	97%
2023	229,124,372.00	1,963,481.76	1%

xi. Otras inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	1,249,570.75
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	713,911.01
TOTAL	1,963,481.76

xii. Situación Presupuestaria

El 67.01% del presupuesto del programa corresponde al Componente 1 en el cual se planificó el mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura escolar priorizada. El Componente 2, representa el 13.27% de los cuales se tienen identificados alrededor de 12 proyectos de índole social y productivo como ser: caja puente, vado inundable, centro de salud, centro comunal, y otros. La construcción de 2 puentes ubicados en los departamentos Colon y Olancho en su etapa de prefactibilidad y formulación absorben el 16.96% en el Componente 3; para iniciar el proceso de prefactibilidad del primer laboratorio nacional de medicamentos y el hospital oncológico se planificó el 2.40% (Componente 5) y para el Componentes 8 diseñado para la gestión y administración del Programa se asignó el 0.36% respectivamente.

El resumen consolidado por objeto del gasto de la asignación presupuestaria del Programa se observa en la Tabla 3; la distribución porcentual del presupuesto modificado del Programa 18 indica que el 12.74% corresponde al grupo de gasto 20000 Servicios No Personales; el 0.10% se asignó a la compra de Materiales y Suministros (30000) y el 87.16% corresponde a Inversión para la construcción y supervisión de obras.

Para el Programa 18 a finales del II trimestre se tienen identificados y priorizados las intervenciones que cumplieron el ciclo de proyectos del FHIS y ante el cumplimiento del convenio firmado con la AMDC (transferencia por L 150.0 millones) se tiene contemplado un disponible para ejecución de obras por el monto de L 49.7 millones, de los cuales el 38.77% se encuentran en etapa de Adjudicación y Contratación; el monto

contratado a la fecha corresponde al 0.06%. Cabe recalcar que debido al desembolso tardío de fondos (30 de mayo de 2023) y en el marco de la Ley de Contratación del Estado alrededor del 80% de los proyectos adjudicados se encuentran en proceso de firma de contrato, pago de anticipo de obra y primera estimación.

A través del Programa 18 se han priorizado los proyectos referentes a las obras de reparación y mejora de la infraestructura escolar priorizadas en el programa Presidencial “Unidos X Tú Escuela”. El resto de las componentes del Programa ha presentado una planificación de la ejecución eficiente con respecto al monto estimado de los proyectos.

A continuación, se detalla el estado de los avances y asuntos pendientes por sectores de intervención.

Componente 1: Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura Educativa

- a) 11 Macroproyectos que contienen 24 subproyectos de reposición, reparación y ampliación de centros educativos en diferentes etapas del ciclo de proyectos por un monto de L 153,540,000.00

Componente 2: Infraestructura Social y Servicios Comunitarios de Honduras

- a) 1 macroproyecto a nivel de estudio de prefactibilidad; 12 proyectos distribuidos entre servicios comunitarios, infraestructura vial, agua y saneamiento en diferentes etapas del ciclo de proyectos por un monto de L 30,410,000.00

Componente 3: Construcción de Puentes sobre el Río Esteban, Colón y El Hormiguero, Olancho

- a) Se ha puesto en marcha 1 proceso de contratación de consultoría de prefactibilidad para el proyecto sobre el río San Esteban en el municipio de Balfate en el departamento de Colón-

Componente 5: Diseño y estudios de Laboratorio de Medicamentos y Hospital Oncológico

- a) Se ha puesto en marcha 1 proceso de contratación de un paquete de consultoría de acompañamiento a la prefactibilidad para el diseño y estudios de prefactibilidad del Laboratorio Nacional de Medicamentos en su primera fase, el costo del paquete asciende a L 4,800,000.00

xiii. Desembolso

El primer desembolso del Programa 18 corresponde a la Cuota de Compromiso por la cantidad de L 9,984,372 monto acreditado hasta el 24 de mayo de 2023; el cual representa el 4.36% del total del monto del Programa.

xiv. Resultados

- 12 proyectos de infraestructura construcción y supervisión de obra en etapa de adjudicación y contratación de obra, distribuidos en varios componentes del programa 18; así como 2 proyectos de prefactibilidad y factibilidad de proyectos de impacto nacional con un monto global del programa por L 229,124,372.00.

xv. Problemática

Al final del segundo mes del II Trimestre, se pudo contar con la primera cuota de compromiso, el proceso de solicitud de cuota inicio a mediados de marzo y concluyo a finales del mes de mayo lo que se traduce en casi 6 meses sin contar con el presupuesto para ejecución de obras. Sin embargo, el inicio de obras no se ha desarrollado con la agilidad debido a varias externalidades. Primero, las empresas supervisoras deben iniciar operaciones antes de que inicien los proyectos. La contratación de las empresas supervisoras, ha demorado más de lo esperado debido a la modalidad de contratación la cual incluye negociaciones que exceden a los tiempos planificados. Segundo, las empresas constructoras han demorado en presentar los requisitos solicitados por la institución para proceder con las firmas de contratos.

xvi. Retos

- Lanzamiento de procesos de contratación de los proyectos con un margen de error menor al 5%
- Definir con la SEFIN estrategias para la simplificación de procesos para la eficiente ejecución de proyectos de emergencia.
- Contratación del personal complementario a las Direcciones del FHIS pertinentes al ciclo de proyectos.
