



ALCALDIA MUNICIPAL MARCALA LA PAZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Reporte Mensual de Proyectos
Octubre 2023.

Alcalde Municipal
Sr. Juan Manuel Melgar

Márcala La Paz.



ALCALDIA MUNICIPAL MARCALA LA PAZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Informe de Inspección:
Mejoramiento De La Escuela Modesto Rodas Alvarado

Inspección realizada por:
- Ing. Juan Carlos Aguilar

Fecha De Supervisión:
11 de octubre de 2023.

Alcalde Municipal
Sr. Juan Manuel Melgar

Márcala La Paz.



INSPECCION

Por disposición de la municipalidad de Marcala, La Paz. El día 11 de octubre de 2023, el departamento de UTM realizaron supervisiones al mejoramiento del módulo sanitario de la Escuela Modesto Rodas Alvarado de la Colonia Melgar Castro, para determinar calidad de la obra construida y verificar que se hayan utilizado los materiales que la Alcaldía Municipal de Marcala proporcionó para el proyecto.

Dando como avance la construcción de 50 m2 de techo con estructura metálica, 9.2 m2 de pared y repello, construcción de 6 puertas metálicas y la construcción de 18.56 m2 de losa de concreto.

Proyecto: REGABILITACIÓN DE CANCHA	
LOCALIZACION	COLONIA MELGAR CASTRO
BENEFICIARIOS	POBLACION DEL SECTOR.
SOLICITANTE	POR DISPOSICIÓN DE LA ALCALDIA
DIAS DE INSPECCION	1 DIAS
ESTADO DEL PROYECTO	EN PROCESO
FUENTE FINANCIERA	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA LA PAZ



Datos de la Comunidad

UBICACIÓN: Colonia Melgar Castro, siguiendo la ruta indicada

Coordenadas: 387937.00 m E; 1566063.00 m N







ALCALDIA MUNICIPAL MARCALA LA PAZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Informe de Inspección:
Construcción Aulas 21 de Octubre

Inspección realizada por:
- Ing. Juan Carlos Aguilar

Fecha De Supervisión:
19 de octubre de 2023.

Alcalde Municipal
Sr. Juan Manuel Melgar

Márcala La Paz.



INSPECCION

Por disposición de la municipalidad de Marcala, La Paz. El día 04 de mayo del 2023, el departamento de UTM ha realizado la supervisión a la construcción de tres aulas de clase y un módulo sanitario tanto para varones como para niñas.

Con dicho proyecto se pretende mejorar la infraestructura interna del Instituto Polivalente 21 de Octubre como también acondicionar un área acta para impartir clases.

Hasta la fecha se han realizado visitas los días 15, 17, 21, 28, 30 de agosto; 05, 08, 13, 19 de septiembre; 09, 11, 13 y 18 de octubre del año 2023

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MODULO SANITARIO	
LOCALIZACION	INSTITUTO POLIVALENTE 21 DE OCTUBRE
BENEFICIARIOS	POBLACION DE MARCALA EN GENERAL
SOLICITANTE	POR DISPOSICIÓN DE LA INSTITUCIÓN
DIAS DE INSPECCION	13 DIAS
ESTADO DEL PROYECTO	EN PROCESO
FUENTE FINANCIERA	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA LA PAZ, INS



Datos de la Comunidad

UBICACIÓN: Colonia Melgar Castro, Instituto Polivalente 21 de Octubre

Coordenadas: 387940.00 m E; 1566366.00 m N



POBLACION: Los beneficiados con dicho proyecto serán la población de Márcala en general y visitantes.



FOTOS
AGOSTO





SEPTIEMBRE





OCTUBRE





ALCALDIA MUNICIPAL MARCALA LA PAZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Proyecto:

Emergencia por Tormenta Ciclón

Informe de Inspección:

Reparación del Puente Peatonal La Dalia

Inspección realizada por:

- Ing. Juan Carlos Aguilar
- Ing. Abigail Alvarado

Fecha De Supervisión:

20 de octubre del 2023.

Alcalde Municipal

Sr. Juan Manuel Melgar

Márcala La Paz.



INSPECCION

Por disposición de la municipalidad de Marcala, La Paz. Los días 11 y 20 de octubre del 2023, el departamento de UTM realizó una supervisión al Puente Peatonal La Dalia, para determinar calidad de la obra reparada y verificar que se hayan utilizado los materiales que la Alcaldía Municipal de Marcala proporcionó para el proyecto.

Se pudo verificar que se reparó el barandal del puente y se construyó un muro de contención para que el agua del rio no socave los estribos del mismo.

En vista de que el puente sufrió daños por las tormentas de los días 20 y 21 de septiembre del 2023. Se vio en la necesidad de realizar las reparaciones necesarias.

Fecha de Inicio: 04 de octubre de 2023.

Proyecto: REPARACIÓN DEL PUENTE PEATONAL LA DALIA	
LOCALIZACION	MARCALA, LA PAZ
BENEFICIARIOS	POBLACION DEL SECTOR.
SOLICITANTE	POR DISPOSICIÓN DE LA ALCALDIA
DIAS DE INSPECCION	1 DIAS
ESTADO DEL PROYECTO	EN PROCESO
FUENTE FINANCIERA	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA LA PAZ




Datos de la Comunidad

UBICACIÓN: Comunidad de Musula.

Coordenadas: 14° 9'4.44"N; 88° 3'12.72"O

POBLACION: Los beneficiados con dicho proyecto serán alrededor 7,000 personas, entre ellos productores de café.

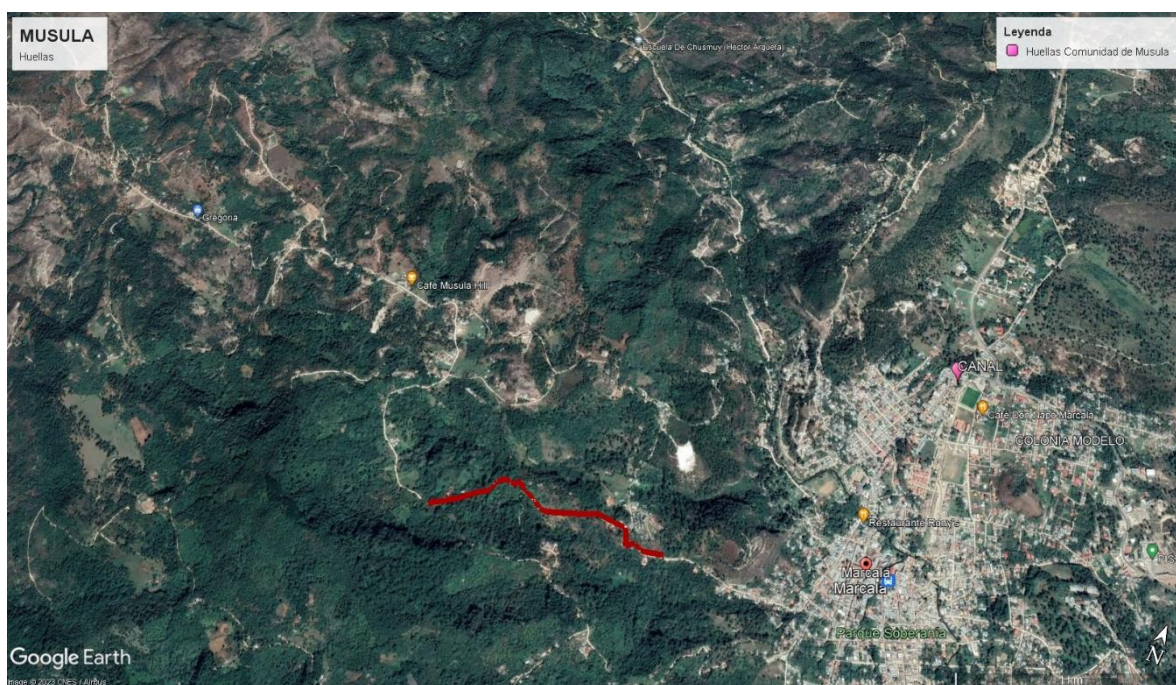




ANTES



DURANTE



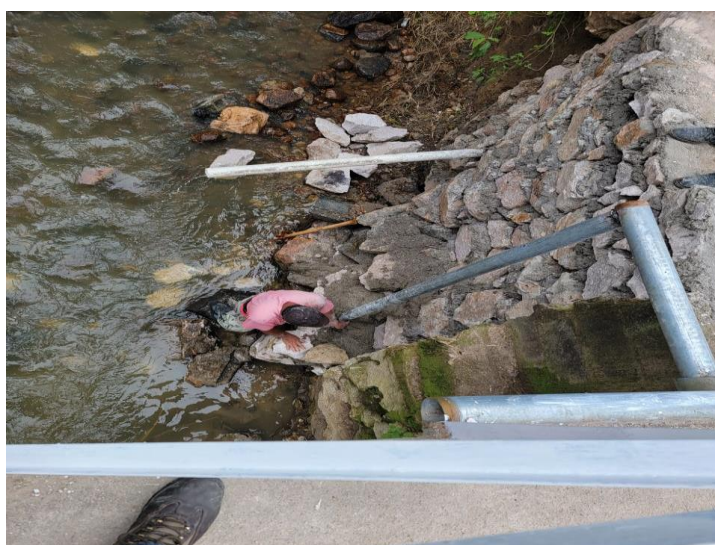



ALCALDIA MUNICIPAL MARCALA LA PAZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Informe de Inspección:
Mejoramiento de la Escuela Modesto Rodas Alvarado

Inspección realizada por:
- Ing. Juan Carlos Aguilar

Fecha De Supervisión:
25 de octubre de 2023.

Alcalde Municipal
Sr. Juan Manuel Melgar

Márcala La Paz.



INSPECCION

Por disposición de la municipalidad de Marcala, La Paz. El día 25 de octubre de 2023, el departamento de UTM realizaron supervisiones a la Rehabilitación de cancha de la Escuela Modesto Rodas Alvarado de la Colonia Melgar Castro, para determinar calidad de la obra construida y verificar que se hayan utilizado los materiales que la Alcaldía Municipal de Marcala proporcionó para el proyecto, con un avance hasta la fecha de 92.5 bloques pegados.

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MODESTO RODAS ALVARADO (REHABILITACIÓN DE CANCHA)	
LOCALIZACION	COLONIA MELGAR CASTRO
BENEFICIARIOS	POBLACION DEL SECTOR.
SOLICITANTE	POR DISPOSICIÓN DE LA ALCALDIA
DIAS DE INSPECCION	1 DIAS
ESTADO DEL PROYECTO	EN PROCESO
FUENTE FINANCIERA	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA LA PAZ



Datos de la Comunidad

UBICACIÓN: Colonia Melgar Castro, siguiendo la ruta indicada

Coordenadas: 387937.00 m E; 1566063.00 m N







ALCALDIA MUNICIPAL MARCALA LA PAZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Informe de Inspección:

Segunda Estimación del Proyecto: Mejora del Sistema de Agua del Municipio. Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua con Capacidad de 50,000 Galones.

Inspección realizada por:

- Ing. Juan Carlos Aguilar

Fecha De Supervisión:

26 de octubre del 2023.

Alcalde Municipal

Sr. Juan Manuel Melgar

Márcala La Paz.



INSPECCION

Por disposición de la municipalidad de Marcala, La Paz. El día 26 de octubre de 2023, el departamento de UTM ha realizado las visitas para revisar el avance de la construcción del tanque de 50,000 galones de Aguas de Marcala.

Nota: se han realizado visitas periódicas al proyecto.

Reportando las siguientes actividades ejecutadas a la fecha:

N°	CONCEPTO	UNIDAD	EJECUTADO ACTUAL		ACUMULAD O FINAL	%
			CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	
	TRAZADO Y MARCADO	M.L.		L -	63.50	100%
	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3		L -	21.06	17%
	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3		L -	65.00	95%
	ZAPATA AISLADA 0.80 x 0.80, e=0.25, 8 Nú4, a.s.	UNID	8	L 13,902.54	8.00	100%
	COLUMNA 25 X 25, 4Nú4, 2Nú3, Nú2 @ 20, CONC. 1:2:2	M.L.	3	L 3,163.34	3.20	14%
	SOLERA 30X18 4#3 Y #2 @ 0.15 M. CONCRETO 1:2:2	M.L.	33	L 20,399.34	33.30	100%
	PISO DE CONCRETO e=20cm #3@20 A. S	M2	78.53	L 136,199.90	78.53	100%


Proyecto: APERTURA DE CALLE	
LOCALIZACION	SANTA EMILIA, MARCALA, LA PAZ
BENEFICIARIOS	POBLACION DE MARCALA
SOLICITANTE	POR DISPOSICIÓN DE LA ALCALDIA
DIAS DE INSPECCION	8 DIAS
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN



Datos de la Comunidad

UBICACIÓN: Carretera que conduce a La Esperanza.

Coordenadas: 387987.00 m E; 1567276.00 m N

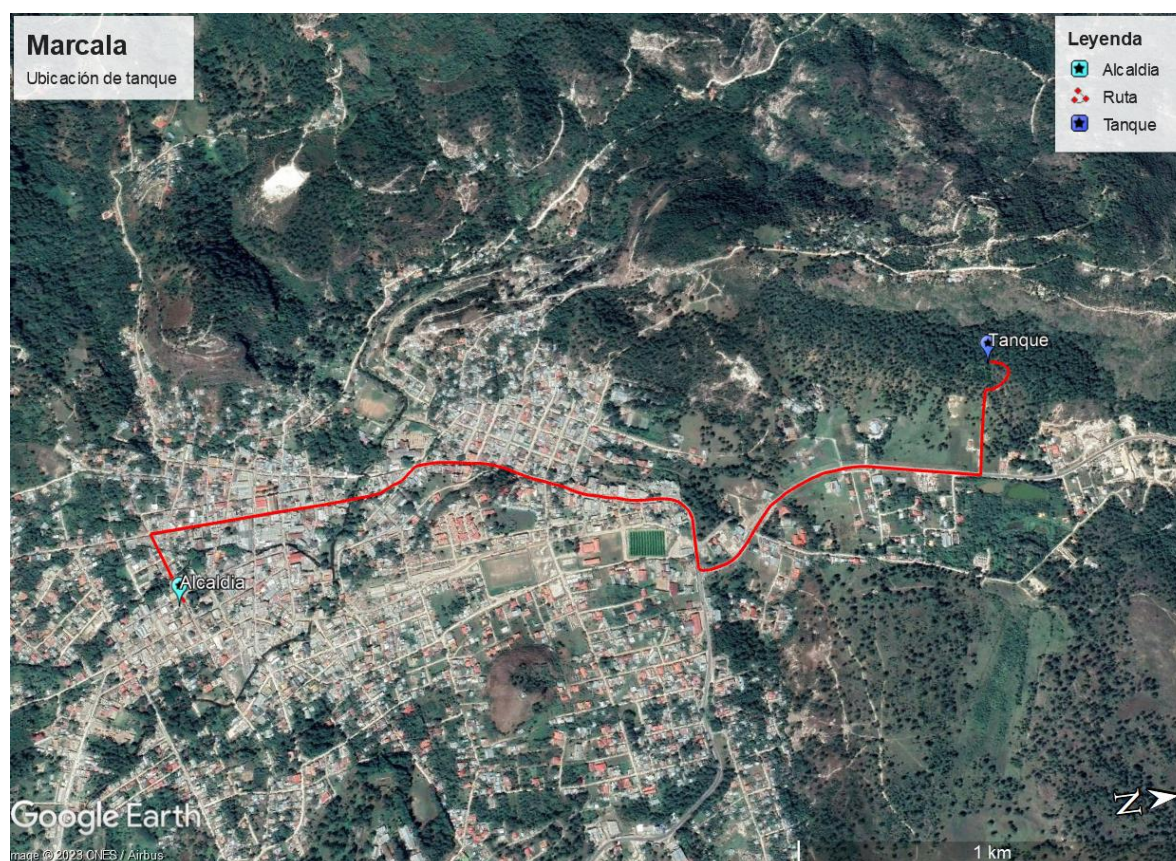

POBLACION: Los beneficiados con dicho proyecto son los pobladores de Márcala en General y visitantes.









ALCALDIA MUNICIPAL MARCALA LA PAZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Informe de Inspección:
Construcción de 220 ml de huellas Concreto Ciclópeo

Inspección realizada por:
- Ing. Juan Carlos Aguilar
- Ing. Abigail Alvarado

Fecha De Supervisión:
24 de octubre del 2023.

Alcalde Municipal
Sr. Juan Manuel Melgar

Márcala La Paz.



INSPECCION

Por disposición de la municipalidad de Marcala, La Paz. Los días 3, 9, 11, 13, 20 y 24 de octubre de 2023, el departamento de UTM realizo la supervisión de la Construcción de 220 ml de huellas de concreto ciclópeo en la calle hacia la comunidad de Musula, en Altos del Pinar y barrio La Pedrera, para determinar calidad de la obra construida y verificar que se hayan utilizado los materiales adecuados para el proyecto.

Donde se verificó que las huellas miden 70 cm de ancho cada una, 80 cm de espacio entre ellas, con un espesor de 15 cm con un concreto de 4000 psi, donde se utilizó vibrador de concreto para asegurarse que la mezcla sea uniforme.

Con un relleno de concreto pobre, y afirmación del suelo de los extremos en los primeros 100 ml, con una mezcla de cemento y material selecto, utilizando compactadora de plato.

Fecha de Inicio: 3 de octubre de 2023.

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 100 ML HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO	
LOCALIZACION	MUSULA
BENEFICIARIOS	POBLACION DEL SECTOR.
SOLICITANTE	POR DISPOSICIÓN DE LA ALCALDIA
DIAS DE INSPECCION	10 DIAS
ESTADO DEL PROYECTO	EN PROCESO



FUENTE FINANCIERA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA LA PAZ

Datos de la Comunidad

UBICACIÓN: Comunidad de Musula.

Coordenadas: 386996.73 m E; 1564936.59 m N



POBLACION: Los beneficiados con dicho proyecto serán alrededor 15,000 personas, entre ellos productores de café.



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA
Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"





ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA
Márcala, ciudad de la amistad y aroma de café"



UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Edificio Municipal, Barrio San Miguel, Frente a Plaza Soberanía, Márcala, La Paz, Honduras, C.A.

Tel. (504) 2764-5329/3975

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es
