



ALCALDIA MUNICIPAL MARCALA LA PAZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Reporte Mensual de Proyectos
Noviembre 2023.

Alcalde Municipal
Sr. Juan Manuel Melgar

Márcala La Paz.



ALCALDIA MUNICIPAL MARCALA LA PAZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Informe de entrega de Suministros:
Proyecto Construcción de Módulo Sanitario Escuela Paris
Orlando Dubon

Inspección realizada por:
- Ing. Juan Carlos Aguilar Castillo

Fecha De Supervisión:
06 de noviembre del 2023.

Alcalde Municipal
Sr. Juan Manuel Melgar

Márcala La Paz.



INSPECCION

Por disposición de la municipalidad de Marcala, La Paz. El departamento de UTM, realizo una supervisión como veedor para entrega de materiales para el Proyecto Construcción de Módulo Sanitario Escuela Paris Orlando Dubon, los cuales fueron donados por WFP. La construcción del proyecto es una necesidad para los niños y maestros de la escuela.


Lista de materiales entregados:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Llave bronce de 1/2	Unidad	4
2	Kit para pintar	Unidad	1
3	Adaptador hembra PVC de 1/2	Unidad	9
4	Alambre de Amarre	Libra	30
5	Brocha de 3"	Unidad	1
	Camisa PVC de 3"	Unidad	3
6	Clavos de 2 1/2"	Libra	10
7	Codo PVC 2x45	Unidad	4
8	Codo PVC 3x90	Unidad	4
9	Codo HG 1/2x90	Unidad	3
10	Codo PVC 1/2x90	Unidad	10
	Codo PVC 2x90	Unidad	5
11	Diluyente	Galón	2
12	Electrodo	Libra	3
13	Bloque	Unidad	400



PROYECTO:	
LOCALIZACION	COLONIA LA MODELO
BENEFICIARIOS	MAESTROS Y ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO
SOLICITANTE	POR DISPOSICIÓN DE LA ALCALDIA
DIAS DE INSPECCION	1 DIAS
ESTADO DEL PROYECTO	EN PROCESO
FUENTE FINANCIERA	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA LA PAZ

Coordenadas: 388872.00 m E; 1566148.00 m N

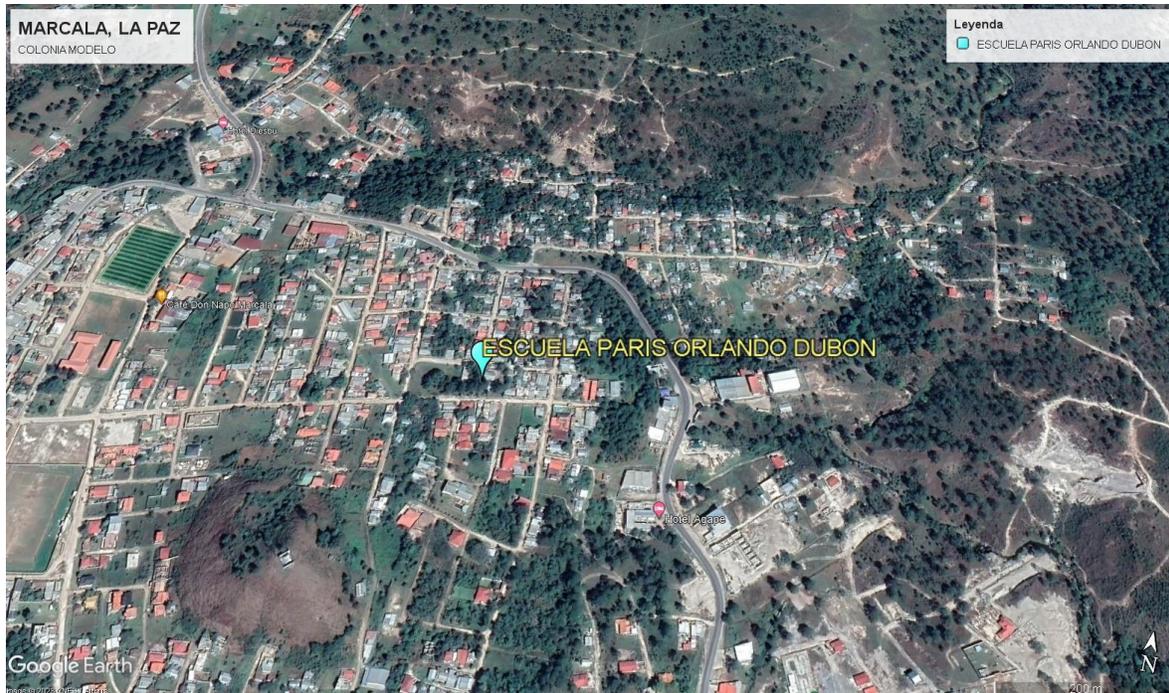





ALCALDIA MUNICIPAL MARCALA LA PAZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Informe De Supervisión:
Construcción de Caja Puente La Victoria. (Construcción de
Cabezales)

Supervisión realizada por:
- Ing. Juan Carlos Aguilar Castillo

Fecha De Inspección:
09 de noviembre de 2023.

Alcalde Municipal
Sr. Juan Manuel Melgar

Márcala La Paz.



Construcción de Caja Puente La Victoria. (Construcción de Cabezales).

El día 09 de noviembre la Unidad Técnica Municipal realizo una supervisión para la Construcción de Cabezales para Alcantarilla PVC de 32", en la calle de la Caja Puente La Victoria.


En el trabajo realizado siempre estuvo presente la supervisión de la UTM.

INSTALACIONES: CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES	
LOCALIZACION	BARRIO LA VICTORIA
BENEFICIARIOS	POBLACION Y SECTOR TRANSPORTE DE LOS BARRIOS Y ALREDEDORES.
SOLICITANTE	POR DISPOSICIÓN DE LA ALCALDIA.
DIAS DE SUPERVISION	1 DIAS
ESTADO DEL PROYECTO	FINALIZADO



UBICACIÓN: Carretera que conduce hacia El Salvador, tomando el desvío hacia COMSA, a 2.645 km desde el Parque Central.

Coordenadas: 390581.00 m E; 1563917.00 m N

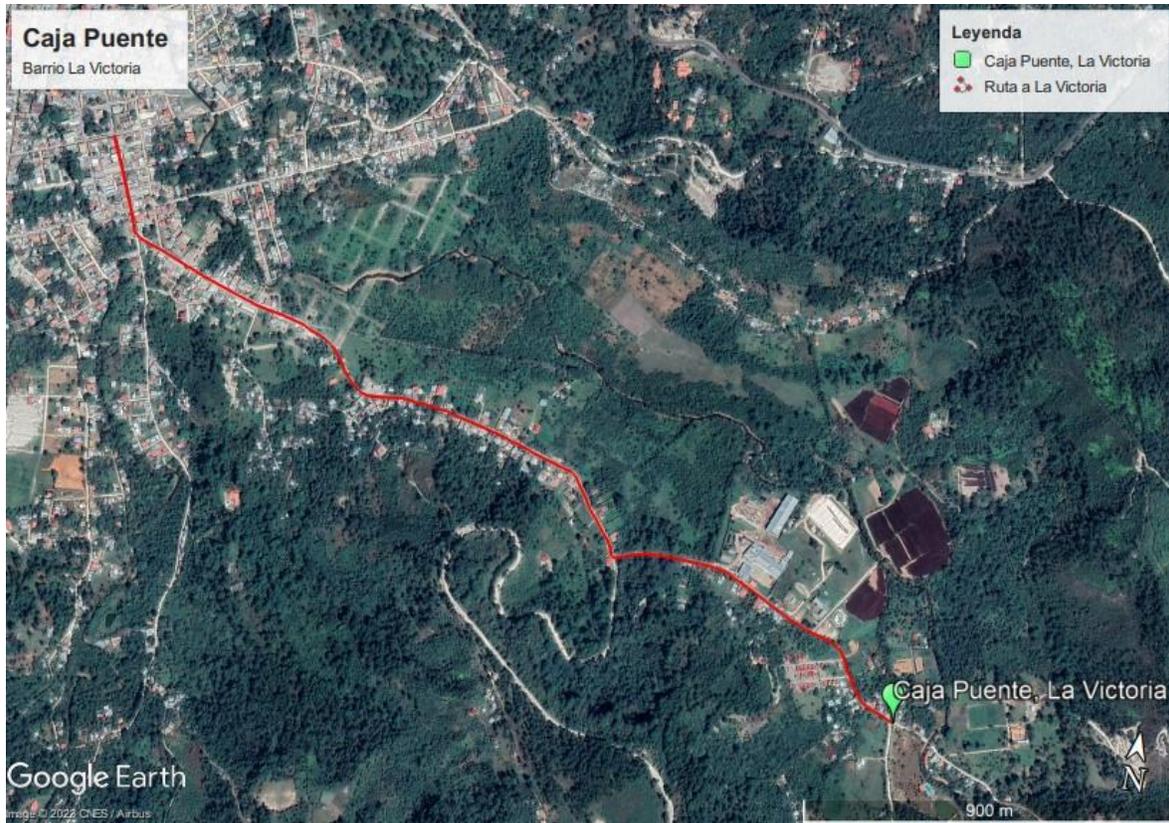

POBLACION: Los beneficiados con dicho proyecto serán alrededor de 17,000, población de Marcala en general y visitantes.





ALCALDIA MUNICIPAL MARCALA LA PAZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Informe de Inspección:
Construcción de huellas Concreto Ciclópeo

Inspección realizada por:

- Ing. Juan Carlos Aguilar
- Ing. Abigail Alvarado

Fecha De Supervisión:
22 de noviembre del 2023.

Alcalde Municipal
Sr. Juan Manuel Melgar

Márcala La Paz.



INSPECCION

Por disposición de la municipalidad de Marcala, La Paz. Los días 13, 15 y 17 de noviembre de 2023, el departamento de UTM realizo la supervisión de la Construcción de huellas de concreto ciclópeo en la calle hacia la comunidad de Musula en barrio La Pedrera, para determinar calidad de la obra construida y verificar que se hayan utilizado los materiales adecuados para el proyecto.

Donde se verificó que las huellas miden 70 cm de ancho cada una, 80 cm de espacio entre ellas, con un espesor de 15 cm con un concreto de 4000 psi, donde se utilizó vibrador de concreto para asegurarse que la mezcla sea uniforme.

Con un relleno de concreto pobre, y afirmación del suelo de los extremos en los primeros 100 ml, con una mezcla de cemento y material selecto, utilizando compactadora de plato.

Fecha de Inicio: 3 de octubre de 2023.

Proyecto:	
LOCALIZACION	MUSULA
BENEFICIARIOS	POBLACION DEL SECTOR.
SOLICITANTE	POR DISPOSICIÓN DE LA ALCALDIA
DIAS DE INSPECCION	10 DIAS
ESTADO DEL PROYECTO	TERMINADO
FUENTE FINANCIERA	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA LA PAZ



Datos de la Comunidad

UBICACIÓN: Comunidad de Musula.

Coordenadas: 386996.73 m E; 1564936.59 m N



POBLACION: Los beneficiados con dicho proyecto serán alrededor 15,000 personas, entre ellos productores de café.





ALCALDIA MUNICIPAL MARCALA LA PAZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Informe de Inspección:
Construcción Aulas 21 de Octubre

Inspección realizada por:

- Ing. Juan Carlos Aguilar
- Ing. Abigail Alvarado

Fecha De Supervisión:
10 de noviembre de 2023.

Alcalde Municipal
Sr. Juan Manuel Melgar

Márcala La Paz.



INSPECCION

Por disposición de la municipalidad de Marcala, La Paz. El departamento de UTM ha realizado la supervisión a la construcción de tres aulas de clase y un módulo sanitario tanto para varones como para niñas.

Con dicho proyecto se pretende mejorar la infraestructura interna del Instituto Polivalente 21 de Octubre como también acondicionar un área acta para impartir clases.

Hasta la fecha se han realizado visitas los días 15, 17, 21, 28, 30 de agosto; 05, 08, 13, 19 de septiembre; 09, 11, 13 y 18, 23, 25 y 27 de octubre; 8, 10, 14 y 25 noviembre del año 2023.

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MODULO SANITARIO	
LOCALIZACION	INSTITUTO POLIVALENTE 21 DE OCTUBRE
BENEFICIARIOS	POBLACION DE MARCALA EN GENERAL
SOLICITANTE	POR DISPOSICIÓN DE LA INSTITUCIÓN
DIAS DE INSPECCION	21 DIAS
ESTADO DEL PROYECTO	EN PROCESO
FUENTE FINANCIERA	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA LA PAZ, INS



Datos de la Comunidad

UBICACIÓN: Colonia Melgar Castro, Instituto Polivalente 21 de Octubre

Coordenadas: 387940.00 m E; 1566366.00 m N



POBLACION: Los beneficiados con dicho proyecto serán la población de Marcala en general y visitantes.



FOTOS
AGOSTO





SEPTIEMBRE





OCTUBRE







ALCALDIA MUNICIPAL MARCALA LA PAZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Informe de Inspección:
Medición de Calle, Barrio San Rafael

Inspección realizada por:
- Ing. Juan Carlos Aguilar

Fecha De Supervisión:
10 de noviembre del 2023.

Alcalde Municipal
Sr. Juan Manuel Melgar

Márcala La Paz.



INSPECCION

Por disposición de la municipalidad de Marcala, La Paz. El día 10 de noviembre del 2023, el departamento de UTM realizó una medición en la calle de San Rafael – Sigamane, en colaboración con el departamento de Catastro.

Los cuales realizaron la medición en el lado frontal de los terrenos colindantes con la calle.

Proyecto: MEDICIÓN DE CALLE	
LOCALIZACION	BARRIO SAN RAFAEL
BENEFICIARIOS	POBLACION DE MARCALA, LA PAZ
SOLICITANTE	POR DISPOSICIÓN DE LA ALCALDIA
DIAS DE INSPECCION	1 DIAS
ESTADO DEL PROYECTO	TERMINADO



Datos de la Comunidad

UBICACIÓN: Carretera del barrio San Rafael a la comunidad de Sigamane.

Coordenadas

Inicio: 388843.00 m E; 1564975.00 m N

Final: 390292.80 m E; 1565285.67 m N



POBLACION: Los beneficiados con dicho proyecto serán alrededor de 5,000 población de Marcala en general y visitantes.





ALCALDIA MUNICIPAL MARCALA LA PAZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Informe de Inspección:

Construcción de Puente de Acceso al Barrio Ciprés,
Rumbo al Oeste de la Escuela Marco Aurelio Soto

Inspección realizada por:

- Ing. Juan Carlos Aguilar

Fecha De Supervisión:

23 de noviembre del 2023.

Alcalde Municipal

Sr. Juan Manuel Melgar

Márcala La Paz.



INSPECCION

Por disposición de la municipalidad de Marcala, La Paz. Los días del 15 al 22 de noviembre de 2023, el departamento de UTM realizó supervisiones periódicas al proyecto de Puente de Acceso al Ciprés, donde se estaba realizando la actividad de bacheo en la calle principal.

En donde se reparó dicho puente ya que se encontraba en mal estado.

A continuación, se describen las actividades realizadas:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Solera inferior	MI	12
Excavación	M3	3.52
Losa	M2	29.32
Muro	M2	2.6
Barandal	MI	12.25

Fecha de Inicio: 15 de noviembre de 2023.

Proyecto: Construcción de Puente de Acceso al Barrio Ciprés, Rumbo al Oeste de la Escuela Marco Aurelio Soto	
LOCALIZACION	MARCALA, LA PAZ
BENEFICIARIOS	POBLACION DEL SECTOR, SECTOR TRANSPORTE, SECTOR TURISMO POBLACION DE MARCALA EN GENERAL.
SOLICITANTE	POR DISPOSICIÓN DE LA ALCALDIA
DIAS DE INSPECCION	4 DIAS
ESTADO DEL PROYECTO	FINALIZADO
FUENTE FINANCIERA	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA LA PAZ




Datos de la Comunidad

UBICACIÓN: MARCALA, LA PAZ.

Coordenadas:

INICIO: 387958.00 m E; 1565203.00 m N

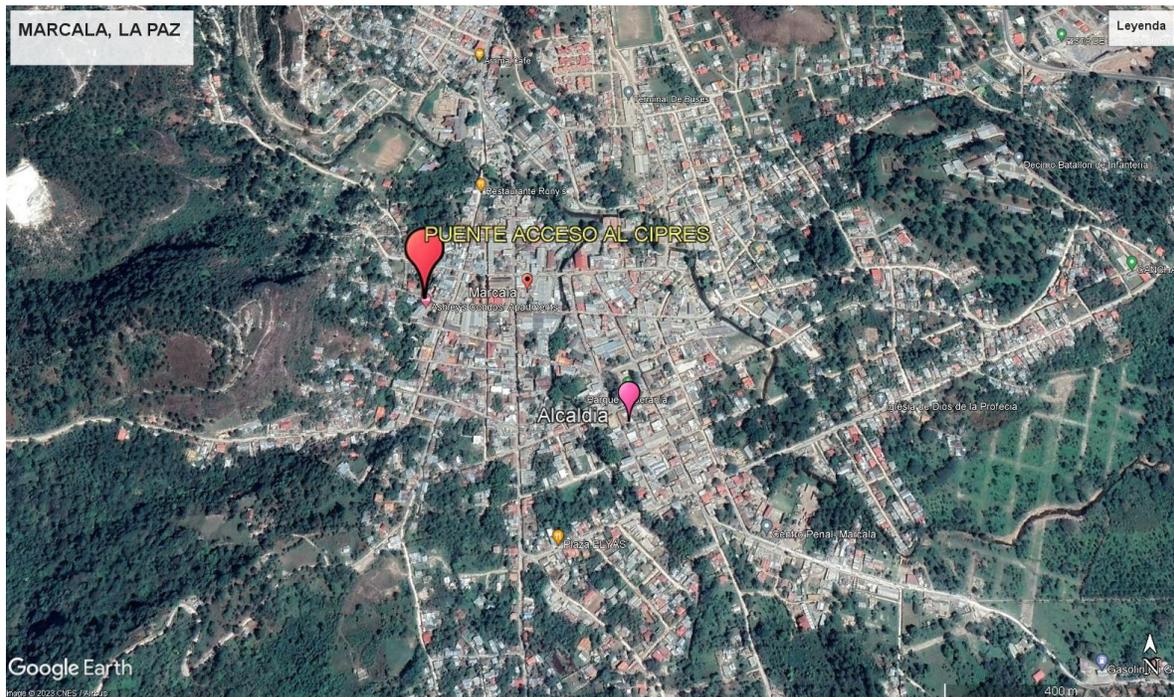







ALCALDIA MUNICIPAL MARCALA LA PAZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Informe de Inspección:

Quinta Estimación del Proyecto: Mejora del Sistema de Agua del Municipio. Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua con Capacidad de 50,000 Galones.

Inspección realizada por:

- Ing. Juan Carlos Aguilar

Fecha De Supervisión:

29 de Noviembre del 2023.

Alcalde Municipal

Sr. Juan Manuel Melgar

Márcala La Paz.



INSPECCION

Por disposición de la municipalidad de Marcala, La Paz. El día 29 de noviembre de 2023, el departamento de UTM ha realizado las visitas para revisar el avance de la construcción del tanque de 50,000 galones de Aguas de Marcala. Se han realizado visitas periódicas al sitio.

Reportando las siguientes actividades que se han ejecutado para esta estimación:

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO ACTUAL		FINAL	%
			CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	
COLUMNA 25 X 25, 4Nú4, 2Nú3, Nú2 @ 20, CONC. 1:2:2	M.L.	28.00	24.80	L 24,515.85	28.00	100%
ACCESORIOS PARA TANQUE DE 50 MIL GALONES	GLOBAL	1.00	1.00	L 90,000.00	1.00	100%

Reportando las siguientes actividades ejecutadas a la fecha:

N°	CONCEPTO	UNIDAD	FINAL	%
			CANTIDAD	
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	63.50	100%
2	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	21.06	100%
3	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	82.77	100%
4	ZAPATA AISLADA 0.80 x 0.80, e=0.25, 8 Nú4, a.s.	UNID	8.00	100%
5	COLUMNA 25 X 25, 4Nú4, 2Nú3, Nú2 @ 20, CONC. 1:2:2	M.L.	28.00	100%
6	SOLERA 30X18 4#3 Y #2 @ 0.15 M. CONCRETO 1:2:2	M.L.	33.30	100%
7	PISO DE CONCRETO e=20cm #3@20 A. S	M2	78.53	100%
8	PARED DE LADRILLO A TESON, 2#3@2HIL. 2#3@25CM	M2	94.00	100%
9	VIGA DE B=25, H=40,8 #4,2 #6, #2 @ 0.15, CONC 1:2:2	M.L.	0.00	0%
10	SOLERA 30X18 4#3 Y #2 @ 0.15 M. CONCRETO 1:2:2	M.L.	33.30	100%
11	REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= 2 CMS	M2	202.30	100%
12	PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM.	M2	0.00	0%
13	AFINADO e=0.5 CM	M2	98.75	70%
14	IMPERMEABILIZACION (APLICADA CON BROCHA)	M2	0.00	0%
15	ENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR	M2	0.00	0%
16	LOSA CONCRETO e=15 CMS Nú4 a/c 15 CMS a/s	M2	0.00	0%
17	PINTURA DE ACEITE	M2	0.00	0%
18	TAPADERA METALICA PARA TANQUE	UND	0.00	0%
19	GRADAS DE INSPECCION TANQUES	ML	0.00	0%
20	ACCESORIOS PARA TANQUE DE 50 MIL GALONES	GLOBAL	1.00	100%
21	EXCAVACION SUELO SEMIDURO	M3	14.00	100%
22	ACERA DE CONCRETO SIMPLE	M3	5.45	100%
SUBTOTAL DEL TANQUE				66%
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	6.00	100%
2	LOSA DE CONCRETO E= 7 cms.	M2	4.00	100%
3	PARED DE LADRILLO RAFON	M2	6.00	100%
4	REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO	M2	14.00	100%
5	PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM.	M2	14.00	100%
6	LOSA PARA TAPADERAS EN CAJAS DE VALVULAS	M2	4.00	100%
7	CASQUETE CAJA DE VALVULA	ML	12.00	100%
SUB TOTAL DE VALVULA				100%
TOTAL				67%




Proyecto:	
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD DE 50,000 GALONES.	
LOCALIZACION	SANTA EMILIA, MARCALA, LA PAZ
BENEFICIARIOS	POBLACION DE MARCALA
SOLICITANTE	POR DISPOSICIÓN DE LA ALCALDIA
DIAS DE INSPECCION	25 DIAS
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN

Datos de la Comunidad

UBICACIÓN: Carretera que conduce a La Esperanza.


Coordenadas: 387987.00 m E; 1567276.00 m N

POBLACION: Los beneficiados con dicho proyecto son los pobladores de Marcala en General y visitantes.

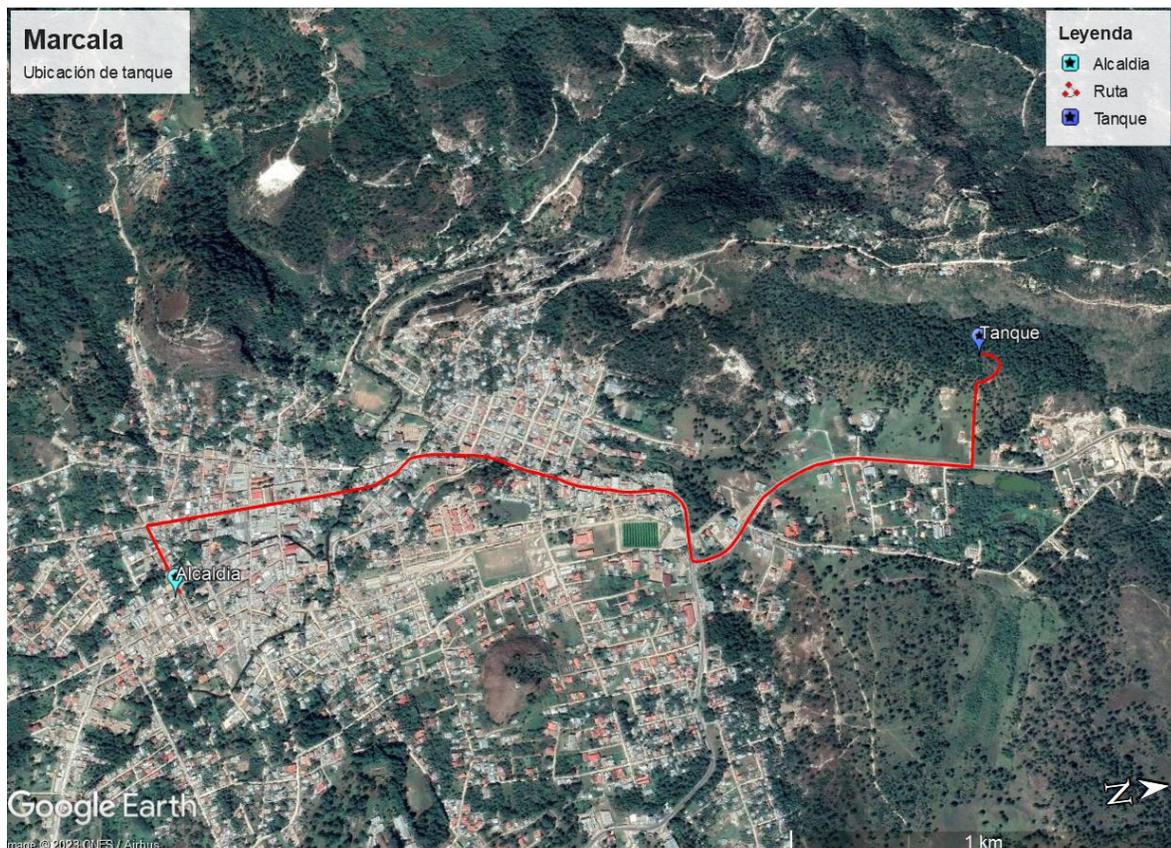

Edificio Municipal, Barrio San Miguel, Frente a Plaza Soberanía, Márcala, La Paz, Honduras, C.A.



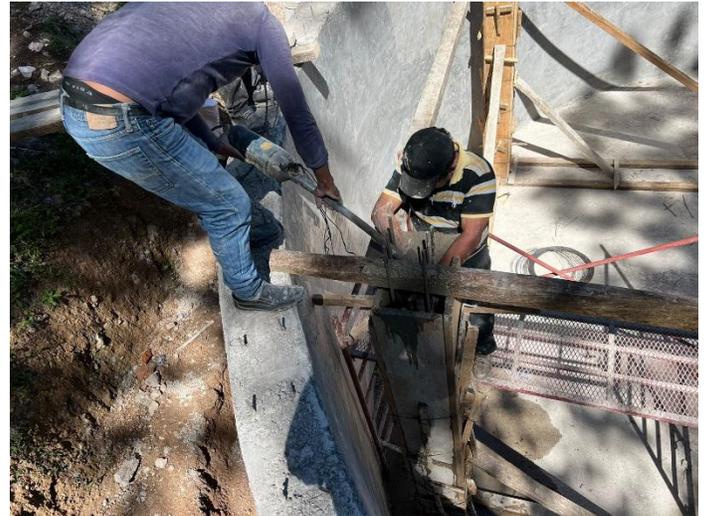



ALCALDIA MUNICIPAL MARCALA LA PAZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Informe de Inspección:
Construcción de huellas en Comunidad de El Chorro
Inspección realizada por:
- Ing. Juan Carlos Aguilar

Fecha De Supervisión:
29 de noviembre del 2023.

Alcalde Municipal
Sr. Juan Manuel Melgar

Márcala La Paz.



INSPECCION

Por disposición de la municipalidad de Marcala, La Paz. El día 20, 24 y 29 de noviembre del 2023, el departamento de UTM realizó una supervisión para el proyecto: Construcción de 99.7 ml de huellas en Comunidad de El Chorro, para determinar los avances en la obra, en la cual aun se está realizando la excavación para luego proceder al encofrado y la fundición de las huellas.

Fecha de Inicio: 20 de noviembre de 2023.

Proyecto: Construcción de 99.7 ml de Huellas	
LOCALIZACION	EL CHORRO
BENEFICIARIOS	POBLACION DEL SECTOR.
SOLICITANTE	POR DISPOSICIÓN DE LA ALCALDIA
DIAS DE INSPECCION	3 DIAS
ESTADO DEL PROYECTO	EN PROCESO
FUENTE FINANCIERA	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA LA PAZ



Datos de la Comunidad



Comunidad El Chorro, Marcala, La Paz



UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
