



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.

Correo Electrónico: oop.cortesvillanueva@municipalidadhn.info

Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994



Villanueva, Cortés
viernes, 12 de abril de 2024

LICENCIADO

GREGORIO MANUEL COELLO

OFICIAL DE ACCESO A INFORMACION PÚBLICA


SU OFICINA

Estimado Lic. Coello,

Por medio de la presente le saludo deseándole muchos éxitos en sus actividades laborales y personales.

Adjunto le remito el informe en detalle de **Avances de Proyectos** derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, **CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024.**

Atentamente,

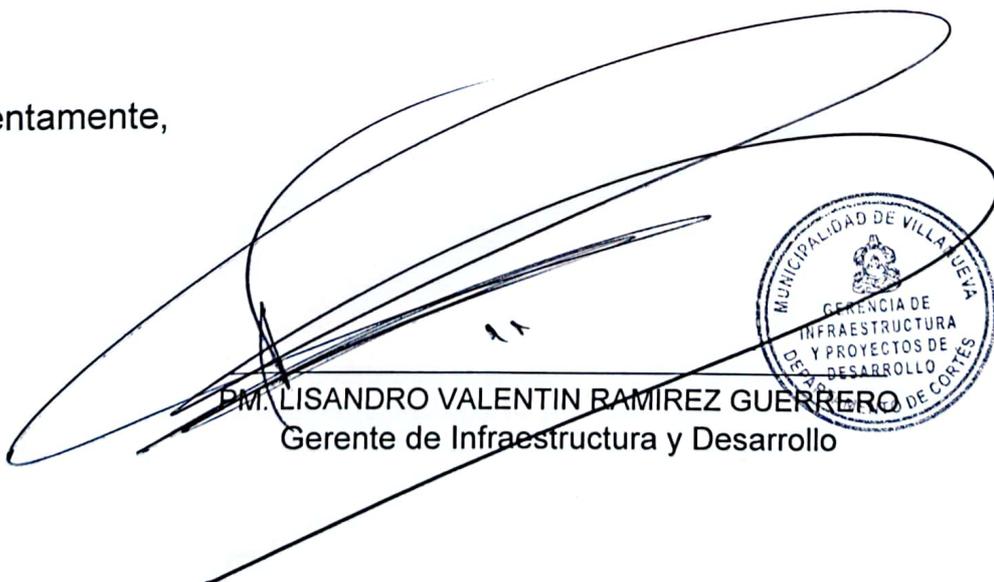

DM. LISANDRO VALENTIN RAMIREZ GUERRERO
Gerente de Infraestructura y Desarrollo



Todos por Villanueva

Escaneado con CamScanner



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.

Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info

Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE MARZO DEL 2024

viernes, 12 de abril de 2024

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
1	INVERSIONES MERCANTILES (ALVA PINEDA) S. DE R.L. (Otoman Alva Castellanos)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos y Construcción Adiciones y Mejoras Proy. Barrio Ciudad	Dragado de Cause de canal de alivio de aguas lluvias	Desde Residencial Shalon hasta colonia Los Angeles, Sector El Milagro de Villanueva, Cortes	Dragado y profundización de cauce de canal de alivio de aguas lluvias, en una distancia de 480 ml. con retroexcavadora 1,749.00 MP; Limpieza manual de paso con alcantarillas en tramo de canal 75.00 MP; Cargado y botado de material de ripio 1,824.00 MP; EQUIPO A UTILIZAR: RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA DE 5MP	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del sedimento	Limpieza del sedimento	Fondos Municipales	L. 341,041.80	04/03/2024	Ejecutado	L. 341,041.80	21/03/2024	Acertado	N/A	N/A
2	RAYCONLO (Raymundo Contreras Lorenzana)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación tipo I de 2.24 kilómetros de calles de terracería 2.70 Kms. Tipo II de calles de terracería	Aldea El Morro Desde Nueva Suyapa hasta Santa Ana de Chasnigua y Calles Internas de aldea El Morro de Villanueva, Cortes	NUEVA SUYAPA HASTA SANTA ANA DE CHASNIGUA: Reparación de calle tipo II, limpieza y definición de cuneta, escarificación de terracería, remoción, afinamiento y compactado de terracería en sección de 4 mts. 2.70 KMS. ALDEA EL MORRO, SECTOR VALLE ESCONDIDO: Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 4.00 Mts. 1.74 KMS; Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 3.00 Mts. 0.50 KMS. NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO I: motoniveladora, vibro compactadora, sistema de agua, excavadora 320 y volquetas de 5 mts. NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO II: Motoniveladora, vibro compactador y sistema de agua	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del suelo para la colocación de material selecto	Movimiento de tierra para la excavación e instalación de material selecto	Fondos Municipales	L. 515,510.00	04/03/2024	Ejecutado	L. 515,510.00	22/03/2024	Acertado	N/A	N/A



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.

Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info

Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE MARZO DEL 2024

viernes, 12 de abril de 2024

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACION
3	A&S ELECTRIKO'S (José Ramón Castro Montoya)	Construcción Adiciones y Mejoras de Edificios	Mejoras al Sistema eléctrico y alumbrado público	Iglesia Católica San Ramón Nonato de barrio El Centro de Villanueva	Barrio El Centro: Instalación y armado de lámparas tipo reflector 100w RGB con grúa mecánica canasta 8.00; Instalación y armado de lámparas tipo reflector 50w RGB con grúa mecánica canasta 32.00; Instalación y conexión de panel eléctrico 220v 125 AMP 4CKT con breakers para control de iluminación 2.00; Montaje armado y doblado de tubería 1/2 EMT para cables eléctricos de iluminación distancia 190 MTS 1.00; Circuito #1: instalación de cable 2x12 THHN L1+N para energizar lámparas de 100w tipo reflector RGB sector oeste, frente al parque central torre campanario derecha (pies) 120.00 PIES; Circuito #2: Instalación de cable 2x12 THHN L 1+n para energizar lámparas de 50w tipo reflector RGB sector oeste, frente al parque central entrada principal de la capilla (pies) 252.00 PIES; Circuito #3: Instalación de cable 2x12 THHN L1+n para energizar lámparas de 100w tipo reflector RGB sector este frente al parque central torre campanario izquierda (pies) 196.00 PIES; Circuito #4: Instalación de cable 2x12 THHN L1+n para energizar lámparas de 50w tipo reflector RGB sector este frente a la biblioteca municipal 284.00 PIES; Montaje, instalación y armado de fotocontrol para iluminación de lámparas tipo reflector RGB frente a la biblioteca municipal sector oeste circuitos 1 y 2 1.00; Montaje, instalación y armado de fotocontrol para iluminación de lámparas tipo reflector RGB frente a la biblioteca municipal Sector Este circuitos 3 y 4 1.00; Servicio de alquilar de grúa mecánica tipo canasta para instalación de lámparas en partes altas de la iglesia por 26 HR 26.00 HORAS	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Ninguno	Ninguno	Fondos Municipales	L. 390,260.00	23/02/2024	Ejecutado	L. 390,260.00	22/03/2024	Acertado	N/A	N/A
4	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES (Ramón Reyes López)	Construcción Adiciones y Mejoras de Edificios	Finalización de obra en aula escolar	Escuela Augusto C. Coello de la Colonia Gracias a Dios de Villanueva, Cortés	Colonia Gracias a Dios: Tallado de columnas 12.50 ML; Tallado de vigas 15.00 ML; Tallado de boquetes 10.80 ML; Pulido de boquetes 10.80 ML; Repello de paredes internas y externas 40.44 MP; Pulido de paredes internas y externas 79.10 MP; Pintado de paredes internas y externas 92.03 MP; Resane de pared con alacranes de varilla de 3/8" @ 0.20 mts 6.20 ML; Construcción de columna de anclaje de 0.20x0.20 mts con una longitud de 3.50 mts, con #4 leg y #3 lisa @ 0.15 mts. 3.50 ML; Demolición de estructura firme en piso existente 1.00; Relleno y compactado de terreno, e=10 cms 49.60 MP; Fundición de firme de concreto de 3" en aula 49.60 MP; Suministro e instalación de cerámica para piso 49.60 MP; Zócalo para piso molduras de 10 cms de alto 28.20 ML; Construcción de acera frontal codaleado, e=5 cms L=7 mts, a=1.80 mts 12.60 MP; Suministro e instalación de lámparas de 2'x4' led, con su respectivo cableado #12 4.00; Suministro e instalación de cielo falso de yeso vinil 49.60 MP; Desmontaje y reinstalación de sistema eléctrico en aula (sistema eléctrico de iluminación y de potencia) con su respectiva distribución con sus cajas octogonales, tomacorrientes con sus cajas de 2'x4' y cambio de interruptor doble 1.00; Bajante de cable 220v, con cable #8 y caja de dos espacios con su breaker de 40 amp 82.00 PIES; Suministro e instalación de caja de 4 espacios con breaker doble de 20 amp 1.00; Suministro e instalación de puerta de vidrio con su contramarco de aluminio 1.00; Construcción de acera lateral codaleado, e=5 cms L=10.30 mts, a=0.80 mts 8.24; Suministro e instalación de ventanas corredizas 1.90x 0.80 mts 6.08 MP; Suministro e instalación de aire acondicionado de 5 toneladas 1.00	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y Compactado de otros sedimentos suelo y colocación productos de las de desperdicios de actividades de las obras la construcción de construcción	Fondos Municipales	L. 389,686.70	04/03/2024	Ejecutado Pendiente de Informe Final	N/A	26/03/2024	N/A	N/A	N/A	



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.

Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info

Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE MARZO DEL 2024

viernes, 12 de abril de 2024

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
5	SOLUCIONES MULTIPLES NIETO S. DE R.L. DE C.V. (José Avel Nieto Suazo)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos Y Construcción Adiciones y Mejoras Proy. Barrio Ciudad	Reparación tipo I de 2.69 Kms. De calles de terracería y 0.84 topo III	Colonia Apadrinados del Sector El Milagro de Villanueva, Cortés	Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 5.00 Mts. 0.84 KMS; Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 6.00 Mts. 1.64 KMS; Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 7.50 Mts. 0.21 KMS; Reparación de calles tipo III, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento en sección de 6.00 Mts. 0.84 KMS. MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO I: motoniveladora, vibro compactadora, sistema de agua, cargadora y volquetas. MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO III: motoniveladora	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del suelo para la colocación de material selecto	Movimiento de tierra para la excavación e instalación de material selecto	Fondos Municipales	L. 627,163.00	23/02/2024	Ejecutado Pendiente de Informe Final	N/A	19/03/2024	Acertado	N/A	N/A
6	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES (Ramón Reyes López)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Puente Peatonal, Construcción de muro de contención, gradas, firme de concreto y barandales con tubo galvanizado de 2"	Colonia Luis García Bustamante del Sector El Marañon de Villanueva	Puente Peatonal L=14.00 mts, a=1.50 mts: Excavación para estribos (2 unidades) (1.80x1.80x1.20) mts 7.78 MP; Armado con 8 varillas de 3/4" por estribo, con una longitud de 2.35 mts por varilla en estribos y anillos de 1/2" @0.20 mts, con soldadura. 4.70 ML; Hechura de simbra para nivelación de estribos 63.35 MP; Fundición de estribos con concreto ciclopeo, (2 unidades), (1.50x1.50x1.00) mts 4.50 MP; Tallado de vigas 14.00 ML; Armado, encofrado y fundición de viga, con una longitud de 14.00 mts, con 8 varillas de 3/4" y anillos de 1/2" a cada 20 cms (0.40x0.65) mts 14.00 ML; Armado, encofrado y fundición de losa de concreto con varilla de 5/8 @0.20 mts longitudinal y perpendicular @0.20 mts, L=14.00 mts y a=1.50 mts 21.00 MP; Desencofrado de estribos, viga y losa 1.00; Botado de material de desperdicio 7.78 MP; Construcción e instalación de barandales de tubo redondo galvanizado de 2 pulg chapa 14, altura=0.90 mts, longitud=28.00 ml, espaciamento entre tubos verticales 2.00 mts (incluye pintado) 28.00 ML; Limpieza final 1.00 Construcción de Gradas de Concreto L=37.30ml y ancho=1.00 mts: Trazado y marcado 37.30 ML; Excavación de material (1.30x0.60x38.00) 29.64 MP; Conformación de suelo pedroso en colina 37.30 MP; Encofrado y desencofrado de escaleras 37.30 ML; Fundición de huellas de 0.30 mts y contra huella de 0.20 mts de mampostería 14.92 MP; Construcción e instalación de barandales de tubo redondo galvanizado de 2 pulg chapa 14, altura=0.90 mts, longitud=39.30 ml, espaciamento entre tubos verticales 2.00 mts (incluye pintado) 39.30 ML; Fundición de firme de mampostería (concreto y piedra) con una longitud de 6.00 mts, un ancho de 1.00 mts y un espesor de 0.15 mts. 6.00 MP; Muro de Contención, L=6.00mts, Prof=1.80mts A1=0.60 mts y A2=0.20 mts: Trazado y marcado 6.00 ML; Excavación de material (6.00x2.20x1.00) 13.20 MP; Hechura de simbra p/ nivelación y fundición 22.80 MP; Fundición de muro de concreto ciclopeo L=14.00 mts, H=7.00 mts, A1=1.00, A2=3.00 mts 4.32 MP; Tallado de elementos 13.20 MP; Relleno con material selecto 6.60 MP	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la excavación para la construcción de muro	Movimiento de tierra para la excavación para la construcción de muro	Fondos Municipales	L. 567,846.60	24/02/2024	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.

Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info

Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE MARZO DEL 2024

viernes, 12 de abril de 2024

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
7	NORTH INVESTMENT AND SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. (Julieta Geraldina Miranda Ugarte)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación Tipo I de 3.76 Kms. De calles de terracería y construcción de Plantel de 26.00 X 28.50 Mts.	Colonia Los Angeles del Sector El Milagro de Villanueva, Cortes	<p>Colonia Los Angeles: Reparación de calle tipo i, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto sección de 4.50 mts 1.15 KMS; Reparación de calle tipo i, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto sección de 5.00 mts 1.00 KMS; Reparación de calle tipo i, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto sección de 6.00 mts 0.63 KMS; Reparación de calle tipo i, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto sección de 4.50 mts 0.98 KMS</p> <p>Plantel (26.00x28.50) Mts.: Limpieza general de terreno 92.80 M²; Cargado y botado de material de desperdicio 92.80 M²; Conformación con motoniveladora (10 cm) 74.10 M²; Material selecto para nivelar el terreno, traslado con volqueta de 5m³ 148.20 M²; Regado de material selecto, escarificación, conformación y compactación con motoniveladora, sistema de agua y Vibrocompactador 148.20 M²; Suministro e instalación de tubería corrugada de 18" 18.00 ML; Equipo a utilizar: Motoniveladora, Vibrocompactador, Volqueta, Sistema de agua, Cargadora</p>	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del suelo para la colocación de material selecto	Movimiento de tierra para la excavación e instalación de material selecto	Fondos Municipales	L. 824,381.20	07/03/2024	Ejecutado	L. 824,381.20	22/03/2024	Acertado	N/A	N/A

T O T A L _____

L. 3,655,889.30

(Handwritten signature and scribbles)

PM. ANDRÉS VALENTIN RAMIREZ GUERRERO
Gerencia de Infraestructura

