



# HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

## FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan  
Operativo Anual POA-Presupuesto

IV Trimestre 2024

## INDICE

<b>INTRODUCCION.....</b>	<b>2</b>
<b>Antecedentes .....</b>	<b>2</b>
<b>Resultados Financieros .....</b>	<b>5</b>
<b>Proyectos FHIS .....</b>	<b>6</b>
<b>Avance Ejecución Física de Proyectos de Inversión.....</b>	<b>7</b>
<b>Ejecución Presupuestaria por Programas 2024.....</b>	<b>8</b>
<b>Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2024.....</b>	<b>9</b>
<b>Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Cuarto Trimestre 2024 .....</b>	<b>10</b>
<b>Ejecución por Objeto del Gasto Cuarto Trimestre del 2024 .....</b>	<b>11</b>
<b>Resumen de Cuadro por Sector 2024 .....</b>	<b>14</b>
<b>PACC-FHIS 2024 IV TRIMESTRE.....</b>	<b>15</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>✓ Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE 6822-HN).....</b> 20</li> <li>▪ <b>✓ Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE) .....</b> 48</li> <li>▪ <b>✓ Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira.....</b> 56</li> <li>▪ <b>✓ Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V .....</b> 70</li> <li>▪ <b>✓ Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) Fase II y Fase III.....</b> 79</li> <li>▪ <b>✓ Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS).....</b> 103</li> <li>▪ <b>✓ Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH) .....</b> 108</li> <li>▪ <b>✓ Gestión de Proyectos Artículo 338 DGP-2024 .....</b> 114</li> <li>▪ <b>✓ Infraestructura y Otros a Nivel Nacional Programa 11.....</b> 117</li> </ul>	

## INTRODUCCION

Este informe de ejecución física financiera del plan operativo anual es una herramienta esencial para medir el desempeño de la institución en el logro de sus objetivos. Este tipo de informe permite evaluar la efectividad de los recursos asignados y su uso adecuado en relación con los resultados obtenidos. El análisis de la ejecución física y financiera nos ha permitido identificar las fortalezas y debilidades, así como las áreas de oportunidad para la mejora continua. Al proporcionar información detallada sobre el cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas, este informe es la recopilación de las actividades e inversiones realizadas por el FHIS durante el 2024.

Para este Cuarto Trimestre el FHIS alcanzo una Ejecución Acumulada de L. 1,462,343.188.45, en los cuales están incluidos los siguientes Programas y Proyectos como ser:

- **(BM)** Proyecto de recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota.
- **(BCIE)** Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE) /Proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira.
- **(USAID)** Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS)/ Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH).
- **(KFW)** Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE Fase IV y V./Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR FASE II).

## Antecedentes

De acuerdo al Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-056-2019, se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), la cual debe de promover el Desarrollo Comunitario por medio de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos, en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerables de Honduras quien para el desarrollo de sus funciones debe contar con una Subsecretaría de Estado.

Se adscribe a dicha Secretaría de Estado, El Instituto Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), que fue creado mediante Decreto Ejecutivo PCM-013-2014 publicado el 30 de Mayo del 2014 y tiene como propósito la integración institucional del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y del Servicio Autónomo

Nacional de Acueducto y Alcantarillados (SANAA) y demás afines al sector, Independiente de su integración estas instituciones continuaron cumpliendo los objetivos establecidos en sus leyes constitutivas.

Y en la práctica el SANAA no se adscribió al IDECOAS

En PCM-05-2022 se adscribe el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y a la vez se crea el Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos que se adscribe a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y aglutina todos los entes relacionados al sector.

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es un organismo Desconcentrado de la Presidencia de la República, creado el 22 de febrero de 1990 y extendida su vida legal hasta el año 2026 según decreto No. 118-2022 cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados, en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social y/o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Asimismo, asesorará a los gobiernos locales con respecto a los procesos de captación de recursos de las fuentes de financiamiento nacionales y/o externas y las asiste en la transferencia de las capacidades técnicas y administrativas, para convertir a estos gobiernos locales en administradores eficientes de sus programas y proyectos, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Nación en aplicación del principio de Descentralización.

### **Misión:**

Somos una Secretaría y Fondo de Inversión Social que mejora las condiciones de vida de la población hondureña mediante la ejecución eficiente y efectiva de proyectos de infraestructura social promoviendo la equidad, la inclusión, cohesión social y el desarrollo sostenible en todo el país.

### **Visión:**

Ser para el 2026 un referente nacional en la ejecución de proyectos de infraestructura social, destacando por su eficacia, transparencia y compromiso con el bienestar, cohesión social y la calidad de vida de los hondureños.

### **Valores:**

- **Ética:** Ejercicio de las funciones con sujeción a las normas morales que promuevan la confianza de la población hondureña.
- **Integridad:** Actuación sustentada en la honradez, prudencia, entereza, rectitud y firmeza.
- **Compromiso:** Ejecución de proyectos que coadyuven al desarrollo local.
- **Transparencia:** Amplia difusión de información sobre nuestras actuaciones. Rendición de cuentas ante la sociedad.
- **Lealtad:** Actuar con fidelidad y rectitud hacia el FHIS y compañeros de trabajo, con el objetivo de identificarse con la institución.
- **Equidad:** El FHIS no hace distinción de credo, raza, de ninguna otra forma de discriminación humana.


## Resultados Financieros

SEDECOAS-FHIS, llega hasta los lugares más lejanos del país, para contribuir a mitigar las necesidades de la población más pobre y vulnerable a través de respuestas rápidas y concretas con proyectos de Agua y Saneamiento, Educación, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural.

El presupuesto vigente de SEDECOAS-FHIS para la gestión 2024 al 31 de diciembre asciende a 1.711 mil millones de lempiras y su ejecución acumulada al IV trimestre asciende a 1.462 millones de lempiras, financiado tanto por fondos del Tesoro Nacional, como de Créditos y Donaciones de Organismos Internacionales, y cuya distribución, así como su participación porcentual en el presupuesto general de la institución se describe a continuación:

Fuente	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada IV Trimestre	% de Participación en el Presupuesto Vigente
<b>BM</b>	L. 298.426.045,00	L. 480.926.045,00	L. 162.732.076,31	28%
<b>BCIE</b>	L. 358.211.977,00	L. 308.363.957,00	L. 84.770.732,87	18%
<b>USAID</b>	L. 98.275.329,00	L. 113.535.670,00	L. 47.203.355,69	7%
<b>GOH*</b>	L. 1.370.965.245,00	L. 452.391.300,00	L. 201.786.122,40	26%
<b>KfW</b>	L. 205.192.188,00	L. 101.214.616,00	L. 67.185.887,44	6%
<b>BCH</b>	L. -	L. 10.706.892,00	L. 10.017.891,52	1%
<b>TESORO NACIONAL</b>	L. -	L. 244.181.203,00	L. 134.116.441,00	14%
<b>TOTAL</b>	<b>L. 2.331.070.784,00</b>	<b>L. 1.711.319.683,00</b>	<b>L. 707.812.507,23</b>	<b>100%</b>

\* Incluye costo operativo y fondos nacionales del FHIS

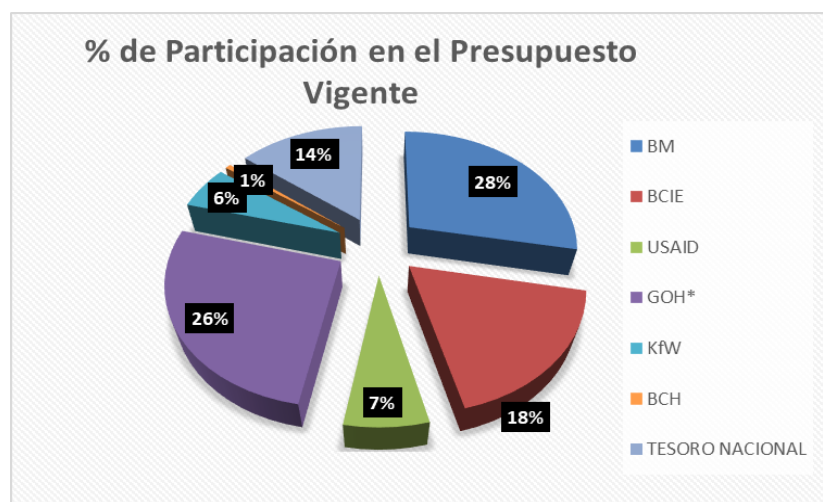

## Proyectos FHIS

Fuente	Nombre del Proyecto	Nombre Corto	Sector	Modalidad Ejecución
<b>BM</b>	Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota	PRE 6822-HN	Infraestructura Escolar	Centralizados
<b>BCIE</b>	Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	BCIE No. 2239 MIFE	Infraestructura Escolar	PEC-Descentralizados
	Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira.	BCIE No. 2261	Agua y Saneamiento	Centralizados
<b>KFW</b>	Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar SE-FHIS FASE IV y V	PROMINE	Infraestructura Escolar	PEC-Descentralizados
	Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras	CONVIVIR	Infraestructura Social	Descentralizados
<b>USAID</b>	Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana	ICS	Infraestructura Social y Escolar	PEC/Centralizados
	Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras	PIOH	Infraestructura Escolar	PEC/Centralizados
<b>Fondos Nacionales</b>	Obras Comunitarias Menores a Nivel Nacional	FN	Infraestructura Social y Escolar	Centralizados
	Programa de Gestión de Proyectos Artículo 338 DGP-2024	ARTÍCULO 338	Infraestructura Vial y Escolar	Centralizados

## Avance Ejecución Física de Proyectos de Inversión


Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Metas			Ubicación y Observaciones
			Programación 2024	Ejecución Física acumulada al IV Trimestre 2024		
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	
PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS	Centros educativos rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota en beneficio de la población afectada por los fenómenos naturales. PRE	CENTRO EDUCATIVO	20	15	75%	Los 4 subproyectos terminados en 1er trimestre son: 108446, 108447, 108452 y 108507. Los subproyectos terminados en 2do trimestre: 108314, 108420, 108449, 108471, 108457, 108614 y 109631. 1 subproyecto finalizado en 3er trimestre: 108350, 3 subproyectos finalizados en 4to trimestre: 108313, 108271 y 108394
	Sistemas de agua rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota. PRE	SISTEMA DE AGUA	3	1	33%	Subproyecto finalizado en 4to trimestre: 108705
	Infraestructura vial rehabilitada y reconstruida afectados por ciclones Eta e Iota. PRE	KILOMETRO	5	3	60%	El subproyecto terminado en el 1er. Trimestre 109225 y los subproyectos terminados en el 2do. Trimestre 109240 y 109239.
	Infraestructura en centros de salud pública rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota en beneficio de la población afectada por los fenómenos naturales. PRE	UNIDAD DE SALUD	1	0	0%	Producto no finalizados
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados. MIFE	CENTRO EDUCATIVO	42	33	79%	Productos finalizados
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE IV y V)	Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados. PROMINE	CENTRO EDUCATIVO	7	2	29%	Lo no ejecutado del Programa con respecto al presupuesto vigente en el caso de Fondos Externos en su mayoría corresponde: al anticipo de un proyecto de aprox de 5.2 mm que no se completo en vista que el KfW tuvo dificultades para realizar el pago directo, tambien se esta analizando estructuralmente una orden de cambio de un proyecto. En el caso de Fondos Nacionales se quedo pendiente de cargar pagos a proveedores en vista que no se tuvo cuota de compromiso. Es importante indicar que estos pagos mencionados anteriormente se deberan considerar en el presupuesto del 2025.
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JOVENES EN HONDURAS FASE II	Espacios públicos recuperados y entregados para la seguridad ciudadana a las colonias, alcaldías y patronatos en beneficio de la población hondureña CONVIVIR II	OBRA	7	1	14%	El Programa No proporciono la información de evaluación.
	Jóvenes capacitados en habilidades sociales y laborales para personas jóvenes de entre las edades de 12-30 años en los municipios de Santa Rosa de Copán, Intibucá, La Esperanza y Juticalpa. CONVIVIR Fase II	CAPACITADO	810	390	48%	Se capacitaron jóvenes en electricidad residencial, maquinaria equipo pesado, barismo
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	Espacios públicos recuperados y entregados para la seguridad ciudadana a las colonias, alcaldías y patronatos en beneficio de la población hondureña ICS	OBRA	4	2	50%	La ejecución presupuestaria para la gestión 2024 se vió afectada por L.1.6MM, para los fondos nacionales (11) en vista de la no aprobación de cuota de compromiso en el mes de diciembre por parte de la TGR-SEFIN para el grupo 400.00, para el cual ya se tenía previsto el 1er desembolso del Proyecto Ejecutado por la Comunidad (PEC).
	Centros educativos construidos, reparados y/o ampliados ubicados en Choloma, San Pedro Sula, Chameleón, La Lima, Tela y Tegucigalpa en beneficio de niños y niñas de las zonas urbana y rural de Honduras. ICS	CENTRO EDUCATIVO	3	3	100%	Para los fondos externos la ejecución se vio afectada en al menos L. 2.0MM por los atrasos en la firma de la Carta de Ejecución 522-0501/522-0513 la cual vence el 25 de junio de 2024 y la misma fue firmada por la USAID-SEFIN el 27 de julio de 2024.
	Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud ubicados en La Ceiba, Sps y Tegucigalpa. ICS	OBRA	1	2	200%	
ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	Centros educativos construidos, reparados y/o ampliados en beneficio de niños y niñas de las zonas rural y urbanas en Honduras. PIOH	CENTRO EDUCATIVO	3	3	100%	a ejecución presupuestaria para la gestión 2024 se vió afectada por L.15.8MM, para los fondos externos (22) por los atrasos en la firma de la Carta de Ejecución 522-0502/522-0511, la cual vence el 28 de junio de 2024 y la misma fue firmada por la USAID-SEFIN el 27 de julio de 2024, lo que conlleva a la pausa de los proyectos PEC iniciados en el mes de Junio, generando un atraso al menos de 2 meses para el reinicio operativo de los proyectos.
	Infraestructura social (puentes y caja puente), rehabilitada y reconstruida en beneficio de la población a nivel Nacional PIOH	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	1	0	0%	
PROGRAMA DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS	Diseño de los sistemas de agua potable realizado. GRACIAS	DISEÑO	1	0	0%	Se realizó el 4to desembolso por US \$ 84,136.87 (Lps 2,103,421.75) por concepto de pago de la Adenda n°1 para el contrato de la firma consultora correspondiente. El producto de Carpeta Final de Diseño ha sido recibida a satisfacción del Coordinador Interino Actual y está pendiente la aprobación de la Adenda n°2 de obras adicionales.



### Ejecución Presupuestaria por Programas 2024

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Monto Planificado IV Trimestre	Devengado al IV Trimestre	Devengado Acumulado	Credito Disponible	% Ejecución IV Trimestre/ Planificado IV Trimestre	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
Programa 1: Actividades Centrales	L 1.145.388.050,00	L 286.855.379,00	L 106.054.322,21	L 115.952.888,90	L 245.499.262,82	L 41.356.116,18	109%	86%
Programa 11: Infraestructura Rural	L 282.287.531,00	L 222.146.473,00	L 80.342.723,00	L 105.732.284,31	L 206.351.117,44	L 15.795.355,56	132%	93%
Programa 12: Infraestructura Escolar	L 441.187.553,00	L 323.723.453,00	L 111.457.528,00	L 104.609.755,59	L 195.786.328,33	L 127.086.732,72	94%	60%
Programa 14: Fomento al Desarrollo Local	L 112.155.540,00	L 121.002.193,00	L 39.708.382,00	L 71.454.782,73	L 109.131.928,73	L 11.864.177,40	180%	90%
Programa 16: Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras	L 298.426.045,00	L 480.920.045,00	L 240.261.273,00	L 162.732.076,31	L 432.753.537,07	L 48.172.507,93	68%	90%
Programa 17: Programa de Agua y Saneamiento	L 51.626.065,00	L 21.778.045,00	L 6.000.001,00	L 3.196.386,87	L 18.974.432,05	L 2.803.612,95	53%	87%
Programa 18: Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras	L -	L 10.706.892,00	L -	L 10.017.891,52	L 10.665.380,39	L 41.511,61	0%	100%
Programa 19: Gestión de Proyectos Artículo 338 DGP-2024	L -	L 243.181.203,00	L 115.141.846,00	L 134.116.441,00	L 243.181.201,62	L 1,38	116%	100%
Programa 20: Reconstrucción Héctor V. Medina	L -	L 1.000.000,00	L -	L -	L -	L 1.000.000,00	0%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>L 2.331.070.784,00</b>	<b>L 1.711.313.683,00</b>	<b>L 698.966.075,21</b>	<b>L 707.812.507,23</b>	<b>L 1.462.343.188,45</b>	<b>L 248.120.015,73</b>	<b>101%</b>	<b>85%</b>

Nota: Se considera el credito disponible ya que cuenta con los fondos reservados de cada proyecto, el saldo al IV trimestre es de L. 248,120,015,73

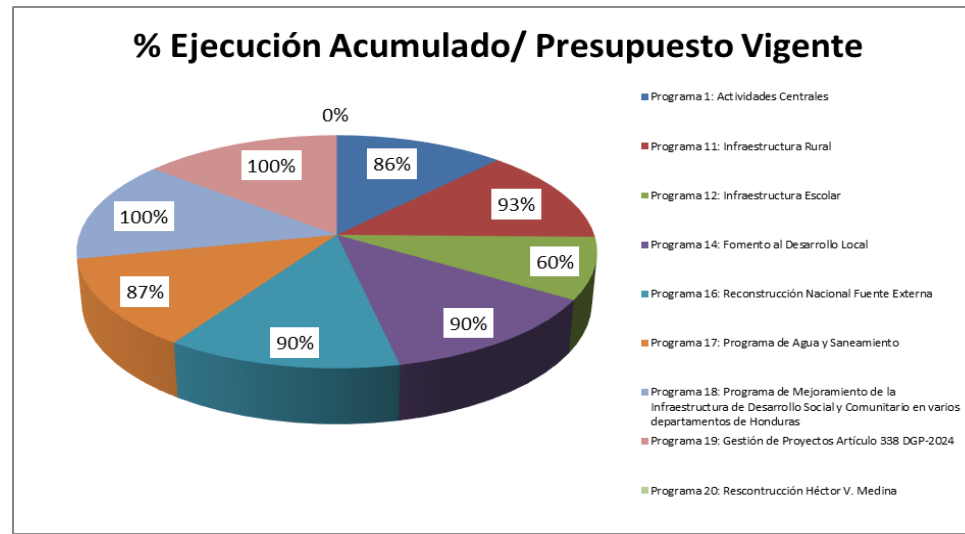


## Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2024



HONDURAS

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente 2024	Devengado al IV Trimestre	Devengado Acumulado 2024	% Ejecución al IV Trimestre / Presupuesto Vigente	% Acumulado al IV Trimestre
Gasto Operativo/Gobierno	L. 1.145.388.050,00	L. 286.855.379,00	L. 115.952.888,90	L. 245.499.262,82	40%	86%
Obras Comunitarias Menores a Nivel Nacional FN	L. 225.577.195,00	L. 165.535.921,00	L. 85.833.233,50	L. 165.535.920,14	52%	100%
Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras PIOH	L. 56.710.336,00	L. 56.610.552,00	L. 19.899.050,81	L. 40.815.197,30	35%	72%
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE	L. 134.601.641,00	L. 37.137.541,00	L. 23.035.409,59	L. 28.005.539,75	62%	75%
Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras MIFE	L. 306.585.912,00	L. 286.585.912,00	L. 81.574.346,00	L. 167.780.788,58	28%	59%
Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS	L. 41.564.993,00	L. 56.925.118,00	L. 27.304.304,88	L. 54.893.122,06	48%	96%
Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes CONVIVIR	L. 70.590.547,00	L. 64.077.075,00	L. 44.150.477,85	L. 54.238.806,67	69%	85%
Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales ETA e IOTA PRE	L. 298.426.045,00	L. 480.926.045,00	L. 162.732.076,31	L. 432.753.537,07	34%	90%
Programa de Ampliación del sistema de Abastecimiento de agua Potable en la Ciudad de Gracias	L. 51.626.065,00	L. 21.778.045,00	L. 3.196.386,87	L. 18.974.432,05	15%	87%
Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras	L. -	L. 10.706.892,00	L. 10.017.891,52	L. 10.665.380,39	94%	100%
Gestión de Proyectos Artículo 338 DGP-2024	L. -	L. 243.181.203,00	L. 134.116.441,00	L. 243.181.201,62	55%	100%
Reconstrucción Hector V. Medina	L. -	L. 1.000.000,00	L. -	L. -	0%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>L. 2.331.070.784,00</b>	<b>L. 1.711.319.683,00</b>	<b>L. 707.812.507,23</b>	<b>L. 1.462.343.188,45</b>	<b>41%</b>	<b>85%</b>

Nota: Se considera el credito disponible ya que cuenta con los fondos reservados de cada proyecto, el saldo al IV trimestre es de L. 248,120,015,73

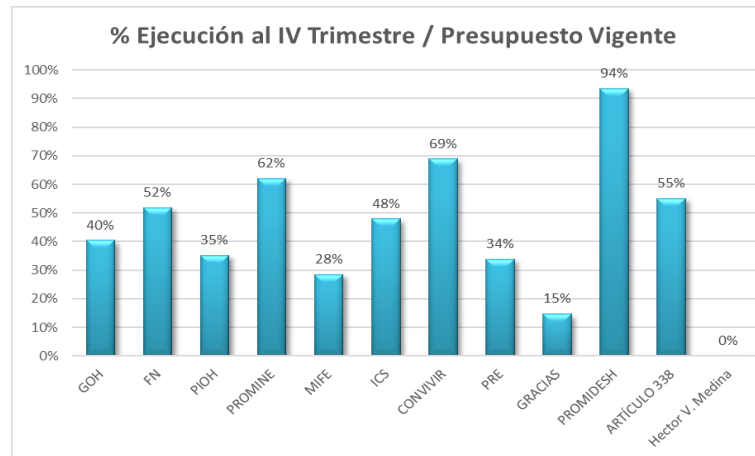


**Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Cuarto Trimestre 2024**

**HONDURAS**

Grupo	Aprobado	Presupuesto Vigente por Grupo	Devengado IV Trimestre	Devengado Acumulado al IV Trimestre	Disponible	% Ejecución IV Trimestre/ Presupuesto Vigente	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
SERVICIOS PERSONALES	L. 155.497.701,00	L. 151.730.421,00	L. 53.943.815,50	L. 151.730.400,81	L. 20,19	36%	100%
SERVICIOS NO PERSONALES	L. 211.277.814,00	L. 211.171.861,00	L. 58.814.063,69	L. 188.337.588,04	L. 22.828.186,09	28%	89%
MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 19.478.176,00	L. 10.583.771,00	L. 2.070.163,67	L. 6.812.332,38	L. 3.771.438,62	20%	64%
BIENES CAPITALIZABLES	L. 1.935.611.955,00	L. 1.335.345.614,00	L. 591.980.685,44	L. 1.112.999.815,22	L. 221.495.406,83	44%	83%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. 9.205.138,00	L. 2.488.016,00	L. 1.003.778,93	L. 2.463.052,00	L. 24.964,00	40%	99%
<b>Total</b>	<b>L. 2.331.070.784,00</b>	<b>L. 1.711.319.683,00</b>	<b>L. 707.812.507,23</b>	<b>L. 1.462.343.188,45</b>	<b>L. 248.120.015,73</b>	<b>41%</b>	<b>85%</b>

**Nota: Se considera el credito disponible ya que cuenta con los fondos reservados de cada proyecto, el saldo al IV trimestre es de L. 248,120,015,73**

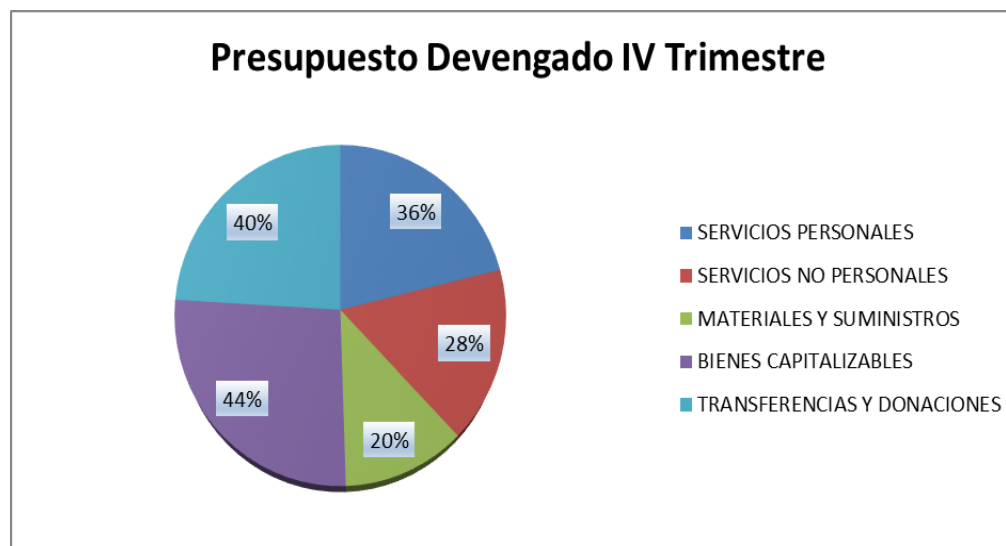

### Ejecución por Objeto del Gasto Cuarto Trimestre del 2024

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
1100	Sueldos basicos	78.102.779,00	67.659.379,00	67.659.376,64	2,36
1150	Decimotercer mes	6.515.110,00	5.348.067,00	5.348.063,64	3,36
11520	Decimocuarto mes	6.515.110,00	5.197.091,00	5.197.087,78	3,22
11600	Complementos	5.238.328,00	4.857.072,00	4.857.069,40	2,60
11700	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11313.121,00	9.761.357,00	9.761.354,57	2,43
11750	Contribuciones para Seguro Social	2.401.600,00	3.227.803,00	3.227.799,81	3,19
12000	Sueldos basicos	37.800.475,00	33.544.356,00	33.544.355,70	0,30
12400	Decimotercer mes	3.150.040,00	2.470.262,00	2.470.261,28	0,72
12420	Decimocuarto mes	3.150.040,00	2.681.417,00	2.681.416,36	0,64
12550	Contribuciones para Seguro Social	1.311.098,00	1.232.281,00	1.232.280,21	0,79
16200	Compensaciones	0,00	15.751.336,00	15.751.335,42	0,58
21100	Suministro de Energia Electrica	300.000,00	439.437,00	439.436,52	0,48
21200	Agua	150.000,00	88.440,00	88.440,00	0,00
21430	Telefonia Celular	0,00	31.722,00	31.721,38	0,62
22000	Alquiler de Edificios, Viviendas y	6.000.000,00	10.788.000,00	10.788.000,00	0,00
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	0,00	8.268,00	8.267,50	0,50
23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	1.574.000,00	1.300.968,00	1.300.966,93	1,07
23390	Mantenimiento y Reparacion de Otros Equipos	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
23600	Mantenimiento de Sistemas Informaticos	50.000,00	0,00	0,00	0,00
24200	Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	200.000,00	1.504.267,00	1.504.266,57	0,43
24300	Servicios Juridicos	940.000,00	391.000,00	391.000,00	0,00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoria	1.315.000,00	416.000,00	416.000,00	0,00
24500	Servicio de Capacitacion	2.251.215,00	1.331.000,00	1.330.999,99	0,01
24600	Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
24700	Servicios de Consultoria de Gestion Administrativa y Financiera	4.745.216,00	3.293.630,00	3.293.627,72	2,28
24720	Servicios de Consultoria de Monitoreo y Evaluacion	11.022.946,00	7.391.678,00	7.391.677,52	0,48
25000	Servicio de Transporte	25.000,00	14.701,00	14.700,03	0,97
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y	2.000.000,00	2.822.698,00	2.822.697,55	0,45
25400	Primas y Gastos de Seguro	10.921.429,00	9.181.604,00	9.181.603,99	0,01
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	7.000,00	0,00	0,00	0,00
25600	Publicidad y Propaganda	70.000,00	35.880,00	35.880,00	0,00
25700	Servicio de Internet	21.000,00	46.789,00	46.788,14	0,86
25900	Otros Servicios Comerciales y	400.000,00	124.279,00	124.278,21	0,79
26100	Pasajes Nacionales	240.000,00	108.100,00	108.099,04	0,96
26200	Viaticos Nacionales	8.072.168,00	7.000.524,00	7.000.522,55	1,45
27200	Tasas	625.000,00	454.040,00	454.039,20	0,80
27500	Gastos Judiciales	0,00	2.985.026,00	2.985.025,37	0,63
29000	Ceremonial y Protocolo	207.142,00	299.038,00	299.037,80	0,20
31100	Productos Alimenticios y Bebidas	134.245,00	125.605,00	125.603,73	1,27
32300	Prendas de Vestir	130.000,00	329.090,00	329.089,75	0,25
33000	Productos de Papel y Carton	520.000,00	244.915,00	244.913,54	1,46
33300	Productos de Artes Graficas	95.000,00	26.786,00	26.785,80	0,20
33500	Libros, revistas y Periodicos	240.000,00	19.225,00	19.225,00	0,00
33700	Especies Timbradas y Valores	30.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00
34400	Llantas y Camaras de Aire	999.613,00	659.038,00	659.037,03	0,97
35000	Productos Quimicos	0,00	7.935,00	7.935,00	0,00
35600	Gasolina	10.000,00	0,00	0,00	0,00
35620	Diesel	2.125.000,00	1.578.508,00	1.578.506,37	1,63
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	700.000,00	96.808,00	96.808,00	0,00
35800	Productos de Material Plastico	7.000,00	49.498,00	49.498,00	0,00
36400	Herramientas Menores	0,00	8.753,00	8.752,50	0,50
39000	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50.000,00	44.893,00	44.892,73	0,27
<b>Total</b>		<b>211.675.675,00</b>	<b>205.315.764,00</b>	<b>205.315.724,27</b>	<b>39,73</b>

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	565.000,00	245.000,00	244.999,35	0,65
39300	Utiles y Materiales Electricos	50.000,00	3.101,00	3.100,10	0,90
39600	Repuestos y Accesorios	1747.937,00	1244.766,00	1244.764,77	1,23
42100	Muebles Varios de Oficina	50.000,00	0,00	0,00	0,00
42120	Equipos Varios de Oficina	0,00	10.235,00	10.235,00	0,00
42140	Electrodomesticos	0,00	73.546,00	73.545,49	0,51
42280	Maquinaria y Equipo de Minería y Aparatos Para Exploracion Geofisica	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
42310	Equipo de Transporte Terrestre para	0,00	7.975.000,00	7.974.999,99	0,01
42430	Equipo de Laboratorio no Medico	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
42510	Equipo de Comunicación	0,00	305.037,00	305.036,90	0,10
42600	Equipos para Computacion	95.534,00	0,00	0,00	0,00
42710	Muebles y Equipos Educativos	20.000.000,00	193.752,00	193.751,14	0,86
45100	Aplicaciones Informaticas	0,00	1803.318,00	1803.317,31	0,69
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80.000.000,00	93.992.190,00	93.992.189,17	0,83
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	451522.944,00	334.196.283,00	334.196.280,33	2,67
26210	Viaticos Nacionales	0,00	65.520,00	0,00	65.520,00
24200	Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	0,00	9.020.000,00	1.240.000,00	7.780.000,00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y	0,00	750.000,00	739.396,87	10.603,13
42310	Equipo de Transporte Terrestre para	0,00	9.600.000,00	9.569.999,99	30.000,01
42600	Equipos para Computacion	0,00	356.892,00	355.983,53	908,47
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en	0,00	52.281.752,00	41.865.000,00	10.416.752,00
21110	Suministro de Energia Electrica	440.000,00	440.000,00	336.305,83	103.694,17
21420	Telefonia Fija	30.000,00	0,00	0,00	0,00
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y	3.600.000,00	3.148.188,00	3.043.896,85	104.291,15
22220	Alquiler de Equipos de Transporte,	2.952.569,00	1.333.822,00	1.013.386,21	320.435,79
23100	Mantenimiento y Reparacion de	576.000,00	514.800,00	513.227,83	1572,17
23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	600.000,00	495.000,00	420.939,93	74.060,07
23360	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles	245.001,00	129.801,00	32.947,50	96.853,50
23390	Mantenimiento y Reparacion de Otros	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigacion	600.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24200	Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	44.205.630,00	34.195.278,00	31.400.262,93	2.795.015,07
24300	Servicios Juridicos	0,00	1.000.000,00	982.213,98	17.786,02
24400	Servicio de Contabilidad y Auditoria	5.749.098,00	4.118.613,00	3.917.906,34	200.706,66
24500	Servicios de Capacitacion	12.985.000,00	3.423.939,00	1.403.605,53	2.020.333,47
24600	Servicios de Informatica y Sistemas	356.000,00	0,00	0,00	0,00
24710	Servicios de Consultoria de Gestion Administrativa y Financiera	41.048.500,00	29.024.851,00	27.324.587,59	1.700.263,41
24720	Servicio de Consultoria de Monitoreo	3.770.000,00	2.740.424,00	2.040.119,79	700.304,21
25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y	785.000,00	895.000,00	627.759,77	267.240,23
25400	Primas y Gastos de Seguro	550.000,00	313.19.000,00	30.919.000,00	400.000,00
25700	Servicio de Internet	490.000,00	390.000,00	278.659,60	111.340,40
25900	Otros Servicios Comerciales y	235.000,00	185.000,00	34.819,86	150.180,14
26110	Pasajes Nacionales	280.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26210	Viaticos Nacionales	6.203.998,00	2.638.210,00	2.089.230,52	548.979,48
27210	Tasas	250.000,00	449.270,00	330.338,56	118.931,44
29100	Ceremonial y Protocolo	200.000,00	108.000,00	57.270,00	46.665,66
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	1.238.875,00	284.875,00	159.804,62	125.070,38
32200	Confecciones Textiles	0,00	230,00	0,00	230,00
32310	Prendas de Vestir	950.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00
33100	Productos de Papel y Carton	615.000,00	499.062,00	238.518,28	260.543,72
33300	Productos de Artes Graficas	200.000,00	6.974,00	0,00	6.974,00
34400	Llantas y Camaras de Aire	520.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00
35100	Productos Quimicos	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
35210	Productos Farmaceuticos y	0,00	11.314,00	0,00	11.314,00
35620	Diesel	3.185.066,00	832.854,00	559.704,31	273.149,69
35800	Productos de Material Plastico	0,00	56.063,00	0,00	56.063,00
36400	Herramientas Menores	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
38100	Material de Defensa y Seguridad	0,00	43.470,00	0,00	43.470,00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo	350.000,00	29.000,00	15.436,75	13.563,25
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	510.000,00	179.752,00	74.317,58	105.434,42
39300	Utiles y Materiales Electricos	0,00	5.636,00	0,00	5.636,00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	0,00	15.000,00	2.031,60	12.968,40
<b>Total</b>		<b>687.802.152,00</b>	<b>632.302.818,00</b>	<b>601.855.391,70</b>	<b>30.377.833,51</b>

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
39600	Repuestos y Accesorios	1.507.056,00	847.102,00	57.561,13	789.540,87
42110	Muebles Varios de Oficina	5.100.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
42120	Equipos Varios de Oficina	5.100.000,00	90.000,00	34.944,05	55.055,95
42310	Equipo de Transporte Terrestre para	5.300.000,00	5.300.000,00	4.757.700,00	542.300,00
42430	Equipo de Laboratorio no Medico	0,00	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00
42510	Equipo de Comunicación	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
42600	Equipos de Computación	10.250.000,00	6.163.605,00	5.868.791,92	294.813,08
42800	Herramientas Mayores	0,00	114.523,00	0,00	114.523,00
45100	Aplicaciones Informáticas	250.000,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
46200	Equipo de Seguridad (Policía)	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	27.489.000,00	26.134.321,00	25.525.312,84	609.008,16
47120	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25.286.494,00	21.552.422,00	20.028.496,14	1.523.925,86
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1.064.783.824,00	602.033.261,00	457.937.317,75	143.245.551,30
47220	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	63.518.054,00	69.653.054,00	36.060.633,80	33.592.420,20
54110	Ayuda Social a Personas (Transferencia de Capital)	9.205.138,00	2.488.016,00	2.463.052,00	24.964,00
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	192.000,00	39.200,00	376.496,82	15.503,18
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	690.000,00	0,00	0,00	0,00
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de tracción y Elevación	554.752,00	704.752,00	496.910,74	207.841,26
23600	Mantenimiento de sistemas	600.000,00	0,00	0,00	0,00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de	180.000,00	343.000,00	126.166,57	216.833,43
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	484.000,00	1.164.000,00	1.161.169,23	2.830,77
24500	Servicios de Capacitación	1.419.012,00	251.000,00	18.750,00	232.250,00
24710	Servicios de consultoría de gestión administrativa y financiera	14.087.221,00	18.877.221,00	16.268.023,39	2.609.197,61
24720	Servicios de consultoría de monitoreo y	11.898.000,00	8.935.000,00	8.202.239,10	732.760,90
25100	Servicio de transporte	19.000,00	0,00	0,00	0,00
25300	Servicio de imprenta, Publicaciones y	431.759,00	357.525,00	50.875,00	306.650,00
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	5.000,00	11.300,00	530,48	8.746,99
26110	Pasajes Nacionales	180.000,00	0,00	0,00	0,00
26210	Viáticos Nacionales	3.096.000,00	3.046.000,00	2.446.472,25	599.527,75
29100	Ceremonial y Protocolo	102.158,00	102.158,00	50.902,96	51.255,04
31110	Productos alimenticios y bebidas	90.000,00	152.534,00	2.533,09	150.000,91
32310	Prendas de vestir	35.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33100	Productos de papel y cartón	25.000,00	40.000,00	9.015,00	30.985,00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	695.000,00	0,00	0,00	0,00
35610	Gasolina	868.384,00	1.368.384,00	897.395,35	470.988,65
35620	Diesel	450.000,00	0,00	0,00	0,00
39200	Útiles de escritorio, Oficina y Enseñanza	25.000,00	25.000,00	21012,00	3.988,00
39600	Repuestos y accesorios	810.000,00	165.000,00	89.991,00	75.009,00
42110	Muebles Varios de Oficina	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
42310	Equipo de Transporte Terrestre para	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
42600	Equipo para Computación	1.603.200,00	3.326.816,00	1.218.850,00	2.107.966,00
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y	750.000,00	0,00	0,00	0,00
45100	Aplicaciones Informáticas	0,00	1.030.562,00	0,00	1.030.562,00
47110	Construcciones y mejoras de Bienes en Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	104.349.347,00	23.911.331,00	16.115.043,59	7.796.287,41
47120	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	6.626.355,00	13.494.111,00	10.766.527,98	2.727.583,02
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	63.537.203,00	56.587.203,00	44.119.358,30	12.467.844,70
<b>Total</b>		<b>1.431.592.957,00</b>	<b>873.348.301,00</b>	<b>655.172.072,48</b>	<b>217.676.614,04</b>
<b>Total General</b>		<b>2.331.070.784,00</b>	<b>1.711.319.683,00</b>	<b>1.462.343.188,45</b>	<b>248.120.015,73</b>

### Resumen de Cuadro por Sector 2024

SECTOR	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
AGUA Y SANEAMIENTO	10	34	185.284.377,23	1.015	140.736
INFRAESTRUCTURA VIAL	75	161	222.514.488,68	3.258	2.028.810
EMPRENDIMIENTO Y VALORES	2	16	3.198.605,57	331	13.500
PREVENCION SITUACIONAL/CONVIVENCIA	20	15	134.112.427,18	509	1.796.060
EDUCACION	89	164	445.672.115,63	4.452	98.749
SALUD	2	5	5.000.554,98	127	3.116
<b>TOTAL</b>	<b>198</b>	<b>395</b>	<b>995.782.569,27</b>	<b>9.692</b>	<b>4.080.971</b>

**Nota:** El monto total refleja la inversión realizado por los proyectos en Construcción

### Resumen de Cuadro por Departamento 2024

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
ATLANTIDA	8	8	39.492.693,04	211	476.129
CHOLUTECA	4	16	35.753.732,39	383	346.244
COMAYAGUA	17	34	74.857.171,21	886	235.926
COPAN	8	14	66.712.134,80	459	78.925
CORTES	37	61	181.909.003,39	1.545	974.224
COLON	11	19	53.602.035,83	547	55.585
EL PARAISO	1	16	21.855.108,63	275	282.787
FRANCISCO MORAZAN	24	34	91.552.362,28	1.119	455.917
GRACIAS A DIOS*	0	2	3.264.072,24	49	902
INTIBUCÁ	5	9	25.842.811,00	263	19.113
ISLAS DE LA BAHIA	1	2	-	37	0
LA PAZ	9	12	32.286.938,51	340	135.926
LEMPIRA	8	17	47.646.834,93	382	15.701
OCOTEPEQUE	1	4	2.815.156,03	91	621
OLANCHO	37	50	133.629.536,46	1.286	643.394
SANTA BARBARA	20	60	64.296.088,19	1.006	236.701
YORO	3	28	94.894.276,19	657	103.751
VALLE	4	9	25.372.614,15	156	19.125
<b>TOTAL</b>	<b>198</b>	<b>395</b>	<b>995.782.569,27</b>	<b>9.692</b>	<b>4.080.971</b>

### Resumen de Cuadro por Otras Inversiones 2024

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	166.417.771,17
GASTO OPERATIVO DE PROGRAMAS	33.978.204,80
ACTIVIDADES CENTRALES FHIS	245.499.262,82
<b>TOTAL</b>	<b>445.895.238,79</b>





**PACC-FHIS 2024 IV TRIMESTRE**



HONDURAS

Seguimiento PACC IV-2024 SEDECOAS/FHIS											
No.	Nombre de la Adquisición	Tipo de Adquisición	No. de Proceso	Monto Estimado (L) Hondurcompras	Orden de Compra	Monto adjudicado	Estatus	Fecha Estimada de contratación	Fecha de Adjudicación	UNIDAD QUE SOLICITO LA ADQUISICION	COMENTARIOS SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO
1	GC-UC-ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO PARA TRABAJO DE CAMPO EN PROYECTOS EJECUTADOS POR EL FHIS -FHIS	Bienes Muebles	CMA-082-FHIS-2024	L 250,000.00	13477	L 257,654.05	Adjudicado	28/6/2024	1/11/2024	DIRECCION DE PROYECTOS	El día lunes 25-11-2024 entregan el equipo
2	GC-UC-ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON -FHIS	Suministros de consumo	CMA-155-FHIS-2024	L 55,000.00	13475	L 29,518.20	Adjudicado	29/6/2024	31/10/2024	PROVEEDURIA	Finalizado
3	GC-UC-ADQUISICION DE CARATULAS PARA IMPRIMIR LICENCIAS AMBIENTALES -FHIS	Suministros de consumo	CMA-156-FHIS-2024	L 150,000.00	13471	L 1,667.50	Adjudicado	26/4/2024	28/10/2024	DIRECCION DE PROYECTOS	Finalizado
4	GC-UC-ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS -FHIS	Suministros de consumo		L 50,000.00				30/11/2024			No Hay requerimiento aun
5	GC-UC-ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS PARA TODA LA INSTITUCIÓN -FHIS	Suministros de consumo		L 80,000.00	*	*		30/9/2024	*		No Hay requerimiento aun
6	GC-UC-ADQUISICION SEPARADORES PERSONALIZADOS PARA EXPEDIENTES DE PROYECTOS DE OBRAS -FHIS	Suministros de consumo	CMA-163-FHIS-2024	L 18,650.00	13510	L 18,630.00	Adjudicado	12/9/2024	15/11/2024	DIRECCION DE PROYECTOS	En espera de entrega de suministro
7	GC-UC-ADQUISICION ROLLO FILM INDUSTRIAL PARA EMBALAJE -FHIS	Suministros de Consumo	CMA-135-FHIS-2024	L 10,000.00	13,465.00	L 14,605.00	Adjudicado	3/9/2024	14/10/2024	ARCHIVO GENERAL	Finalizado
8	GC-UC-ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA FORTALECER TALLER DE FLOTA VEHICULAR -FHIS	Suministros de Consumo	CMA-149-FHIS-2024	L 150,000.00	13516/13517/13518/	L 57,675.85	Adjudicado	9/7/2024	19/11/2024	TRANSPORTE	En espera de entrega de suministro
9	GC-UC-ADQUISICION DE TINTAS Y TONER -FHIS	Suministros de Consumo	CMA-150-FHIS-2024	L 50,000.00	13483/ 13484	L 46,142.78	Adjudicado	20/8/2024	5/11/2024	PROVEEDURIA	Finalizado
10	GC-UC-ADQUISICION DE PINTADO DE BANDERAS E INSIGNIAS PARA VEHICULOS NUEVOS -FHIS	Servicios	CMA-144-FHIS-2024	L 115,000.00	13470	L 99,015.00	Adjudicado	30/9/2024	23/11/2024	TRANSPORTE	Servicio con entregas parciales a la esper
11	GC-UC-ADQUISICION SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE CODIGOS DE FALLAS Y REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN PARA VEHICULOS FRONTIER GHA-1293 Y VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 GHA1274 -FHIS	Servicios	CMA-140-FHIS-2024	L 160,000.00	13469	L 89,307.85	Adjudicado	16/9/2024	25/10/2024	TRANSPORTE	En trámite de Pago
12	GC-UC-ADQUISICION SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FOTON POR KM RECORRIDO SEGUN CERTIFICADO DE GARANTIA -FHIS	Servicios	CMA-132-FHIS-2024, CMA-147-FHIS-2024, CMA-164-FHIS-2024, CMA-133-FHIS-2024, CMA-170-FHIS-2024, CMA-177-FHIS-2024, CMA-176-FHIS-2024, CMA-179-FHIS-2024, CMA-178-FHIS-2024, CMA-187-FHIS-2024, CMA-193-FHIS-2024, CMA-197-FHIS-2024, CMA-224-FHIS-2024, CMA-228-FHIS-2024, CMA-225-FHIS-2024	L 100,000.00	13446 / 13467 /13478 /13449 / 13481 /13488 /13487 /13493/13494 /13507 /13551 /13523/13563 /13571/ 13564	L 172,774.83	Adjudicado	1/7/2024	desde el 01-10-2024 hasta el11-12-2024	TRANSPORTE	Según acuerdo de garantía , se solicitó una modificación presupuestaria para cubrir las necesidades de mantenimiento de vehiculos según acuerdo de garantía
13	GC-UC-ADQUISICION DE MAQUINA ETIQUETADORA CON QR PARA INVENTARIAR BIENES DE USO -FHIS	Bienes de Uso	CMA-209-FHIS-2024	L 20,000.00	*	*	Fracasado	22/7/2024	*		En proceso de publicación y ala espera de la modificación presupuestaria para su financiamiento
14	GC-UC-ADQUISICION DE RELOJ MARCADOR DE DOCUMENTOS -FHIS	Bienes de Uso	CMA-142-FHIS-2024	L 40,000.00	13466	L 10,235.00	Adjudicado	30/8/2024	15/10/2024	CONTROL Y SEGUIMIENTO	Finalizado





15	GC-UC-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR -FHS	Suministros de Consumo	CMA-148-FHS-2024	L	300,000.00	3490 /1348 /1348	L	284,613.50	Adjudicado	30/9/2024	8/11/2024	TRANSPORTE	
16	GC-UC-ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES - FHS	Suministros de Consumo	CMA-185-FHS-2024	L	120,000.00	13557 /13568	L	59,754.00	Adjudicado		10/12/2024		FONDOS FHS
17	GC-UC-ADQUISICION DE DISCOS DUROS INTERNOS PARA FORTALECIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO -FHS	Suministros de Consumo	CMA-184-FHS-2024	L	250,000.00	13552	L	296,010.00	Adjudicado		6/12/2024		FONDOS FHS
18	GC-UC-ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCION -FHS	Bienes de Uso	CMA-182-FHS-2024	L	100,000.00	13514 /13513	L	73,545.49	Adjudicado	15/11/2024	18/11/2024		
19	GC-UC-ADQUISICION DE ARMARIO PARA FORTALECIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA - FHS	Bienes de Uso	CMA-183-FHS-2024	L	10,000.00	13538	L	5,956.44	Adjudicado	28/11/2024	28/11/2024	RRHH	FONDOS FHS
20	GC-UC-ADQUISICION DE PRENDAS E INDUMENTARIA DE VESTIR PARA PERSONAL DEL FHS -FHS	Suministros de Consumo	CMA-152-FHS-2024	L	300,000.00	13472	L	299,281.75	Adjudicado	29/10/2024	29/10/2024	COMUNICACIONES	FONDOS FHS
21	GC-UC-ADQUISICION DE RELOJ DE RECONOCIMIENTO FACIAL -FHS	Bienes de Uso	CMA-194-FHS-2024	L	20,000.00				francésado				Apertura programada para el día lunes 25/11/2024
22	GC-UC-ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA marca HP LaserJet Pro MFP modelo 4303 -FHS	suministros de consumo	CMA-218-FHS-2024	L	300,000.00	13554	L	298,494.00		5/12/2024	10/12/2024	PROVEEDURIA	FONDOS SEDECOAS
23	GC-UC-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PRESENTACION DE LOGROS DE SEDECOAS/FHS -FHS	suministros de consumo	CMA-219-FHS-2024	L	200,000.00	13567	L	169,000.00	Adjudicado	13/12/2024	12/12/2024	COMUNICACIONES	FONDOS SEDECOAS
24	GC-UC-ADQUISICION DE PRODUCTOS DE OFICINA Y UTILES DE OFICINA -FHS	suministros de consumo	CMA-223-FHS-2024	L	120,000.00	22-1-28-0140-2024 / 22-1-28-0138-2024 / 22-1-28-0137-2024	L	54,051.26	Adjudicado	30/10/2024	12/12/2024	PROVEEDURIA	FONDOS SEDECOAS
25	GC-UC-ADQUISICION DE PRODUCTOS DE OFICINA Y UTILES DE OFICINA -FHS	suministros de consumo	CMA-221-FHS-2024	L	30,000.00	13569	L	26,553.75	Adjudicado		12/12/2024	PROVEEDURIA	FONDOS SEDECOAS
26	GC-UC-ADQUISICION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS -FHS	suministros de consumo	CMA-188-FHS-2024	L	250,000.00	13540	L	216,156.31	Adjudicado		29/11/2024	METODOS Y SISTEMAS	FONDOS FHS

  
 Autorizado por  
 Gabriela Ortiz  
 Jefe de Unidad de compras SEDECOAS/FHS



  
 Aprobado por  
 Subdirección de Administración y Finanzas  
 HONDURAS, C.A.

PACC IV-2024 SEDECOAS/FHIS

No.	Nombre de la Adquisición	Tipo de Adquisición	No. de Proceso	Monto Estimado (L) Honducompras	Fecha Estimada de contratación	UNIDAD QUE SOLICITO LA ADQUISICION	OBJETO DE GASTO
1	GC-UC-ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO PARA TRABAJO DE CAMPO EN PROYECTOS EJECUTADOS POR EL FHIS -FHIS	Bienes Muebles	CMA-082-FHIS-2024	L 250,000.00	28/6/2024	DIRECCION DE PROYECTOS	42280 /42430/ 42600
2	GC-UC-ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON -FHIS	Suministros de consumo	CMA-155-FHIS-2024	L 55,000.00	29/6/2024	PROVEEDURIA	39200
3	GC-UC-ADQUISICION DE CARATULAS PARA IMPRIMIR LICENCIAS AMBIENTALES -FHIS	Suministros de consumo	CMA-156-FHIS-2024	L 150,000.00	26/4/2024	DIRECCION DE PROYECTOS	33100
4	GC-UC-ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS -FHIS	Suministros de consumo		L 50,000.00	30/11/2024		
5	GC-UC-ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS PARA TODA LA INSTITUCIÓN -FHIS	Suministros de consumo		L 80,000.00	30/9/2024		
6	GC-UC-ADQUISICION SEPARADORES PERSONALIZADOS PARA EXPEDIENTES DE PROYECTOS DE OBRAS -FHIS	Suministros de consumo	CMA-163-FHIS-2024	L 18,650.00	12/9/2024	DIRECCION DE PROYECTOS	33100
7	GC-UC-ADQUISICION ROLLO FILM INDUSTRIAL PARA EMBALAJE -FHIS	Suministros de Consumo	CMA-135-FHIS-2024	L 10,000.00	3/9/2024	ARCHIVO GENERAL	35800
8	GC-UC-ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA FORTALECER TALLER DE FLOTA VEHICULAR -FHIS	Suministros de Consumo	CMA-149-FHIS-2024	L 150,000.00	9/7/2024	TRANSPORTE	23200
9	GC-UC-ADQUISICION DE TINTAS Y TONER -FHIS	Suministros de Consumo	CMA-150-FHIS-2024	L 50,000.00	20/8/2024	PROVEEDURIA	39600
10	GC-UC-ADQUISICION DE PINTADO DE BANDERAS E INSIGNIAS PARA VEHICULOS NUEVOS -FHIS	Servicios	CMA-144-FHIS-2024	L 115,000.00	30/9/2024	TRANSPORTE	23200
11	GC-UC-ADQUISICION SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE CODIGOS DE FALLAS Y REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN PARA VEHICULOS FRONTIER GHA-1293 Y VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 GHA1274 -FHIS	Servicios	CMA-140-FHIS-2024	L 160,000.00	16/9/2024	TRANSPORTE	23200



12	GC-UC-ADQUISICION SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FOTON POR KM RECORRIDO SEGUN CERTIFICADO DE GARANTIA -FHIS	Servicios	CMA-132-FHIS-2024, CMA-147-FHIS-2024, CMA-164-FHIS-2024, CMA-133-FHIS-2024, CMA-170-FHIS-2024, CMA-177-FHIS-2024, CMA-176-FHIS-2024, CMA-179-FHIS-2024, CMA-178-FHIS-2024, CMA-187-FHIS-2024, CMA-193-FHIS-2024, CMA-197-FHIS-2024, CMA-224-FHIS-2024, CMA-228-FHIS-2024, CMA-225-FHIS-2024	L	100,000.00	1/7/2024	TRANSPORTE	23200
13	GC-UC-ADQUISICION DE MAQUINA ETIQUETADORA CON QR PARA INVENTARIAR BIENES DE USO -FHIS	Bienes de Uso	CMA-209-FHIS-2024	L	20,000.00	22/7/2024		
14	GC-UC-ADQUISICION DE RELOJ MARCADOR DE DOCUMENTOS -FHIS	Bienes de Uso	CMA-142-FHIS-2024	L	40,000.00	30/8/2024	CONTROL Y SEGUIMIENTO	42140
15	GC-UC-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR -FHIS	Suministros de Consumo	CMA-148-FHIS-2024	L	300,000.00	30/9/2024	TRANSPORTE	39600
16	GC-UC-ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES - FHIS	Suministros de Consumo	CMA-185-FHIS-2024	L	120,000.00		COMUNICACIONES	42510
17	GC-UC-ADQUISICION DE DISCOS DUROS INTERNOS PARA FORTALECIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO -FHIS	Suministros de Consumo	<b>CMA-184-FHIS-2024</b>	L	250,000.00		COMUNICACIONES	42600
18	GC-UC-ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCION -FHIS	Bienes de Uso	CMA-182-FHIS-2024	L	100,000.00	15/11/2024	DAF	42110
19	GC-UC-ADQUISICION DE ARMARIO PARA FORTALECIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA -FHIS	Bienes de Uso	CMA-183-FHIS-2024	L	10,000.00	28/11/2024	RRHH	42110





Fondo Hondureño  
de Inversión Social



20	GC-UC-ADQUISICION DE PRENDAS E INDUMENTARIA DE VESTIR PARA PERSONAL DEL FHIS -FHIS	Suministros de Consumo	CMA-152-FHIS-2024	L	300,000.00	29/10/2024	COMUNICACIONES	32310
21	GC-UC-ADQUISICION DE RELOJ DE RECONOCIMIENTO FACIAL -FHIS	Bienes de Uso	CMA-194-FHIS-2024	L	20,000.00			
22	GC-UC-ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA marca HP LaserJet Pro MFP modelo 4303 -FHIS	suministros de consumo	CMA-218-FHIS-2024	L	300,000.00	5/12/2024	PROVEEDURIA	39600
23	GC-UC-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PRESENTACION DE LOGROS DE SEDECOAS/FHIS -FHIS	suministros de consumo	CMA-219-FHIS-2024	L	200,000.00	13/12/2024	COMUNICACIONES	31110
24	GC-UC-ADQUISICION DE PRODUCTOS DE OFICINA Y UTILES DE OFICINA -FHIS	suministros de consumo	CMA-223-FHIS-2024	L	120,000.00	30/10/2024	PROVEEDURIA	39200
25	GC-UC-ADQUISICION DE PRODUCTOS DE OFICINA Y UTILES DE OFICINA -FHIS	suministros de consumo	CMA-221-FHIS-2024	L	30,000.00	30/10/2024	PROVEEDURIA	39200
26	GC-UC-ADQUISICION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS -FHIS	suministros de consumo	CMA-188-FHIS-2024	L	250,000.00	5/12/2024	METODOS Y SISTEMAS	45100
27	GC-UC-ADQUISICION SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FOTON POR KM RECORRIDO SEGUN CERTIFICADO DE GARANTIA -FHIS	Servicios	CMA-131-FHIS-2024,CMA-151-FHIS-2024, CMA-196-FHIS-2024, CMA-210-FHIS-2024,CMA-215-FHIS-2024	L	100,000.00	DESDE 01-11-2024 HASTA 10-12-2024	TRANSPORTE	23200

Elaborado por:

Gabriela Ortiz

Jefe de Unidad de compras SEDECAS/FHIS



Aprobado por:

Miguel Bonilla

Subdirector de Administración y Finanzas



## CARTERA BANCO MUNDIAL



### ✓ **Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE 6822-HN)**



#### **i. Antecedentes**

Entre los días 1 y 16 de noviembre de 2020, dos tormentas tropicales consecutivas, Eta e Iota, devastaron a Honduras con una magnitud de impacto económico y social comparable a la del huracán Mitch de 1998. En respuesta a la emergencia causada, el Gobierno de Honduras (GdH) solicitó al Banco Mundial (BM) un financiamiento de US\$150 millones para un Proyecto de Recuperación de Emergencia.

El 8 de marzo de 2021 el Gobierno de Honduras suscribió con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) el Convenio de Crédito No. 6822-HN, por un monto de US\$150.000.000.00, aprobado mediante Decreto Legislativo No.10-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 5 de mayo de 2021, fondos que financiarán el Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE), habiéndose cumplido con las condiciones de efectividad el 4 de junio de 2021 y efectuándose el Primer Desembolso el 28 de junio de 2021 por un monto de USD\$ 4.36 Millones.

El Proyecto se enfoca en la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública en salud, educación, agua y saneamiento, vial, comunitaria y vivienda en las zonas geográficas del país afectadas por los ciclones tropicales Eta e Iota.

La implementación, coordinación, planificación y seguimiento general del Proyecto se llevará de manera centralizada en la SEDECOAS, a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), quien contará con personal especializado en diferentes áreas que garanticen el cumplimiento de los estándares del BM.

## ii. Objetivo General

El PRE tiene por objetivo atender las necesidades identificadas como prioritarias para reactivar la economía y apoyar las más urgentes necesidades de la población afectada por los fenómenos naturales ETA e IOTA, como respuesta de emergencia y recuperación de Honduras, y, en esta perspectiva, fortalecer la capacidad institucional del Estado para gestionar una ejecución eficaz, eficiente y transparente.

## iii. Objetivos Específicos

- Realizar operaciones de asistencia y respuesta de emergencia, salud y seguridad pública.
- Realizar la rehabilitación y construcción resiliente de la infraestructura pública y Comunitaria y Restablecimiento de los servicios públicos.
- Mejorar la capacidad instalada del Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.

## iv. Descripción

### **Componente 1: Operaciones de asistencia y respuesta de emergencia, salud y seguridad pública (US\$ 17.3 MILLONES)**

Bajo este componente se financian actividades y acciones de respuesta y seguridad pública como resultado de los daños causados por los ciclones Eta e Iota. Son elegibles actividades de respuesta inmediata realizadas por el Gobierno de Honduras previo a la fecha de efectividad del Crédito.

### **Componente 2: Rehabilitación y reconstrucción resiliente de la infraestructura pública y comunitaria y restablecimiento de los servicios públicos (US\$119.2 MILLONES)**

Este componente se financia la preparación técnica, la implementación de reparaciones urgentes, rehabilitación y reconstrucción resiliente de la infraestructura pública y comunitaria de alta prioridad, incluido el costo de la reubicación temporal y la inspección o actividades de diseño necesarias para instalaciones de alta prioridad que requieran una nueva construcción.

### **Componente 3: Apoyo institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción (US\$11.0 MILLONES)**

El componente se financia la gestión de Proyecto (financiero y fiduciario), la capacidad técnica e institucional, auditorías técnicas, financieras y sociales, monitoreo y seguimiento, cumplimiento social y ambiental, mecanismo de atención y resolución de quejas y denuncias, preparaciones informes, evaluación de medio términos, estudios de línea base.

#### **Componente 4. Medidas de Protección Financiera de Emergencia. (US\$2.5 Millones).**

El componente corresponde a las Primas anuales en virtud de la Parte 4 del Proyecto

##### **v. Focalización**

Para determinar las zonas y sectores de intervención, el Gobierno de Honduras con la asistencia técnica de organizaciones y agencias internacionales, ha elaborado el documento borrador denominado “Evaluación de daños y pérdidas causadas por las tormentas tropicales Eta e Iota”<sup>1</sup>

También se cuenta con la base de datos del estudio levantado por la SEDECOAS denominado “Plataforma de información de incidencias de la infraestructura dañada por las tormentas Eta e Iota”, que consolida los datos de las tres fuentes del Gobierno. De igual manera, se cuenta con listas de infraestructura que fue levantada por las instituciones sectoriales en las oficinas de COPECO Tegucigalpa, en un centro de acopio instalado luego de los eventos de desastre de las tormentas tropicales Eta e Iota.

Las acciones de respuesta de socorro y atención a personas están siendo financiadas bajo el Componente 1 y, las obras de reconstrucción y rehabilitación, elegibles y priorizadas, serán financiadas bajo el Componente 2, estas se ejecutarán en los municipios y sectores afectados por las tormentas tropicales Eta e Iota.

##### **vi. Sector de Intervención**

Los sectores por intervenir son:

- **Infraestructura de Salud:** Rehabilitación, reconstrucción, construcción de obras de mitigación de centros de salud, UAPS, CIS, Clínicos y hospitales.

<sup>1</sup> Dalla\_Honduras, 2020

- **Infraestructura Vial:** Habilitación, reposición de carreteras primarias, secundarias, carreteras terciarias (caminos vecinales), habilitación, reposición y reparación de puentes, puentes de doble vía cajas puentes, vados en caminos, construcción de obras de mitigación para proteger estructuras viales, rehabilitación de calles (pavimentadas y no pavimentadas), rehabilitación de caminos rurales de terracería, mantenimiento en los cauces de los ríos (incluye limpieza, dragado, etc.).
- **Infraestructura Escolar:** Rehabilitación, reparación y reposición de Centros de Educación de manera integral incluyendo obras ambientales y de mitigación.
- **Infraestructura Agua y Saneamiento:** Reparación o rehabilitación en estructuras de sistemas de agua potables (obras tomas, desarenadores, pases aéreos, tanques de almacenamiento, cajas de registro, rompe cargas, cajas distribuidoras de caudal, etc.), plantas de tratamiento y sistemas de aguas residuales, construcción de obras de mitigación para la protección de estructuras de los sistemas de agua potable y residuales, equipamiento de agua potable y residuales.
- **Infraestructura Comunitaria:** Rehabilitación de centros comunitarios y servicios públicos básicos (estación de bomberos, estaciones policiales, albergues, alcaldías, etc.), reposición de centros comunitarios, equipamiento para rehabilitación de centros comunitarios y servicios públicos básicos.

**vii. Duración del Proyecto:**

El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de 5 años y medio incluyendo actividades de gestión, socialización, adquisiciones, etc.

**viii. Avance Financiero**

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	175.537.263,00	1.116.987,87	1%
2022	259.608.231,00	53.027.150,75	20%
2023	432.092.852,00	130.271.743,46	30%
2024	480.926.045,00	432.753.537,07	90%



**ix. Avance por Sector**

SECTOR	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
AGUA Y SANEAMIENTO	1	7	99.346.739,61	443	125.120
INFRAESTRUCTURA VIAL	3	2	41.584.783,06	157	20.002
EDUCACION	15	16	168.364.791,36	953	7.526
SALUD	0	1	5.000.554,98	44	3.116
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>314.296.869,01</b>	<b>1.597</b>	<b>155.764</b>

**x. Avance por Departamento**

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios directos 2024
ATLANTIDA	0	1	5.073.264,36	37	248
CHOLUTECA	0	1	11.051.310,64	102	1.491
COMAYAGUA	4	2	32.818.297,17	196	73.141
COPAN	0	2	34.404.984,58	85	12.915
CORTES	3	9	54.176.127,38	417	7.715
COLON	0	3	35.755.564,06	152	521
EL PARAISO	1	0	762.843,50	17	29
FRANCISCO MORAZAN	2	2	39.051.887,29	114	1.360
LA PAZ	3	0	2.172.417,56	28	82
LEMPIRA	2	0	10.965.221,80	35	133
OCOTEPEQUE	1	0	1.027.488,56	14	32
OLANCHO	0	1	10.398.091,66	65	2.586
SANTA BARBARA	3	0	7.179.798,48	72	7.087
YORO	0	5	69.459.571,97	263	48.424
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>314.296.869,01</b>	<b>1.597</b>	<b>155.764</b>

**xi. Otras Inversiones**

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	82.234.063,64
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	5.303.604,42
SEGURO SOBERANO -CCRIF	30.919.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>118.456.668,06</b>

## xii. Situación presupuestaria

El monto formulado original para el año 2024 asciende a L 298,426,045.00, sin embargo, después de actualizar los montos comprometidos y ejecutados al cierre del 2023, se presentó para consideración de la SEFIN, un nuevo monto presupuestario por L 349,935,045.00 el cual no fue aceptado.

En mayo, se le ha incorporado al presupuesto L 32,500,000.00 para pagos del seguro soberano. En junio se incorporaron L 50,000,000.00 para pago de estimaciones de subproyectos de inversión. En diciembre se incorporaron L 100,000,000.00 para pago de estimaciones por avance de obra y supervisión de subproyectos de inversión. El presupuesto vigente ahora asciende a **L 480,926,045.00** ejecutándose al cierre del cuarto trimestre el monto de **L 432,753,537.07** equivalente al **90%**.

Así mismo, a partir de las revisiones y reprogramaciones de actividades en el Plan Operativo Anual (POA) y en el Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC), se solicitaron modificaciones presupuestarias internas entre actividades y objetos del gasto, sin modificarse el presupuesto global vigente.

El 78% del presupuesto está concentrado en el Componente 2 para ejecución de obras de las cuales a la fecha ascienden a 76 subproyectos, desglosados de la siguiente manera:

- 61 subproyectos de reposición/repación de centros educativos
- 9 subproyectos de rehabilitación/rehabilitación de sistemas de agua potable
- 5 subproyectos de reposición de puentes y cajas puente
- 1 subproyecto de rehabilitación de unidad de atención primaria en salud.

## xiii. Ejecución Financiera

El monto del financiamiento del Crédito es de US\$ 150,000.00, con ejecución financiera acumulada al 31 de diciembre del 2024 que asciende a L 1,221,519,373 equivalentes a USD 49,611,619 que representa el 33% del monto de Convenio; mostrándose a la fecha una disponibilidad por componentes de inversión, así:

Componentes	(a) Asignación Convenio Crédito		(b) = (c + d) Total Comprometido		(c) Ejecutado acumulado		(d) Comprometido por ejecutar **		(e) = (a - b) Disponible
	US\$	* HNL	US\$	HNL	US\$	HNL	US\$	HNL	US\$
	1) Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública	17,300,000	420,390,000	16,818,559	407,708,157	16,818,559	407,708,157	-	-
<i>Categoría: Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, y costos operativos bajo la Parte 1 del Proyecto.</i>	17,300,000	420,390,000	16,818,559	407,708,157	16,818,559	407,708,157	-	-	481,441
2) Rehabilitación y Construcción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos	119,200,000	2,896,560,000	50,255,278	1,256,462,742	26,215,115	651,131,443	24,040,163	605,331,299	68,944,722
<i>Categoría: Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 2 del Proyecto</i>	119,200,000	2,896,560,000	50,255,278	1,256,462,742	26,215,115	651,131,443	24,040,163	605,331,299	68,944,722
3) Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción	11,000,000	267,300,000	4,593,308	113,771,835	4,327,944	107,089,972	265,364	6,681,863	6,406,692
<i>Categoría: Bienes, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 3 del Proyecto</i>	11,000,000	267,300,000	4,593,308	113,771,835	4,327,944	107,089,972	265,364	6,681,863	6,406,692
4) Medidas de Protección Financiera de Emergencia	2,500,000	60,750,000	2,250,000	55,589,800	2,250,000	55,589,800	-	-	250,000
<i>Categoría: Primas anuales en virtud de la Parte 4 del Proyecto</i>	2,500,000	60,750,000	2,250,000	55,589,800	2,250,000	55,589,800	-	-	250,000
<b>Total</b>	<b>\$ 150,000,000</b>	<b>HNL 3,645,000,000</b>	<b>\$ 73,917,146</b>	<b>HNL 1,833,532,534</b>	<b>\$ 49,611,619</b>	<b>HNL 1,221,519,373</b>	<b>\$ 24,305,527</b>	<b>HNL 612,013,161</b>	<b>\$ 76,082,854</b>

\* Se aplica la tasa de L 24.3 establecida en el Documento del Proyecto (PAD) y en el presupuesto global en los Sistemas: SNIPH, UEPEX y Sistema Financiero del FHIS.

\*\* Valores comprometidos con contrato

Para fines de control y seguimiento al costo administrativo (10%) del proyecto, el componente 3. se subdividió en el Sistema UEPEX/SIAFI en dos componentes/actividad presupuestaria (3. y 4.) con el nombre “Gestión y Administración del Proyecto”.

#### xiv. Desembolsos

Al 31 de diciembre del 2024 los desembolsos suman la cantidad de US\$ 81,456,241.38 equivalente a L 2,022,043,505.38; representa el 54.3% del total del Crédito.

El total desembolsado incluye US\$ 16.8 Millones por reembolso bajo el Componente 1 mediante pago

directo a la SEFIN por actividades de respuesta inmediata realizadas por la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS); US\$ 2.250 Millones por pagos directos por anticipo/prima de la Póliza de Seguro por exceso de lluvia (XSR) a The Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF-SPC), y US\$25.8 Millones por reorientación de fondos para la atención de daños provocados por la tormenta SARA (PCM 035-2024).

Desembolso	Dólares	Lempiras
Anticipo Cuenta Designada del Proyecto (Cta. 11101-20-000949-1 BCH) <sup>2</sup>	36,598,682.00	903,242,112.78
Reembolso bajo Componente 1, con Pago Directo a la SEFIN. (Cta. 11101-20-000952-1)	16,818,559.38	407,708,157.42
Pago Directo – CCRIF	2,250,000.00	55,589,800.00
Reorientación de Fondos- SF IDA 7154 2DO CRED HN	25,789,000.00	655,503,435.18
<b>Total</b>	<b>81,456,241.38</b>	<b>2,022,043,505.38</b>

## xv. MODIFICACIONES AL CONVENIO

### Enmienda No. 1

Mediante Oficio No. SE-SEDECOAS-FHIS-620/2021 se solicita la primera reasignación de fondos entre Categorías de Inversión respaldada en Dictámenes Técnicos Favorables No. 057-2021 (septiembre 2021) y 068-2021 (noviembre 2021) emitidos por la SEFIN y aprobada por el Banco Mundial el 16 de diciembre de 2021.

La reasignación se hace entre el Componente 1. y 2. para cubrir el sobregiro de USD\$ 7,300,000 en el monto original asignado bajo la Categoría 1. del Componente 1.

<sup>2</sup> Se ha presentado justificaciones de gastos efectuados contra la Cuenta Especial del Proyecto por un total de \$23,380,380, que representa el 64% de monto del anticipo desembolsado.

## Enmienda No. 2

En fecha 3 de agosto de 2023 la Secretaría de Finanzas solicita al Banco Mundial aprobación de la segunda enmienda al Convenio de Crédito, para incorporar el financiamiento del pago de la Prima del Fondo de Seguro contra Riesgos Catastróficos en el Caribe (CCRIF) de Honduras. La enmienda al Convenio de Financiamiento fue firmada el 31 de octubre de 2023 con Dictamen Técnico Favorable No.037-2023, que consiste en disminuir el Componente 2 en US\$ 2,500,000.00 y crear el Componente 4 – Primas anuales en virtud de la Parte 4 del Proyecto (Medidas de protección financiera de emergencia).

El Convenio de Financiamiento queda modificado, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Categoría	Descripción de las categorías	Asignado Convenio Original	Enmienda 1	Enmienda 2	Asignación actual
(1)	Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, y costos operativos bajo la Parte 1 del Proyecto.	10,000,000	7,300,000	-	17,300,000
(2)	Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 2 del Proyecto.	129,000,000	(7,300,000)	(2,500,000)	119,200,000
(3)	Bienes, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 3 del Proyecto.	11,000,000	-		11,000,000
(4)	Primas anuales en virtud de la Parte 4 del Proyecto	-	-	2,500,000	2,500,000
<b>Total</b>		<b>\$ 150,000,000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000,000</b>

### xvi. **Reembolso gastos efectuados bajo el Componente 1- Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia y Salud y Seguridad Pública.**

Mediante Memorando 207-2021 SE-SEDECOAS-FHS del 11 de junio de 2021, se nombró Comité Interino para la revisión de documentación para reembolso del Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras, en cumplimiento a esto, al 31 de diciembre de 2021 se revisó documentación de procesos por un monto total de L591,952,044.29, de gastos ejecutados por la Secretaría

de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS) y la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), en acciones de respuesta de socorro y atención a personas, así:

Institución	Lempiras
SEDIS	415.939.122,84
COPECO	176,012,921.45
<b>Total</b>	<b>591,952,044.29</b>

**SEDIS:** Del total de los gastos presentados, al 30 de junio de 2022 se han reembolsado con pago directo a la SEFIN un total de L 407,708,157.42 equivalente a USD 16,818,559.38, a través de Sistema de Desembolso (Client Connection). No se efectuarán más reembolsos.

**COPECO:** A la fecha ningún gasto se ha sometido a reembolso. Contratos de limpieza de calles están en proceso de revisión, y de ser elegibles, serán sometidos a reembolso con fondos del Contrato de Préstamo 5328 BL-HO, Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

## xvii. AVANCE DE ACTIVIDADES

### i. Componente 1 - Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia y Salud y Seguridad Pública.

A través de la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS) fueron atendidas 60,000 familias (equivalente a 300,000 personas) con kit de cocina, kit de higiene personal de niños y adultos, kit de limpieza, camas, estufas, filtros de agua, pañales, material de bioseguridad, toallas de baño, baldes plásticos, entre otros).

El componente 1, estuvo vigente del 2 de noviembre de 2020 al 8 marzo de 2021. Por tanto, durante la duración del proyecto no tendrá nuevas actividades a ejecutarse.

**ii. Componente 2 - Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos (Obras).**

Con el financiamiento de otras fuentes, el FHIS ha identificado zonas y sitios afectados por la tormenta Eta e Iota, con el fin de formular diseños finales para la rehabilitación y/o reconstrucción en infraestructura educativa, infraestructura vial (puentes) y en el sector de agua y saneamiento.

La Unidad Ejecutora del Proyecto a través de su personal técnico y con el apoyo de la Dirección de Proyectos del FHIS-SEDECOAS ha realizado revisiones a la formulación de los subproyectos priorizados, para verificar que estos estén cumpliendo con los lineamientos técnicos, ambientales, sociales, y otros relevantes que son parte de los compromisos adquiridos con el Banco Mundial.

A continuación, se detalla el estado de los avances y asuntos pendientes por sectores de intervención.

### **Infraestructura Educativa**

#### **Finalizados**

- Un primer lote de 25 subproyectos de reposición, reparación y ampliación de centros educativos adjudicados por un monto de L78,619,307.53 el cual ascendió a L88,265,020.36 y para la supervisión 2 contratos por L10,004,647.38. que se incrementó a L12,870,282.09. Las obras dieron inicio en noviembre de 2022.

La ejecución financiera al cierre del IV trimestre del 2024 es de L85,028,647.85 equivalente al 96.33% para obras y de L7,753,903.21 equivalente al 60.25% para la supervisión (Ver Anexo 1: Detalle de Subproyectos PRE).

#### **En Ejecución**

- Un segundo paquete consta de 17 subproyectos de reposición y reparación de centros educativos adjudicados los cuales iniciaron su ejecución en el II y III trimestre del 2023 por un monto contratado de L127,025,993.75 el cual asciende a L146,691,450.34 por órdenes de cambio y para la supervisión un (1) contrato por L17,661,922.00. A la fecha, 13 subproyectos han finalizado físicamente y 4

subproyectos se encuentran en ejecución.

La ejecución financiera al cierre del IV trimestre del 2024 es de L 98,851,506.32 equivalente al 67.39% para obras y de L15,652,554.84 equivalente al 88.62% para la supervisión (Ver Anexo 1: Detalle de Subproyectos PRE).

- Un tercer grupo de 8 subproyectos de reposición y reparación de centros educativos dieron inicio en el último trimestre del año 2023 por un monto contratado de L175,302,970.39 el cual ascendió a L185,068,846.68 por las órdenes de cambio y para la supervisión un (1) contrato por L 24,306,748.00 ampliado a L.31,772,954.70. Al cierre del IV trimestre han finalizado físicamente 2 subproyectos y 6 subproyectos se encuentran en ejecución.

La ejecución financiera al cierre del IV trimestre del 2024 es de L87,235,118.32 equivalente al 47.14% para obras y de L13,739,228.84 equivalente al 43.24% para la supervisión (Ver Anexo 1: Detalle de Subproyectos PRE).

- Un cuarto grupo de 6 subproyectos de reposición y reparación de centros educativos de los cuales 3 iniciaron a finales de mayo de 2024 y 3 en agosto de 2024, los cuales se encuentran en ejecución por un monto contratado de L148,767,589.03, sin modificaciones a la fecha. La supervisión será cubierta por la empresa del tercer grupo.

La ejecución financiera al cierre del IV trimestre del 2024 es de L47,507,951.99 equivalente al 31.93% para obras (Ver Anexo 1: Detalle de Subproyectos PRE).

- Un quinto grupo de 5 subproyectos de reposición y reparación de centros educativos adjudicados por un monto de L142,470,757.82 se encuentran por iniciar las actividades de ejecución.

La ejecución financiera al cierre del IV trimestre del 2024 asciende a L23,201,753.46 por concepto de pago de anticipos de 4 de los 5 subproyectos contratados (Ver Anexo 1: Detalle de Subproyectos PRE).



### En Licitación, Aprobación y Formulación

- En Contratación se encuentran 5 subproyectos por un monto estimado de L155,700,389.65; la recepción de ofertas fue programada para el 12 de diciembre de 2024, encontrándose actualmente en proceso de evaluación. Los subproyectos son los siguientes:

No.	Código	Nombre del Subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	110177	Reposición CEB Juana Donatila Ruiz y CEPB Julio Arriola Oliva	Colón	Tocoa	Col. Aurora
2	108480	Reposición Escuela María Teresa Aburto	Yoro	Olanchito	Colonia 24 de mayo
3	110053	Reparación CEB Rubén Antúnez	Colón	Bonito Oriental	San José del 5
4	110055	Reparación CEB Rafael Pineda Ponce	Colón	Bonito Oriental	La Esperanza
5	110054	Reparación CEB Augusto C. Coello	Colón	Bonito Oriental	Barrio El Centro

- Para un nuevo lote de 4 subproyectos, por un monto estimado de L162,064,704.68 se ha finalizado el proceso de formulación, de los cuales dos (2) subproyectos cuentan con No Objeción del Banco Mundial y aprobación por parte del Comité de Operaciones del FHIS, mientras que los dos (2) subproyectos restantes han pasado a la revisión preliminar del Banco Mundial. Los subproyectos son los siguientes:

No.	Código	Nombre del Subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación	Estado Actual
1	110184	Reposición Escuela Rosendo Núñez, JN República de Venezuela y JN Alba Nora Gúnera de Melgar.	Colón	Trujillo	Barrio Río Negro	Aprobado C-FHIS, Con NO BM
2	110181	Reposición CEB / CEPB Esteban Guardiola y CEB / JN José Heriberto Díaz	Atlántida	Tela	Triunfo de la Cruz	Revisión Preliminar BM
3	110740	Reposición CEB Manuel Bonilla y CEPB José Amancio López	Santa Bárbara	Macuelizo	San Francisco de Asís	Aprobado C-FHIS, Con NO BM
4	108238	CEB José Melecio Velásquez	Yoro	El Progreso	Col. Roberto Delgado Mangandi	Revisión Preliminar BM

- Un total de 15 subproyectos se encuentra en formulación por los técnicos del Proyecto, que serán agrupados según su ubicación, como parte de la estrategia de contratación por lotes de subproyectos y así lograr un menor número de procesos. El presupuesto preliminar asciende a L217,518,191.00.

Los subproyectos son los siguientes:

No.	Código	Nombre del subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	108310	Reparación Escuela Lempira	Yoro	El Progreso	Urraco Pueblo
2	108376	Reparación CEBG Éxitos de ANACH	Cortés	Choloma	Colonia Éxitos De ANACH
3	110176	Reposición CEPB Argelia Barrientos	Colón	Tocoa	Col. 18 de septiembre
4	110182	Reposición CEB Perla del Aguán	Colón	Sabá	Comunidad Ceibita
5	110906	Reposición Instituto José Simón Azcona Hoyo	Yoro	El Progreso	Urraco Norte
6	108328	Reposición Escuela Centro América	Cortés	Choloma	Aldea La Bueso
7	108309	Reparación Escuela Álvaro Contreras	Yoro	El Progreso	Aldea Brisas de La Libertad
8	S/C	CEB Arnaldo Auld	Isla de la Bahía	Roatán	Consolation Bight
9	S/C	Reparación Genaro Muñoz Hernández	Comayagua	Siguatepeque	Bo. El Centro
10	S/C	Reparación Ramon Rosa No 2	Francisco Morazán	Distrito Central	Blv Suyapa
11	S/C	Técnico Luis Bográn	Francisco Morazán	Distrito Central	-
12	108378	Reparación Escuela Rafael Pineda Ponce	Cortés	Choloma	Cerro Verde
13	108329	Reparación Escuela PROHECO Flor del Campo	Cortés	Choloma	Caserío Boquitas y Morales, Quebrada Seca
14	108381	Reparación CEB Gubernamental Augusto Coello	Cortés	Choloma	Col. Las Pilas
15	108501	Reparación CEB José María Ferrero	Yoro	El Progreso	Barrio Fátima

## Sector de Agua y Saneamiento

### Finalizados

- La primera intervención en el Sector de Agua y Saneamiento consta de 3 subproyectos de agua y saneamiento que iniciaron ejecución en el tercer trimestre del año 2023. Durante el IV trimestre de 2024 concluyeron las actividades de construcción de un (1) subproyecto de rehabilitación del sistema de agua potable del Casco Urbano del Municipio de Comayagua, por un monto de L33,496,613.04 con una ejecución de L31,628,392.32, equivalentes al 94.42%.

### En Ejecución

- Actualmente, se están ejecutando siete (7) subproyectos de reposición/ reconstrucción de sistemas de agua potable, cuyas actividades iniciaron entre el tercer trimestre del 2023 y los trimestres II y IV del 2024. El monto contratado para estos subproyectos es de L200,340,472.14, incrementándose a L204,990,917.04 por órdenes de cambio, adicionalmente, se han destinado L38,285,977.65 para la supervisión de las obras, distribuidos en dos contratos. Durante el IV trimestre de 2024 se contrató un subproyecto de reposición de sistema de agua potable por un monto de L45,154,764.95; actualmente, la orden de inicio del subproyecto está pendiente de emisión.

La ejecución al cierre del IV trimestre de 2024 es de L102,327,686.69., equivalente al 40.91% para obras y de L14,984,958.27 equivalente al 39.14% para la supervisión (Ver Anexo 1: Detalle de Subproyectos PRE).

### En Licitación, Aprobación y Formulación

- En Contratación se encuentra un lote de tres (3) subproyectos por un monto estimado de L108,782,698.33, la recepción de ofertas fue programada para el 13 de diciembre de 2024, encontrándose actualmente en proceso de evaluación. Los subproyectos son los siguientes:

No.	Código	Nombre del Subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	109071	Rehabilitación Sistema de Agua Potable	Olancho	Gualaco	Pacura y Toro Muerto
2	110509	Reposición Sistema de Agua Potable Aldea La Guatilla	Yoro	Yoro	Aldea La Guatilla
3	108919	Reposición Sistema de Agua Potable Ciudad Guaymas	Yoro	El Negrito	Ciudad Guaymas y Centro Poblado

- Dos (2) subproyectos cuentan con No Objeción del Banco Mundial, los cuales fueron sometidos a aprobación por el Comité de Operaciones de FHIS por un monto estimado de L75,702,333.10, mientras que un (1) subproyecto por un monto estimado de L61,635,197.98 se ha remitido al Banco Mundial para revisión y posterior No Objeción. A continuación, se detalla su estado actual:

No.	Código	Nombre del Subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación	Estado Actual
1	108877	Reposición Sistema de Agua Potable	Cortés	Villanueva	El Marañón	Aprobado C-FHIS, Con NO BM
2	109148	Reposición Sistema de Agua Potable Nueva Jalapa	Santa Bárbara	Nuevo Celilac	Nueva Jalapa	Con NO Objeción de BM, pendiente aprobación de Comité
3	108709	Rehabilitación Planta de Tratamiento Sector Sur Cañeras	Cortés	Villanueva	Sector Sur Cañeras	En BM No Objeción

- En formulación se encuentran 24 subproyectos adicionales para la reposición y/o rehabilitación de sistemas de agua potable por un monto estimado de L1,138,387,438.23, siendo los siguientes:

No.	Código	Nombre del Subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	110463	Reposición Estación de Bombeo y Línea de Impulsión La Entrada Copan	Copán	Nueva Arcadia	La Entrada
2	109256	Reposición Sistema de Agua Potable y Saneamiento	Lempira	San Manuel de Colohete	Varias Comunidades
3	109236	Reposición Línea de Impulsión Y Tanque de Distribución Potrerillos	Cortés	Potrerillos	Potrerillos
4	108876	Rehabilitación Sistema de Agua Potable Puerto Cortes	Cortés	Puerto Cortés	Casco Urbano
5	110615	Reposición Sistema Agua Villa Santa	El Paraíso	Danlí	Varias comunidades Villa Santa
6	108920	Reposición Sistema de Agua Potable San Julian	El Paraíso	Danlí	Comunidad de San Julian
7	110472	Reposición Sistema de Agua Potable Subirana	Olancho	Dulce Nombre de Culmí	Aldea Subirana
8	110681	Reposición Sistema de Agua Potable	Olancho	Juticalpa	Zopilotepe
9	110511	Reposición Estación Elevadora y Planta de Tratamiento De Aguas Residuales I Etapa Potrerillos	Cortés	Potrerillos	Potrerillos
10	108874	Reconstrucción de Sistema de Agua Potable Casco Urbano 11 barrios	Cortés	San Antonio	Casco Urbano (11 Comunidades)
11	110508	Reposición Sistema de Agua Potable 16 Comunidades Comayagua	Comayagua	Esquias, San Luis, San Jeronimo	El Comal, La Florida, El Playón, Las Minitas, Rancho Grande, La Cañada, Guamas, Vallecillos, Agua Dulce, Pocitos, Peladeritos, Coyolitos, Las Majadas, Loma Pelada, Planes y Ceibita Vieja
12	108893	Reposición Sistema Agua Potable Macuelizo	Santa Barbara	Macuelizo	La Flecha, La Pinuela y Ciruielo

No.	Código	Nombre del Subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
13	110680	Prospección y Explotación de Pozo Hospital Santa Rosita	Francisco Morazán	Distrito Central	Amarateca
14	110683	Reposición Sistema Agua Comunidad Agua Amarilla	Cortés	Santa Cruz de Yojoa	Agua Amarilla
15	110510	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable e Intervención Integral Hospital Santa Rosita	Francisco Morazán	Distrito Central	Amarateca
16	108710	Rehabilitación Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Choloma	Cortés	Choloma	Casco Urbano
17	108707	Reconstrucción Presa y Línea de Conducción La Mina	Cortés	Villanueva	La Mina
18	108892	Rehabilitación Sistema de Agua Potable y Saneamiento	Santa Bárbara	San José de Colinas	San Miguel de Lajas
19	108916	Rehabilitación Sistema de Agua Potable y FIME	Ocotepeque	Lucerna	Casco Urbano
20	108915	Rehabilitación Sistema de Agua Potable	Ocotepeque	Lucerna	El Higon
21	108891	Rehabilitación Sistema de Agua Potable	Olancho	Gualaco	Laguna Grande
22	108608	Rehabilitación Sistema de Agua Potable Varias Aldeas	Cortés	Villanueva	Milagro, Calan y Cañeras
23	108706	Rehabilitación Sistema de Agua Potable Varias Aldeas Sector el Milagro	Cortés	Villanueva	Varias aldeas Milagro
24	108708	Rehabilitación y Ampliación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Sector Villas del Río	Cortés	Villanueva	Nueva Chamelecón

## **Infraestructura Vial (Puentes)**

### **En Ejecución**

- La primera intervención en el Sector Vial consta de 4 subproyectos, han iniciado ejecución en el cuarto trimestre del año 2023. Un 5to subproyecto se agregó en el primer trimestre del año 2024. A la fecha han finalizado físicamente 3 subproyectos. El monto total contratado de los 5 subproyectos es de L75,108,023.39 y se redujo a L74,784,593.06 por órdenes de cambio y para la supervisión un monto contratado de L7,802,185.38, incrementándose a L10,040,905.38.

La ejecución financiera al cierre del IV trimestre de 2024 es de L61,206,115.78 equivalente al 81.84% para obras y de L4,653,559.69 equivalente al 59.64% para la supervisión. (Ver Anexo 1: Detalle de Subproyectos PRE).

## En Licitación, Aprobación y Formulación

- En formulación se encuentran 17 subproyectos, de los cuales 13 corresponden a reposición/construcción de puentes y 3 corresponden a construcciones de caja puentes por un monto estimado de L. 137,304,613.05.

No.	Código del subproyecto	Nombre del subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	108785	Reposición de Puente San Lorenzo Techin-Las Palmas Techin	Copán	Florida	San Lorenzo, Techin, Las Palmas
2	108700	Reposición de Puente Santa Clara Techin	Copán	Florida	Santa Clara, San Lorenzo Techin
3	110805	Puente Sobre el Río Aguagua	San Vicente Centenario	Santa Bárbara	-Sobre carretera hacia casco urbano
4	S/C	reposición de Puente sobre Río Palaja	Santa Bárbara	El Nispero	-
5	S/C	Reposición de caja puente	Comayagua	San José del Potrero	Casco Urbano
6	S/C	reposición de Puente sobre Río Machigua	Yoro	Yoro	Casco Urbano
7	S/C	Obras de protección de Puente Balfate	Colón	Balfate	
8	S/C	Puente Río Siale	Francisco Morazán	Orica	Las Casitas
9	110806	Puente El Bonete	Copán	Copán Ruinas	Aldea El Bonete
10	110807	Puente Río Morja	Copán	El Paraíso	Río Lindo y La Playona
11	S/C	Construcción Caja Puente	Olancho	Rosario	Tabáco
12	S/C	Construcción Caja Puente	Olancho	Silca	Sábana de López
13	109250	construcción Caja Puente	Lempira	Gracias	Santa Rosita
14	S/C	Puente Río Grande - Jupure	Comayagua	Lamaní	
15	S/C	construcción de bases y cabezal de puente en vía principal de Ojos de Agua	Comayagua	Ojos de Agua	
16	S/C	Puente sobre Río Mocal que conecta con San Sebastián y San Manuel de Colohete	Lempira	San Sebastián	Río Mocal
17	S/C	Puente colgante Nueva Suyapa	Yoro	Victoria	Pueblo Nuevo

## Infraestructura de Vial (Caminos)

Según la priorización realizada en el año 2023, se está ejecutando la consultoría de diseño para la rehabilitación de la infraestructura vial en caminos rurales en 25 municipios de 5 departamentos de país.

### En Aprobación

- El primer subproyecto de rehabilitación de tramos carreteros, con un presupuesto estimado L34,473,504.44 cuenta con No Objeción del Banco Mundial y aprobación del Comité de Operaciones de FHIS. Por otro lado, dos (2) subproyectos adicionales, por un monto estimado de L79,410,140.56, han sido sometidos a revisión y obtuvieron la No Objeción correspondiente y posteriormente serán remitidos para aprobación del Comité de Operaciones de FHIS. El detalle se presenta a continuación:

No.	Código del subproyecto	Nombre del subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación	Estado Actual
1	110596	Rehabilitación del tramo carretero Los Horcones - Agua Caliente - El Guantillo	Francisco Morazán	El Porvenir	Los Horcones, Agua Caliente, El Guantillo	Aprobado C-FHIS, Con NO BM
2	110743	Rehabilitación de tramos Carreteros del Municipio de Cedros, Francisco Morazán	Francisco Morazán	Cedros	Varias Comunidades	Con No Objeción BM
3	110744	Rehabilitación de tramos Carreteros del Municipio de Curarén, Francisco Morazán	Francisco Morazán	Curarén	Varias Comunidades	Con No Objeción BM

- Tres (3) subproyectos por un monto estimado de L85,164,318.17 se ha finalizado el proceso de diseño y formulación, actualmente se encuentran en la etapa de revisión preliminar del Banco Mundial. Los subproyectos son los siguientes:

No.	Código del subproyecto	Nombre del subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	110747	Rehabilitación de tramos Carreteros del Municipio de Tatumbula, Francisco Morazán	Francisco Morazán	Tatumbula	Varias Comunidades
2	110745	Rehabilitación de tramos Carreteros del Municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán	Francisco Morazán	Sabanagrande	Varias Comunidades
3	110746	Rehabilitación de tramos Carreteros del Municipio de San	Francisco Morazán	San Buenaventura	Varias Comunidades

No.	Código del subproyecto	Nombre del subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
		Buenaventura, Francisco Morazán			

## En Diseño y Formulación

- Un total de 19 subproyectos se encuentra en diseño, a cargo de la empresa ASP Consultores. El presupuesto preliminar asciende a L598,450,000.00. Los subproyectos son los siguientes:

No.	Código del subproyecto	Nombre del subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	110748	Rehabilitación de tramos Carreteros del Municipio de Tambla, Lempira	Lempira	Tambla	Varias Comunidades
2	110749	Rehabilitación de tramos Carreteros del Municipio de La Unión, Lempira	Lempira	La Unión	Varias Comunidades
3	110751	Rehabilitación de tramos Carreteros del Municipio de La Iguala, Lempira	Lempira	La Iguala	Varias Comunidades
4	110752	Rehabilitación de tramos Carreteros del Municipio de Lepaera, Lempira	Lempira	Lepaera	Varias Comunidades
5	110754	Rehabilitación de tramos Carreteros del Municipio de San Nicolás, Santa Bárbara	Santa Bárbara	San Nicolás	Varias Comunidades
6	110755	Rehabilitación de tramos Carreteros del Municipio de San Vicente Centenario, Santa Bárbara	Santa Bárbara	San Vicente Centenario	Varias Comunidades
7	110756	Rehabilitación de tramos Carreteros del Municipio de Protección, Santa Bárbara	Santa Bárbara	Protección	Varias Comunidades
8	110757	Rehabilitación de tramos Carreteros del Municipio de El Naranjito, Santa Bárbara	Santa Bárbara	El Naranjito	Varias Comunidades
9	110759	Rehabilitación de tramos Carreteros del Municipio de Concepción del Norte, Santa Bárbara	Santa Bárbara	Concepción del Norte	Varias Comunidades
10	110760	Rehabilitación de tramos Carreteros del Municipio de Belén Gualcho, Ocotepeque	Ocotepeque	Belén Gualcho	Varias Comunidades
11	110761	Rehabilitación de tramos Carreteros del Municipio de Mercedes, Ocotepeque	Ocotepeque	Mercedes	Varias Comunidades
12	110762	Rehabilitación de tramos Carreteros del Municipio de La Labor, Ocotepeque	Ocotepeque	La Labor	Varias Comunidades
13	110763	Rehabilitación de tramos Carreteros del Municipio de Sensenti, Ocotepeque	Ocotepeque	Sensenti	Varias Comunidades



No.	Código del subproyecto	Nombre del subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
14	110764	Rehabilitación de tramos Carreteros del Municipio de La Jigua, Copán	Copán	La Jigua	Varias Comunidades
15	110765	Rehabilitación de tramos Carreteros del Municipio de Santa Rita, Copán	Copán	Santa Rita	Varias Comunidades
16	110766	Rehabilitación de tramos Carreteros del Municipio de San Agustín, Copán	Copán	San Agustín	Varias Comunidades
17	110767	Rehabilitación de tramos Carreteros del Municipio de San Nicolás, Copán	Copán	San Nicolás	Varias Comunidades
18	110768	Rehabilitación de tramos Carreteros del Municipio de Copán Ruinas, Copán	Copán	Copán Ruinas	Varias Comunidades
19	S/C	Rehabilitación de tramos Carreteros del Municipio de San José, Copán	Copán	San José	Varias Comunidades

## Infraestructura de Salud

### En Ejecución

- La primera intervención en el Sector Salud consta de un (1) subproyecto, el cual ha iniciado ejecución en el II trimestre del año 2024. El monto total de contrato es de L17,696,680.82 sin haber sufrido modificaciones a la fecha y la supervisión es realizada por la empresa que supervisa a 11 subproyectos educativos del lote 3 y 4.

La ejecución financiera al cierre del IV Trimestre del 2024 es de L5,000,554.98.

### En Licitación, Aprobación y Formulación

- El técnico del Proyecto continua con la formulación de dos (2) subproyectos del sector salud por un monto estimado de L. 85,118,000.00. Los subproyectos son los siguientes:

No.	Código del subproyecto	Nombre del subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	110321	Reposición CESAMO Santa Rosa de Aguan	Colón	Santa Rosa de Aguan	La Lomas

No.	Código del subproyecto	Nombre del subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
2	110510	Reparación Hospital Santa Rosita	Francisco Morazán	Distrito Central	Distrito Central

### **Resultados**

Durante la vida del proyecto, se han adjudicado 76 subproyectos, desglosados de la siguiente manera:

- Un primer lote de **25 subproyectos** de infraestructura educativa ha culminado físicamente, de los cuales 21 ya han sido cerrados financieramente.
- Para el lote 2, 3, 4 y 5 que suman un total de **36 subproyectos** de obra de infraestructura educativa, 16 subproyectos se encuentran en ejecución junto con la supervisión respectiva, cinco (5) subproyecto por iniciar ejecución y 15 subproyectos han finalizado físicamente, de los cuales 4 han sido cerrados financieramente.
- De los **9 subproyectos** de agua y saneamiento, actualmente se encuentran en ejecución 7 subproyectos junto a la supervisión respectiva, un (1) subproyecto por iniciar ejecución y un (1) subproyecto finalizó durante el periodo.
- **1 subproyecto** del sector salud continua en proceso de ejecución junto con la supervisión respectiva.
- **5 subproyectos** viales (puentes) han iniciado ejecución junto a la supervisión respectiva, de los cuales tres (3) han finalizado físicamente y dos (2) se encuentran en ejecución.

### **iii. Componente 3 - Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.**

- Seguimiento de inspectoría, ambiental, social y de seguridad y salud ocupacional a los 26 subproyectos en ejecución.
- Seguimiento al Mecanismo de Quejas, Marco de Reasentamiento y Plan de Participación de Partes Interesadas.
- En proceso de evaluación de personal para complementar al equipo técnico de la Unidad Ejecutora.

## **xviii. PROBLEMÁTICA**

La UEP del proyecto PRE debe cumplir con los requerimientos del Banco Mundial y de la institución FHIS-SEDECOAS. Dicho cumplimiento, conlleva varias sesiones de revisión y subsanación lo que ralentiza el inicio de la ejecución de los subproyectos. Se considera que esto continuará sucediendo en los primeros subproyectos de cada tipología ya que cada uno conlleva sus particularidades que no se han abordado anteriormente.

La mayoría de las formulaciones de los subproyectos efectuadas por formuladores externos y recibidas por el proyecto PRE carecen de análisis de gestión de riesgos: accesibilidad; obras de mitigación; hidrosanitarios; estabilización de taludes; medidas compensatorias, contra incendios, de comunicación y de señalización, y, requieren actualización de costos y cantidades de obra, por lo que la reformulación toma bastante tiempo para tener los expedientes listos para licitarlos.

## **xix. RETOS**

- Llevar una ejecución financiera a la par de la ejecución física, abordando mes a mes a los contratistas para presentar sus estimaciones sin atrasos.
- Acompañamiento quincenal a la supervisión para alcanzar altos niveles de calidad en la ejecución de las obras contratadas.
- Definir con el Banco Mundial estrategias para la simplificación de requisitos y procesos para la eficiente ejecución de subproyectos de emergencia.

### **ANEXO 1 DETALLE DE SUBPROYECTOS PRE**



**Fondo Hondureño  
de Inversión Social  
FHIS**

Gobierno de la República



No.	Lote	Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Colonia / Barrio / Aldea	Monto de Proyecto Actual		% Avance Físico	% Avance Financiero
1	1	108417	Reparación CEPB Luis Sabillón Ortiz	Santa Bárbara	Ilama	San José de Oriente	L	2,938,231.64	100.00%	100.00%
2	1	108374	Reparación Jardín de Niños Rosaura Posas de Navarro	Cortés	Choloma	Col. La Twana, Quebrada Seca	L	1,081,917.96	100.00%	100.00%
3	1	108524	Reparación C.E.P.B Miriam J. Gallardo	Francisco Morazán	Distrito Central	Col. Villa Nueva Sector 1	L	1,310,680.88	100.00%	90.00%
4	1	108620	Reposición Escuela Republica de Honduras	Francisco Morazán	Ojojona	El Jícaro	L	2,734,227.10	100.00%	100.00%
5	1	108509	Reparación Jardín de Niños Humberto Rivera Torres	Francisco Morazán	Cedros	Barrio Arriba	L	1,731,866.68	100.00%	90.00%
6	1	108451	Reparación Escuela Juan Lindo	El Paraíso	Danlí	La Redonda	L	3,531,861.71	100.00%	100.00%
7	1	108429	Reparación C.E.B.G. Rodolfo Padilla Sunceri	Cortés	San Pedro Sula	Res. Real del Campo 2.	L	2,811,064.51	100.00%	100.00%
8	1	108491	Reposición CCEPREB Angelitos Sonrientes	Intibucá	San Francisco de Opalaca	Santa Fe	L	2,272,586.19	100.00%	100.00%
9	1	108602	Reposición CEB El Adelanto	Lempira	Lepaera	Aldea Alegrías	L	2,296,570.72	100.00%	100.00%
10	1	108393	Reposición CEB Marco Tulio Rodríguez	Lempira	San Sebastián	Comunidad La Chorrera	L	2,102,279.48	100.00%	100.00%
11	1	108555	Reposición Jardín Niños Xiomara de Zelaya	Copán	Florida	Buenos Aires	L	2,377,180.95	100.00%	100.00%
12	1	108284	Ampliación CEPBG Mercedes Enderson	Cortés	San Pedro Sula	Col. 6 de Mayo	L	2,610,893.18	100.00%	100.00%
13	1	108285	Suministro de Mobiliario C.E.B. Alfonso Lacayo	Cortés	San Pedro Sula	Col. Dr. Alfonso Lacayo	L	845,468.41	100.00%	100.00%
14	1	108430	Reparación CEBG Republica de Canadá	Cortés	San Pedro Sula	Col. Gracias a Dios	L	3,591,149.65	100.00%	100.00%
15	1	108335	Reparación CEG Unidad y Cambio	Cortés	Villanueva	Aldea El Calán	L	7,439,287.04	100.00%	97.12%
16	1	108340	Reposición CEPB Mis Primeras Letras	Cortés	Villanueva	Aldea El Coabano	L	2,066,405.55	100.00%	97.12%
17	1	108359	Reparación CEB José Trinidad Reyes	Cortés	Villanueva	Vista Hermosa	L	3,789,511.01	100.00%	97.12%

No.	Lote	Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Colonia / Barrio / Aldea	Monto de Proyecto Actual		% Avance Físico	% Avance Financiero
18	1	108519	Reparación CEB José Cecilio del Valle	Cortés	Villanueva	Santa Eduvigis	L	6,324,309.56	100.00%	97.12%
19	1	108304	Reparación Jardín de Niños San Francisco de Asís	Yoro	Morazán	Bo. El Jazmín	L	2,663,170.02	100.00%	100.00%
20	1	108305	Reparación CEB. Pedro Nufio	Yoro	Morazán	El Portillo de Gonzales	L	9,164,738.05	100.00%	100.00%
21	1	108504	Ampliación Centro de Educación Básica León Alvarado	Francisco Morazán	Distrito Central	El Tizatillo	L	4,017,845.83	100.00%	74.16%
22	1	108505	Reparación C.E.B. Rubén Martínez Rodas	Francisco Morazán	Distrito Central	Germania	L	4,140,483.37	100.00%	67.91%
23	1	108443	Reposición CEPB Dr. Andrés Arturo Martínez Guillen	La Paz	San José	Aldea Llano Largo	L	2,556,800.31	100.00%	100.00%
24	1	108579	Reparación CEB Marcelino Pineda López	Comayagua	Comayagua	La Independencia	L	6,075,325.78	100.00%	100.00%
25	1	108275	Reparación CEBG República de Venezuela	Francisco Morazán	Distrito Central	Col. El Rincón	L	7,791,164.78	100.00%	100.00%
26	2	108628	Reparación CEB José Cecilio del Valle	Comayagua	Lejamaní	Barrio Los Dolores	L	19,912,505.28	92.00%	58.59%
27	2	108511	Reposición CEB Hibuera	Comayagua	Comayagua	Barrio Los Dolores	L	5,074,724.19	39.50%	10.21%
28	2	108313	Reposición Escuela Luis Alonzo Suazo	Comayagua	San Luis	La Esperanza	L	17,614,573.15	100.00%	74.48%
29	2	108314	Reparación Jardín de Niños Ricardo Maduro	Comayagua	San Luis	El Picacho	L	6,368,257.47	100.00%	93.54%
30	2	108507	Reparación CEB Francisco Morazán	Comayagua	Ojos de Agua	El Hielo	L	7,418,079.18	100.00%	94.67%
31	2	108446	Reposición Escuela Rural Mixta Dr. Doroteo Varela	La Paz	Guajiquiro	Guanacaste	L	4,136,958.08	100.00%	87.55%
32	2	108447	Reposición Escuela Fausto Castillo Suazo	La Paz	Santiago Puringla	Orobila	L	4,300,113.31	100.00%	89.02%
33	2	108449	Reposición Escuela Pompeyo Bonilla	La Paz	Santiago Puringla	Las Quebradas	L	2,905,076.49	100.00%	83.28%
34	2	108350	Reparación Esc. Prevocacional Raúl Zaldívar	Francisco Morazán	Distrito Central	Col. Venezuela	L	10,438,168.72	100.00%	91.04%
35	2	108420	Reposición Jardín de Niños Abraham Raudales	Francisco Morazán	Cedros	El Suyatal	L	5,747,800.43	100.00%	80.76%

No.	Lote	Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Colonia / Barrio / Aldea	Monto de Proyecto Actual		% Avance Físico	% Avance Financiero
36	2	108452	Reposición Escuela Eusebio Fiallos	El Paraíso	Danlí	Aldea El Chaparral	L	3,855,284.29	100.00%	97.50%
37	2	108478	Reposición Centro de Educación Básica Presentación Centeno	Cortés	San Pedro Sula	Aldea Flor del Valle	L	10,625,822.74	55.00%	36.97%
38	2	108318	Reposición CEB Gubernamental Ramón Amaya Amador	Cortés	La Lima	Col. San José	L	17,919,382.49	45.00%	35.90%
39	2	108271	Reparación CEB Real de Suecia	Cortés	San Pedro Sula	Col. Brisas del Valle	L	8,921,094.83	100.00%	39.34%
40	2	108394	Reposición CEB Ing. Manuel Zelaya Rosales y Jardín de Niños Francisco Morazán	Lempira	San Manuel Colohete	Comunidad Quesuca	L	10,429,649.42	100.00%	93.15%
41	2	108471	Reposición CEB Republica de Perú	Lempira	Gracias	Calle principal del Caserío El Caral	L	6,484,513.88	100.00%	100.00%
42	2	109631	Reposición PCEPB Profesor Manuel Antonio Mejía	Ocotepeque	Belén Gualcho	Barrio San Antonio	L	4,539,446.39	100.00%	60.04%
43	3	108290	Reposición Instituto Gubernamental José Dolores Gonzales	Cortés	La Lima	Colonia Nuevo San Juan	L	6,075,325.78	52.00%	48.85%
44	3	108291	Reparación CEPB y CEB Nuevo San Juan	Cortés	La Lima	Col. Nuevo San Juan	L	7,791,164.78	75.00%	37.86%
45	3	108614	Reparación CEPB República de Honduras	Cortés	La Lima	Oro Verde	L	3,582,933.70	100.00%	87.77%
46	3	108295	Reposición Instituto Dr. Alfonso Hernández Córdova	Cortés	La Lima	Colonia Planeta	L	45,046,742.44	59.00%	53.14%
47	3	108457	Reposición CEPB Lic. Evaristo Euceda	Cortés	La Lima	Col. Nueva Jerusalén	L	3,921,191.56	100.00%	90.16%
48	3	108253	Reparación Instituto Oficial José Manuel Díaz Palma	Atlántida	El Porvenir	Aldea La Unión	L	18,379,722.21	67.00%	43.60%
49	3	108578	Reposición CEB Oswaldo López Arellano	Cortés	La Lima	Col. Flores de Oriente	L	27,748,713.04	59.00%	37.01%
50	3	108458	Reparación CEPB Gabriela Mistral	Cortés	La Lima	Barrio Centro Norte	L	33,207,035.20	56.00%	43.27%
51	4	108351	Reposición CEPB Roberto Micheletti Bain	Francisco Morazán	Distrito Central	Barrio La Soledad	L	5,058,108.15	56.00%	40.16%

No.	Lote	Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Colonia / Barrio / Aldea	Monto de Proyecto Actual		% Avance Físico	% Avance Financiero
52	4	108272	Reparación CEBG y CEPBG Cámara Junior No. 1	Francisco Morazán	Distrito Central	Colonia San Luis	L	31,208,184.75	58.00%	37.46%
53	4	108500	Reparación CB Luis Bográn	Yoro	Morazán	Aldea El Filón	L	20,276,330.81	24.00%	34.35%
54	4	110028	Reposición CEPB Federico Froebel	Colón	Tocoa	Barrio El Centro	L	19,122,190.86	20.35%	33.41%
55	4	110030	Reposición CEB Ramon Montoya	Colón	Tocoa	Aldea Prieta	L	22,466,894.28	13.37%	30.03%
56	4	110031	Reposición Escuela Padre Reyes Y CCEPREB Nilsa Anastasia Solano	Colón	Santa Rosa De Aguan	Aldea La Planada	L	50,635,880.18	9.37%	27.03%
57	5	110168	Reposición Escuela. Ramón Villeda Morales y CEPB Lic. Yenny Martínez	Colón	Tocoa	Col. Lempira	L	27,796,332.40	0.00%	20.00%
58	5	108483	Reposición CEB Joaquín Reyes Tejeda	Yoro	Olanchito	Colonia Libertad Norte	L	38,606,625.75	0.00%	20.00%
59	5	110056	Reposición Instituto Marco Tulio Castillo Santos	Colón	Bonito Oriental	Aldea La Esperanza	L	18,277,652.93	0.00%	0.00%
60	5	110130	Reparación Escuela José Cecilio del Valle	Colón	Santa Rosa de Aguán	Las Lomas, Barra de Aguán	L	16,868,458.80	0.00%	20.00%
61	5	108020	Reposición de Instituto Gubernamental República Federal de México	Francisco Morazán	Distrito Central	Colonia Iberia	L	40,921,687.94	0.00%	16.00%
62	AP	108705	Rehabilitación Sistema de Agua Potable Comayagua	Comayagua	Comayagua	Casco Urbano	L	31,628,392.32	100.00%	94.42%
63	AP	108702	Rehabilitación Sistema de Agua Potable Ciudad de Yoro Yoro	Yoro	Yoro	Casco Urbano	L	19,559,820.62	89.00%	61.18%
64	AP	108703	Rehabilitación Sistema de Agua Potable Morazán Yoro	Yoro	Morazán	Casco Urbano	L	9,273,510.42	79.00%	74.25%
65	AP	108918	Reconstrucción de Sistema de Agua Potable Casco Urbano	Yoro	El Negrito	Casco Urbano	L	37,164,878.36	50.00%	58.47%
66	AP	109073	Reposición de Sistema de Agua Potable	Choluteca	Apacilagua	Casco Urbano	L	11,051,310.64	13.79%	28.77%
67	AP	108878	Reposición de Sistema de Agua Potable	Cortés	Santa Cruz de Yojoa	Aldea Buena Vista y La Fé	L	3,135,787.45	0.00%	20.00%



No.	Lote	Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Colonia / Barrio / Aldea	Monto de Proyecto Actual		% Avance Físico	% Avance Financiero
68	AP	108885	Reposición de Sistema de Agua Potable	Cortés	San Antonio	Aldea Planes de Italia y Buena Vista Caleras	L	2,713,334.55	5.00%	20.00%
69	AP	109074	Reposición de Sistema de Agua Potable	Olancho	Dulce Nombre de Culmi	Aldea La Colonia y Marañones	L	10,398,091.66	8.00%	35.47%
70	AP	108917	Reposición Sistema de Agua Potable	Francisco Morazán	Guaimaca	Comunidad La Herradura, Guarlaca, Nueva Esmeralda, Menonita, Rancho Quemado y Puente Jalan	L	9,030,952.99	0.00%	20.00%
71	Vial	109249	Reposición Puente vehicular sobre el Rio Chamelecón	Copán	Nueva Arcadía	Aldea Los Tangos	L	33,338,223.22	86.00%	75.35%
72	Vial	109240	Reposición Caja puente Pacayal	Santa Bárbara	San Nicolás	El Pacayal	L	5,831,565.77	100.00%	100.00%
73	Vial	109239	Reposición Caja puente Joconal	Santa Bárbara	San Nicolás	Rio Frio, Joconal	L	5,945,008.14	100.00%	100.00%
74	Vial	109225	Construcción de obras de protección Puente Lindo	Santa Bárbara	Las Vegas	Barrio San Juan	L	1,932,990.05	100.00%	100.00%
75	Vial	108698	Reconstrucción de Puente El Gritadero	Copán	Florida	Aldea Espíritu Santo	L	27,736,805.88	85.00%	80.67%
76	Salud	109916	Rehabilitación Unidad de Atención Primaria en Salud (UAPS)	Yoro	Morazán	Aldea Caridad	L	17,696,680.82	32.00%	28.26%



## CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA



### ✓ Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)

#### i. Antecedentes

El Estado de Honduras ha revalorizado la educación como elemento fundamental para el desarrollo integral de todos los hondureños, mediante la implementación de la Tercera Reforma Educativa, que responde a las expectativas de la sociedad, cuyos alcances se enmarcan en los objetivos No.1 y No.4 de la Visión de País 2010-2038; Plan de Nación 2010-2022; que estipulan: “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidados de previsión social” y “Honduras con un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo. Para la ejecución de esta Tercera Reforma, se aprueba en el año 2012, la Ley Fundamental de Educación y en el año 2014 sus 22 Reglamentos.

-Fortalecimiento de la Secretaría de Educación conforme a la Ley Fundamental de Educación (LFE), principalmente en dos aspectos: i) descentralizar funciones operativas en las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de Educación; y ii) fomentar la participación comunitaria en la gestión educativa, formulación y coordinación de los planes estratégicos, que apunten a mejorar la calidad educativa.

El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Educación, garantiza el derecho fundamental a la educación, el acceso a una educación de calidad en condiciones de equidad, sin discriminación de ninguna naturaleza en todos sus niveles. La Ley Fundamental de Educación recupera el espíritu de garantizar este derecho, estableciendo el compromiso de brindar educación gratuita en todos sus niveles; un año obligatorio en Educación Pre-Básica (tercer grado) y tres ciclos de Educación Básica (I, II y III ciclo). Con ello, se logra la meta establecida de país, que para el año 2038, Honduras debe elevar la escolaridad promedio a 9 años

(1° a 9° grado), reconociendo que es necesario formar educandos para la

convivencia, derechos humanos, responsabilidad social, cuidado de las personas, entendimiento del entorno, protección del medio ambiente y la educación media ha sido considerada, hasta finales del siglo XX, como el período de preparación de los jóvenes para el ingreso a la educación superior y también como la enseñanza que proporciona entrenamiento técnico-vocacional, preparando a los jóvenes para su inserción en la vida productiva. En general, la educación media tiene como propósito ofrecer la experiencia formativa para incorporarse al mundo del trabajo y/o proseguir estudios en el nivel de educación superior.

## **ii. Objetivo General**

Fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros Educativos Media y sean promovidos con la calidad requerida.

## **iii. Descripción**

Consiste en la implementación de metodología de formación permanente de docentes y estudiantes, la mejora de la infraestructura escolar de centros de educación pública en todo el territorio nacional con énfasis en las zonas de mayor pobreza urbana y rural. El mejoramiento de la infraestructura podrá incluir al menos la ampliación y/o reparación de infraestructura educativa, dotación de mobiliario y equipamiento técnico educativo especializado; y el fortalecimiento de habilidades de los docentes de educación sobre metodologías de enseñanza basadas en competencias y las capacidades de los estudiantes y docentes de bachillerato en temas relacionados al emprendedurismo.

## **iv. Focalización**

En las áreas urbanas, periurbanas y rurales en los 18 departamentos, como ser: Colon, Islas de la Bahía, Cortes, Francisco Morazán y Valle son intervenidos con fondos del Programa para la Reducción de la Pobreza y la Exclusión Económica y Social (**PRPEES**).

Para los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Comayagua, Copan, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara y Yoro, son intervenidos con fondos de Recursos Ordinarios (**RO**).

#### v. **Beneficiarios**

El Programa beneficiará 480 niños de Educación pre-básica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes.

#### vi. **Duración**

Fecha de inicio de ejecución: 30 de marzo de 2021

Fecha de cierre: 30 de marzo de 2026

#### vii. **Costo Total del Programa**

Este es un esfuerzo de la Republica de Honduras, a través de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por US\$80,000,000.00 que tiene como meta llegar a la población educativa de los diferentes niveles que atiende el sistema educativo nacional.

#### **Datos del Préstamo**

Monto Total de la Operación	\$80,000,000.00
Monto del Préstamo Otorgado por el BCIE	\$80,000,000.00
Solicitud de Financiamiento	06 de agosto del 2018
Fecha de Firma	16 de diciembre del 2019
Fecha de Publicación	19 de junio del 2020
Fecha de Elegibilidad	01 de marzo del 2021
Fecha Base para el inicio del Plazo para Desembolsar	30 de marzo de 2021
Plazo para la Ejecución de los Desembolsos	30 de marzo de 2026
Fecha Máxima para Desembolsar	30 de marzo de 2026
	\$20,734,298.00 PRPEES
Monto Desembolsado a la Fecha del Informe	\$9,432,130.00 Recursos Ordinarios
Monto Total Desembolsado	\$30,166,248.00

**viii. Avance Financiero**

<b>Año</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Eficiencia</b>
<b>2021</b>	507.311.663,00	114.393.414,00	23%
<b>2022</b>	438.079.338,00	860.314,43	0%
<b>2023</b>	297.119.742,00	106.004.347,02	36%
<b>2024</b>	286.585.912,00	167.780.788,58	59%

**ix. Avance por Sector**

<b>SECTOR</b>	<b>Proyectos Finalizados 2024</b>	<b>Proyectos en Ejecución 2024</b>	<b>Mto. Ejecutado 2024</b>	<b>Empleos Generados 2024</b>	<b>Beneficiarios Directos 2024</b>
EDUCACION	33	26	142.402.359,34	696	6.904
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>142.402.359,34</b>	<b>696</b>	<b>6.904</b>

**x. Avance por Departamento**

<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>Proyectos Finalizados 2024</b>	<b>Proyectos en Ejecución 2024</b>	<b>Mto. Ejecutado 2024</b>	<b>Empleos Generados 2024</b>	<b>Beneficiarios directos 2024</b>
ATLANTIDA	0	1	-	0	0
COMAYAGUA	1	1	9.202.185,10	32	128
COPAN	0	2	-	0	0
CORTES	12	6	58.760.629,19	257	2.885
EL PARAISO	0	2	-	0	0
OLANCHO	14	5	60.140.062,57	284	2.079
SANTA BARBARA	6	8	11.630.325,36	101	1.394
VALLE	0	1	2.669.157,12	22	418
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>142.402.359,34</b>	<b>696</b>	<b>6.904</b>

**xi. Otras Inversiones**

<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>Mto. Ejecutado 2024</b>
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	11.194.652,88
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	14.183.776,36
<b>TOTAL</b>	<b>25.378.429,24</b>

**xii. Resumen Financiero**

Con relación a los US\$ 80.0 Millones se tiene una ejecución acumulada de US\$ 18.374,994.51, equivalente a HLN 449,467,051.14.

En relación con el periodo 2024, se ejecutaron US\$ 6,442,216.43 equivalente a HLN 159,952,794.51.

Con relación al Trimestre se ejecutaron US\$ 2,670,012.42 equivalente a HLN 66,750,310.50.

**ESTADO DE INVERSIONES POR ESTRUCTURA DE CONVENIO**

DESDE 01/01/24 HASTA 28/12/24

IMPORTE EXPRESADOS EN MONEDA: USD

28/12/2024 20:43:09  
Gestión: 2024  
R\_UFX\_02\_ACUEST  
Página 1 de 1

Organismo:  Banco Centroamericano de Integración Económica

Institución:  Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa:  GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Numero de Contrato/Convenio:  Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras

Moneda del Contrato/Convenio:

ESTRUCTURA DEL CONTRATO/CONVENIO	ACUMULADO AL INICIO DEL PERIODO						INVERSIONES DEL PERIODO						ACUMULADO AL FINAL DEL PERIODO					
	ORGANISMO FINANCIADOR		APORTE LOCAL		TOTAL		ORGANISMO FINANCIADOR		APORTE LOCAL		TOTAL		ORGANISMO FINANCIADOR		APORTE LOCAL		TOTAL	
	Mon. Convenio	Lempiras	Mon. Convenio	Lempiras	Mon. Convenio	Lempiras	Mon. Convenio	Lempiras	Mon. Convenio	Lempiras	Mon. Convenio	Lempiras	Mon. Convenio	Lempiras	Mon. Convenio	Lempiras	Mon. Convenio	Lempiras
01	5,963,282.49	148,831,360.47	0.00	0.00	5,963,282.49	148,831,360.47	5,406,858.00	134,271,255.97	0.00	0.00	5,406,858.00	134,271,255.97	11,370,138.54	281,102,617.44	0.00	0.00	11,370,138.54	281,102,617.44
02	4,820,000.00	100,964,224.00	0.00	0.00	4,820,000.00	100,964,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820,000.00	100,964,224.00	4,820,000.00	100,964,224.00	0.00	0.00	4,820,000.00	100,964,224.00
03	554,817.13	13,862,498.96	0.00	0.00	554,817.13	13,862,498.96	561,565.96	13,928,930.81	0.00	0.00	561,565.96	13,928,930.81	1,116,383.09	27,789,430.17	0.00	0.00	1,116,383.09	27,789,430.17
04	594,678.03	14,892,487.80	0.00	0.00	594,678.03	14,892,487.80	473,794.42	11,794,807.83	0.00	0.00	473,794.42	11,794,807.83	1,068,472.40	26,493,275.53	0.00	0.00	1,068,472.40	26,493,275.53
06	300,000.00	4,835,500.00	0.00	0.00	300,000.00	4,835,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	4,835,500.00	300,000.00	4,835,500.00	0.00	0.00	300,000.00	4,835,500.00
<b>TOTAL POR ORGANISMO FINANCIADOR:</b>	<b>11,932,777.65</b>	<b>288,514,256.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,932,777.65</b>	<b>288,514,256.23</b>	<b>6,442,216.43</b>	<b>159,952,794.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,442,216.43</b>	<b>159,952,794.51</b>	<b>18,374,994.51</b>	<b>449,467,051.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,374,994.51</b>	<b>449,467,051.14</b>
<b>TOTAL CONVENIO:</b>	<b>11,932,777.65</b>	<b>288,514,256.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,932,777.65</b>	<b>288,514,256.23</b>	<b>6,442,216.43</b>	<b>159,952,794.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,442,216.43</b>	<b>159,952,794.51</b>	<b>18,374,994.51</b>	<b>449,467,051.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,374,994.51</b>	<b>449,467,051.14</b>

**xiii. Desembolsos**

**CONTROL DE DESEMBOLSOS**

**USD**

No.	FONDOS PREEPS	FONDOS ORDINARIO	DESEMBOLSADO	FECHA
1	4,552,920.00	2,180,760.00	6,733,680.00	may-21
2	8,041,480.00	5,751,370.00	13,792,850.00	abr-22
3	4,500,000.00	-	4,500,000.00	nov-23
4	-	1,500,000.00	1,500,000.00	dic-23
4	3,639,893.00	-	3,639,893.00	dic-24
<b>Total</b>	<b>20,734,293.00</b>	<b>9,432,130.00</b>	<b>30,166,423.00</b>	
<b>Monto del Prestamo</b>		<b>80,000,000.00</b>		
<b>% Desembolsado</b>		<b>38%</b>		

xiv. Descripción de Avances Físicos de la Operación 2024 en el 4to. Trimestre

PROGRAMA MIFE					
dic-24					
ESTATUS DE PROYECTOS	CANTIDAD	INFRAESTRUCTURA Ips.	SUPERVISIÓN Ips	MOBILIARIO Y EQUIPO Ips	INVERSIÓN US\$
Cerrados Físico y Financiera	26	100,271,745.14	13,284,326.99	7,339,517.07	4,835,823.57
Cerrados Físico	30	113,489,690.23	13,420,304.83	13,277,052.62	5,660,525.79
Sub-total	56	213,761,435.37	26,704,631.82	20,616,569.69	10,496,349.36
En Ejecución	23	192,057,706.67	18,772,170.71	13,402,542.41	8,969,296.79
Suspendidos	3	23,136,750.53	1,383,346.00	1,806,818.90	1,053,076.62
Sub-total	26	215,194,457.20	20,155,516.71	15,209,361.31	10,022,373.41
<b>Total</b>	<b>82</b>	<b>428,955,892.57</b>	<b>46,860,148.53</b>	<b>35,825,931.00</b>	<b>20,518,722.76</b>

ESTATUS DE PROYECTOS	CANTIDAD	INVERSIÓN LPS	INVERSIÓN US\$
Por Licitar	15	200,542,115.74	28,936,421.50
Formulados	9	34,155,298.37	4,712,768.27
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>234,697,414.11</b>	<b>33,649,189.76</b>

ESTATUS DE PROYECTOS	CANTIDAD	INFRAESTRUCTURA Ips.	SUPERVISIÓN Ips	MOBILIARIO Y EQUIPO Ips	INVERSIÓN US\$
<b>Total General</b>	<b>106</b>	<b>663,653,306.68</b>	<b>80,509,338.29</b>	<b>71,448,443.66</b>	<b>32,677,487.43</b>

Proyectos Finalizados

PROGRAMA MIFE														
CENTRO EDUCATIVOS REPARADOS Y REPOSICIONES 2024														
IV TRIMESTRE														
N°	Código FHIS	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ALDEA	Estado General	NUEVO MONTO DE INVERSIÓN Infraestructura	SUPERVISIÓN	MONTO DE MOB Y EQUIPO	INVERSIÓN TOTAL	PLAZO FINAL	Beneficiarios Directos según MIFE	TIPO DE CENTRO	NOMBRE CENTRO EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN
1	109023	Olancho	Manto	Manto	Ejecutado	8,907,127.01	HNL989,734.07	HNL1,908,070.00	HNL9,896,861.08	150	170	ESCUELA	PEDRO NUFFO	REPARACION
2	109015	Olancho	Santa María del Real	Alvaro Gordo	Ejecutado	3,827,382.98	HNL479,604.51	HNL305,537.50	HNL4,306,987.49	90	122	ESCUELA	PROFA. GLADYS EMERITHA MUÑOZ	REPARACION
3	108991	Olancho	San Fco. de Becerra	San Fco. de Becerra	Ejecutado	4,298,851.05	HNL507,369.40	HNL1,020,559.50	HNL4,806,220.45	120	195	CEB	OSWALDO LOPEZ ARELLANO	REPARACION
4	109028	Santa Bárbara	Protección	Protección	Ejecutado	3,675,983.86	HNL373,142.77	HNL296,300.00	HNL4,046,726.63	90	337	ESCUELA	FLORENCIO MARTINEZ	REPARACION
5	108997	Santa Bárbara	Protección	La Ruidosa	Ejecutado	2,165,228.30	HNL210,324.34	HNL125,275.00	HNL2,375,552.64	90	45	ESCUELA	TIMOTEO SABILLOM RIVERA	REPARACION

PROGRAMA MIFE													
CENTRO EDUCATIVOS REPARADOS Y REPOSICIONES													
Código FHIS	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ALDEA	Estado General - BICE	NUEVO MONTO DE INVERSIÓN Infraestructura	SUPERVISIÓN	MONTO DE MOB Y EQUIPO	PLAZO FINAL	Beneficiarios Directos según MIFE	TIPO DE CENTRO	NOMBRE CENTRO EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN	
108990	OLANCHO	San Francisco de Becerra	Tres Ceibas	Ejecutado 1er. Trím. 2024	HNL2,149,177.94		HNL367,724.00	HNL71,825.60	145	149	Escuela	LUIS LANDA	REPARACION
109022	OLANCHO	Mangulile	Los Pietros	Ejecutado 1er. Trím. 2024	HNL1,706,588.78		HNL278,430.00	HNL188,037.10	134	24	Escuela	Rural Mixta Unión y Fuerza	REPARACION
108989	CORTES	San Pedro Sula	Barrio San Pedro	Ejecutado 1er. Trím. 2024	HNL1,775,778.90		HNL258,081.71	HNL1,586,240.00	134	81	CEB	Fernando Narajie	REPARACION
108988	CORTES	San Pedro Sula	Colonia Ebenezer	Ejecutado 1er. Trím. 2024	HNL3,485,647.54		HNL296,438.65	HNL3,782,086.19	149	299	CEB	Hector Guillermo Guillén	REPARACION
108921	CORTES	San Pedro Sula	Colonia Morelos #3	Ejecutado 1er. Trím. 2024	HNL8,082,781.51		HNL286,428.65	HNL8,904,823.78	149	449	CEB	Jag. Roberto Larios Silva	REPARACION
108460	CORTES	La Lima	Colonia La Paz	Ejecutado 1er. Trím. 2024	HNL4,322,063.90		HNL240,677.07	HNL4,123,471.34	125	79	CEPB	Manuel de Jesus Valencia	REPARACION
108613	CORTES	La Lima	Centro Sur	Ejecutado 1er. Trím. 2024	HNL5,212,385.48		HNL240,677.07	HNL5,182,098.68	134	76	CEPB	Esteban Guardiola	REPARACION
108978	Olancho	Salama	Salama	Ejecutado 1er. Trím. 2024	HNL6,019,493.30		HNL5,902,936.88	HNL713,796.28	180	355	Escuela	REPUBLICA DE HONDURAS	REPARACION
108995	Olancho	San Fco. de la Paz	El Pedregal	Ejecutado 1er. Trím. 2024	HNL5,877,189.99		HNL2,980,038.19	HNL3,218,111.11	215	187	Escuela	DIONISIO DE HERRERA	REPARACION
107295	Comayagua	Comayagua	Comayagua	Ejecutado 1er. Trím. 2024	HNL9,528,721.64		HNL1,280,281.10	HNL10,809,002.74	180	128	Jardín de Niños	Sagrado Corazón	REPARACION
108583	Santa Bárbara	Chinda	El Tule	Ejecutado 2do. Trím. 2024	HNL1,438,824.48		HNL255,309.03	HNL1,255,586.72	125	113	CEB	FRANCISCO MORAZAN	REPARACION
108981	Santa Bárbara	Arada	Jirillile	Ejecutado 2do. Trím. 2024	HNL1,566,007.14		HNL255,309.02	HNL1,255,586.72	130	48	Escuela	JUAN LINDO	REPARACION
108353	Santa Bárbara	Protección	Buenos Aires	Ejecutado 2do. Trím. 2024	HNL3,551,834.59		HNL425,515.04	HNL3,113,109.00	206	83	CEB	MANUEL BONILLA	AMPLIACION
108972	Santa Bárbara	Quimistan	Quimistan	Ejecutado 2do. Trím. 2024	HNL5,141,103.68		HNL425,515.04	HNL4,995,569.92	194	831	CEM	SUPERACION	AMPLIACION
108999	Olancho	Mangulile	Camarillofilo	Ejecutado 2do. Trím. 2024	HNL4,458,358.37		HNL240,677.07	HNL4,296,965.68	199	75	CEB	I DE MAYO	REPOSICION
109025	Olancho	Manto	El Tablon	Ejecutado 2do. Trím. 2024	HNL2,139,446.43		HNL278,430.00	HNL1,733,440.44	125	39	Escuela	RURAL ALVARO CONTRERAS	REPOSICION
108979	Olancho	Juticalpa	Lepaguare, el Caliche	Ejecutado 2do. Trím. 2024	HNL1,948,370.22		HNL278,430.00	HNL1,255,038.19	115	15	Escuela	RURAL NUEVA ESPERANZA	REPOSICION
108992	Olancho	La Unión	Los Encuentros	Ejecutado 2do. Trím. 2024	HNL1,893,971.09		HNL399,408.00	HNL1,621,364.64	115	42	CEB	PRESENTACION CENTRO	REPARACION
109024	Olancho	Manto	Ulupá	Ejecutado 2do. Trím. 2024	HNL2,697,824.18		HNL399,408.00	HNL1,621,364.64	115	49	ESCUELA	ESCUELA MARIA AUXILIADORA	REPARACION
108961	Cortes	Villanueva	Aldea La Libertad	Ejecutado 2do. Trím. 2024	HNL2,097,088.55		HNL244,081.71	HNL1,537,999.84	132	38	Escuela	ESCUELA SUPERACION	REPOSICION
108817	Cortes	Villanueva	Comunidad El Marañon	Ejecutado 2do. Trím. 2024	HNL4,786,251.25		HNL301,122.55	HNL4,471,136.66	179	347	CEB	PETRONILA BARRIOS DE CABANAS	REPARACION
108966	Cortes	San Pedro Sula	Cerrito Lindo	Ejecutado 2do. Trím. 2024	HNL8,520,368.20		HNL65,204.27	HNL8,360,182.91	209	141	CEB	RAMAL PINEDA PONCE	REPOSICION
109036	Cortes	Puerto Cortes	Manacaltio	Ejecutado 2do. Trím. 2024	HNL3,375,489.39		HNL254,081.71	HNL3,125,996.48	263	100	ESCUELA	RAFEL ROSA	REPARACION
109014	Olancho	Santa María del Real	Santa María del Real	Ejecutado 3er. Trím. 2024	HNL11,794,477.25		HNL1,244,181.84	HNL11,229,390.60	240	458	CEB	COHETE HERNAN ACOSTA MEJIA	REPARACION
108963	Cortés	Choloma	San Jose	Ejecutado 3er. Trím. 2024	HNL8,511,237.93		HNL854,238.94	HNL9,111,693.85	180	194	ESCUELA	NOHEMI FERRERA DE GARCIA	REPARACION
108919	Cortés	La Lima	La Lima	Ejecutado 3er. Trím. 2024	HNL17,241,358.38		HNL509,462.59	HNL17,598,502.91	180	530	CEB	GUBERNAMENTAL MANUEL DE JESUS	REPARACION
108926	Olancho	Guaymas	El Higuelito	Ejecutado 3er. Trím. 2024	HNL4,485,248.96		HNL396,038.26	HNL4,082,730.00	206	27	ESCUELA	UNION Y FUERZA	REPARACION
108585	Cortés	San Pedro Sula	San Pedro Sula	Ejecutado 3er. Trím. 2024	HNL2,970,617.88		HNL208,137.81	HNL2,713,311.36	85	129	CEBG	ESMERALDA QUIROZ DE MADRID	REPARACION
109023	Olancho	Manto	Manto	Ejecutado 4to. Trím. 2024	HNL8,907,127.01		HNL989,734.07	HNL9,896,861.08	150	170	ESCUELA	PEDRO NUFFO	REPARACION
109015	Olancho	Santa María del Real	Alvaro Gordo	Ejecutado 4to. Trím. 2024	HNL3,827,382.98		HNL305,537.50	HNL4,306,987.49	90	122	ESCUELA	PROFA. GLADYS EMERITHA MUÑOZ	REPARACION
108991	Olancho	San Fco. de Becerra	San Fco. de Becerra	Ejecutado 4to. Trím. 2024	HNL4,298,851.05		HNL507,369.40	HNL4,806,220.45	120	195	CEB	OSWALDO LOPEZ ARELLANO	REPARACION
109028	Santa Bárbara	Protección	Protección	Ejecutado 4to. Trím. 2024	HNL3,675,983.86		HNL373,142.77	HNL4,046,726.63	90	337	ESCUELA	FLORENCIO MARTINEZ	REPARACION
108997	Santa Bárbara	Protección	La Ruidosa	Ejecutado 4to. Trím. 2024	HNL2,165,228.30		HNL125,275.00	HNL2,375,552.64	90	45	ESCUELA	TIMOTEO SABILLOM RIVERA	REPARACION



**xv. Limitantes**

- a. Aprobación eficiente de la documentación general de Programa MIFE.
- b. Establecer procesos de revisión eficiente y mecanismos de control de documentos del Programa MIFE.
- c. Agilizar los cambios de fase entre las direcciones en el Sistema FHIS.
- d. Agilizar y Homologar procedimientos en el Ciclo FHIS para gestiones administrativas.
- e. **Solicitar a SEFIN ampliación presupuestaria para cumplir compromisos adquiridos en:** Supervisión, Obra y operatividad de la Unidad Ejecutora del Programa para el 2025.

**xvi. Principales Logros IV Trimestre**

1. 08 proyectos contratados en Obra.
2. 11 proyectos para licitación en Obra y Supervisión.
3. 04 proyectos formulados.
4. 05 proyectos finalizados.
5. Reformulación del Programa (Nota de Prioridad y Cambios entre Categorías).
6. Finalización del IBCIE.

**xvii. Componente Socioambiental**

Todos los proyectos actualmente en ejecución en el marco del Programa MIFE cuentan con una **“Constancia de no Requerir Licenciamiento Ambiental”** debido a su **“muy baja magnitud”** enfocada en reparaciones y ampliaciones (menores a 1,500 m<sup>2</sup> de intervención constructiva); y en vista que los mismos comparten similares características en sus actividades técnicas constructivas se implementan medidas de mitigación al impacto ambiental estandarizadas para garantizar el más mínimo cuidado al ambiente y la sociedad involucrada en esta etapa (trabajadores de la construcción, alumnos y maestros, etc.)

A la fecha se han ejecutado todas las actividades relacionadas al cumplimiento de las condicionalidades establecidas en el Plan de Acción del Sistema de Evaluación de Monitoreo Ambiental y Social (SIEMAS) exigido por el Organismo Financiero, destacando la implementación de herramientas de gestión ambiental (PGAS) específicas para cada uno de los proyectos en ejecución; así como, la socialización e

implementación del “Mecanismo de Quejas y Reclamos” en los mismo garantizando una intervención amigable con el ambiente y la sociedad beneficiaria. Así mismo, como producto de la gestión ambiental y social desarrollada y la buena coordinación lograda con las empresas constructoras y supervisoras, se cuenta con toda la evidencia o documentación de respaldo (según su aplicabilidad por proyecto) de la buena gestión desempeñada cumpliendo con las condicionalidades del plan de acción SIEMAS.

#### **xviii. Adquisiciones**

1. Adquisición de 06 vehículos.
2. Adquisición de Seguros para los Vehículos.

#### **xix. Actividades Programadas**

1. Actualización del Manual Operativo del Programa (MOP)
2. Evaluar el desempeño de las Firmas Consultoras y Supervisoras.
3. Formulación y contratación de 35 Proyectos en los tres de 15, 10 y 10 Proyectos.
4. Contratación de Personal en diferentes áreas para el Programa MIFE y en el Seguimiento de los proyectos en el Ciclo de Proyectos.
5. Contratación de Obras y Supervisión de 15 proyectos.
6. Elaborar modificaciones presupuestarias en el Presupuesto 2025.
7. Elaboración del POA 2025.
8. Elaboración Informe Trimestral para el BCIE.



✓ **Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira.**

**i. Antecedentes.**

El Estado de Honduras ha revalorizado la necesidad de mejorar el servicio de suministro de agua potable en la ciudad de Gracias, mediante la implementación de un sistema de abastecimiento de agua potable cuyos alcances se enmarcan en los objetivos No.3 y No.4 de la Visión de País 2010-2038; Plan de Nación 2010-2022; que estipulan: “Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental” y “Honduras con un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo”.

Según la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento, El Estado, como responsable de propiciar el bienestar económico, político, social y cultural de los hondureños, es responsable de cuatro funciones básicas: 1. Garantía de acceso a servicios de Agua Potable y Saneamiento de calidad y con eficiencia a la población. 2. Ampliación de la cobertura del servicio, especialmente en comunidades rurales y en comunidades urbanas de escasos recursos. 3. Garantía, bajo principio de solidaridad, de acceso al agua potable a sectores excluidos del servicio por razones de pobreza. 4. Gestión de recursos para el desarrollo de servicios de agua potable y saneamiento, estableciendo las prioridades, los criterios de recuperación de inversiones, asignación de capital, acorde con capacidades financieras respectivas.

**ii. Objetivo**

El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los servicios de agua potable para la población del municipio de Gracias, Departamento de Lempira, aumentando la cantidad y la calidad del agua suministrada, a través de la ampliación del sistema de abastecimiento, mediante el desarrollo de la infraestructura hidráulica.

**iii. Objetivos específicos:**

- a) Ampliar y optimizar el caudal de las líneas de conducción de agua hacia los reservorios y la red de distribución del Sistema existente.
- b) Asistencia técnica al prestador UMASG de forma que puedan asumir la operación y mantenimiento del Sistema o contribuir a la sostenibilidad de este.
- c) Introducción de procedimientos rutinarios de operación y mantenimiento con el fin de asegurar una mayor eficiencia.
- d) Acciones destinadas a la reducción de pérdidas (físicas y contables) de agua que puedan reducir la necesidad de inversiones en nuevas obras.

**iv. Localización**

El Proyecto estará localizado en la Ciudad de Gracias en el Departamento de Lempira.

**v. Beneficiarios**

El Proyecto beneficiará 22,681 personas en el año 2022 de los cuales 11,005 son hombres y 11,676 son mujeres y en un periodo de 40 años lo estarían alcanzando un estimado de 76,889 personas.

**vi. Duración**

La duración del Proyecto es de 4.1 años (49.2 meses) incluyendo actividades de gestión, socialización, adquisiciones, ejecución, etc. Y se estima además 2 años para la operación y mantenimiento antes de hacer el traspaso a la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento de Gracias (UMASG).

**vii. Situación Actual del Proyecto**

El proyecto ha logrado dar cumplimiento a las condiciones previas al primer desembolso, y el 20 de diciembre se recibió el mismo por US\$1,617,085.33, valor necesario para hacer frente a los compromisos del proyecto en los próximos 6 meses.

Se requiere llevar a cabo la revisión del diseño.

### viii. Fuente Financiera

Este es un esfuerzo de la República de Honduras, a través de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por US\$36,000,000.00 que tiene como meta llegar a la población de Gracias, Lempira.

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2022	193.172.460,00	28.412.086,07	15%
2023	57.836.382,00	6.177.646,62	11%
2024	21.778.045,00	18.974.432,05	87%

### ix. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	11.971.622,86
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	7.002.809,19
<b>TOTAL</b>	<b>18.974.432,05</b>

### x. Logros y avances del trimestre del proyecto

#### Logros y Avances del Proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”.

En atención al Plan General de adquisiciones del proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira” se tienen en desarrollo los procesos de las siguientes consultorías y adquisiciones:

- En ejecución la consultoría CPIR-FHIS-01-2023 “Revisión, Ajuste y Supervisión del Proyecto de Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”, con los siguientes hitos:
  - La firma contratada fue el consorcio coreano-hondureño SAMAN-ASP, conforme a las políticas del BCIE y lo establecido en el contrato de préstamo No. BCIE 2261.
  - El contrato se firmó el 24 de octubre del 2023.

Monto de la consultoría: US \$ 1,472,164.24

Plazo de la consultoría: 16.5 meses, con las siguientes etapas:

- Etapa de Revisión y Ajuste al Diseño: 5 meses, el 1er informe se recibió el 01 de febrero y luego de subsanar observaciones se aceptó su recepción oficial en fecha 15 de marzo.

El Informe Final de Carpeta de Diseño que estaba previsto para el 01 de abril del 2024, se recibió el 30 de abril en atención a un requerimiento de ampliación en las condiciones contractuales de dicha consultoría y con un costo adicional de US \$ 84,136.87. El 28 de mayo se envió para aprobación la enmienda 1 de SAMAN-ASP a la Dirección de Proyectos la cual fue aprobada hasta el 23 de septiembre por lo tanto en ese momento se continuó con la revisión de todo el producto para integrarlo al ciclo FHIS. Posteriormente a varias revisiones y correcciones a observaciones, finalmente se recibió el producto de Carpeta Final de Diseño con la integración del producto de la enmienda n°1 hasta el 08 de noviembre y luego de la correspondiente revisión técnica fue aprobada para tramitar el correspondiente pago a la firma consultora.

En cuanto al tema de requerimiento de las escrituras a favor del estado de los predios y servidumbres para el proyecto, luego de que se buscaron y proporcionaron nuevos sitios por parte de la alcaldía municipal de Gracias-Lempira y la respectiva revisión de viabilidad técnica de dicho cambio por parte de la empresa SAMAN-ASP, se resolvió la obtención de tales escrituras en el mes de diciembre. En el tiempo que se llevó este proceso, el consorcio contratado SAMAN-ASP presentó una segunda solicitud de enmienda (n°2) que luego de ser revisada y tras negociación se llegó a un valor de US \$ 11,051.24 en fecha 26 de noviembre que incluye los cambios en diseño de línea de distribución y costos de nueva topografía y nuevas pruebas de capacidad soportante en los nuevos de sitios de ubicación para los tanques de Tierra Blanca y El Censo respectivamente.

- Etapa de respuestas de preguntas de los oferentes: 4 meses (aproximadamente)
- Etapa de Supervisión en la ejecución de las obras: 7.5 meses
- La orden de Inicio correspondiente fue dada para el 01 de noviembre del 2023.
- Se realizó el pago del 1er producto llamado “Informe Preliminar Revisión al Diseño” por un monto de US\$ 269,029.50 en fecha 16 de mayo del 2024.

- Se realizó el pago del 2do producto llamado “Informe Carpeta Técnica de Diseño Final” por un monto de US\$ 134,514.75 en fecha 02 de agosto del 2024.
- Se realizó el pago del producto de la Enmienda 1º por un monto de US\$ 84,136.87 en fecha 09 de diciembre del 2024.
- Con visto bueno por parte de las direcciones de Contrataciones y Legal del FHIS el borrador elaborado del documento base de la Licitación Pública Internacional Restringida del proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, en el departamento de Lempira”. Previamente a la renuncia de la especialista de adquisiciones de nuestra unidad ejecutora, se recibieron observaciones de parte del BCIE a dicho documento y están pendientes de subsanar.
- En ejecución el contrato de consultoría de Auditoría Externa adjudicado a la empresa “Horwarth Central América” que fue contratada por el Tiempo de Ejecución del Proyecto "Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en La Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira". Para dicho contrato, en vista que no se lograron iniciar los trámites del proceso de licitación de obras de Gracias, no se podrá hacer la ejecución planificada, al respecto se sostuvo reunión con la firma auditora contratada el 19 de noviembre para considerar conciliar y negociar, traspasando una parte del pago correspondiente al año 2024 para el momento en que se inicie la ejecución de las obras. El 05 de diciembre se envió información que la firma auditora solicitó en virtud de presentar una propuesta de su parte, pero aún no se ha recibido respuesta. Se espera llegar a un acuerdo a inicios del 1er trimestre del 2025.
- Se envió solicitud al BCIE con actualización del Plan General de Adquisiciones en virtud de las recientes renunciaciones interpuestas, como ser la de la Especialista de Adquisiciones, la Coordinadora General y la Asistente Administrativa, para volver a realizar la contratación de dicho personal. Aún pendiente de aprobación de su parte.
- En lo que respecta a aspectos financieros es preciso destacar que a la fecha el proyecto refleja una ejecución financiera de Octubre a Diciembre 2024 de USD 126,821.83 y una ejecución acumulada de USD 2,163,098.37 (6.01% del total de la operación).
- Para este año 2024 ha sido asignado un presupuesto de L. 51,626,065.00 de los cuales se han ejecutado L. 18,974,432.05 hasta la fecha.

- La Unidad Ejecutora recibió el día 26 de noviembre del 2024 una solicitud de aprobación de la Enmienda No.2 de Ampliación de plazo por 45 días y ampliación de monto por \$11,051.24 (L.276,281.00) del Contrato de Consultoría suscrito con el CONSORCIO SAMAN-ASP. Actualmente está pendiente de ser aprobada en comité de operaciones del FHIS.
- En cuanto al borrador de Manual Operativo elaborado para el Proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira” Préstamo BCIE No.2261, al mismo no se le incluirá el proyecto de Tegucigalpa según comunicaciones entre UPEG – FHIS con el BCIE.
- En cuanto a gestiones de tipo ambiental se tiene avance en los siguientes aspectos:

1. Actualización de Informe Técnico de DECA / SERNA

Luego de realizar la solicitud a la UGA-FHIS, esta remitió a SERNA el Oficio No.UGA-FHIS-030-2024 y recibió respuesta 14 de octubre mediante oficio DECA-180/2024 el cual incluye la copia del Informe técnico No. 942/242, el cual concluye:

- a) “...se determina que las obras de infraestructura a realizar para el proyecto.... No están contenidas en la tabla de categorización vigente”
- b) El proponente de proyecto deberá solicitar ante la SERNA Constancia de No Requerir Licencia Ambiental.

Esto confirma el paso previo realizado en Agosto 2024, donde realizó el Proceso de Licenciamiento Ambiental a nivel interno, solicitando y obteniendo la CONSTANCIA de la UGA-FHIS señalando que el proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, en el departamento de Lempira” Código 110318 tiene un impacto ambiental potencial muy bajo de acuerdo a la Tabla de Categorización Ambiental (Acuerdo Ministerial No.705-2021) por lo tanto dicho proyecto NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL, amparada esta Constancia en el Convenio suscrito entre SERNA y SEDECOAS-FHIS.

2. Revisión de los diseños a luz del Dictamen técnico de MAPANCE e ICF.

Ya con esto y la gestión realizada ante MAPANCE e ICF, desde la perspectiva ambiental el proyecto estaría listo para ser ejecutado. Con relación a estos actores, se realizó una socialización sobre el proyecto e informar sobre las Medidas Ambientales y sociales a adoptar durante la construcción del proyecto de “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias,

Departamento de Lempira”. La reunión comenzó con la presentación de los participantes y sus roles en el proyecto Aguas de Gracias, estableciendo un ambiente colaborativo. Se definieron los objetivos, que incluían la revisión del resumen ejecutivo y la evaluación ambiental. Se discutieron aspectos de la evaluación ambiental y social, destacando la importancia de controlar los impactos ambientales y se acordaron planes de gestión ambiental. Se presentó un plan de manejo centrado en la biodiversidad, enfatizando la necesidad de monitoreo constante de especies. Se abordaron temas de capacitación de contratistas y la intervención en áreas de reservorios, así como un plan de salvamento de árboles. Se propusieron próximos pasos, incluyendo la planificación de reuniones para discutir la actualización de la línea base del proyecto y la sostenibilidad de las áreas protegidas. Finalmente, se acordó realizar una reunión para el 21 y 22 de enero, con énfasis en la colaboración y el trabajo de campo.

### **Logros y Avances del Proyecto “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sureste de Tegucigalpa”.**

- En ejecución la consultoría CPN-FHIS-20-2023, financiada con fondos nacionales, llamada “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sureste de Tegucigalpa”, con los siguientes hitos:
  - La empresa contratada para ejecutar el diseño del proyecto es Gabinete Técnico S.A. (GATESA).
  - El contrato se firmó el 21 de noviembre del 2023.
    - Monto de la consultoría: L. 13,225,678.13
    - Plazo de la consultoría: 9 meses

Etapas de Diseño: 5 meses, el 1er informe se recibió el 21 de febrero y el Informe Final de Carpeta de Diseño continúa previsto para el 21 de abril del 2024 pero debido a que se presentó una ampliación de tiempo de 26 días, la fecha de entrega final correspondió al 17 de mayo del 2024, diseño que fue recibido en su totalidad el 12 de noviembre luego de pasar por revisiones parciales e iniciales. Actualmente ha sido revisado técnicamente en los meses de noviembre y diciembre por un consultor externo del FHIS y mejorado por parte de la empresa consultora GATESA según observaciones dictadas por el mismo. Pendiente aún de subsanaciones finales tanto técnicas, así como también en el área del presupuesto.

Etapa de respuesta de preguntas de los oferentes: 4 meses (aproximadamente)

- La orden de Inicio correspondiente fue dada para el 21 de noviembre del 2023.



- Recibido y aprobado el primer producto llamado “Informe Inicial del proyecto de Consultoría”.
- Recibido y aprobado el segundo producto “Informe de avance intermedio de las mejoras a implementar”.
- Recibido el informe de la Carpeta Final de la Cuenca y Planta de Tratamiento que le corresponde de San José de la Vega, y recibida la parte de Agua Salada y Río Choluteca que desembocan en la Planta de PRRAC-ASAN, en el plantel de San José de la Vega, la Dirección de Proyecto ha continuado con el seguimiento respectivo y realizó revisión técnica con un especialista sanitario quien ha revisado técnicamente los productos finales recibidos, quedando pendiente de parte de GATESA subsanar varias observaciones de forma en planos y soporte en cálculo de presupuesto de equipo electromecánico en la PTAR.

Cabe señalar que la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) se ha encargado de realizar la revisión de los aspectos técnicos y socio ambientales de ambos informes, asegurándose que cumplan los términos fijados en el contrato suscrito entre FHIS y GATESA, sin embargo, la gestión de aprobación y pago corresponde a las instancias administrativas y financieras del ciclo FHIS

**xi. Limitaciones o barreras presentadas durante el 4to trimestre del 2024.**

- a) La unidad ejecutora no cuenta con los siguientes especialistas:
- Coordinador General (renuncia el 31 de octubre 2024)
  - Especialista de Adquisiciones (renuncia el 23 de septiembre 2024)
  - Asistente Administrativo (renuncia el 13 de octubre)

A partir del mes de noviembre, el FHIS nombró coordinador interino al ing. Elmer Ramírez, quien funge actualmente también como Director de Proyectos del FHIS. En vista de lo anterior se procedió a realizar las respectivas notificaciones de dicho nombramiento en el cargo tanto a las autoridades del BCIE como a las del FHIS.

- b) De parte del BCIE se informó verbalmente, que no se puede iniciar el proceso de licitación de las obras del proyecto de Gracias- Lempira, mientras no sea aprobada la Modificación N°1 al contrato de Préstamo BCIE N° 2261. Para lo anterior se ha trabajado en la enmienda de la nota de prioridad según los lineamientos de SEFIN.

- c) Considerando de que el 11 de septiembre se recibió la información de parte de la Dirección de Proyectos del FHIS que para la aprobación del proyecto de la ciudad de Gracias y posteriormente iniciar su proceso de licitación de las obras, es necesario contar con los predios y servidumbres escriturados a favor del Estado de Honduras, acción que es responsabilidad de la alcaldía de Gracias, Lempira; lo anterior produjo un retraso sustancial, para cumplir las metas financieras tanto en el año 2024 como en el 2025.

Cabe señalar que en virtud de que los propietarios de los terrenos donde inicialmente se construirían los Tanques exigieron condiciones no viables para efectuar dicha escrituración a favor de la Municipalidad, dicha alcaldía buscó nuevos sitios para ubicar los respectivos tanques, es así que la empresa contratada SAMAN-ASP analizó en campo la viabilidad técnica de los cambios propuestos por la Alcaldía para nueva ubicación de Tanques y Servidumbres de paso, a lo cual la empresa consultora solicitó una 2da enmienda en su contrato respecto al tiempo y al monto por el cambio mencionado.

- d) Se continúa con la solicitud de establecer claramente los tiempos de procesos de aprobación interna de FHIS para ordenes de cambio, enmiendas o modificación de los contratos de consultoría y de obra para ampliaciones de tiempo y monto, necesario para cumplir con los tiempos de pagos correspondientes, ya que se tomaron casi 4 meses para aprobar enmienda n°1 del contrato de Consultoría de SAMAN-ASP en el proyecto de Gracias y actualmente, desde finales del mes de noviembre, se tiene en espera la aprobación de la enmienda n°2. Estos tiempos prolongados de aprobación, pueden acarrear costos adicionales en la administración del contrato mismo.
- e) Se tiene pendiente aprobación de la Enmienda N°2 por ampliación de plazo por 45 días y monto por US \$11,051.24 por parte del consorcio SAMAN-ASP, para el proyecto Agua Potable de Gracias, Lempira.
- f) En virtud de que es sumamente necesario la contratación del Especialista de Adquisiciones para la unidad ejecutora, desde inicios del mes de noviembre se enviaron los respectivos términos de referencia a la dirección de contrataciones del FHIS para su respectiva revisión y aún se continúa en espera de su respuesta en observaciones para su aprobación.

- g) Se procedió a enviar solicitud de actualización del plan de adquisiciones (PGA) mediante la plataforma digital del BCIE a finales del mes de noviembre y aún no se tiene respuesta u observaciones a la misma de parte de dicha institución.
- h) Se requiere garantizar la custodia de los documentos oficiales que se generan en este contrato de préstamo BCIE No. 2261, por lo que se considera la adquisición de seis archivos donde almacenar toda la documentación.

**xii. Problemática presentada en el IV trimestre 2024**

**Proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”.**

- No se logró cumplir con las metas financieras propuestas para el año 2024, ya que se nos informó verbalmente por parte del BCIE, que no se pueden iniciar el proceso de licitación de las obras del proyecto de Gracias, Lempira, mientras no sea aprobada la Modificación N°1 al contrato de Préstamo BCIE N° 2261, lo cual está en proceso. Por otra parte, y respecto al requerimiento obligatorio para la aprobación del proyecto de obtener las Escrituras de los predios y servidumbres de paso, a inicios del mes de diciembre, la alcaldía de Gracias logró obtenerlas.
- Se mantienen como riesgos en el caso del proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”:
  - a. Que las empresas coreanas no tengan interés en participar en la ejecución de obras por ser un monto aproximado de \$ 7,600,000.00, valor que puede no ser atractivo para las empresas constructoras de ese país.
  - b. Que no exista tampoco interés de hacer consorcio las empresas constructoras Hondureñas con las Coreanas para participación para la licitación de obras.
  - c. Que los tramites a lo interno del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) no se puedan realizar en los tiempos esperados.
  - d. Que el sistema FHIS no permita hacer los pagos en dólares tanto de Supervisión, como de ejecución de obras, condiciones que deben quedar claras en la base de la licitación de obras.
  - e. Que los costos de las ofertas para las obras sean mayores a los que se han estimado.

- f. Que la Alcaldía Municipal de Gracias, departamento de Lempira, no tenga un esquema de regulación del uso racional del Agua potable como norma y no cumpla con la operación y mantenimiento que se requiere al concluirse las obras.
- g. Que la Alcaldía de Gracias, al instalar la micro medición para cada uno de los abonados, provoque un rechazo y problemas sociales en la zona, proyecto que se ha programado ejecutar con fondos del Banco Mundial por medio de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
- h. Que la alcaldía autorice proyectos de urbanización sin considerar la capacidad de diseño con la fuente del río Arcagual, con la que se ha planificado ejecutar este proyecto, dando como resultado la disminución en la vida útil del mismo y no poder abastecer en épocas de sequía a toda la población que está creciendo en forma desordenada.
- i. Que la Alcaldía de Gracias no tenga definido en legal y en debida forma el predio destinado para el otro reservorio a ser requerido posteriormente para que se cumplan los 20 años de vida útil de diseño.
- j. Que la empresa SAMAN-ASP, como firma consultora del proyecto en Revisión, ajuste al diseño y supervisión solicite incremento en tiempo y costos por consideraciones adicionales a lo establecido en el contrato, común en los proyectos de ampliación, mejoras o reparación.

**Proyecto “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sureste de Tegucigalpa”.**

- Por parte de la firma GATESA, se ha recibido el informe de la Carpeta Final de la Cuenca y Planta de Tratamiento que le corresponde de San José de la Vega, así como también posteriormente se recibió el 12 de noviembre la parte de Agua Salada y Río Choluteca que desembocan en la Planta de PRRAC-ASAN, en el plantel de San José de la Vega, para lo cual FHIS ha procedido con el seguimiento respectivo pero aún se continúa pendiente con la formalización de la respectiva ampliación de tiempo debido a los retrasos en la entrega de los productos de parte de GATESA.
- Para el producto “Informe Carpeta Técnica de Diseño Final”, la UEP ha apoyado con la revisión técnica general y correcciones entregadas parcial e inicialmente por la firma consultora contratada GATESA para el proyecto “Mejoramiento de la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sureste de Tegucigalpa” (ejecutado con fondos nacionales). Actualmente dicho producto se encuentra en proceso de corrección a observaciones finales y aprobación total del producto, pero es necesario se defina el cierre administrativo y financiero de los pagos del diseño.

- El proyecto de Tegucigalpa requiere de disponibilidad de vehículo, por lo que es recomendable disponer de parqueo en el Centro Cívico Gubernamental.
- Al momento de definirse formalmente el ingreso del proyecto de Tegucigalpa al financiamiento del contrato de préstamo, será necesario realizar un Convenio de Colaboración entre SEDECOAS-FHIS e INFOP que permita capacitar en albañilería y fontanería a jóvenes en riesgo social, tomando en cuenta las zonas de intervención del proyecto.
- En el proyecto “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sureste de Tegucigalpa”, se consideran los siguientes riesgos:
  - a) Que la UMAPS de Tegucigalpa, no logre agrupar el personal calificado para participar en este tipo de procesos, necesarios para el Fortalecimiento institucional de la UMAPS, quien debe garantizar alcanzar la operatividad y mantenimiento que requiere este tipo de proyectos.
  - b) Que no se puedan conseguir los fondos para la ejecución del 100% del proyecto diseñado.
  - c) En el caso que el proyecto sea financiado con fondos del Contrato de Préstamo BCIE N°2261, las empresas coreanas no quieran participar en los procesos de contratación.
  - d) Que los costos del proyecto de diseño de Tegucigalpa sean mayores a lo planificado, debido a que lo que se está solicitando como ampliación de PTAR y Colectores va más allá de los fondos disponibles de BCIE para su construcción.
  - e) Que con el diseño se den soluciones para mejorar las plantas de tratamiento con datos de población proyectada a futuro, incluyendo lugares que están sin habitar, obligando a coordinar una construcción de una planta de tratamiento en el plantel de la Vega, sin que se tenga fortalecida las capacidades institucionales de UMAPS para que haga los trámites para obtener los fondos y hacer los procesos de adquisición.
  - f) Que por razones de poca disponibilidad financiera debamos decidir rehabilitar la planta y colectores con los diseños existentes, sin ningún tipo de ampliación de colectores, ni unificación de las dos plantas de depuración existente.
  - g) Que la inseguridad de las zonas afecte la construcción de las obras o la pérdida de bienes y/o personas que intervendrán en el proyecto.
  - h) Que en caso de que sea necesario el trámite de llevar al Congreso Nacional la modificación N°1 del Contrato de Préstamos N° 2261, no se pueda coordinar en tiempo y forma con Planificación Estratégica, SEFIN y con BCIE, para que la construcción de los dos proyectos sea ejecutada.

- En vista de los riesgos analizados se recomienda el trámite adicional de contratación de un seguro médico y de vida para el personal de la Unidad Ejecutora, por los riesgos sociales que involucran las maras y pandillas que hay en las zonas a ser intervenidas, así como las posibles afecciones en la salud que este proyecto implica.

### **Modificación al Contrato de Préstamo No. BCIE 2261**

El 06 de noviembre se giró memorándum DSM-460- 2024 de parte del Ministro Director de SEDECOAS/FHIS, donde se instruye a la unidad ejecutora del proyecto BCIE 2261, a iniciar las gestiones administrativas, técnicas y legales para realizar el proyecto de Tegucigalpa referente a cuenca San José y la Planta de Tratamiento, a través de los fondos remanentes de dicho préstamo, para lo cual se ha procedido con siguientes acciones:

### **Procedimiento para efectuar la modificación del contrato de préstamo No.2261-BCIE, según SEFIN:**

- a) Formalización de utilizar los fondos remanentes del proyecto de Gracias para el proyecto de Tegucigalpa.
- b) FASE I: incluir en el contrato de préstamo el proyecto de Tegucigalpa, específicamente las obras de la cuenca de San José y la rehabilitación de la PTAR correspondiente, para lo que se requerirá preparar la Enmienda N°1 a la Nota de Prioridad del Contrato de Préstamo N° 2261, así como preparar una Nueva Nota de Prioridad que incluya el remanente de los fondos que queden del proyecto de aguas de Gracias en el Proyecto de “Mejoramiento de la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la Cuenca San José”, y así ejecutar los \$36,000,000,00 de este contrato de préstamo.
- c) FASE II: se requiere el acercamiento entre el Ministro del FHIS y el Ministro de Finanzas en la que se den los lineamientos para establecer la fuente de financiamiento que se debe gestionar para completar el proyecto de “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sureste de Tegucigalpa”, que puede andar por el rango de \$50,000,000.00.



### **xiii. Recomendaciones**

1. Es necesario nos instruya el enfoque que como Gobierno se seguirá para obtener el financiamiento que se quiere para para ejecutar las obras del proyecto de Tegucigalpa. (Para definir si solo se harán las obras de Gracias o si se deben incluir las obras totales establecidas en Fase I y II indicadas anteriormente).
2. Establecer procesos claros y definitivos por parte del ciclo FHIS, para lograr que los pagos en dólares del consorcio SAMAN-ASP no sufran problemas y retrasos por generar errores en el sistema de FHIS, condición que, si no se resuelve, será más grave en la ejecución de las obras con el retraso de pagos, lo cual podría ser un riesgo que implique el pago de intereses a ambas empresas, montos que pueden ser reparables para los responsables del retraso.
3. Que se haga lo antes posible el trámite de aprobación oficial en Comité de Operaciones de enmienda de ampliación de tiempo al contrato de GATESA, encargado del diseño del proyecto de Tegucigalpa.
4. Que se instruya por parte de las autoridades de FHIS sobre el trámite administrativo y financiero a seguir con los productos que se encuentran pendientes de aprobación a favor de GATESA, ya que dicho diseño se ejecuta con fondos nacionales, y por tanto esta Unidad Ejecutora no es responsable de dicho contrato.
5. Es necesario poder socializar ante BCIE el inicio de la licitación de obras del proyecto de Gracias, Lempira en el 2024, sin que se haya concluido la aprobación a la modificación del Contrato de Préstamo, para alcanzar las metas establecidas para la ejecución de los fondos del proyecto en los tiempos programados.
6. La incertidumbre que durante el año 2024 ha enfrentado la Unidad Ejecutora en cuanto si procede o no, la ejecución de los proyectos de Gracias-Lempira y Tegucigalpa, ha derivado en el retiro de la Especialista de Adquisiciones, la Coordinadora General y la Asistente Administrativa, quienes de acuerdo a su capacidad técnica optan por buscar nuevas oportunidades.- Esto ocasiona mayores efectos negativos en el trabajo requerido por la Unidad Ejecutora y provoca retrasos en los trámites a gestionar.
7. Es necesario continuar con la negociación de la disminución del pago de la Auditoría Externa del Contrato de Préstamo para el año 2024, el cual puede ser compensado en los siguientes años que se ejecute el Contrato de Préstamo. Al mismo tiempo se debe contemplar la posibilidad de suspender o rescindir el contrato, mientras se concluye la modificación del Contrato de Préstamo.

## CARTERA KfW



### ✓ Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V



#### i. Objetivo General

Consiste en la utilización de centros educativos mejorados, ampliados o nuevos y equipados bajo conceptos pedagógicos que operan de manera sostenible por la comunidad educativa. De esta manera se pretende contribuir a que niños/as y jóvenes de regiones pobres utilicen una oferta de alta calidad educativa, tanto formal como de educación vocacional.

#### ii. Focalización

**Fase IV:** El Área de intervención abarcará los departamentos que están siendo intervenidos en las fases anteriores (Zona de Occidente): 1) Copán, 2) Santa Bárbara, 3) Intibucá, 4) Lempira, 5) La Paz, 6) Ocotepeque. 7) Centros a nivel nacional en casos de emergencia (catástrofes naturales). La información de estos centros deberá ser actualizada en el plan maestro y sólo si se determina su precariedad, podrán ser intervenidos previo a No Objeción del KfW. 8) Adicionalmente se extenderá el área de intervención a los departamentos adyacentes a la zona de occidente, delimitando el área de intervención a través de la Carretera Panamericana. Los municipios para beneficiar se encuentran al oeste de la misma en los siguientes departamentos: 1) Choluteca, 2) Valle, 3) Francisco Morazán (exceptuando el núcleo urbano de Tegucigalpa), 4) Comayagua y adicionalmente 5) Gracias a Dios.

**Fase V:** El Área de intervención abarcará los departamentos de: Ocotepeque, Lempira y Copan, en la zona de Occidente. Además, los departamentos al oeste de la carretera CA-5 de los departamentos de Francisco Morazán (exceptuando el Distrito Central), Valle, Choluteca, Comayagua. También seguirá formando parte del Programa el Departamento de Gracias a Dios (siempre y cuando no se alcance un mínimo de infraestructura en este departamento y según las experiencias de la fase IV del PROMINE).

### iii. Priorización de los Centros Educativos

Esta es realizada por la Secretaría de Educación apoyados en la herramienta del Plan Maestro de Infraestructura Educativa.

### iv. Descripción del Proyecto

**Fase IV:** El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y en la planificación estratégica para los años 2014 - 2018 de la Secretaría de Educación (SE). El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las tres fases previas PROMINE I, II y III. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

**Fase V:** El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y el Plan Estratégico del Sector de Educación para los años 2017 - 2030 de la Republica de Honduras. El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las cuatro fases previas PROMINE I, II, III y IV. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

### v. Modalidad de Ejecución

**Fase IV:** La Modalidad de Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC), se refiere a donde los recursos son transferidos de la SEDECOAS-FHIS a las Municipalidades y está a las comunidades debidamente organizadas, capacitadas y asesoradas, para que realicen las actividades requeridas para la realización de su proyecto, asumiendo ambos la responsabilidad de una ejecución eficiente, y el manejo transparente de los recursos financieros. Estos procesos son debidamente acompañados por profesionales técnicos y sociales contratados por las Comunidades, Municipalidades, Mancomunidades o el SEDECOAS-FHIS. En el caso de los proyectos en Gracias a Dios este varía dada una coadministración Municipalidad- Comunidad.

## vi. Actores Claves

La ejecución del Programa será responsabilidad de la Secretaria de Educación (SE) como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS) como Entidad Ejecutora.

Considerando la modalidad de ejecución descentralizada de Proyectos Ejecutados por la Comunidad de manera local son actores importantes las Municipalidades y la Comunidades beneficiadas.

## vii. Monto del Proyecto Fase IV:

Componente	KFW	FHIS	SE	Municipalidades	Comunidades	Total
Infraestructura	13,420,685.00	0	0	257,000.00	514,000.00	14,191,685.00
Fortalecimiento FHIS	400,000.00	0	88,000.00	0	0	488,000.00
Asistencia Técnica	779,315.00	0	0	0	0	779,315.00
Fortalecimiento SE	400,000.00	0	0	0	0	400,000.00
Gastos Operativos	0.00	424,000.00	130,000.00	257,000.00	0	811,000.00
<b>Total</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>424,000.00</b>	<b>218,000.00</b>	<b>514,000.00</b>	<b>514,000.00</b>	<b>16,670,000.00</b>

Fondos de Donación por un monto de EUR 15,000,000.00, Contrapartida Nacional para SEDECOAS/FHIS de EUR 424,000, Contrapartida Nacional para SE de EUR 218,000, Contrapartida Municipal de EUR 515,000 y Contrapartida Comunitaria de EUR 514,000.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 03/12/2015

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 17/02/2017

Fecha de Inicio: 02 de abril 2018 (Se considera la fecha de inicio de la Consultoría)

Fecha de Finalización de convenio: Con ampliación hasta el 31/12/2024 según No Objeción otorgada en fecha 03/09/2024

**viii. Monto Desembolsado**

CONVENIO	ORGANISMO	Financiamiento			Por Desembolsar
		Moneda	Monto Total del Convenio	Desembolsado al 30/09/2024	
2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE - Cooperación Financiera Oficial entre Alemania y Honduras Programa de Mejora de La Infraestructura Escolar PROMINE IV	KFW	EUR	€ 14,600,000.00	€ 14,600,000.00	0.00

**ix. Modalidad de Ejecución Fase V:**

**Modalidad de Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC)**, se refiere a donde los recursos son transferidos de la SEDECOAS-FHIS a las Municipalidades y está a las comunidades debidamente organizadas, capacitadas y asesoradas, para que realicen las actividades requeridas para la realización de su proyecto, asumiendo ambos la responsabilidad de una ejecución eficiente, y el manejo transparente de los recursos financieros. Estos procesos son debidamente acompañados por profesionales técnicos y sociales contratados por las Comunidades, Municipalidades, Mancomunidades o el SEDECOAS-FHIS. En el caso de los proyectos en Gracias a Dios este varia dada una coadministración Municipalidad- Comunidad. Los proyectos de Infraestructura ejecutados bajo esta modalidad se enmarcan en el financiamiento de cuatro componentes para el desarrollo de los mismos: 1) I Bloque de Capacitación. 2) Inversión 3) Supervisión de Inversión y 4) II Bloque de Capacitación denominado Capacitación, o descentralizada.

**Modalidad Centralizada** Donde los proyectos son ejecutados a través de empresas constructoras y la supervisión se realiza con consultores o firmas consultoras, esta modalidad se utiliza por excepción con No Objeción del KfW. Únicamente se está utilizando para los proyectos en Gracias a Dios los cuales en la fase IV están en proceso de resolución y un proyecto en el Distrito Central.

**x. Actores Claves Fase V**

La ejecución del Programa será responsabilidad de la Secretaria de Educación (SE) como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS) como Entidad Ejecutora.

En la modalidad de ejecución descentralizada de Proyectos Ejecutados por la Comunidad de manera local son actores las Municipalidades y la Comunidades beneficiadas y en la modalidad centralizada las empresas constructoras, consultores o firmas consultoras.

**xi. Monto del Proyecto Fase V:**

Componente	KfW	FHIS	SE	Municipalidades	Comunidades	Total
Infraestructura	8,145,409.57	0	0	300,000.00	600,000.00	9,045,409.57
Fortalecimiento FHIS	400,000.00	0	100,000.00	0	0	500,000.00
Asistencia Técnica	854,590.43	0	0	0	0	854,590.43
Calidad Educativa	200,000.00	0	0	0	0	200,000.00
Fortalecimiento SE	400,000.00	0	0	0	0	400,000.00
Gastos Operativos	0	495,000.00	150,000.00	300,000.00	0	945,000.00
<b>Total</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>495,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>11,945,000.00</b>

Fondos de Donación por un monto de EUR 10,000,000.00, Contrapartida Nacional para IDECOAS/FHIS de EUR 495,000, Contrapartida Nacional para SE de EUR 250,000, Contrapartida Municipal de EUR 600,000 Contrapartida Comunitaria de EUR 600,000.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 06/07/2018

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 21/03/2019

Fecha de Inicio: Inicio de la Consultoría 18 de marzo del 2021

Fecha de Finalización de convenio: Con fecha de ampliación al 31/03/2026 con No Objeción otorgada en fecha 13/09/2024.

La distribución de monto por convenio se ha ajustado según la modificación entre componentes la cual cuenta con No Objeción de fecha 20/11/2024

**xii. Monto Desembolsado**

CONVENIO	ORGANISMO	Financiamiento			Por Desembolsar
		Moneda	Monto Total del Convenio	Desembolsado al 31/12/2024	
BMZ 2016 68 763 - Mejora de la Infraestructura Escolar, PROMINE V	KfW	EUR	€ 9,400,000.00	€ 4,479,208.74	€ 4,920,791.26

**xiii. Avance Financiero**

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2016	145.687.475,00	142.916.817,45	98%
2017	107.279.375,00	96.731.967,93	90%
2018	53.035.502,00	50.951.601,81	96%
2019	81.069.633,00	79.762.875,76	98%
2020	134.608.478,00	123.221.616,32	92%
2021	139.936.980,00	119.695.679,72	86%
2022	102.757.410,00	66.787.201,74	65%
2023	126.728.365,00	112.691.821,90	89%
2024	37.137.541,00	28.005.539,75	75%

**xiv. Avance por Sector**

SECTOR	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
EDUCACION	8	7	17.023.358,91	386	4.783
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>17.023.358,91</b>	<b>386</b>	<b>4.783</b>

**xv. Avance por Departamento**

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
COMAYAGUA	1	0	414.856,42	33	439
COPAN	3	0	1.150.708,93	66	740
FRANCISCO MORAZAN	0	1	344.701,57	20	954
GRACIAS A DIOS	0	2	3.264.072,24	49	902
LA PAZ	3	0	1.823.049,23	101	564
LEMPIRA	1	1	4.358.108,92	55	441
OCOTEPEQUE	0	2	1.787.667,47	47	589
OLANCHO	0	1	3.880.194,13	15	154
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>17.023.358,91</b>	<b>386</b>	<b>4.783</b>

**xvi. Otras Inversiones**

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	9.522.696,56
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA*	1.459.484,28
<b>TOTAL</b>	<b>10.982.180,84</b>

\*Viaticos, pasajes y Combustible



**xvii. AVANCE GENERALES**

- El estatus físico para los 33 proyectos considerados en Fase IV se detalla a continuación:

Estatus	No. Proyectos
Ejecución	1
Finalizado	21
Rescindido	5
Suspendido	1
Finalizado presupuestariamente en cierre físico y administrativo	5
<b>Total general</b>	<b>33</b>

El detalle de cada uno de los proyectos se presenta en el anexo 1, con importante atención considerando la finalización de la fase IV el 31 de diciembre del 2024 en los proyectos finalizados presupuestariamente, en ejecución y suspendido ya que el cierre administrativo y físico deberá realizarse en un corto plazo.

- El estatus físico para los 33 proyectos considerados en Fase V se detalla a continuación:

Estatus	No. Proyectos
Ejecución	3
Finalizado	1
Suspendido	1
Finalizado presupuestariamente en cierre físico y administrativo	1
En contrataciones	2
En proceso de orden de inicio	1
<b>Total general</b>	<b>33</b>

El detalle de cada uno de los proyectos se presenta en el anexo 2, indicando los que requieren atención.

**Avance de Ejecución Física 2024**

Programa	Anual			
	Programación	Ejecución	%	Comentarios
Mejora de la Infraestructura Escolar	7	8	114.29%	Se reportaron finalizados 8 proyectos, 5 de ellos considerando el porcentaje de avance físico sin embargo estarán en cierre físico y administrativo en el mes de enero

### Proyectos finalizados 2024

Código De Proyecto	Descripción Proyecto	Departamento	Municipio	Aldea	Beneficiario Directos	Empleos Generado	Fase
107750	Reparación CEB Profa. Olga Ondina López	Copan	La Unión	La Unión	352	21	IV
109116	Reparación CEB Francisco Morazán	Copan	San Antonio	La Zumbadora	188	22	V
107732	Ampliación CEB La Fraternidad y CEPB Mi Esperanza	La Paz	Santa Ana	Estancias	298	36	IV
107735	Reposición CEB Francisco Morazán y JN Francisco Filiberto Isaula	La Paz	La Paz	El Encinal	154	34	IV
108938	Reparación CEB Cultura	Copan	Dolores	Barrio El Siglo	200	23	IV
107884	Ampliación Instituto Jenrry Santos Padilla	La Paz	Santa María	Los Planes	112	31	IV
107912	Construcción Instituto El Progreso	Lempira	Talgua	Ciliantuque	227	39	IV
109211	Reposición CEB Leoncio Valle	Comayagua	Comayagua	San José de Pane	439	33	V

### Ejecución Presupuestaria 2024

Programa	Anual			
	programación	Ejecución	%	Comentarios
Mejora de la Infraestructura Escolar	38,567,677.00	28,005,539.75	72.61%	Lo no ejecutado del Programa con respecto al presupuesto vigente en el caso de Fondos Externos en su mayoría corresponde: al anticipo de un proyecto de aprox. de 5.2 mm que no se completó en vista que el KfW tuvo dificultades para realizar el pago directo, también se está analizando estructuralmente una orden de cambio de un proyecto. En el caso de Fondos Nacionales se quedó pendiente de cargar pagos a proveedores en vista que no se tuvo cuota de compromiso. Es importante indicar que estos pagos mencionados anteriormente se deberán considerar en el presupuesto del 2025.

#### xviii. LOGROS AL IV TRIMESTRE

1. Se finalizaron 8 proyectos que apoyan al mejoramiento de la infraestructura escolar, así como el desarrollo de habilidades administrativas de 8 comités ejecutores.
2. Se aprobaron y lanzaron los procesos de contratación de los dos proyectos en Gracias a Dios.

#### xix. PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTO EN EL IV TRIMESTRE

1. Falta de un oficial financiero y contable dedicado al programa exclusivamente.
2. La falta de una Unidad Ejecutora para el Programa demora los avances en el ciclo institucional.

## **xx. RETOS**

1. De manera urgente se requiere:
  - Contratación de un oficial financiero y contable
  - Contratación de un inspector de infraestructura
  - Contratación de un inspector social

Dichos procesos fueron solicitados sus lanzamientos el 18 de diciembre, sin embargo, se está pendiente de las listas cortas.

2. Contratación de la Auditoría Externa del año 2024, aun se están trabajando los términos de referencia sin embargo considerando que no se cuenta con un oficial financiero contable dedicado al programa estos no se han podido concluir.
3. Formulación, aprobación, contratación y ejecución de los proyectos de mobiliario priorizados por la Secretaria de Educación para comprometer los remantes del componente de Infraestructura de la fase IV.
4. Atención de la Dirección de Control y Seguimiento a los proyectos indicados en el anexo 1 y 2.

✓ **Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)  
Fase II y Fase III**



**i. Antecedentes**

El Proyecto CONVIVIR nace del Acuerdo Intergubernamental celebrado entre el Gobierno de Honduras y el Gobierno de la República Federal de Alemania, suscrito en fecha de 8 de noviembre del 2012. Publicado en el diario oficial La Gaceta, 23 de marzo del 2013, mediante el cual el Gobierno de Alemania concedió un prestamos de Cooperación Financiera para el Proyecto " Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) ,a ser ejecutado por la SEDECOAS / FHIS, con participación del Instituto Nacional de la Juventud( INJUVE) La Fase I del Proyecto fue Implementada en 3 municipios : El Municipio de Siguatepeque, Comayagua, Municipio de La Lima, Cortes, Municipio de Gracias, Lempira.

Cabe mencionar que las intervenciones realizadas por el Proyecto CONVIVIR, en su Primera Fase han generado impactos relevantes en la población joven y en las comunidades; siendo fortalecidas las capacidades laborales y sociales de 3,356 jóvenes; se generaron capacidades para el trabajo con juventud de 211 actores claves de los municipios y de diferentes instituciones a nivel municipal e institucional; de igual manera se construyeron 9 obras de infraestructura que están fortaleciendo el tejido social para la promoción de la convivencia comunitaria y la prevención de violencia juvenil.

Para fortalecer la promoción de convivencia y la prevención de violencia juvenil a nivel nacional, el Proyecto CONVIVIR inicio la Fase II en los municipios de Intibucá/Departamento de Intibucá, Municipio de La Esperanza/Departamento de Intibucá, Municipio de Santa Rosa de Copán/Departamento de Copán.

Se firmó el Acuerdo Separado y Convenio de Aporte Financiero el 26 de octubre del año 2021 de CONVIVIR Fase III como una donación, la cual se dio orden de inicio el 15 de abril del 2024.

**ii. Objetivo General**

Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).

### iii. Focalización Fase II y III

- A través de un proceso de concurso con criterios de selección predefinidos en el acuerdo separado y evaluación de propuestas técnicas alineadas a los componentes del programa fueron seleccionados 4 municipios para la Fase II y 4 municipios para la Fase III en donde se está realizando la intervención del CONVIVIR a través de obras de infraestructura y medidas de alcance social para beneficio enfocado en la juventud. Así mismo se definieron los barrios, colonias o comunidades urbanas en donde se focaliza las acciones y en donde ya se ha realizado una labor de socialización de los alcances, compromisos y beneficios para la población.

Departamento	Fase I	Fase II	Fase III
	Municipio	Municipio	Municipio
Comayagua	Siguatepeque		
Cortes	La Lima		
Lempira	Gracias		
Olancho		Juticalpa	
Intibucá		Intibucá	
		La Esperanza	
Copán		Santa Rosa de Copán	
Yoro			El Progreso
			Yoro
El Paraíso			Danlí
La Paz			La Paz

### iv. Descripción del Proyecto

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

**v. Modalidad de Ejecución**

El programa CONVIVIR tiene por brazo ejecutor al SEDECOAS-FHIS, concebido de tal forma que se apoya en el ciclo de proyectos de la institución para desarrollar cada una de sus acciones en el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el Acuerdo Separado. Para tal efecto interactúan coordinadamente 2 equipos de trabajo siendo la Unidad Administradora del Programa (UAP) y la Asesoría Técnica del CONVIVIR.

**vi. Financiamiento del Proyecto**

FASE	No. CONVENIO	MONTO (MILLONES DE EUROS)	TIPO DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
I	BMZ-No. 2011-65-364	10.0	Préstamo	Kridistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)  -KFW-
II	BMZ-No. 2016-65-348	6.0	Préstamo	
III	BMZ-No. 2018-67-563	10.0	Donación	

**vii. Monto del Proyecto:**

- Los fondos destinados para la ejecución de este Programa para la **Fase II** es de EUR 6,000,000.00 Contrapartida Nacional para FHIS de EUR 600,000.00, Contrapartida Municipal de EUR 300,000.00 Contrapartida Comunitaria de EUR 300,000.00.
- Los fondos destinados para la ejecución de este Programa para la **Fase III** es de EUR 10,000,000.00 Contrapartida Nacional para FHIS de EUR 1,000,000.00, Contrapartida Municipal de EUR 500,000.00 Contrapartida Comunitaria de EUR 500,000.00.

**Fecha de Inicio del Programa de convenio Fase II:** 14/07/2021

**Fecha de Finalización del Programa Fase II:** 13/07/2025

**Fecha de Inicio del Programa de convenio Fase III:** 15/04/2024

**Fecha de Finalización del Programa Fase III:** 14/04/2028

**viii. Avance Financiero**

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	19.897.004,00	8.372.701,20	42%
2022	44.370.387,00	26.573.808,83	60%
2023	74.083.192,00	72.701.682,29	98%
2024	64.077.075,00	54.238.806,67	85%

**ix. Avance Físico por Sector**

SECTOR	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
EMPREDIMIENTO Y VALORES	1	3	3.198.605,57	121	13.500
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	6	2	47.620.385,78	185	16.267
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>50.818.991,35</b>	<b>306</b>	<b>29.767</b>

**x. Avance Físico por Departamento**

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
COPAN	2	1	11.540.686,14	85	7.307
EL PARAISO	0	0	2.469.411,92	0	0
INTIBUCÁ	3	3	17.515.737,24	143	10.460
LA PAZ	0	0	2.469.411,92	0	0
OLANCHO	2	1	11.884.920,31	78	12.000
YORO	0	0	4.938.823,83	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>50.818.991,35</b>	<b>306</b>	<b>29.767</b>

**xi. Otras Inversiones**

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	1.828.158,14
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	1.591.657,18
<b>TOTAL</b>	<b>3.419.815,32</b>



## xii. Estado Contractual y Ejecución por Fases

FASE	ESTADO ACTUAL	Ejecución
I	Finalizado el 31 de julio del año 2021.	Monto ejecutado de L.263,470,445.13
II	<p>Inició el 14 de julio del año 2021</p> <p>Finaliza el 13 de julio del año 2025</p>	12 proyectos de Construcción en ejecución se están realizando capacitaciones a los jóvenes de las distintas Municipalidades y Actores Relevantes SEDECOAS/FHIS, Municipalidades, INJUVE
III	<p>Firma del Acuerdo Separado y Convenio de Aporte Financiero el 26 de octubre del año 2021, Orden de Inicio Programa CONVIVIR Fase III el 15 de abril 2024, con la llegada del Equipo de la Asistencia Técnica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preparación y Trámites administrativos.</li> </ul> <p>Se firmo Convenio Tripartito el día 19 de agosto del 2024</p>

FASE	COMPONENTES			
	Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura	Fortalecimiento de Habilidades de jóvenes para el trabajo habilidades Sociales	Mejoramiento de Capacidades de Actores Relevantes	Materiales y Equipos de Capacitación
II*	<p>7 proyectos en ejecución y con el primer 80% desembolsados,</p> <p>5 proyectos en ejecución con su primer desembolso.</p>	454 jóvenes Fortalecidos en Habilidades Sociales 490 Jóvenes que serán capacitado por INFOP	214 actores Relevantes capacitados	Equipamiento para los 12 proyectos, incluyen equipo de cómputo, mobiliario, áreas de juego, área de ejercicio, jardinería
III**	<p>Por definir la selección de obras de infraestructura generalmente se realiza en función de las necesidades específicas de cada municipio.</p> <p>Se definieron las Obras de Confianza de cada municipio y se está a la espera de contratación nuevo personal para la etapa de Diseño Y Formulación</p>	<p>Capacitaciones mediante Consultoría Visibilidad y Diseño Gráfico</p> <p>Capacitación en Community Manager</p> <p>Habilidades para la Vida y actividades de Cohesión Social.</p> <p>Capacitación en Arte Urbano</p>	<p>Capacitaciones mediante Consultoría Implementación y Monitoreo</p> <p>Capacitaciones Personal Técnico</p>	Se proyecta para este año 2024 dotar de equipamiento y mobiliario para las alcaldías, SEDECOAS-FHIS-Como avance en el diseño de las Obras de Confianza.

### xiii. LOGROS Y AVANCES

#### CONTROL Y SEGUIMIENTO PROYECTOS CONVIVIR FASE II

No.	Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Colonia / Barrio / Aldea	Monto de Proyecto Actual	% Avance Físico	Avance Financiero	Estado Actual	Fecha de Finalización Previsita
1	109190	Plaza Juvenil Brisas de Copan	COPÁN	SANTA ROSA DE COPÁN	EL DUENDE	L 4,256,435.99	100.00%	94.43%	FINALIZADO Y ENTREGADO	17/6/2024
2	109191	Plaza el Mirador Santa Teresa	COPÁN	SANTA ROSA DE COPÁN	BO. SANTA TERESA	L 4,803,327.26	100.00%	98.13%	En ejecución	16/11/2024
3	109192	Paseo Cultural Lenca	INTIBUCÁ	LA ESPERANZA	COL. BUENOS AIRES	L 4,728,832.16	100.00%	98.29%	FINALIZADO	20/10/2024
4	109193	Parque la Piramide	INTIBUCÁ	INTIBUCÁ	BO. EL WAY	L 1,548,715.11	100.00%	100.00%	FINALIZADO	15/10/2024
5	109194	Cancha ABE y BEN	OLANCHO	JUTICALPA	SOLIDARIDAD	L 3,798,360.93	100.00%	95.59%	FINALIZADO	15/10/2024
6	109195	Parque Recreativo de la Juventud	OLANCHO	JUTICALPA	LA CONCEPCION	L 4,008,808.24	100.00%	97.31%	FINALIZADO	21/10/2024
7	109232	Ruta Lenca de la Juventud	INTIBUCÁ	INTIBUCÁ	BARIO EL WAY	L 3,129,647.16	100.00%	98.57%	FINALIZADO	15/10/2024
8	109611	Casa de la Juventud	COPÁN	SANTA ROSA DE COPÁN	BARRIO EL CARMEN	L 13,138,262.90	42.41%	25.87%	EN EJECUCIÓN	11/5/2025
9	109612	Plaza de la Juventud	INTIBUCÁ	LA ESPERANZA	COL. BUENOS AIRES	L 8,160,161.95	51.50%	56.48%	EN EJECUCIÓN	5/4/2025
10	109613	Centro Deportivo Integral San Carlos	INTIBUCÁ	LA ESPERANZA	COL SAN CARLOS	L 6,090,046.99	63.00%	73.00%	EN EJECUCIÓN	9/4/2025
11	109614	Thau Mishu Casa de la Juventud	INTIBUCÁ	INTIBUCÁ	BO. EL WAY	L 11,319,038.74	56.00%	48.00%	EN EJECUCIÓN	5/4/2025
12	109615	Centro de Formacion Integral Juvenil	OLANCHO	JUTICALPA	BARRIO EL CENTRO	L 13,720,180.88	51.46%	45.57%	EN EJECUCIÓN	13/5/2025

#### A. COMPONENTE 1 CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA- AVANCE FISICO

En **Santa Rosa de Copán** se están llevando a cabo varios proyectos comunitarios significativos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Uno de ellos es la Plaza Mirador Santa Teresa, diseñada como un espacio público integral que incluirá quioscos de emprendimiento, sanitarios, una gradería techada y una cancha también techada. Además, contará con áreas de juegos infantiles, máquinas de ejercicios y se destacará por su mirador hacia el municipio, ofreciendo vistas panorámicas que enriquecerán la experiencia de los visitantes y residentes por igual.

Otro proyecto relevante es Plaza Juvenil Brisas de Copán, orientado específicamente a la juventud de Aldea El Derrumbo, sector El Duende. Este proyecto tiene como objetivo crear una plaza juvenil con una cancha

multisusos, fomentando así la convivencia comunitaria y promoviendo actividades deportivas y recreativas que ayuden a prevenir la violencia juvenil en la zona.

Además, se está desarrollando la Casa de la Juventud, un espacio social, educativo y laboral destinado a los jóvenes de Santa Rosa y sus alrededores. Este proyecto tiene como misión proporcionar un lugar donde los jóvenes puedan desarrollar y potenciar sus capacidades a través de programas educativos, formación laboral y actividades de emprendimiento. La Casa de la Juventud se posiciona como un centro integral que promueve la participación de los jóvenes en la construcción de su propio futuro y el de su comunidad.

**Tabla 1: Proyectos de Infraestructura Seleccionados en el Municipio de Santa Rosa de Copán – Estado de la Ejecución**

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	<b>Plaza Juvenil Brisas de Copán (Obra de Confianza)</b>	Barrio El Duende	4,256,435.99	➤ Proyecto desembolsado en el primer y segundo desembolso, en ejecución
2.	<b>Casa de la Juventud</b>	Barrio El Carmen	13,161,194.90	➤ Se dio orden de inicio el 3 de abril 2024
3.	<b>Plaza El Mirador – Santa Teresa</b>	Barrio Santa Teresa, sector La Cuchilla	4,803,327.26	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer y segundo desembolso, en ejecución. En espera de inauguración.
<b>Monto Total de Inversión Estimado</b>			<b>22,220,958.15</b>	

## PROYECTO PLAZA BRISAS DE COPÁN

El día 29 de agosto se llevó a cabo los actos de inauguración del Proyecto Plaza Juvenil Brida de Copan, Sector el Duende.



## PROYECTO CASA DE LA JUVENTUD

Se ha logrado avances en el levantamiento de paredes, entrepisos del módulo A, Instalaciones eléctricas en paredes y pisos, construcción de gradas hacia el segundo nivel. Construcción entrepiso del segundo nivel, instalaciones eléctricas.





## PROYECTO PLAZA MIRADOR SANTA TERESA

Proyecto con avance de subsanaciones a la espera de que la alcaldía aporte con fondos para la finalización del Proyecto.



## INTIBUCA

En el municipio de Intibucá se llevan a cabo varios proyectos como ser “Ruta Lenca de la Juventud” consiste en la rehabilitación de la acera peatonal ubicada en la calle principal en la salida a Siguatepeque, con el objetivo de, entre otros, brindar seguridad y movilidad vial a estudiantes, jóvenes y emprendedores del municipio de Intibucá.

Así también, por medio de esta obra se podrán vincular el Parque La Pirámide (Primer proyecto de Intibucá) con la THAU MISHU/Casa de La Juventud (Segundo Proyecto de Intibucá) de forma ordenada y segura.

Cabe mencionar que el proyecto “Ruta Lenca de la Juventud” del municipio de Intibucá se ubica frente al proyecto de La Esperanza denominado “Paseo Cultural Lenca”, por lo que está previsto realizar un proyecto integral que permita promover el trabajo en conjunto con las dos alcaldías y sus respectivas comunidades.

**Tabla 2: Proyectos de Infraestructura Seleccionados en el Municipio de Intibucá – Estado de la Ejecución**

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	<b>Parque La Pirámide (Obra de Confianza)</b>	Barrio El Way, Sector No. 1	1,720,794.57	➤ Proyecto Finalizado en espera de inauguración
2.	<b>THAU MISHU (Casa de La Juventud)</b>	Barrio El Way	11,319,038.74	➤ Orden de inicio el 5 de abril 2024
3.	<b>Ruta Lenca de la Juventud</b>	Barrio El Way	3,477,385.73	➤ Proyecto Finalizado en espera de inauguración
<b>Monto Total de Inversión Estimado</b>			<b>16,517,219.04</b>	


### PROYECTO PARQUE LA PIRAMIDE

Con el desembolso de las ordenes de cambio se logró retomar en el trabajo de subsanaciones pendientes, resanes, pintura en estructuras metálicas. **Se está a la espera de que las autoridades de SEDECOAS - FHIS confirmen fecha de inauguración.**



## PROYECTO RUTA LENCA DE LA JUVENTUD

Se realizó el desembolso de la orden de cambio por lo que se retomaron las obras en ejecución, se avanzó en subsanar detalles pendientes, siembra de plantas en áreas verdes, pintura. **Se está a la espera de que las autoridades de SEDECOAS -FHIS confirmen fecha de inauguración.**

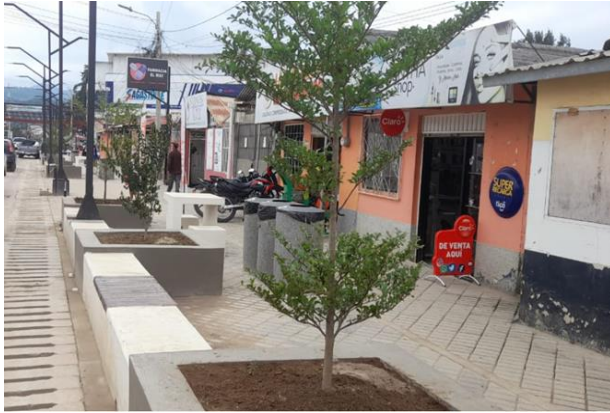

## PROYECTO THAU MISHU CASA DE LA JUVENTUD

El proyecto Thau Mishu avanza sin inconvenientes se han realizado trabajos de levantamiento de paredes, firmes de concreto, instalaciones eléctricas.





## LA ESPERANZA

El Proyecto de Paseo Cultura Lenca en La Esperanza, Intibucá, representa una significativa operación de regeneración urbana dentro de un enfoque integral y sostenible. Este proyecto transforma gran parte del margen de la calzada principal CA11A en un paseo peatonal a lo largo del margen izquierdo de la carretera.

Además, se han implementado iniciativas como la Plaza de la Juventud en Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá, diseñada para proporcionar espacios seguros y adecuados para los jóvenes. Esta plaza busca promover la convivencia comunitaria y prevenir la violencia juvenil mediante la inclusión de áreas para actividades deportivas y recreativas como gimnasios al aire libre, áreas de juego, salones multiusos y canchas deportivas, dirigidas a todas las edades.

El Proyecto Plaza San Carlos se enfoca en crear un centro deportivo seguro para los jóvenes de San Carlos, La Esperanza, Intibucá, ofreciendo instalaciones como canchas multiusos, pistas de trote y patinaje, así como áreas de gimnasio al aire libre, todo diseñado para promover la participación familiar y comunitaria.

**Tabla 3: Proyectos de Infraestructura Seleccionados en el Municipio de La Esperanza – Estado de la Ejecución**

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	<b>Paseo Cultural Lenca (Obra de Confianza)</b>	Colonia Buenos Aires	4,728,832.16	➤ Proyecto Finalizado Pendiente de inauguración
2.	<b>Plaza de La Juventud Buenos Aires</b>	Colonia Buenos Aires	8,160,161.95	➤ Proyecto aprobado y desembolsado en el primer desembolso, Orden de inicio 4 de abril 2024.
3.	<b>Centro Deportivo Integral San Carlos</b>	Colonia San Carlos	6,090,046.99	➤ Proyecto aprobado y desembolsado el primer desembolso, Orden de inicio 4 de abril 2024. Se realizó el segundo desembolso y orden de cambio
<b>Monto Total de Inversión Estimado</b>			<b>18,979,041.10</b>	

## PROYECTO PASEO CULTURAL LENCA

Se realizaron los desembolsos correspondientes a las órdenes de cambio, lo que permitió avanzar en las subsanaciones pendientes, especialmente en los trabajos de acabado. Estos incluyeron la mejora de pisos, la instalación de barandales y la aplicación de pintura. **Se está a la espera de que las autoridades de SEDECOAS -FHIS confirmen fecha de inauguración.**



## PROYECTO PLAZA DE LA JUVENTUD

Se puede observar un avance significativo en el módulo de Oficinas y áreas externas.



## PROYECTO CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL SAN CARLOS

Trabajos exteriores, instalación hidrosanitarias y eléctricas, construcción de jardineras, senderos, plazas, ya listo para comenzar con acabados.



## JUTICALPA

En la Colonia Solidaridad, la iniciativa "Cancha Abe y Ben" se buscó transformar una cancha deteriorada en un espacio seguro y adecuado para actividades físicas y convivencia juvenil, la cancha presentaba problemas de accesibilidad y sin condiciones apropiadas para actividades al aire libre. Con el apoyo del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Cooperación Alemana KfW y el programa CONVIVIR, se remodelo completamente este espacio, proporcionando a los jóvenes un lugar donde puedan participar en actividades deportivas y sociales.

El proyecto "Centro de Formación Integral Juvenil" tiene como objetivo revitalizar un antiguo Centro Penal para convertirlo en un centro educativo, social y laboral para los jóvenes de la zona y sus alrededores. Este centro ofrecerá una variedad de talleres prácticos y educativos como música, arte, informática y técnicos, así como espacios para exhibiciones y usos múltiples. Además, albergará oficinas administrativas para facilitar la gestión y operación del centro. Se espera que este espacio se convierta en un punto de referencia para el desarrollo personal y profesional de los jóvenes, fomentando sus habilidades y promoviendo la integración comunitaria.

★ ★ ★ El proyecto "Parque Recreativo La Juventud" tiene como objetivo remodelar completamente un parque existente para crear un espacio seguro y adecuado donde la comunidad, especialmente los jóvenes, puedan convivir y participar en actividades recreativas y culturales. Se enfoca en mejorar la infraestructura,



incluyendo áreas verdes, mobiliario urbano, iluminación y accesibilidad, con la intención de promover el bienestar y la cohesión social en la comunidad.

**Tabla 4: Proyectos de Infraestructura Seleccionados en el Municipio de Juticalpa – Estado de la Ejecución**

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	<b>Cancha ABE y BEN (Obra de Confianza)</b>	Colonia La Solidaridad	4,220,401.03	➤ Proyecto Finalizado en espera de inauguración
2.	<b>Centro de Formación Integral Juvenil</b>	Barrio El Centro	13,720,180.88	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer, orden de inicio 9 de mayo 2024.
3.	<b>Parque Recreativo de La Juventud</b>	Aldea La Concepción	4,454,231.38	➤ Proyecto Finalizado en espera de inauguración
<b>Monto Total de Inversión Estimado</b>			<b>22,394,813.29</b>	

### CANCHA ABE Y BEN

Proyecto ha sido finalizada exitosamente y está preparada para su inauguración. Todas las subsanaciones pendientes se llevaron a cabo de manera efectiva, logrando un espacio agradable. **Se está a la espera de que las autoridades de SEDECOAS -FHIS confirmen fecha de inauguración.**



## PROYECTO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENIL

Los avances en la ejecución del proyecto continúan de manera significativa, logrando importantes progresos en la construcción de las paredes intervenidas en los módulos 3 y 4. Además, se ha trabajado en el módulo 1, un área de especial relevancia debido a su intervención por parte de antropología, lo que requiere un enfoque más cuidadoso y especializado para respetar y preservar su valor histórico y cultural, se trabajo en el repello interiores y exterior.



## PROYECTO PARQUE RECREATIVO LA JUVENTUD

Proyecto ha sido finalizada exitosamente, habiéndose completado las subsanaciones mínimas, como pintura y acabados finales. Además, se logró instalar el equipamiento completo, colocar grama sintética y culminar el mobiliario con elegantes bancas circulares, ofreciendo un espacio acogedor y funcional para los usuarios. **Se está a la espera de que las autoridades de SEDECOAS -FHIS confirmen fecha de inauguración.**



## **B. COMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES LABORALES Y SOCIALES DE JOVENES**

Este componente se financian las siguientes actividades:

- Capacitación de jóvenes en competencias sociales, mediación y resolución pacífica de conflictos, ciudadanía, organización comunitaria, convivencia, seguridad ciudadana y gestión de proyectos comunitarios, así como en habilidades para la vida, de equidad de género e igualdad de oportunidades.
- Capacitación de jóvenes en competencias laborales, talleres técnico-vocacionales, formación de facilitadores bajo la metodología aprender haciendo en coordinación con otras instituciones y programas.
- Capacitación de jóvenes en talleres de arte y deporte con enfoque de cultura de paz y prevención de violencia.
- Estudios de análisis del mercado laboral de regiones determinadas para identificar necesidades de formación y perfiles laborales.
- Materiales y equipo para actividades de deporte, arte y cultura, el manejo de conflictos y la operación de infraestructura social para jóvenes.
- Materiales y equipo para la aplicación de metodologías de orientación laboral, emprendimiento social, la formación técnica en oficios y habilidades laborales orientadas por las demandas según el análisis del mercado laboral.
- Equipamiento de centros de formación y bolsas de empleo local en coordinación con otras instituciones.
- Coordinación con instituciones nacionales y locales, ONG, iglesias y la empresa privada para determinar oportunidades de empleo.
- Coordinación con centros educativos y/o institutos de formación profesional, para facilitar la participación de jóvenes en cursos de formación.

- Consultorías especializadas a través de enlaces in situ para monitorear los procesos sociales y laborales, enfocadas a la juventud y actores relevantes, los cuales son implementados por las oficinas municipales de juventud y los enlaces sociales municipales en los municipios de injerencia del Proyecto verificando el cumplimiento de las contrapartes con las cuales la Entidad Ejecutora ha establecido convenios de colaboración o contratos.

**Tabla 6: Procesos de Capacitaciones**

A continuación, se presenta una actualización y conteo de jóvenes capacitados a la fecha, a partir de los datos recibidos de cada uno de los Enlaces Sociales en los municipios, quienes acompañan los procesos de formación a nivel local y verifican la participación de los jóvenes.

Nombre del curso	ORGANIZACIÓN / INSTITUCIÓN	Total		TOTAL
		Hombres	Mujeres	
<b>PRODUCTO B</b>				
Habilidades para la Vida	FIPADEH	99	159	258
Arte Cultura, Deporte y Ambiente	FIPADEH	83	114	197
Habilidades para la Vida	INJUVE	112	114	226
<b>TOTAL PRODUCTO B</b>				<b>681</b>
<b>PRODUCTO C</b>				
Servicio al Cliente y Técnicas de Ventas	INFOP	111	57	168
Reparación de Celulares	INFOP	23	18	41
Barismo	INFOP	20	79	99
Manejo de Redes Sociales para Emprender	INFOP	24	26	50
Electricidad Residencial	INFOP	40	0	40
Maquinaria Equipo Pesado	INFOP	5	6	11
Albañilería	INFOP	7	1	8
Revestimiento de Pisos	INFOP	4	4	8
Planes de Negocio	INJUVE	28	66	94
<b>TOTAL PRODUCTO C</b>				<b>519</b>
<b>TOTAL JÓVENES CAPACITADOS</b>		<b>556</b>	<b>644</b>	<b>1,200</b>

### **C. COMPONENTE 3 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES RELEVANTES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (ESPECIALMENTE LA ENTIDAD EJECUTORA, LA ENTIDAD COORDINADORA Y LAS MUNICIPALIDADES Y COMUNIDADES PARTICIPANTES)**

Este componente financia las siguientes actividades:

- Capacitación de organizaciones comunitarias en gestión, ejecución, operación y mantenimiento de la infraestructura comunal, en temas relacionados a la prevención de violencia y la recuperación de



espacios públicos aplicando la metodología CPTED (Prevención de Delitos mediante el Diseño del Ambiente).

- Capacitación de los actores relevantes en temas de “espacios seguros para jóvenes”, la metodología CPTED, el desarrollo juvenil, la mediación y resolución de conflictos, la creación de una cultura de paz, la operación y el mantenimiento participativo, la seguridad comunitaria (enfoque preventivo con la policía municipal) y en la elaboración, la gestión y el monitoreo de los planes municipales para el desarrollo comunitario y para la prevención de violencia.
- Fortalecer la participación comunitaria y la promoción de la convivencia a través de la metodología Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC).
- Fortalecer la participación comunitaria en la sostenibilidad, revitalización y mantenimiento de los proyectos CONVIVIR a través de la metodología de Organización, Mantenimiento y Gestión (ORMAG).
- Estudios y documentación de buenas prácticas de prevención de violencia.
- Incorporar metodologías y buenas prácticas exitosas institucionalizadas en la Entidad Coordinadora.

A continuación, se presenta el cuadro resumen de actores relevantes capacitados a la fecha.

En el Componente 3 “Mejoramiento de las capacidades de actores relevantes” como reportado en el informe anterior, la meta de este componente ya fue lograda. Meta 284 / logro 292 = 103%.

**Tabla 7: Procesos de Capacitaciones Mejoramiento de Capacidades de Actores Relevantes**

Proceso de Capacitación	Empresa Responsable	Hombres	Mujeres	Total
		Capacitados	Capacitadas	
Habilidades Blandas para Profesionales	CINTA - X	8	10	18
CPTED	Consultor Independiente	10	7	17
Diplomados y Cursos varios	UNITEC	21	23	44
Fortalecimiento Municipal	FUNDEMUN	23	37	60
Políticas Públicas	Fundación Misión Integral	27	54	81
Género e Inclusión Social	Milthon Meza	24	48	72
				<b>292</b>

Nota. Cabe mencionar que varios actores relevantes fueron capacitados en diversos procesos de formación

#### xiv. INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO

Se ha realizado una revisión detallada del presupuesto, detectándose un déficit que afecta la proyección financiera tanto para el resto del año en curso como para el siguiente. Ante esta situación, se llevó a cabo un proceso de Redistribución de los recursos, con el fin de cubrir dicho déficit y asegurar el cumplimiento de los compromisos financieros sin comprometer el desarrollo de los proyectos previstos. Esta redistribución permitirá equilibrar las cuentas y mantener la sostenibilidad de las operaciones.

PROYECTO (Datos SIAFI)	Organismo financiador	Año 2024 (Millones HNL)			% AVANCE	Proyección fina HNL 2024	PROYECCION 2024 FINAL EUROS
		Vigente	Redistribución	Ejecutado			
Gatos Operativos	Contraparte Nacional	L 8,111,994.00	L 6,184,348.16	L 1,864,296.97	30%	L 4,385,503.57	165,241.28 €
Construcción y/ o Mejoramiento de Infraestructura Fase II	Cooperación Alemana KfW	L 31,679,403.00	L 29,982,034.42	L 3,070,031.25	10%	L 26,912,003.17	1,014,016.70 €
Fortalecimiento de Habilidades para Jóvenes	Cooperación Alemana KfW	L 7,575,280.00	L 2,428,772.27	L 1,933,772.27	80%	L 495,000.00	18,651.09 €
Fortalecimiento de Actores Relevantes	Cooperación Alemana KfW	L 8,369,776.00	L 1,633,800.00	L 537,000.00	33%	L 1,096,800.00	41,326.30 €
Materiales y Equipo de Capacitación	Cooperación Alemana KfW	L 9,005,138.00	L 2,488,016.32	L 1,459,273.07	59%	L 1,028,743.25	38,761.99 €
Asistencia Técnica	Cooperación Alemana KfW	L 5,848,956.00	L 7,764,696.97	L 1,227,012.78	16%	L 6,537,684.19	246,333.24 €
<b>TOTAL</b>		<b>L 70,590,547.00</b>	<b>L 50,481,668.14</b>	<b>L 10,091,386.34</b>	<b>14%</b>	<b>L 40,455,734.18</b>	<b>L 1,524,330.60</b>

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS CONVIVIR FASE II									
DESCRIPCIÓN	CUENTA BANCARIA	FECHA	MONTO DE TRANSFERENCIA	MTO ACREDITADO BCH	MONTO ACREDITADO BCH HNL	N/D COMISION BANCARIA	N/D	TASA DE CAMBIO	MONTO DE LA TRANSFERENCIA HNL
DOTACION INICIAL	11101-22-000044-7	03.11.2021	€ 77.914,72	€ 77.839,72	L 2.172.631,24	€ 75,00	L 2.093,37	27,9116	L 2.174.724,61
TRASNFERENCIA 1	11101-22-000044-7	23.05.2022	€ 231.076,31	€ 231.001,31	L 6.004.530,24	€ 75,00	L 1.949,51	25,9935	L 6.006.479,75
TRASNFERENCIA 2	11101-22-000044-7	02.12.2022	€ 772.806,12	€ 772.731,12	L 20.048.331,18	€ 75,00	L 1.945,86	25,9448	L 20.050.277,04
TRASNFERENCIA 3	11101-22-000044-7	10.08.2023	€ 452.781,85	€ 452.706,85	L 12.277.871,53	€ 75,00	L 2.034,08	27,121	L 12.279.905,61
TRASNFERENCIA 4	11101-22-000044-7	06.11.2023	€ 2.114.888,40	€ 2.114.813,40	L 56.081.573,41	€ 75,00	L 1.988,88	26,5185	L 56.083.562,29
TRASNFERENCIA 5	11101-22-000044-7	18.10.2024	€ 150.560,58	€ 150.485,58	L 4.070.453,46	€ 75,00	L 2.027,65	27,0353	L 4.072.481,11
TRASNFERENCIA 6	11101-22-000044-7	31.10.2024	€ 964.999,40	€ 964.924,40	L 26.205.407,91	€ 75,00	L 2.036,69	27,1558	L 26.207.444,60
<b>TOTAL</b>			<b>€ 4.765.027,38</b>	<b>€ 4.764.502,38</b>	<b>L 126.860.798,97</b>	<b>€ 525,00</b>	<b>L 14.076,03</b>	<b>26,8115</b>	<b>L 126.874.875,00</b>

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS CONVIVIR FASE III									
DESCRIPCIÓN	CUENTA BANCARIA	FECHA	MONTO DE TRANSFERENCIA	MTO ACREDITADO BCH	MONTO ACREDITADO BCH HNL	N/D COMISION BANCARIA	N/D	TASA DE CAMBIO	MONTO DE LA TRANSFERENCIA HNL
DOTACION INICIAL	11101-22-000045-5	17.09.2024	€ 252.449,13	€ 252.374,13	L 6.959.128,30	€ 75,00	L 2.068,10	27,5746	L 6.961.196,40
<b>TOTAL</b>			<b>€ 252.449,13</b>	<b>€ 252.374,13</b>	<b>L 6.959.128,30</b>	<b>€ 75,00</b>	<b>L 2.068,10</b>	<b>27,5746</b>	<b>L 6.961.196,40</b>

**xv. LISTADO DE PRINCIPALES CONTRATO DE BIENES, SERVICIOS, SUMINSTROS, OBRAS Y SUPERVISION FIRMADOS EN EL TROMESTRE**

ESTATUS DE PROCESOS DE COMPRAS MENORES - PROYECTO CONVIVIR 2024									
	NUMERO DE PROCESO	TIPO DE PRODUCTO	Tipo de Adquisición	FECHA DE PUBLICACION	FECHA DE ADJUDICACION	ESTATUS	EMPRESA GANADORA	MONTO ORDEN DE COMPRA	FONDOS
1	CMA-062-FHIS-2024	ADQUISICION SIEMBRA Y TRANSPORTE DE PLANTAS	Servicios	14/5/2024	29/5/2024	ADJUDICADO	INVERSIONES LM	580,457.28	FONDOS EXTERNOS
2	CMA-070-FHIS-2024	ADQUISICION DE DIAGNOSTICO DE FLOTA VEHICULAR PROYECTO CONVIVIR -FASE II	Servicios	12/6/2024	24/6/2024	ADJUDICADO	TALLER CARRASCO	17,940.00	FONDOS EXTERNOS
3	CMA-073-A-FHIS-2024	ADQUISICION DE PAPEL DE OFICINA-FASE I	Suministros	17/6/2024	17/6/2024	ADJUDICADO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	16,543.37	FONDOS NACIONALES
4	CMA-073-B-FHIS-2024	ADQUISICION DE PAPEL DE OFICINA-FASE II	Suministros	17/6/2024	17/6/2024	ADJUDICADO	DISPROA	4,119.99	FONDOS NACIONALES
5	CMA-073-C-FHIS-2024	ADQUISICION DE PAPEL DE OFICINA-FASE II	Suministros	17/6/2024	17/6/2024	ADJUDICADO	PAPELERIA HONDURAS	862.50	FONDOS NACIONALES
6	CMA-104-A-FHIS-2024	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS TALLERES DE CAPACITACION A JOVENES EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA, EN EL MARCO DEL PRYCTO CONVIVIR FASE III LA CAPACITACION SERA IMPARTIDA POR INJUVE	Servicios	13/8/2024	16/8/2024	ADJUDICADO	IPSA NAH	19,665.00	FONDOS EXTERNOS
7	CMA-104-B-FHIS-2024	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS TALLERES DE CAPACITACION A JOVENES EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA, EN EL MARCO DEL PRYCTO CONVIVIR FASE III LA CAPACITACION SERA IMPARTIDA POR INJUVE	Servicios	13/8/2024	16/8/2024	ADJUDICADO	HOTEL PLAZA INTERNACIONAL/ RESTAURANTE	23,141.34	FONDOS EXTERNOS
8	CMA-104-C-FHIS-2024	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS TALLERES DE CAPACITACION A JOVENES EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA, EN EL MARCO DEL PRYCTO CONVIVIR FASE III LA CAPACITACION SERA IMPARTIDA POR INJUVE	Servicios	13/8/2024	16/8/2024	ADJUDICADO	FRESA Y CHOCOLATE	17,779.00	FONDOS EXTERNOS
9	CMA-115-FHIS-2024	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) PARA LOS 06 VEHICULOS DEL PROYECTO CONVIVIR FASE I.	Servicios	3/9/2024	23/9/2024	ADJUDICADO	TALLER CARRASCO	639,620.80	FONDOS EXTERNOS
10	CMA-116-A-FHIS-2024	ADQUISICION DE LLANTAS, FASE II	Suministros	6/9/2024	6/9/2024	ADJUDICADO	RENDILLANTAS	63,894.00	FONDOS EXTERNOS
11	CMA-116-B-FHIS-2024	ADQUISICION DE LLANTAS, FASE II	Suministros	6/9/2024	6/9/2024	ADJUDICADO	LLANTICENTRO FERCO	7,130.00	FONDOS NACIONALES
12	CMA-138-FHIS-2024	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS UBICADA EN JUTICALPA OLANCHO-FASE II	Bienes	26/9/2024	26/9/2024	ADJUDICADO	CASH BUSINES	240,051.00	FONDOS NACIONALES
13	CMA-143-A-FHIS-2024	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, FASE II	Suministros	23/10/2024	23/10/2024	ADJUDICADO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	9,572.14	FONDOS NACIONALES
14	CMA-143-B-FHIS-2024	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, FASE II	Suministros	10/10/2024	10/10/2024	ADJUDICADO	DISPROA	6,927.83	FONDOS NACIONALES
15	CMA-143-C-FHIS-2024	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, FASE II	Suministros	10/10/2024	10/10/2024	ADJUDICADO	REDIPO	2,001.00	FONDOS NACIONALES
16	CMA-143-D-FHIS-2024	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, FASE II	Suministros	10/10/2024	10/10/2024	ADJUDICADO	COMPUSER S DE R L DE C V	4,112.40	FONDOS NACIONALES
17	CMA-143-E-FHIS-2024	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, FASE II	Suministros	10/10/2024	10/10/2024	ADJUDICADO	PAPELERIA HONDURAS	781.43	FONDOS NACIONALES
18	CMA-143-F-FHIS-2024	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, FASE II	Suministros	8/11/2024	8/11/2024	ADJUDICADO	REDIPO	1,240.00	FONDOS NACIONALES
	CMA-175-FHIS-204	ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE VISITAS	Bienes/Sumistro	8/11/2024	13/11/2024	ADJUDICADO	GIPEREZ	21,594.5	FONDOS NACIONALES
19	CMA-180-FHIS-2024	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR-FASE II	Suministros	11/11/2024	*	CANCELADO/ FRACASADO	*	*	FONDOS NACIONALES
20	CMA-181-A-FHIS-2024	ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	Suministros	12/11/2024	12/11/2024	ADJUDICADO	PAPELERIA HONDURAS	12,992.13	FONDOS NACIONALES
21	CMA-181-B-FHIS-2024	ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	Suministros	14/11/2024	14/11/2024	ADJUDICADO	DISTRIBUDORA VALENCIA	10,265.04	FONDOS NACIONALES
22	CMA-181-C-FHIS-2024	ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	Suministros	12/11/2024	12/11/2024	ADJUDICADO	DISPROA	5,063.45	FONDOS NACIONALES
23	CMA-186-FHIS-2024	ADQUISICION DE SERVICIOS PARA TALLER DE CONVIVENCIA, LOGROS 2024 Y METAS 2025, FASE II- LUGAR TENTATIVO: TELA, ATLANTIDA	Servicios	14/11/2024	*	CANCELADO/ FRACASADO	*	*	FONDOS NACIONALES
25	CMA-192-FHIS-2024	ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA- FASE II	Bienes	18/11/2024	22/11/2024	ADJUDICADO	COMPUSERVICIOS Y MAS	49,151.00	FONDOS NACIONALES
26	CMA-214-FHIS-2024	ADQUISICION SERVICIO DE TALLER DE CONVIVENCIA, LOGROS 2024 Y METAS 2025 DEL PROYECTO CONVIVIR -FASE I- LUGAR TENTATIVO: LAGO DE YOJOA	Servicios	2/12/2024	5/12/2024	ADJUDICADO	TURASER	393,580.82	FONDOS NACIONALES

**xvi. DESAFÍOS Y PROBLEMÁTICA DE CONVIVIR Fase II:**

1. Los proyectos están sujetos a procesos administrativos que pueden sufrir retrasos o cambios, lo que afecta la planificación y ejecución oportuna, especialmente en fases críticas como las ordenes de inicio y desembolsos programados.
2. Se efectuaron los pagos correspondientes a procesos de compras pendientes, fortaleciendo la cadena de suministro y garantizando la disponibilidad de recursos necesarios para los proyectos en ejecución
3. Se logró la contratación de nuevo personal estratégico para fortalecer las capacidades operativas del equipo de trabajo. Este refuerzo garantiza una mejor ejecución y seguimiento de los proyectos en curso, optimizando la eficiencia y efectividad de las iniciativas.
4. Se clausuraron exitosamente las capacitaciones impartidas por INFOP en los municipios de Juticalpa, La Esperanza e Intibucá y Santa Rosa de Copán. Estas actividades fortalecieron las competencias técnicas de los jóvenes, promoviendo su empleabilidad y desarrollo personal.
5. Algunos de los procesos de contratación no fueron exitosos debido a la imposibilidad de encontrar un perfil adecuado para los puestos requeridos.

**xvii. DESAFÍOS Y PROBLEMÁTICA DE CONVIVIR Fase III**

1. Este Trimestre es clave para cumplir con los objetivos establecidos, lo que exige una gestión eficiente en diversos aspectos, como la realización de pagos pendientes y la agilización de procesos. Sin embargo, uno de los principales desafíos a los que nos enfrentamos es la lentitud en las gestiones entre los procesos del ciclo Fhis y la Secretaría de Finanzas, lo que ha generado demoras y complicaciones en el cumplimiento de estos objetivos.
2. La creación de la estructura programática y presupuestaria ha sido un proceso engorroso, debido a los trámites complejos que deben gestionarse ante la Secretaría de Finanzas. Además, se ha presentado un problema técnico por parte de la Unidad de Modernización (UDEM), lo que generó un retraso.

**xviii. LOGROS Y AVANCES CONVIVIR FASE II**

- 1) Se ha gestionado con éxito el avance de las órdenes de cambio, lo que ha permitido completar los trámites necesarios para proceder con los desembolsos en tres proyectos específicos: Parque La Pirámide, Parque Recreativo La Juventud y Cancha Abe y Ben. Esta gestión ha sido crucial para evitar que los proyectos se detengan por falta de fondos, asegurando así su continuidad y progreso.
- 2) Se establecieron alianzas con organizaciones como SEDECOAS-FHIS, INFOP, INJUVE, permitiendo una implementación más efectiva de los programas de capacitación y el aprovechamiento de recursos y conocimientos para el beneficio de los jóvenes y las comunidades.
- 3) Se realizaron visitas de supervisión y monitoreo en los proyectos en ejecución para evaluar el avance físico y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos, lo que ha permitido ajustar estrategias y mantener el ritmo de avance de las obras.
- 4) Se finalizó el Proyecto Plaza Juvenil brisas de Copán ubicado en Santa Rosa de Copán. El día 29 de agosto se llevó a cabo los actos de inauguración donde participaron autoridades municipales, miembros del CEP y la comunidad.
- 5) Se logró el desembolso de las órdenes de cambio, lo que permitió retomar de manera efectiva la ejecución de los proyectos. Este avance financiero no solo revitaliza las actividades planificadas, sino que también garantiza el cumplimiento de los plazos establecidos y la calidad de los resultados esperados. Con la reactivación de estos proyectos, se espera un impacto positivo en la ejecución.

**xix. LOGROS Y AVANCES CONVIVIR FASE III**

1. Se ha logrado la contratación de nuevo personal clave para el proyecto CONVIVIR, fortaleciendo las distintas áreas del proyecto.
2. Se llevo a cabo el Taller de Indicadores con participantes del Equipo CONVIVIR Fase II y Fase III, personal de INJUVE y Sub-Secretaría de Seguridad.
3. Después de varias reuniones con la ATP, se logró finalizar el Manual Operativo CONVIVIR. Este manual es un documento clave para la gestión y ejecución de las actividades dentro del proyecto, ya que establece de manera clara los procedimientos, directrices y normativas que deben seguirse en todas las fases del proyecto. La finalización de este manual representa un avance significativo en la

estandarización de los procesos y contribuirá a la mejora de la eficiencia y coherencia en la implementación de las actividades del proyecto CONVIVIR.

4. Al inicio del Proyecto CONVIVIR III, se presentaron desafíos para lograr las transferencias a la cuenta especial por parte de la Secretaría de Finanzas (SEFIN). Un problema en el sistema informático impidió realizar las transferencias de fondos a la cuenta especial de CONVIVIR III durante varios meses, afectando también la transferencia de fondos para los gastos operativos. Sin embargo, el problema ha sido resuelto y se pudo realizar la gestión lo que permitió el pago pendiente de los consultores y la adquisición de servicios.

## **CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)**



### ✓ **Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)**

#### **A. Objetivo General**

El propósito de esta Actividad es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

#### **B. Focalización**

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en las cinco municipalidades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Tela y La Ceiba. Las comunidades específicas de intervención serán identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

#### **C. Descripción del Proyecto**

El gobierno de EE.UU. a través de la Agencia de Desarrollo Internacional (USAID), y el GdH han firmado el convenio de donación de objetivo de desarrollo 522-0501 y cuatro (4) cartas de ejecución con un periodo de implementación de 81 meses del de octubre de 2017 a junio de 2024.



En este trimestre se formalizó la firma de una nueva carta de ejecución No. 522-0513-01 por parte de la USAID/FHIS/SEFIN donde se sub obligaron \$8,422,674 equivalentes a L 208,567,337 de aportaciones de la USAID y \$2,105,669 equivalente a L. 52,141,809 de aportaciones del GdH, siendo el nuevo monto de la actividad de \$20,269,689.20 de aportaciones de la USAID y \$5,067,423.00 de aportaciones del GdH. Así mismo, bajo la aprobación de esta nueva carta de ejecución, se extiende el periodo de implementación de la actividad a 111 meses, desde el mes de octubre del 2017 a diciembre de 2026.

Cartas de Ejecución	Aportaciones USAID		Aportaciones GdH	
	US\$	HNL	US\$	HNL
Convenio 522-0441 Carta de Ejecución 30 y Convenio 522-0501 Carta de Ejecución 4	2,836,304	69,957,309	709,076	17,489,327
Convenio 522-0441 Carta de Ejecución 33 y Convenio 522-0501 Carta de Ejecución 8	Reprogramación Plan de Trabajo y Presupuesto			
Convenio 522-0441 Carta de Ejecución 36 y Convenio 522-0501 Carta de Ejecución 11	3,861,710	95,248,883	965,427	23,812,221
Convenio 522-0501 Carta de Ejecución 22	1,000,000	24,664,951	250,000	6,166,238
Convenio 522-0501 Carta de Ejecucion25	4,149,001	102,334,906	1,037,250	25,583,727
Convenio 522-0513 Carta de Ejecución 01	8,422,674	208,567,337	2,105,669	52,141,809
<b>Total</b>	<b>20,269,689</b>	<b>500,773,386</b>	<b>5,067,423</b>	<b>125,193,322</b>

#### D. Monto del Convenio

Presupuesto total estimado: \$14,637, 541.74 conforme se establece en la carta de ejecución No 522.0501 – 025 y su plan de trabajo aprobado., de los cuales, fondos de donación de USAID: \$11, 847,015.20; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$ 2, 961,753.80 (efectivo: \$ 2,127,508.35 y especies: \$ 800,000.00).

**i. Avance Financiero**

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	23.226.555,00	21.906.553,68	94%
2019	60.781.669,00	60.781.669,00	100%
2020	145.322.291,00	60.678.681,68	42%
2021	67.508.910,00	42.626.620,46	63%
2022	57.711.016,00	55.047.658,54	95%
2023	80.251.050,00	76.368.680,98	95%
2024	56.925.118,00	54.893.122,06	96%

**ii. Avance por Sector**

SECTOR	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	5	0	15.873.029,05	64	555.619
EDUCACION	3	8	23.382.195,20	168	7.318
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>39.255.224,25</b>	<b>232</b>	<b>562.937</b>

**iii. Avance por Departamento**

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
ATLANTIDA	3	0	7.231.871,69	41	450.731
COMAYAGUA	0	1	1.189.733,65	12	808
COPAN	0	1	2.224.000,00	20	675
CORTES	3	4	12.924.629,10	85	6.212
FRANCISCO MORAZAN	2	1	13.072.589,81	54	103.665
LA PAZ	0	1	2.612.400,00	20	846
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>39.255.224,25</b>	<b>232</b>	<b>562.937</b>

#### iv. Otras Inversiones

<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>Mto. Ejecutado 2024</b>
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	13.558.320,88
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	2.079.576,93
<b>TOTAL</b>	<b>15.637.897,81</b>

#### v. EJECUCION FINANCIERA

Para el año 2024, se tiene programada una ejecución presupuestaria total de L. 58,564,993.00. De este monto, L. 19,139,161.00 corresponden a fondos nacionales (Fuente 11) y L. 39,233,832.00 corresponden a fondos de donación (Fuente 22).

Al cierre del IV Trimestre del 2024, se ejecutaron L. 54.9MM equivalente al 94% del presupuesto para dicha gestión, en el IV trimestre de 2024 se ejecutaron L. 27.3MM equivalente al 47% del presupuesto 2024, este repunte de ejecución se debe en gran parte a los desembolsos de 6 (seis) Proyectos PEC que forman parte de la nueva carta de ejecución firmada entre el GdH y USAID.

Descripción	Gestion 2024	Gestion 2024 (Oct - Dic)			
	Presupuesto Aprobado	Regularización Pend 2024	Presupuesto Ejecutado 2024	Disponible	% de Ejecucion
ICS- 522-0501 Fondos Nacionales	2,139,161	-	17,499,285	1,639,875.750	91%
ICS- 522-0501 Fondos Donaciones	39,425,832	-	37,393,837	2,031,995	95%
		-	<b>54,893,122</b>	<b>3,671,871</b>	<b>94%</b>

#### vi. LOGROS ALCANZADOS EN TRIMESTRE

Durante el periodo comprendido desde el 01 de octubre al 31 de diciembre del 2024, se encuentran en etapa de ejecución un total de 6 de Infraestructura Escolar. Los 6 proyectos se encuentran en ejecución bajo la metodología de Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC).

Al cierre de IV se finalizaron 3 proyectos con una inversión total de L. 8,450,179 beneficiando de manera directa a más de 961 personas y generando 36 empleos.

CUMPLIMIENTO DE ENTREGABLES POR TRIMESTRE, INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA ICS											
Categoría	Programado				Ejecutado				TOTALES		
	I trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Programado	Ejecutado	
Infraestructura Escolar	2	1	0	0	1	0	0	2	3	3	
Espacios Recuperados	0	3	0	0	0	1	1	1	3	3	
Obras Complementarias en los Centros de salud	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2	
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			
	<b>7</b>				<b>8</b>						

### A. Avances Físicos de Proyecto en ejecución

Al cierre del IV Trimestre del 2024 bajo el programa ICS se encuentran 6 proyectos en ejecución, presentando un avance promedio de 17%.

Estos proyectos son orientados al fortalecimiento de la Infraestructura Escolar, de los cuales 5 son ejecutados bajo la metodología de Proyectos PEC y 1 por contratista.

### B. Avances Financiero de Proyecto en ejecución

Los 6 proyectos que se encuentran en etapa de ejecución y suspendidos al final del IV Trimestre del 2024 bajo el programa ICS, representan un monto total de L. 36,170,000 del cual se ha desembolsado un monto promedio del 45%.

### Matriz de Seguimiento de Proyectos ICS en ejecución

No.	Código	Localización		Proyecto	% Avance físico
1	109693	Cortés	SPS	Reparación del CEB Padre Claret y construcción de obras varias Fase II.	3%
2	109161	Cortés	SPS	Reparación del Instituto Modesto Rodas Alvarado FASE II	80.00%
3	110094	La Paz	Yarumela	REPARACIÓN INSTITUTO POLIVALENTE DR. DOROTEO VARELA MEJIA Y OBRAS VARIAS	2.5%

4	110135	Copan	Corquin	REPARACIÓN DE ESCUELA URBANA MIXTA JOSE CECILIO DEL VALLE Y OBRAS VARIAS	14.0%
5	110248	Cortes	Villanueva	Reparación de CEB Augusto C. Coello y Obras Varias.	3.0%
6	110244	Francisco Morazán	M.D.C.	Reparación de CEBG Tiburcio Carias Andino y Obras Varias.	2.0%

**vii. LISTADOS DE PRINCIPALES CONTRATOS DE BIENES, SERVICIOS, SUMINISTROS, OBRAS Y SUPERVISIÓN FIRMADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE 2024.**

Programa	Código	Localización	Proyecto	Estatus	Monto de contrato	N. de Contrato
ICS	110215	Santa Bárbara	Reparación CEB La Independencia y Obras Varias.	En Contratación	6,994,000.00	008-PEC-FHIS-ICS-2024
ICS	109699	Cortes	Reparación de Talleres y Construcción de Obras Varias Centro Laura Vicuña	En Contratación	6,494,000.00	007-PEC-FHIS-ICS-2024

**viii. PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCION IV TRIMESTRE**

Área Administrativa-Financiera

Durante el IV trimestre de 2024, la ejecución presupuestaria del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS) se vio afectada por un monto de L. 1.6 millones correspondiente a los fondos nacionales (fuente 11), debido a que la Tesorería General de la República (TGR-SEFIN) no aprobó la cuota compromiso solicitada para el mes de diciembre, específicamente para el grupo presupuestario 400, el cual correspondía al primer desembolso de un Proyecto Ejecutado por la Comunidad (PEC).

### Área Técnica

**Incremento de los costos de contratación de mano de obra calificada en las zonas de intervención:** Se ha observado que en los últimos periodos la contratación de mano de obra calificada representa un enorme reto para la ejecución de los proyectos en materia de costo, lo cual incide directamente en el presupuesto de los proyectos y afectación de alcances.

**Escases de mano de obra:** En los proyectos que se encuentran en el occidente del país su mano de obra calificada y no calificada se ha visto mermada debido a la temporada de corte de café, las personas orientar sus actividades para generación de recursos económicos al corte de café que se da en los meses de octubre, noviembre y diciembre.

**Temporada de fenómenos naturales:** Particularmente el último trimestre del año 2024 se presentaron periodos de tormentas y frentes fríos concurrentes, lo que genero retrasos significativos en las programaciones de ejecución en los proyectos.

## ix. ACCIONES DE LA DIM ANTE LA PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN DE IV TRIMESTRE

### Área Financiera

Gestionar ante SEFIN nuevamente la cuota compromiso que corresponde al primer desembolso para dar inicio al Proyecto PEC que quedó pendiente en diciembre del 2024 del programa ICS.

### Área Técnica:

Se está trabajando en la reprogramación de actividades para acelerar la ejecución y recuperar los desfases en tiempo de los proyectos en estatus de ejecución.

El incremento en los costos laborales en las zonas de intervención ha afectado los presupuestos iniciales, por lo que es necesario ajustar los costos para asegurar que los alcances de los proyectos sean viables dentro de los nuevos márgenes financieros. Esto también permitirá evitar futuros desfases presupuestarios y mantener la ejecución dentro de los límites previstos.

✓ **Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)**

**i. Objetivo General**

El propósito de esta Actividad es mejorar las pobres condiciones sociales y económicas son especialmente pronunciadas en el Occidente de Honduras. Extrema pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático. Bajos niveles educativos, migración, falta de acceso a los servicios básicos y otros retos socioeconómicos son endémicos. La provisión de servicios básicos de educación y nutrición son escasos en la zona de Occidente y es difícil el acceso a los ya existentes, así mismo la gestión de servicios de educación, nutrición y agua y saneamiento son deficientes por lo que los ciudadanos cuentan además con pocos espacios de participación para mejorar sus vidas a nivel de hogar y sus vidas productivas, lo que genera una gran brecha de pobreza.

**ii. Focalización**

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en los departamento de Ocotepeque, la Paz, Copan Intibucá, Santa Bárbara y Lempira y zonas occidente específicas de intervención identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

**iii. Descripción del Proyecto**

La USAID, y el GdH han firmado el convenio de donación de objetivo de desarrollo 522-0502 y cuatro (4) cartas de ejecución con un periodo de implementación de 68 meses del de octubre de 2018 a junio de 2024.

A través de la formalización de la nueva carta de ejecución No. 522-0511-01 por parte de la USAID/FHIS/SEFIN se reprogramo el plan de trabajo aprobado bajo la Carta de Ejecución No.522-0502-45 y se extendiendo el periodo de implementación de la actividad a 84 meses, desde el mes de



octubre del 2018 a diciembre de 2025, esta ampliación se realiza para ejecutar fondos de donación de la oficina de Crecimiento Económico (EG).

Cartas de Ejecución	Aportaciones USAID		Aportaciones GdH	
	US\$	HNL	US\$	HNL
Convenio 522-0502 Carta de Ejecución 9	1,004,470	24,107,280	251,117	6,026,820
Convenio 522-0502 Carta de Ejecución 19	2,995,530	71,892,720	748,883	17,973,192
Convenio 522-0502 Carta de Ejecución 25	-1,000,000	-25,000,000	-250,000	-6,250,000
Convenio 522-0502 Carta de Ejecución 37	Reprogramación de Plan de Trabajo y Plazo			
Convenio 522-0502 Carta de Ejecución 34	3,831,000	93,522,440	957,750	23,426,857
Convenio 522-0502 Carta de Ejecución 45	1,504,304	39,980,889	376,076	9,948,963
Convenio 522-0502 Carta de Ejecución 47 y Convenio 522-0511 Carta de Ejecución 01	Reprogramación de Plan de Trabajo y Plazo			
<b>Total</b>	<b>8,335,304</b>	<b>204,503,329</b>	<b>2,083,826</b>	<b>51,125,832</b>

#### iv. Monto del Convenio

El monto total de la Actividad es de \$ 10,538,750.00 (USAID \$ 8,831,000.00, Gobierno de Honduras \$ 1,707,750.00). Según la carta de ejecución No. 034.

#### v. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
<b>2019</b>	6.190.650,00	5.981.569,54	97%
<b>2020</b>	65.583.096,00	13.336.794,49	20%
<b>2021</b>	58.488.260,00	47.180.270,68	81%
<b>2022</b>	37.504.624,00	35.478.196,70	95%
<b>2023</b>	42.199.428,00	33.390.584,30	79%
<b>2024</b>	56.610.552,00	40.815.197,30	72%

vi. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
INFRAESTRUCTURA VIAL	0	1	2.429.698,05	1	0
EDUCACION	3	6	20.838.946,60	115	2.422
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>23.268.644,65</b>	<b>116</b>	<b>2.422</b>

vii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
COPAN	1	1	5.012.242,90	22	175
LA PAZ	1	2	7.569.000,48	42	1.073
LEMPIRA	0	1	3.465.990,38	10	323
SANTA BARBARA	1	3	7.221.410,93	42	851
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>23.268.644,69</b>	<b>116</b>	<b>2.422</b>

viii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	15.189.256,21
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	2.357.296,44
<b>TOTAL</b>	<b>17.546.552,65</b>

ix. EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE

Durante el periodo comprendido desde el 01 de octubre al 31 de diciembre del 2024, se encuentran en etapa de ejecución un total de 6 de Infraestructura Escolar. Los 6 proyectos se encuentran en ejecución bajo la metodología de Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC).

Al cierre del IV Trimestre se finalizaron 2 proyectos con una inversión total de L.7,511,624.11, beneficiando de manera directa a más de 97 estudiantes y generando 35 empleos.

CUMPLIMIENTO DE ENTREGABLES POR TRIMESTRE, PILOTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL OCCIDENTE DE HONDURAS										
Categoría	Programado				Ejecutado				TOTALES	
	I trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Programado	Ejecutado
Infraestructura Escolar	0	0	0	1	0	0	1	2	1	3
Infraestructura, Logística y Transporte	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Total	0	0	0	2	0	0	1	2		
	2				3					

### A. Avances Físicos de Proyecto en ejecución

Al cierre del IV Trimestre del 2024 bajo el programa PIOH, 6 proyectos se encuentran en ejecución con un avance promedio de un 70%.

### B. Avances Financiero de Proyecto en ejecución

Los 6 proyectos que se encuentran en etapa de ejecución al final del IV Trimestre del 2024 bajo el programa PIOH, representan un monto total de L. 16,818,551.33 del cual se ha desembolsado un monto promedio del 75%.

#### Matriz de Seguimiento de Proyectos PIOH en ejecución

No.	Programa	Código	Localización		Proyecto	% Avance físico
1	PIOH	109055	La Paz	Yarula	Reparación del CEB PEDRO H. BONILLA y construcción de obras varias.	55.0%
2	PIOH	109204	La Paz	La Paz	Reparación CEB Dionisio de Herrera y Construcción de obras varias.	90.0%
3	PIOH	108952	Santa Bárbara	Azacualpa	Reparación del CEB REPUBLICA DE BRASIL y construcción de obras varias	35.0%
4	PIOH	109205	Santa Bárbara	Las Vegas	CEB Lesly Argentina Rodríguez, Colonia Orellana, Las Vegas, Santa Bárbara	80.0%
5	PIOH	109066	Copán	El Paraíso	Reparación del Escuela Jonh F. Kennedy y Construcción de obras varias	76.0%
6	PIOH	109063	Lempira	San Sebastián	Reparación del CEB JOSE TRINIDAD REYES y construcción de obras varias.	85.0%

## x. LOGROS ALCANZADOS EN TRIMESTRE

Para el año 2024, se tiene programada una ejecución presupuestaria total de L. 56,710,336.00. De este monto, L. 11,611,250.00 corresponden a fondos nacionales (Fuente 11) y L. 45,099,086.00 corresponden a fondos de donación (Fuente 22).

Al cierre del IV Trimestre del 2024, se ejecutaron L.40.1MM equivalente al 72% del presupuesto para dicha gestión, en el IV trimestre de 2024 se ejecutaron L. 19.9MM, equivalente al 35% del presupuesto, este repunte de ejecución se debe en gran parte a la regularización de liquidaciones de proyectos PEC que se encontraban en revisión del TSC desde el mes de septiembre de 2024.

El bajo porcentaje de ejecución (72%) se debe a un desfase provocado por la reprogramación de actividades, resultado de la priorización de proyectos por parte de la USAID y por el proceso de firma de la Carta de implementación. Inicialmente, se había planificado iniciar proyectos de caminos productivos en 2024; sin embargo, la USAID solicitó dar prioridad a proyectos escolares, destinando los fondos correspondientes a esa cartera, decisión en apoyo a la Alianza por la Educación. Adicionalmente a la firma tardía de la carta de implementación No. 522-0511-01, dado que la carta de implementación No.45 venció el 28 de junio y la nueva carta de ejecución fue aprobada en Julio por el GdH y USAID en Julio de 2024, los proyectos tuvieron que suspenderse hasta la firma de la nueva carta de ejecución.

Descripción	Presupuesto Aprobado	Gestion 2024 (Oct - Dic)			
		Regularización Pend. 2024	Presupuesto Ejecutado 2024	Disponible	% de Ejecucion
PIOH- 522-0502 Fondos Nacionales	11,611,250	-	11,511,464	99,786.02	99%
PIOH- 522-0502 Fondos Donaciones	45,099,086	-	29,303,733	15,795,353	65%
		-	<b>40,815,197</b>	<b>15,895,139</b>	<b>72%</b>

Tomando en cuenta el mecanismo financiero establecido en los convenios de donación de cada programa donde se establece lo siguiente: “Se utilizará el método de reembolso de costos para implementar y financiar la Actividad. Bajo este método, el Donatario deberá hacer los pagos con sus propios fondos para cubrir costos de la Actividad según el cuadro de Presupuesto del Plan de Trabajo pertinente aprobado por la USAID (El Presupuesto de la Actividad). La USAID reembolsara al Donatario por los costos incurridos en esta Actividad y que se han presentado a la USAID para reembolso sobre una base periódica.”

**xi. LISTADOS DE PRINCIPALES CONTRATOS DE BIENES, SERVICIOS, SUMINISTROS, OBRAS Y SUPERVISIÓN FIRMADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE 2024.**

Programa	Código	Localización	Proyecto	Estatus	Monto de contrato	Número de contrato
PIOH	109585	La Paz	Reparación CCPREB Unión y Fe y Construcción de obras varias	En Contratación	2,202,000.00	013-PEC-FHIS-PIOH-2023
PIOH	109064	Lempira	Reparación del CEB JUAN RAMON MOLINA y construcción de obras varias.	En Contratación	2,357,000.00	015-PEC-FHIS-PIOH-2023

**xii. PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCION IV TRIMESTRE**

Área Técnica

**Incremento de los costos de contratación de mano de obra calificada en las zonas de intervención:** Se ha observado que en los últimos periodos la contratación de mano de obra calificada representa un enorme reto para la ejecución de los proyectos en materia de costo, lo cual incide directamente en el presupuesto de los proyectos y afectación de alcances.

**Escases de mano de obra:** En los proyectos que se encuentran en el occidente del país su mano de obra calificada y no calificada se ha visto mermada debido a la temporada de corte de café, las personas orientar sus actividades para generación de recursos económicos al corte de café que se da en los meses de octubre, noviembre y diciembre.

**Temporada de fenómenos naturales:** Particularmente el último trimestre del año 2024 se presentaron periodos de tormentas y frentes fríos concurrentes, lo que genero retrasos significativos en las programaciones de ejecución en los proyectos

### **xiii. ACCIONES DE LA DIM ANTE LA PROBLEMAICA EN LA EJECUCION DE IV TRMESTRE**

#### Área Financiera

Gestionar ante SEFIN nuevamente la cuota compromiso que corresponde al primer desembolso para dar inicio al Proyecto PEC que quedó pendiente en diciembre del 2024.

#### Área Técnica:

Se está trabajando en la reprogramación de actividades para acelerar la ejecución y recuperar los desfases en tiempo de los proyectos en estatus de ejecución.

El incremento en los costos laborales en las zonas de intervención ha afectado los presupuestos iniciales, por lo que es necesario ajustar los costos para asegurar que los alcances de los proyectos sean viables dentro de los nuevos márgenes financieros. Esto también permitirá evitar futuros desfases presupuestarios y mantener la ejecución dentro de los límites previstos.



## CARTERA DE FONDOS NACIONALES

### ✓ **Gestión de Proyectos Artículo 338 DGP-2024**

#### **i. Antecedentes**

El informe de ejecución de fondos se elabora en cumplimiento del Artículo 338 de las Disposiciones Generales del presupuesto 2024, que establece lo siguiente:

*Se autoriza una asignación presupuestaria de hasta NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L950,000,000.00) para el desarrollo de infraestructura menor y obras sociales a petición y en beneficio de las Comunidades, Patronatos, Asociaciones, Alcaldías, Juntas de Agua, Cajas Rurales, entre otros; así como para el otorgamiento de becas de estudio en todos los niveles educativos. Las obras de infraestructura menor, sociales, becas y canchas deportivas se gestionarán a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), Instituto de Crédito Educativo (EDUCREDITO), Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (FOSODE) y la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR).*

A la fecha, se ha asignado un total de L180,659,079.00 de los cuales se han ejecutado L55,249,806.58 en 153 proyectos de infraestructura. Asimismo, en fondos del Tesoro Nacional se cuenta con un presupuesto vigente de L215,577,195.00, de los cuales se han ejecutado L47,976,484.78 en 39 proyectos de inversión, distribuidos en 21 proyectos de anticipos, 17 estimaciones de obras y 1 devolución de retención.

Este informe tiene como propósito evaluar el progreso y la utilización de los fondos asignados, así como analizar el impacto de los proyectos en las comunidades beneficiarias y los desafíos enfrentados en la ejecución de los mismos. Se busca proporcionar una visión clara y detallada del estado actual de los proyectos y ofrecer recomendaciones para mejorar la eficiencia en la gestión y ejecución de los recursos restantes.

## ii. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2024	243.181.203,00	243.181.201,62	100%

## iii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
AGUA Y SANEAMIENTO	0	2	34.314.371,30	62	5.550
INFRAESTRUCTURA VIAL	31	57	124.870.451,71	970	1.929.552
PREVENCION SITUACIONAL	6	8	39.220.756,13	140	388.616
EDUCACION	6	27	44.675.622,48	709	66.866
SALUD	0	1	-	8	0
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>95</b>	<b>243.081.201,62</b>	<b>1.889</b>	<b>2.390.584</b>

## iv. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
ATLANTIDA	3	3	18.027.332,91	58	25.100
CHOLUTECA	0	8	11.998.803,45	116	337.764
COMAYAGUA	2	9	20.861.675,31	163	128.966
COPAN	0	5	12.379.512,25	121	57.113
CORTES	8	11	17.754.546,59	156	176.082
COLON	1	1	10.191.258,40	20	50.573
EL PARAISO	0	8	18.622.853,21	168	282.758
FRANCISCO MORAZAN	8	10	25.759.645,85	451	339.308
ISLAS DE LA BAHIA	0	1	-	7	0
LA PAZ	1	7	15.640.659,32	104	133.361
LEMPIRA	3	2	16.600.825,29	57	12.404
OCOTEPEQUE	0	0	-	0	0
OLANCHO	8	16	21.517.679,94	259	545.987
SANTA BARBARA	6	6	27.909.151,55	86	227.369
YORO	1	5	10.942.979,63	94	52.092
VALLE	2	3	14.974.277,92	29	21.707
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>95</b>	<b>243.181.201,62</b>	<b>1.889</b>	<b>2.390.584</b>

## v. Logros y Avances

Durante el cuarto trimestre del 2024, el Programa 20, enfocado en la Infraestructura Rural, ha ejecutado un total de 57 proyectos de inversión distribuidos en diferentes departamentos y sectores. A continuación, se muestra el avance físico por departamento y sector conforme a lo que se ha registrado en el SIAFI con documentos F01, representando una ejecución de L59,682,015.32 representando un 20.1% en relación con el presupuesto vigente (L295,800,925.00).

## vi. Problemática

- ✓ **Retrasos en la Ejecución:** Aunque se ha logrado un avance significativo, algunos proyectos han experimentado retrasos debido a diversos factores, como problemas logísticos, climáticos y administrativos.
- ✓ **Coordinación Interinstitucional:** La gestión de proyectos a través de múltiples entidades, como el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Educación y otras, ha presentado desafíos en términos de coordinación y comunicación, lo que ha afectado la eficiencia en la ejecución de algunos proyectos.
- ✓ **Capacidad Técnica:** En ciertas localidades, la capacidad técnica para llevar a cabo los proyectos es limitada, lo que ha requerido capacitación adicional y apoyo técnico, generando demoras y costos adicionales.
- ✓ **Control y Seguimiento:** La implementación de un sistema efectivo de seguimiento y monitoreo no ha sido óptimo, lo que ha dificultado la evaluación continua y precisa del progreso y la identificación oportuna de problemas.

✓ **Infraestructura y Otros a Nivel Nacional Programa 11**

**i. Logros y Avances**

Durante el tercer trimestre del 2024, el Programa 11, enfocado en la Infraestructura Rural, ha ejecutado un total de 103 proyectos de inversión distribuidos en diferentes departamentos y sectores. A continuación, se muestra el avance físico por departamento y sector conforme a lo que se ha registrado en el SIAFI con documentos F01, representando una ejecución de L31,726,201.86 representando un 61.7% en relación con el presupuesto vigente (L51,394,299.00).

**ii. Avance Financiero**

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
<b>2024</b>	165.535.921,00	165.535.920,14	100%

**iii. Avance por Sector**

SECTOR	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
AGUA Y SANEAMIENTO	9	25	51.623.266,32	510	10.066
EMPREDIMIENTO Y VALORES	1	13	-	210	0
INFRAESTRUCTURA VIAL	41	101	53.629.555,86	2.130	82.256
PREVENCION SITUACIONAL /CC	3	5	31.398.256,22	120	835.558
EDUCACION	21	74	28.884.841,74	1.425	2.930
SALUD	2	3	-	75	0
<b>TOTAL</b>	<b>77</b>	<b>221</b>	<b>165.535.920,14</b>	<b>4.470</b>	<b>930.810</b>

#### iv. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
ATLANTIDA	2	3	9.160.224,08	75	50
CHOLUTECA	4	7	12.703.618,30	165	6.989
COMAYAGUA	9	21	10.370.423,56	450	32.444
COPAN	2	2	-	60	0
CORTES	11	31	38.293.071,13	630	781.330
COLON	10	15	7.655.213,37	375	4.491
EL PARAISO	0	6	-	90	0
FRANCISCO MORAZAN	12	20	13.323.537,76	480	10.630
INTIBUCÁ	2	6	8.327.073,76	120	8.653
ISLAS DE LA BAHIA	1	1	-	30	0
LA PAZ	1	2	-	45	0
LEMPIRA	2	13	12.256.688,54	225	2.400
OCOTEPEQUE	0	2	-	30	0
OLANCHO	13	26	25.808.587,85	585	80.588
SANTA BARBARA	4	43	10.355.401,91	705	3.235
YORO	2	18	9.552.900,77	300	0
VALLE	2	5	7.729.179,11	105	0
<b>TOTAL</b>	<b>77</b>	<b>221</b>	<b>165.535.920,14</b>	<b>4.470</b>	<b>930.810</b>

#### v. Problemática

- ✓ **Retrasos en la Ejecución:** Aunque se ha logrado un avance significativo, algunos proyectos han experimentado retrasos debido a diversos factores, como problemas logísticos, climáticos y administrativos.
- ✓ **Coordinación Interinstitucional:** La gestión de proyectos a través de múltiples entidades, como el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Educación y otras, ha presentado desafíos en términos de coordinación y comunicación, lo que ha afectado la eficiencia en la ejecución de algunos proyectos.

✓ **Capacidad Técnica:** En ciertas localidades, la capacidad técnica para llevar a cabo los proyectos es limitada, lo que ha requerido capacitación adicional y apoyo técnico, generando demoras y costos adicionales.

- ✓ **Control y Seguimiento:** La implementación de un sistema efectivo de seguimiento y monitoreo no ha sido óptimo, lo que ha dificultado la evaluación continua y precisa del progreso y la identificación oportuna de problemas.
