



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan
Operativo Anual POA-Presupuesto

FONDO HONDUREÑO DE
INVERSION SOCIAL
(IDECOAS/FHIS)

IV Trimestre 2016

Contenido

Introducción	3
Antecedentes	3
Misión:	4
Visión:	4
Valores:	4
Resumen Ejecutivo.....	5
Proyectos FHIS	8
Ejecución Presupuestaria por Programas 2016	9
Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2016.....	10
Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Cuarto Trimestre 2016.....	11
Ejecución Gasto Operativo Cuarto Trimestre del 2016	12
CARTERA BANCO MUNDIAL	16
• Proyecto Municipios más Seguros	16
• Crédito Banco Mundial 5289-0 HN	23
CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.....	27
• Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC)	27
• Programa de Integración y Convivencia Urbana	34
CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	40
• Proyecto de Infraestructura Rural BCIE	40
CARTERA KfW Entwicklungsbank	46
• Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local SE-FHIS KFW VIII (PROMINE) FASE I, II y III.....	46
• PROMINE FASE I	46
• PROMINE FASE II	48
• PROMINE FASE III	50
• Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR).....	53
CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID).....	62
• Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP)	62
• Programa de Infraestructura de Educativa (FHIS/EIP)	70

- Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a Través de las Energías Renovables (PODER) 74
- CARTERA PROYECTOS VARIOS 78
- DECRETO No. 045-2013. 78

Introducción



El presente informe es la recopilación de las actividades e inversiones realizadas por el IDECOAS/FHIS durante el Cuarto Trimestre del 2016.

Antecedentes

De acuerdo al Artículo 3, Numeral 4, Artículo 13 y 20 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-001-2014 se crea el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, mismo que se encuentra integrado por el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), que fue creado mediante el Decreto Ejecutivo PCM-013-2014 publicado el 30 de Mayo del 2014 y tiene como propósito la integración institucional del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y del Servicio Autónomo Nacional de Acueducto y Alcantarillados (SANAA) y demás afines al sector, en el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS). Independiente de su integración estas instituciones continúan cumpliendo los objetivos establecidos en sus leyes constitutivas. A partir de la aprobación del Decreto PCM-013-2014 queda establecida la nueva estructura y funcionamiento del IDECOAS con las entidades que lo integran.

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es un organismo Desconcentrado de la Presidencia de la República, creado el 22 de febrero de 1990 y extendida su vida legal hasta el año 2022 según decreto No. 222-2010 cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados, en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social y/o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Asimismo, asesorará a los gobiernos locales con respecto a los procesos de captación de recursos de las fuentes de financiamiento nacionales y/o externas y las asiste en la transferencia de las capacidades

técnicas y administrativas, para convertir a estos gobiernos locales en administradores eficientes de sus programas y proyectos, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Nación en aplicación del principio de Descentralización.

Misión:

“Somos una Institución estatal, desconcentrada, técnica y captadora de recursos que promueve el desarrollo local sostenible, participativo e incluyente mediante el fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, en alianza con socios estratégicos para desarrollar obras de infraestructura y proyectos de orientación social de acuerdo al plan de nación y visión de país de forma transparente y eficiente, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable de Honduras”.

Visión:

“Ser para el año 2022, la Institución líder en gestión y fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, para la ejecución de proyectos, que contribuya equitativamente al desarrollo sustentable nacional”.

Valores:

- ❖ Ética: Ejercicio de las funciones con sujeción a las normas morales que promuevan la confianza de la población hondureña.
- ❖ Integridad: Actuación sustentada en la honradez, prudencia, entereza, rectitud y firmeza.
- ❖ Compromiso: Ejecución de proyectos que coadyuven al desarrollo local.
- ❖ Transparencia: Amplia difusión de información sobre nuestras actuaciones. Rendición de cuentas ante la sociedad.
- ❖ Lealtad: Actuar con fidelidad y rectitud hacia el FHIS y compañeros de trabajo, con el objetivo de identificarse con la institución.
- ❖ Equidad: El FHIS no hace distinción de credo, raza, de ninguna otra forma de discriminación humana.


Resumen Ejecutivo

El IDECOAS/FHIS, llega hasta los lugares más recónditos del país, para contribuir a mitigar las necesidades de la población más pobre y vulnerable a través de respuestas rápidas y concretas con proyectos de Agua y Saneamiento, Educación, Electrificación Rural, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural.

El presupuesto del FHIS para la gestión 2016 al 31 de diciembre de 2016 asciende a 868.26 Millones de Lempiras:

Fuente	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	% de Participación en el Presupuesto Vigente
BID	L. 45,588,102.00	L. 121,775,377.00	14.03%
BCIE	L. 97,398,168.00	L. 95,056,511.00	10.95%
BM	L. 102,470,909.00	L. 104,164,025.00	12.00%
USAID	L. 20,820,000.00	L. 77,485,108.00	8.92%
GOH*	L. 229,820,856.00	L. 235,297,531.00	27.10%
KfW	L. 157,092,625.00	L. 234,483,978.00	27.01%
TOTAL	L. 653,190,660.00	L. 868,262,530.00	100.00%

* Incluye costo Operativo del FHIS

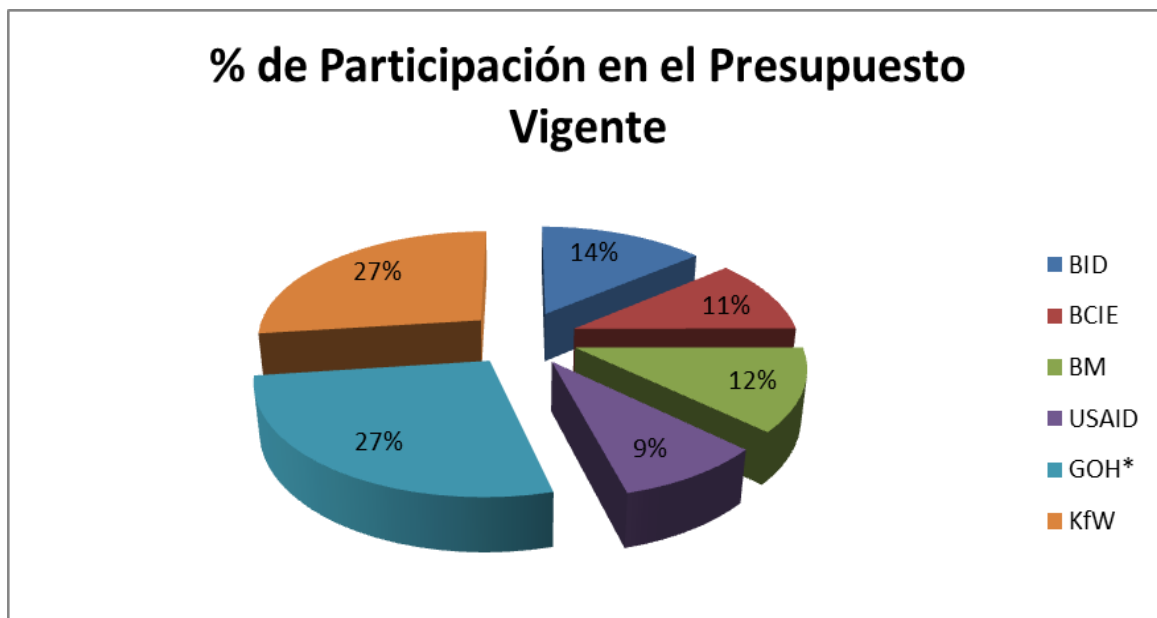

Situación Actual de los Programas:

- ❖ Proyecto Municipios Más Seguros: 2 Procesos de Consultorías Individuales que concluyeron en el trimestre, 4 Procesos de Consultorías que iniciaron. A nivel Comunitario: Se realizaron 10 reuniones de socialización con las comunidades, 22 capacitaciones a líderes, 2 talleres de resolución de conflictos para líderes y 2 talleres CEPREV para líderes, 3 ferias SAS, 3 concursos Barrios Limpios, 2 réplicas de taller de panadería. Con dichas actividades se llegó a un promedio de 1,399 personas a nivel comunitario. A Nivel Centro Educativo: Se continuó con la implementación la metodología de Miles de Manos, se desarrollaron 6 encuentros en donde participaron 770 personas (3 encuentros familia, 2 encuentros docentes y 1 encuentro puente). 3 Foros Educativos con un promedio de 1,010 personas participantes, 2 Talleres de resolución de conflictos 54 participantes, 1 Taller CEPREV 38 participantes y 2 campañas de prevención en centros educativos en donde participaron 201 personas.
- ❖ Proyecto de Infraestructura Rural (Crédito Banco Mundial 5289-0 HN), En cuanto a la ejecución física, todos los Subproyectos financiados por el Crédito de Banco Mundial 5289-HN, fueron finalizados antes del 30 de junio de 2016, dando cumplimiento a la fecha límite de cierre físico y a la entrega de productos (conexiones y kilómetros) proporcionada por el Banco.
- ❖ Programa de Integración y Convivencia Urbana, En Talleres de Capacitación Laboral, se impartieron 11 módulos con una participación de 1,200 personas. En Capacitación de Valores 11 módulos con una participación aproximada de 6,600 personas. En programas de Deportes y Valores se beneficiaron un total de 1200 niños y jóvenes en las colonias donde interviene el Programa. En taller de Convivencia se realizaron 3 talleres con la participación de 286 líderes comunitarios de las colonias ubicadas en la zona 1 y zona 2.
- ❖ Programa Infraestructura Rural (BCIE), Al 31 de diciembre del año 2016, se suscribieron/adjudicaron veintiséis (26) procesos de obras de infraestructura, siete (7) correspondiente al sector de Agua y Saneamiento, diez (10) del sector de Caminos Rurales y nueve (9) del sector de Electrificación Rural por Extensión de Red, por un monto de 106.85 Millones de Lempiras, de los cuales 100.80 Millones de Lempiras, serán financiados con fondos del Préstamo.

- ❖ Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión local SE-FHIS KFW:
 - ✓ Fase I se ejecutó el 94% de los fondos asignados en presupuesto.
 - ✓ Fase II se ejecutó el 94% de los fondos asignados en presupuesto.
 - ✓ Fase III se ejecutó el 99% de los fondos asignados en presupuesto, para un porcentaje de ejecución a nivel del programa de 98.11%.

- ❖ Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR), En el componente de Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura el programa CONVIVIR tiene en cartera actualmente: Siguatepeque: 1 obra de confianza concluida y 6 proyectos en ejecución con un monto de L. 19,502,227.90, Gracias: 1 obra de confianza concluida y 12 proyectos en ejecución con un monto de L. 50,407,422.54 y en la Lima: 1 obra de confianza y 9 proyectos en ejecución con un monto de L. 40,388,568.24. En temas de Capacitación se han realizado 7 talleres y 1 se encuentra en proceso de Contratación con una participación de 1,078 jóvenes en los 3 Municipios donde el Programa tiene presencia.

- ❖ Programa Pueblos Indígenas y Afro Hondureños y Cambio Climático (PIAHCC), Se efectuó una disminución del presupuesto 2016, trasladando el monto no ejecutado L. 12,771,727.00 a otro programa USAID FHIS/EIP de la misma Institución; se efectuaron los ajustes entre objetos del gasto para adecuar el presupuesto 2017 del Programa PIAHCC al nuevo esquema de los proyectos reformulados y al nuevo método de contratación de los mismos.

- ❖ Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP), Se terminaron 95 proyectos de Infraestructura y 7 proyectos se encuentran en ejecución.

- ❖ Programa de Infraestructura de Educativa (FHIS/EIP), Se terminaron 27 proyectos de Infraestructura escolar.


- ❖ Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a través de las Energías Renovables (PODER), se encuentran en ejecución 15 proyectos de riego y energía renovable.

Proyectos FHIS

Fuente	Nombre de Proyecto	Nombre Corto	Sector	Modalidad de Ejecucion
BID	Programa de Integración y Convivencia Urbana	2895/SF-HO	Infraestructura Social	Centralizados
	Programa de Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático	ATN NV-13535-HO-1	Proyectos de Adaptación y Mitigación de Riesgos	PEC
Banco Mundial	Proyecto de Infraestructura Rural	5289-HN	Agua y Saneamiento, Electrificación y Caminos Rurales	Descentralizados/ Centralizados
	Proyecto Municipios más Seguros	5192-HN	Infraestructura Social, Seguridad Ciudadana	Descentralizados/ Centralizados
BCIE	Proyecto de Infraestructura Rural	BCIE 1736	Agua y Saneamiento, Electrificación y Caminos Rurales	Descentralizados/ Centralizados
KFW	Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local SE-FHIS- KFW VIII	KFW VIII	Infraestructura Escolar	Descentralizados
	Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)	CONVIVIR	Infraestructura Social y Fortalecimiento de las Capacidades de los Jóvenes.	Descentralizados
USAID	Programa de Infraestructura Educativa (FHIS/EIP)	Mérida/CARSI	Reparación de centros educativos (escuelas y jardines de niños) en la primera fase del programa.	Centralizados
	Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a Través de las Energías Renovables	PODER	Soluciones y tecnologías haciendo uso de las energías renovables orientados a la mejora de los procesos productivos logrando atacar las causas de pobreza e inseguridad alimentaria.	Descentralizados
	Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP)	Mérida/CARSI	Proyectos de Seguridad en las comunidades que se puedan construir en menos de un año.	Descentralizados


Ejecución Presupuestaria por Programas 2016

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Monto Planificado IV Trimestre	Devengado del IV Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% Ejecución IV Trimestre/ Planificado IV Trimestre	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
Programa 1: Actividades Centrales	L. 229,820,856.00	L. 235,297,531.00	L. 77,574,382.75	L. 131,567,443.45	L. 209,048,680.81	L. 26,248,850.19	170%	89%
Programa 11: Infraestructura Rural	L. 125,906,243.00	L. 141,307,702.00	L. 44,883,066.00	L. 43,729,833.38	L. 140,136,779.80	L. 1,170,922.20	97%	99%
Programa 12: Infraestructura Escolar	L. 55,796,122.00	L. 175,106,597.00	L. 94,544,192.00	L. 91,773,534.30	L. 172,335,939.10	L. 2,770,657.90	97%	98%
Programa 14: Fomento al Desarrollo Local	L. 206,957,694.00	L. 296,873,580.00	L. 125,657,419.00	L. 115,842,111.42	L. 284,619,450.99	L. 12,254,129.01	92%	96%
Programa 15: Pueblos Indígenas y Cambio Climático	L. 13,889,745.00	L. 3,270,790.00	L. 1,352,276.00	L. 1,189,115.80	L. 3,055,190.37	L. 215,599.63	88%	93%
Programa 17: Infraestructura Productiva	L. 20,820,000.00	L. 16,406,200.00	L. 5,000,925.00	L. 5,000,924.16	L. 16,406,199.26	L. 0.74	100%	100%
TOTAL	L. 653,190,660.00	L. 868,262,400.00	L. 349,012,260.75	L. 389,102,962.51	L. 825,602,240.33	L. 42,660,159.67	111%	95%

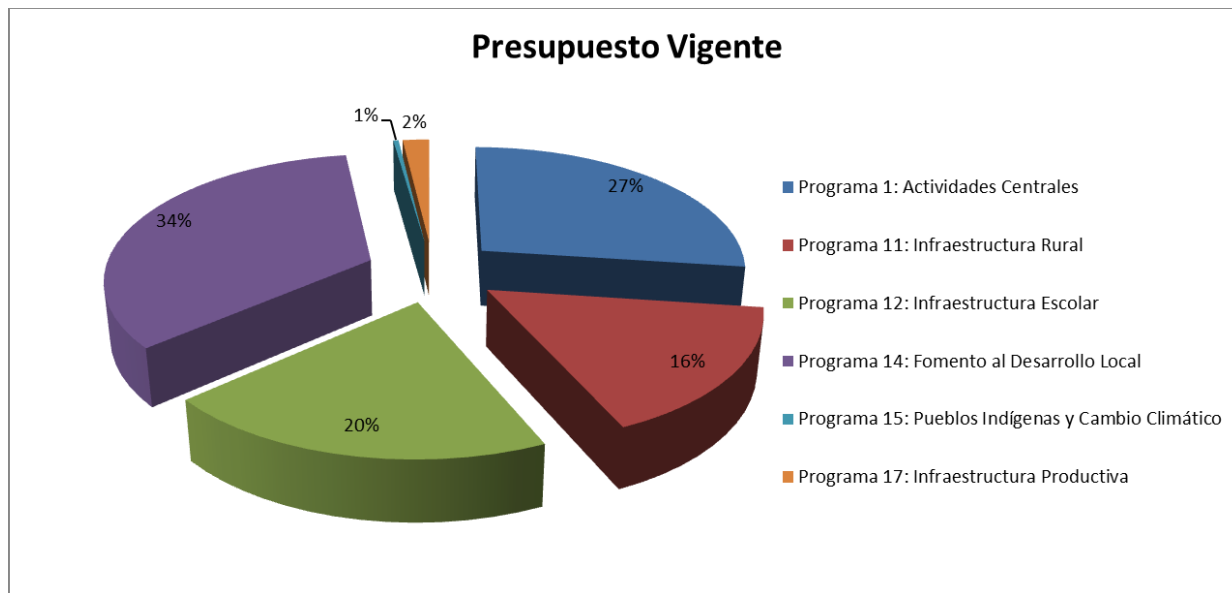


Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2016

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente 2016	Devengado del IV Trimestre	Devengado Acumulado 2016	% Ejecución al IV Trimestre / Presupuesto Vigente
Gasto Operativo/Gobierno	L. 229,820,856.00	L. 210,297,531.00	L. 113,518,817.63	L. 191,000,054.99	90.82%
Proyecto de Infraestructura Rural 5289-HN	L. 28,508,075.00	L. 46,251,191.00	L. 469,424.07	L. 46,230,447.99	99.96%
Proyecto de Infraestructura Rural 1736-BCIE	L. 97,398,168.00	L. 95,056,511.00	L. 43,260,409.31	L. 93,906,331.81	98.79%
Programa de Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestion Local, KfW VIII	L. 55,796,122.00	L. 145,687,475.00	L. 62,354,412.65	L. 142,916,817.45	98.10%
Programa de Infraestructura Educativa EIP	L. 0.00	L. 29,419,122.00	L. 29,419,121.65	L. 29,419,121.65	
Programa de Integración y Convivencia Urbana	L. 31,698,357.00	L. 118,504,457.00	L. 25,309,279.31	L. 113,622,321.26	95.88%
Proyecto Municipios mas Seguros	L. 73,962,834.00	L. 57,912,834.00	L. 22,971,026.83	L. 55,876,475.87	96.48%
Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jovenes CONVIVIR	L. 101,296,503.00	L. 88,796,503.00	L. 35,902,019.84	L. 83,460,868.42	93.99%
Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria CLIP	L. 0.00	L. 31,659,786.00	L. 31,659,785.44	L. 31,659,785.44	
Programa de Pueblos Indigenas y Afrohondureños y Cambio Climatico	L. 13,889,745.00	L. 3,270,920.00	L. 1,189,115.80	L. 3,055,190.37	93.40%
Programa de Oportunidades para el Desarrollo a través de Energía Renovable	L. 20,820,000.00	L. 16,406,200.00	L. 5,000,924.16	L. 16,406,199.26	100.00%
Decreto 45	L. 0.00	L. 25,000,000.00	L. 18,048,625.82	L. 18,048,625.82	72.19%
TOTAL	L. 653,190,660.00	L. 868,262,530.00	L. 389,102,962.51	L. 825,602,240.33	95.09%

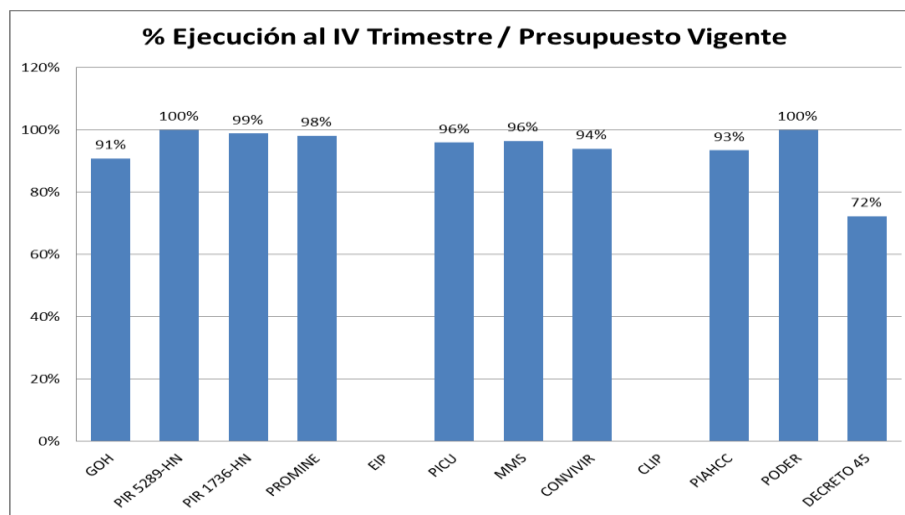

Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Cuarto Trimestre 2016

Grupo	Presupuesto Vigente por Grupo	Devengado IV Trimestre	Devengado Acumulado al IV Trimestre	Disponibles	% Ejecución IV Trimestre/ Presupuesto Vigente	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
Servicios Personales	L. 103,604,575.00	L. 32,365,687.28	L. 98,398,171.01	L. 5,206,403.99	31%	95%
Servicios no personales	L. 130,582,335.00	L. 51,671,187.23	L. 121,909,883.55	L. 8,672,451.45	40%	93%
Materiales y Suministros	L. 12,604,363.00	L. 6,028,611.64	L. 11,402,655.61	L. 1,201,707.39	48%	90%
Bienes Capitalizables	L. 610,860,527.00	L. 289,260,645.94	L. 583,443,399.75	L. 27,417,127.25	47%	96%
Transferencias y Donaciones	L. 710,600.00	L. 34,500.00	L. 705,799.99	L. 4,800.01	5%	99%
Servicio de la Deuda Pública	L. 9,900,000.00	L. 9,742,330.42	L. 9,742,330.42	L. 157,669.58	98%	98%
Total	L. 868,262,400.00	L. 389,102,962.51	L. 825,602,240.33	L. 42,660,159.67	45%	95%

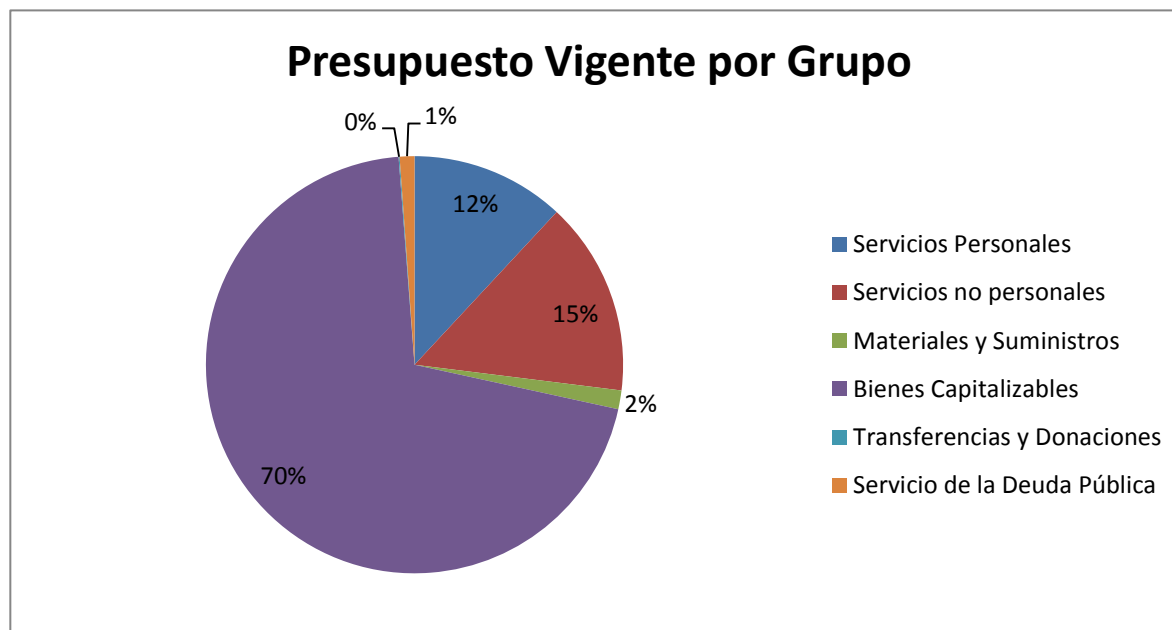

Ejecución Gasto Operativo Cuarto Trimestre del 2016

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
1100	Sueldos Básicos	18,453,511.00	5,748,626.11	0.00
11400	Adicionales	1,505,661.00	212,260.56	472,791.24
11510	Decimotercer Mes	1,537,793.00	1,369,364.11	9,888.89
11520	Decimocuarto Mes	1,537,793.00	291,399.14	35,845.14
11600	Complementos	1,975,407.00	266,550.00	828,048.06
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	2,135,354.00	820,900.24	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	620,172.00	126,741.44	0.00
14300	Gastos de Representación en el País	240,000.00	240,000.00	0.00
26110	Pasajes Nacionales	84,189.00	0.00	74,289.00
26210	Viáticos Nacionales	197,451.00	0.00	0.00
29100	Ceremonia y Protocolo	846,216.00	325,549.20	34,615.37
51220	Ayuda Social a Personas	76,000.00	4,500.00	200.01
51310	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fines De Lucro	4,600.00	0.00	4,600.00
1100	Sueldos Básicos	14,857,546.00	3,405,997.21	0.00
11400	Adicionales	588,021.00	118,411.67	26,113.75
11510	Decimotercer Mes	1,238,129.00	1,132,153.18	7,411.14
11520	Decimocuarto Mes	1,238,129.00	129,084.17	98,939.71
11600	Complementos	935,647.00	159,278.48	93,146.61
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	1,708,618.00	528,964.01	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	898,800.00	366,106.32	0.00
16200	Compensaciones	1,608,301.00	1,608,301.00	0.00
21200	Agua	26,794.00	5,850.00	15,094.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	278,113.00	54,440.00	219,587.99
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,304,578.00	139,399.49	225,878.92
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	83,387.00	19,544.25	25,541.74
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	65,188.00	0.00	62,556.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	124,490.00	13,581.52	87,446.73
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	128,288.00	288.55	41,905.85
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	288,000.00	15,000.00	0.00
24500	Servicios de Capacitación	86,600.00	25,560.00	61,040.00
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	2,638,279.00	472,288.38	21,000.00
25100	Servicio de Transporte	51,583.00	790.00	50,099.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,983,051.00	933,256.35	74,465.24
25400	Primas y Gastos de Seguro	1,423,491.00	239,315.80	228,562.07
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	2,550.00	7,450.00
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	12,000.00	4,748.00	7,252.00
26210	Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00	0.00
27210	Tasas	165,445.00	116,294.14	45,385.86
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	371,757.00	107,518.84	65,759.85
33100	Papel de Escritorio	198,000.00	187,151.57	153.43
33300	Productos de Artes Gráficas	37,885.00	0.00	13,058.50

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
33400	Productos de Papel y Cartón	32,505.00	2,729.55	27,973.03
33500	Libros, Revistas y Periódicos	23,615.00	0.00	0.00
35100	Productos Químicos	35,400.00	0.00	26,634.85
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00
35610	Gasolina	200.00	0.00	200.00
35620	Diesel	391,953.00	200,000.00	190,216.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	160,360.00	0.00	160,360.00
36400	Herramientas Menores	6,014.00	570.00	4,294.00
36930	Elementos de Ferretería	21,649.00	424.99	8,112.01
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	84,189.00	24,191.75	0.94
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	275,169.00	194,413.16	33,366.53
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	50,513.00	30,276.45	8,074.77
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	4,009.00	0.00	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	438,889.00	152,163.36	45,130.73
51220	Ayuda Social a Personas	30,000.00	30,000.00	0.00
11100	Sueldos Básicos	2,568,000.00	348,813.17	0.00
11400	Adicionales	146,000.00	0.00	0.00
11510	Decimotercer Mes	214,000.00	214,000.00	0.00
11520	Decimocuarto Mes	214,000.00	0.00	0.00
11600	Complementos	257,800.00	51,700.00	55,300.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	295,320.00	41,695.00	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	89,880.00	33,523.06	0.00
24300	Servicios Jurídicos	96,216.00	64,513.62	31,702.38
26210	Viáticos Nacionales	95,394.00	0.00	0.00
33700	Especies Timbradas y Valores	38,030.00	1,000.00	36,080.00
11100	Sueldos Básicos	1,718,022.00	169,688.65	0.00
11400	Adicionales	89,000.00	16,666.67	45,333.33
11510	Decimotercer Mes	143,168.00	143,168.00	0.00
11520	Decimocuarto Mes	143,168.00	0.00	0.00
11600	Complementos	169,868.00	52,186.66	45,663.69
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	197,572.00	24,403.17	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	80,892.00	32,538.66	0.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	240,540.00	4,821.43	107,733.07
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	97,610.00	16,285.56	51,611.52
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	385,598.00	370,598.00	0.00
11100	Sueldos Básicos	2,058,063.00	613,840.23	0.00
11400	Adicionales	87,000.00	0.00	4,915.79
11510	Decimotercer Mes	171,505.00	171,505.00	0.00
11520	Decimocuarto Mes	171,505.00	0.00	0.00
11600	Complementos	111,853.00	7,000.00	50,653.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	236,677.00	100,903.30	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	89,880.00	46,035.53	0.00

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
26210	Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	0.00
11100	Sueldos Básicos	18,481,870.00	3,680,288.35	1,368,887.30
11400	Adicionales	1,214,361.00	233,032.32	194,385.94
11510	Decimotercer Mes	1,540,155.00	1,416,637.68	0.00
11520	Decimocuarto Mes	1,540,155.00	60,747.22	208,057.68
11600	Complementos	1,121,474.00	269,805.10	0.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	2,701,624.00	1,285,770.93	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	283,500.00	0.00	0.00
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	109,000.00	41,800.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	2,008,536.00	230,600.82	2574.20
11100	Sueldos Básicos	804,000.00	724,854.61	0.00
11400	Adicionales	109,000.00	6,113.33	102,886.67
11510	Decimotercer Mes	67,000.00	67,000.00	0.00
11520	Decimocuarto Mes	67,000.00	30,851.26	36,148.74
11600	Complementos	99,700.00	79,797.14	902.86
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	92,460.00	87,835.00	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	35,952.00	29,179.40	0.00
12100	Sueldos Básicos	11,979,000.00	4,031,159.09	681,337.21
12410	Decimotercer Mes	999,750.00	919,083.39	80,666.61
12420	Decimocuarto Mes	999,750.00	604,770.68	1,669.46
12550	Contribuciones para Seguro Social	772,269.00	246,957.04	255,890.17
16200	Compensaciones	363,500.00	0.00	0.00
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	83,708,182.00	71,045,561.65	185,443.35
47120	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio P	7,000,000.00	6,075,553.92	924,446.08
55170	Transferencias de Capital a Gobiernos Locales	600,000.00	0.00	0.00
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000,000.00	18,048,625.82	695,1374.18
TOTAL PROGRAMA		L. 235,297,531.00	L. 131,567,443.45	L. 16,554,168.19

Cuadro por Sector 2016 (Ejecutado)

SECTOR	Proyectos Finalizados 2016	Mto. Ejecutado 2016	Empleos Generados 2016	Beneficiarios directos 2016
AGUA Y SANEAMIENTO	34	79,853,666.15	567	32,784
ENERGIA	33	30,949,417.69	320	20,652
EMPREDIMIENTO Y VALORES	68	15,428,589.93	71	9,834
INFRAESTRUCTURA VIAL	23	97,351,862.95	679	38,456
PREVENCION SITUACIONAL	50	34,862,167.55	143	49,086
EDUCACION	37	166,698,544.24	430	7,523
ASISTENCIA TECNICA	4	8,189,837.64	10	0
MUNICIPAL	49	63,826,284.73	545	61,039
RIEGO	8	14,240,880.00	0	694
TOTAL	306	511,401,250.88	2,765	220,068

Cuadro por Departamento 2016 (Ejecutado)

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2016	Mto. Ejecutado 2016	Empleos Generados 2016	Beneficiarios directos 2016
ATLANTIDA	24	22,241,847.69	81	23,156
CHOLUTECA	11	1,813,931.15	15	5,324
COMAYAGUA	23	16,035,791.28	118	14,039
COPAN	16	25,057,746.96	73	15,411
CORTES	51	46,640,903.43	306	58,004
FRANCISCO MORAZAN	69	134,296,805.35	799	25,500
GRACIAS A DIOS	2	635,322.42	8	400
INTIBUCÁ	18	76,654,385.35	288	3,461
LA PAZ	14	39,312,070.66	178	7,354
LEMPIRA	48	89,749,768.24	461	33,693
OCOTEPEQUE	9	21,990,143.71	90	6,203
OLANCHO	2	3,032,668.85		
SANTA BARBARA	14	26,965,258.37	293	17,604
YORO	5	6,974,607.42	55	9,919
TOTAL	306	511,401,250.88	2,765	220,068

	Mto. Ejecutado 2016
OTRAS INVERSIONES	
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	123,200,934.46
ACTIVIDADES CENTRALES	191,000,054.99
TOTAL	314,200,989.45

CARTERA BANCO MUNDIAL

- **Proyecto Municipios más Seguros**

- i. Objetivo**

Los objetivos de desarrollo del Proyecto son apoyar a Honduras para (i) mejorar las capacidades del gobierno central y de los gobiernos locales en la prevención de la violencia; (ii) abordar factores de riesgo de crimen y violencia en las Municipalidades Seleccionadas; y (iii) mejorar su capacidad de responder de manera rápida y efectiva ante una emergencia elegible.

- ii. Focalización:**

El Proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región Norte: La Ceiba, Choloma y El Progreso. Esto refleja la selección realizada por el Programa Municipios más Seguros que prioriza acciones en zonas con alta concentración de delincuencia y violencia. Para este Proyecto, los municipios fueron seleccionados por la clasificación en orden decreciente, tomando aquellos con poblaciones urbanas menores a 250.000 habitantes y con una tasa de homicidios mayor a 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual es aproximadamente el promedio nacional.

- iii. Tipología de Proyectos**

Componente 1 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención de Violencia a Nivel Nacional:

Subcomponente 1.1 Fortalecimiento de las capacidades de la Secretaría de Seguridad para orientar, coordinar y supervisar actividades de prevención de la violencia a nivel municipal; Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de las capacidades de la Secretaría de Seguridad y de las Municipalidades Seleccionadas para recolectar y procesar datos sobre violencia para la formulación de políticas basadas en la evidencia.

Componente 2 – Prevención Integrada de Crimen y Violencia a nivel Municipal y Comunitario

Intervenciones de prevención social dirigidos a las poblaciones en riesgo, incluyendo aquellas:

- Orientadas a la familia (por ejemplo, capacitación para padres, programas de desarrollo para niños víctimas de maltrato en edad preescolar (0-5 años) y proveerán capacitación para estilos de crianza, disciplina y comunicación padre-niño, habilidades para manejo sin violencia de situaciones familiares, supervisión de padres de familia y actividades de desarrollo para preparación de la escuela y mejoramiento de capacidades cognitivas);

- Basadas en género (por ejemplo, consejerías y remisiones de mujeres víctimas de violencia interpersonal, doméstica y/o sexual, educación sobre salud reproductiva y salud sexual, masculinidad y el rol de los géneros, y fortalecimiento de redes locales de prevención de violencia de género);
- Basadas en la prevención de violencia escolar (por ejemplo, programas para después de clase que involucren deportes, música y arte, además de habilidades para la vida, y promoción de conductas pro-positivas; la promoción de habilidades para la resolución de conflictos y promoción de relaciones positivas entre estudiantes; intervenciones para estudiantes con problemas de aprendizaje o conducta; prevención y reducción del “bullying” y desarrollo de espacios escolares)
- Orientadas a los jóvenes (por ejemplo, Sub proyectos de mentoría (contacto sostenido con un adulto para proveer aprendizaje, acompañamiento y establecimiento de roles positivos a seguir) para jóvenes en situación de riesgo; servicios integrados para jóvenes de (15 -34 años) que cubran desarrollo de capacidades para obtención de trabajos incluyendo una mezcla de habilidades para la vida (auto-control, manejo de ira, mejora a la auto-estima y toma de decisiones así como pasantías laborables. También se prevé educación técnica vocacional, mediación en el mercado laboral y programas de rehabilitación de drogas.

Intervenciones de prevención situacional incluyendo:

- La construcción de infraestructura comunitaria en pequeña escala que reduce las oportunidades de cometer delitos o crea espacios seguros comunitarios (parques, jardines comunitarios, parques infantiles, alumbrado público y pavimentación de algunas calles);
- La construcción y/o rehabilitación de espacios que podrían servir como centro para la entrega de los servicios sociales para acciones de prevención de violencia.

Acceso a servicios básicos incluyendo:

- Intervenciones de mejoramiento urbano tales como conexiones de agua y saneamiento, alumbrado público, calles de acceso y obras de mitigación de riesgos.

Resolución alternativa de conflictos para ampliar los sistemas municipales de resolución de conflictos, incluyendo:

- La formación de mediadores municipales;
- Fortalecimiento de sistemas de registro de casos;
- Expansión de redes de mediadores voluntarios.

Componente 3 - Administración del Proyecto y Monitoreo y Evaluación

Subcomponente 3.1. Apoyo a la Administración del Proyecto; Subcomponente 3.2. Monitoreo y Evaluación del Proyecto, incluyendo (a) el establecimiento de sistemas y capacidades para el proceso de monitoreo de las actividades del Proyecto, (b) la recopilación de datos de línea de base y de seguimiento para la evaluación de impacto del Proyecto, y (c) el desarrollo de la evaluación de impacto de al menos dos tipos de intervenciones.

Componente 4: Mecanismo de Respuesta Inmediata (MRI) para Contingencias por Emergencias

Este componente incluye la entrega de apoyo para responder de forma inmediata ante una Emergencia Elegible.

El Monto del convenio original fue de \$15, 000,000.00, pero el 22 de septiembre del 2015 la subsecretaria de Inversión Pública notificó al Ministro Director de IDECOAS, mediante oficio DGIP-212-2015, la reestructuración de los fondos de financiamiento, que significó una disminución de 2.3 millones de Dólares, siendo el nuevo monto del convenio de US\$ 12, 700,000.00.

Fecha de Firma del Convenio: 18 de Diciembre de 2012

Fecha de Finalización: 31 de Agosto de 2018

iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2013	19,288,000.00	11,605,763.23	60.17%
2014	43,046,050.00	22,346,049.32	51.91%
2015	54,222,419.00	51,468,890.89	94.92%
2016	57,912,834.00	55,876,475.87	96.48%

v. Avance Físico por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2016	Mto. Ejecutado 2016	Empleos Generados 2016	Beneficiarios directos 2016
ELECTRIFICACION	3	4,387,891.23	35	6,942
PREVENCION SITUACIONAL	11	12,155,719.07	100	25,069
EDUCACION	3	4,255,937.69	30	833
TOTAL	17	20,799,547.99	165	32,844

vi. Avance Físico por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2016	Mto. Ejecutado 2016	Empleos Generados 2016	Beneficiarios directos 2016
ATLANTIDA	5	8,189,018.57	55	6,976
CORTES	7	5,635,922.00	55	15,949
YORO	5	6,974,607.42	55	9,919
TOTAL	17	20,799,547.99	165	32,844

vii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2016
BIENES COMPRAS /CONSULTORIAS/ GASTO OPERATIVO	35,076,927.88
TOTAL	35,076,927.88

viii. Principales Logros

Procesos de Consultorías Individuales que concluyeron en el trimestre:

1. CPN-IDECOAS-FHIS-25-2016 Servicios de Consultoría Analista de información para los Observatorios Locales de los Municipios de la Ceiba, Choloma y El Progreso, Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192 - HN - Banco Mundial.
2. CPN-IDECOAS-FHIS-25-2016 Auditoría de los Estados Financieros del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN, ejecutado por el IDECOAS-FHIS y financiado por la Asociación Internacional de Fomento (AIF), durante el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, Código 106305.

Procesos de Consultorías que iniciaron:

1. PN-IDECOAS-FHIS-31-2016 2° proceso adaptación y traducción de material de la metodología basada en los principios de SASA, Modelo metodológico de prevención primaria para el abordaje de la violencia entre parejas e intrafamiliar basado en los principios de la metodología de SASA.

2. CPN-IDECOAS-FHIS-32-2016 2° proceso coordinador para la implementación de un modelo metodológico de prevención primaria para el abordaje de la violencia entre parejas e intrafamiliar en el Municipio del Progreso, Yoro.
3. CPN-IDECOAS-FHIS-33-2016 2° proceso dos (2) promotores comunitarios para la implementación de un modelo metodológico de prevención primaria para el abordaje de la violencia entre parejas e intrafamiliar en el Municipio del Progreso, Yoro.
4. CPN-IDECOAS-FHIS-30-2016 2° proceso oficial de monitoreo para la implementación de un modelo metodológico de prevención primaria para el abordaje de la violencia entre parejas e intrafamiliar en el Municipio del Progreso, Yoro.

Iniciativas/Subproyectos de Prevención Social

A nivel Comunitario: Se realizaron 10 reuniones de socialización con las comunidades, 22 capacitaciones a líderes, 2 talleres de resolución de conflictos para líderes y 2 talleres CEPREV para líderes, 3 ferias SAS, 3 concursos Barrios Limpios, 2 réplicas de taller de panadería. Con dichas actividades se llegó a un promedio de 1,399 personas a nivel comunitario.

A Nivel Centro Educativo: Se continuó con la implementación la metodología de Miles de Manos, se desarrollaron 6 encuentros en donde participaron 770 personas (3 encuentros familia, 2 encuentros docentes y 1 encuentro puente). 3 Foros Educativos con un promedio de 1,010 personas participantes, 2 Talleres de resolución de conflictos 54 participantes, 1 Taller CEPREV 38 participantes y 2 campañas de prevención en centros educativos en donde participaron 201 personas.

A Nivel Niñez y Juventud: Se desarrollaron 3 talleres CEPREV con una participación de 22 jóvenes, 7 encuentros deportivos con una participación de 179 jóvenes, 10 jornadas recreativas con 394 participantes, 8 cines comunitarios con 263 participantes, 19 círculos de lectura con 374 niños participantes, 12 capacitaciones con 165 participantes, 2 talleres de resolución de conflictos con 26 jóvenes, 1 festival de la canción con 120 personas.

A Nivel Familia: Se desarrollaron 4 Jornadas de Reproducción de Conocimiento de Resolución de Conflictos con 46 personas, 2 Talleres CEPREV en donde participaron 71 personas, 8 jornadas de madres guías y estimulación temprana de Estimulación temprana y talleres de resolución de conflictos y 10 sesiones de Familias Fuertes con 158 participantes.

PROCESOS DE COMPRAS DEL ULTIMO TRIMESTRE		
No. PROCESO	DESCRIPCION	MONTO
CMA-444-2016	COMPRA DE COMPUTADORA ING LAITANO	L. 24,092.50
CMA-411-2016	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DONACION IUDPAS	L. 11,727.25
CMA-394-2016	UTILES PARA EL CENSO DE DIME	L. 3,272.28
CMA-393-2016	COMPRA DE UTILIZ PARA LOS NIÑOS DE LOS BARRIOS DEL PROYECTO	L. 32,173.75
CMA-391-2016	COMPRA DE BOTES PLASTICOS PARA LIDERES DEL PROYECTO	L. 42,550.00
CMA-386-2016	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ALEMANIA DEL PROGRESO	L. 44,067.36
CMA-385-2016	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE MARIA FERRERO DEL PROGRESO	L. 3,267.60
CMA-384-2016	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DEL PROGRESO	L. 409,381.97
CMA-383-2016	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO EDUARDO HERNANDEZ CHEVEZ DEL PROGRESO	L. 669,707.96
CMA-382-2016	COMPRA DE VENTANAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO EDUARDO HERNANDEZ CHEVEZ DEL PROGRESO	L. 156,246.22
CMA-381-2016	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA ABRAHAM BUESO PINEDA DE CHOLOMA	L. 5,319.42
CMA-380-2016	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE CHOLOMA	L. 57,788.84
CMA-377-2016	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER GIS DEL IUDPAS	L. 34,955.40
CMA-364-2016	REVISION VEHICULO IUDPAS	L. 19,677.36
CMA-358-2016	SERVICIO DE ALIMENTACION PAR EL TALLER DEL PGET	L. 5,502.75
CMA-350-2016	REPRODUCCION DE MATERIALES PARA EL CENSO DE DIME	L. 175,525.08
CMA-332-2016	REVISION DEL VEHICULO 099	L. 8,668.96
CMA-231-A-2016	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LOS CENTROS DE ALCANCE	L. 153,283.39
CMA-231-B-2016	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LOS CENTROS DE ALCANCE	L. 174,822.05
CMA-321-2016	COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PARA LOS CENTROS DE ALCANCE	L. 611,828.75
CMA-320-2016	COMPRA DE MESAS DE FUTBOLITO PARA LOS CENTROS DE ALCANCE	L. 89,999.98
CMA-319-2016	COMPRA DE BANDERAS BORDADAS PARA LA ESCUELA REPUBLICA DE ALEMANIA EN EL PROGRESO	L. 20,010.00
CMA-318-2016	COMPRA DE GORRAS Y CHALECOS PARA LOS ENCUESTADORES DE DIME	L. 13,225.00
CMA-316-2016	COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	L. 89,847.20
CMA-315-2016	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO Y CAMISETAS	L. 239,926.80
CMA-314-2016	COMPRA DE ARTICULOS PROMOSIONALES PARA EL PROYECTO	L. 132,825.00
CMA-313-2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS BOTIQUINES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS	L. 38,300.36
CMA-286-2016	COMPRA DE EQUIPO PARA LA UNIDAD DE BIENES DEL FHIS	L. 6,095.00
CMA-278-2016	COMPRA DE COMPUTADORAS DE LOS ESPECIALISTAS DE LA UAP	L. 100,409.26
CMA-277-B-2016	COMPRA DE IMPRESORA PARA LA SEDS	L. 20,585.00
CMA-258-B-2016	COMPRA DE MAQUINA DE CORTAR CESPED PARA LOS CENTROS DE ALCANCE	L. 14,030.00
CMA-248-A-2016	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA ABRAHAM BUESO PINEDA DE CHOLOMA	L. 238,292.55
CMA-247-A-2016	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO EDUARDO HERNANDEZ CHEVEZ DEL PROGRESO	L. 206,485.01
CMA-246-2016	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE MARIA FERRERO DEL PROGRESO	L. 156,389.56
CMA-245-A-2016	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DEL PROGRESO	L. 118,450.33
CMA-244-2016	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ALEMANIA DEL PROGRESO	L. 39,368.14
CMA-243-2016	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE LA CEIBA	L. 583,647.70
CMA-242-2016	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA POLICARPO PAZ GARCIA DE LA CEIBA	L. 176,793.00
CMA-241-2016	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE CHOLOMA	L. 292,121.52
CMA-239-2016	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO UAP	L. 7,918.31
CMA-230-2016	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LOS CENTROS DE ALCANCE	L. 2,005.00
CMA-227-2016	COMPRA DE ESCANER PARA LA UPEG	L. 18,009.00
CMA-226-2016	COMPRA DE SWITCHES PARA SISTEMAS	L. 32,940.60
CMA-199-2016	COMPRA DE LLANTAS PARA EL BUS PIENSALO BIEN DE LA SEDS	L. 27,830.00
CMA-191-D-2016	COMPRA DE ACCES POINT PARA EL IUDPAS	L. 20,297.50
CMA-191-A-3-2016	COMPRA DE UNA LAPTOP PARA EL IUDPAS	L. 50,717.30
CMA-191-A-2-2016	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL IUDPAS	L. 453,507.00
CMA-191-A-1-2016	COMPRA DE UPS PARA EL IUDPAS	L. 59,885.94
CMA-184-2016	REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA UAP	L. 10,468.45
TOTAL		L. 5,904,239.40



- **Crédito Banco Mundial 5289-0 HN**

i. Objetivo

- a) Mejorar el acceso, la calidad y la sostenibilidad de los servicios de infraestructura (camino, agua, saneamiento y electricidad) para los habitantes pobres de las zonas rurales del territorio del Receptor.
- b) Desarrollar capacidades y crear en el ámbito del Receptor condiciones propicias para el suministro y la planificación de servicios de infraestructura impulsados a nivel local.
- c) Mejorar la capacidad del Receptor para responder con prontitud y eficacia ante una Emergencia Elegible.

ii. Focalización:

El Programa se ejecuta a través de seis mancomunidades localizadas en los siguientes departamentos y municipios:

- Choluteca (MAMBOCAURE): San Marcos de Colón, Orocuina, Apacilagua, El Corpus, Santa Ana de Yusguare, Concepción de María, Duyure, Liure y Morolica.
- Santa Bárbara (CRA): San Marcos, Concepción del Norte, Trinidad, San Luis, Chinda, Petoa.
- Copán (CHORTI): Nueva Arcadía, La Jigua, El Paraíso, San Antonio, Copán Ruinas, San Nicolás, San Jerónimo, Cabañas, Santa Rita y Florida.
- Olancho (MAMNO): Guata, La Unión, Mangulile, Jano, Yocón, El Rosario, Salamá, Guayape, Silca, Concordia, Campamento y Esquipulas del Norte
- La Paz (MAMCEPAZ): Santa María, San Pedro Tutule, San José, Marcala, Chinacla, Santiago de Puringla, Cane y La Paz.
- Ocotepeque (GUISAYOTE): Fraternidad, Sensenti, Dolores Merendón, La Labor y Lucerna
- Lempira (MANCOSOL): Tomalá, Tambla, Guarita, San Juan Guarita, Valladolid, Cololaca

iii. Tipología de Proyectos

- **Electrificación Rural:** Proyectos para habilitar o mejorar el acceso a electricidad.
- **Agua y Saneamiento:** Proyectos de rehabilitación, expansión y construcción de sistemas comunales de agua y saneamiento y facilidades en áreas rurales, de las mancomunidades previamente seleccionadas.

- **Caminos Rurales:** Proyectos de rehabilitación y mejoramiento de los caminos municipales eficientemente y utilizando métodos de empleo masivo de mano de obra aportando.

Monto del Convenio: El convenio suscrito el 12 de Julio del 2013 entre el Banco Mundial y el Gobierno de la Republica de Honduras, es de hasta un monto de Trece Millones Trescientos Mil Derechos Especiales de Giro (DEG. 13, 300,000.00), fondos destinados a financiar la ejecución del “Financiamiento Adicional al Proyecto de Infraestructura Rural”. Pero el 22 de septiembre del 2015 la sub secretaria de Inversión Publica notificó al Ministro Director de IDECOAS, mediante oficio DGIP-212-2015, la reestructuración de los fondos de financiamiento al Crédito IDA 5289-HN, que significó una disminución de 6.8 millones de Dólares, siendo el nuevo monto del convenio de SDR. 8, 459,281 equivalente a US\$ 13, 200,000.00, la fecha de cierre del proyecto se ha extendido al 30 de Junio del 2016.

iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2014	70,067,696.00	19,391,807.50	27.68%
2015	199,719,678.00	199,347,761.68	99.81%
2016	46,251,191.00	46,230,447.99	99.96%

v. Avance Físico por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2016	Mto. Ejecutado 2016	Empleos Generados 2016	Beneficiarios directos 2016
AGUA Y SANEAMIENTO	23	14,935,427.61	332	30,516
ELECTRIFICACION	20	9,233,380.58	75	9,456
INFRAESTRUCTURA VIAL	13	9,680,264.04	151	18,602
TOTAL	56	33,849,072.23	558	58,574

vi. Avance Físico por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2016	Mto. Ejecutado 2016	Empleos Generados 2016	Beneficiarios directos 2016
CHOLUTECA	7	1,522,519.47	15	5,324
COPAN	13	7,746,408.86	59	15,212
LA PAZ	11	3,467,284.18	121	7,142
LEMPIRA	11	1,802,401.23	101	7,654
OCOTEPEQUE	5	11,857,507.70	90	5,988
OLANCHO		626,784.91		
SANTA BARBARA	9	6,826,165.88	172	17,254
TOTAL	56	33,849,072.23	558	58,574

vii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2016
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS, COSTO OPERATIVO	12,381,375.76
TOTAL	12,381,375.76

viii. Modificaciones Presupuestarias

Durante el IV trimestre se solicitaron 3 modificaciones presupuestarias:

- Traslado presupuestario entre Convenios: Disminución del Convenio de Crédito 5289-HN en L. 3,019,459.00 y aumento al Convenio de Préstamo BCIE-1736 de L.3,019,459.00.
- Traslado interno entre objetos y actividades del gasto por L. 472,000.00 para el Convenio de Crédito 5289-HN.

Estas modificaciones no incrementaron ni disminuyeron el presupuesto vigente a nivel de Programa.

ix. Principales Logros

- En cuanto a la ejecución física, todos los Subproyectos financiados por el Crédito de Banco Mundial 5289-HN, fueron finalizados antes del 30 de junio de 2016, dando cumplimiento a la fecha límite de cierre físico y a la entrega de productos (conexiones y kilómetros) proporcionada por el Banco Mundial.
- En el sector de Caminos Rurales, en el año 2016 se construyeron 4.809 kilómetros de pavimento en el casco urbano de los municipios intervenidos, además de 36.79 kilómetros de caminos rurales rehabilitados, beneficiando así a 18,602 personas con acceso a servicios de infraestructura vial mejorados.
- En el sector de Agua y Saneamiento, en el año 2016, se logró conectar a 2,660 viviendas al sistema de agua potable, ya sea por Subproyectos de construcción, reconstrucción o ampliación de sistemas y 2,426 viviendas al sistema de alcantarillado sanitario; construidos y ampliados, beneficiando en total a 30,516 personas con acceso a servicios de agua potable y redes de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento.

- En el sector de Electrificación Rural, en el año 2016, se conectaron 1,576 viviendas al sistema eléctrico nacional por extensión de red, con un total de 9,456 personas beneficiadas con el servicio eléctrico.

x. Descentralización a las Mancomunidades Beneficiarias del PIR

Con fondos del Crédito No. 5289-HN, no se reportan transferencias a las Mancomunidades durante este período.

xi. Desembolsos del PIR

- Durante el IV trimestre, se presentó una solicitud de gastos con cargo a la Cuenta Designada No.13 por USD\$ 1,040,31.69.

xii. Problemática

- Debido a que los proyectos financiados con el Crédito 5289-HN finalizaron con fecha límite al 30 de junio de 2016, durante el III y IV trimestre se han llevado a cabo los respectivos procesos de cierre físicos y financieros de los proyectos, sin ninguna problemática que resaltar.

CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO



- **Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC)**

- i. **Antecedentes**

En fecha 28 de febrero de 2013 se firmó el Convenio de Financiamiento No Reembolsable de Inversión ATN/NV-13535-HO, Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC), el monto total del convenio es de US\$ 4, 535,382.00 financiado con recursos provenientes de la Cooperación Técnica No Reembolsable de los Fondos Nórdicos para el Desarrollo, administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Siendo US\$2,409,380.00 el monto asignado al componente I, para ejecución de Proyectos bajo la categoría de Soluciones de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (AMCC), para el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios cuyas inversiones elegibles correspondan al menú pre-establecido que consta en el Manual Operativo del Programa, incluyendo, sin limitarse a, muros de contención, protección de taludes pequeños sistemas de riego, vados, puentes colgantes y soluciones de energía renovable.

Las inversiones elegibles deben responder a dos criterios: i) efectividad de las intervenciones en Honduras, o en otros países; o ii) un resultado favorable en el análisis costo-beneficio ex-ante realizado para el proyecto respectivo.

El monto de US\$ 2,126,002.00 para el componente II Fortalecimiento del Capital Humano en Materia de Cambio Climático y Sistematización de Buenas Prácticas financiará: (i) la contratación de servicios de asistencia técnica para desarrollar e implementar talleres sobre AMCC para líderes pertenecientes a las comunidades beneficiarias del Programa; (ii) formación de jóvenes en el tercer ciclo de educación básica; y (iii) sistematización y difusión de buenas prácticas de los pueblos indígenas y Afrohondureños (PIAH) en AMCC.

El 11 de septiembre de 2015 se recibió notificación de parte del BID dirigida al Sr. Wilfredo Cerrato, Ministro de Finanzas, planteando asuntos referentes al Programa PIAHCC, entre los cuales se establece que: 1) Los fondos anteriormente establecidos para la ejecución del Programa PIAHCC, serán disminuidos a USD 1, 000,000.00 los cuales serán utilizados para la ejecución del componente uno del proyecto por medio del IDECOAS/FHIS y, 2) El BID administrara directamente el presupuesto restante

destinado para la Operación **ATN-13535-HO**, mediante la contratación directa de ONG's, afín de que ejecuten diversos proyectos.

El 22 de septiembre de 2015 se llevó a cabo una reunión entre el Gobierno de Honduras, El Fondo Nórdico y El Banco Interamericano de Desarrollo, para acordar las condiciones en que continuara la ejecución del Programa PIAHCC, y ratificar lo expuesto en notificación del BID de fecha 11 de septiembre de 2015. Es así como el Fondo Nórdico, como financista de la Donación, ha expresado su decisión que el Programa PIAHCC, continúe manejando solamente el Componente I del Programa, pero la asignación presupuestaria del mismo sería solamente de US\$ 1,000,000.00 que se oficiara con la emisión de la Carta Modificatoria N° 2 al convenio de donación.

El 28 de abril de 2015 el Gobierno de Honduras suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la Carta Modificación No. 1 al Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/NV-13535-HO, para realizar el cambio de Organismo Ejecutor de la operación específicamente el COMPONENTE II que iba a ser ejecutado por la SEDINAFROH - solicitado mediante comunicación No. DGCP-DEN-543/2014 de fecha 19 de septiembre de 2014 de la Secretaria de Finanzas, con lo cual el IDECOAS/FHIS pasa hacer el ejecutor de los dos COMPONENTES, el uso de los recursos según Carta la Carta Modificatoria I, estaba condicionado a que se cumplan a satisfacción del Banco, los siguientes requisitos:

- (a) Que se haya suscrito un convenio subsidiarios entre el Beneficiario, representados por la Secretaria de Estado de Finanzas, e IDECOAS/FHIS para la transferencia, en forma No Reembolsable de los recursos del Programa;
- (b) Que se haya modificado el Manual Operativo del Programa, el cual incluye un manual administrativo fiduciario y de control interno para que refleje la nueva estructura de ejecución del Programa;
- (c) Que se haya revisado y modificado el Manual PEC del Programa, el cual incluye la participación comunitaria, el estudio socioeconómico de la comunidad, la línea de base, la identificación de actores y un énfasis en proyectos únicamente de adaptación y mitigación de cambio climático;

- (d) Que se haya conformado la UCP con, al menos, el coordinador y el especialista administrativo/financiero.

En fecha 04 de febrero de 2016, el Gobierno de Honduras y el BID suscribieron la Carta Modificatoria N° 2 al convenio, dejando en firme un nuevo presupuesto de US\$1,000,000.00 para la ejecución del componente I.

ii. Objetivo General

El Programa tiene por objetivo aumentar la capacidad de adaptación y mitigación de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (PIAH) al Cambio Climático y reducir la vulnerabilidad ante los riesgos climáticos que afectan su bienestar y cultura, así como aprovechar cualquier oportunidad positiva que se presente en relación a la adaptación y mitigación al cambio climático.

iii. Descripción del Proyecto

El Componente I. Soluciones de adaptación y mitigación al cambio climático. Que financiará pequeños proyectos comunitarios, de adaptación y mitigación al cambio climático hasta US\$ 100.000.00 cada proyecto, e incluirá los costos de pre-inversión, inversión y capacitación en la gestión del proyecto. Las comunidades a ser beneficiadas serán seleccionadas de la lista de 32 municipios elegibles que consta en el Manual Operativo (En varios municipios se localizan más de dos pueblos haciendo que el total de municipios aumente de 32 a 35).

El Componente II. Fortalecimiento de capital humano en materia de cambio climático y sistematización de buenas prácticas: según los acuerdos a los que se llegó en reunión del 22 de septiembre de 2015, quedará limitado a implementar la iniciativa “súbete” de educación sobre cambio climático, consensuada ya con la Secretaría de Educación del Gobierno de Honduras para inclusión en la curricula nacional básica en comunidades PIAH.

Por lo anteriormente mencionado el **Proyecto PIAHCC** se limitara a la ejecución del componente I *Soluciones de adaptación y mitigación al cambio climático*. Por un monto de **UN MILLON DE DOLARES (US\$1,000.000.00)**

iv. Focalización

Los recursos para los proyectos de AMCC, se asignarán entre los pueblos más afectados o más vulnerables al cambio climático: Lenca y Maya Chortí, a ellos se les está asignando más o menos US\$

350,000.00, y para priorizar el resto de los recursos se analizará la factibilidad de los proyectos ya presentados al programa.

- i. **Estructura del Convenio:** a continuación se muestra el detalle de costos y financiamiento ajustado según Carta Modificatoria N°2 para el componente uno, su estructura es la siguiente:

CATEGORÍAS DE INVERSIÓN	BID	BID	BID	APOORTE LOCAL	TOTAL
	EJECUTADO FINANCIAMIENTO ORIGINAL	NUEVO FINANCIAMIENTO	TOTAL FINANCIAMIENTO		
Componente 1 Soluciones de AMCC	52,713.51	757,071.00	809,784.51	0.00	809,784.51
Sub componente 1.01 Propuesta	8,262.85	707,071.00	715,333.85	0.00	715,333.85
Sub componente 1.02 Acompañamiento Técnico	44,450.66	50,000.00	94,450.66	0.00	94,450.66
Gestión del Programa	158,039.54	202,812.00	360,851.54	0.00	360,851.54
Evaluación Externa y Auditoría	15,046.85	12,845.00	27,891.85	0.00	27,891.85
Imprevistos	0.00	27,272.00	27,272.00	0.00	27,272.00
Comisión de Administración	120,188.00	0.00	120,188.00	0.00	120,188.00
TOTAL	345,987.90	1,000,000.00	1,345,987.90	0.00	1,345,987.90

v. **Avance Financiero**

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2013	1,907,838.00	676,800.22	35%
2014	16,341,372.00	4,853,382.71	30%
2015	4,080,629.00	2,621,639.23	64%
2016	3,270,790.00	3,055,190.37	93%

vi. **Otras Inversiones**

OTRAS INVERSIONES	MONTO TOTAL EJECUTADO
ATN/NV-13535-HO BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	3,055,190.37
TOTAL GENERAL	3,055,190.37

vii. Principales Logros

Se formularon con éxito:

- Tres (3) perfiles de proyectos de Energía Renovable y Manejo de Recursos Naturales, tres (3) proyectos de Mejoramiento de Café bajo Sistemas Agroforestales y dos (2) proyectos de Cultivos Hortícolas con Sistemas de Riego por Goteo formulados, siguiendo los lineamientos del Manual Operativo y a las observaciones realizadas por personal de BID. Estos fueron aceptados por el Organismo Financiero, el cual dio su no objeción según CID/CHO/2203/2016, CID/CHO/2479/2016 y CID/CHO/2683/2016.
- Así mismo, se recibió No Objeción al documento base y llamado a licitación pública internacional N° LPI-IDECOAS-FHIS-01-2016 para Adquisición e Instalación de 236 Sistemas Solares Domiciliarios, al documento base y llamado a licitación pública internacional N° LPI-IDECOAS-FHIS-02-2016 para la Ejecución de tres proyectos de Mejoramiento de Café y, al documento base y llamado a licitación pública nacional para la Ejecución de dos proyectos de Cultivos Hortícolas.
- El 01 de diciembre de 2016 se lanzó la Licitación Pública Internacional N° LPI-IDECOAS-FHIS-02-2016 para la ejecución de los tres proyectos de Mejoramiento de Café bajo Sistemas Agroforestales y se efectuó visita en compañía de los oferentes para explicarles mejor el proyecto y atender sus consultas. Actualmente se está en periodo de recepción de ofertas.
- Se elaboraron el Plan de Ejecución del Programa (PEP), Plan de Adquisiciones (PAC) y el Plan Operativo Anual del Programa (POA) para los años 2017-2018 y se enviaron al BID para N.O. mediante el oficio N° MD-FHIS-580-2016.
- Se efectuó una disminución del presupuesto 2016, trasladando el monto no ejecutado L. 12,771,727.00 a otro programa USAID FHIS/EIP de la misma Institución; se efectuaron los ajustes entre objetos del gasto para adecuar el presupuesto 2017 del Programa PIAHCC al nuevo esquema de los proyectos reformulados y al nuevo método de contratación de los mismos.

Avance Técnico

Se coordinaron esfuerzos con equipo técnico asignado a los Centros de Facilitación Regional (CEFAR) descritos a PRONADERS, para realizar visitas de campo y levantar información de

base (ficha socioeconómica) para la formulación de los proyectos, así mismo, se recibió el apoyo de los técnicos de PRONADERS en las visitas para definir especificaciones técnicas y diseños de planos de los proyectos, y finalmente la priorización y socialización de los proyectos con los beneficiarios.

Se formó un equipo de trabajo entre los equipos técnicos del PIAHCC y Técnicos del Proyecto PIR ambos descritos al IDECOAS/FHIS para preparar los tres (3) proyectos de Sistemas Solares Domiciliarios, aprovechando la experiencia del PIR en esta tipología de Proyectos.

En lo referente a los permisos ambientales para la ejecución de los proyectos, se realizaron acercamientos con la Unidad de Gestión Ambiental del FHIS y con la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) de Mi Ambiente, para explicar y socializar los proyectos, con lo que se logró la exoneración del licenciamiento ambiental, ya que los mismos son para beneficio del ambiente y la comunidad.

A la fecha, se formularon y se obtuvieron las No Objeciones de los proyectos siguientes:

- ✓ Proyecto Energía Renovable y Manejo de Recursos Naturales de la Comunidad de Cofradía, Municipio de Yamaranguila, Departamento de Intibucá.
- ✓ Proyecto Energía Renovable y Manejo de Recursos Naturales de la Comunidad de Fátima, Municipio de Marcala, Departamento La Paz.
- ✓ Proyecto Energía Renovable y Manejo de Recursos Naturales de la Comunidad de Guascotoro, Municipio de Yamaranguila, Departamento de Intibucá.
- ✓ Mejoramiento de café bajo sistemas agroforestales en la Comunidad de San Francisco de Cone, Sensenti, Ocotepeque.
- ✓ Mejoramiento de café bajo sistemas agroforestales en la Comunidad de San Francisco, Copan Ruinas, Copan.
- ✓ Mejoramiento de café bajo sistemas agroforestales en la Comunidad de Atima, Atima, Santa Bárbara.
- ✓ Cultivos hortícolas con sistemas de riego por goteo, en las Comunidades del Pelón / Buenos Aires, Yamaranguila, Intibucá.
- ✓ Cultivos hortícolas con sistemas de riego por goteo en las Comunidades de Zacate blanco/ La puerta, Yamaranguila, Intibucá.

i. Problemática

Será necesario para el año 2017, una ejecución fluida ya que los tiempos son bastante ajustados para poder ejecutar los proyectos en el tiempo planificado y poder hacer el cierre del Programa en febrero de 2018.

El BID esta anuente a realizar el cambio en la fecha fin del componente 1 de la operación que es el que maneja IDECOAS/FHIS, sin embargo están en revisión de los documentos.

Debido a que en el año 2016, no se pudieron ejecutar los fondos que se solicitaron inicialmente para el presupuesto ya que los proyectos se reformularon a partir de agosto de 2016, y también considerando la extensión de tiempo del Programa, será necesario iniciar el trámite para una incorporación presupuestaria a más tardar en marzo-abril de 2017 ya que el presupuesto aprobado para ese año es de apenas L. 6,742,676.00.



- **Programa de Integración y Convivencia Urbana**

i. Objetivo

El objetivo general del Proyecto es contribuir a la integración y convivencia social en los barrios urbanos marginales del Distrito Central del Departamento de Francisco Morazán (Distrito Central).

ii. Objetivos específicos

- Mejorar el acceso de estos barrios a los servicios urbanos básicos;
- Aumentar las capacidades laborales, especialmente de los grupos en riesgo;
- Fortalecer el capital social de estas comunidades.

iii. Descripción

Para el logro de los objetivos descritos en la Sección I anterior, se apoyarán los siguientes componentes:

Componente 1. Mejora en la convivencia social

- Este componente busca apoyar acciones de capacitación y asistencia técnica destinadas a fortalecer las organizaciones comunitarias y apoyar a los grupos más vulnerables. Se busca desarrollar capacidades y valores individuales, familiares y comunitarios, dimensionados de acuerdo a las necesidades identificadas en cada barrio seleccionado de acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en el ROP. Para ello, se financiarán: (i) talleres de capacitación sobre valores, liderazgo, convivencia comunitaria, salud reproductiva y prevención de violencia bajo un enfoque de género; (ii) talleres y cursos de capacitación laboral para incrementar las posibilidades de inserción de jóvenes, y mujeres en el mercado de trabajo de acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en el ROP ; (iii) actividades recreativas para niños; (iv) el personal técnico que ejecuta los trabajos sociales; y (v) una consultoría para la sistematización de las intervenciones sociales.

Componente 2. Proyectos de integración urbana

- Este componente busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios urbanos entre los más pobres del Distrito Central, seleccionados de acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en el ROP. Previo a las intervenciones de cada barrio se preparará un

Plan Integral de Mejoramiento de Barrios (PIMB), el cual incluirá los correspondientes diseños urbanísticos, de ingeniería y la programación y presupuestos de los trabajos sociales. Este instrumento permitirá la adecuada programación de las inversiones y facilitará el dialogo con la comunidad sobre las actividades a desarrollar. Este componente financiará: (i) la contratación de consultorías para la preparación de los PIMBs; y (ii) las contrataciones para las inversiones en obras de infraestructura básica de agua y saneamiento, alumbrado público, vialidad, drenaje pluvial, plazas y parques, equipamientos sociales y otras necesidades detectadas en los PIMBs. De ser necesario, se promoverá la recuperación de centros educativos y centros de salud públicos, operados por las entidades estatales competentes.

- Los barrios beneficiarios del Proyecto han sido seleccionados en base a tres criterios básicos: (i) pobreza (medido por el Índice de Marginación publicado por la Secretaria de Desarrollo Social); (ii) densidad demográfica (favoreciendo los barrios de mayor densidad); y (iii) déficit de infraestructura de saneamiento (con posibilidad de conexión a la red de alcantarillado existente). Los criterios de elegibilidad y de priorización de los barrios se describen con más detalle en el ROP.

Gestión del Proyecto y Evaluación

- Se financiarán los gastos operativos de la ejecución del Proyecto y su evaluación, además de estudios específicos. Las actividades específicas que serán financiadas incluyen: (i) los gastos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP); (ii) los materiales y equipos requeridos para la ejecución; (iii) el personal técnico que apoya, en campo, el monitoreo de los trabajos sociales, a cargo de los Enlaces Técnicos Comunitarios (ETEC); (iv) la estrategia de comunicación del Proyecto; (v) las consultorías de evaluación intermedia y final, además de la consultoría de impacto del Proyecto; y (vi) la auditoría financiera.

iv. Costo del Proyecto y plan de financiamiento

- El costo estimado del Proyecto es el equivalente de diecisiete millones doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$17.200.000), que serán financiados por el Banco de la siguiente forma: doce millones cuarenta mil dólares (US\$12.040.000) con cargo a los recursos del Capital Ordinario (CO) y cinco millones ciento sesenta mil dólares (US\$5.160.000) con cargo a los recursos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE). El presupuesto consolidado

por componente se muestra en el siguiente cuadro, el cual presenta la distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento. Los costos del Proyecto incluyen los impuestos, tasas y derechos arancelarios aplicables a las adquisiciones y contrataciones del Proyecto, según la legislación nacional. Los intereses podrán ser financiados con recursos del Financiamiento.

La fecha de cierre del proyecto es el 17 de Junio del 2017.

v. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2013	4,922,920.00	2,773,999.51	56.35%
2014	136,221,739.00	112,190,571.97	82.36%
2015	120,882,736.00	106,545,487.78	88.14%
2016	118,504,457.00	113,622,321.26	95.88%

vi. Avance Físico por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2016	Mto. Ejecutado 2016	Empleos Generados 2016	Beneficiarios directos 2016
AGUA Y SANEAMIENTO	9	23,617,835.46	201	14,015
EMPRENDIMIENTO Y VALORES	27	3,585,400.87	15	14,944
INFRAESTRUCTURA VIAL	10	60,415,140.49	528	19,854
EDUCACION		3,106,476.55		10,171
TOTAL	46	90,724,853.37	744	19,854

vii. Avance Físico por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2016	Mto. Ejecutado 2016	Empleos Generados 2016	Beneficiarios directos 2016
FRANCISCO MORAZAN	46	90,724,853.37	744	19,854
TOTAL	46	90,724,853.37	744	19,854

viii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2016
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	22,897,467.89
TOTAL	22,897,467.89

ix. Principales Logros

Avances Programa		
Componente 1: Mejora en la convivencia social y comunitaria		
1.0	Talleres de capacitación laboral	
1.1	<i>Capacitaciones en Emprendimiento</i>	Se impartieron 11 módulos de capacitación sobre emprendimiento en la elaboración de alimentos: Wantan y salsa agridulce, Sándwich Cubano, bolitas de queso, tostones de plátano, torta básica, pasta fría 1, pasta fría 2, bisutería en pasta fría, elaboración de piñatas, químicos 1, creación de micro empresas ; con una participación de 1,200 personas.
2.0	Capacitaciones sobre valores, liderazgo, convivencia comunitaria y prevención de violencia	
1.1	<i>Capacitaciones en Valores</i>	Se impartieron 11 módulos de capacitación sobre: Liderazgo comunitario, limpieza del entorno, planes de monitoreo, reforestación, buen trato familiar, medidas ante un desastre natural, cambio climático y efecto de invernadero, buen trato a los hijos, educación sexual, salud física y mental, conviviendo en comunidad; con una participación de aproximadamente 6,600 personas.
1.2	<i>Programa Deportivo y de Valores</i>	Se ha ejecutado el Programa de Deportes y Valores en las disciplinas de: Taekwondo, Tenis de Mesa, Atletismo, Balonmano y Levantamiento de pesas, con una participación de 1,200 niños y jóvenes de las colonias beneficiarias.
3.0	Convivencias Integración y Eventos Recreativos	
3.1	<i>Taller de Convivencia</i>	Se realizaron 3 talleres de convivencia: Participaron 286 líderes comunitarios de las colonias ubicadas en la zona 1 y zona 2, donde los principales objetivos fueron: Compromisos comunitarios para el pago de la contrapartida comunitaria; cuidado de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial y la socialización para la implementación del Programa Deportivo y de Valores y sostenibilidad de la intervención realizada por el programa.
Componente 2: Proyecto de Integración urbana		
1.0	Proyecto de Integración Urbana Zona 1, Lote 1 (San Juan del norte 1 y 2, Buenas Nuevas) 688 Viviendas	
.1	<i>Ejecución de obras, que incluye la construcción de los siguientes sistemas: Alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y mitigación de riesgos.</i>	100% de Avance Físico.

2.0	Proyecto de Integración Urbana Zona 1, Lote 2 (Brisas de la Laguna, Las Pavas, Alemania) 725 Viviendas	
.1	<i>Ejecución de obras, que incluye la construcción de los siguientes sistemas: Alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y mitigación de riesgos.</i>	100% de Avance Físico.
3.0	Proyecto de Integración urbana en Zona 2 (Colonias David Betancourt, Arcieri, Ramón Amaya Amador y Montes de Bendición)	
.1	<i>Ejecución de obras, que incluye la construcción de los siguientes sistemas: Alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y mitigación de riesgos.</i>	100% de Avance Físico.
4.0	Proyecto de Integración urbana Obras Complementarias Colonia Villa Cristina	
.1	<i>Ejecución de obras, que incluye la construcción de las siguientes obras: Pavimentación de calle y construcción de canal de drenaje pluvial.</i>	100% de Avance Físico.
5.0	Proyecto de Integración Urbana Obras Complementarias: Construcción Salón de Usos Múltiples colonia Alemania, Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico colonia Brasilia, Reparación de Cancha para Usos Múltiples colonia Buenas Nuevas y Canalización de Quebrada colonia Las Pavas y Amates.	
.1	<i>Este proyecto iniciará su ejecución en enero del año 2017, para el mes de diciembre se realizó el pago por concepto de anticipo.</i>	0% de Avance Físico
	"Proyecto de Integración Urbana Equipamiento Social: Construcción de Centro Comunal Colonia Arcieri, Construcción de Centro Comunal Colonia David Betancourth, Construcción de Centro Comunal Colonia Montes de Bendición, Reparación de Campo de Fútbol Colonia Ramón Amaya Amador.	
.1	<i>Este proyecto iniciará su ejecución en enero del año 2017, para el mes de diciembre se realizó el pago por concepto de anticipo.</i>	0% de Avance Físico
6.0	Supervisión Proyecto de Integración Urbana Zona 1, Lote 1 (San Juan del norte 1 y 2, Buenas Nuevas) 688 Viviendas	
.1	<i>Ejecución de la consultoría</i>	<i>La firma supervisó la ejecución de las obras y a la fecha entregó el informe final de la consultoría.</i>
7.0	Supervisión Proyecto de Integración Urbana Zona 1, Lote 2 (Brisas de la Laguna, Las Pavas, Alemania) 725 Viviendas	
.1	<i>Ejecución de la consultoría</i>	<i>La firma supervisó la ejecución de las obras y a la fecha entregó el informe final de la consultoría.</i>
8.0	Supervisión Proyecto de Integración urbana en Zona 2 (Colonias David Betancourt, Arcieri 1 y 2, Ramón Amaya Amador y Montes de Bendición)	
.1	<i>Ejecución de la consultoría</i>	<i>La firma supervisó la ejecución de las obras y a la fecha entregó el informe final de la consultoría.</i>
9.0	Supervisión del Proyecto de Integración urbana Obras Complementarias Colonia Villa Cristina	
.1	<i>Ejecución de la consultoría</i>	<i>La firma supervisó la ejecución de las obras y a la fecha entregó el informe final de la consultoría.</i>
10.0	Supervisión Proyecto de Integración Urbana Obras Complementarias: Construcción Salón de Usos Múltiples colonia Alemania, Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico colonia Brasilia,	

	Reparación de Cancha para Usos Múltiples colonia Buenas Nuevas y Canalización de Quebrada colonia Las Pavas y Amates.	
.1	<i>Ejecución de la consultoría</i>	<i>Al último trimestre se realizó la contratación de la supervisión para iniciar labores en el mes de enero</i>
11.0	Supervisión del Proyecto Integración Urbana Equipamiento Social: Construcción de Centro Comunal Colonia Arcieri, Construcción de Centro Comunal Colonia David Betancourth, Construcción de Centro Comunal Colonia Montes de Bendición, Reparación de Campo de Fútbol Colonia Ramón Amaya Amador.	
.1	<i>Ejecución de la consultoría</i>	<i>Al último trimestre se realizó la contratación de la supervisión para iniciar labores en el mes de enero</i>

x. Problemática:

- A iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo e IDECOAS FHIS; en virtud del impacto positivo que ha tenido la institución y el programa, se solicitó la priorización de una segunda fase del Programa, la cual SEFIN notificó que para el año 2017 el país ya no tiene capacidad de endeudamiento.
- Se tiene una participación comunitaria con impactos positivos en la ejecución del Programa de Deportes y Valores, pero para el mes de junio del año 2017 no se cuentan con los fondos para la continuidad del Programa de Deportes y Valores.

xi. Conclusiones y Recomendaciones:

El contrato de préstamo finaliza el 17 de julio del año 2017, sin embargo se tienen actividades programadas para finalizar en el primer semestre del año 2017, que incluyen en el Componente 1 El Programa deportivo con niños para la enseñanza de valores a través del deporte. En el Componente 2 se considera el diseño de obras de infraestructura para equipamiento social, mejoras en el sistema de alumbrado público y obras de mitigación.

CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA



- **Proyecto de Infraestructura Rural BCIE**

i. Objetivo General

Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local. Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son de L. 283 millones aproximadamente.

ii. Focalización:

- En base a la metodología de selección de la mancomunidades ejecutado por PIR, que toma en consideración el índice de desarrollo humano, la capacidad de gerenciamiento de la Unidades técnicas Municipales en cada mancomunidad y no más de una mancomunidad por departamento, fueron seleccionadas las mancomunidades de los departamentos de Lempira (CAFEG), Intibucá (AMFI) y Francisco Morazán (MANOFM).

iii. Tipología de Proyectos

- Electrificación Rural: proyectos para habilitar o mejorar el acceso a electricidad teniendo los beneficiarios que aportar el 15% del monto total del proyecto.
- Agua y Saneamiento: proyectos de rehabilitación, expansión y construcción de sistemas comunales de agua y saneamiento y facilidades en áreas rurales, de las mancomunidades previamente seleccionadas.
- Caminos Rurales: proyectos de rehabilitación y mejoramiento de los caminos municipales eficientemente y utilizando métodos de empleo masivo de mano de obra aportando las comunidades beneficiadas el 15% del total del proyecto.

Monto del Convenio: L.285.0 Millones de Lempiras aproximadamente, según convenio de préstamo el tiempo de ejecución del proyecto es de 60 meses.

iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2011	37,790,000.00	0.00	0.00%
2012	6,393,674.00	0.00	0.00%
2013	33,774,273.00	33,771,086.72	99.99%
2014	42,465,271.00	32,714,051.57	77.04%
2015	32,683,893.00	32,295,225.85	98.81%
2016	95,056,511.00	93,906,331.81	98.79%

v. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2016	Mto. Ejecutado 2016	Empleos Generados 2016	Beneficiarios directos 2016
AGUA Y SANEAMIENTO	2	41,300,403.08	34	2,268
ELECTRIFICACION	10	17,328,145.88	210	4,254
INFRAESTRUCTURA VIAL	0	27,256,458.42	0	0
TOTAL	12	85,885,007.38	244	6,522

vi. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2016	Mto. Ejecutado 2016	Empleos Generados 2016	Beneficiarios directos 2016
FRANCISCO MORAZAN	2	16,757,045.11	27	1,728
INTIBUCÁ	5	40,708,829.77	149	2,628
LEMPIRA	5	28,419,132.50	68	2,166
TOTAL	12	85,885,007.38	244	6,522

vii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	EJECUTADO
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS, COSTO OPERATIVO	8,021,324.43
TOTAL	8,021,324.43

viii. Principales Logros

- En el sector de Agua y Saneamiento, actualmente se encuentran en ejecución 6 subproyectos, 2 subproyectos de construcción de sistemas de agua potable en las aldeas de Jiquinlaca, en Concepción, Intibucá (con un 60% de avance físico a la fecha), y en la Aldea Quebrada Honda en el Municipio de Marale, Francisco Morazán; 2 subproyectos de construcción de sistemas de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento en los municipios de San Andrés y Santa Cruz, departamento de Lempira y 2 subproyectos de

Agua Potable y Captación Pluvial en Piraera, Lempira y en Santa Lucía, Intibucá. Todos los subproyectos anteriormente mencionados recientemente iniciaron su ejecución.

- En el sector de Caminos Rurales, se encuentran en ejecución un subproyecto de pavimentación del Casco Urbano del Municipio de Marale, ubicado en el departamento de Francisco Morazán, que a la fecha, se reporta un 70% de avance de obra. En rehabilitación de caminos 3 subproyectos en los municipios de Cantarranas y Guaimaca iniciaron ejecución en los últimos días del mes de noviembre, mientras que 2 subproyectos ubicados en Camasca, Intibucá iniciaron obras el 15 de diciembre del presente.
- En el sector de Electrificación Rural por extensión de red, se encuentran en ejecución el subproyecto ubicado en la comunidad Guachipilin en el municipio de Vallecillo, Francisco Morazán (35% de avance). Durante el IV trimestre se finalizaron cuatro subproyectos conectando a 397 viviendas a la red con los cuales se beneficiaron 2,382 pobladores en las comunidades de Guatemalita, Los Reimundos y Santa Rosita, en Gualcince; comunidad de RorrUCA municipio de San Francisco y en la comunidad El Joril en Piraera, en el departamento de Lempira; además del subproyecto ubicado en las comunidades Llano de Balas, El Naranja, Cedros, en el municipio de San Marcos de la Sierra, Intibucá.
- Al 31 de diciembre del año 2016, se suscribieron/adjudicaron veintiséis (26) procesos de obras de infraestructura, siete (7) correspondiente al sector de Agua y Saneamiento, diez (10) del sector de Caminos Rurales y nueve (9) del sector de Electrificación Rural por Extensión de Red, por un monto de 106.85 Millones de Lempiras, de los cuales 100.80 Millones de Lempiras, serán financiados con fondos del Préstamo:

No.	Nombre del Proyecto	Código	Adjudicatario	Monto Aporte FHIS	Monto Total del Contrato
1	Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Aldea Jiquinlaca, Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá(SEGUNDO PROCESO)	102576	POMAR S. de R.L. de C.V.	L. 6,434,824.44	L. 6,434,824.44
2	Proyecto de Electrificación Rural de las Comunidades de Callejones y Piedra Parada, Colomoncagua, Intibucá.	104764	ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 3,544,232.28	L. 4,169,685.04
3	Proyecto de Electrificación Rural de las Comunidades de Las Isleta, Llanitos, La Montaña, La Cumbre, Municipio de Santa Lucia, Departamento de Intibucá.	103422	ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 1,240,878.66	L. 1,459,857.25

4	Proyecto de Electrificación Rural de las Comunidades de Llano de Balas, El Naranjo, Cedros, Municipio de San Marcos de la Sierra, Departamento de Intibucá.	103419	ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 3,075,330.05	L. 3,618,035.35
5	Proyecto de Electrificación por extensión de red en Coquin, San Andrés, Lempira	103414	ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 842,150.26	L. 990,765.01
6	Proyecto de Electrificación Rural por Extensión de Red de las Comunidades de Guatemala, Los Reimundos y Santa Rosita	105372	DISEÑOS ELÉCTRICOS COMERCIALES	L. 2,634,819.24	L. 3,099,787.34
7	Proyecto de Electrificación por extensión de red en Rorrucá, San Francisco, Lempira	102430	ELECTRIFICADORA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	L. 3,690,893.87	L. 4,342,228.08
8	Construcción de Pavimento en el Casco Urbano de Marale	105612	INGENIERÍA DE CAMINOS (IDECA)	L. 1,723,429.86	L. 1,723,429.86
9	Proyecto de Electrificación por extensión de red Rodeo de Pacayas, Marale, Francisco Morazán	101642	DISEÑOS ELÉCTRICOS COMERCIALES (DISEC)	L. 640,827.33	L. 753,914.51
10	Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento / Captación Pluvial, San Pedrito, Managua y Guasquin, Piraera, Lempira	106011	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS S.A. DE C.V.	L. 2,303,901.33	L. 2,303,901.33
11	Construcción de Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Quebrada Honda, en el Municipio de Marale, Francisco Morazán	105736	CONSTRUCTORA LEMPIRA S. DE R.L.	L. 1,509,011.20	L. 1,509,011.20
12	Rehabilitación de Caminos Rurales Calle San Ignacio, Municipio de Camasca, Departamento de Intibucá	105593	INGENIERÍA DE CAMINOS, S. DE R.L.	L. 4,199,180.07	L. 4,420,189.55
13	Rehabilitación de Caminos Rurales El Barreal - El Portillo La Montaña	105596	INGENIERÍA DE CAMINOS, S. DE R.L.	L. 3,455,794.64	L. 3,637,868.04
14	Proyecto de Electrificación por extensión de red en El Joril, Piraera, Lempira	105839	ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 1,612,191.17	L. 1,896,695.49
15	Proyecto de Electrificación por extensión de red en Guachipilin, Vallecillo, Francisco Morazán	101564	ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 1,490,314.19	L. 1,753,310.81
16	Construcción de sistema de agua potable y saneamiento / captación pluvial, Santa Rita, Santa Lucía, Intibucá	105859	POMAR S. de R.L. de C.V.	L. 2,007,644.87	L. 2,007,644.87
17	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Andrés, Lempira	103116	INGENIERÍA DE CAMINOS S. DE R.L.	L. 5,258,967.04	L. 5,258,967.04

18	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Santa Cruz, Lempira (Segundo Proceso)	105113	INGENIERÍA DE CAMINOS S. DE R.L.	L. 6,183,783.49	L. 6,183,783.49
19	Rehabilitación de Caminos Rurales Santa Lucía - Castaño, Municipio de Santa Lucía, Departamento de Intibucá.	105595	CONSTRUCTORA SUALEMAN	L. 7,973,300.65	L. 8,392,948.05
20	Rehabilitación de Caminos Rurales La Esperanza - El Guayabo	105606	CONSTRUCTORA SUALEMAN	L. 7,267,760.21	L. 7,650,273.90
21	Rehabilitación de Caminos Rurales El Roble-Susuma	105605	INGENIERÍA DE CAMINOS S. DE R.L.	L. 9,075,376.17	L. 9,553,027.55
22	Rehabilitación de Caminos Rurales Tramos: Aldea Sicaguara - El Bosque; Rehabilitación de Caminos Rurales Aldea Sicaguara - Pacayas	105607 y 105608	INGENIERÍA DE CAMINOS S. DE R.L./CONSTRUCTORA MI CASA S. DE R.L.	L. 4,087,931.71	L. 4,303,086.01
23	Rehabilitación de Caminos Rurales Calona-Maraquito-Aguacatillo-Zarzal-Rio Abajo-Cerro Grande-San Marcos	105609	CONSTRUCTORA MI CASA S. DE R.L.	L. 2,585,156.76	L. 2,721,217.64
24	Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento Aldeas San José y La Alondra, Municipio de Gualcinse, Departamento de Lempira	104511	Diseño, Construcción y Servicios Técnicos, S.A. de C.V.	L. 4,723,254.51	L. 4,723,254.51
25	Rehabilitación de Caminos Rurales Calle San Lucas, Municipio de Camasca, Departamento de Intibucá	105591	INGENIERÍA DE CAMINOS (IDECA)	L. 5,295,023.44	L. 5,573,708.88
26	Rehabilitación de Caminos Rurales Tramo No.1-La Hacienda - La Queserita; Tramo No.2: San Juan - San Jose, Municipio de San Antonio, Departamento de Intibucá	105598-105599	CONSTRUCTORA SUALEMAN/CONSTRUCCIONES CERRATO S.A.	L. 7,948,011.90	L. 8,366,328.32
TOTAL				L. 100,803,989.34	L. 106,847,743.56

- De igual manera, se encuentran en proceso de contratación, cinco (05) sub proyectos, por un monto total de L. 38.56 millones, de los cuales L. 37.59 millones serán financiados con fondos del préstamo; dos (2) de estos sub proyectos corresponden al sector de Agua Potable y Saneamiento y tres (03) al sector de Caminos Rurales.
- Se encuentran pendientes de publicación por diversas causas dos (2) sub proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento, por un monto total de L. 10.69 millones, a ser financiado con fondos del préstamo.

ix. Descentralización a las Mancomunidades Beneficiarias del PIR

Con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE Préstamo No. 1736, se han transferido a las Mancomunidades beneficiadas a la fecha la cantidad de L.2.58 millones. No se registra mucha actividad en las transferencias, ya que en SIAFI los montos se encuentran a nivel de firmado pero no pagado y se dispondrá de los mismos cuando ingresen los fondos de la tercera restitución del Fondo Rotatorio. En el siguiente cuadro se muestra los fondos transferidos durante el IV trimestre del 2016 a las mancomunidades beneficiarias del Proyecto para la ejecución de los Subproyectos:

**TRANSFERENCIAS PARA EJECUCIÓN DE SUBPROYECTOS DESCENTRALIZADOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
01 OCTUBRE AL 08 DICIEMBRE 2016**

MANCOMUNIDAD	AGUA Y SANEAMIENTO	ELECTRIFICACIÓN RURAL	CAMINOS RURALES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	TOTAL LEMPIRAS
AMFI	-	-	-	-	-
CAFEG	-	-	-	-	-
MANOFM	-	-	2,585,156.76	-	2,585,156.76
Total	-	-	2,585,156.76	-	2,585,156.76

x. Desembolsos del PIR

Durante el periodo se envió la reposición del Fondo Rotatorio, mismo que se encuentra en proceso de revisión. Con fecha 13 de diciembre 2016, se recibió el monto de USD\$ 2,134,808.77, correspondiente a la Tercera Restitución del Fondo Rotatorio.

xi. Problemática

Durante el IV trimestre, todos los procesos de licitación y contratación de proyectos y consultorías se ha realizado con normalidad, así como en la ejecución financiera y física.

CARTERA KfW Entwicklungsbank

- **Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local**
SE-FHIS KFW VIII (PROMINE) FASE I, II y III

- **PROMINE FASE I**



i. Objetivo General

Fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la SE y la gestión local participativa así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico).

ii. Focalización

Este Programa se ubica en los departamentos de Lempira, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Intibucá, La Paz.

Nota: La selección de los municipios de estos departamentos se realizarán en base al análisis de la contratación de consultoría solicitada por el KfW quien juntamente con la Secretaría de Educación emitirán una resolución de las escuelas seleccionadas.

iii. Descripción del Proyecto

El programa se enmarca en el área de educación básica con un componente de infraestructura que complementa al Plan EFA-ETI (Education for All/Fast Track Initiative) y contribuye a las metas del milenio en Educación en la República de Honduras. El programa presenta la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado por el Programa FHIS-KFW VI-VII, con un enfoque temático: se financiará infraestructura educativa en estrecha articulación con el sector. La ejecución del programa será responsabilidad de la SE como ente rector y del FHIS como ente ejecutor. Los recursos del programa se utilizarán principalmente para financiar la construcción, ampliación y/o mejoramiento de los Centros Educativos (CE) así como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizarán mediante la modalidad descentralizada con énfasis en la ejecución comunitaria (PEC, Proyectos Ejecutados por la Comunidad).

El programa trabajará y fortalecerá el concepto de Redes Educativas (RE) como modelo de gestión, enmarcándose en esa política financiando – en la manera de lo posible- las necesidades de inversión

alrededor de las RE existentes en los departamentos a intervenir, lo que se espera la disponibilidad de redes educativas mejoradas de punto de vista funcional.


Monto del Proyecto: Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son Euros 18,500,000.00. El tipo de financiamiento es una donación.

Fecha de Firma de convenio: 25/06/2009

Fecha de Finalización de convenio: Abril 2014 según acuerdo separado. Se solicitó no objeción a la ampliación de cierre hasta junio del 2016.

iv. Avance físico de las obras

A continuación se presenta un detalle del estatus de los proyectos para fase I:

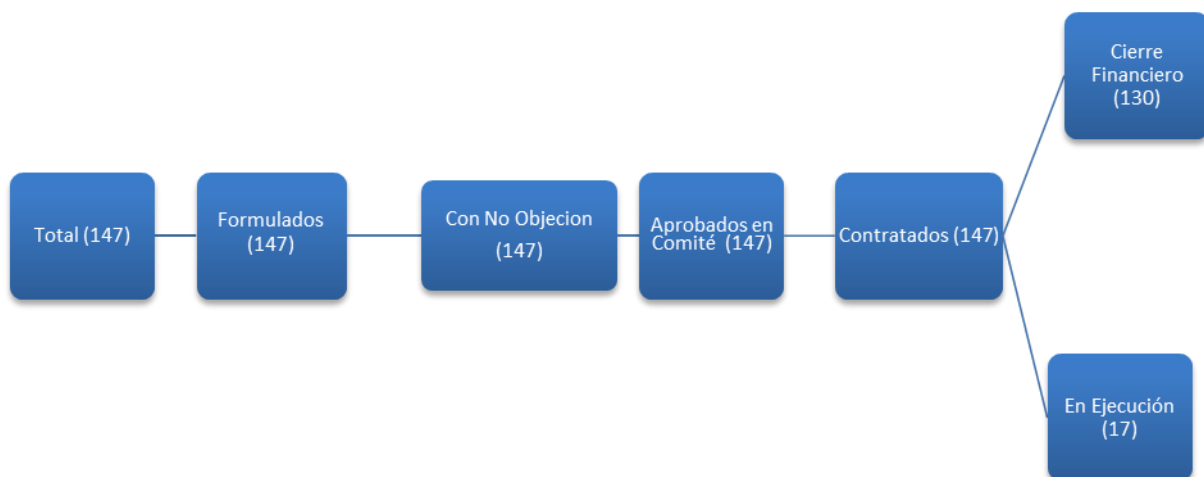

El PROMINE fase I, contempla 131 proyectos de infraestructura y equipamiento y 16 proyectos de equipamiento para complementar el suministro de equipamiento en las redes educativas, para un total de 147 proyectos.

El 88.43 % de los proyectos se encuentran en cierre financiero y otro 11.56% se encuentran en plena ejecución.

Considerando que el cierre del PROMINE fase I estaba previsto para el 30 de junio del 2016 y que existen montos comprometidos y proyectos en ejecución, en fecha 03 de agosto 2016 se otorgó la No

Objeción del KfW para que los remantes del PROMINE fase I y II puedan ser empleados en el marco de la ejecución de la fase III del Programa.

- **PROMINE FASE II**

- i. Objetivo General**

Fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la SE y la gestión local participativa así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico).

- ii. Focalización**

Este Programa se ubica en los departamentos de Lempira, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Intibucá, La Paz.

Nota: La selección de los municipios de estos departamentos se realizarán en base al análisis de la contratación de consultoría solicitada por el KfW quien juntamente con la Secretaría de Educación emitirán una resolución de las escuelas seleccionadas.

- iii. Descripción del Proyecto**

El programa es continuación del Programa de Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local SE/FHIS VIII y se enmarca en el área de educación básica con un componente de infraestructura que complementa al Plan EFA-ETI (Education for All/Fast Track Initiative) y contribuye a las metas del milenio en Educación en la República de Honduras. El programa presenta la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado por el Programa FHIS-KfW VI-VII, con un enfoque temático: se financiará infraestructura educativa en estrecha articulación con el sector. La ejecución del programa será responsabilidad de la SE como ente rector y del FHIS como ente ejecutor. Los recursos del programa se utilizarán principalmente para financiar la construcción, ampliación y/o mejoramiento de los Centros Educativos (CE) así como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizarán mediante la modalidad descentralizada con énfasis en la ejecución comunitaria (PEC, Proyectos Ejecutados por la Comunidad).

El programa trabajará y fortalecerá el concepto de Redes Educativas (RE) como modelo de gestión, enmarcándose en esa política financiando – en la manera de lo posible- las necesidades de inversión alrededor de las RE existentes en los departamentos a intervenir, lo que se espera la disponibilidad de redes educativas mejoradas de punto de vista funcional.

Monto del Proyecto: Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son Euros 6, 157,000.00. El tipo de financiamiento es un contrato de Préstamo.

Fecha de Firma de convenio: 19/12/2012

Fecha de Finalización de convenio: Junio 2016

iv. Avance físico de las obras



El PROMINE fase II, contempla 40 proyectos de infraestructura y equipamiento y 3 proyectos de equipamiento para complementar el suministro de equipamiento en las redes educativas, para un total de 43 proyectos.

El 83.72 % de los proyectos se encuentran en cierre financiero, 9.32 % en fase de cierre físico (avance físico entre 90 - 100%) y otro 6.97% se encuentran en plena ejecución.

Considerando que el cierre del PROMINE fase II estaba previsto para el 30 de junio del 2016 y que existen montos comprometidos, proyectos en ejecución y montos pendientes comprometer, en fecha 03 de agosto 2016 se otorgó la No Objeción del KfW para que los remantes del PROMINE fase I y II puedan ser empleados en el marco de la ejecución de la fase III del Programa.

- **PROMINE FASE III**

- i. Objetivo General**

Fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la SE y la gestión local participativa así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico).

- ii. Focalización**

El área de intervención del Programa comprende principalmente los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara. El Programa PROEFA de la GIZ apoya actualmente al sector educativo en Honduras. Al igual que en las fases I y II del Programa se buscará la coordinación con el Programa PROEFA de la GIZ o en su debido caso con el Programa que le siga, siempre y cuando existan medidas complementarias entre ambos programas.

- iii. Descripción del Proyecto**

El Programa comprende la tercera fase del Programa PROMINE que se enmarca en el área de educación básica con un componente de infraestructura que complementa al Plan EfA-FTI (Education for All / Fast Track Initiative) y contribuye al logro de las Metas del Milenio en Educación en la República de Honduras y por lo tanto en general se rige por los acuerdos ya definidos para la ejecución de la primera y segunda fase. Se financiará infraestructura educativa en estrecha articulación con el Sector. La ejecución del Programa será responsabilidad de la Secretaría de Educación (SE) como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) como ente ejecutor. Los recursos del Programa se utilizarán principalmente para financiar la construcción, ampliación y/o el mejoramiento de los Centros Educativos (CE) así como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizarán mediante la modalidad descentralizada con énfasis en la ejecución comunitaria (Proyectos Ejecutados por la Comunidad – PEC-FHIS) empleada con éxito en el programa FHIS VI y VII, aplicada de forma general en todos los proyectos, indistinto de su monto financiero, excepto los altamente complejos.

Monto del Proyecto: Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son EUR 11, 945,000.00. El tipo de financiamiento es un contrato de Préstamo.

Fecha de Firma de convenio: 30/12/2013

Fecha de Finalización de convenio: 31/03/2017

iv. Avance Financiero PROMINE FASE I, II y III

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2016	145,687,475.00	142,916,817.45	98.10%

v. Avance Físico por Sector PROMINE FASE I, II y III

Sector	Proyectos Finalizados 2016	Mto. Ejecutado 2016	Empleos Generados 2016	Beneficiarios Directos 2016
EDUCACION	14	125,549,897.49	353	1,188
TOTAL	14	125,549,897.49	353	1,188

*Nota: Datos SIAFI y Sistema FHIS

vi. Avance Físico por Departamento PROMINE FASE I, II y III


Departamento	Proyectos Finalizados 2016	Mto. Ejecutado 2016	Empleos Generados 2016	Beneficiarios Directos 2016
COPAN	1	13,071,783.15	14	55
INTIBUCA	5	25,591,030.48	139	535
FRANCISCO MORAZAN	0	17,800.00	0	0
LA PAZ	2	34,165,310.74	57	175
LEMPIRA	1	24,567,859.17	22	73
SANTA BARBARA	5	20,139,092.09	121	350
OCOTEPEQUE	0	7,997,021.86	0	0
TOTAL	14	125,549,897.49	353	1,188

*Nota: Datos aproximados generados por el Sistema IDECOAS-FHIS

vii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2016
BIENES COMPRAS/CONSULTORIAS/ GASTO OPERATIVO	17,366,919.96
TOTAL	17,366,919.96

viii. Avance físico de las obras

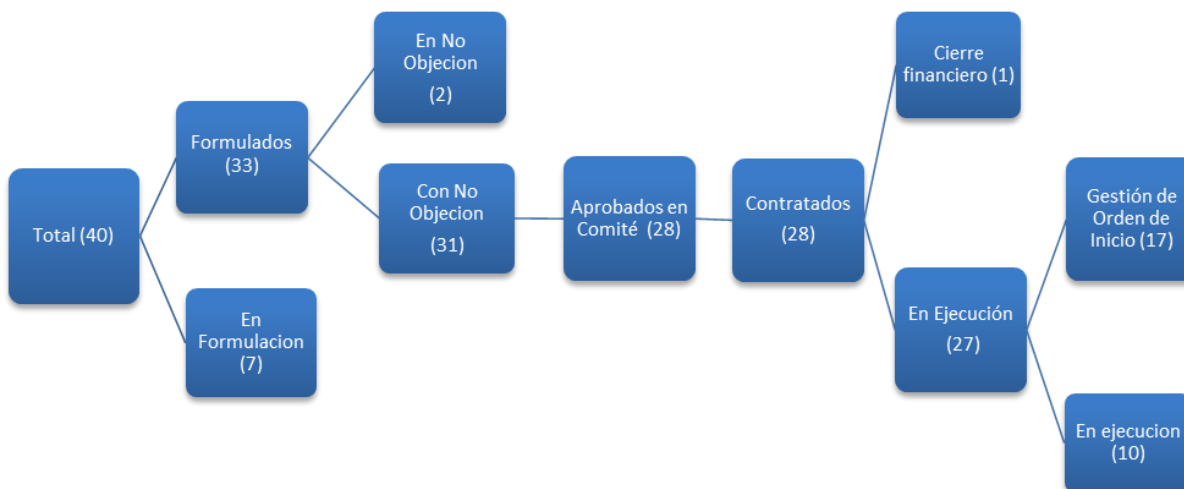

Fase III contempla 40 proyectos de los cuales han ingresado al ciclo de proyectos del FHS 40 proyectos (en formulación y formulados).

Este número de proyectos ha variado en base al costo de los mismos y la disponibilidad de recursos.

LOGROS PROMINE FASE I, II y III

- Fase I se ejecutó el 94% de los fondos asignados en presupuesto.
- Fase II se ejecutó el 94% de los fondos asignados en presupuesto.
- Fase III se ejecutó el 99% de los fondos asignados en presupuesto, para un porcentaje de ejecución a nivel del programa de 98.11%.
- Se terminaron 14 proyectos con los cuales se beneficiaron a 1,188 personas (alumnos y personal administrativo) y se generaron 353 empleos.

Retos Próximos

Entre los principales retos que enfrenta el PROMINE-KfW se mantienen los indicados en el informe anterior entre otros:

Nuevos Fondos. Gestiones necesarias para la firma del Acuerdo Separado fase IV y cumplimiento de condiciones previas.

- **Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras**
(CONVIVIR)



i. Objetivo General

Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).

ii. Focalización

A través de un proceso de concurso con criterios de selección predefinidos en el acuerdo separado y evaluación de propuestas técnicas alineadas a los componentes del programa fueron seleccionados 3 municipios en donde se está realizando la intervención del CONVIVIR a través de obras de infraestructura y medidas de alcance social para beneficio enfocado en la juventud. Así mismo se definieron los barrios, colonias o comunidades urbanas en donde se focaliza las acciones y en donde ya se ha realizado una labor de socialización de los alcances, compromisos y beneficios para la población. Los municipios seleccionados son:

- Municipio de Gracias, departamento de Lempira
- Municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua
- Municipio de La Lima, departamento de Cortes.

iii. Descripción del Proyecto

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

Monto del Proyecto: Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son Euros 12, 200,000.00. El tipo de financiamiento es un contrato de Préstamo.

Fecha de Firma de convenio: 08/11/2012

Fecha de Finalización de convenio: 30/06/2017

iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2014	21,289,204.00	18,316,427.97	86.04%
2015	38,873,159.00	34,024,198.74	87.53%
2016	88,796,503.00	83,460,868.42	93.99%

v. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2016	Mto. Ejecutado 2016	Empleos Generados 2016	Beneficiarios directos 2016
EMPRENDIMIENTO Y VALORES	41	11,843,189.06	56	9,834
ASISTENCIA TECNICA	4	8,189,837.64	10	0
MUNICIPAL	30	55,241,513.34	545	61,039
TOTAL	75	75,274,540.04	611	70,873

vi. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2016	Mto. Ejecutado 2016	Empleos Generados 2016	Beneficiarios directos 2016
COMAYAGUA	22	15,535,875.68	118	14,039
CORTES	25	27,882,077.68	223	33,034
LEMPIRA	28	31,856,586.68	270	23,800
TOTAL	75	L. 75,274,540.04	611	70,873

vii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	MONTO TOTAL EJECUTADO
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	8,186,328.38
TOTAL	8,186,328.38

viii. Principales Logros

En el presente cuadro se observa la ejecución financiera que ha tenido el Programa CONVIVIR desde su creación a la fecha, en el 4to trimestre lo ejecutado se distribuye de la siguiente manera:

Ejecución financiera del 4to trimestre

Componente	Presupuesto Ejecutado 2014	Presupuesto Ejecutado 2015	Presupuesto vigente 2016	EJECUTADO 2016
01-Gasto Operativo	L. 536,459.53	L. 4011,908.76	L. 9,208,773.00	L. 8,186,328.3
02- Construcción	L. 4134,589.44	L. 14781,805.43	L. 53,923,484.00	L. 53,726,357.68
03- Fortalecimiento de Habilidades de Jóvenes	L. 0.00	L. 2011,078.63	L. 8,606,895.00	L.8,078,022.83
04- Mejoramiento Capacidades de Actores Relevantes	L. 0.00	L. 4114,456.01	L. 3,650,000.00	L. 2137,666.23
05-Materiales y Equipos	L. 0.00	L. 820,323.53	L. 5,169,841.00	L. 3142,655.66
06-Consultoria internacional	L. 13645,379.00	L. 8284,626.38	L. 8,237,510.00	L. 8189,837.64
Total	L. 18,316,427.97	L. 34,024,198.74	L. 88,796,503.00	L. 83,460,868.42

ix. Avance Físico

En el componente de Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura el programa CONVIVIR tiene en cartera actualmente de 30 proyectos de infraestructura para ejecutar con el monto del convenio, de los cuales se han ejecutado los primeros 3 proyectos completamente, se están ejecutando 4 proyectos y para finales del año 2016 se desembolsaran el 50% de anticipo para las obras restantes. Actualmente el programa se encuentra en plena ejecución física financieramente de las obras de infraestructura y sociales.

Obras priorizadas en el municipio de Siguatepeque, Comayagua

Proyecto	Inversión Estimada* (millones de Lempiras)	Estado
1. Obra de Confianza	L. 3,104,790.51	Proyecto Ejecutado.
2. Cancha de Fútbol Col. Mata	L. 2,668,978.76	Proyecto en ejecución 80%
3. Centro Calidad de Vida Col. Noé Cruz	L. 3,012,043.70	Proyecto en ejecución 12%
4. Centro de calidad de vida Bo. San Juan	L. 3,598,956.85	Proceso de desembolso
5. Centro de Educación Digital	L. 393,589.02	Proyecto en ejecución 10%
6. Colonia El Carmen	L. 3,767,167.59	Proceso firma de contrato alcalde
7. Centro de calidad de vida aldea Las Crucitas	L. 2,956,701.47	Proceso firma de contrato alcalde
Total	L. 19,502,227.90	

Obras priorizadas en el municipio de Gracias, Lempira

Proyecto	Inversión Estimada* (millones de Lempiras)	Estado
1. Obra de Confianza	L. 3,225,774.58	Proyecto Ejecutado.
2. Ampliación Casa de la Juventud.	L. 6,846,269.84	Proyecto en ejecución 45%
3. Construcción campo de pelota Bella Vista y Pinalito.	L. 2,974,938.57	Proyecto en ejecución 65%
4. Reposición Polideportivo Villas del Rosario.	L. 6,338,642.02	Ya se cuentan con los cheques pero la alcaldía municipal no cuenta con su contrapartida
5. Construcción plaza para la Recreación y la Convivencia Pinalito y Bella Vista.	L. 2,147,440.69	Ya está diseñado y formulado 100% en proceso de desembolso
6. Remodelación Plaza San Sebastián	L. 4,029,707.82	Ya está diseñado y formulado 100% en proceso de desembolso
7. Casa de la cultura	L. 8,169,443.80	Ya está diseñado y formulado 100% en proceso de desembolso
8. Centros de Formación Digital.	L. 53,756.51	Ya está diseñado y formulado 100% en proceso de desembolso
9. Construcción de Salón multiusos Bella Vista y Pinalito.	L. 2,979,546.19	Ya está diseñado y formulado 100% en proceso de desembolso
10. Construcción parque recreativo Moreno y Hércules.	L. 5,459,590.31	Está pendiente la no objeción del KFW
11. Ampliación plaza Marco Tulio Rodríguez	L. 2,454,714.29	Pendiente su formulación y aprobación de calidad en 90% para finales del mes de octubre se aprobara en comité.
12. Centro de calidad de vida Villami	L. 2,447,597.92	Pendiente su formulación y aprobación de calidad en 90% para finales del mes de octubre se aprobara en comité.
13. Escuela de música Mejjcapa	L. 3,280,000.00	Pendiente su formulación y aprobación de calidad en 90% para finales del mes de octubre se aprobara en comité.
Total	L. 50,407,422.54	

Obras priorizadas en el municipio de La Lima, Cortés

Proyecto	Inversión Estimada* (millones de Lempiras)	Estado
1. Construcción centro juvenil de desarrollo integral	L. 3,262,221.20	Proyecto Ejecutado.
2. Ampliación Plaza de la Juventud.	L. 7,036,616.12	Proyecto en ejecución.
3. Remodelación Caminos de los Gatos paseo del Puente y Áreas Aledañas	L. 1,261,200.58	Proyecto en ejecución.

4. Remodelación parque los Pinos La Lima	L. 1,775,191.17	Proyecto en ejecución.
5. Parque Mediana Sitraterco	L. 8,518,858.49	Proceso de Desembolso
6. Casa de la Cultura	L. 9,605,935.76	Proceso de Desembolso
7. Remodelación Cancha El Maestro	L. 2,687,523.23	Proyecto en Suspensión.
8. Centros de Formación Digital.	L. 211,335.17	Proyecto en ejecución
9. Construcción Centro de Calidad De Vida Col. Nuevo San Juan	L. 2,961,528.33	Proceso de Desembolso
10. Construcción Centro de Calidad de Vida Alvarez Martínez	L. 3,068,158.19	Proyecto en Suspensión.
TOTAL	L. 40,388,568.24	

Tema de Capacitación o Proceso	Jóvenes a Capacitar	Estado
1. Habilidades para la Vida (EDEX)	60	Ejecutado (100%)
2. Formación Técnica INFOP	570	Ejecutado (100%)
4. Taller en comunicación y Video	60	Ejecutado (100%)
5. Talleres de mascarones	103	Ejecutado (100%)
6. Facilitadores de arte social para la convivencia	56	Ejecutado (100%) jóvenes formados como facilitadores de arte social
7. promotores de deporte comunitario.	54	Ejecutado (100%)
8. talleres de genero	175	En proceso de contratación
Total	1,078	

ACTIVIDADES FORMATIVAS PREPARADAS POR EL IDECOAS/FHIS PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO

Con la finalidad de dar cierre al año con la implementación de otros procesos formativos para jóvenes tanto como de fortalecimiento institucional, el IDECOAS/FHIS con el apoyo de la Consultoría

CONVIVIR, ha estado trabajando en la planificación de las actividades formativas que se realizarán hasta el fin del año 2016.

Según lo programado estas serían las actividades a realizarse entre octubre a Diciembre 2016.

- **Capacitación en la Metodología CPTED “Prevención Situacional del Delito en Espacios Públicos”** Se considera 10 participantes por municipio, Un Enlace social/Municipal, Un enlace Técnico/Municipal, Un Oficial de Juventud., Un enlace Social Consultoría Convivir, Un Enlace Técnico consultoría Convivir., Un Funcionario de la Policía municipal (Con liderazgo), Un representante de los Bomberos (Con liderazgo), Un Líder de Un CEP., Un Líder de Un CEP, Un Líder de un CEP.
- **Socialización del diagnóstico y del Plan de Fortalecimiento Municipal en Gestión para el desarrollo de la Juventud.**
15 participantes: Alcalde Municipal, Oficial de Juventud, Un Enlace social/Municipal, Un Enlace Social Consultoría Convivir, Un Enlace Técnico consultoría Convivir, Un funcionario de la Biblioteca Municipal, Un funcionario de niñez y adolescencia, Un Funcionario del área Administrativa.
Dos (2) regidores Municipal, Cinco (5) Jóvenes representativos.
Revisión del Plan de convivencia, contrato y forma de liquidación.
Oficial de Juventud, Enlace social y técnico de la consultoría, Jóvenes que han participado en la elaboración del plan
- **Reunión de seguimiento con los jóvenes formados como Facilitadores de Arte social para socializar proyectos deportivos, asociarlos con Banca Joven, etc.**
Si es posible, los 20 jóvenes puedan participar en la reunión, Oficial de Juventud, Enlace social y técnico de la consultoría
- **Formación de Promotores Deportivos Comunitarios COALICION INTERNACIONAL DEL DEPORTE**
Este proceso se inicia una segunda vez, hay que procurar que los 25 jóvenes participen con el debido rango de edad, Jóvenes de 15 a 30 años, con interés en la práctica deportiva, que ejecute algún deporte, con compromiso por su comunidad y liderazgo.
- **Talleres en Habilidades para la Vida Certificados por Edex y la universidad de Girona, España.**
20 personas formadas, divididos de las siguientes maneras:

10 jóvenes líderes, entre 18 y 30 años de edad, participantes del Programa Convivir, de la Comisión de Juventud u otras redes juveniles, posteriormente replicaran el conocimiento.

10 Actores relevantes entre funcionarios municipales enlaces técnicos y sociales, líderes de los CEP, patronatos, ONG enfocadas en juventud o instituciones del Estado ligadas a temas laborales, educativos, etc.-

- **Talleres de Género y Masculinidad.**

Se tendrá que ir trabajando en los listados, el reciente levantamiento de información será de ayuda para confirmar a los jóvenes de los barrios convivir

Un Taller para 25 personas hombres y mujeres en el nivel local, con autoridades y técnicos municipales de las Oficinas Municipales de la Mujer, representantes designados de los Comités de Ejecución de Proyectos (CEP) y Comités de Contraloría social, Oficina Municipal de Juventud, representantes de la Comisión Municipal de Juventud, representante de salud, educación, policía comunitaria.

Un taller para 25 jóvenes hombres y mujeres de 16 a 24 años miembros de las redes juveniles de las distintas comunidades donde interviene el Programa CONVIVIR.

- **Formación de Jóvenes Ambientalistas**

Se tendrá que ir trabajando en los listados, el reciente levantamiento de información será de ayuda para confirmar a los jóvenes de los barrios convivir.

25 jóvenes entre las edades de 15 a 30 años de edad.

Pertenecientes a grupos/Organizaciones ambientalistas.

Con sensibilidad para la conservación del medio ambiente.

Con compromiso en promover a nivel comunitario acciones de protección del medio ambiente.

Participantes en los barrios convivir.

Solicitar apoyo y coordinación con la UMA

- **Talleres de liderazgo y ciudadanía**

El reciente levantamiento de información será de ayuda para confirmar a los jóvenes de los barrios convivir.

25 jóvenes entre las edades de 15 a 30 años de edad, pertenecientes a las Comisiones Municipales de Juventud y redes juveniles, con liderazgo y compromiso en la comunidad participantes en los barrios convivir

- **Formación de instructores de informática.**

El Oficial de juventud tendrá que coordinar con la municipalidad a la persona encargada del manejo de los centros digitales que se están acondicionando actualmente

Son 5 persona en total, se pueden considerar 2 adultos y 3 jóvenes entre 18 y 30 años, que tengan conocimientos básicos en los paquetes de informática (Word, Excel, Power Point y otros)

Las personas que participen tendrán que disponer de una semana porque la formación durara 40 horas.

- **Desarrollo institucional del Instituto Nacional de la Juventud (INJ)**

Este proceso se desarrollara mediante una Consultoría Individual, el consultor convocara a los oficiales de juventud y a algunos jóvenes representativos para realizar consultas y enriquecer el diagnóstico y otros procesos relacionados con planificación estratégica, etc.

- **Análisis de Línea de base.**

Se socializara con 25 personas entre Técnicos municipales actores relevantes y jóvenes representativos los resultados del análisis de datos obtenidos de la Encuesta aplicada con el INE, esto será mediante un consultor individual.

LICENCIAS AMBIENTALES PROYECTOS CONVIVIR.

De acuerdo a las modificaciones establecidas todo proyecto aprobado por el IDECOAS/FHIS debe cumplir con una serie de requisitos, los cuales deben quedar documentos por parte del municipio. Este es un proceso que tomará tiempo, y además de eso uno de los requisitos es que el municipio tiene que dejar una garantía que corresponde a un porcentaje del costo del proyecto, lo cual suma montos bastante elevado para cada municipio. Los proyectos son categorizados según el tipo de intervención en categorías 1- 2 y 3,

Esta situación tomó por sorpresa a los municipios quienes no contaban con tener que poner garantías y considerando que los proyectos ya habían sido aprobados por el IDECOAS/FHIS, quién cuenta con una Unidad de Medioambiente, daban por hecho que ya todo estaba aprobado y no habría ni más trámites que realizar, ni menos pagas.

A fin de agilizar toda esta gestión, Mi Ambiente, la unidad Medioambiental de gobierno que maneja este tema, está gestionando para que las Unidades de Gestión de Instituciones como el IDECOAS/FHIS, puedan certificar los proyectos de manera oficial. Sin embargo, aún con todas las facilidades que está dando Mi Ambiente y apoyando para que los trámites de aprobaciones de las licencias sean rápidos (dicen que un plazo de 48 horas podría extender una licencia operativa,

mientras se tramita la licencia final). Con todo, esto ha producido una paralización de la ejecución, y un proyecto que ya estaba dando inicio fue paralizado por el IDECOAS/FHIS. Otros proyectos que estaban a punto de dar inicio a su construcción no tienen orden de inicio por parte de la Dirección de Control y Seguimiento del IDECOAS/FHIS. Toda esta situación inesperada, hace suponer que se podría poner en riesgo la programación hecha para ejecución de proyectos el último trimestre del año 2015.

En total existe un número de 10 proyectos que deben conseguir las licencias ambientales, según el siguiente cuadro.

CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)

- **Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP)**

- i. **Objetivo General**



El Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP), tiene como objetivo principal, la construcción de proyectos sociales que mejoren la calidad de vida de la población, los cuales promueven la seguridad local e incorporan diseños del entorno para prevención del crimen y la violencia.

De esta manera, se contribuye a la mejora de las condiciones de vida de la población, se construye cohesión social y se impulsa la convivencia ciudadana. Algunos de los proyectos se han ejecutado bajo la modalidad PEC (Proyecto Ejecutado por la Comunidad).

- ii. **Focalización**

Todos los sub proyectos seleccionados serán ejecutados en zonas “calientes” urbanas y rurales y en comunidades remotas amenazadas por las maras y el narcotráfico. Unos proyectos son modalidad PEC y otros con contratista individual o firma constructora. Estos proyectos se están ejecutando actualmente.

Nota: La elegibilidad de los proyectos: Comunidades urbanas identificadas por la USAID bajo Mérida/CARSI. Se elegirán los sub proyectos que ayuden a mejorar la seguridad en las comunidades y que puedan construirse en menos de un año. El Programa está orientado a beneficiar a los habitantes de barrios y colonias con alto índice de violencia ubicados en los municipios de: La Ceiba, Atlántida; Tela, Atlántida; San Pedro Sula, Cortés; Choloma, Cortés; Comayagua, Comayagua; Nueva Arcadia, Copán; San Agustín, Copán; Cane, La Paz; Distrito Central; Puerto Lempira, Gracias a Dios.

- iii. **Descripción del Proyecto**

Ejecución de obras de infraestructura a través de la implementación de metodologías altamente participativas con el objetivo de utilizar principios de prevención de la violencia situacional, transformando el espacio físico de las comunidades beneficiadas e involucrando activamente a los miembros de la comunidad en la identificación, selección y ejecución de los subproyectos. Se ejecutan diferentes tipos de proyectos tales como instalaciones educativas, centros de salud, iluminación de

calles, proyectos de agua, espacios comunitarios más seguros, centros de alcance, centros vocacionales y capacitación juvenil.

Monto del Convenio Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son de 152.010 millones de lempiras. Estos fondos son donación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Adicionalmente cuenta con una contraparte de fondos nacionales por un monto de 38.078 millones de lempiras. Así como nueva fecha de cierre 31 de Marzo 2017.

iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2014	70,145,453.00	68,995,453.00	98.36%
2015	24,579,983.00	23,604,345.43	96.03%
2016	31,659,786.00	31,659,785.44	100.00%

v. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2016	Mto. Ejecutado 2016	Empleos Generados 2016	Beneficiarios directos 2016
PREVENCIÓN SITUACIONAL	39	22,706,448.48	43	24,017
TOTAL	39	22,706,448.48	43	24,017

vi. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2016	Mto. Ejecutado 2016	Empleos Generados 2016	Beneficiarios directos 2016
ATLANTIDA	15	4,828,450.42	14	15,666
CORTES	14	4,574,321.45	13	6,825
FRANCISCO MORAZAN	8	12,668,354.18	8	1,126
GRACIAS A DIOS	2	635,322.42	8	400
TOTAL	39	22,706,448.48	43	24,017

vii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	EJECUTADO
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	8,953,336.96
TOTAL	8,953,336.96

viii. Principales Logros (Octubre a Diciembre de 2016)

A. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS TERMINADOS

- Terminados 95 proyectos de infraestructura.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Status	% de Avance Físico
1	Completación Centro de Alcance	Col. San José, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
2	Pavimentación Concreto Hidráulico - 400 m de calle	Col. San José, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
3	Construcción / Expansión Centro de Alcance	Armenia Bonito, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
4	Construcción Centro de Alcance Dr. Ramón Antonio Leva	Búfalo, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
5	Reparación Centro de Alcance Los Ángeles Sector El Carmen	Col. Los Ángeles, San Pedro Sula, Cortés	Finalizado	100%
6	Construcción Escuela 29 de Noviembre	Col. Suazo Córdova, San Pedro Sula, Cortés	Finalizado	100%
7	Iluminación de Calle de Acceso al Centro de Alcance	Col. López Arellano, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
8	Reparación Cancha Multiusos frente a Centro de Alcance	Col. López Arellano, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
9	Reparación Escuela Augusto C. Coello	Col. Las Pilas, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
10	Construcción de Acceso Peatonal e Iluminación	Col. Las Pilas, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
11	Construcción de Centro de Alcance	Col. Las Pilas, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
12	Construcción de cancha multiusos en Parque Pawanka	Puerto Lempira, Gracias a Dios	Finalizado	100%
13	Construcción Centro de Alcance	Puerto Lempira, Gracias a Dios	Finalizado	100%
14	Estudio Drenaje de Aguas Lluvias	Col. Primero de Mayo, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
15	Diseño Muro de Contención y Pavimentación de Calle en Sector Los Pozos	Col. San Francisco, Distrito Central, Francisco Morazán	Finalizado	100%
16	Extensión de Red Secundaria para Iluminación de Bordos y Mejoras al Sistema de Iluminación de Calles	Col. Primero de Mayo, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
17	Ampliación Estudio Drenaje de Aguas Lluvias	Col. Armenia Bonito, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%

18	Pavimentación de Calles – Fase I	Col. Flor del Campo, Distrito Central, Francisco Morazán	Finalizado	100%
19	Diseño de Techo de cancha multiusos	Puerto Lempira, Gracias a Dios	Finalizado	100%
20	Mejoras a Puente, Drenajes, Aceras y Bordillos	Col. San José, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
21	Mejoras a Kínder San José y Área Recreativa	Col. San José, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
22	Pavimentación Concreto Hidráulico	Col. San Judas, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
23	Construcción Centro de Alcance	Col. Zapote Norte, Distrito Central, Francisco Morazán	Finalizado	100%
24	Mejoras al Sistema de Iluminación de calles	Col. El Japón, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
25	Construcción de parque infantil	Col. El Japón, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
26	Construcción de cancha multiusos	Col. Éxitos de ANACH, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
27	Ampliación Jardín de Niños Marcelino Pineda López	Col. Sierra Pina, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
28	Reparación Jardín de Niños Nuevo Amanecer	Col. Melgar 2, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
29	Construcción de contenedores para basura	Col. Armenia Bonito, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
30	Construcción de parada de buses	Col. Armenia Bonito, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
31	Pavimentación / Electrificación Colonia San Alejo	Col. San Alejo, Tela, Atlántida	Finalizado	100%
32	Construcción de parada de buses	Col. El Japón, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
33	Mejoras al Sistema de Iluminación de calles	Col. Rubí, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
34	Construcción de Parada de buses	Col. Rubí, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
35	Ampliación Centro de Salud Dr. José María Ochoa	Comayagua, Comayagua	Finalizado	100%
36	Construcción Cancha Multiusos	Aldea Las Calabazas, Cane, La Paz	Finalizado	100%
37	Mejoras a cancha de futbol	Barrio San Agustín, San Agustín, Copán	Finalizado	100%
38	Construcción Mejoras Cancha Polideportivo	Barrio El Dorado, Nueva Arcadia, Copán	Finalizado	100%
39	Reparación Escuela María Elena de Santamaría	Col. Nueva Capital, Distrito Central	Finalizado	100%
40	Mejoras a Centro de Alcance	Col. Nueva Capital, Distrito Central	Finalizado	100%
41	Reparación cancha multiusos	Col. Nueva Capital, Distrito Central	Finalizado	100%

42	Pavimentación de Calles Fase I	Col. El Japón, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
43	Construcción Drenaje de Aguas Lluvias	Col. El Japón, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
44	Iluminación y mejoras a cancha multiusos	Col. El Japón, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
45	Pavimentación de calles y drenaje superficial	Col. Rubí, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
46	Muralismo	Col. Rubí, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
47	Suministro e Instalación de Contenedores de Basura	Col. Rubí, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
48	Poda de árboles (Capacitación - equipamiento - implementación)	Col. Armenia Bonito, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
49	Proyecto de señalización comunitaria	Col. Rubí, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
50	Mejoras al sistema de iluminación de calles	Col. Éxitos de Anach No. 1 y 2, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
51	Mejoras al Sistema de Iluminación de Calles	Col. Nueva Capital, Distrito Central, Francisco Morazán	Finalizado	100%
52	Pavimentación de Calles – Fase I	Col. Las Torres, Distrito Central, Francisco Morazán	Finalizado	100%
53	Mejoras al sistema de iluminación de calles	Col. Armenia Bonito, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
54	Iluminación campo de fútbol	Col. Armenia Bonito, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
55	Mejoramiento de calles en Sector Cabañas Elite	Col. San Francisco, Distrito Central	Finalizado	100%
56	Ampliación y mejoramiento espacio recreativo en Sector La Popular	Col. San Francisco, Distrito Central	Finalizado	100%
57	Iluminación de calles	Colonia Rodas, La Ceiba	Finalizado	100%
58	Mejoras Sistema de Iluminación de calles	Colonia Sierra Pina, La Ceiba	Finalizado	100%
59	Construcción Cerco Escuela Roberto Larios Silva	Colonia Morales III, San Pedro Sula	Finalizado	100%
60	Pavimentación Tramo Calle Principal-Cancha	Col. Éxitos de Anach No.1 y 2, Choloma	Finalizado	100%
61	Reparación CEB Lempira, Fase I	Colonia Lempira, San Pedro Sula	Finalizado	100%
62	Reparación Puente Peatonal y Ruta Segura	Colonia Lempira, San Pedro Sula	Finalizado	100%
63	Reparación Escuela Esteban Pineda	Colonia Morales II, San Pedro Sula	Finalizado	100%
64	Mejoras a calle principal	Colonia Melgar 2, La Ceiba	Finalizado	100%
65	Pavimentación de Calles – Fase II	Colonia El Japón, Choloma	Finalizado	100%

66	Reparación Escuela Lempira	Col. Sierra Pina, La Ceiba	Finalizado	100%
67	Construcción Parada de Buses	Col. Modesto Rodas, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
68	Construcción de contenedores para basura	Col. Modesto Rodas, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
69	Mejoras a campo de futbol	Col. Modesto Rodas, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
70	Pavimentación de Calles Fase II	Col. Las Torres, Distrito Central, Francisco Morazán	Finalizado	100%
71	Pavimentación de Calles Fase II	Col. Flor del Campo, Distrito Central, Francisco Morazán	Finalizado	100%
72	Construcción Parque Infantil y Mejoras a Kínder Mauricio Campagne	Colonia Armenia Bonito, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
73	Construcción Centro de Alcance y Mejoras a Jardín de Niños Francisco Zepeda Andino	Col. Primero de Mayo, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
74	Acondicionamiento, Equipamiento y Mobiliario de CCPREB Sister Marjorie Destout	Col. Modesto Rodas Alvarado, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
75	Fase II – Reparación Escuela Francisco Regis Benedith	Col. San José, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
76	Construcción Cocina Bodega de Escuela Japón	Col. Japón, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
77	Reparación CDA/IHER/Kínder	Colonia Morales III, San Pedro Sula	En cierre	100%
78	Ampliación Centro de Alcance (CDA)	Col. El Japón, Choloma, Cortés	En cierre	100%
79	Reparación de Escuela Anexa Miguel Paz Barahona	Colonia Sinaí Sector Bonitillo, La Ceiba, Atlántida	En cierre	100%
80	Reparación Escuela Gustavo Adolfo Álvarez Martínez – Fase II	Col. Armenia Bonito, La Ceiba, Atlántida	En cierre	100%
81	Pavimentación de calles - Fase III	Col. El Japón, Choloma, Cortés	En cierre	100%
82	Reparación CEB Lempira - II Fase	Colonia Lempira, San Pedro Sula, Cortés.	En cierre	100%
83	Reparación Jardín de Niños Club de Leones – Fase II	Col. Suyapa, La Ceiba, Atlántida	En cierre	100%
84	Construcción, Reparación y Mejoras de CDA Col. Suyapa, La Ceiba	Col. Suyapa, La Ceiba, Atlántida	En cierre	100%
85	Construcción, Reparación y Mejoras de CDA Col. Estados Unidos.	Col. Estados Unidos, Distrito Central, Francisco Morazán	En cierre	100%
86	Construcción, Reparación y Mejoras de CDA Col. Los Pinos.	Col. Los Pinos, Distrito Central, Francisco Morazán	En cierre	100%

87	Construcción, Reparación y Mejoras de CDA Col Nueva Capital.	Col. Nueva Capital, Distrito Central, Francisco Morazán	En cierre	100%
88	Construcción, Reparación y Mejoras de CDA Col. Los Ángeles	Col. Los Ángeles, San Pedro Sula, Cortes	En cierre	100%
89	Construcción, Reparación y Mejoras de CDA Col. San Vicente de Paul	Col. San Vicente de Paul, San Pedro Sula, Cortes	En cierre	100%
90	Construcción, Reparación y Mejoras de CDA Col. Suyapa, Chamelecón	Col. Suyapa, Chamelecón, Cortes	En cierre	100%
91	Mejoras a campo de fútbol	Col. Nueva Capital, Distrito Central, Francisco Morazán	En cierre	100%
92	Fase II- Reparación Escuela Jesús Aguilar Paz	Col. San Francisco, Distrito Central, Francisco Morazán	En cierre	100%
93	Fase II- Reparación Escuela Ibrahim Gamero Idiáquez	Col. Zapote Norte, Distrito Central, Francisco Morazán	En cierre	100%
94	Construcción Cerco Perimetral CDA Asla Wapaia	Puerto Lempira, Gracias a Dios	En cierre	100%
95	Saneamiento Básico	Mocorón, Puerto Lempira, Gracias a Dios	En cierre	100%

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

- En ejecución 7 proyectos de infraestructura.

No.	Nombre del Proyecto	Modalidad de ejecución	Ubicación	Monto del Proyecto	Status	% de Ejecución
1	Construcción Club de Patinaje	PEC	Col. 9 de Mayo, Sector Cofradía, San Pedro Sula, Cortés	4,400,000	En ejecución	74%
2	Reparación de Escuela Miguel Paz Barahona y Ampliación a CEB	PEC	Colonia Municipal, Sector Bonitillo, La Ceiba, Atlántida	6,600,000	En ejecución	95%
3	Obras Complementarias en CDA Morales III	PEC	Colonia Morales III, San Pedro Sula	800,000.00	En inicio de obras	0%

4	Reparación Escuela Naciones Unidas	PEC	Colonia Villanueva, Distrito Central	2,500,000.00	En inicio de obras	0%
5	Mejoras a calle de acceso Escuela Naciones Unidas	PEC	Colonia Villanueva, Distrito Central	800,000.00	En inicio de obras	0%
6	Construcción de Obras complementarias en CEB Rafael Pineda Ponce	PEC	Colonia Unidad y Fuerza, Distrito Central	600,000.00	En inicio de obras	0%
7	Reparación CDA Rivera Hernández	PEC	Colonia Rivera Hernández, San Pedro Sula	2,100,000.00	En inicio de obras	0%

- **Programa de Infraestructura de Educativa (FHIS/EIP)**

- i. **Objetivo General**

El Programa de Infraestructura Educativa (FHIS/EIP), tiene como objetivo principal, la mejora de la infraestructura de centros educativos en las comunidades bajo el convenio MERIDA/CARSI. Con este programa, se financian las actividades de pre-construcción, diseños, suministros de equipo/mobiliario, así como reparaciones y mejoras de infraestructura de centros educativos. Asimismo, a través de la metodología CPTED aplicada a los centros educativos, se incluirán elementos que reduzcan la oportunidad de crimen y violencia y mejoran la percepción de temor en las escuelas. En la fase II del programa, se espera la mejora de la demanda educativa al ampliar los centros educativos a centros básicos (hasta 9° grado), con la construcción de las aulas y dotación de mobiliario para este fin, con acuerdo de nombramiento de plazas provistas por la Secretaría de Educación.

- ii. **Focalización**

Todos los sub proyectos seleccionados serán ejecutados en zonas “calientes” urbanas y rurales y en comunidades remotas amenazadas por las maras y el narcotráfico. Unos proyectos son modalidad PEC y otros con contratista individual o firma constructora. Estos proyectos se están ejecutando actualmente.

Nota: La elegibilidad de los proyectos: Comunidades urbanas identificadas por la USAID bajo Mérida/CARSI y escuelas priorizadas por la Secretaría de Educación dentro de estas mismas comunidades. Se elegirán los sub proyectos que ayuden a mejorar la infraestructura física educativa, a través de reparaciones a centros educativos y ampliaciones de escuelas a centro básico. El Programa está orientado a beneficiar a los niños y niñas de las comunidades de: La Ceiba, Atlántida; San Pedro Sula, Cortés; Choloma, Cortés; Cane, La Paz; Distrito Central.

- iii. **Descripción del Proyecto**

Reparación de centros educativos (escuelas y jardines de niños) en la primera fase del programa. Ampliación de escuelas a Centro Educativo Básico, según los criterios de selección realizados en conjunto con la Secretaría de Educación y la Oficina de Educación de la USAID, en la segunda fase del programa.

Monto del Convenio: Los fondos destinados para la ejecución de este Programa es de 80.91 millones de lempiras para la ejecución del programa. Estos fondos son donación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), así como nueva fecha de cierre 31 de Julio 2016.

iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2014	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%
2015	24,807,145.00	24,651,657.63	99%
2016	29,419,122.00	29,419,121.65	100%

v. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2016	Mto. Ejecutado 2016	Empleos Generados 2016	Beneficiarios directos 2016
EDUCACION	10	24,322,377.00	47	5,502
TOTAL	10	24,322,377.00	47	5,502

vi. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2016	Mto. Ejecutado 2016	Empleos Generados 2016	Beneficiarios directos 2016
ATLANTIDA	2	4,864,475.40	12	514
CORTES	4	8,512,831.95	15	2,196
FRANCISCO MORAZAN	4	10,945,069.65	20	2,792
TOTAL	10	24,322,377.00	47	5,502

vii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	EJECUTADO
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	5,096,744.65
TOTAL	5,096,744.65

viii. Principales Logros (Septiembre a Diciembre de 2016)

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS TERMINADOS

- Terminados 27 proyectos de infraestructura escolar.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Status	% de Avance Físico
1	Reparación en Escuela Manuel Francisco Vélez	Cane, La Paz	Terminado	100%
2	Reparación Jardín de Niños El Japón	Col. El Japón, Choloma, Cortés	Terminado	100%
3	Reparación Escuela Enrique Ortez Pinel	Col. Primero de Mayo, La Ceiba, Atlántida	Terminado	100%
4	Reparación Escuela Policarpo Paz García	Col. Melgar N.1, La Ceiba, Atlántida	Terminado	100%
5	Reparación Escuela General Gustavo Alvarez Martínez	Col. Armenia Bonito, La Ceiba, Atlántida	Terminado	100%
6	Reparación Jardín de Niños Club de Leones	Col. Suyapa, La Ceiba, Atlántida	Terminado	100%
7	Reparación Jardín de Niños Brazos de Amor	Col. Las Pilas, Choloma, Cortés	Terminado	100%
8	Reparación Jardín de Niños Buen Samaritano	Col. Rubí, Choloma, Cortés	Terminado	100%
9	Reparaciones en CEB Juan Ramón Molina (Fase I)	Col. San Miguel, Distrito Central, Francisco Morazán	Terminado	100%
10	Reparación Escuela Jesús Aguilar Paz	Col. San Francisco, Distrito Central, Francisco Morazán	Terminado	100%
11	Reparación Escuela Ibrahim Gamero Idiáquez	Col. Zapote Norte, Distrito Central, Francisco Morazán	Terminado	100%
12	Reparación Escuela Francisco Regis Benedith	Col. San José, La Ceiba, Atlántida	Terminado	100%
13	Reparación Centro de Educación Básica Estado de Israel	Col. Flor del Campo, Distrito Central, Francisco Morazán	Terminado	100%
14	Reparación Jardín de Niños Sagrado Corazón	Col. Las Torres, Distrito Central, Francisco Morazán	Terminado	100%
15	Reparación y Mejoras a Centro de Educación Básica (CEB) Justo Rufino Spillbury	Colonia Búfalo, La Ceiba	Terminado	100%
16	Ampliación a Centro de Educación Básica (CEB) y Reparación de Escuela Éxitos de Anach	Col. Éxitos de Anach, Choloma	Terminado	100%
17	Reparación de Escuela Maria Elena de Santa Maria y Ampliación a Centro de Educación Básica (CEB)	Col. Nueva Capital, Distrito Central, Francisco Morazán	Terminado	100%
18	Ampliación a Centro de Educación Básica (CEB) y Reparación de Escuela Oswaldo López Arellano	Col. López Arellano, Choloma	Terminado	100%

19	Reparación Escuela José Arturo Santos Delgado	Colonia Modesto Rodas Alvarado, La Ceiba	Terminado	100%
20	Reparación Escuela Lempira	Col. Sierra Pina, La Ceiba	Terminado	100%
21	Reparaciones en Centro de Educación Básica (CEB) Juan Ramón Molina (Fase II)	Colonia San Miguel, Distrito Central, Francisco Morazán	Terminado	100%
22	Reparación Escuela El Japón	Colonia El Japón, Choloma	Terminado	100%
23	Reparación de Escuela Miguel Andonie Fernandez y Ampliación a Centro de Educación Básica (CEB)	Col. La Era, Distrito Central, Francisco Morazán	Terminado	100%
24	Reparación de Escuela Jose Maria Casco y Ampliación a Centro de Educación Básica (CEB)	Col. La Sosa, Distrito Central, Francisco Morazán	Terminado	100%
25	Ampliación y Reparación Instituto Polivalente Las Brisas	Col. Las Brisas, San Pedro Sula	Terminado	100%
26	Ampliación y Reparación de Centro de Educación Básica (CEB) Rubén Antúnez Castillo	Col. San Jorge, Sector Cofradía, San Pedro Sula	Terminado	100%
27	Ampliación y Reparación de Centro de Educación Básica (CEB) Rafael Pineda Ponce	Col. Unidad y Fuerza, Distrito Central, Francisco Morazán	Terminado	100%

Este proyecto finalizó ejecución física el 31 de julio de 2016, según la Carta de Ejecución No. 26. En este período se culminó con la ejecución de 27 proyectos de infraestructura escolar, beneficiando a 12,038 estudiantes de los centros educativos intervenidos. Además se convirtieron a Centro Educativo Básico 7 escuelas, incluyendo la construcción de aulas para el Tercer Ciclo Educativo y el compromiso de asignación de docentes por parte de la Secretaría de Educación.

Actualmente se encuentra cerrado financiera, legal y técnicamente.

- **Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a Través de las Energías Renovables (PODER)**



i. Objetivo General

El Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a través de las Energías Renovables (PODER), tiene como objetivo principal, mejorar las condiciones de vida del sector rural de Honduras más pobre del país. La falta de energía limita las oportunidades económicas y las opciones alimenticias disponibles en los hogares hondureños. Sin energía, familias rurales no tienen la capacidad de refrigerar y almacenar alimentos nutritivos, operar sistemas de irrigación y llevar a cabo procesos que les de valor agregado para generar ingresos adicionales, o incluso que les permita finalizar las tareas escolares por la noche. La meta de esta Actividad es proporcionar acceso a energías renovables (incluyendo las tecnologías que pueden resultar en la entrega de energía eléctrica) a por lo menos 10,000 familias rurales de Honduras, aproximadamente 50,000 beneficiarios en el occidente de Honduras en comunidades de la iniciativa de Alimentando el Futuro del Gobierno de Estados Unidos, a través de los proyectos, y de esta manera abordar algunas de las causas fundamentales de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición.

ii. Focalización

Proyectos que mejoran la posibilidad para generar el ingreso de los residentes de las comunidades del área de influencia en los departamentos de La Paz, Lempira, Intibucá, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque.

iii. Descripción del Proyecto

Soluciones y tecnologías haciendo uso de las energías renovables orientados a la mejora de los procesos productivos logrando atacar las causas de pobreza e inseguridad alimentaria.

Monto del Convenio: Los fondos destinados para la ejecución de este Programa es de 20.82 millones de lempiras para el año 2016. Estos fondos son donación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2015	10,860,882.00	9,750,284.62	89.77%
2016	16,406,200.00	16,406,199.26	100.00%

v. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2016	Mto. Ejecutado 2016	Empleos Generados 2016	Beneficiarios directos 2016
ENERGÍA RENOVABLE Y RIEGO	8	14,240,880.00	0	694
TOTAL	8	14,240,880.00	0	694

vi. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2016	Mto. Ejecutado 2016	Empleos Generados 2016	Beneficiarios directos 2016
COPAN	0	777,836.56	0	144
INTIBUCÁ	7	9,968,616.00	0	298
LA PAZ	1	1,679,475.48	0	37
OCOTEPEQUE	0	1,814,951.97	0	215
TOTAL	8	14,240,880.00	0	694

vii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	EJECUTADO
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	2,165,319.26
TOTAL	2,165,319.26

i. Principales Logros (Octubre a Diciembre de 2016)

EJECUCIÓN DE PROYECTOS:

- En ejecución 15 proyectos de riego y energía renovable.

No.	Tipo de Proyecto	Ubicación	Monto del Proyecto	Status	% de Ejecución
1	Sistema de riego	San Antonio del Norte, San Antonio del Norte, La Paz	1,089,250.00	En ejecución	65%
2	Sistema de riego	Grupo Mixto, Azacualpa, Yamaranguila, Intibucá	720,000.00	En ejecución	99%
3	Sistema de riego	Togopala, Intibucá, Intibucá	800,000.00	En cierre	99%
4	Sistema de riego	Las Mesas, Yamaranguila, Intibucá	1,026,360.00	En cierre	99%
5	Sistema de Riego	El Tablón, Yamaranguila, Intibuca	650,000.00	En cierre	99%
6	Sistema de Riego	Los Olivos, Yamaranguila, Intibbuca	759,065.00	En cierre	99%
7	Sistema de Riego	La Rinconada, Intibucá, Intibucá	576,075.00	En cierre	99%
8	Sistema de Riego	Las Lagunas, Intibucá, Intibucá	1,000,075.00	En ejecución	90%
9	Sistema de Riego	Las Quebradas, Yamaranguila, Intibucá	724,426.00	En cierre	99%
10	Sistema de Riego	Belén, Intibucá, Intibucá	802,672.00	En cierre	99%
11	Sistema de Riego	Panina, Intibucá, Intibucá	775,000.00	En ejecución	50%
12	Sistema de Riego	El Cerrón, Cabañas, La Paz	635,164.00	En cierre	99%
13	Proyecto de secadoras solares y eco-estufas para pequeños productores de café	Departamento de La Paz e Intibucá	1,200.000.00	En ejecución	5%
14	Secadoras solares tipo domo para pequeños productores	Departamento de Ocotepeque	2,162,934.80	En ejecución	6%
15	Secadoras solares tipo domo para pequeños productores	Departamento de Copán	2,047,073.80	En ejecución	6%

Observaciones:

Los proyectos de Panina, Belén, Las Quebradas y Grupo Mixto, ubicados en el Departamento de Intibucá y el Proyecto de San Antonio del Norte, ubicado en la Paz, se encuentran en estatus de suspensión, debido a que las parcelas donde deben ejecutarse los proyectos de riego, actualmente cuentan con cultivos de subsistencia como maíz, frijoles, maicillo y sorgo, los cuales fueron sembrados en época de postrera, en los meses de agosto a noviembre, situación por la cual no se puede continuar con los trabajos de instalación de los sistemas parcelarios, hasta que estos no sean cosechados, de manera tentativa hasta el mes de enero del 2017.

CARTERA PROYECTOS VARIOS

DECRETO No. 045-2013.

Artículo 1.- Crease el Programa de Infraestructura, Viabilidad Comunitaria y Generación de Empleo, con el propósito de fomentar la Actividad Económica Nacional y mejorar las condiciones de vida de la población más desposeída del país.

Artículo 2.- Autorizar al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), a emitir ordenes de comprar a favor de las Empresas Productoras de Cemento; dichas ordenes serán distribuidas en forma equitativa y las Empresas Productoras de Cemento entregaran el producto según las instrucciones que reciban del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). Se autoriza a la referida Institución y a cada una de las Empresas Hondureñas Productoras de Cemento, para suscribir los convenios necesarios para la entrega del comento comprado dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la entrada en vigencia de este decreto.

Artículo 3.- Autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), a emitir notas de crédito para la compra de cemento, incluido el costo del flete, a las Empresas Hondureñas Productoras de Cemento por un monto de MIL MILLONES DE LEMPIRAS (L. 1,000,000,000.00); las notas de crédito serán presentadas ante la Dirección Ejecutiva de Ingreso (DEI) como pago del Impuesto Sobre la Renta y Aportación Solidaria Temporal de las Empresas Productoras de Cemento, a partir de la entrada en vigencia de este Decreto.

Artículo 4.- Se autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) a suscribir, dentro los cinco (5) días calendarios siguientes a la entrada en vigencia del presente Decreto, convenio tripartitos a nivel de cada una de las Empresas Hondureñas Productoras de Cemento para viabilizar el procedimiento de aplicación de crédito fiscal al Impuesto Sobre la Renta y aportación solidaria temporal, estos créditos se consideraran como parte de la recaudación para la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). La aplicación del crédito fiscal estará sujeta al control y fiscalización respectiva. Asimismo se faculta a la SEFIN para negociar los descuentos correspondientes según el volumen de compra del cemento, en ningún caso esta podrá negociar un precio superior al de la lista vigente al momento de emitida la orden de compra.

Artículo 5.- El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), procederá a realizar obras civiles en todo el territorio nacional, en forma directa o mediante las contrataciones de Empresas del sector privado

incluyendo empresas constructoras, empresas supervisoras, empresas de consultoría, empresas de gerenciamiento de proyectos y empresas desarrolladoras de proyectos y Asociaciones Comunitarias.

Artículo 6.- Autorizar al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), a suscribir convenios subsidiarios de coejecución de proyectos con otras instituciones de gobierno que estén vinculadas a la ejecución de proyectos de infraestructura como la Secretaría de Estado en las Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) y Fondo Vial, así como con alcaldías municipales, patronatos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias e iglesias.

Artículo 7.- Se autoriza al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y a las municipalidades que así lo decidan a suscribir convenios para la entrega de cemento con cargo a sus transferencias municipales, tales convenios deberán ser registrados en la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población.

Artículo 8.- Se autoriza al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), a canalizar el cemento hacia las Empresas que tienen contratos con el Estado para la construcción, reparación y rehabilitación de la red vial; el valor del cemento entregado será para reducir el costo de la obra contratada, ajustando las estimaciones de avance de obra, reduciendo el costo del cemento utilizado, previa calificación de la Institución ejecutora.

Artículo 9.- El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), estructurará una cartera de proyectos elegibles, dentro de los cuales se incluirá, entre otros los siguientes:

1. Pavimentación de calles en las zonas urbanas de las comunidades (pavimentación municipal);
2. Proyectos de Mejoramiento y conservación ubicados en la red vial secundaria y terciaria, que de acuerdo a evaluaciones técnicas cuenten con un adecuado sistema de drenaje. Estos podrán ser ejecutados ya sea mediante un proceso de licitación con financiamiento y con pagos parciales o totales con cemento;
3. Construcción de pisos de concreto para las casad de la familias más necesitadas, en el marco de la iniciativa de Pisos Saludables;
4. Autoconstrucción de proyectos con participación de las comunidades y de los gobiernos locales;
5. Ciclo vías para que los niños accedan a su escuela utilizando bicicletas o cualquier otro medio de transporte rural;
6. Instalaciones deportivas para la recreación y prevención;

7. Pavimentación del acceso hacia el centro de salud cuando este no estén aledaño a la plaza central;
8. Arreglo del acceso a un determinado atractivo turístico que posea la comunidad en sus alrededores; y ,
9. Construcción de un obra importante de drenaje menor o reparación de una obra de drenaje mayor, como un puente que sea de vital importancia para la accesibilidad integral de la comunidad.

Artículo 10.- El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), deberá implementar un sistema de gestión, planificación, control de calidad, seguimiento y verificación de la ejecución de los proyectos objeto de este Decreto; podrá contratar para estos propósitos los servicios profesionales de empresas privadas especializadas.

Artículo 11.- Toda compra de cemento realizada al amparo de este Decreto queda exenta del pago de Impuesto Sobre la Renta.

i. Avance Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2016	Mto. Ejecutado 2016
EDUCACION	10	9,463,854.43
MUNICIPAL	19	8,584,771.39
TOTAL	29	18,048,625.82

viii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2016	Mto. Ejecutado 2016
ATLANTIDA	2	4,359,903.30
CHOLUTECA	4	291,411.68
COMAYAGUA	1	499,915.60
COPAN	2	3,461,718.54
CORTES	1	35,750.35
FRANCISCO MORAZAN	9	3,183,681.96
INTIBUCÁ	1	385,909.58
LEMPIRA	3	3,103,788.83
OCOTEPEQUE	4	320,662.04
OLANCHO	2	2,405,883.94
TOTAL	29	18,048,625.82
