



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan
Operativo Anual POA-Presupuesto

I Trimestre 2024

INDICE

Introducción.....	2
Antecedentes	2
▪ Misión:	3
▪ Visión:	4
▪ Valores:	4
Resumen Ejecutivo	5
Proyectos FHIS	6
Avance Ejecución Física de Proyectos de Inversión.....	7
Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Primer Trimestre 2024	9
Resumen de Cuadro por Sector 2024	13
CARTERA BANCO MUNDIAL	14
▪ ✓ Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE 6822-HN).....	14
CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	30
▪ ✓ Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)	30
▪ ✓ Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira.	35
CARTERA KfW	42
▪ ✓ Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V	49
CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID).....	56
▪ ✓ Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS).....	56
▪ ✓ Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)	61

Introducción

Este informe de ejecución física financiera del plan operativo anual es una herramienta esencial para medir el desempeño de la institución en el logro de sus objetivos. Este tipo de informe permite evaluar la efectividad de los recursos asignados y su uso adecuado en relación con los resultados obtenidos. El análisis de la ejecución física y financiera nos ha permitido identificar las fortalezas y debilidades, así como las áreas de oportunidad para la mejora continua. Al proporcionar información detallada sobre el cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas, este informe es la recopilación de las actividades e inversiones realizadas por el FHIS durante el tercer trimestre del 2023.

Para este Primer Trimestre el FHIS alcanzo una Ejecución Acumulada de L. 109.462.340,17, en los cuales están incluidos los siguientes Programas y Proyectos como ser:

- **(BM)** Proyecto de recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota.
- **(BCIE)** Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE) /Proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira.
- **(USAID)** Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS)/ Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH).
- **(KFW)** Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE Fase IV y V./Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR FASE II).

Antecedentes

De acuerdo al Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-056-2019, se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), la cual debe de promover el Desarrollo Comunitario por medio de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos, en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerables de Honduras quien para el desarrollo de sus funciones debe contar con una Subsecretaría de Estado.

Se adscribe a dicha Secretaría de Estado, El Instituto Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), que fue creado mediante Decreto Ejecutivo PCM-013-2014 publicado el 30 de Mayo del 2014 y tiene como propósito la integración institucional del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y del Servicio Autónomo

Nacional de Acueducto y Alcantarillados (SANAA) y demás afines al sector, Independiente de su integración estas instituciones continuaron cumpliendo los objetivos establecidos en sus leyes constitutivas.

Y en la práctica el SANAA no se adscribió al IDECOAS

En PCM-05-2022 se adscribe el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y a la vez se crea el Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos que se adscribe a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y aglutina todos los entes relacionados al sector.

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es un organismo Desconcentrado de la Presidencia de la República, creado el 22 de febrero de 1990 y extendida su vida legal hasta el año 2026 según decreto No. 118-2022 cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados, en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social y/o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Asimismo, asesorará a los gobiernos locales con respecto a los procesos de captación de recursos de las fuentes de financiamiento nacionales y/o externas y las asiste en la transferencia de las capacidades técnicas y administrativas, para convertir a estos gobiernos locales en administradores eficientes de sus programas y proyectos, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Nación en aplicación del principio de Descentralización.

Misión:

Somos una Institución Estatal, desconcentrada, técnica y captadora de recursos que promueve el desarrollo local sostenible, participativo e incluyente mediante el fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, en municipales y sociedad civil, en alianza con socios estratégicos para desarrollar obras de infraestructura y proyectos de orientación social de acuerdo al plan de nación y visión de país de forma transparente y eficiente, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable de Honduras.

Visión:

Ser para el año 2026, la Institución líder en gestión y fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, para la ejecución de proyectos, que contribuya equitativamente al desarrollo sustentable nacional.

Valores:

- **Ética:** Ejercicio de las funciones con sujeción a las normas morales que promuevan la confianza de la población hondureña.
- **Integridad:** Actuación sustentada en la honradez, prudencia, entereza, rectitud y firmeza.
- **Compromiso:** Ejecución de proyectos que coadyuven al desarrollo local.
- **Transparencia:** Amplia difusión de información sobre nuestras actuaciones. Rendición de cuentas ante la sociedad.
- **Lealtad:** Actuar con fidelidad y rectitud hacia el FHIS y compañeros de trabajo, con el objetivo de identificarse con la institución.
- **Equidad:** El FHIS no hace distinción de credo, raza, de ninguna otra forma de discriminación humana.


Resultados Financieros y Físicos

SEDECOAS/FHIS, llega hasta los lugares más lejanos del país, para contribuir a mitigar las necesidades de la población más pobre y vulnerable a través de respuestas rápidas y concretas con proyectos de Agua y Saneamiento, Educación, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural.

El presupuesto de SEDECOAS/FHIS para la gestión 2023 al 31 de diciembre asciende a 2.331 Mil Millones de Lempiras y su ejecución acumulada al I trimestre asciende a 109.462 Millones de Lempiras, financiado tanto por fondos del Tesoro Nacional, como de Créditos y Donaciones de Organismos Internacionales, y cuya distribución, así como su participación porcentual en el presupuesto general de la institución se describe a continuación:

Fuente	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecución Acumulada I Trimestre		% de Participación en el Presupuesto Vigente
BM	L.	298.426.045,00	L.	298.426.045,00	L.	44.588.282,78	13%
BCIE	L.	358.211.977,00	L.	358.211.977,00	L.	11.346.754,72	15%
USAID	L.	98.275.329,00	L.	98.275.329,00	L.	14.124.955,85	4%
GOH*	L.	1.370.965.245,00	L.	1.370.965.245,00	L.	34.084.405,28	59%
KfW	L.	205.192.188,00	L.	205.192.188,00	L.	5.317.941,54	9%
TOTAL	L.	2.331.070.784,00	L.	2.331.070.784,00	L.	109.462.340,17	100%

* Incluye costo Operativo del FHIS

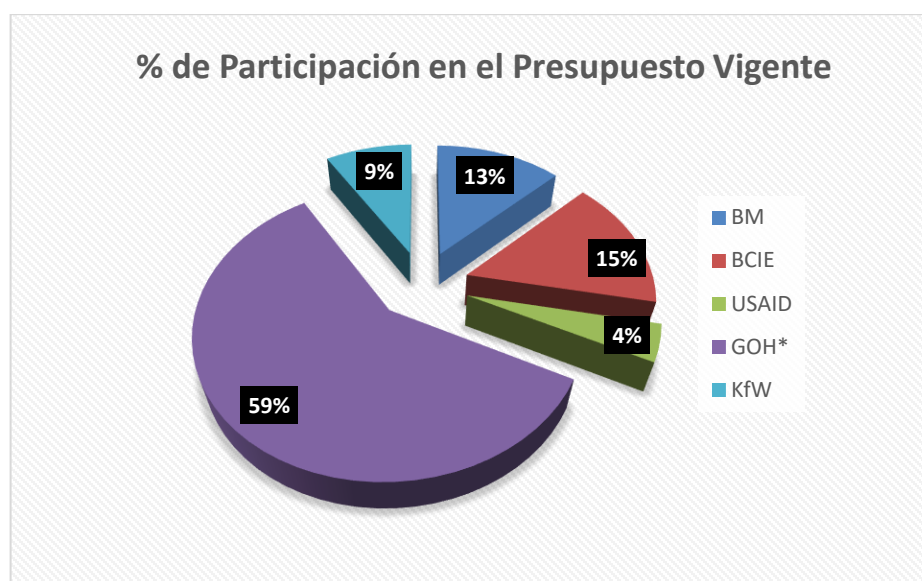

Proyectos FHIS

Fuente	Nombre del Proyecto	Nombre Corto	Sector	Modalidad Ejecución
BM	Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota	PRE 6822-HN	Infraestructura Escolar	Centralizados
BCIE	Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	BCIE No. 2239 MIFE	Infraestructura Escolar	PEC-Descentralizados
	Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira.	BCIE No. 2261	Agua y Saneamiento	Centralizados
KFW	Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar SE-FHIS FASE IV y V	PROMINE	Infraestructura Escolar	PEC-Descentralizados
	Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras	CONVIVIR	Infraestructura Social	Descentralizados
USAID	Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana	ICS	Infraestructura Social y Escolar	PEC/Centralizados
	Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras	PIOH	Infraestructura Escolar	PEC/Centralizados


Avance Ejecución Física de Proyectos de Inversión

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Metas			Ubicación y Observaciones
			Programación 2024	Ejecución Física al I Trimestre 2024		
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	
PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS	Centros educativos rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota en beneficio de la población afectada por los fenómenos naturales. PRE	CENTRO EDUCATIVO	20	4	20%	Los 4 subproyectos terminados son: 108446, 108447, 108452 y 108507
	Sistemas de agua rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota. PRE	SISTEMA DE AGUA	3	0	0%	Productos programados para el III y IV trimestre
	Infraestructura vial rehabilitada y reconstruida afectados por ciclones Eta e Iota. PRE	KILOMETRO	5	1	20%	
	Infraestructura en centros de salud pública rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota en beneficio de la población afectada por los fenómenos naturales. PRE	UNIDAD DE SALUD	1	0	0%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados. MIFE	CENTRO EDUCATIVO	42	7	17%	Meta cumplida para el I trimestre, productos programados para el II, III y IV trimestre
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE IV y V)	Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados. PROMINE	CENTRO EDUCATIVO	7	0	0%	Productos programados para el II, III y IV trimestre
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS FASE II	Espacios públicos recuperados y entregados para la seguridad ciudadana a las colonias, alcaldías y patronatos en beneficio de la población hondureña CONVIVIR II	OBRA	7	0	0%	Productos programados para el II, III y IV trimestre
	Jóvenes capacitados en habilidades sociales y laborales para personas jóvenes de entre las edades de 12-30 años en los municipios de Santa Rosa de Copán, Intibucá, La Esperanza y Juticalpa. CONVIVIR Fase II	CAPACITADO	810	0	0%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	Espacios públicos recuperados y entregados para la seguridad ciudadana a las colonias, alcaldías y patronatos en beneficio de la población hondureña ICS	OBRA	3	0	0%	La ejecución presupuestaria para el I trimestre se vio afectada por el cambio de autoridades en la institución, en especial el cambio en la firma de documentos de pago.
	Centros educativos construidos, reparados y/o ampliados ubicados en Choloma, San Pedro Sula, Chamelecón, La Lima, Tela y en Tegucigalpa en beneficio de niños y niñas de las zona urbana y rural de Honduras. ICS	CENTRO EDUCATIVO	3	1	33%	Productos programados para el III y IV trimestre
	Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud ubicados en La Ceiba, Sps y Tegucigalpa. ICS	OBRA	1	1	100%	
ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	Centros educativos construidos, reparados y/o ampliados en beneficio de niños y niñas de las zonas rural y urbanas en Honduras. PIOH	CENTRO EDUCATIVO	1	0	0%	Productos programados para el IV trimestre
	Infraestructura social (puentes y caja puente), rehabilitada y reconstruida en beneficio de la población a nivel Nacional PIOH	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	1	0	0%	
PROGRAMA DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS	Diseño de los sistemas de agua potable realizado. GRACIAS	DISEÑO	1	0	0%	La ejecución de proyectos se presenta hasta el VI trimestre

Ejecución Presupuestaria por Programas 2024

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Monto Planificado I Trimestre	Devengado al I Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% Ejecución I Trimestre/ Planificado I Trimestre	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
Programa 1: Actividades Centrales	L 1.145.388.050,00	L 1.145.388.050,00	L 100.203.961,33	L 31.803.824,44	L 31.803.824,44	L 789.139.643,59	32%	3%
Programa 11: Infraestructura Rural	L 282.287.531,00	L 282.287.531,00	L 70.571.883,00	L 7.903.168,06	L 7.903.168,06	L 271.524.839,20	11%	3%
Programa 12: Infraestructura Escolar	L 441.187.553,00	L 441.187.553,00	L 33.791.282,00	L 12.750.686,05	L 12.750.686,05	L 301.120.257,62	38%	3%
Programa 14: Fomento al Desarrollo Local	L 112.155.540,00	L 112.155.540,00	L 28.038.885,00	L 11.135.512,84	L 11.135.512,84	L 100.258.027,16	40%	10%
Programa 16: Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras	L 298.426.045,00	L 298.426.045,00	L 16.406.020,00	L 44.588.282,78	L 44.588.282,78	L 253.837.762,22	272%	15%
Programa 17: Programa de Agua y Saneamiento	L 51.626.065,00	L 51.626.065,00	L 8.725.737,00	L 1.281.866,00	L 1.281.866,00	L 49.984.199,00	0%	2%
TOTAL	L 2.331.070.784,00	L 2.331.070.784,00	L 257.737.768,33	L 109.463.340,17	L 109.463.340,17	L 1.765.864.728,79	42%	5%


Nota: Se considera el credito disponible ya que cuenta con los fondos reservados de cada proyecto, el saldo al I trimestre es de L. 2.221,607,443,83

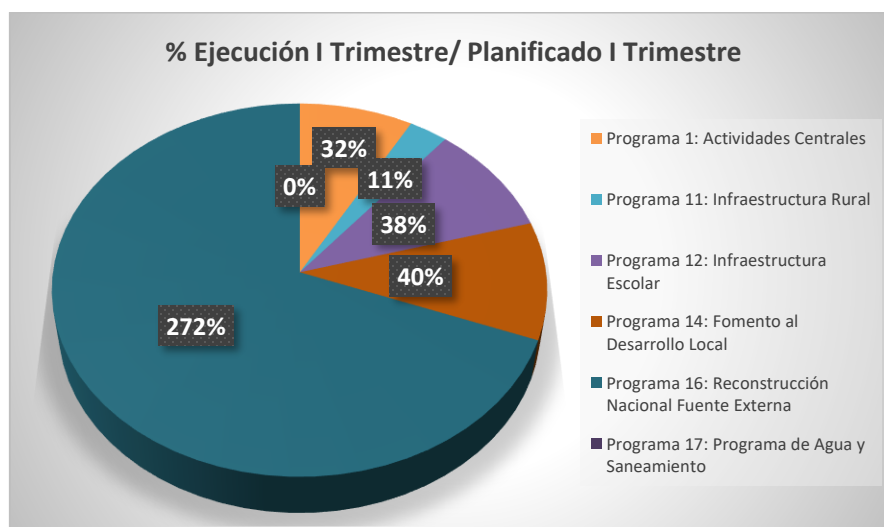

Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2024

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente 2024	Devengado al I Trimestre	Devengado Acumulado 2023	% Ejecución al I Trimestre / Presupuesto Vigente	% Acumulado al I Trimestre
Gasto Operativo/Gobierno	L. 1.145.388.050,00	L. 1.145.388.050,00	L. 31.803.824,44	L. 31.803.824,44	3%	3%
Obras Comunitarias Menores a Nivel Nacional FN	L. 225.577.195,00	L. 225.577.195,00	L. 2.280.580,84	L. 2.280.580,84	1%	1%
Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras PIOH	L. 56.710.336,00	L. 56.710.336,00	L. 5.622.587,22	L. 5.622.587,22	10%	10%
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE	L. 134.601.641,00	L. 134.601.641,00	L. 2.685.797,33	L. 2.685.797,33	2%	2%
Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras MIFE	L. 306.585.912,00	L. 306.585.912,00	L. 10.064.888,72	L. 10.064.888,72	3%	3%
Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS	L. 41.564.993,00	L. 41.564.993,00	L. 8.503.368,63	L. 8.503.368,63	20%	20%
Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jovenes CONVIVIR	L. 70.590.547,00	L. 70.590.547,00	L. 2.632.144,21	L. 2.632.144,21	4%	4%
Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales ETA e IOTA PRE	L. 298.426.045,00	L. 298.426.045,00	L. 44.588.282,78	L. 44.588.282,78	15%	15%
Programa de Ampliación del sistema de Abastecimiento de agua Potable en la Ciudad de Gracias	L. 51.626.065,00	L. 51.626.065,00	L. 1.281.866,00	L. 1.281.866,00	2%	2%
TOTAL	L. 2.331.070.784,00	L. 2.331.070.784,00	L. 109.463.340,17	L. 109.463.340,17	5%	5%


Nota: Se considera el credito disponible ya que cuenta con los fondos reservados de cada proyecto, el saldo al I trimestre es de L. 2.221,607,443,83

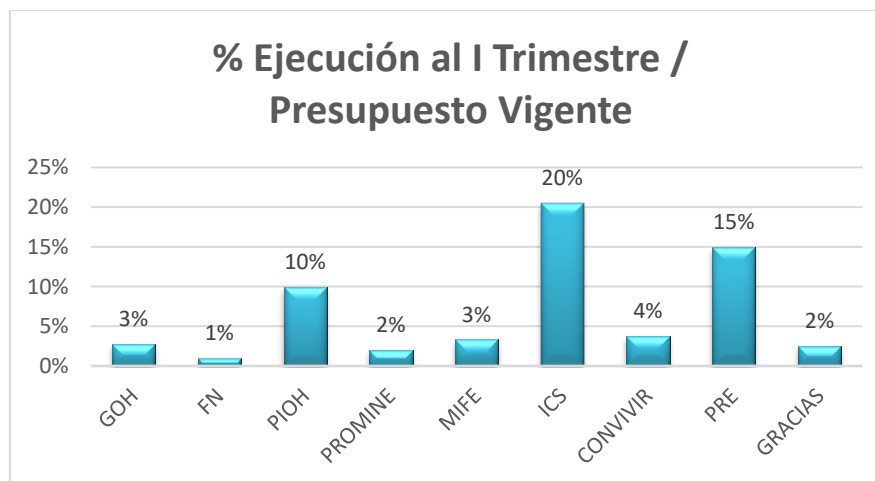

Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Primer Trimestre 2024

Grupo	Aprobado	Presupuesto Vigente por Grupo	Devengado I Trimestre	Devengado Acumulado al I Trimestre	Disponible	% Ejecución I Trimestre/ Presupuesto Vigente	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
SERVICIOS PERSONALES	L. 155.497.701,00	L. 155.497.701,00	L. 28.216.381,76	L. 28.216.381,76	L. 127.277.607,29	18%	18%
SERVICIOS NO PERSONALES	L. 211.277.814,00	L. 211.277.814,00	L. 31.724.111,99	L. 31.724.111,99	L. 166.816.008,97	15%	15%
MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 19.478.176,00	L. 19.478.176,00	L. 989.834,11	L. 989.834,11	L. 18.002.856,15	5%	5%
BIENES CAPITALIZABLES	L. 1.935.611.955,00	L. 1.935.611.955,00	L. 48.533.012,31	L. 48.533.012,31	L. 1.441.563.118,38	3%	3%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. 9.205.138,00	L. 9.205.138,00	L. -	L. -	L. 9.205.138,00	0%	0%
Total	L. 2.331.070.784,00	L. 2.331.070.784,00	L. 109.463.340,17	L. 109.463.340,17	L. 1.762.864.728,79	5%	5%

Nota: Se considera el credito disponible ya que cuenta con los fondos reservados de cada proyecto, el saldo al I trimestre es de L. 2.221,607,443,83

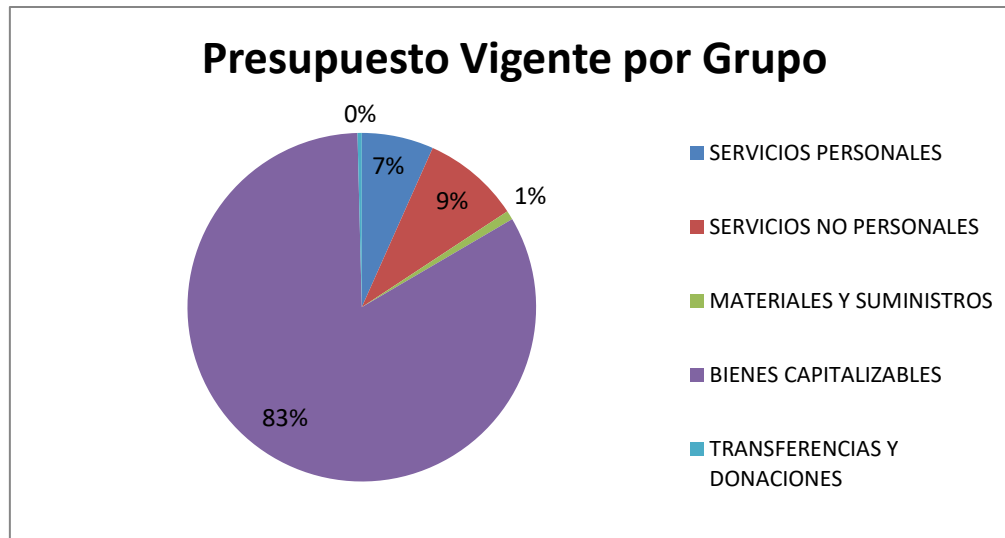

Ejecución por Objeto del Gasto Primer Trimestre del 2024

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
1100	Sueldos basicos	78.102.779,00	78.102.779,00	15.852.018,42	62.247.538,84
11510	Decimotercer mes	6.515.110,00	6.515.110,00	27.734,96	6.487.314,14
11520	Decimocuarto mes	6.515.110,00	6.515.110,00	277.755,30	6.237.354,70
11600	Complementos	5.238.328,00	5.238.328,00	1.528.574,41	3.709.753,59
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11313.121,00	11313.121,00	2.290.686,93	9.022.434,07
11750	Contribuciones para Seguro Social	2.401.600,00	2.401.600,00	700.419,15	1.701.180,85
12100	Sueldos basicos	37.800.475,00	37.800.475,00	7.258.475,01	30.541.570,68
12410	Decimotercer mes	3.150.040,00	3.150.040,00	13.836,88	3.136.203,12
12420	Decimocuarto mes	3.150.040,00	3.150.040,00	22.808,26	3.127.231,74
12550	Contribuciones para Seguro Social	1.311.098,00	1.311.098,00	244.072,44	1.067.025,56
21110	Suministros de energia electrica	300.000,00	300.000,00	88.978,13	183.910,95
21200	Agua	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
22100	Alquiler de edificios, viviendas locales	6.000.000,00	6.000.000,00	1.523.521,87	3.303.000,00
23200	mantenimiento y reparacion de equipos y medios de transporte	1.574.000,00	1.574.000,00	33.804,40	1.408.179,10
23600	Mantenimiento de sistemas informaticos	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
24200	Estudios, investigaciones y analisis de factibilidad	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
24300	Servicios juridicos	940.000,00	940.000,00	177.000,00	763.000,00
24400	Servicios de contabilidad y auditoria	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
24500	servicios de capacitacion	2.251.215,00	2.251.215,00	270.000,00	1.981.215,00
24710	servicios de consultoria de gestion administrativa y financiera	4.745.216,00	4.745.216,00	1.502.333,33	3.242.882,67
24720	Servicios de consultoria de monitoreo y evaluacion	11.022.946,00	11.022.946,00	2.945.000,00	8.077.946,00
25100	Servicio de transporte	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
25300	Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones	2.000.000,00	2.000.000,00	920.843,59	1.079.156,41
25400	Primas y gastos de seguro	10.921.142,00	10.921.142,00	69.564,65	10.851.864,35
25500	Comisiones y Gastos bancarios	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
25600	Publicidad y propaganda	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
25700	Servicio de internet	21.000,00	21.000,00	1.635,12	19.364,88
25900	Otros servicios comerciales y financieros	400.000,00	400.000,00	0,00	209.076,77
26110	Pasajes nacionales	240.000,00	240.000,00	8.961,00	190.147,28
26210	Viaticos nacionales	8.072.168,00	8.072.168,00	1.355.161,56	6.695.600,18
27210	Tasas	625.000,00	625.000,00	1.050,00	623.950,00
29100	Ceremonial y Protocolo	207.142,00	207.142,00	0,00	207.142,00
31110	Productos alimenticios y bebidas	134.245,00	134.245,00	37.215,49	91.128,45
32310	Prendas de vestir	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
33100	Productos de papel y carton	520.000,00	520.000,00	0,00	517.010,00
33300	Productos de artes graficas	95.000,00	95.000,00	0,00	75.000,00
33500	Libros, revistas y periodicos	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
33700	Especies Timbradas y valores	30.000,00	30.000,00	1.100,00	28.900,00
34400	Llantas y camaras de aire	999.613,00	999.613,00	0,00	999.613,00
35610	Gasolina	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
35620	Diesel	2.125.000,00	2.125.000,00	291.976,49	1.785.235,80
35650	Aceites y grasas lubricantes	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
35800	Productos de material plastico	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
39100	Elementos de limpieza y aseo personal	50.000,00	50.000,00	15.157,16	1407,97
39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	565.000,00	565.000,00	0,00	565.000,00
39300	Utiles y materiales electricos	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
39600	Repuestos y Accesorios	1.747.937,00	1.747.937,00	0,00	1.736.937,00
42110	Muebles varios de oficina	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
42600	Equipos para computacion	95.534,00	95.534,00	0,00	95.534,00
42710	Muebles y equipos educacionales	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	451.522.944,00	451.522.944,00	2.280.580,84	120.620.339,42
Total		765.707.090,00	765.707.090,00	39.740.265,39	725.966.824,61

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
2110	Suministros de energía eléctrica	440.000,00	440.000,00	53.521,95	386.478,05
21420	Telefonía fija	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
22100	Alquileres de edificios, vivienda y locales	3.600.000,00	3.600.000,00	760.320,35	2.199.834,59
22220	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	2.952.569,00	2.952.569,00	246.047,42	2.550.691,49
23100	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	576.000,00	576.000,00	128.056,97	447.943,03
23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	600.000,00	600.000,00	47.801,96	552.198,04
23360	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	245.001,00	245.001,00	0,00	245.001,00
23390	Mantenimiento y reparación de otros equipos	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23500	Limpieza, Aseo y fumigación	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	44.205.630,00	44.205.630,00	5.135.730,51	38.632.699,41
24300	Servicios Jurídicos	0,00	1.000.000,00	244.220,79	755.779,21
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	5.749.098,00	5.749.098,00	176.502,97	4.866.583,15
24500	Servicios de Capacitación	12.985.000,00	12.985.000,00	278.000,00	12.005.000,00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	356.000,00	356.000,00	0,00	356.000,00
24710	Servicios de Consultoría de gestión administrativa y financiera	41.048.500,00	40.048.500,00	7.159.612,03	25.241.341,25
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	3.770.000,00	3.770.000,00	466.056,33	2.638.296,47
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	785.000,00	1.045.000,00	87.793,13	826.960,00
25400	Primas y Gastos de Seguro	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
25700	Servicio de Internet	490.000,00	490.000,00	66.463,10	366.154,78
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	235.000,00	235.000,00	3.284,40	231.715,60
26110	Pasajes Nacionales	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
26210	Viáticos Nacionales	6.203.998,00	5.943.998,00	405.706,75	5.528.134,99
27210	Tasas	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
29100	Ceremonial y protocolo	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	1.238.875,00	1.238.875,00	0,00	1.238.875,00
32310	Prendas de Vestir	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00
33100	Productos de papel y cartón	615.000,00	615.000,00	0,00	615.000,00
33300	Productos de Artes Gráficas	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00
35620	Diesel	3.185.066,00	3.185.066,00	94.463,99	2.726.229,91
39100	Elementos de limpieza y aseo personal	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00
39600	Repuestos y Accesorios	1.507.056,00	1.507.056,00	2.115,49	1.504.940,51
42110	Muebles Varios de Oficina	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
42120	Equipos Varios de Oficina	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	5.300.000,00	15.875.000,00	0,00	15.875.000,00
42600	Equipos para Computación	10.250.000,00	15.513.605,00	4.308.475,00	11.205.130,00
45100	Aplicaciones Informáticas	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
47110	Construcciones y Mejoras de bienes en Dominio Privado	27.489.000,00	27.489.000,00	0,00	27.489.000,00
74120	Supervisión de construcciones y mejoras de bienes en Dominio Privado	25.286.494,00	25.286.494,00	171.870,89	25.114.623,11
47210	Construcciones y Mejoras de bienes en Dominio Público	1.064.783.824,00	1.048.945.219,00	36.078.737,07	911.217.992,58
47220	Supervisión de construcciones y mejoras de bienes en Dominio Público	63.518.054,00	63.518.054,00	1.698.127,29	46.574.615,49
54110	Ayuda Social a Personas (Transferencia de capital)	9.205.138,00	9.205.138,00	0,00	9.205.138,00
Total		1.351.560.303,00	1.351.560.303,00	57.612.908,39	1.293.947.394,61

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	192.000,00	192.000,00	146.497,76	45.502,24
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de tracción y Elevación	554.752,00	554.752,00	182.998,96	371.753,04
23600	Mantenimiento de sistemas Informáticos	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	484.000,00	484.000,00	0,00	484.000,00
24500	Servicios de Capacitación	1419.012,00	1419.012,00	0,00	1419.012,00
24710	Servicios de consultoría de gestión administrativa y financiera	14.087.221,00	14.087.221,00	3.584.650,00	10.502.571,00
24720	Servicios de consultoría de monitoreo y evaluación	11.898.000,00	11.898.000,00	2.417.465,62	9.480.534,38
25100	Servicio de transporte	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
25300	Servicio de imprenta, Publicaciones y Reproducciones	431.759,00	431.759,00	43.585,00	388.174,00
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26110	Pasajes Nacionales	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
26210	Viajeros Nacionales	3.096.000,00	3.096.000,00	1.191.942,34	1.904.057,66
29100	Ceremonial y Protocolo	102.158,00	102.158,00	0,00	102.158,00
31110	Productos alimenticios y bebidas	90.000,00	90.000,00	1.639,09	88.360,91
32310	Prendas de vestir	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
33100	Productos de papel y cartón	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	695.000,00	695.000,00	0,00	695.000,00
35610	Gasolina	868.384,00	868.384,00	440.065,40	428.318,60
35620	Diesel	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
39200	Útiles de escritorio, Oficina y Enseñanza	25.000,00	25.000,00	18.360,00	6.640,00
39600	Repuestos y accesorios	810.000,00	810.000,00	87.741,00	722.259,00
42600	Equipos para computación	1.603.200,00	1.603.200,00		1.580.562,75
42900	Equipos para electrificación (medidores, transformadores y postes)	750.000,00	750.000,00	22.637,25	750.000,00
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	104.349.347,00	104.349.347,00	0,00	104.349.347,00
47120	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	6.626.355,00	6.626.355,00	0,00	6.626.355,00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	63.537.203,00	63.537.203,00	0,00	59.564.619,03
Total General		2.331.070.784,00	2.331.070.784,00	105.490.756,20	2.221.607.443,83

Resumen de Cuadro por Sector 2024

SECTOR	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
AGUA Y SANEAMIENTO	0	4	13.672.097,52	231	118.079
INFRAESTRUCTURA VIAL	1	4	8.322.418,99	157	20.002
EMPRENDIMIENTO Y VALORES	0	6	1.506.000,00	5	0
PREVENCION SITUACIONAL/CONVIVENCIA	1	3	1.295.576,52	87	717.824
EDUCACION	12	59	16.761.228,01	895	10.206
TOTAL	14	76	41.557.321,04	1.375	866.111

Nota: El monto total refleja la inversión realizado por los proyectos en Construcción

Resumen de Cuadro por Departamento 2024

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
ATLANTIDA	1	2	195.656,94	65	450.791
COMAYAGUA	1	6	960.477,68	196	73.141
COPAN	0	4	6.185.342,54	86	12.915
CORTES	5	24	7.150.561,03	503	5.652
EL PARAISO	1	0	448.456,00	17	29
FRANCISCO MORAZAN	1	4	5.425.142,63	93	1.653
INTIBUCÁ	0	3	821.641,19	29	268.000
LA PAZ	2	1	-	28	82
LEMPIRA	0	5	1.113.927,34	81	557
OCOTEPEQUE	0	1	321.802,70	14	32
OLANCHO	2	11	3.583.616,70	22	93
SANTA BARBARA	1	12	2.639.076,45	72	7.087
YORO	0	3	12.711.619,84	169	46.079
TOTAL	14	76	41.557.321,04	1.375	866.111

Nota: El monto total refleja la inversión realizado por los proyectos en Construcción

Resumen de Cuadro por Otras Inversiones 2024

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	27.460.012,04
GASTO OPERATIVO DE PROGRAMAS	6.361.601,81
ACTIVIDADES CENTRALES FHIS	34.084.405,28
TOTAL	67.906.019,13

CARTERA BANCO MUNDIAL



✓ **Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE 6822-HN)**



i. Antecedentes

Entre los días 1 y 16 de noviembre de 2020, dos tormentas tropicales consecutivas, Eta e Iota, devastaron a Honduras con una magnitud de impacto económico y social comparable a la del huracán Mitch de 1998. En respuesta a la emergencia causada, el Gobierno de Honduras (GdH) solicitó al Banco Mundial (BM) un financiamiento de US\$150 millones para un Proyecto de Recuperación de Emergencia.

El 8 de marzo de 2021 el Gobierno de Honduras suscribió con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) el Convenio de Crédito No. 6822-HN, por un monto de US\$150.000.000.00, aprobado mediante Decreto Legislativo No.10-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 5 de mayo de 2021, fondos que financiaran el Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE), habiéndose cumplido con las condiciones de efectividad el 4 de junio de 2021 y efectuándose el Primer Desembolso el 28 de junio de 2021 por un monto de USD\$ 4.36 Millones.

El Proyecto se enfoca en la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública en salud, educación, agua y saneamiento, vial, comunitaria y vivienda en las zonas geográficas del país afectadas por los ciclones tropicales Eta e Iota.

La implementación, coordinación, planificación y seguimiento general del Proyecto se llevará de manera centralizada en la SEDECOAS, a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), quien contará con personal especializado en diferentes áreas que garanticen el cumplimiento de los estándares del BM.

ii. **Objetivo General**

El PRE tiene por objetivo atender las necesidades identificadas como prioritarias para reactivar la economía y apoyar las más urgentes necesidades de la población afectada por los fenómenos naturales ETA e IOTA, como respuesta de emergencia y recuperación de Honduras, y, en esta perspectiva, fortalecer la capacidad institucional del Estado para gestionar una ejecución eficaz, eficiente y transparente.

iii. **Objetivos Específicos**

- Realizar operaciones de asistencia y respuesta de emergencia, salud y seguridad pública.
- Realizar la rehabilitación y construcción resiliente de la infraestructura pública y Comunitaria y Restablecimiento de los servicios públicos.
- Mejorar la capacidad instalada del Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.

iv. **Descripción**

Componente 1: Operaciones de asistencia y respuesta de emergencia, salud y seguridad pública (US\$ 17.3 MILLONES)

Bajo este componente se financian actividades y acciones de respuesta y seguridad pública como resultado de los daños causados por los ciclones Eta e Iota. Son elegibles actividades de respuesta inmediata realizadas por el Gobierno de Honduras previo a la fecha de efectividad del Crédito.

Componente 2: Rehabilitación y reconstrucción resiliente de la infraestructura pública y comunitaria y restablecimiento de los servicios públicos (US\$121.7 MILLONES)

Este componente se financia la preparación técnica, la implementación de reparaciones urgentes, rehabilitación y reconstrucción resiliente de la infraestructura pública y comunitaria de alta prioridad, incluido el costo de la reubicación temporal y la inspección o actividades de diseño necesarias para instalaciones de alta prioridad que requieran una nueva construcción.

Componente 3: Apoyo institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción (US\$11.0 MILLONES)

El componente se financia la gestión de Proyecto (financiero y fiduciario), la capacidad técnica e institucional, auditorías técnicas, financieras y sociales, monitoreo y seguimiento, cumplimiento social y ambiental, mecanismo de atención y resolución de quejas y denuncias, preparaciones informes, evaluación de medio términos, estudios de línea base.

v. Focalización

Para determinar las zonas y sectores de intervención, el Gobierno de Honduras con la asistencia técnica de organizaciones y agencias internacionales, ha elaborado el documento borrador denominado “Evaluación de daños y pérdidas causadas por las tormentas tropicales Eta e Iota”¹

También se cuenta con la base de datos del estudio levantado por la SEDECOAS denominado “Plataforma de información de incidencias de la infraestructura dañada por las tormentas Eta e Iota”, que consolida los datos de las tres fuentes del Gobierno. De igual manera, se cuenta con listas de infraestructura que fue levantada por las instituciones sectoriales en las oficinas de COPECO Tegucigalpa, en un centro de acopio instalado luego de los eventos de desastre de las tormentas tropicales Eta e Iota.

Las acciones de respuesta de socorro y atención a personas están siendo financiadas bajo el Componente 1 y, las obras de reconstrucción y rehabilitación, elegibles y priorizadas, serán financiadas bajo el Componente 2, estas se ejecutarán en los municipios y sectores afectados por las tormentas tropicales Eta e Iota.

vi. Sector de Intervención

Los sectores por intervenir son:



Infraestructura de Salud: Rehabilitación, reconstrucción, construcción de obras de mitigación de

¹ Dalla_Honduras, 2020

centros de salud, UAPS, CIS, Clínicos y hospitales.

- *Infraestructura Vial:* Habilitación, reposición de carreteras primarias, secundarias, carreteras terciarias (caminos vecinales), habilitación, reposición y reparación de puentes, puentes de doble vía cajas puentes, vados en caminos, construcción de obras de mitigación para proteger estructuras viales, rehabilitación de calles (pavimentadas y no pavimentadas), rehabilitación de caminos rurales de terracería, mantenimiento en los cauces de los ríos (incluye limpieza, dragado, etc.).
- *Infraestructura Escolar:* Rehabilitación, reparación y reposición de Centros de Educación de manera integral incluyendo obras ambientales y de mitigación.
- *Infraestructura Agua y Saneamiento:* Reparación o rehabilitación en estructuras de sistemas de agua potables (obras tomas, desarenadores, pases aéreos, tanques de almacenamiento, cajas de registro, rompe cargas, cajas distribuidoras de caudal, etc.), plantas de tratamiento y sistemas de aguas residuales, construcción de obras de mitigación para la protección de estructuras de los sistemas de agua potable y residuales, equipamiento de agua potable y residuales.
- *Infraestructura Comunitaria:* Rehabilitación de centros comunitarios y servicios públicos básicos (estación de bomberos, estaciones policiales, albergues, alcaldías, etc.), reposición de centros comunitarios, equipamiento para rehabilitación de centros comunitarios y servicios públicos básicos.

vii. Duración del Proyecto:

El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de 5 años y medio incluyendo actividades de gestión, socialización, adquisiciones, etc.

viii. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	175.537.263,00	1.116.987,87	1%
2022	259.608.231,00	53.027.150,75	20%
2023	432.092.852,00	130.271.743,46	30%
2024	298.426.045,00	44.588.285,78	15%

ix. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
AGUA Y SANEAMIENTO	0	4	13.672.097,52	231	118.079
INFRAESTRUCTURA VIAL	1	4	8.322.418,99	157	20.002
EDUCACION	4	21	8.770.106,97	674	5.904
TOTAL	5	29	30.764.623,48	1062	143.985

x. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios directos 2023
ATLANTIDA	0	1	-	37	248
COMAYAGUA	1	5	960.477,68	196	73.141
COPAN	0	2	5.683.342,54	85	12.915
CORTES	0	10	4.129.173,82	372	3.817
EL PARAISO	1	0	448.456,00	17	29
FRANCISCO MORAZAN	0	2	3.358.787,11	37	422
LA PAZ	2	1	-	28	82
LEMPIRA	0	2	511.887,34	35	133
OCOTEPEQUE	0	1	321.802,70	14	32
SANTA BARBARA	1	2	2.639.076,45	72	7.087
YORO	0	3	12.711.619,84	169	46.079
TOTAL	5	29	30.764.623,48	1062	143.985

xi. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	12.588.365,15
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	1.235.294,15
TOTAL	13.823.659,30

xii. Situación presupuestaria

El presupuesto aprobado para el año 2024 es de L 298,426,045.00, ejecutándose al cierre del primer trimestre el monto de **L 44,588,282.78** equivalente al **15 %**.

Así mismo, a partir de las revisiones y reprogramaciones de actividades en el Plan Operativo Anual (POA) y en el Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC), se solicitaron modificaciones presupuestarias internas entre actividades y objetos del gasto, sin modificarse el presupuesto global vigente.

El 72% del presupuesto está concentrado en el Componente 2 para ejecución de obras de las cuales a la fecha ascienden a 59 subproyectos. Las primeras 25 obras obedecen a subproyectos de reposición/reparación de centros educativos los cuales iniciaron su ejecución en el IV Trimestre del año 2022. En el III trimestre del 2023 se han iniciado 3 obras de agua y saneamiento y 17 obras de centros educativos. En el IV trimestre del 2023 se han iniciado 4 subproyectos viales y 8 nuevos subproyectos en centros educativos. En el primer trimestre de 2024 iniciaron 2 subproyectos, uno de infraestructura vial y otro de agua potable. Las formulaciones de nuevas intervenciones se han continuado en todos los sectores

El monto del financiamiento del Crédito es de US\$ 150,000.00, de los cuales al 31 de marzo se tiene una ejecución financiera acumulada que asciende a L 830,423,580 equivalentes a USD 33,975,602 que

Componentes	(a) Asignación Convenio Crédito		(b) = (c + d) Total Comprometido		(c) Ejecutado acumulado		(d) Comprometido por ejecutar **		(e) = (a - b) Disponibile
	US\$	* HNL	US\$	HNL	US\$	HNL	US\$	HNL	US\$
1) Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública	17,300,000	420,390,000	16,818,559	407,708,157	16,818,559	407,708,157	-	-	481,441
<i>Categoría: Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, y costos operativos bajo la Parte 1 del Proyecto.</i>	17,300,000	420,390,000	16,818,559	407,708,157	16,818,559	407,708,157	-	-	481,441
2) Rehabilitación y Construcción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos	119,200,000	2,896,560,000	29,841,952	735,347,956	12,941,263	318,913,291	16,900,689	416,434,665	89,358,048
<i>Categoría: Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 2 del Proyecto</i>	119,200,000	2,896,560,000	29,841,952	735,347,956	12,941,263	318,913,291	16,900,689	416,434,665	89,358,048
3) Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción	11,000,000	267,300,000	4,577,552	112,685,548	3,215,779	79,131,332	1,361,773	33,554,216	6,422,448
<i>Categoría: Bienes, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 3 del Proyecto</i>	11,000,000	267,300,000	4,577,552	112,685,548	3,215,779	79,131,332	1,361,773	33,554,216.43	6,422,448
4) Medidas de Protección Financiera de Emergencia	2,500,000	60,750,000	2,500,000	60,750,000	1,000,000	24,670,800	1,500,000	36,079,200	-
<i>Categoría: Primas anuales en virtud de la Parte 4 del Proyecto</i>	2,500,000	60,750,000	2,500,000	60,750,000	1,000,000	24,670,800	1,500,000	36,079,200.00	-
Total	\$ 150,000,000	HNL 3,645,000,000	\$ 53,738,063	HNL 1,316,491,662	\$ 33,975,602	HNL 830,423,580	\$ 19,762,462	HNL 486,068,082	\$ 96,261,937

* Se aplica la tasa de L 24.3 establecida en el Documento del Proyecto (PAD) y en el presupuesto global en los Sistemas: SNIPH, UEPEX y Sistema Financiero del FHIS.
 ** Valores comprometidos con contrato

representa el 23% del monto de Convenio; mostrándose a la fecha una disponibilidad por componentes de inversión, así:

xiii. Desembolsos

Al 31 de marzo del 2024 se ha desembolsado la cantidad de US\$ 37,258,547.38 equivalente a L 907,349,937.33; representa el 25% del total del Crédito. Del total desembolsado USD\$ 16.8 millones equivalente a L 407,7 millones, corresponde a reembolso bajo el Componente 1 mediante pago directo a la SEFIN por actividades de respuesta inmediata realizadas por la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS), así mismo, a petición de la SEFIN, se efectuó desembolso mediante pago directo por anticipo/prima de la Póliza de Seguro por exceso de lluvia (XSR) a The Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF-SPC), por US\$ 1 millón.

Desembolso	Dólares	Lempiras
Anticipo Cuenta Designada del Proyecto (Cta. 11101-20-000949-1 BCH)	19,439,988.00	474,970,979.91
Reembolso bajo Componente 1, con Pago Directo a la SEFIN. (Cta. 11101-20-000952-1)	16,818,559.38	407,708,157.42
Pago Directo – CCRIF	1,000,000.00	24,670,800.00
Total	37,258,547.38	907,349,937.33

xiv. Reasignación de fondos entre Categorías de Inversión.

Enmienda No. 1

Mediante Oficio No. SE-SEDECOAS-FHIS-620/2021 se solicita la primera reasignación de fondos entre Categorías de Inversión respaldada en Dictámenes Técnicos Favorables No. 057-2021 (septiembre 2021) y 068-2021 (noviembre 2021) emitidos por la SEFIN y aprobada por el Banco Mundial el 16 de diciembre de 2021.

cubierto con el presupuesto de la Categoría 2. del Componente 2., tal como se muestra en el cuadro siguiente.

La reasignación se hace entre el Componente 1. y 2. para cubrir el sobregiro de USD\$ 7,300,000 en el monto original asignado bajo la Categoría 1. del Componente 1.

Enmienda No. 2

En fecha 3 de agosto de 2023 la Secretaría de Finanzas solicita al Banco Mundial aprobación de la segunda enmienda al Convenio de Crédito, para incorporar el financiamiento del pago de la Prima del Fondo de Seguro contra Riesgos Catastróficos en el Caribe (CCRIF) de Honduras. La enmienda al Convenio de Financiamiento fue firmada el 31 de octubre de 2023 con Dictamen Técnico Favorable No.037-2023, que consiste en disminuir el Componente 2 en US\$ 2,500,000.00 y crear el Componente 4 – Primas anuales en virtud de la Parte 4 del Proyecto (Medidas de protección financiera de emergencia).

Categoría	Descripción de las categorías	Asignado Convenio Original	Enmienda 1	Enmienda 2	Asignación actual
(1)	Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, y costos operativos bajo la Parte 1 del Proyecto.	10,000,000	7,300,000	-	17,300,000
(2)	Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 2 del Proyecto.	129,000,000	(7,300,000)	(2,500,000)	119,200,000
(3)	Bienes, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 3 del Proyecto.	11,000,000	-		11,000,000
(4)	Primas anuales en virtud de la Parte 4 del Proyecto	-	-	2,500,000	2,500,000
Total		\$ 150,000,000	\$0.00	\$0.00	\$150,000,000

xv. Reembolso gastos efectuados bajo el Componente 1- Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia y Salud y Seguridad Pública.

Mediante Memorando 207-2021 SE-SEDECOAS-FHS del 11 de junio de 2021, se nombró Comité Interino para la revisión de documentación para reembolso del Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras, en cumplimiento a esto, al 31 de diciembre de 2021 se revisó documentación de procesos por un monto total de L591,952,044.29, de gastos

ejecutados por la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS) y la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), en acciones de respuesta de socorro y atención a personas, así:

Institución	Lempiras
SEDIS	415.939.122,84
COPECO	176,012,921.45
Total	591,952,044.29

SEDIS: Del total de los gastos presentados, al 30 de junio de 2022 se han reembolsado con pago directo a la SEFIN un total de L 407,708,157.42 equivalente a USD 16,818,559.38, a través de Sistema de Desembolso (Client Connection). No se efectuarán más reembolsos.

COPECO: A la fecha ningún gasto se ha sometido a reembolso. Contratos de limpieza de calles están en proceso de revisión, y de ser elegibles, serán sometidos a reembolso con fondos del Contrato de Préstamo 5328 BL-HO, Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

xvi. AVANCE DE ACTIVIDADES

i. Componente 1 - Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia y Salud y Seguridad Pública.

A través de la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS) fueron atendidas 60,000 familias (equivalente a 300,000 personas) con kit de cocina, kit de higiene personal de niños y adultos, kit de limpieza, camas, estufas, filtros de agua, pañales, material de bioseguridad, toallas de baño, baldes plásticos, entre otros).

El componente 1, estuvo vigente del 2 de noviembre de 2020 al 8 marzo de 2021. Por tanto, durante la duración del proyecto no tendrá nuevas actividades a ejecutarse.

ii. Componente 2 - Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos (Obras).

Con el financiamiento de otras fuentes, el FHIS ha identificado zonas y sitios afectados por la tormenta Eta e Iota, con el fin de formular diseños finales para la rehabilitación y/o reconstrucción en infraestructura educativa, infraestructura vial (puentes) y en el sector de agua y saneamiento.

La Unidad Ejecutora del Proyecto a través de su personal técnico y con el apoyo de la Dirección de Proyectos del FHIS-SEDECOAS ha realizado revisiones a la formulación de los subproyectos priorizados, para verificar que estos estén cumpliendo con los lineamientos técnicos, ambientales, sociales, y otros relevantes que son parte de los compromisos adquiridos con el Banco Mundial.

A continuación, se detalla el estado de los avances y asuntos pendientes por sectores de intervención.

Infraestructura Educativa

En Ejecución

- Un primer lote de 25 subproyectos de reposición, reparación y ampliación de centros educativos adjudicados por un monto de L 88,289,931.04 y para la supervisión L 10,004,647.38. Las obras dieron inicio en noviembre de 2022. La ejecución al cierre del 1er trimestre del año 2024 es de L. 85,028,647.85 equivalente al 97% para obras y de L. 5,904,228.64 equivalente al 59% para la supervisión. (Ver Anexo 1: Detalle de Subproyectos PRE).
- Un segundo paquete consta de 17 subproyectos los cuales iniciaron su ejecución en el II y III trimestre del 2023 por un monto de L. 129,639,668.54 y para la supervisión L 17,661,922.00. La ejecución al cierre del 1er trimestre del año 2024 fue de L. 65,316,504.37 equivalente al 50% para obras y de L. 7,349,225.71 equivalente al 41% para la supervisión. (Ver Anexo 1: Detalle de Subproyectos PRE).
- Un tercer grupo de 8 subproyectos dieron inicio en el último trimestre del año por un monto de L. 175,302,970.39 y para la supervisión L 24,306,748.00. La ejecución al cierre del 1er trimestre del año 2024 es de L. 52,195,951.44 equivalente al 30% para obras y de L. 6,694,048.26

equivalente al 27% para la supervisión. (Ver Anexo 1: Detalle de Subproyectos PRE).

En Licitación, Aprobación y Formulación

- En evaluación de ofertas recibidas del proceso de Licitación correspondiente se encuentran 3 subproyectos por un monto presupuestado de L. 58,903,083.28. Los subproyectos en evaluación son:

No.	Código	Nombre del Subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	108351	Reposición CEPB Roberto Micheletti Bain	Francisco Morazán	D.C.	Col. La Soledad
2	108500	Reparación CB Luis Bográn	Yoro	Morazán	El Filón
3	108272	Reparación CEBB Cámara Junior No. 1	Francisco Morazán	D.C.	Colonia San Luis

- En Licitación se encuentran 3 subproyectos por un monto presupuestado de L. 94,612,165.26. Los subproyectos en evaluación son:

No.	Código	Nombre del Subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	110028	Reposición CEPB Federico Froebel	Colón	Tocoa	Barrio El Centro
2	110030	Reposición CEB Ramon Montoya	Colón	Tocoa	Aldea Prieta
3	110031	Reposición Escuela Padre Reyes Y CCEPREB Nilsa Anastasia Solano	Colón	Santa Rosa De Aguan	Aldea La Planada

- En aprobación por el Banco Mundial o por el Comité de Operaciones del FHIS se encuentran 6 subproyectos por un monto presupuestado de L 120,955,164.84. Los subproyectos educativos próximos por licitarse son los siguientes:

No.	Código	Nombre del Subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	110053	Reparación CEB Rubén Antúnez	Colón	Bonito oriental	San José del 5
2	110054	Reparación CEB Augusto C. Coello	Colón	Bonito oriental	Barrio El Centro
3	110056	Reposición Instituto Marco Tulio Castillo	Colón	Bonito Oriental	Aldea La Esperanza

No.	Código	Nombre del Subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
4	110130	Reparación Escuela José Cecilio del Valle	Colón	Santa Rosa de Aguán	Las Lomas, Barra de Aguán
5	110168	Reposición Escuela. Ramon Villeda Morales y CEPB Lic. Jenny Martínez	Colón	Tocoa	Col. Lempira
6	110177	Reposición CEB Juana Donatila Ruiz y Reposición CEPB Julio Arriola Oliva	Colón	Tocoa	Col. Aurora

- Un total de 15 subproyectos se encuentra en reformulación por los técnicos del proyecto, los que serán agrupados según su ubicación, como parte de la estrategia de contratación por lotes de subproyectos y tener un menor número de procesos. El presupuesto preliminar es de L 208,078,000.00. A continuación, los subproyectos:

No.	Código	Nombre del subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	108020	Reposición de Instituto Gubernamental República Federal de México	Francisco Morazán	D.C	Colonia Iberia
2	108480	Reposición Escuela María Teresa Aburto	Yoro	Olanchito	Colonia 24 de mayo
3	108483	Reposición Escuela Joaquín Reyes Tejeda	Yoro	Olanchito	Colonia Libertad Norte
4	108655	Reposición Escuela Remigio Duran Godoy	Yoro	Olanchito	Comunidad La Chorrera
5	110052	Reparación Escuela 3 de agosto	Colón	Bonito oriental	Aldea Florida Miramar
6	110055	Reparación CEB Rafael Pineda Ponce	Colón	Bonito Oriental	La Esperanza
7	110176	Reposición CEPB Argelia Barrientos	Colón	Tocoa	Col. 18 de septiembre
8	110180	Reparación CEB José Heriberto Díaz	Atlántida	Tela	La Ensenada
9	110181	Reposición CEB Esteban Guardiola/CEPB Esteban Guardiola	Atlántida	Tela	Triunfo de la cruz
10	110182	Reposición CEB Perla del Aguan	Colón	Saba	Comunidad ceibita
11	110183	Reparación CEB SAT Félix Salgado	Colón	Tocoa	Aldea Chiripa
12	110184	Reparación Escuela Rosendo Núñez Bonilla	Colón	Trujillo	Barrio Río Negro
13	110185	Reparación CEPB Alba Nora Gunera de Melgar	Colón	Trujillo	Colonia Eduardo castillo
14	110186	Reparación CEPB Delfina Hernández	Colón	Trujillo	Colonia Capiro
15	110187	Reparación CEPB 11 de febrero	Colón	Trujillo	Aldea Chapagua

Sector de Agua y Saneamiento

En Ejecución

- La primera intervención en el Sector de Agua y Saneamiento consta de 3 subproyectos de agua y saneamiento han iniciado ejecución en el tercer trimestre del año. En abril 2024, se dará inicio a

un 4to subproyecto de agua potable. El monto de contrato es de L.143,435,262.47 y para la supervisión L 10,372,183.71. La ejecución al cierre del primer trimestre de 2024 es de L. 56,666,385.34 equivalente al 40% para obras y de L. 4,829,541.02 equivalente al 47% para la supervisión. (Ver Anexo 1: Detalle de Subproyectos PRE).

En Licitación, Aprobación y Formulación

- Un subproyecto de reparación de sistemas de agua potable se encuentra en evaluación de licitación, ubicado en el municipio de Dulce Nombre de Culmi, Olancho por un monto estimado de L. 26,478,023.92.
- En Licitación se encuentran 3 subproyectos por un monto presupuestado de L. 63,209,235.63. Los subproyectos en evaluación son:

No.	Código	Nombre del Subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	108878	Mejoramiento Sistema Agua Potable	Cortés	Santa Cruz de Yojoa	Buena Vista
2	109073	Sistema agua potable (Linea de conducción 19km)	Choluteca	Apacilagua	Casco Urbano
3	108885	Reposición Sistema de Agua Potable	Cortés	San Antonio	Planes de Italia y Buena Vista Calera

- En aprobación se encuentran 2 subproyectos, próximos a lanzarse en licitación por un monto estimado de L. 92,007,148.66.

No.	Código	Nombre del Subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	108890	Reposición Sistema de Agua Potable Casco Urbano Salama y Aldea Talgua	Olancho	Salama	Casco Urbano y Talgua
2	109071	Rehabilitación Linea de Conducción	Olancho	Gualaco	Pacura y Toro Muerto

- En reformulación se encuentran 5 subproyectos adicionales para la reposición y/o rehabilitación de sistemas de agua potable por un monto estimado de L. 159,449,628.31. Los subproyectos en formulación son los siguientes:

No.	Código	Nombre del Subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	108876	Rehabilitación Sistema De Agua Potable Puerto Cortes	Cortes	Puerto Cortes	Casco Urbano
2	108877	Reposición Sistema De Agua Potable El Maraón	Cortes	Villanueva	Aldea El Maraón
3	108917	Reposición Sistema de Agua Potable Aldea La Herradura, Guaimaca	Francisco Morazán	Guaimaca	La Herradura
4	108919	Reposición Sistema De Agua Potable Ciudad Guaymas	Yoro	El Negrito	Ciudad Guaymas Y Centro Poblado
5	110463	Reposición Estación De Bombeo Y Línea De Impulsión La Entrada Copan	Copan	Nueva Arcadia	La Entrada

Infraestructura vial

En Ejecución

- La primera intervención en el Sector Vial consta de 4 subproyectos, han iniciado ejecución en el cuarto trimestre del año 2023. Un 5to subproyecto se agregó en el primer trimestre del año 2024. El monto de contrato es de L 75,108,023.39 y para la supervisión L 7,802,185.38. La ejecución al cierre del año 2023 es de L 34,029,022.54 equivalente al 45% para obras y de L. 1,560,437.08 equivalente al 20% para la supervisión. (Ver Anexo 1: Detalle de Subproyectos PRE).

En Licitación, Aprobación y Formulación

- En formulación se encuentran 2 subproyectos, próximos a lanzarse en licitación por un monto estimado de L. 18,656,000.00.

No.	Código del subproyecto	Nombre del subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	108700	Reposición de Puente Santa Clara Techin	Copán	Florida	Santa Clara, San Lorenzo Techin
2	108785	Reposición de Puente San Lorenzo Techin-Las Palmas Techin	Copán	Florida	San Lorenzo, Techin, Las Palmas

Infraestructura de salud

En Licitación, Aprobación y Formulación

- Un subproyecto de salud se encuentra en proceso de evaluación próximo a licitarse. El monto del presupuesto es de L. 18,731,858.26.

No.	Código del subproyecto	Nombre del subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	109916	Unidad de Atención Primaria en Salud (UAPS) Caridad	Yoro	Morazán	Caridad

- Un subproyecto de salud se encuentra próximo a reformularse. El monto aproximado es de L. 10,000,000.00

No.	Código del subproyecto	Nombre del subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	110319	Reparación Centro de Salud Médico Odontológico	Colón	Santa Rosa de Aguan	La Lomas

Resultados

- Un primer lote de 25 subproyectos de infraestructura educativa en ejecución, culminados físicamente, y 14 ya han sido cerrados financieramente.
- 25 nuevos subproyectos de infraestructura educativa han iniciado su ejecución en el segundo semestre del año 2023 junto con la supervisión respectiva. De estos, 4 subproyectos han terminado físicamente.
- La supervisión de los 25 subproyectos se desarrolla a la par de la ejecución.
- 4 subproyectos de agua y saneamiento han iniciado ejecución junto a la supervisión respectiva.
- 5 subproyectos viales han iniciado ejecución junto a la supervisión respectiva, de los cuales 1 ha finalizado físicamente.

iii. **Componente 3 - Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.**

- Seguimiento de inspección, ambiental, social y de seguridad social a los 25 subproyectos en ejecución.

- Seguimiento al Mecanismo de Quejas, Marco de Reasentamiento y Plan de Participación de Partes Interesadas.
- En proceso de Evaluación de técnicos para complementar al equipo técnico de la Unidad Ejecutora.

xvii. PROBLEMÁTICA

La UEP del proyecto PRE debe cumplir con los requerimientos del Banco Mundial y de la institución FHIS-SEDECOAS. Dicho cumplimiento, conlleva varias sesiones de revisión y subsanación lo que ralentiza el inicio de la ejecución de los subproyectos. Se considera que esto continuará sucediendo en los primeros subproyectos de cada tipología ya que cada uno conlleva sus particularidades que no se han abordado anteriormente.

La mayoría de las formulaciones de los subproyectos efectuadas por formuladores externos y recibidas por el proyecto PRE carecen de análisis de gestión de riesgos: accesibilidad; obras de mitigación; hidrosanitarios; estabilización de taludes; medidas compensatorias, contra incendios, de comunicación y de señalización, y, requieren actualización de costos y cantidades de obra. Por lo que la reformulación toma bastante tiempo para tener los expedientes listos para licitarles.

iv. RETOS

- Llevar una ejecución financiera a la par de la ejecución física, abordando mes a mes a los contratistas para presentar sus estimaciones sin atrasos.
- Acompañamiento quincenal a la supervisión para alcanzar altos niveles de calidad en la ejecución de las obras contratadas.
- Ejecutar el presupuesto 2024 aprobado, obteniendo un avance trimestral significativo.
- Definir con el Banco Mundial estrategias para la simplificación de requisitos y procesos para la eficiente ejecución de subproyectos de emergencia.

Realizar los cambios necesarios en el Proyecto para descentralizar los procesos administrativos.

CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION **ECONOMICA**



✓ **Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)**

i. Antecedentes

El Estado de Honduras ha revalorizado la educación como elemento fundamental para el desarrollo integral de todos los hondureños, mediante la implementación de la Tercera Reforma Educativa, que responde a las expectativas de la sociedad, cuyos alcances se enmarcan en los objetivos No.1 y No.4 de la Visión de País 2010-2038; Plan de Nación 2010-2022; que estipulan: “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidados de previsión social” y “Honduras con un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo. Para la ejecución de esta Tercera Reforma, se aprueba en el año 2012, la Ley Fundamental de Educación y en el año 2014 sus 22 Reglamentos.

-Fortalecimiento de la Secretaría de Educación conforme a la Ley Fundamental de Educación (LFE), principalmente en dos aspectos: i) descentralizar funciones operativas en las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de Educación; y ii) fomentar la participación comunitaria en la gestión educativa, formulación y coordinación de los planes estratégicos, que apunten a mejorar la calidad educativa.

El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Educación, garantiza el derecho fundamental a la educación, el acceso a una educación de calidad en condiciones de equidad, sin discriminación de ninguna naturaleza en todos sus niveles. La Ley Fundamental de Educación recupera el espíritu de garantizar este derecho, estableciendo el compromiso de brindar educación gratuita en todos sus niveles; un año obligatorio en Educación Pre-Básica (tercer grado) y tres ciclos de Educación Básica (I, II y III ciclo). Con ello, se logra la meta establecida de país, que para el año 2038, Honduras debe elevar la escolaridad promedio a 9 años (1º a 9º grado), reconociendo que es necesario formar educandos para la

convivencia, derechos humanos, responsabilidad social, cuidado de las personas, entendimiento del entorno, protección del medio ambiente y la educación media ha sido considerada, hasta finales del siglo XX, como el período de preparación de los jóvenes para el ingreso a la educación superior y también como la enseñanza que proporciona entrenamiento técnico-vocacional, preparando a los jóvenes para su inserción en la vida productiva. En general, la educación media tiene como propósito ofrecer la experiencia formativa para incorporarse al mundo del trabajo y/o proseguir estudios en el nivel de educación superior.

ii. Objetivo General

Fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros Educativos Media y sean promovidos con la calidad requerida.

iii. Focalización

El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.

iv. Beneficiarios

El Programa beneficiará 480 niños de Educación pre-básica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes.

v. Duración

Fecha de inicio de ejecución: 30 de marzo de 2021

Fecha de cierre: 30 de marzo de 2026

vi. Costo Total del Programa

Este es un esfuerzo de la Republica de Honduras, a través de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por US\$80,000,000.00 que tiene como meta llegar a la población educativa de los diferentes niveles que atiende el sistema educativo nacional.

vii. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	507.311.663,00	114.393.414,00	23%
2022	438.079.338,00	860.314,43	0%
2023	297.119.742,00	106.004.347,02	36%
2024	306.585.912,00	10.064.888,72	3%

viii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
EDUCACION	7	33	5.314.113,59	134	1.511
TOTAL	7	33	5.314.113,59	134	1.511

ix. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
COMAYAGUA	0	1	-	0	0
CORTES	5	13	2.232.496,89	114	1.418
OLANCHO	2	9	3.081.616,70	20	93
SANTA BARBARA	0	10	-	0	0
TOTAL	7	33	5.314.113,59	134	1.511

x. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	4.260.023,13
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	490.752,00
TOTAL	4.750.775,13

xi. Principales Logros I Trimestre

1. 11 proyectos para firma de contrato
2. 7 proyectos finalizados físicamente
3. 3 proyecto formulados

xii. Adquisiciones

1. Firma de Contratos de Proceso COT-FHIS-050-2023 y CPN-FHIS-044-2023 (11 proyectos)
2. Contratación de la Firma Formuladora de Proyectos (2 Lotes Desiertos)

xiii. Actividades Programadas

- Reformulación del programa MIFE
- Actualización del Manual Operativo del Programa
- Evaluar el desempeño de las Firmas Consultoras y Supervisoras.
- Contratación de Obra y Supervisión de 13 Proyectos

✓ **Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira.**

i. Antecedentes.

El Estado de Honduras ha revalorizado la necesidad de mejorar el servicio de suministro de agua potable en la ciudad de Gracias, mediante la implementación de un sistema de abastecimiento de agua potable cuyos alcances se enmarcan en los objetivos No.3 y No.4 de la Visión de País 2010-2038; Plan de Nación 2010-2022; que estipulan: “Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental” y “Honduras con un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo”.

Según la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento, El Estado, como responsable de propiciar el bienestar económico, político, social y cultural de los hondureños, es responsable de cuatro funciones básicas: 1. Garantía de acceso a servicios de Agua Potable y Saneamiento de calidad y con eficiencia a la población. 2. Ampliación de la cobertura del servicio, especialmente en comunidades rurales y en comunidades urbanas de escasos recursos. 3. Garantía, bajo principio de solidaridad, de acceso al agua potable a sectores excluidos del servicio por razones de pobreza. 4. Gestión de recursos para el desarrollo de servicios de agua potable y saneamiento, estableciendo las prioridades, los criterios de recuperación de inversiones, asignación de capital, acorde con capacidades financieras respectivas.

ii. Objetivo

El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los servicios de agua potable para la población del municipio de Gracias, Departamento de Lempira, aumentando la cantidad y la calidad del agua suministrada, a través de la ampliación del sistema de abastecimiento, mediante el desarrollo de la infraestructura hidráulica.

iii. Objetivos específicos:

- a) Ampliar y optimizar el caudal de las líneas de conducción de agua hacia los reservorios y la red de distribución del Sistema existente.
- b) Asistencia técnica al prestador UMASG de forma que puedan asumir la operación y mantenimiento del Sistema o contribuir a la sostenibilidad de este.
- c) Introducción de procedimientos rutinarios de operación y mantenimiento con el fin de asegurar una mayor eficiencia.
- d) Acciones destinadas a la reducción de pérdidas (físicas y contables) de agua que puedan reducir la necesidad de inversiones en nuevas obras.

iv. Localización

El Proyecto estará localizado en la Ciudad de Gracias en el Departamento de Lempira.

v. Beneficiarios

El Proyecto beneficiará 22,681 personas en el año 2022 de los cuales 11,005 son hombres y 11,676 son mujeres y en un periodo de 40 años lo estarían alcanzando un estimado de 76,889 personas.

vi. Duración

La duración del Proyecto es de 4.1 años (49.2 meses) incluyendo actividades de gestión, socialización, adquisiciones, ejecución, etc. Y se estima además 2 años para la operación y mantenimiento antes de hacer el traspaso a la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento de Gracias (UMASG).

vii. Situación Actual del Proyecto

El proyecto ha logrado dar cumplimiento a las condiciones previas al primer desembolso, y el 20 de diciembre se recibió el mismo por US\$1,617,085.33, valor necesario para hacer frente a los compromisos del proyecto en los próximos 6 meses.

Se requiere llevar a cabo la revisión del diseño.

viii. Fuente Financiera

Este es un esfuerzo de la Republica de Honduras, a través de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por US\$36,000,000.00 que tiene como meta llegar a la población de Gracias, Lempira.

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2022	193.172.460,00	28.412.086,07	15%
2023	57.836.382,00	6.177.646,62	11%
2024	51.626.065,00	1.281.866,00	2%

ix. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	1.281.866,00
TOTAL	1.281.866,00

x. Logros y avances del trimestre del proyecto

Logros y Avances del Proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”.

En atención al Plan General de adquisiciones del proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira” se tienen en desarrollo los procesos de las siguientes consultorías y adquisiciones:

- En ejecución la consultoría CPIR-FHIS-01-2023 “Revisión, Ajuste y Supervisión del Proyecto de Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”, con los siguientes hitos:
 - La firma contratada fue el consorcio coreano-hondureño SAMAN-ASP, conforme a las políticas del BCIE y lo establecido en el contrato de préstamo No. BCIE 2261.
 - El contrato se firmó el 24 de octubre del 2023.

Monto de la consultoría: US \$ 1,472,164.24

Plazo de la consultoría: 16.5 meses, con las siguientes etapas:

- Etapa de Revisión y Ajuste al Diseño: 5 meses, el 1er informe se recibió el 01 de febrero y luego de subsanar observaciones se aceptó su recepción oficial en fecha 15 de marzo.

El Informe Final de Carpeta de Diseño que estaba previsto para el 01 de abril del 2024, pero en atención a un requerimiento de ampliación en las condiciones contractuales de dicha consultoría, se ampliará su entrega para el 30 de abril, con costo adicional de US \$ 76,404.60 para el diseño de una nueva represa en la obra de toma y nuevos análisis técnicos para la construcción del reservorio que se requiere para garantizar el agua potable para la población de la ciudad de Gracias, departamento de Lempira.

- Etapa de respuestas de preguntas de los oferentes: 4 meses (aproximadamente)
 - Etapa de Supervisión en la ejecución de las obras: 7.5 meses
- La orden de Inicio correspondiente fue dada para el 01 de noviembre del 2023.
 - Se finalizó el trámite de pago del anticipo hasta el mes de febrero, debido a que la firma SAMAN-ASP entregó la garantía bancaria de anticipo en forma tardía, el 31 de enero del 2024.
 - A pesar de haberse recibido a satisfacción el 1er producto llamado “Informe Preliminar Revisión al Diseño”, por un monto de US\$ 269,029.50, no se ha realizado el trámite de pago correspondiente debido a que el 22 de marzo del 2024, el consorcio SAMAN-ASP solicitó que no se le hiciera la retención del 25% en concepto del impuesto sobre la renta, solicitud que se le envió al director de administración y finanzas del FHIS para su análisis el mismo 22 de marzo, por lo que estamos pendientes sobre la instrucción que corresponde sobre el tema solicitado.

El 18 de marzo del 2024 del presente año se remitió a la dirección de Proyectos dicho Informe Preliminar mediante el memorándum No. UEP-SEDECOAS-FHIS-048-2024, con el fin de realizar las gestiones administrativas para proceder al pago de acuerdo al contrato suscrito. Cabe señalar que como unidad ejecutora se ha revisado el informe concluyendo que cumple con los términos pactados.

- Concluido el proceso CPN-FHIS-01-2024 para la nueva contratación del Especialista Financiero, iniciará a partir del 01 de abril del 2024.

- En proceso el trámite de evaluación de ofertas de la Adquisición de Equipamiento para consultores de la Unidad Ejecutora.
- Concluido el proceso de la Adquisición del Suministro Materiales de Oficina para el proyecto (COT-FHIS-68-2023) y se generaron las órdenes de compra.
- Concluido el proceso de evaluación CP-FHIS-16-2023 correspondiente a la Auditoría Externa por el Tiempo de Ejecución del Proyecto "Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en La Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira"; se realizó la negociación con la empresa ganadora "Horwarth Central América" y se firmará el contrato correspondiente en el mes de abril, con lo cual dará inicio la ejecución de los trabajos de consultoría.
Se encuentra pendiente de respuesta por parte de la dirección legal el oficio remitido por la firma auditora externa sobre algunos puntos que es necesario sea confirmados por la institución para la continuación de sus servicios profesionales.
- En virtud que aún se encuentra en trámite el seguro del vehículo adquirido para la Unidad Ejecutora del Proyecto (COT-FHIS-67-2023), se espera que en el mes de abril se pueda utilizar.
- En lo que respecta a aspectos financieros es preciso destacar que a la fecha el proyecto refleja una ejecución financiera de enero-marzo 2024 de USD 51,967.85 y una ejecución acumulada de USD 1,457,578.37 (4.05% del total de la operación).
- En el mes de febrero se recibió el 2do desembolso solicitado al BCIE por un monto de USD 811,583.21 reflejando así un avance financiero del 6.75% de la operación, teniendo como última fecha para desembolsar en el contrato de préstamo BCIE 2261 hasta el 20 de junio de 2027.
- Para este año 2024 ha sido asignado un presupuesto de Lps. 51,626,065.00.
- En vista de haber realizado una corrección en la fecha del Convenio entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS) a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la alcaldía Municipal de Gracias, departamento de Lempira, fuente de financiamiento: BCIE-2261 para el seguimiento de la operación y

mantenimiento del proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira”, está pendiente integrar en dicho documento la fecha del 24 de octubre del 2023, ya que por un error de omisión involuntario, no fue incluido.

Logros y Avances del Proyecto “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sureste de Tegucigalpa”.

- En ejecución la consultoría CPN-FHIS-20-2023, financiada con fondos nacionales, llamada “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sureste de Tegucigalpa”, con los siguientes hitos:
 - La empresa contratada para ejecutar el diseño del proyecto es Gabinete Técnico S.A. (GATESA).
 - El contrato se firmó el 21 de noviembre del 2023.

Monto de la consultoría: L. 13,225,678.13

Plazo de la consultoría: 9 meses

Etapas de Diseño: 5 meses, el 1er informe se recibió el 21 de febrero y el Informe Final de Carpeta de Diseño continúa previsto para el 21 de abril del 2024

Etapas de respuesta de preguntas de los oferentes: 4 meses (aproximadamente)

- La orden de Inicio correspondiente fue dada para el 21 de noviembre del 2023.
- Recibido y aprobado el primer producto llamado “Informe Inicial del proyecto de Consultoría” por parte de la firma el día 12 de diciembre del 2023.
- Recibido el segundo producto “Informe de avance intermedio de las mejoras a implementar”, el día 21 de febrero del 2024, pendiente su aprobación hasta que se subsanen las observaciones hechas por la Unidad Ejecutora al respecto.

Cabe señalar que el proyecto se ha encargado de realizar la revisión de los aspectos técnicos y socio ambientales de ambos informes, asegurándose que cumplan los términos fijados en el contrato suscrito entre FHIS y GATESA, sin embargo, la gestión de aprobación y pago, corresponde a las instancias administrativas del FHIS.

xi. Problemática presentada en el I trimestre 2024

Proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”.

- Se continúa realizando el esfuerzo por parte de la unidad ejecutora por iniciar las obras antes de lo programado en el Plan de Ejecución del proyecto (PEP), lo cual a la fecha se estima sea en agosto del 2024.
- Analizando en PEP del proyecto, se concluye que será necesaria la contratación de un plazo mayor al programado para algunos de los consultores de la Unidad Ejecutora en el año 2025, para alcanzar el cierre del Contrato de préstamo BCIE N° 2261.
- La empresa SAMAN-ASP, como firma consultora del proyecto en la etapa de Revisión y Ajuste al Diseño del proyecto, ha solicitado incremento en tiempo y costos por consideraciones adicionales a lo establecido en el contrato y al respecto se ha revisado y autorizado un monto de US \$ 76,404.60 con un tiempo adicional de 30 días calendario, para lo cual el tiempo de presentación de la carpeta final sería el 01 de mayo del 2024, lo cual es aceptado por la unidad ejecutora y se harán los trámites administrativos pertinentes para su formalización oficial.
- En caso de no terminar de suscribirse el Convenio entre el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Alcaldía Municipal de Gracias, se pone en riesgo la operación, mantenimiento y aplicación de tarifas, debido a que el FHIS quedaría como responsable, haciendo más difícil la sostenibilidad del sistema pues a nivel institucional no se cuenta con la logística para lograrlo en forma eficiente y eficaz, sobre todo para las evaluaciones expos uno o dos años después de finalizadas las obras, cuando ya no se tiene conformada la unidad ejecutora.

Proyecto “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sureste de Tegucigalpa”.

- Se ha tenido reuniones con BCIE para la socialización del financiamiento de las obras de este proyecto, quienes han dado apertura para que se obtenga.
- Se ha coordinado con la oficina de Crédito Público de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) reuniones para discutir y establecer el procedimiento y forma de efectuar la modificación N°1 del contrato de préstamo No.2261-BCIE, para iniciar los trámites preliminares que permitan la reorientación de los fondos remanentes que no se usarían en el proyecto de Gracias - Lempira, ampliando el alcance de los fondos al municipio del Distrito Central, donde Honduras ha

financiado el diseño del proyecto “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sur-Oriente de Tegucigalpa”, en base a una solicitud de la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento (UMAPS), quienes han indicado que el proceso se debe iniciar hasta que se tengan los diseños completos de los dos proyectos que se coordinan.

- El proyecto de Tegucigalpa requiere de disponibilidad de vehículo, por lo que es recomendable disponer de parqueo en el Centro Cívico Gubernamental.

Modificación al Contrato de Préstamo No. BCIE 2261

Se ha dado inicio por parte de la Unidad Ejecutora al trabajo definido como FASE I, correspondiente a preparar la Enmienda N°1 a la Nota de Prioridad del Contrato de Préstamo N° 2261, así como preparar una Nueva Nota de Prioridad que incluya el remanente de los fondos que queden del proyecto de aguas de Gracias en el Proyecto de “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sureste de Tegucigalpa”, y así ejecutar los \$36,000,000,00 de este contrato de préstamo, para lo cual se nos han dado instrucciones de la Dirección de Inversión Pública de SEFIN.

Se está en espera de instrucción por parte de las autoridades superiores para definir si se ejecutará la FASE II, para la cual se requiere el acercamiento entre el Ministro del FHIS y el Ministro de Finanzas en la que se den los lineamientos para establecer la fuente de financiamiento que se debe gestionar para completar el proyecto de “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sureste de Tegucigalpa”, que puede andar por el rango de \$40,000,000.00

CARTERA KfW



✓ **Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V**



I. Objetivo General

Consiste en la utilización de centros educativos mejorados, ampliados o nuevos y equipados bajo conceptos pedagógicos que operan de manera sostenible por la comunidad educativa. De esta manera se pretende contribuir a que niños/as y jóvenes de regiones pobres utilicen una oferta de alta calidad educativa, tanto formal como de educación vocacional.

II. Focalización

Fase IV: El Área de intervención abarcará los departamentos que están siendo intervenidos en las fases anteriores (Zona de Occidente): 1) Copán, 2) Santa Bárbara, 3) Intibucá, 4) Lempira, 5) La Paz, 6) Ocotepeque. 7) Centros a nivel nacional en casos de emergencia (catástrofes naturales). La información de estos centros deberá ser actualizada en el plan maestro y sólo si se determina su precariedad, podrán ser intervenidos previo a No Objeción del KfW. 8) Adicionalmente se extenderá el área de intervención a los departamentos adyacentes a la zona de occidente, delimitando el área de intervención a través de la Carretera Panamericana. Los municipios a ser beneficiados se encuentran al oeste de la misma en los siguientes departamentos: 1) Choluteca, 2) Valle, 3) Francisco Morazán (exceptuando el núcleo urbano de Tegucigalpa), 4) Comayagua y adicionalmente 5) Gracias a Dios.

Fase V: El Área de intervención abarcará los departamentos de: Ocotepeque, Lempira y Copan, en la zona de Occidente. Además, los departamentos al oeste de la carretera CA-5 de los departamentos de Francisco Morazán (exceptuando el Distrito Central), Valle, Choluteca, Comayagua. También seguirá formando parte del Programa el Departamento de Gracias a Dios (siempre y cuando no se alcance un mínimo de infraestructura en este departamento y según las experiencias de la fase IV del PROMINE).

III. Priorización de los Centros Educativos

Esta es realizada por la Secretaría de Educación apoyados en la herramienta del Plan Maestro de Infraestructura Educativa.

IV. Descripción del Proyecto

Fase IV: El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y en la planificación estratégica para los años 2014 - 2018 de la Secretaría de Educación (SE). El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las tres fases previas PROMINE I, II y III. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

Fase V: El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y el Plan Estratégico del Sector de Educación para los años 2017 - 2030 de la Republica de Honduras. El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las cuatro fases previas PROMINE I, II, III y IV. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

V. Monto del Proyecto:

Fase IV:

Fondos de Donación por un monto de EUR 15,000,000.00, Contrapartida Nacional para SEDECOAS/FHIS de EUR 424,000, Contrapartida Nacional para SE de EUR 218,000, Contrapartida Municipal de EUR 515,000 y Contrapartida Comunitaria de EUR 514,000.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 03/12/2015

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 17/02/2017

Fecha de Inicio: 02 de abril 2018 (Se considera la fecha de inicio de la Consultoría)

Fecha de Finalización de convenio: 31/07/2024

Fase V:

Fondos de Donación por un monto de EUR 10,000,000.00, Contrapartida Nacional para IDECOAS/FHIS de EUR 495,000, Contrapartida Nacional para SE de EUR 250,000, Contrapartida Municipal de EUR 600,000 Contrapartida Comunitaria de EUR 600,000.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 06/07/2018

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 21/03/2019

Fecha de Inicio: Inicio de la Consultoría 18 de marzo

Fecha de Finalización de convenio: 37 meses a partir del inicio de la consultoría

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2016	145.687.475,00	142.916.817,45	98%
2017	107.279.375,00	96.731.967,93	90%
2018	53.035.502,00	50.951.601,81	96%
2019	81.069.633,00	79.762.875,76	98%
2020	134.608.478,00	123.221.616,32	92%
2021	139.936.980,00	119.695.679,72	86%
2022	102.757.410,00	66.787.201,74	65%
2023	126.728.365,00	112.691.821,90	89%
2024	134.601.641,00	2.685.797,33	2%

VI. Avance Físico por Sector PROMINE FASE IV y V

i. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	2.353.986,45
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	331.810,88
TOTAL	2.685.797,33

Avance Físico FASE IV.

Estatus	Nº	%
Finalizado	19	58%
Suspendido	4	12%
En resolución de contratos	5	15%
En ejecución	5	15%

Avance Físico FASE V.

Estatus	Nº	%
En contrataciones	3	33%
En ejecución	3	33%
Pendiente Orden de Inicio	3	33%

VII. LOGROS AL I TRIMESTRE

Meta de ejecución física y financiera según lo reprogramado.

I TRIMESTRE	PLANIFICADO	EJCUTADO	COMENTARIOS
Financiero	3,060,357.00	2,685,797.33	Se cumplió al 88% la ejecución conforme a la planificación, lo anterior considerando que no se realizó un pago previsto a un proyecto por retrasos en la Municipalidad de La Paz, La Paz. Tampoco se realizó el pago de los consultores en el mes de marzo
Físico	0	0	

VIII. LIMITACIONES

En este periodo se han presentado las siguientes limitaciones:

1. Internas

a) Definición de los contratos consultores

Cinco consultorías, contratadas por la Dirección de Recursos Humanos, donde se manifestó desde el mes de febrero que: a) La fecha de finalización era el 29 de febrero, b) Se presentaron las solicitudes de renovación por las Direcciones involucradas, con sus respectivas

- evaluaciones del personal, c) Se cuenta con la disponibilidad de recursos financieros para su contratación por todo el año, d) Se requiere del personal para la operatividad del Programa,
- b) Las acciones con respecto a las dos consultorías contratadas por la Dirección de Contrataciones con fondos SEDECOAS. Informándonos que el equipo Legal estaba en proceso de revisión de la documentación y análisis de los que procedería para su atención. De parte del programa se indicó que se cuenta con disponibilidad para su financiamiento por el periodo de nueve meses.
 - c) Visitas a los proyectos en vista que se han suspendido las giras de los consultores a partir del 18 de marzo.
 - d) Publicación en HonduCompras de la contratación de la auditoria hasta el 4 de abril.
 - e) Tiempo requerido para la evaluación de los procesos de licitación en la Dirección de Contrataciones.
 - f) Aprobación de Ordenes de Cambio en Comité y la posterior elaboración de adendas
 - g) Tiempo de Formulación de Proyectos y plazos considerados para su ejecución.
 - h) Actualizaciones de centros de costos.

2. Externas

- a) Recuperación de los fondos de los proyectos en Gracias a Dios
- b) Las Transferencias a las Municipalidades, retrasan los aportes municipales de los proyectos.
- c) Respuesta de SEDUC a solicitudes de información.

Dificultad de mano de obra calificada, local, supervisores docentes y aportes comunitarios.

IX. RETOS

Se mantienen alguno de los retos indicados en el informe anterior:

- 1) Pronta recuperación de los fondos de los cinco proyectos de Gracias a Dios ya que estos montos tienen que comprometerse y ejecutarse antes del 31 de julio del 2024.

Estatus actual

Ítem	Nombre del Proyecto	Monto por Aceptar de la Transferencia	Estatus de la Resolución	Nuevo Proyecto
1	* Municipio Wampusirpi * Comunidad Wampusirpi * Reposición Escuela y Jardín De Niños Jesús Mejía Paz * Código 107668	1,756,084.58	En Despacho para firma de auto de admisión propuesta.	En revisión de carpeta para solicitud No Objeción
2	* Municipio Brus Laguna * Comunidad Las Marías * Reposición CEB República de Costa Rica y Jardín de Niños Stanley Goff * Código 107656	3,599,416.00	En Secretaria de Gobernación 26/10/2023	En revisión de carpeta para solicitud No Objeción
3	* Municipio Ahuas * Comunidad Wawina * Reparación CEB José Trinidad Reyes y Jardín De Niños Felipe Licon * Código 107687	290,050.72	En elaboración de Resolución, posteriormente se dan 10 días para presentación de recurso, en caso de no existir se envía a Gobernación con Resolución firme.	En revisión de carpeta para solicitud No Objeción
4	* Municipio Juan Francisco Bulnes * Comunidad Ibans * Ampliación CEB Sat América CEPB Rosa Canelo * Código 107626	1,402,267.73	En Secretaria de Gobernación 02/11/2023	La Obra contratada, supervisión en proceso de contratación
5	* Municipio Puerto Lempira * Comunidad Tipimuna * Reposición CEB Modesto Rodas Alvarado y CEPB Estados Unidos * Código 107624	3,634,021.92	En elaboración de Resolución para firme y posterior envío a Gobernación.	En reformulación
TOTAL		10,681,840.95		

- 2) Atención a los proyectos que se encuentran suspendidos y en los que pueda iniciarse un proceso de resolución, en caso de no obtenerse una respuesta favorable de las municipalidades, considerando que estos son de la fase IV se requerirá la pronta recuperación de los fondos, comprometerlos y ejecutarlos antes del 31 de julio 2024.

- 3) No Objeción a la Ampliación de Vigencia de la Fase V.
- 4) Ampliación del Contrato de la Asistencia Técnica del Programa, para lo cual se requiere previo la ampliación de la vigencia de la fase V y una modificación entre componentes del convenio.
- 5) Contratación de la Auditoria Anual 2023.
- 6) Del Acuerdo Separado: *“La Entidad Ejecutora del Programa será el IDECOAS-FHIS, quien garantizará la capacidad de ejecución y especialmente la del personal técnico necesario para cumplir las metas y programaciones establecidas. Dentro del IDECOAS-FHIS, la ejecución del Programa será responsabilidad de las Direcciones en Línea con el Apoyo de la Coordinación del Programa”*. Dado lo anterior en algunas Direcciones se requiere de personal que cumpla las actividades que indica el Manual PEC- PROMINE:
 - a) En la Dirección de Administración y Finanzas:
 - La contratación o designación del Oficial de Fuente I para el programa quien es responsable las disponibilidades de convenio, justificaciones de fondos a la fuente, auditorias anuales, asignaciones de fuente, entre otros.
 - La contratación o designación del Oficial de Fuente II para el programa quien es el apoyo del oficial de fuente II.

Este personal es de suma importancia ya que a partir de enero 2024 no se cuenta con el equipo responsable de la parte financiera.

 - b) En la Dirección de Control y Seguimiento se requiere:
 - La Contratación o designación de dos inspectores contables para los proyectos en ejecución.
 - c) En la Dirección de Contrataciones se requiere:
 - Capacitación interna al personal responsable de los procesos de contratación del Programa.

✓ **Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras
(CONVIVIR) Fase II**



ii. Objetivo General

Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).

iii. Focalización

A través de un proceso de concurso con criterios de selección predefinidos en el acuerdo separado y evaluación de propuestas técnicas alineadas a los componentes del programa fueron seleccionados 4 municipios en donde se está realizando la intervención del CONVIVIR a través de obras de infraestructura y medidas de alcance social para beneficio enfocado en la juventud. Así mismo se definieron los barrios, colonias o comunidades urbanas en donde se focaliza las acciones y en donde ya se ha realizado una labor de socialización de los alcances, compromisos y beneficios para la población. Los municipios seleccionados son:

- Municipio de Juticalpa, departamento de Olancho
- Municipio de Intibucá, departamento de Intibucá
- Municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá
- Municipio de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán

iv. Descripción del Proyecto

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

v. Monto del Proyecto:

Los fondos destinados para la ejecución de este Programa para la Fase II es de EUR 6,000,000.00 Contrapartida Nacional para IDECOAS/FHIS de EUR 600,000.00, Contrapartida Municipal de EUR 300,000.00 Contrapartida Comunitaria de EUR 300,000.00.

Fecha de Inicio del Programa de convenio Fase II: 14/07/2021

vi. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	19.897.004,00	8.372.701,20	42%
2022	44.370.387,00	26.573.808,83	60%
2023	74.083.192,00	72.701.682,29	98%
2024	70.590.547,00	2.632.144,21	4%

vii. Avance Físico por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
EMPREDIMIENTO Y VALORES	0	6	1.506.000,00	5	0
TOTAL	0	6	1.506.000,00	5	0

viii. Avance Físico por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
COPAN	0	2	502.000,00	1	0
INTIBUCÁ	0	2	502.000,00	2	0
OLANCHO	0	2	502.000,00	2	0
TOTAL	0	6	1.506.000,00	5	0

ix. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	171.870,89
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	954.273,32
TOTAL	1.126.144,21

x. LOGROS Y AVANCES

FASE	COMPONENTES			
	Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura	Fortalecimiento de Habilidades de jóvenes para el trabajo habilidades Sociales	Mejoramiento de Capacidades de Actores Relevantes	Materiales y Equipos de Capacitación
II*	7 proyectos en ejecución y con el 50% desembolsados 5 proyectos con su primer desembolso	255 jóvenes fortalecidos en habilidades sociales	24 actores relevantes	-

**A. COMPONENTE 1 CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA-
AVANCE FISICO**

Tabla 1: Proyectos de Infraestructura Seleccionados en el Municipio de Santa Rosa de Copán
Estado de la Ejecución

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Plaza Juvenil Brisas de Copán (Obra de Confianza)	Barrio El Duende	4,256,435.99	➤ Proyecto desembolsado en el primer y segundo desembolso, en ejecución
2.	Casa de la Juventud	Barrio El Carmen	13,161,194.90	➤ Proyecto con el primer desembolso a iniciar abril 2024
3.	Plaza El Mirador – Santa Teresa	Barrio Santa Teresa, sector La Cuchilla	4,803,327.26	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer y segundo desembolso, en ejecución
Monto Total de Inversión Estimado			22,220,958.15	

Tabla 2: Proyectos de Infraestructura Seleccionados en el Municipio de Intibucá – Estado de la Ejecución

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Parque La Pirámide (Obra de Confianza)	Barrio El Way, Sector No. 1	1,720,794.57	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer y segundo desembolso, en ejecución
2.	THAU MISHU (Casa de La Juventud)	Colonia Guagua	11,319,038.74	➤ Proyecto aprobado y primer desembolso
3.	Ruta Lenca de la Juventud	Barrio El Way	3,477,385.73	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer y segundo desembolso, en ejecución.
Monto Total de Inversión Estimado			16,517,219.04	

Tabla 3: Proyectos de Infraestructura Seleccionados en el Municipio de La Esperanza – Estado de la Ejecución

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Paseo Cultural Lenca (Obra de Confianza)	Colonia Buenos Aires	4,728,832.16	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer y segundo desembolso, en ejecución.
2.	Plaza de La Juventud Buenos Aires	Colonia Buenos Aires	8,160,161.95	➤ Proyecto aprobado y desembolsado en el primer y segundo desembolso, en ejecución.
3.	Centro Deportivo Integral San Carlos	Colonia San Carlos	6,090,046.99	➤ Proyecto aprobado y desembolsado el primer desembolso, Orden de inicio.
Monto Total de Inversión Estimado			18,979,041.10	

Tabla 4: Proyectos de Infraestructura Seleccionados en el Municipio de Juticalpa – Estado de la Ejecución

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Cancha ABE y BEN (Obra de Confianza)	Colonia La Solidaridad	4,220,401.03	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer y segundo desembolso, en ejecución
2.	Centro de Formación Integral Juvenil	Barrio El Centro	13,720,180.88	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer, orden de inicio pendiente abril 2024
3.	Parque Recreativo de La Juventud	Aldea La Concepción	4,454,231.38	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer y segundo desembolso, en ejecución
Monto Total de Inversión Estimado			22,394,813.29	

B. COMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES LABORALES Y SOCIALES DE JOVENES

En la semana del 2 al 6 de mayo 2022, SEDECOAS-FHIS realizó nuevamente una gira por los municipios de incidencia del Proyecto con el propósito de brindar acompañamiento a: (i) ANED Consultores, quienes trabajaron en el estudio de *Línea Base y el Diagnóstico de Necesidades Formativas para los y las Jóvenes* y (ii) Espirállica Research & Consulting, quienes llevaron a cabo la consultoría del *Diagnóstico de Necesidades e Intereses de Fortalecimiento para la Mejora de la Gestión Municipal enfocada en el Desarrollo de la Juventud* en las comunidades seleccionadas.

En esta gira las empresas consultoras socializaron los resultados de los estudios, diagnósticos y planes de formación, con la participación de Jóvenes, Líderes Comunitarios, Sociedad Civil, Entes Gubernamentales y Representantes de las Municipalidades.

El proceso de investigación de “Línea Base, Diagnóstico de Necesidades de Juventud y Propuesta de Plan para el Fortalecimiento de las Necesidades de Formación para Jóvenes” encargado a la empresa de consultoría ANED Consultores ha concluido con la aprobación de sus productos por parte del equipo de La SEDECOAS-FHIS y La Asistencia Técnica. A la fecha de cierre del presente Informe estos documentos se encuentran en proceso de diagramación final para dar por concluido este proceso de consultoría.

Se realizó convenio con FIPADEH el cual se desembolsó el 70% para la ejecución de los talleres con juventud en los municipios de CONVIVIR.

Se inició con la elaboración de lineamientos y propuesta para la suscripción de un convenio con INFOP para el fortalecimiento de habilidades laborales.

xi. Desafíos de CONVIVIR:

1. Concienciar a la población meta (constituida por la juventud entre 12 y 30 años) para el logro del objetivo general y específico del programa.
2. Falta de participación de algunos miembros de las comunidades en las actividades programadas por miembros del CEP. Esto puede deberse a una variedad de factores, como falta de conciencia, apatía

o barreras logísticas. Superar este desafío ha implicado redoblar nuestros esfuerzos de divulgación y compromiso comunitario para fomentar una mayor participación e inclusión.

3. La falta de fondos puede limitar nuestra capacidad para implementar actividades en la parte de capacitaciones a jóvenes y actores relevantes. Para abordar este desafío, hemos buscado formas creativas de maximizar nuestros recursos existentes y hemos explorado oportunidades de colaboración con otras organizaciones y entidades gubernamentales logrando alianzas con SENPRENDE para poder cumplir con el déficit financiero en el componente 1. Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura.
4. En los últimos dos meses, el proyecto Convivir ha enfrentado el desafío de renuncias del personal, lo que ha afectado significativamente la continuidad y eficiencia de nuestros programas. La pérdida de talento humano clave ha generado una disrupción en la implementación de nuestras iniciativas y ha aumentado la carga de trabajo para el personal restante. Superar este desafío requerirá medidas para reclutar y capacitar nuevo personal, así como redistribuir responsabilidades de manera efectiva para garantizar la continuidad de nuestras operaciones.
5. Lograr el cumplimiento de los plazos establecidos en el ciclo de proyectos FHIS, para la ejecución de los proyectos según lo programado.
6. El programa Convivir se ha enfrentado a significativos desafíos tras la llegada de la nueva coordinación, particularmente debido a la pérdida de información relevante provocada por la gestión anterior. Esta falta de datos pertinentes ha generado obstáculos en la continuidad de los procesos, dificultando la planificación y ejecución de actividades. La nueva coordinación se ha visto obligada a realizar un exhaustivo trabajo de reconstrucción de la información y establecer nuevos protocolos para garantizar la eficiencia y efectividad del programa. A pesar de estos contratiempos, se están implementando medidas para fortalecer la gestión y recuperar la confianza en el programa.

CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)



✓ Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)

A. Objetivo General

El propósito de esta Actividad es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

B. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en las cinco municipalidades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Tela y La Ceiba. Las comunidades específicas de intervención serán identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

C. Descripción del Proyecto

Esta Actividad ayudará al GdeH (representado a través de FHIS) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otras partes interesadas. La Actividad incluye dos resultados complementarios: Resultado 1: Mejora de la infraestructura comunitaria, las

actividades responderán a las prioridades de infraestructura comunitaria para abordar la seguridad ciudadana. Resultado 2: Aumento de la cohesión comunitaria, considera que la forma en que las intervenciones de infraestructura son concebidas, diseñadas y ejecutadas pueden desempeñar un papel directo en el aumento de la cohesión social y comunitaria y promover un marco holístico de prevención de la violencia. Los proyectos bajo la Actividad incluirán instalaciones educativas, centros de salud, alumbrado público, espacios comunitarios más seguros, centros de alcance y comunitarios, centros vocacionales, jardines comunitarios, parques, espacios recreativos, paradas de buses, accesos peatonales, mejoras al alumbrado de calles, señalización, instalaciones para el sector seguridad y justicia, así como otros proyectos de infraestructura de pequeña escala que se acuerde entre las Partes.

D. Monto del Convenio

Presupuesto total estimado: \$14,637, 541.74, de los cuales, fondos de donación de USAID: \$11, 710,033.39; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$ 2, 927,508.35 (efectivo: \$ 2,127,508.35 y especies: \$ 800,000.00).

i. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	23.226.555,00	21.906.553,68	94%
2019	60.781.669,00	60.781.669,00	100%
2020	145.322.291,00	60.678.681,68	42%
2021	67.508.910,00	42.626.620,46	63%
2022	57.711.016,00	55.047.658,54	95%
2023	80.251.050,00	76.368.680,98	95%
2024	41.564.993,00	8.503.368,36	20%

ii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	1	1	369.240,48	49	449.823
EDUCACION	1	2	2.074.967,45	41	2.367
TOTAL	2	3	2.444.207,93	90	452.190

iii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
ATLANTIDA	1	1	195.656,94	28	450.543
CORTES	0	1	788.890,32	17	417
FRANCISCO MORAZAN	1	1	1.459.660,67	45	1.230
TOTAL	2	3	2.444.207,93	90	452.190

iv. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	5.009.979,17
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	1.049.181,53
TOTAL	6.059.160,70

v. EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE

Al cierre del I Trimestre del 2024 bajo el programa ICS se encuentran 7 proyectos en ejecución, presentando un avance promedio de 75%.

Los 7 proyectos que se encuentran en ejecución al final del I Trimestre del 2024 bajo el programa ICS representan un monto total de L. 28,167,866.74 del cual se ha ejecutado financieramente un promedio del 80%.

Matriz de Seguimiento de Proyectos ICS en ejecución

Código	Proyecto	Estado	Disponibilidad	AV Físico	AV Financiero	Inicio	Fin
109052	Reparación Centro de Salud de la San Miguel, equipamiento y obras varias	Ejecución	L.6.000.000,00	56,00 %	23,00 %	28/8/2023	28/4/2024
109161	Reparación del Instituto Modesto Rodas Alvarado y Construcción de obras varias Fase II	Ejecución	L.6.841.866,74	50,00 %	55,00 %	25/5/2023	20/3/2024
108864	Rivera Hernández - Oficina Comité Intersectorial	Ejecución	L.3.900.000,00	45,00 %	25,00 %	22/6/2023	18/3/2024
109104	Construcción Área Recreativa CDA Col. Gale	Ejecución	L.3.676.000,00	70,00 %	55,00 %	23/6/2023	18/2/2024
109242	Chamelecón - Oficina Comité Intersectorial	Ejecución	L.3.500.000,00	60,00 %	55,00 %	6/12/2023	5/2/2024
109079	Reparación del CEB Porfirio Ruiz y Construcción de Obras Varias.	Ejecución	L.1.600.000,00	95,00 %	90,00 %	28/5/2023	25/9/2023
108942	Reparación del CEB Ramón Rosa y Construcción de Obras Varias.	Ejecución	L.2.650.000,00	85,00 %	65,00 %	6/9/2023	12/6/2023
109152	Reparación de Techo y Obras Complementarias en Anexo SESAL FASE II	Ejecución	L.418.155,00	90,00 %	0,00 %		28/2/2023
Total			L.28.586.021,74	68,88 %	46,00 %		

Tomando en cuenta el mecanismo financiero establecido en los convenios de donación de cada programa donde se establece lo siguiente: “Se utilizará el método de reembolso de costos para implementar y financiar la Actividad. Bajo este método, el Donatario deberá hacer los pagos con sus propios fondos para cubrir costos de la Actividad según el cuadro de Presupuesto del Plan de Trabajo pertinente aprobado por la USAID (El Presupuesto de la Actividad). La USAID reembolsará al Donatario por los costos incurridos en esta Actividad y que se han presentado a la USAID para reembolso sobre una base periódica.”

Para el I Trimestre del 2024 se programó una ejecución financiera basada en reembolsos realizados de L. 10,391,248 de los cuales se lograron regularizar frente a la Secretaría de Finanzas L. 8,503,369 obteniendo un porcentaje de cumplimiento Trimestral del 82% y la ejecución financiera programada para el año 2024 que corresponde a un total de L. 41,564,993 la ejecución en relación al presupuesto para esta gestión representando un porcentaje de ejecución financiera del 20%.

vi. LOGROS ALCANZADOS EN TRIMESTRE

En el año 2024 se finalizaron 2 proyectos en el programa ICS, por un monto aproximado de L. 2,668,155.00 de los cuales corresponde 1 infraestructura escolar y 1 proyectos de salud.

La Dirección realizó la contratación de 2 consultores, siendo las plazas de Especialista en Comunicaciones & Visibilidad y Especialista de Género e Inclusión Social, lo que vendrá a fortalecer las capacidades del equipo en términos de posicionamiento de FHIS como actor clave en el desarrollo de la infraestructura social del país, de igual manera logra hacer transversal el componente de género y todas las intervenciones de la actividad.

A través de implementador de la USAID, se están realizando las gestiones necesarias para exportar la metodología de ejecución de proyectos ejecutados por la comunidad (PEC) a países con características similares a las de Honduras, esto debido a los impactos positivos socioeconómicos obtenidos a través de la aplicación de esta metodología.

vii. PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCION I TRIMESTRE

- La ejecución presupuestaria para el I trimestre se vio afectada por el cambio de autoridades en la institución, en especial el cambio en la firma de documentos de pago.
- La Ejecución de los fondos nacionales para ICS se encuentra al 100%, con esta aportación el GdH, ha cumplido con las aportaciones en presupuestos designadas en la carta de ejecución vigente.
- A solicitud de la USAID se realizaron cambios en la planificación de PIOH en la ejecución de proyectos educativos, programados para generar orden de inicio en el mes de febrero, por proyectos carreteros que se encontraban en etapa de diseño y socialización, lo que generó un atraso en la ejecución de al menos 2 meses
- Se realizará una reprogramación de actividades para ser ejecutadas en el III Trimestre de 2024.

✓ **Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)**

i. Objetivo General

El propósito de esta Actividad es mejorar las pobres condiciones sociales y económicas son especialmente pronunciadas en el Occidente de Honduras. Extrema pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático. Bajos niveles educativos, migración, falta de acceso a los servicios básicos y otros retos socioeconómicos son endémicos. La provisión de servicios básicos de educación y nutrición son escasos en la zona de Occidente y es difícil el acceso a los ya existentes, así mismo la gestión de servicios de educación, nutrición y agua y saneamiento son deficientes por lo que los ciudadanos cuentan además con pocos espacios de participación para mejorar sus vidas a nivel de hogar y sus vidas productivas, lo que genera una gran brecha de pobreza.

ii. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en los departamentos de Ocotepeque, la Paz, Copán Intibucá, Santa Bárbara y Lempira y zonas occidentales específicas de intervención identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

iii. Descripción del Proyecto

Esta Actividad apoyará al FHIS para construir de al menos 14 proyectos de infraestructura comunitaria que potencien otros esfuerzos de USAID para mejorar los servicios relacionados con nutrición, la educación y el acceso al agua seleccionadas dentro de las municipalidades identificadas bajo el Objetivo de Desarrollo 2 de USAID.

iv. Monto del Convenio

El monto total de la Actividad es de \$ 10,544,130.00 (USAID \$ 8,435,304.00, Gobierno de Honduras \$ 2,108,826.00). Según la carta de ejecución No. 034.

v. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2019	6.190.650,00	5.981.569,54	97%
2020	65.583.096,00	13.336.794,49	20%
2021	58.488.260,00	47.180.270,68	81%
2022	37.504.624,00	35.478.196,70	95%
2023	42.199.428,00	33.390.584,30	79%
2024	56.710.336,00	5.622.587,22	10%

vi. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	0	2	926.336,04	38	268.001
EDUCACION	0	3	602.040,00	46	424
TOTAL	0	5	1.528.376,04	84	268.425

vii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
FRANCISCO MORAZAN	0	1	606.694,85	11	1
INTIBUCÁ	0	1	319.641,19	27	268.000
LEMPIRA	0	1	119.905,00	15	75
OCOTEPEQUE	0	2	482.135,00	31	349
TOTAL	0	5	1.528.376,04	84	268.425

viii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	3.075.787,25
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	1.018.423,93
TOTAL	4.094.211,18

ix. EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE

Durante el periodo correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo del 2024 bajo el programa PIOH, no se finalizaron proyectos. A continuación, se presenta la tabla de programación de entregables correspondientes a los 4 trimestres del año 2024.

Al cierre del I Trimestre del 2024 bajo el programa PIOH, 2 proyectos se encuentran en ejecución con un avance promedio de un 20% y financieramente un promedio del 29.72%.

Para el I Trimestre del 2024 se programó una ejecución financiera basada en reembolsos realizados de L. 14,177,584 de los cuales se lograron regularizar frente a la Secretaria de Finanzas L. 5,622,587 obteniendo un porcentaje de cumplimiento Trimestral del 40%.

Tomando en cuenta la ejecución financiera programada para el año 2024 que corresponde a un total de L. 56,710,336 la ejecución en relación al presupuesto para esta gestión representando un porcentaje de ejecución financiera del 10%.
