



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan
Operativo Anual POA-Presupuesto

II Trimestre 2024

INDICE

Introducción.....	2
Antecedentes	2
Resultados Financieros y Físicos.....	5
Proyectos FHIS.....	6
Avance Ejecución Física de Proyectos de Inversión.....	7
Ejecución Presupuestaria por Programas 2024.....	8
Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2024.....	9
Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Segundo Trimestre 2024	11
Resumen de Cuadro por Sector 2024	15
CARTERA BANCO MUNDIAL	16
▪ ✓ Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE 6822-HN).....	16
CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	22
▪ ✓ Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)	22
▪ ✓ Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira.	28
CARTERA KfW.....	37
▪ ✓ Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V	37
▪ ✓ Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) Fase II	50
CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID).....	61
▪ ✓ Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)	61
▪ ✓ Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)	68
CARTERA DE FONDOS NACIONALES	74
▪ ✓ Gestión de Proyectos Artículo 38 DGP-2024	74
▪ ✓ Infraestructura y Otros a Nivel Nacional.....	77

Introducción

Este informe de ejecución física financiera del plan operativo anual es una herramienta esencial para medir el desempeño de la institución en el logro de sus objetivos. Este tipo de informe permite evaluar la efectividad de los recursos asignados y su uso adecuado en relación con los resultados obtenidos. El análisis de la ejecución física y financiera nos ha permitido identificar las fortalezas y debilidades, así como las áreas de oportunidad para la mejora continua. Al proporcionar información detallada sobre el cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas, este informe es la recopilación de las actividades e inversiones realizadas por el FHIS durante el tercer trimestre del 2023.

Para este Primer Trimestre el FHIS alcanzo una Ejecución Acumulada de L. 109.462.340,17, en los cuales están incluidos los siguientes Programas y Proyectos como ser:

- **(BM)** Proyecto de recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota.
- **(BCIE)** Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE) /Proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira.
- **(USAID)** Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS)/ Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH).
- **(KFW)** Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE Fase IV y V./Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR FASE II).

Antecedentes

De acuerdo al Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-056-2019, se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), la cual debe de promover el Desarrollo Comunitario por medio de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos, en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerables de Honduras quien para el desarrollo de sus funciones debe contar con una Subsecretaría de Estado.

Se adscribe a dicha Secretaría de Estado, El Instituto Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), que fue creado mediante Decreto Ejecutivo PCM-013-2014 publicado el 30 de Mayo del 2014 y tiene como propósito la integración institucional del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y del Servicio Autónomo

Nacional de Acueducto y Alcantarillados (SANAA) y demás afines al sector, Independiente de su integración estas instituciones continuaron cumpliendo los objetivos establecidos en sus leyes constitutivas.

Y en la práctica el SANAA no se adscribió al IDECOAS

En PCM-05-2022 se adscribe el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y a la vez se crea el Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos que se adscribe a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y aglutina todos los entes relacionados al sector.

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es un organismo Desconcentrado de la Presidencia de la República, creado el 22 de febrero de 1990 y extendida su vida legal hasta el año 2026 según decreto No. 118-2022 cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados, en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social y/o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Asimismo, asesorará a los gobiernos locales con respecto a los procesos de captación de recursos de las fuentes de financiamiento nacionales y/o externas y las asiste en la transferencia de las capacidades técnicas y administrativas, para convertir a estos gobiernos locales en administradores eficientes de sus programas y proyectos, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Nación en aplicación del principio de Descentralización.

Misión:

Somos una Institución Estatal, desconcentrada, técnica y captadora de recursos que promueve el desarrollo local sostenible, participativo e incluyente mediante el fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, en municipales y sociedad civil, en alianza con socios estratégicos para desarrollar obras de infraestructura y proyectos de orientación social de acuerdo al plan de nación y visión de país de forma transparente y eficiente, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable de Honduras.

Visión:

Ser para el año 2026, la Institución líder en gestión y fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, para la ejecución de proyectos, que contribuya equitativamente al desarrollo sustentable nacional.

Valores:

- **Ética:** Ejercicio de las funciones con sujeción a las normas morales que promuevan la confianza de la población hondureña.
- **Integridad:** Actuación sustentada en la honradez, prudencia, entereza, rectitud y firmeza.
- **Compromiso:** Ejecución de proyectos que coadyuven al desarrollo local.
- **Transparencia:** Amplia difusión de información sobre nuestras actuaciones. Rendición de cuentas ante la sociedad.
- **Lealtad:** Actuar con fidelidad y rectitud hacia el FHIS y compañeros de trabajo, con el objetivo de identificarse con la institución.
- **Equidad:** El FHIS no hace distinción de credo, raza, de ninguna otra forma de discriminación humana.


Resultados Financieros y Físicos

SEDECOAS-FHIS, llega hasta los lugares más lejanos del país, para contribuir a mitigar las necesidades de la población más pobre y vulnerable a través de respuestas rápidas y concretas con proyectos de Agua y Saneamiento, Educación, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural.

El presupuesto vigente de SEDECOAS-FHIS para la gestión 2024 al 31 de diciembre asciende a 1.836 mil millones de lempiras y su ejecución acumulada al II trimestre asciende a 430.160 millones de lempiras, financiado tanto por fondos del Tesoro Nacional, como de Créditos y Donaciones de Organismos Internacionales, y cuya distribución, así como su participación porcentual en el presupuesto general de la institución se describe a continuación:

Fuente	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecución Acumulada II Trimestre	% de Participación en el Presupuesto Vigente
BM	L.	298.426.045,00	L.	380.926.045,00	L. 156.339.245,96	21%
BCIE	L.	358.211.977,00	L.	358.211.977,00	L. 54.215.024,92	20%
USAID	L.	98.275.329,00	L.	98.275.329,00	L. 30.196.497,86	5%
GOH*	L.	1.370.965.245,00	L.	613.587.513,00	L. 129.730.699,30	33%
KfW	L.	205.192.188,00	L.	205.192.188,00	L. 10.296.279,95	11%
TESORO NACIONAL	L.	-	L.	180.659.079,00	L. 49.382.745,30	10%
TOTAL	L.	2.331.070.784,00	L.	1.836.852.131,00	L. 430.160.493,29	100%

* Incluye costo Operativo del FHIS

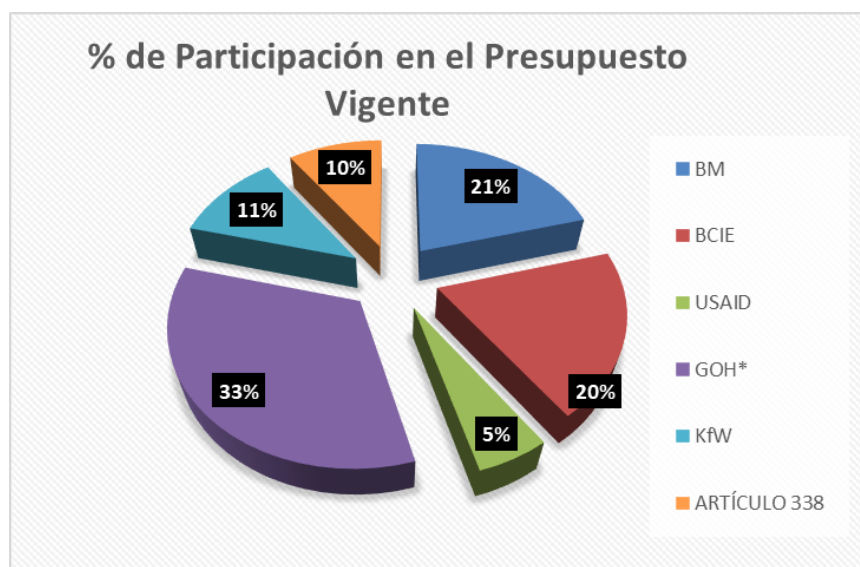

Proyectos FHIS

Fuente	Nombre del Proyecto	Nombre Corto	Sector	Modalidad Ejecución
BM	Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota	PRE 6822-HN	Infraestructura Escolar	Centralizados
BCIE	Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	BCIE No. 2239 MIFE	Infraestructura Escolar	PEC-Descentralizados
	Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira.	BCIE No. 2261	Agua y Saneamiento	Centralizados
KFW	Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar SE-FHIS FASE IV y V	PROMINE	Infraestructura Escolar	PEC-Descentralizados
	Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras	CONVIVIR	Infraestructura Social	Descentralizados
USAID	Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana	ICS	Infraestructura Social y Escolar	PEC/Centralizados
	Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras	PIOH	Infraestructura Escolar	PEC/Centralizados
Fondos Nacionales	Programa de Gestión de Proyectos Artículo 338 DGP-2024	ARTÍCULO 338	Infraestructura Vial y Escolar	Centralizados


Avance Ejecución Física de Proyectos de Inversión

Avance Ejecución Física de Proyectos de Inversión						
Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Metas			Ubicación y Observaciones
			Programación 2024	Ejecución Física acumulada al II Trimestre 2024		
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	
PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS	Centros educativos rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota en beneficio de la población afectada por los fenómenos naturales. PRE	CENTRO EDUCATIVO	20	11	55%	Los 4 subproyectos terminados en 1er Trimestre son: 108446, 108447, 108452 y 108507. Los 7 subproyectos terminados en 2do trimestre: 108314, 108420, 108449, 108471, 108457, 108614 y 109631.
	Sistemas de agua rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota. PRE	SISTEMA DE AGUA	3	0	0%	Producto programado para el IV trimestre
	Infraestructura vial rehabilitada y reconstruida afectados por ciclones Eta e Iota. PRE	KILOMETRO	5	3	60%	El subproyecto terminado en el 1er. Trimestre 109225 y los subproyectos terminados en el 2do. Trimestre 109240 y 109239
	Infraestructura en centros de salud pública rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota en beneficio de la población afectada por los fenómenos naturales. PRE	UNIDAD DE SALUD	1	0	0%	Producto programado para el IV trimestre
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados. MIFE	CENTRO EDUCATIVO	42	20	48%	Meta cumplida para el II trimestre, productos programados para el III y IV trimestre
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE IV y V)	Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados. PROMINE	CENTRO EDUCATIVO	7	1	14%	Productos programados para el III y IV trimestre
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS FASE II	Espacios públicos recuperados y entregados para la seguridad ciudadana a las colonias, alcaldías y patronatos en beneficio de la población hondureña CONVIVIR II	OBRA	7	0	0%	El Programa No proporciono la información de evaluación, productos programados para el III trimestre
	Jóvenes capacitados en habilidades sociales y laborales para personas jóvenes de entre las edades de 12-30 años en los municipios de Santa Rosa de Copán, Intibucá, La Esperanza y Juticalpa. CONVIVIR Fase II	CAPACITADO	810	0	0%	El Programa No proporciono la información de evaluación, productos programados para el IV trimestre
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	Espacios públicos recuperados y entregados para la seguridad ciudadana a las colonias, alcaldías y patronatos en beneficio de la población hondureña ICS	OBRA	3	1	33%	Construcción Área Recreativa en CDA Col. Gale
	Centros educativos construidos, reparados y/o ampliados ubicados en Choloma, San Pedro Sula, Chamelecón, La Lima, Tela y en Tegucigalpa en beneficio de niños y niñas de las zona urbana y rural de Honduras. ICS	CENTRO EDUCATIVO	3	1	33%	Por ampliación de alcances, el proyecto pasará al próximo trimestre
	Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud ubicados en La Ceiba, Sps y Tegucigalpa. ICS	OBRA	1	2	200%	El proyecto presentó una ampliación en el 2023, por lo que se presenta hasta este año 1) Reparación Anexo y Obras Complementarias en la Secretaría de Salud Fase II, Ubicado en Barrio Abajo. Código 109152. 2) Ampliación Centro de Salud San Miguel, Col. San Miguel, Tegucigalpa, Francisco Morazán
ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	Centros educativos construidos, reparados y/o ampliados en beneficio de niños y niñas de las zonas rural y urbanas en Honduras. PIOH	CENTRO EDUCATIVO	1	0	0%	Productos programados para el IV trimestre
	Infraestructura social (puentes y caja puente), rehabilitada y reconstruida en beneficio de la población a nivel Nacional PIOH	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	1	0	0%	
PROGRAMA DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS	Diseño de los sistemas de agua potable realizado. GRACIAS	DISEÑO	1	0	0%	La ejecución de proyectos se presenta hasta el IV trimestre

Ejecución Presupuestaria por Programas 2024

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Monto Planificado II Trimestre	Devengado al II Trimestre	Devengado Acumulado	Credito Disponible	% Ejecución II Trimestre/ Planificado II Trimestre	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
Programa 1: Actividades Centrales	L 1.145.388.050,00	L 398.010.318,00	L 106.707.822,33	L 49.950.390,08	L 81.754.214,52	L 166.206.053,07	47%	21%
Programa 11: Infraestructura Rural	L 282.287.531,00	L 272.287.531,00	L 70.571.883,00	L 51.549.562,93	L 59.452.730,99	L 212.834.800,01	73%	22%
Programa 12: Infraestructura Escolar	L 441.187.553,00	L 441.187.553,00	L 89.384.110,00	L 35.747.896,66	L 48.498.582,71	L 205.677.873,92	40%	11%
Programa 14: Fomento al Desarrollo Local	L 112.155.540,00	L 112.155.540,00	L 28.038.885,00	L 13.459.584,11	L 24.595.096,95	L 87.538.915,19	48%	22%
Programa 16: Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras	L 298.426.045,00	L 380.926.045,00	L 126.733.710,00	L 111.750.963,18	L 156.339.245,96	L 188.369.452,46	88%	41%
Programa 17: Programa de Agua y Saneamiento	L 51.626.065,00	L 51.626.065,00	L 5.362.870,00	L 8.856.010,86	L 10.137.876,86	L 37.887.505,57	165%	20%
Programa 19: Gestión de Proyectos Artículo 338 DGP-2024	L -	L 180.659.079,00	L 126.461.355,00	L 49.382.745,30	L 49.382.745,30	L 125.409.272,42	39%	27%
TOTAL	L 2.331.070.784,00	L 1.836.852.131,00	L 553.260.635,33	L 320.697.153,12	L 430.160.493,29	L 1.023.923.872,64	58%	23%


Nota: Se considera el credito disponible ya que cuenta con los fondos reservados de cada proyecto, el saldo al II trimestre es de L. 1,406,691,637.71

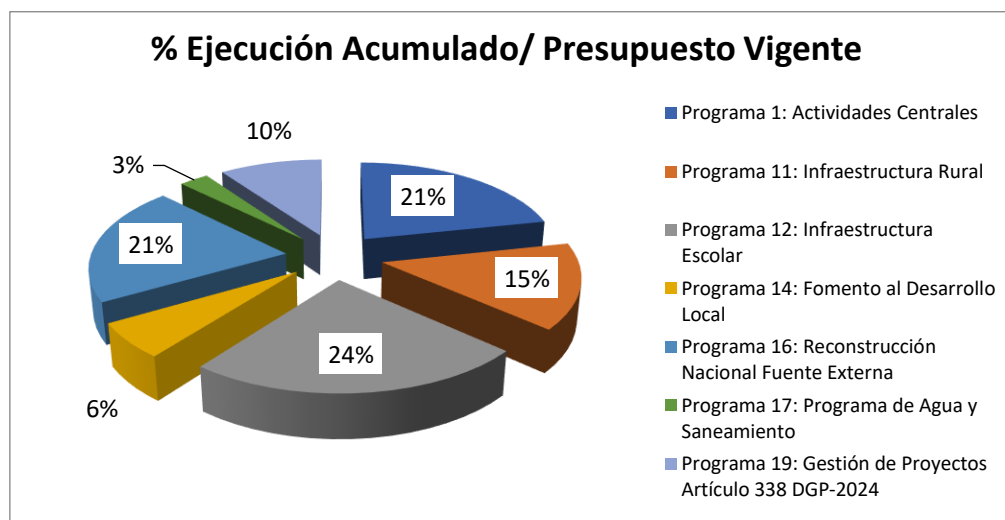

Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2024

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente 2024	Devengado al II Trimestre	Devengado Acumulado 2024	% Ejecución al II Trimestre / Presupuesto Vigente	% Acumulado al II Trimestre
Gasto Operativo/Gobierno	L. 1.145.388.050,00	L. 398.010.318,00	L. 49.950.390,08	L. 81.754.214,52	13%	21%
Obras Comunitarias Menores a Nivel Nacional FN	L. 225.577.195,00	L. 215.577.195,00	L. 45.695.903,94	L. 47.976.484,78	21%	22%
Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras PIOH	L. 56.710.336,00	L. 56.710.336,00	L. 5.853.658,99	L. 11.476.246,21	10%	20%
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE	L. 134.601.641,00	L. 134.601.641,00	L. 1.735.637,32	L. 4.421.434,65	1%	3%
Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras MIFE	L. 306.585.912,00	L. 306.585.912,00	L. 34.012.259,34	L. 44.077.148,06	11%	14%
Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS	L. 41.564.993,00	L. 41.564.993,00	L. 10.216.883,02	L. 18.720.251,65	25%	45%
Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jovenes CONVIVIR a Fase II	L. 70.590.547,00	L. 70.590.547,00	L. 3.242.701,09	L. 5.874.845,30	5%	8%
Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales ETA e IOTA PRE	L. 298.426.045,00	L. 380.926.045,00	L. 111.750.963,18	L. 156.339.245,96	29%	41%
Programa de Ampliación del sistema de Abastecimiento de agua Potable en la Ciudad de Gracias	L. 51.626.065,00	L. 51.626.065,00	L. 8.856.010,86	L. 10.137.876,86	17%	20%
Gestión de Proyectos Artículo 338 DGP-2024	L. -	L. 180.659.079,00	L. 49.382.745,30	L. 49.382.745,30	27%	27%
TOTAL	L. 2.331.070.784,00	L. 1.836.852.131,00	L. 320.697.153,12	L. 430.160.493,29	17%	23%

Nota: Se considera el credito disponible ya que cuenta con los fondos reservados de cada proyecto, el saldo al II trimestre es de L. 1,406,691,637.71

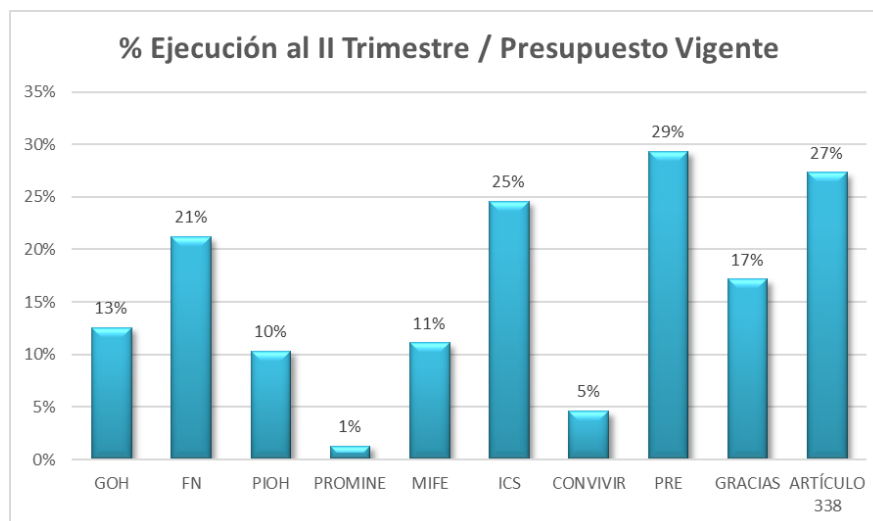


Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Segundo Trimestre 2024

Grupo	Aprobado	Presupuesto Vigente por Grupo	Devengado II Trimestre	Devengado Acumulado al II Trimestre	Disponible	% Ejecución II Trimestre/ Presupuesto Vigente	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
SERVICIOS PERSONALES	L. 155.497.701,00	L. 155.907.084,00	L. 35.948.753,59	L. 64.165.135,35	L. 91.741.948,65	23%	41%
SERVICIOS NO PERSONALES	L. 211.277.814,00	L. 243.876.951,00	L. 59.364.295,19	L. 91.088.407,18	L. 128.293.354,95	24%	37%
MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 19.478.176,00	L. 19.035.176,00	L. 1.402.477,48	L. 2.392.311,59	L. 15.893.349,55	7%	13%
BIENES CAPITALIZABLES	L. 1.935.611.955,00	L. 1.408.827.782,00	L. 223.077.847,61	L. 271.610.859,92	L. 779.693.860,74	16%	19%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. 9.205.138,00	L. 9.205.138,00	L. 903.779,25	L. 903.779,25	L. 8.301.358,75	10%	10%
Total	L. 2.331.070.784,00	L. 1.836.852.131,00	L. 320.697.153,12	L. 430.160.493,29	L. 1.023.923.872,64	17%	23%

Nota: Se considera el credito disponible ya que cuenta con los fondos reservados de cada proyecto, el saldo al II trimestre es de L. 1,406,691,637,71

Presupuesto Devengado II Trimestre

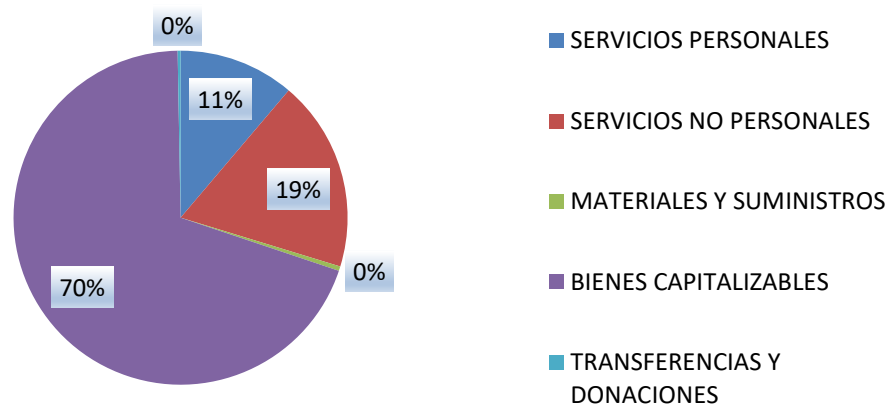

Ejecución por Objeto del Gasto Segundo Trimestre del 2024

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
1100	Sueldos basicos	78.102.779,00	78.102.779,00	31.734.870,24	46.367.908,76
11510	Decimotercer mes	6.515.110,00	6.515.110,00	147.577,27	6.367.532,73
11520	Decimocuarto mes	6.515.110,00	6.515.110,00	5.036.818,07	1.478.291,93
11600	Complementos	5.238.328,00	5.238.328,00	2.620.572,06	2.617.755,94
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11.313.121,00	11.313.121,00	4.552.472,03	6.760.648,97
11750	Contribuciones para Seguro Social	2.401.600,00	2.401.600,00	1.412.208,44	989.391,56
12100	Sueldos basicos	37.800.475,00	37.800.475,00	16.292.702,39	21.507.772,61
12410	Decimotercer mes	3.150.040,00	3.150.040,00	112.888,08	3.037.151,92
12420	Decimocuarto mes	3.150.040,00	3.150.040,00	1.303.982,53	1.846.057,47
12550	Contribuciones para Seguro Social	1.311.098,00	1.311.098,00	541.662,08	769.435,92
16200	Compensaciones	0,00	409.383,00	409.382,16	0,84
21110	Suministro de Energia Electrica	300.000,00	300.000,00	191.720,61	108.279,39
21200	Agua	150.000,00	150.000,00	19.872,00	120.128,00
21430	Telefonia Celular	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	6.000.000,00	6.000.000,00	5.394.000,00	606.000,00
23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	1574.000,00	1574.000,00	335.125,80	1.117.518,35
23600	Mantenimiento de Sistemas Informaticos	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
24200	Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
24300	Servicios Juridicos	940.000,00	940.000,00	177.000,00	763.000,00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoria	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00	1.183.000,00
24500	Servicios de Capacitacion	2.251.215,00	2.251.215,00	534.000,00	1.717.215,00
24710	Servicios de Consultoria de Gestion Administrativa y Financiera	4.745.216,00	4.745.216,00	2.136.666,67	2.438.549,33
24720	Servicios de Consultoria de Monitoreo y Evaluacion	11.022.946,00	11.022.946,00	3.935.166,66	6.880.979,34
25100	Servicio de Transporte	25.000,00	25.000,00	1.950,00	23.050,00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2.000.000,00	2.000.000,00	1.666.632,51	333.367,49
25400	Primas y Gastos de Seguro	10.921.429,00	10.921.429,00	3.092.016,26	7.829.412,74
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
25600	Publicidad y propaganda	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
25700	Servicio de Internet	21.000,00	21.000,00	3.272,14	17.727,86
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	400.000,00	380.000,00	17.092,68	362.907,32
26110	Pasajes Nacionales	240.000,00	240.000,00	55.321,60	179.828,40
26210	Viaticos Nacionales	8.072.168,00	7.662.785,00	3.211.502,72	4.335.222,06
27210	Tasas	625.000,00	625.000,00	35.165,00	589.835,00
29100	Ceremonial y Protocolo	207.142,00	207.142,00	47.484,36	159.657,64
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	134.245,00	134.245,00	79.298,99	54.946,01
32310	Prendas de Vestir	130.000,00	130.000,00	29.808,00	100.192,00
33100	Productos de Papely Carton	520.000,00	520.000,00	7.793,30	490.678,84
33300	Productos de Artes Graficas	95.000,00	95.000,00	16.560,00	78.440,00
33500	Libros, Revistas y Periodicos	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
33700	Especies Timbradas y Valores	30.000,00	30.000,00	1.100,00	28.900,00
34400	Llantas y Camaras de Aire	999.613,00	999.613,00	212.980,00	518.226,80
35610	Gasolina	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
35620	Diesel	2.125.000,00	2.125.000,00	761.523,34	1.232.824,66
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
35800	Productos de Material Plastico	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50.000,00	50.000,00	44.892,73	5.107,27
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	565.000,00	565.000,00	112.871,76	452.128,24
39300	Utiles y Materiales Electricos	50.000,00	50.000,00	0,00	47.177,90
39600	Repuestos y Accesorios	1.747.937,00	1.747.937,00	73.255,15	1.492.314,35
42110	Muebles Varios de Oficina	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0,00	8.000.000,00	3.654.315,45	25.000,01
42600	Equipos para Computacion	95.534,00	95.534,00	0,00	95.534,00
42710	Muebles y Equipos Educacionales	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
45100	Aplicaciones Informativas	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Privado	80.000.000,00	12.159.634,00	6.273.143,43	115.322.490,57
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Publico	451.522.944,00	399.927.310,00	91.086.086,65	157.870.741,07
Total		765.707.090,00	765.707.090,00	187.372.753,16	578.334.336,84

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
26210	Viaticos Nacionales	0,00	65.520,00	0,00	65.520,00
21110	Suministro de energia electrica	440.000,00	440.000,00	129.764,62	295.423,68
21420	Telefonia Fija	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y locales	3.600.000,00	3.613.000,00	1520.829,93	1662.245,16
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	2.952.569,00	2.952.569,00	497.562,57	1918.747,83
23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales	576.000,00	576.000,00	256.113,93	319.886,08
23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	600.000,00	625.000,00	104.568,92	520.431,08
23360	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles	245.001,00	245.001,00	28.807,50	216.193,50
23390	Mantenimiento y Reparacion de Otros Equipos	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigacion	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
24200	Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	44.205.630,00	44.205.630,00	9.234.312,67	24.389.836,90
24300	Servicios Juridicos	0,00	1000.000,00	488.656,08	511.343,92
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoria	5.749.098,00	5.749.098,00	1.493.808,85	4.255.289,15
24500	Servicios de Capacitacion	12.985.000,00	12.985.000,00	278.000,00	12.707.000,00
24600	Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados	356.000,00	356.000,00	0,00	356.000,00
24710	Servicios de Consultoria de Gestion Administrativa y Financiera	41048.500,00	40.048.500,00	13.017.161,73	15.412.710,27
24720	Servicios de Consultoria de Monitoreo y Evaluacion	3.770.000,00	3.770.000,00	932.374,02	2.393.861,18
25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	785.000,00	1045.000,00	421.580,97	557.515,00
25400	Primas y Gastos de Seguro	550.000,00	33.200.000,00	30.919.000,00	2.281.000,00
25700	Servicio de Internet	490.000,00	490.000,00	155.879,08	322.644,52
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	235.000,00	235.000,00	15.835,41	219.164,59
26110	Pasajes Nacionales	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
26210	Viaticos Nacionales	6.203.998,00	6.173.998,00	899.605,02	5.248.283,59
27210	Tasas	250.000,00	275.000,00	0,00	268.931,44
29100	Ceremonial y Protocolo	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	1238.875,00	1238.875,00	90.390,00	1.148.485,00
32310	Prendas de Vestir	950.000,00	1080.000,00	0,00	1080.000,00
33100	Productos de Papel y Carton	615.000,00	634.062,00	0,00	617.219,22
33300	Productos de Artes Graficas	200.000,00	206.974,00	0,00	206.974,00
34400	Llantas y Camaras de Aire	520.000,00	545.000,00	0,00	545.000,00
35620	Diesel	3.185.066,00	2.587.066,00	276.258,05	2.240.681,96
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	510.000,00	469.752,00	3.761,80	412.078,41
39300	Utiles y Materiales Electricos	0,00	5.636,00	0,00	5.636,00
39600	Repuestos y Accesorios	1507.056,00	1515.632,00	7.474,49	1505.288,88
42110	Muebles Varios de Oficina	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
42120	Equipos Varios de Oficina	5.100.000,00	5.190.000,00	0,00	5.190.000,00
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	5.300.000,00	15.875.000,00	0,00	15.875.000,00
42600	Equipos para Computacion	10.250.000,00	16.163.605,00	5.263.604,42	10.900.000,58
45100	Aplicaciones Informaticas	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	27.489.000,00	27.489.000,00	0,00	27.489.000,00
47120	Supervision de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25.286.494,00	25.286.494,00	7.871.099,58	14.087.015,25
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	1064.783.824,00	521421046,00	128.030.557,75	234.606.098,49
47220	Supervision de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	63.518.054,00	63.518.054,00	12.188.943,01	30.396.908,40
54110	Ayuda Social a Personas (Transferencia de Capital)	9.205.138,00	9.205.138,00	903.779,25	8.301.358,75
Total		1.351.560.303,00	857.276.130,00	215.029.729,65	642.246.400,35

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	192.000,00	192.000,00	191999,76	0,24
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de tracción y Elevación	554.752,00	554.752,00	274.031,36	280.720,64
23600	Mantenimiento de sistemas Informáticos	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	484.000,00	484.000,00	0,00	484.000,00
24500	Servicios de Capacitación	1419.012,00	1419.012,00	0,00	1419.012,00
24710	Servicios de consultoría de gestión administrativa y financiera	14.087.221,00	14.087.221,00	5.466.150,00	8.621.071,00
24720	Servicios de consultoría de monitoreo y evaluación	11.898.000,00	11.898.000,00	2.417.465,62	9.480.534,38
25100	Servicio de transporte	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
25300	Servicio de imprenta, Publicaciones y Reproducciones	431.759,00	431.759,00	43.585,00	388.174,00
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26110	Pasajes Nacionales	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
26210	Viajes Nacionales	3.096.000,00	3.096.000,00	1.447.325,12	1.648.674,88
29100	Ceremonial y Protocolo	102.158,00	102.158,00	0,00	102.158,00
31110	Productos alimenticios y bebidas	90.000,00	90.000,00	1639,09	88.360,91
32310	Prendas de vestir	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
33100	Productos de papel y cartón	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
34400	Llaves y Cámaras de Aire	695.000,00	695.000,00	0,00	695.000,00
35610	Gasolina	868.384,00	868.384,00	566.603,90	301.780,10
35620	Diesel	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
39200	Útiles de escritorio, Oficina y Enseñanza	25.000,00	25.000,00	18.360,00	6.640,00
39600	Repuestos y accesorios	810.000,00	810.000,00	87.741,00	722.259,00
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0,00	0,00	0,00	0,00
42600	Equipo para Computación	1.603.200,00	1.603.200,00	22.637,25	1.580.562,75
42900	Equipo para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00
45100	Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	104.349.347,00	104.349.347,00	1.268.802,08	83.893.621,92
47120	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	6.626.355,00	6.626.355,00	0,00	6.626.355,00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	63.537.203,00	63.537.203,00	15.951.670,30	47.585.532,70
Total		213.803.391,00	213.803.391,00	27.758.010,48	186.045.380,52
Total General		2.331.070.784,00	1.836.852.131,00	430.160.493,29	1.023.923.872,64

Resumen de Cuadro por Sector 2024

SECTOR	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
AGUA Y SANEAMIENTO	0	16	55.493.573,49	472	485.278
ELECTRIFICACION	0	2	-	7	32.500
INFRAESTRUCTURA VIAL	3	113	72.339.985,45	1.953	1.412.878
EMPRENDIMIENTO Y VALORES	0	0	278.000,00	0	0
PREVENCION SITUACIONAL/CONVIVIENCIA	3	33	16.203.394,62	516	1.169.249
EDUCACION	26	106	94.350.472,11	2.282	63.259
SALUD	0	1	3.539.336,16	44	3.116
TOTAL	32	271	242.204.761,83	5.274	3.166.280

Nota: El monto total refleja la inversión realizado por los proyectos en Construcción

Resumen de Cuadro por Departamento 2024

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
ATLANTIDA	1	10	6.666.609,48	176	16.760
CHOLUTECA	0	9	10.060.809,76	176	179.734
COMAYAGUA	2	24	13.703.409,75	546	165.126
COPAN	1	15	12.967.025,51	324	70.768
CORTES	8	50	63.157.451,16	980	1.258.638
COLON	0	2	-	28	50.573
EL PARAISO	1	8	4.931.806,55	186	165.958
FRANCISCO MORAZAN	3	32	23.708.503,23	638	321.402
GRACIAS A DIOS*	0	2	-	49	902
INTIBUCÁ	0	7	1.881.934,44	17	1.025
LA PAZ	3	9	5.591.446,52	157	76.843
LEMPIRA	1	12	9.486.411,96	274	10.540
OCOTEPEQUE	1	2	1.068.528,33	59	380
OLANCHO	4	46	25.484.306,99	759	593.482
SANTA BARBARA	7	25	25.082.724,65	453	139.408
YORO	0	12	35.105.041,20	369	96.461
VALLE	0	6	3.308.752,30	83	18.280
TOTAL	32	271	242.204.761,83	5.274	3.166.280

Nota: El monto total refleja la inversión realizado por los proyectos en Construcción

*El Proyecto en Gracias a Dios se encuentra en resolución en Secretaría General, Dirección Legal y en Control y Seguimiento FHIS

Resumen de Cuadro por Otras Inversiones 2024

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	57.027.015,40
GASTO OPERATIVO DE PROGRAMAS	18.255.501,54
ACTIVIDADES CENTRALES FHIS	81.754.214,52
TOTAL	157.036.731,46

CARTERA BANCO MUNDIAL



✓ **Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE 6822-HN)**



i. Antecedentes

Entre los días 1 y 16 de noviembre de 2020, dos tormentas tropicales consecutivas, Eta e Iota, devastaron a Honduras con una magnitud de impacto económico y social comparable a la del huracán Mitch de 1998. En respuesta a la emergencia causada, el Gobierno de Honduras (GdH) solicitó al Banco Mundial (BM) un financiamiento de US\$150 millones para un Proyecto de Recuperación de Emergencia.

El 8 de marzo de 2021 el Gobierno de Honduras suscribió con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) el Convenio de Crédito No. 6822-HN, por un monto de US\$150.000.000.00, aprobado mediante Decreto Legislativo No.10-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 5 de mayo de 2021, fondos que financiaran el Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE), habiéndose cumplido con las condiciones de efectividad el 4 de junio de 2021 y efectuándose el Primer Desembolso el 28 de junio de 2021 por un monto de USD\$ 4.36 Millones.

El Proyecto se enfoca en la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública en salud, educación, agua y saneamiento, vial, comunitaria y vivienda en las zonas geográficas del país afectadas por los ciclones tropicales Eta e Iota.

La implementación, coordinación, planificación y seguimiento general del Proyecto se llevará de manera centralizada en la SEDECOAS, a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), quien contará con personal especializado en diferentes áreas que garanticen el cumplimiento de los estándares del BM.

ii. **Objetivo General**

El PRE tiene por objetivo atender las necesidades identificadas como prioritarias para reactivar la economía y apoyar las más urgentes necesidades de la población afectada por los fenómenos naturales ETA e IOTA, como respuesta de emergencia y recuperación de Honduras, y, en esta perspectiva, fortalecer la capacidad institucional del Estado para gestionar una ejecución eficaz, eficiente y transparente.

iii. **Objetivos Específicos**

- Realizar operaciones de asistencia y respuesta de emergencia, salud y seguridad pública.
- Realizar la rehabilitación y construcción resiliente de la infraestructura pública y Comunitaria y Restablecimiento de los servicios públicos.
- Mejorar la capacidad instalada del Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.

iv. **Descripción**

Componente 1: Operaciones de asistencia y respuesta de emergencia, salud y seguridad pública (US\$ 17.3 MILLONES)

Bajo este componente se financian actividades y acciones de respuesta y seguridad pública como resultado de los daños causados por los ciclones Eta e Iota. Son elegibles actividades de respuesta inmediata realizadas por el Gobierno de Honduras previo a la fecha de efectividad del Crédito.

Componente 2: Rehabilitación y reconstrucción resiliente de la infraestructura pública y comunitaria y restablecimiento de los servicios públicos (US\$121.7 MILLONES)

Este componente se financia la preparación técnica, la implementación de reparaciones urgentes, rehabilitación y reconstrucción resiliente de la infraestructura pública y comunitaria de alta prioridad,

incluido el costo de la reubicación temporal y la inspección o actividades de diseño necesarias para instalaciones de alta prioridad que requieran una nueva construcción.

Componente 3: Apoyo institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción (US\$11.0 MILLONES)

El componente se financia la gestión de Proyecto (financiero y fiduciario), la capacidad técnica e institucional, auditorías técnicas, financieras y sociales, monitoreo y seguimiento, cumplimiento social y ambiental, mecanismo de atención y resolución de quejas y denuncias, preparaciones informes, evaluación de medio términos, estudios de línea base.

v. Focalización

Para determinar las zonas y sectores de intervención, el Gobierno de Honduras con la asistencia técnica de organizaciones y agencias internacionales, ha elaborado el documento borrador denominado “Evaluación de daños y pérdidas causadas por las tormentas tropicales Eta e Iota”¹

También se cuenta con la base de datos del estudio levantado por la SEDECOAS denominado “Plataforma de información de incidencias de la infraestructura dañada por las tormentas Eta e Iota”, que consolida los datos de las tres fuentes del Gobierno. De igual manera, se cuenta con listas de infraestructura que fue levantada por las instituciones sectoriales en las oficinas de COPECO Tegucigalpa, en un centro de acopio instalado luego de los eventos de desastre de las tormentas tropicales Eta e Iota.

Las acciones de respuesta de socorro y atención a personas están siendo financiadas bajo el Componente 1 y, las obras de reconstrucción y rehabilitación, elegibles y priorizadas, serán financiadas bajo el Componente 2, estas se ejecutarán en los municipios y sectores afectados por las tormentas tropicales Eta e Iota.

vi. Sector de Intervención

Los sectores por intervenir son:

¹ Dalla_Honduras, 2020

- *Infraestructura de Salud:* Rehabilitación, reconstrucción, construcción de obras de mitigación de centros de salud, UAPS, CIS, Clínicos y hospitales.
- *Infraestructura Vial:* Habilitación, reposición de carreteras primarias, secundarias, carreteras terciarias (caminos vecinales), habilitación, reposición y reparación de puentes, puentes de doble vía, cajas puentes, vados en caminos, construcción de obras de mitigación para proteger estructuras viales, rehabilitación de calles (pavimentadas y no pavimentadas), rehabilitación de caminos rurales de terracería, mantenimiento en los cauces de los ríos (incluye limpieza, dragado, etc.).
- *Infraestructura Escolar:* Rehabilitación, reparación y reposición de Centros de Educación de manera integral incluyendo obras ambientales y de mitigación.
- *Infraestructura Agua y Saneamiento:* Reparación o rehabilitación en estructuras de sistemas de agua potables (obras tomas, desarenadores, pases aéreos, tanques de almacenamiento, cajas de registro, rompe cargas, cajas distribuidoras de caudal, etc.), plantas de tratamiento y sistemas de aguas residuales, construcción de obras de mitigación para la protección de estructuras de los sistemas de agua potable y residuales, equipamiento de agua potable y residuales.
- *Infraestructura Comunitaria:* Rehabilitación de centros comunitarios y servicios públicos básicos (estación de bomberos, estaciones policiales, albergues, alcaldías, etc.), reposición de centros comunitarios, equipamiento para rehabilitación de centros comunitarios y servicios públicos básicos.

vii. Duración del Proyecto:

El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de 5 años y medio incluyendo actividades de gestión, socialización, adquisiciones, etc.

viii. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	175.537.263,00	1.116.987,87	1%
2022	259.608.231,00	53.027.150,75	20%
2023	432.092.852,00	130.271.743,46	30%
2024	380.926.045,00	156.339.245,96	41%

ix. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
AGUA Y SANEAMIENTO	0	5	33.400.899,72	333	119.570
INFRAESTRUCTURA VIAL	3	2	14.408.624,50	157	20.002
EDUCACION	11	17	43.332.836,36	801	7.037
SALUD	0	1	3.539.336,16	44	3.116
TOTAL	14	25	94.681.696,74	1.335	149.725

x. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios directos 2024
ATLANTIDA	-	1	1.678.929,13	37	248
CHOLUTECA	-	1	7.682.968,97	102	1.491
COMAYAGUA	2	4	6.874.163,13	196	73.141
COPAN	-	2	9.478.286,81	85	12.915
CORTES	2	8	15.781.470,84	372	3.817
EL PARAISO	1	-	448.456,00	17	29
FRANCISCO MORAZAN	1	3	10.992.033,54	114	1.405
LA PAZ	3	0	856.486,80	28	82
LEMPIRA	1	1	5.244.598,00	35	133
OCOTEPEQUE	1	0	321.802,70	14	32
SANTA BARBARA	3	0	4.930.337,62	72	7.087
YORO		5	30.392.163,20	263	49.345
TOTAL	14	25	94.681.696,74	1335	149.725

xi. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	27.830.893,10
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	2.907.656,12
SEGURO SOBERANO -CCRIF	30.919.000,00
TOTAL	61.657.549,22

xii. Situación presupuestaria

El monto formulado original para el año 2024 asciende a L 298,426,045.00, sin embargo, después de actualizar los montos comprometidos y ejecutados al cierre del 2023, se presentó para consideración de la SEFIN, un nuevo monto presupuestario por L 349,935,045.00 el cual no fue aceptado.

En mayo, se le ha incorporado al presupuesto L 32,500,000.00 para pagos del seguro soberano. En junio se incorporaron L 50,000,000.00 para pago de estimaciones de subproyectos de inversión. El presupuesto vigente ahora asciende a L 380,926,045.00 ejecutándose al cierre del segundo trimestre el monto de L 156,339,245.96 equivalente al 41 %.

Así mismo, a partir de las revisiones y reprogramaciones de actividades en el Plan Operativo Anual (POA) y en el Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC), se solicitaron modificaciones presupuestarias internas entre actividades y objetos del gasto, sin modificarse el presupuesto global vigente.

El 72% del presupuesto está concentrado en el Componente 2 para ejecución de obras de las cuales a la fecha ascienden a 67 subproyectos. Las primeras 25 obras obedecen a subproyectos de reposición/reparación de centros educativos los cuales iniciaron su ejecución en el IV Trimestre del año 2022. En el III trimestre del 2023 se han iniciado 3 obras de agua y saneamiento y 17 obras de centros educativos. En el IV trimestre del 2023 se han iniciado 4 subproyectos viales y 8 nuevos subproyectos en centros educativos. En el primer trimestre de 2024 iniciaron 2 subproyectos, uno de infraestructura vial y

otro de agua potable. En el II trimestre del 2024 se han iniciado 3 obras en centros educativos, 1 sistema de agua potable y 1 reposición de infraestructura de salud.

El monto del financiamiento del Crédito es de US\$ 150,000.00, de los cuales al 30 de junio de 2024 se tiene una ejecución financiera acumulada que asciende a L 944,548,679.00 equivalentes a USD 38,592,810.00 que representa el 25.73% del monto de Convenio; mostrándose a la fecha una disponibilidad por componentes de inversión, así:

Componentes	(a) Asignación Convenio Crédito		(b) = (c + d) Total Comprometido		(c) Ejecutado acumulado		(d) Comprometido por ejecutar **		(e) = (a - b) Disponible
	US\$	HNL	US\$	HNL	US\$	HNL	US\$	HNL	US\$
1) Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública	17,300,000	420,390,000	16,818,559	407,708,157	16,818,559	407,708,157	-	-	481,441
<i>Categoría : Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, y costos operativos bajo la Parte 1 del Proyecto.</i>	17,300,000	420,390,000	16,818,559	407,708,157	16,818,559	407,708,157	-	-	481,441
2) Rehabilitación y Construcción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos	119,200,000	2,896,560,000	39,734,619	979,328,770	16,032,685	395,310,738	23,701,934	584,018,032	79,465,381
<i>Categoría: Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 2 del Proyecto</i>	119,200,000	2,896,560,000	39,734,619	979,328,770	16,032,685	395,310,738	23,701,934	584,018,032	79,465,381
3) Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción	11,000,000	267,300,000	4,603,725	113,343,700	3,491,565	85,939,984	1,112,159	27,403,717	6,396,275
<i>Categoría: Bienes, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 3 del Proyecto</i>	11,000,000	267,300,000	4,603,725	113,343,700	3,491,565	85,939,984	1,112,159	27,403,716.69	6,396,275
4) Medidas de Protección Financiera de Emergencia	2,500,000	60,750,000	2,250,000	55,589,800	2,250,000	55,589,800	-	-	250,000
<i>Categoría: Primas anuales en virtud de la Parte 4 del Proyecto</i>	2,500,000	60,750,000	2,250,000	55,589,800	2,250,000	55,589,800	-	-	250,000
Total	\$ 150,000,000	HNL 3,645,000,000	\$ 63,406,903	HNL 1,555,970,427	\$ 38,592,810	HNL 944,548,679	\$ 24,814,094	HNL 611,421,749	\$ 86,593,097

* Se aplica la tasa de L 24.3 establecida en el Documento del Proyecto (PAD) y en el presupuesto global en los Sistemas: SNIPH, UEPEX y Sistema Financiero del FHIS.
 ** Valores comprometidos con contrato

xiii. Desembolsos

Al 30 de junio del 2024 se ha desembolsado la cantidad de US\$ 45,451,089.38 equivalente a L 1,109,671,274.00; representa el 30.3% del total del Crédito. Del total desembolsado USD\$ 16.8 millones equivalente a L 407,7 millones, corresponde a reembolso bajo el Componente 1 mediante pago directo a la SEFIN por actividades de respuesta inmediata realizadas por la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS), así mismo, a petición de la SEFIN, se efectuó desembolso mediante pago directo por anticipo/prima de la Póliza de Seguro por exceso de lluvia (XSR) a The Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF-SPC), por US\$ 1 millón.

Desembolso	Dólares	Lempiras
Anticipo Cuenta Designada del Proyecto (Cta. 11101-20-000949-1 BCH) 2	19,439,988.00	474,970,979.91
Reembolso bajo Componente 1, con Pago Directo a la SEFIN. (Cta. 11101-20-000952-1)	16,818,559.38	407,708,157.42
Pago Directo – CCRIF	1,000,000.00	24,670,800.00
Total	37,258,547.38	907,349,937.33

xiv. Reasignación de fondos entre Categorías de Inversión.

Enmienda No. 1

Mediante Oficio No. SE-SEDECOAS-FHIS-620/2021 se solicita la primera reasignación de fondos entre Categorías de Inversión respaldada en Dictámenes Técnicos Favorables No. 057-2021 (septiembre 2021) y 068-2021 (noviembre 2021) emitidos por la SEFIN y aprobada por el Banco Mundial el 16 de diciembre de 2021.

cubierto con el presupuesto de la Categoría 2. del Componente 2., tal como se muestra en el cuadro siguiente.

La reasignación se hace entre el Componente 1. y 2. para cubrir el sobregiro de USD\$ 7,300,000 en el monto original asignado bajo la Categoría 1. del Componente 1.

Enmienda No. 2

En fecha 3 de agosto de 2023 la Secretaría de Finanzas solicita al Banco Mundial aprobación de la segunda enmienda al Convenio de Crédito, para incorporar el financiamiento del pago de la Prima del Fondo de Seguro contra Riesgos Catastróficos en el Caribe (CCRIF) de Honduras. La enmienda al Convenio de Financiamiento fue firmada el 31 de octubre de 2023 con Dictamen Técnico Favorable No.037-2023, que consiste en disminuir el Componente 2 en US\$ 2,500,000.00 y crear el Componente 4 – Primas anuales en virtud de la Parte 4 del Proyecto (Medidas de protección financiera de emergencia).

Categoría	Descripción de las categorías	Asignado Convenio Original	Enmienda 1	Enmienda 2	Asignación actual
(1)	Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, y costos operativos bajo la Parte 1 del Proyecto.	10,000,000	7,300,000	-	17,300,000
(2)	Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 2 del Proyecto.	129,000,000	(7,300,000)	(2,500,000)	119,200,000
(3)	Bienes, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 3 del Proyecto.	11,000,000	-		11,000,000
(4)	Primas anuales en virtud de la Parte 4 del Proyecto	-	-	2,500,000	2,500,000
Total		\$ 150,000,000	\$0.00	\$0.00	\$150,000,000

xv. Reembolso gastos efectuados bajo el Componente 1- Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia y Salud y Seguridad Pública.

Mediante Memorando 207-2021 SE-SEDECOAS-FHS del 11 de junio de 2021, se nombró Comité Interino para la revisión de documentación para reembolso del Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras, en cumplimiento a esto, al 31 de diciembre de 2021 se revisó documentación de procesos por un monto total de L591,952,044.29, de gastos ejecutados por la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS) y la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), en acciones de respuesta de socorro y atención a personas, así:

Institución	Lempiras
SEDIS	415.939.122,84
COPECO	176,012,921.45
Total	591,952,044.29

SEDIS: Del total de los gastos presentados, al 30 de junio de 2022 se han reembolsado con pago directo a la SEFIN un total de L 407,708,157.42 equivalente a USD 16,818,559.38, a través de Sistema de Desembolso (Client Connection). No se efectuarán más reembolsos.

COPECO: A la fecha ningún gasto se ha sometido a reembolso. Contratos de limpieza de calles están en proceso de revisión, y de ser elegibles, serán sometidos a reembolso con fondos del Contrato de Préstamo 5328 BL-HO, Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

xvi. AVANCE DE ACTIVIDADES

i. Componente 1 - Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia y Salud y Seguridad Pública.

A través de la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS) fueron atendidas 60,000 familias (equivalente a 300,000 personas) con kit de cocina, kit de higiene personal de niños y adultos, kit de limpieza, camas, estufas, filtros de agua, pañales, material de bioseguridad, toallas de baño, baldes plásticos, entre otros).

El componente 1, estuvo vigente del 2 de noviembre de 2020 al 8 marzo de 2021. Por tanto, durante la duración del proyecto no tendrá nuevas actividades a ejecutarse.

ii. Componente 2 - Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos (Obras).

Con el financiamiento de otras fuentes, el FHIS ha identificado zonas y sitios afectados por la tormenta Eta e Iota, con el fin de formular diseños finales para la rehabilitación y/o reconstrucción en infraestructura educativa, infraestructura vial (puentes) y en el sector de agua y saneamiento.

La Unidad Ejecutora del Proyecto a través de su personal técnico y con el apoyo de la Dirección de Proyectos del FHIS-SEDECOAS ha realizado revisiones a la formulación de los subproyectos

priorizados, para verificar que estos estén cumpliendo con los lineamientos técnicos, ambientales, sociales, y otros relevantes que son parte de los compromisos adquiridos con el Banco Mundial.

A continuación, se detalla el estado de los avances y asuntos pendientes por sectores de intervención.

Infraestructura Educativa

Terminados

- Un primer lote de 25 subproyectos de reposición, reparación y ampliación de centros educativos adjudicados por un monto de L 88,289,931.04 y para la supervisión L 10,004,647.38. Las obras dieron inicio en noviembre de 2022. La ejecución al cierre del 1er trimestre del año 2024 es de L. 85,028,647.85 equivalente al 97% para obras y de L. 6,627,533.90 equivalente al 66% para la supervisión.

En Ejecución

- Un segundo paquete consta de 17 subproyectos los cuales iniciaron su ejecución en el II y III trimestre del 2023 por un monto de L. 134,190,638.44 y para la supervisión L 17,661,922.00. Al momento, 9 subproyectos han finalizado físicamente. La ejecución al cierre del 2do trimestre del año 2024 fue de L. 77,938,233.06 equivalente al 57% para obras y de L. 8,357,400.38 equivalente al 47% para la supervisión.
- Un tercer grupo de 8 subproyectos dieron inicio en el último trimestre del año por un monto de L. 175,302,970.39 y para la supervisión L 24,306,748.00. Al cierre del trimestre han terminado físicamente 2 subproyectos. La ejecución al cierre del 2do trimestre del año 2024 es de L. 61,707,053.75 equivalente al 35% para obras y de L. 6,434,669.42 equivalente al 27% para la supervisión.
- Un cuarto grupo de 3 subproyectos inició a finales del mes de mayo de 2024 por un monto de L. 56,542,623.71. La supervisión será cubierta por la empresa del tercer grupo. La ejecución al cierre del 2do trimestre del año 2024 es de L. 11,308,524.74 equivalente al 20% para obras.

En Licitación, Aprobación y Formulación

- En Contratación se encuentran 3 subproyectos por un monto presupuestado de L. 94,612,165.26.

Los subproyectos en evaluación son:

No.	Código	Nombre del Subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	110028	Reposición CEPB Federico Froebel	Colón	Tocoa	Barrio El Centro
2	110030	Reposición CEB Ramon Montoya	Colón	Tocoa	Aldea Prieta
3	110031	Reposición Escuela Padre Reyes Y CCEPREB Nilsa Anastasia Solano	Colón	Santa Rosa De Aguan	Aldea La Planada

- En aprobación por el Banco Mundial o por el Comité de Operaciones del FHIS se encuentran 9 subproyectos por un monto presupuestado de L 159,385,164.84. Los subproyectos educativos próximos por licitarse son los siguientes:

No.	Código	Nombre del Subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	110053	Reparación CEB Rubén Antúnez	Colón	Bonito oriental	San José del 5
2	110054	Reparación CEB Augusto C. Coello	Colón	Bonito oriental	Barrio El Centro
3	110056	Reposición Instituto Marco Tulio Castillo	Colón	Bonito Oriental	Aldea La Esperanza
4	110130	Reparación Escuela José Cecilio del Valle	Colón	Santa Rosa de Aguán	Las Lomas, Barra de Aguán
5	110168	Reposición Escuela. Ramon Villeda Morales y CEPB Lic. Jenny Martínez	Colón	Tocoa	Col. Lempira
6	110177	Reposición CEB Juana Donatila Ruiz y Reposición CEPB Julio Arriola Oliva	Colón	Tocoa	Col. Aurora
7	108483	Reposición Escuela Joaquín Reyes Tejeda	Yoro	Olanchito	Colonia Libertad Norte
8	110055	Reparación CEB Rafael Pineda Ponce	Colón	Bonito Oriental	La Esperanza
9	108020	Reposición de Instituto Gubernamental República Federal de México	Francisco Morazán	D.C	Colonia Iberia

- Un total de 12 subproyectos se encuentra en reformulación por los técnicos del proyecto, los que serán agrupados según su ubicación, como parte de la estrategia de contratación por lotes de subproyectos y tener un menor número de procesos. El presupuesto preliminar es de L. 169,648,000.00. A continuación, los subproyectos:

No.	Código	Nombre del Subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	108480	Reposición Escuela María Teresa Aburto	Yoro	Olanchito	Colonia 24 de mayo
2	108655	Reposición Escuela Remigio Duran Godoy	Yoro	Olanchito	Comunidad La Chorrera
3	110052	Reparación Escuela 3 de agosto	Colón	Bonito oriental	Aldea Florida Miramar
4	110176	Reposición CEPB Argelia Barrientos	Colón	Tocoa	Col. 18 de septiembre
5	110180	Reparación CEB José Heriberto Díaz	Atlántida	Tela	La Ensenada
6	110181	Reposición CEB Esteban Guardiola/CEPB Esteban Guardiola	Atlántida	Tela	Triunfo de la cruz
7	110182	Reposición CEB Perla del Aguan	Colón	Saba	Comunidad ceibita
8	110183	Reparación CEB SAT Félix Salgado	Colón	Tocoa	Aldea Chiripa
9	110184	Reparación Escuela Rosendo Núñez Bonilla	Colón	Trujillo	Barrio Río Negro
10	110185	Reparación CEPB Alba Nora Gunera de Melgar	Colón	Trujillo	Colonia Eduardo castillo
11	110186	Reparación CEPB Delfina Hernández	Colón	Trujillo	Colonia Capiro
12	110187	Reparación CEPB 11 de febrero	Colón	Trujillo	Aldea Chapagua

Sector de Agua y Saneamiento

En Ejecución

- La primera intervención en el Sector de Agua y Saneamiento consta de 3 subproyectos de agua y saneamiento han iniciado ejecución en el tercer trimestre del año. En abril 2024, se dará inicio a un 4to subproyecto de agua potable. El monto de contrato es de L.143,435,262.47 y para la supervisión L. 10,372,183.71. La ejecución al cierre del 2do trimestre de 2024 es de L. 63,604,082.60 equivalente al 44% para obras y de L. 6,520,565.05 equivalente al 47% para la supervisión.
- En 2024 se lanzó la licitación para un segundo grupo de 4 subproyectos de agua potable. De los 4, solamente se adjudicó el subproyecto ubicado en Apacilagua, Choluteca por un monto de L. 38,414,844.84 y para la supervisión L. 27,913,793.94 (quedan pendientes otros subproyectos dentro de la consultoría de supervisión). La ejecución al cierre del 2do trimestre de 2024 es de L.

7,682,968.97 equivalente al 20% para obras y de L. 5,582,758.79 equivalente al 20% para la supervisión.

En Licitación, Aprobación y Formulación

- En Evaluación se encuentran 3 subproyectos por un monto presupuestado de L. 53,919,923.13.

Los subproyectos en evaluación son:

No.	Código	Nombre del Subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	108878	Mejoramiento Sistema Agua Potable	Cortés	Santa Cruz de Yojoa	Buena Vista
2	109073	Sistema agua potable (Línea de conducción 19km)	Choluteca	Apacilagua	Casco Urbano
3	108885	Reposición Sistema de Agua Potable	Cortés	San Antonio	Planes de Italia y Buena Vista Calera

- En aprobación se encuentran 6 subproyectos, próximos a lanzarse en licitación por un monto estimado de L. 216,476,776.97.

No.	Código	Nombre del Subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	108890	Reposición Sistema de Agua Potable Casco Urbano Salama y Aldea Talgua	Olancho	Salama	Casco Urbano y Talgua
2	109071	Rehabilitación Línea de Conducción	Olancho	Gualaco	Pacura y Toro Muerto
3	108876	Rehabilitación Sistema De Agua Potable Puerto Cortes	Cortes	Puerto Cortes	Casco Urbano
4	108877	Reposición Sistema De Agua Potable El Marañón	Cortes	Villanueva	Aldea El Marañón
5	108917	Reposición Sistema de Agua Potable Aldea La Herradura, Guaimaca	Francisco Morazán	Guaimaca	La Herradura
6	108919	Reposición Sistema De Agua Potable Ciudad Guaymas	Yoro	El Negrito	Ciudad Guaymas Y Centro Poblado

- En reformulación se encuentran 9 subproyectos adicionales para la reposición y/o rehabilitación de sistemas de agua potable por un monto estimado de L. 216,476,776.97. Los subproyectos en formulación son los siguientes:

No.	Código	Nombre del Subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	110463	Reposición Estación De Bombeo Y Linea De Impulsión La Entrada Copan	Copan	Nueva Arcadia	La Entrada
2	109256	Reposición Sistema de Agua Potable y Saneamiento	Lempira	San Manuel de Colohete	Varias Comunidades
3	110508	Reposición Sistema de Agua Potable 16 Comunidades Comayagua	Comayagua	Esquías	El Comal, La Florida, El Playón, Las Minitas, Rancho Grande, La Cañada, Guamas, Vallecillos, Agua Dulce, Pocitos, Peladeritos, Coyolitos, Las Majadas, Loma Pelada, Planes y Ceibita Vieja
4	110509	Reposición Sistema de Agua Potable Aldea La Guatilla, Yoro, Yoro	Yoro	Yoro	La Guatilla
5	109236	Reposición Línea de Impulsión Y Tanque de Distribución Potrerillos	Cortés	Potrerillos	Casco Urbano
6	110615	Reposición Sistema Agua Villa Santa, Danli, El Paraíso	El Paraíso	Danlí	Villa Santa
7	108893	Reposición Sistema Agua Potable La Flecha, El Ciruelo y Piñuelas, Macuelizo, Santa Barbara	Santa Bárbara	Macuelizo	El Ciruelo y Piñuelas
8	110511	Reposición Estación Elevadora y Planta de Tratamiento De Aguas Residuales I Etapa Potrerillos, Cortes	Cortés	Potrerillos	Casco Urbano
9	108920	Reposición Sistema de Agua Potable San Julián, Danli, El Paraíso	El Paraíso	Danlí	San Julián

Infraestructura vial

En Ejecución

- La primera intervención en el Sector Vial consta de 4 subproyectos, han iniciado ejecución en el cuarto trimestre del año 2023. Un 5to subproyecto se agregó en primer trimestre del año 2024. Han finalizado físicamente 3 subproyectos. El monto total de contrato es de L 74,865,659.45 y para la supervisión L 7,802,185.38. La ejecución al cierre del II Trimestre de 2024 es de L 34,029,957.21 equivalente al 46% para obras y de L. 1,560,437.08 equivalente al 20% para la supervisión.

En Licitación, Aprobación y Formulación

- En formulación se encuentran 2 subproyectos, próximos a lanzarse en licitación por un monto estimado de L. 18,656,000.00.

No.	Código del subproyecto	Nombre del subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	108700	Reposición de Puente Santa Clara Techin	Copán	Florida	Santa Clara, San Lorenzo Techin
2	108785	Reposición de Puente San Lorenzo Techin-Las Palmas Techin	Copán	Florida	San Lorenzo, Techin, Las Palmas

Infraestructura de salud

En Ejecución

- La primera intervención en el Sector Salud consta de 1 subproyecto, ha iniciado ejecución en el II trimestre del año 2024. El monto total de contrato es de L 17,696,680.82 y la supervisión es realizada por la empresa que supervisa a 11 subproyectos educativos del lote 3 y 4. La ejecución al cierre del II Trimestre de 2024 es de L 3,539,336.16 equivalente al 20% para obras.

En Licitación, Aprobación y Formulación

- Un subproyecto de salud se encuentra próximo a reformularse. El monto aproximado es de L. 10,000,000.00

No.	Código del subproyecto	Nombre del subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	110321	Reposición CESAMO Santa Rosa de Aguan	Colón	Santa Rosa de Aguan	La Lomas

Resultados

- Un primer lote de 25 subproyectos de infraestructura educativa en ejecución, culminados físicamente, y 21 ya han sido cerrados financieramente.
- 25 nuevos subproyectos de infraestructura educativa han iniciado su ejecución en el segundo semestre del año 2023 junto con la supervisión respectiva. De estos, 4 subproyectos han terminado físicamente.
- La supervisión de los subproyectos se desarrolla a la par de la ejecución.
- 5 subproyectos de agua y saneamiento han iniciado ejecución junto a la supervisión respectiva.
- 5 subproyectos viales han iniciado ejecución junto a la supervisión respectiva, de los cuales 3 ha finalizado físicamente.

iii. Componente 3 - Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.

- Seguimiento de inspectoría, ambiental, social y de seguridad social a los 25 subproyectos en ejecución.
- Seguimiento al Mecanismo de Quejas, Marco de Reasentamiento y Plan de Participación de Partes Interesadas.
- En proceso de Evaluación de técnicos para complementar al equipo técnico de la Unidad Ejecutora.

xvii. PROBLEMÁTICA

La UEP del proyecto PRE debe cumplir con los requerimientos del Banco Mundial y de la institución FHIS-SEDECOAS. Dicho cumplimiento, conlleva varias sesiones de revisión y subsanación lo que ralentiza el inicio de la ejecución de los subproyectos. Se considera que esto continuará sucediendo en los primeros subproyectos de cada tipología ya que cada uno conlleva sus particularidades que no se han abordado anteriormente.

La mayoría de las formulaciones de los subproyectos efectuadas por formuladores externos y recibidas por el proyecto PRE carecen de análisis de gestión de riesgos: accesibilidad; obras de mitigación; hidrosanitarios; estabilización de taludes; medidas compensatorias, contra incendios, de comunicación y de señalización, y, requieren actualización de costos y cantidades de obra. Por lo que la reformulación toma bastante tiempo para tener los expedientes listos para licitarles.

iv. RETOS

- Llevar una ejecución financiera a la par de la ejecución física, abordando mes a mes a los contratistas para presentar sus estimaciones sin atrasos.
- Acompañamiento quincenal a la supervisión para alcanzar altos niveles de calidad en la ejecución de las obras contratadas.
- Ejecutar el presupuesto 2024 aprobado, obteniendo un avance trimestral significativo.
- Definir con el Banco Mundial estrategias para la simplificación de requisitos y procesos para la eficiente ejecución de subproyectos de emergencia.

CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA



✓ Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)

i. Antecedentes

El Estado de Honduras ha revalorizado la educación como elemento fundamental para el desarrollo integral de todos los hondureños, mediante la implementación de la Tercera Reforma Educativa, que responde a las expectativas de la sociedad, cuyos alcances se enmarcan en los objetivos No.1 y No.4 de la Visión de País 2010-2038; Plan de Nación 2010-2022; que estipulan: “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidados de previsión social” y “Honduras con un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo. Para la ejecución de esta Tercera Reforma, se aprueba en el año 2012, la Ley Fundamental de Educación y en el año 2014 sus 22 Reglamentos.

-Fortalecimiento de la Secretaría de Educación conforme a la Ley Fundamental de Educación (LFE), principalmente en dos aspectos: i) descentralizar funciones operativas en las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de Educación; y ii) fomentar la participación comunitaria en la gestión educativa, formulación y coordinación de los planes estratégicos, que apunten a mejorar la calidad educativa.

El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Educación, garantiza el derecho fundamental a la educación, el acceso a una educación de calidad en condiciones de equidad, sin discriminación de ninguna naturaleza en todos sus niveles. La Ley Fundamental de Educación recupera el espíritu de garantizar este derecho, estableciendo el compromiso de brindar educación gratuita en todos sus niveles; un año obligatorio en Educación Pre-Básica (tercer grado) y tres ciclos de Educación Básica (I, II y III ciclo). Con ello, se logra la meta establecida de país, que para el año 2038, Honduras debe elevar la escolaridad promedio a 9 años (1° a 9° grado), reconociendo que es necesario formar educandos para la

convivencia, derechos humanos, responsabilidad social, cuidado de las personas, entendimiento del entorno, protección del medio ambiente y la educación media ha sido considerada, hasta finales del siglo XX, como el período de preparación de los jóvenes para el ingreso a la educación superior y también como la enseñanza que proporciona entrenamiento técnico-vocacional, preparando a los jóvenes para su inserción en la vida productiva. En general, la educación media tiene como propósito ofrecer la experiencia formativa para incorporarse al mundo del trabajo y/o proseguir estudios en el nivel de educación superior.

ii. Objetivo General

Fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros Educativos Media y sean promovidos con la calidad requerida.

iii. Descripción

Consiste en la implementación de metodología de formación permanente de docentes y estudiantes, la mejora de la infraestructura escolar de centros de educación pública en todo el territorio nacional con énfasis en las zonas de mayor pobreza urbana y rural. El mejoramiento de la infraestructura podrá incluir al menos la ampliación y/o reparación de infraestructura educativa, dotación de mobiliario y equipamiento técnico educativo especializado; y el fortalecimiento de habilidades de los docentes de educación sobre metodologías de enseñanza basadas en competencias y las capacidades de los estudiantes y docentes de bachillerato en temas relacionados al emprendedurismo.

iv. Focalización

En las áreas urbanas, periurbanas y rurales en los 18 departamentos, como ser: Colon, Islas de la Bahía, Cortes, Francisco Morazán y Valle son intervenidos con fondos del Programa para la Reducción de la Pobreza y la Exclusión Económica y Social (**PRPEES**).

Para los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Comayagua, Copan, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara y Yoro, son intervenidos con fondos de Recursos Ordinarios (RO).

v. Beneficiarios

El Programa beneficiará 480 niños de Educación pre-básica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes.

vi. Duración

Fecha de inicio de ejecución: 30 de marzo de 2021

Fecha de cierre: 30 de marzo de 2026

vii. Costo Total del Programa

Este es un esfuerzo de la Republica de Honduras, a través de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por US\$80,000,000.00 que tiene como meta llegar a la población educativa de los diferentes niveles que atiende el sistema educativo nacional.

viii. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	507.311.663,00	114.393.414,00	23%
2022	438.079.338,00	860.314,43	0%
2023	297.119.742,00	106.004.347,02	36%
2024	306.585.912,00	44.077.148,06	14%

ix. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
EDUCACION	13	28	30.598.695,89	325	1.912
TOTAL	13	28	30.598.695,89	325	1.912

x. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
COMAYAGUA	0	1	-	0	0
CORTES	5	9	10.281.197,39	125	626
OLANCHO	4	8	10.120.728,64	100	211
SANTA BARBARA	4	10	10.196.769,86	100	1.075
TOTAL	13	28	30.598.695,89	325	1.912

xi. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	6.408.490,60
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	7.069.961,57
TOTAL	13.478.452,17

xii. Principales Logros II Trimestre

1. 11 proyectos contratados
2. 14 proyectos finalizados físicamente
3. 8 proyecto formulados

xiii. Desembolsos

No.	FONDOS PREEPS	FONDOS ORDINARIO	DESEMBOLSADO	FECHA
1	4.552.920,00	2.180.760,00	6.733.680,00	may-21
2	8.041.480,00	5.751.370,00	13.792.850,00	abr-22
3	4.500.000,00	-	4.500.000,00	nov-23
4	-	1.500.000,00	1.500.000,00	dic-23
Total	17.094.400,00	9.432.130,00	26.526.530,00	
Monto del Prestamo		80.000.000,00		
% Desembolsado		33%		

xiv. Aspectos Físicos

La Operación 2024 en el 2do trimestre, la Inversión es de US\$ 1.5 millones y Supervisión US\$ 177 miles y acumulado de la vida del Programa US\$ 7.4 Millones en Inversión de obra y Supervisión US\$ 772 miles.

xv. Componente Socioambiental

Todos los proyectos actualmente en ejecución en el marco del Programa MIFE cuentan con una “Constancia de no Requerir Licenciamiento Ambiental” debido a su “muy baja magnitud” enfocada en reparaciones y ampliaciones (menores a 1,500 m² de intervención constructiva); y en vista que los mismos comparten similares características en sus actividades técnicas constructivas se implementan medidas de mitigación al impacto ambiental estandarizadas para garantizar el más mínimo cuidado al ambiente y la sociedad involucrada en esta etapa (trabajadores de la construcción, alumnos y maestros, etc.)

A la fecha se han ejecutado todas las actividades relacionadas al cumplimiento de las condicionalidades establecidas en el Plan de Acción del Sistema de Evaluación de Monitoreo Ambiental y Social (SIEMAS) exigido por el Organismo Financiero, destacando la implementación de herramientas de gestión ambiental (PGAS) específicas para cada uno de los proyectos en ejecución; así como, la socialización e

implementación del “Mecanismo de Quejas y Reclamos” en los mismo garantizando una intervención amigable con el ambiente y la sociedad beneficiaria. Así mismo, como producto de la gestión ambiental y social desarrollada y la buena coordinación lograda con las empresas constructoras y supervisoras, se cuenta con toda la evidencia o documentación de respaldo (según su aplicabilidad por proyecto) de la buena gestión desempeñada cumpliendo con las condicionalidades del plan de acción SIEMAS.

xvi. Adquisiciones

1. Contratación de la Firma Formuladora de Proyectos. (2 Lotes Desiertos)

xvii. Actividades Programadas

- Reformulación del programa MIFE
- Actualización del Manual Operativo del Programa
- Evaluar el desempeño de las Firmas Consultoras y Supervisoras.
- Contratación de Obra y Supervisión de 13 Proyectos

xviii. Limitantes

1. Tiempos prolongados para revisiones y aprobaciones en el Ciclo de Proyectos FHIS.
2. Incertidumbre sobre la aplicación del Acuerdo No. SEDECOAS -025-2023, denominado Manual de Procesos para Fondos Externos.
3. Disminuida la Comunicación entre las Direcciones FHIS y Programa MIFE.
4. Curva de aprendizaje de nuevo RR HH el Ciclo de Proyectos FHIS.
5. Bajo nivel de responsabilidad en compromisos adquiridos de contratistas y proveedores de Servicios.

✓ **Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira.**

i. Antecedentes.

El Estado de Honduras ha revalorizado la necesidad de mejorar el servicio de suministro de agua potable en la ciudad de Gracias, mediante la implementación de un sistema de abastecimiento de agua potable cuyos alcances se enmarcan en los objetivos No.3 y No.4 de la Visión de País 2010-2038; Plan de Nación 2010-2022; que estipulan: “Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental” y “Honduras con un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo”.

Según la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento, El Estado, como responsable de propiciar el bienestar económico, político, social y cultural de los hondureños, es responsable de cuatro funciones básicas: 1. Garantía de acceso a servicios de Agua Potable y Saneamiento de calidad y con eficiencia a la población. 2. Ampliación de la cobertura del servicio, especialmente en comunidades rurales y en comunidades urbanas de escasos recursos. 3. Garantía, bajo principio de solidaridad, de acceso al agua potable a sectores excluidos del servicio por razones de pobreza. 4. Gestión de recursos para el desarrollo de servicios de agua potable y saneamiento, estableciendo las prioridades, los criterios de recuperación de inversiones, asignación de capital, acorde con capacidades financieras respectivas.

ii. Objetivo

El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los servicios de agua potable para la población del municipio de Gracias, Departamento de Lempira, aumentando la cantidad y la calidad del agua suministrada, a través de la ampliación del sistema de abastecimiento, mediante el desarrollo de la infraestructura hidráulica.

iii. Objetivos específicos:

- a) Ampliar y optimizar el caudal de las líneas de conducción de agua hacia los reservorios y la red de distribución del Sistema existente.
- b) Asistencia técnica al prestador UMASG de forma que puedan asumir la operación y mantenimiento del Sistema o contribuir a la sostenibilidad de este.
- c) Introducción de procedimientos rutinarios de operación y mantenimiento con el fin de asegurar una mayor eficiencia.
- d) Acciones destinadas a la reducción de pérdidas (físicas y contables) de agua que puedan reducir la necesidad de inversiones en nuevas obras.

iv. Localización

El Proyecto estará localizado en la Ciudad de Gracias en el Departamento de Lempira.

v. Beneficiarios

El Proyecto beneficiará 22,681 personas en el año 2022 de los cuales 11,005 son hombres y 11,676 son mujeres y en un periodo de 40 años lo estarían alcanzando un estimado de 76,889 personas.

vi. Duración

La duración del Proyecto es de 4.1 años (49.2 meses) incluyendo actividades de gestión, socialización, adquisiciones, ejecución, etc. Y se estima además 2 años para la operación y mantenimiento antes de hacer el traspaso a la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento de Gracias (UMASG).

vii. Situación Actual del Proyecto

El proyecto ha logrado dar cumplimiento a las condiciones previas al primer desembolso, y el 20 de diciembre se recibió el mismo por US\$1,617,085.33, valor necesario para hacer frente a los compromisos del proyecto en los próximos 6 meses.

Se requiere llevar a cabo la revisión del diseño.

viii. Fuente Financiera

Este es un esfuerzo de la Republica de Honduras, a través de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por US\$36,000,000.00 que tiene como meta llegar a la población de Gracias, Lempira.

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2022	193.172.460,00	28.412.086,07	15%
2023	57.836.382,00	6.177.646,62	11%
2024	51.626.065,00	10.137.876,86	20%

ix. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	6.644.086,80
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	3.493.790,06
TOTAL	10.137.876,86

x. Logros y avances del trimestre del proyecto

Logros y Avances del Proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”.

En atención al Plan General de adquisiciones del proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira” se tienen en desarrollo los procesos de las siguientes consultorías y adquisiciones:

- En ejecución la consultoría CPIR-FHIS-01-2023 “Revisión, Ajuste y Supervisión del Proyecto de Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”, con los siguientes hitos:
 - La firma contratada fue el consorcio coreano-hondureño SAMAN-ASP, conforme a las políticas del BCIE y lo establecido en el contrato de préstamo No. BCIE 2261.
 - El contrato se firmó el 24 de octubre del 2023.

Monto de la consultoría: US \$ 1,472,164.24

Plazo de la consultoría: 16.5 meses, con las siguientes etapas:

- Etapa de Revisión y Ajuste al Diseño: 5 meses, el 1er informe se recibió el 01 de febrero y luego de subsanar observaciones se aceptó su recepción oficial en fecha 15 de marzo.

El Informe Final de Carpeta de Diseño que estaba previsto para el 01 de abril del 2024, se recibió el 30 de abril en atención a un requerimiento de ampliación en las condiciones contractuales de dicha consultoría y con un costo adicional de US \$ 84,136.87 para el diseño de dos nuevas obras de toma y nuevos análisis técnicos requeridos para la construcción del reservorio que se requiere para garantizar el agua potable para la población de la ciudad de Gracias, departamento de Lempira. Entre los meses de mayo y junio se llevaron a cabo reuniones de revisión y de acuerdos de criterios entre personal de la UEP, asesores del FHIS (ing. Lenin Delgado e ing. Gunter Von Wiese) y personal técnico de SAMAN-ASP, en donde se conciliaron diferentes aspectos técnicos, ambientales y sociales. Su aprobación está pendiente de darse en el mes de julio.

Como unidad ejecutora se da seguimiento a la revisión de la carpeta de diseño a nivel técnico conceptual, presupuestario, especificaciones técnicas, planos, memorias de cálculo, cantidades de obra para corroborar que cumpla con los términos pactados. Todo lo anterior se hace para cumplir con el control de calidad y el ingreso del presupuesto según el ciclo FHIS para lo cual se cuenta también con apoyo adicional de la Dirección de Proyectos y Unidad de Costos del FHIS.

Etapa de respuestas de preguntas de los oferentes: 4 meses (aproximadamente)

- Etapa de Supervisión en la ejecución de las obras: 7.5 meses
- La orden de Inicio correspondiente fue dada para el 01 de noviembre del 2023.
- Se realizó el pago del 1er producto llamado “Informe Preliminar Revisión al Diseño” por un monto de US\$ 269,029.50 en fecha 16 de mayo del 2024.
- Concluido el proceso (COT-FHIS-69-2023) de la Adquisición de Equipamiento para consultores de la Unidad Ejecutora y se generaron las órdenes de compra. Quedando pendiente la adquisición del Data Show ya que el proceso del mismo se declaró fracasado.

- Se dio inicio a la ejecución de los trabajos de consultoría por parte de la empresa “Horwarth Central America” Auditoría Externa que fue contratada por el Tiempo de Ejecución del Proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en La Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”, la cual concluyó su primer informe correspondiente a los años 2022 y 2023 el 30 de abril y se le realizó el pago por dicho producto el 20 de mayo del presente año.
- Se concluyó el trámite del seguro del vehículo adquirido para la Unidad Ejecutora del Proyecto (COT-FHIS-67-2023), a partir del mes de junio ya se logró hacer uso del mismo.
- Ya se cuenta con el convenio suscrito entre las autoridades del FHIS sobre el mantenimiento y operación después de que se concluya el proyecto por parte de la alcaldía de Gracias. Dicho convenio fue firmado el 20 de junio de parte del Alcalde Municipal de Gracias-Lempira.
- Se ha elaborado un primer borrador de Manual Operativo del Proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira” Préstamo BCIE No.2261, pero debe definirse previo a su versión final, si incluirá el proyecto de Tegucigalpa Código 110359, de acuerdo con las decisiones de las máximas autoridades del FHIS, SEFIN, BCIE Y Congreso Nacional definan, antes de que se inicien las obras de Gracias, Lempira.

Logros y Avances del Proyecto “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sureste de Tegucigalpa”.

- En ejecución la consultoría CPN-FHIS-20-2023, financiada con fondos nacionales, llamada “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sureste de Tegucigalpa”, con los siguientes hitos:
 - La empresa contratada para ejecutar el diseño del proyecto es Gabinete Técnico S.A. (GATESA).
 - El contrato se firmó el 21 de noviembre del 2023.

Monto de la consultoría: L. 13,225,678.13

Plazo de la consultoría: 9 meses

Etapa de Diseño: 5 meses, el 1er informe se recibió el 21 de febrero y el Informe Final de Carpeta de Diseño continúa previsto para el 21 de abril del 2024

Etapa de respuesta de preguntas de los oferentes: 4 meses (aproximadamente)

- La orden de Inicio correspondiente fue dada para el 21 de noviembre del 2023.
- Recibido y aprobado el primer producto llamado “Informe Inicial del proyecto de Consultoría”.
- Recibido y aprobado el segundo producto “Informe de avance intermedio de las mejoras a implementar”.

Cabe señalar que la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) se ha encargado de realizar la revisión de los aspectos técnicos y socio ambientales de ambos informes, asegurándose que cumplan los términos fijados en el contrato suscrito entre FHIS y GATESA, sin embargo, la gestión de aprobación y pago, corresponde a las instancias administrativas y financieras del ciclo FHIS.

xi. Problemática presentada en el II trimestre 2024

Proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”.

- Se continúa realizando el esfuerzo por parte de la unidad ejecutora por iniciar las obras antes de lo programado en el Plan de Ejecución del proyecto (PEP), lo cual a la fecha se estima sea en del noviembre del 2024, pero se nos informó verbalmente por parte del BCIE, que no se pueden iniciar las obras, sin tener aprobada la Modificación N°1 al contrato de Préstamo BCIE N° 2261, lo cual representa que no se podrá cumplir con las metas financieras propuestas para el año 2024.
- Actualmente se necesita definir si se ejecutará el proyecto de Tegucigalpa como parte del financiamiento de Tegucigalpa, para lo cual se deberá obtener la aprobación de SEFIN, del directorio del BCIE y del Congreso Nacional de la República. Según análisis del PEP del proyecto, se concluye que será necesaria la contratación de un plazo mayor al programado para los consultores de la Unidad Ejecutora, ya que, dependiendo de las dichas aprobaciones, se extenderá la ejecución del contrato de préstamo.

- Se mantienen como riesgos en el caso del proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”:
 - a) Es posible que la contratación de las empresas coreanas para Ejecución de obra presente ofertas económicas mayores a los montos establecidos, o no quieran participar.
 - b) Que los tramites a lo interno del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) no se puedan realizar en los tiempos esperados.
 - c) Que los costos de las ofertas para las obras sean mayores a los que se han estimado.
 - d) Que la alcaldía municipal de Gracias, departamento de Lempira, no tenga un esquema de regulación del uso racional del Agua potable como norma.
 - e) Que la Alcaldía de Gracias, al instalar la micro medición para cada uno de los abonados, provoque un rechazo y problemas sociales en la zona, proyecto que se ha programado ejecutar con fondos del Banco Mundial por medio de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
 - f) Que la alcaldía autorice proyectos de urbanización sin considerar la capacidad de diseño con la fuente del río Arcagual, con la que se ha planificado ejecutar este proyecto, dando como resultado la disminución en la vida útil del mismo y no poder abastecer en épocas de sequía a toda la población que está creciendo en forma desordenada.

Proyecto “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sureste de Tegucigalpa”.

- Después de revisada la documentación presentada, la Unidad Ejecutora remitió a la Dirección de Proyectos el día 17 de mayo del 2024 el borrador de Enmienda No. 1 de Ampliación de plazo por 26 días del Contrato de Consultoría. “Mejoramiento de la Red de Colectores y Planta de Tratamiento Aguas Residuales del Sureste de Tegucigalpa” Código 110359 suscrito con la empresa GABINETE TECNICO, S.A. (GATESA), mediante Memorándum UEP-SEDECOAS/FHIS-077-2024 para que sea sometido a la revisión y aprobación, además de gestionar que sean revisados y aprobados por la Dirección Legal, Dirección de Contrataciones, así como finalmente se obtenga la aprobación del Comité de Operaciones del FHIS. Lo anterior está pendiente.

- Para el producto “Informe Carpeta Técnica de Diseño Final”, la UEP ha apoyado con la revisión técnica y correcciones entregados por la firma consultora contratada GATESA para el proyecto “Mejoramiento de la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sureste de Tegucigalpa” (ejecutado con fondos nacionales), en proceso de revisión y aprobación del producto, pero **es necesario se defina el cierre administrativo y financiero de los pagos del diseño.**
- El proyecto de Tegucigalpa requiere de disponibilidad de vehículo, por lo que es recomendable disponer de parqueo en el Centro Cívico Gubernamental.
- En el proyecto “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sureste de Tegucigalpa”, se consideran los siguientes riesgos:
 - a) Que la UMAPS de Tegucigalpa, no logre agrupar el personal calificado para participar en este tipo de procesos, necesarios para el Fortalecimiento institucional de la UMAPS, quien debe garantizar alcanzar la operatividad y mantenimiento que requiere este tipo de proyectos.
 - b) Que no se puedan conseguir los fondos para la ejecución del 100% del proyecto diseñado.
 - c) En el caso que el proyecto sea financiado con fondos del Contrato de Préstamo BCIE N°2261, las empresas coreanas no quieran participar en los procesos de contratación.
 - d) Que los costos del proyecto de diseño de Tegucigalpa sean mayores a lo planificado, debido a que se está solicitando como ampliación de PTAR y Colectores va más allá de los fondos disponibles de BCIE para su construcción.
 - e) Que con el diseño se den soluciones para mejorar las plantas de tratamiento con datos de población proyectada a futuro, incluyendo lugares que están sin habitar, obligando a coordinar una construcción de una planta de tratamiento en el plantel de la Vega, sin que se tenga fortalecida las capacidades institucionales de UMAPS para que haga los trámites para obtener los fondos y hacer los procesos de adquisición.
 - f) Que por razones de poca disponibilidad financiera debamos decidir rehabilitar la planta y colectores con los diseños existentes, sin ningún tipo de ampliación de colectores, ni unificación de las dos plantas de depuración existente.

- g) Que la inseguridad de las zonas afecte la construcción de las obras o la pérdida de bienes y/o personas que intervendrán en el proyecto.
- h) Que no se pueda coordinar en tiempo y forma con SEFIN, con BCIE y el Congreso Nacional la modificación N°1 del Contrato de Préstamos N° 2261, para que la construcción de los dos proyectos sea ejecutada, ya que a pesar que el contrato de préstamo era para Gracias-Lempira, las modificaciones de la revisión y ajuste al diseño, según BCIE requiere de este trámite obligatorio antes de que se inicien las obras.

Modificación al Contrato de Préstamo No. BCIE 2261

Procedimiento para efectuar la modificación del contrato de préstamo No.2261-BCIE, según SEFIN:

- a) Se requiere decidir que solamente se utilicen los fondos para el proyecto de Gracias y que el remanente no sea utilizado por el gobierno de Honduras.
- b) FASE I: incluir en el contrato de préstamo el proyecto de Tegucigalpa, específicamente las obras de la cuenca de San José y la rehabilitación de la PTAR correspondiente, para lo que se requerirá preparar la Enmienda N°1 a la Nota de Prioridad del Contrato de Préstamo N° 2261, así como preparar una Nueva Nota de Prioridad que incluya el remanente de los fondos que queden del proyecto de aguas de Gracias en el Proyecto de “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sureste de Tegucigalpa”, y así ejecutar los \$36,000,000,00 de este contrato de préstamo.
- c) FASE II: para la cual se requiere el acercamiento entre el Ministro del FHIS y el Ministro de Finanzas en la que se den los lineamientos para establecer la fuente de financiamiento que se debe gestionar para completar el proyecto de “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sureste de Tegucigalpa”, que puede andar por el rango de \$80,000,000.00.

CARTERA KfW



✓ **Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V**



I. Objetivo General

Consiste en la utilización de centros educativos mejorados, ampliados o nuevos y equipados bajo conceptos pedagógicos que operan de manera sostenible por la comunidad educativa. De esta manera se pretende contribuir a que niños/as y jóvenes de regiones pobres utilicen una oferta de alta calidad educativa, tanto formal como de educación vocacional.

II. Focalización

Fase IV: El Área de intervención abarcará los departamentos que están siendo intervenidos en las fases anteriores (Zona de Occidente): 1) Copán, 2) Santa Bárbara, 3) Intibucá, 4) Lempira, 5) La Paz, 6) Ocotepeque. 7) Centros a nivel nacional en casos de emergencia (catástrofes naturales). La información de estos centros deberá ser actualizada en el plan maestro y sólo si se determina su precariedad, podrán ser intervenidos previo a No Objeción del KfW. 8) Adicionalmente se extenderá el área de intervención a los departamentos adyacentes a la zona de occidente, delimitando el área de intervención a través de la Carretera Panamericana. Los municipios a ser beneficiados se encuentran al oeste de la misma en los siguientes departamentos: 1) Choluteca, 2) Valle, 3) Francisco Morazán (exceptuando el núcleo urbano de Tegucigalpa), 4) Comayagua y adicionalmente 5) Gracias a Dios.

Fase V: El Área de intervención abarcará los departamentos de: Ocotepeque, Lempira y Copan, en la zona de Occidente. Además, los departamentos al oeste de la carretera CA-5 de los departamentos de Francisco Morazán (exceptuando el Distrito Central), Valle, Choluteca, Comayagua. También seguirá formando parte del Programa el Departamento de Gracias a Dios (siempre y cuando no se alcance un mínimo de infraestructura en este departamento y según las experiencias de la fase IV del PROMINE).

III. Priorización de los Centros Educativos

Esta es realizada por la Secretaría de Educación apoyados en la herramienta del Plan Maestro de Infraestructura Educativa.

IV. Descripción del Proyecto

Fase IV: El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y en la planificación estratégica para los años 2014 - 2018 de la Secretaría de Educación (SE). El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las tres fases previas PROMINE I, II y III. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

Fase V: El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y el Plan Estratégico del Sector de Educación para los años 2017 - 2030 de la Republica de Honduras. El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las cuatro fases previas PROMINE I, II, III y IV. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

V. Modalidad de Ejecución

Fase IV: La Modalidad de Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC), se refiere a donde los recursos son transferidos de la SEDECOAS-FHIS a las Municipalidades y está a las comunidades debidamente organizadas, capacitadas y asesoradas, para que realicen las actividades requeridas para la realización de su proyecto, asumiendo ambos la responsabilidad de una ejecución eficiente, y el manejo transparente de los recursos financieros. Estos procesos son debidamente acompañados por profesionales técnicos y sociales contratados por las Comunidades, Municipalidades, Mancomunidades o el SEDECOAS-FHIS.

En el caso de los proyectos en Gracias a Dios este varia dada una co administración Municipalidad-Comunidad.

Fase V: Modalidad de Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC), se refiere a donde los recursos son transferidos de la SEDECOAS-FHIS a las Municipalidades y está a las comunidades debidamente organizadas, capacitadas y asesoradas, para que realicen las actividades requeridas para la realización de su proyecto, asumiendo ambos la responsabilidad de una ejecución eficiente, y el manejo transparente de los recursos financieros. Estos procesos son debidamente acompañados por profesionales técnicos y sociales contratados por las Comunidades, Municipalidades, Mancomunidades o el SEDECOAS-FHIS. En el caso de los proyectos en Gracias a Dios este varia dada una co administración Municipalidad-Comunidad. Los proyectos de Infraestructura ejecutados bajo esta modalidad se enmarcan en el financiamiento de cuatro componentes para el desarrollo de los mismos: 1) I Bloque de Capacitación. 2) Inversión 3) Supervisión de Inversión y 4) II Bloque de Capacitación denominado Capacitación, o descentralizada.

VI. Monto del Proyecto:

Fase IV:

Fondos de Donación por un monto de EUR 15,000,000.00, Contrapartida Nacional para SEDECOAS/FHIS de EUR 424,000, Contrapartida Nacional para SE de EUR 218,000, Contrapartida Municipal de EUR 515,000 y Contrapartida Comunitaria de EUR 514,000.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 03/12/2015

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 17/02/2017

Fecha de Inicio: 02 de abril 2018 (Se considera la fecha de inicio de la Consultoría)

Fecha de Finalización de convenio: 31/07/2024, **se ha solicitado una ampliación hasta el 31 de diciembre 2024.**

Fase V:

Fondos de Donación por un monto de EUR 10,000,000.00, Contrapartida Nacional para IDECOAS/FHIS de EUR 495,000, Contrapartida Nacional para SE de EUR 250,000, Contrapartida Municipal de EUR 600,000 Contrapartida Comunitaria de EUR 600,000.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 06/07/2018

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 21/03/2019

Fecha de Inicio: Inicio de la Consultoría 18 de marzo

Fecha de Finalización de convenio: 18 de abril 2024, **solicitada la ampliación hasta el 31 de marzo del 2026 sin embargo el Dictamen de la SEFIN otorgo el plazo hasta 18 de abril del 2025.**

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2016	145.687.475,00	142.916.817,45	98%
2017	107.279.375,00	96.731.967,93	90%
2018	53.035.502,00	50.951.601,81	96%
2019	81.069.633,00	79.762.875,76	98%
2020	134.608.478,00	123.221.616,32	92%
2021	139.936.980,00	119.695.679,72	86%
2022	102.757.410,00	66.787.201,74	65%
2023	126.728.365,00	112.691.821,90	89%
2024	134.601.641,00	4.421.435,65	3%

VII. Avance Físico por Sector PROMINE FASE IV y V

i. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
EDUCACION	1	8	1.268.802,08	224	2.784
TOTAL	1	8	1.268.802,08	224	2.784

ii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
COMAYAGUA	0	1	-	33	439
COPAN	1	2	-	66	740
GRACIAS A DIOS	0	2	-	49	902
LA PAZ	0	0	795.805,73	0	0
LEMPIRA	0	2	472.996,35	55	441
OCOTEPEQUE	0	1	-	21	262
TOTAL	1	8	1.268.802,08	224	2.784

iii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	2.353.986,45
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA*	798.646,12
TOTAL	3.152.632,57
*Viaticos, pasajes y Combustible	

VIII. LOGROS AL II TRIMESTRE

1. Meta de ejecución física y financiera según lo reprogramado.

Considerando que a la fecha no se han aprobado el traslado y la modificación solicitados la evaluación de la ejecución del II trimestre se realiza conforme a la planificación original de la siguiente forma:

Descripción	Planificado I Trimestre	Ejecución I Trimestre	Planificado II Trimestre	Ejecución II Trimestre	Planificado III Trimestre	Planificado IV Trimestre	Total, Presupuesto 2024
FINANCIERA	3,060,357.00	2,685,797.33	25,557,751.00	1,735,637.32	29,749,348.00	76,234,185.00	134,601,641.00
FISICA	0	0	1	1	3	3	7

En la cual la diferencia conforme a lo planificado corresponde a:

1. En el mes de enero se reportó que se contaban con 23,343,420.18 de lempiras disponibles del presupuesto vigente en vista que la disponibilidad de convenio no permitirá financiar dos proyectos en Gracias a Dios.
2. A la fecha y conforme a la programación presentada en el mes de junio esta disponibilidad ha incrementado a 43,183,711.00 de lempiras, este incremento corresponde las dificultades presentadas en los inicios de tres proyectos a los cuales se les dio el primer desembolso a finales del 2023 y que dos de ellos a la fecha no han iniciado, razones que han sido expuestas anteriormente, desfasando los pagos programados a ellos.

Es importante indicar que esté disponible si se hace efectivo el traslado al programa CONVIVIR de 30,986,923 lempiras se reducirán aproximadamente a 12,196,788.00 lempiras, pero si se mantiene las dificultades en la ampliación del Programa y los proyectos que se han indicado

requieren atención esta seguirá incrementando por los desfases en la programación de desembolsos.

3. El reintegro de 3/5 proyectos de Gracias a Dios se dio el 30 de mayo de mayo, sin embargo, se está a la espera de la Priorización de los proyectos de mobiliario por parte de Secretaria de Educación para realizar la formulación, aprobación, contratación y ejecución de los mismos, con la observación que se está pendiente de 2/5 proyectos.
4. El pago de la Asistencia Técnica no se ha realizado en vista que según contrato se estimaba el pago final, pero conforme a la Ayuda Memoria y para garantizar el acompañamiento durante la ejecución del programa se debe considerar la ampliación de tiempo y monto de esta, sin embargo, al no contar con la ampliación de la vigencia del Programa esta no se ha dado.
5. Las consultorías que apoyan al programa están siendo financiadas actualmente por la planilla
6. Se finalizo el proyecto 107750 “Reparación CEB Olga Ondina López”, ubicado en Barrio La Cruz, Municipio de La Unión, Departamento de Copán, según lo programado.

IX. RETOS

1. Revisión del Dictamen con la SEFIN para la Ampliación del PROMINE fase V, en el cual indica un tiempo de ampliación hasta el 18 de abril del 2025, cuando el solicitado para comprometer y ejecutar el total de los recursos de donación es de 31 de marzo de 2026.
2. Dictamen de la SEFIN para la Ampliación del PROMINE fase IV hasta el 31 de diciembre del 2024.
3. Priorización de los proyectos de mobiliario por la Secretaria de Educación para comprometer los remantes del componente de Infraestructura de la fase IV en un corto plazo.
4. Pronta recuperación de los fondos de los dos proyectos de Gracias a Dios que suman 5,385,343.88 y que serán utilizados en el financiamiento de los proyectos indicados en el ítem anterior.
5. Atención a los proyectos que se encuentran suspendidos y pendientes de orden de inicio, detallados para la fase V y IV anteriormente.
6. Definición de las ordenes de cambio en conjunto con Secretaria de Educación
7. Presentación al KfW de informe Final Auditoria, dicha auditoria se inició el 24 de junio del presente.
8. Presentación al KfW de Justificación de PROMINE fase IV, es importante indicar que el KfW ya envió un correo recordatorio de su presentación.

9. Presentación al KfW de Justificación de PROMINE fase V, es importante indicar que el KfW ya envió un correo recordatorio de su presentación.
10. Adenda de tiempo y monto del Contrato de la Asistencia Técnica, la cual está elaborada sin embargo no se ha enviado a revisión de la Dirección de Legal y Contratación ya que esta podría sufrir cambios de tiempo y monto conforme la ampliación de la fase V, adicionalmente para su firma se requiere el un Dictamen de la SEFIN para el traslado entre componentes.
11. Aprobación de la modificación presupuestaria para iniciar los procesos de compra financiados con el Componente de Fortalecimiento FHIS fase IV.
12. En caso tener resultados favorables para la ampliación del programa a marzo del 2026 se requerirá en tiempos mínimos:
 - Inicio del proyecto:109483, Ampliación Instituto Gubernamental Técnico Francisco Morazán,
 - Contratar e Iniciar el proyecto: 109243, Reposición CEB Cerro Grande Zona 2
 - Publicación, Contratación e Inicio de los proyectos 109111, Reposición Escuela y Jardín de Niños Jesús Mejía Paz Y 109113, Reposición CEB Republica De Costa Rica y JN Stanley Goff
13. En caso de no tener resultados favorables en la ampliación de fase V, será de acordar un proceso con KfW de las próximas acciones para esta fase, ya que los proyectos previstos y formulados no se realizan en el tiempo indicado por la SEFIN.

ANEXO 1 PROYECTOS FASE IV

N°	Código de Proyecto	Descripción Proyecto	Departamento	Municipio	Monto Total Contratado	Monto Ejecución Financiera	Monto por Ejecutar Financiero	Avance Físico	Avance Financiero en Campo	Observaciones
1	107631	REPOSICION CEB SIMON BOLIVAR Y JN SIMON BOLIVAR	GRACIAS A DIOS	VILLEDA MORALES	19,178,466.02	17,407,649.14	1,770,816.88	75%	85%	En ejecución
2	108114	REPARACION CEB DR. POLICARPO BONILLA	OCOTEPEQUE	BELEN GUALCHO	12,992,112.33	12,992,112.33	0.00	57%	56%	En ejecución
3	108938	REPARACION CEB CULTURA	COPAN	DOLORES	13,855,649.23	13,855,649.23	0.00	56%	58%	En ejecución
4	107912	CONSTRUCCION INSTITUTO EL PROGRESO	LEMPIRA	TALGUA	26,007,454.03	26,007,454.03	0.00	94%	99%	En ejecución
5	107571	REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN Y JARDIN DE NIÑOS CARLOS EMERITO PORTILLO NO1 Y NO2	OCOTEPEQUE	SAN FERNANDO	11,981,740.82	11,981,740.82	0.00	95%	100%	Suspendido, en proceso de compras de equipamiento
6	107732	AMPLIACION CEB LA FRATERNIDAD Y CEPB MI ESPERANZA	LA PAZ	SANTA ANA	15,434,027.26	15,434,027.26	0.00	97%	100%	Suspendido, en proceso de compras de equipamiento
7	107735	REPOSICION CEB FRANCISCO MORAZAN Y JN FRANCISCO FILIBERTO ISAULA	LA PAZ	LA PAZ	12,229,407.32	12,229,407.32	0.00	96%	100%	Suspendido, en proceso de compras de equipamiento
8	107884	AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA	LA PAZ	SANTA MARIA	18,874,742.06	18,874,742.06	0.00	99%	93%	Suspendido, en proceso de compras de equipamiento
9	106296	REPOSICION ESCUELA RAMON ROSA	INTIBUCA	MAGDALENA	7,340,207.73	7,340,207.73	0.00	100%	100%	Finalizado
10	106373	AMPLIACION CEB ESTEBAN GUARDIOLA	SANTA BARBARA	NUEVA FRONTERA	10,623,271.80	10,623,271.80	0.00	100%	100%	Finalizado
11	107381	AMPLIACION CEB MIGUEL PAZ BARAHONA	OCOTEPEQUE	LA LABOR	5,725,462.02	5,725,462.02	0.00	100%	100%	Finalizado
12	107400	REPOSICION CEB JOSE TRINIDAD REYES Y CEPB MUNDO INFANTIL	OCOTEPEQUE	CONCEPCION	10,317,959.81	10,317,959.81	0.00	100%	100%	Finalizado

N°	Código de Proyecto	Descripción Proyecto	Departamento	Municipio	Monto Total Contratado	Monto Ejecución Financiera	Monto por Ejecutar Financiero	Avance Físico	Avance Financiero en Campo	Observaciones
13	107456	REPOSICION CEB JOSE CECILIO DEL VALLE	COPAN	TRINIDAD	8,694,110.87	8,694,110.87	0.00	100%	100%	Finalizado
14	107490	AMPLIACION CEB MANUEL BUESO PINEDA	COPAN	SANTA RITA	9,093,229.81	9,093,229.81	0.00	100%	100%	Finalizado
15	107491	AMPLIACION CEB JUAN RAMON MOLINA	INTIBUCA	CAMASCA	9,802,340.81	9,802,340.81	0.00	100%	100%	Finalizado
16	107492	AMPLIACION CEB FRANCISCO MORAZAN	INTIBUCA	COLOMONCAGUA	11,175,243.86	11,175,243.86	0.00	100%	100%	Finalizado
17	107541	REPOSICION CEB JOSE TRINIDAD REYES Y CEPB NIMIA BAQUEDANO	OCOTEPEQUE	SAN JORGE	8,891,775.16	8,891,775.16	0.00	100%	100%	Finalizado
18	107551	AMPLIACION CEB VICENTE MEJIA COLINDRES	LA PAZ	SAN PEDRO TUTULE	8,596,993.65	8,596,993.65	0.00	100%	100%	Finalizado
19	107552	AMPLIACION CEB MANUEL ANTONIO MEJIA	OCOTEPEQUE	LUCERNA	7,963,516.80	7,963,516.80	0.00	100%	100%	Finalizado
20	107570	AMPLIACION CEB PRESENTACION CENTENO Y JN SANDRA LORENA POLANCO	OCOTEPEQUE	FRATERNIDAD	7,521,385.04	7,521,385.04	0.00	100%	100%	Finalizado
21	107690	REPARACION CEB MINERVA Y CEPB ENMA DE JESUS HERNANDEZ	INTIBUCA	SAN JUAN	16,220,389.04	16,220,389.04	0.00	100%	100%	Finalizado
22	107693	AMPLIACION CEB DR. MIGUEL PAZ BARAHONA Y CEPB JESUS MARIA RODRIGUEZ	LEMPIRA	TAMBLA	14,574,353.22	14,574,353.22	0.00	100%	100%	Finalizado
23	107696	AMPLIACION CEB CRUTA Y JN EN MARCHA	INTIBUCA	JESUS DE OTORO	13,386,502.69	13,386,502.69	0.00	100%	100%	Finalizado
24	107716	AMPLIACION CEB JESUS MARIA RODRIGUEZ Y CEPB LA INDEPENDENCIA	COPAN	SAN JOSE	11,039,173.27	11,039,173.27	0.00	100%	100%	Finalizado

Nº	Código de Proyecto	Descripción Proyecto	Departamento	Municipio	Monto Total Contratado	Monto Ejecución Financiera	Monto por Ejecutar Financiero	Avance Físico	Avance Financiero en Campo	Observaciones
25	107750	REPARACION CEB PROFA. OLGA ONDINA LOPEZ	COPAN	LA UNION	11,941,085.93	11,941,085.93	0.00	100%	100%	Finalizado
26	107760	AMPLIACION CEB PEDRO NUFIO	INTIBUCA	INTIBUCA	10,137,817.32	10,137,817.32	0.00	100%	100%	Finalizado
27	107783	REPARACION CEB LUCILA PEREZ ESTRADA Y CEPB HECTOR JUAREZ	LEMPIRA	LA UNION	9,833,783.04	9,833,783.04	0.00	100%	100%	Finalizado
28	107990	AMPLIACION CEB 21 DE OCTUBRE Y JN DR. RAMON ROSA	COPAN	NUEVA ARCADIA	15,432,237.15	15,432,237.15	0.00	100%	100%	Finalizado
29	107668	REPOSICION ESCUELA Y JARDIN DE NIÑOS JESUS MEJIA PAZ	GRACIAS A DIOS	WAMPUSIRPI	6,866,278.90	8,617,600.87	- 1,751,321.97	NA	NA	En proceso de resolución de contratos
30	107624	REPOSICION CEB MODESTO RODAS ALVARADO Y CEPB ESTADOS UNIDOS	GRACIAS A DIOS	PUERTO LEMPIRA	2,078,067.75	5,712,089.66	- 3,634,021.91	NA	NA	En Secretaría de Gobernación para recuperación de Fondos
31	107626	AMPLIACION CEB SAT AMERICA Y CEPB ROSA CANELO	GRACIAS A DIOS	JUAN FCO. BULNES	3,924,956.35	3,924,956.35	0.00	NA	NA	Rescindido y recuperado fondos
32	107656	REPOSICION CEB REPUBLICA DE COSTA RICA Y JARDIN DE NIÑOS STANLEY GOFF	GRACIAS A DIOS	BRUS LAGUNA	2,287,982.69	2,287,982.69	0.00	NA	NA	Rescindido y recuperado fondos
33	107687	REPARACION CEB JOSE TRINIDAD REYES Y JARDIN DE NIÑOS FELIPE LICONA	GRACIAS A DIOS	AHUAS	4,056,216.88	4,056,216.88	0.00	NA	NA	Rescindido y recuperado fondos

*La información de avance físico y financiero de los proyectos corresponde a la proporcionada por la Dirección de Control y Seguimiento.

ANEXO 2 PROYECTOS FASE V

Nº	Código de Proyecto	Descripción Proyecto	Departamento	Municipio	Monto en Evaluación de Ofertas	Monto Total Contratado	Monto Ejecución Financiera	Monto por Ejecutar Financiero	Avance Físico en campo	Avance Financiero en campo	Observaciones
1	109112	AMPLIACION CEB SAT AMERICA Y CEPB ROSA CANELO	GRACIAS A DIOS	JUAN FCO. BULNES	0.00	23,263,608.96	4,263,981.79	18,999,627.17	3.77%	2.00%	Con poco avance, se está trabajando una orden de cambio considerando la revisión estructural
2	109115	REPOSICION CEB COYOCUTENA	LEMPIRA	PIRAERA	0.00	15,769,305.57	13,467,743.88	2,301,561.69	45.60%	45.46%	En ejecución, este proyecto requerirá ampliación de tiempo
3	109116	REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN	COPAN	SAN ANTONIO	0.00	12,482,233.75	12,482,233.75	0.00	79.05%	69.02%	En ejecución, este proyecto requerirá ampliación de tiempo
4	109211	REPOSICION CEB LEONCIO VALLE	COMAYAGUA	COMAYAGUA	0.00	23,125,255.78	23,125,255.78	0.00	67.99%	52.74%	En ejecución, este proyecto requerirá ampliación de tiempo

Nº	Código de Proyecto	Descripción Proyecto	Departamento	Municipio	Monto en Evaluación de Ofertas	Monto Total Contratado	Monto Ejecución Financiera	Monto por Ejecutar Financiero	Avance Físico en campo	Avance Financiero en campo	Observaciones
5	109483	AMPLIACION INSTITUTO GUBERNAMENTAL TECNICO FRANCISCO MORAZAN	FRANCISCO MORAZAN	SABANA GRANDE	0.00	23,110,244.63	11,603,942.17	11,506,302.46	0.00%	0.00%	No se ha iniciado por Conflictos locales. Actualmente la Secretaria de Educación tiene el compromiso de gestionar entre la comunidad las condiciones para lograr el arranque del mismo. A la fecha no se tiene prevista orden de inicio
6	110192	REPOSICION CEB JOSE TRINIDAD REYES	OLANCHO	DULCE NOMBRE DE CULMI	0.00	7,857,827.98	3,977,633.85	3,880,194.13	0.00%	0.00%	En este proyecto se ha presentado la dificultad de encontrar un profesional que quiera realizar la labor de supervisor docente, que en su mayoría muestras interés, pero al conocer la ubicación, condiciones de estadía y disposiciones presupuestarias retractan su posición para tomar la oportunidad laboral. Sin embargo, en la semana del 13 de junio se logró encontrar una profesional con disponibilidad para la zona y se tiene previsto el proyecto inicie el 01 de julio.

Nº	Código de Proyecto	Descripción Proyecto	Departamento	Municipio	Monto en Evaluación de Ofertas	Monto Total Contratado	Monto Ejecución Financiera	Monto por Ejecutar Financiero	Avance Físico en campo	Avance Financiero en campo	Observaciones
7	109243	REPOSICION CEB CERRO GRANDE ZONA 2	FRAN CISCO MORAZAN	DISTRITO CENTRAL	29,299,539.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Con No Objeción al borrador de contrato de obra para su adjudicación y la supervisión en evaluación de oferta económica. En gestiones del cumplimiento del aporte municipal y comunitario
8	109111	REPOSICION ESCUELA Y JARDIN DE NIÑOS JESUS MEJIA PAZ	GRACIAS A DIOS	WAMPUSIRPI	13,393,376.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Con No Objeción al financiamiento, con visto bueno de la Dirección de Legal a las bases de licitación para obras y supervisión, en revisión de la Dirección de Contrataciones
9	109113	REPOSICION CEB REPUBLICA DE COSTA RICA Y JN STANLEY GOFF	GRACIAS A DIOS	BRUS LAGUNA	14,158,773.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Con No Objeción al financiamiento, con visto bueno de la Dirección de Legal a las bases de licitación para obras y supervisión, en revisión de la Dirección de Contrataciones

*La información de avance físico y financiero de los proyectos corresponde a la proporcionada por la Dirección de Control y Seguimiento.

✓ **Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) Fase II**



i. Objetivo General

Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).

ii. Focalización

A través de un proceso de concurso con criterios de selección predefinidos en el acuerdo separado y evaluación de propuestas técnicas alineadas a los componentes del programa fueron seleccionados 4 municipios en donde se está realizando la intervención del CONVIVIR a través de obras de infraestructura y medidas de alcance social para beneficio enfocado en la juventud. Así mismo se definieron los barrios, colonias o comunidades urbanas en donde se focaliza las acciones y en donde ya se ha realizado una labor de socialización de los alcances, compromisos y beneficios para la población. Los municipios seleccionados son:

- Municipio de Juticalpa, departamento de Olancho
- Municipio de Intibucá, departamento de Intibucá
- Municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá
- Municipio de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán

iii. Descripción del Proyecto

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

iv. Monto del Proyecto:

Los fondos destinados para la ejecución de este Programa para la Fase II es de EUR 6,000,000.00
Contrapartida Nacional para IDECOAS/FHIS de EUR 600,000.00, Contrapartida Municipal de EUR
300,000.00 Contrapartida Comunitaria de EUR 300,000.00.

Fecha de Inicio del Programa de convenio Fase II: 14/07/2021

Fecha de Finalización del Programa Fase II: 13/07/2025

v. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	19.897.004,00	8.372.701,20	42%
2022	44.370.387,00	26.573.808,83	60%
2023	74.083.192,00	72.701.682,29	98%
2024	70.590.547,00	5.874.845,30	8%

vi. Avance Físico por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024
EMPREDIMIENTO Y VALORES	0	0	278.000,00	0
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	0	12	2.066.666,74	12
TOTAL	0	12	2.344.666,74	12

vii. Avance Físico por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024
COPAN	0	3	688.972,24	3
INTIBUCÁ	0	6	966.722,25	6
OLANCHO	0	3	688.972,25	3
TOTAL	0	12	2.344.666,74	12

viii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	2.130.792,03
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	1.399.386,53
TOTAL	3.530.178,56

ix. LOGROS Y AVANCES

FASE	COMPONENTES			
	Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura	Fortalecimiento de Habilidades de jóvenes para el trabajo habilidades Sociales	Mejoramiento de Capacidades de Actores Relevantes	Materiales y Equipos de Capacitación
II*	7 proyectos en ejecución y con el primer 80% desembolsados, 5 proyectos en ejecución con su primer desembolso.	454 jóvenes Fortalecidos en Habilidades Sociales 490 Jóvenes que serán capacitado por INFOP	214 actores Relevantes capacitados	Equipamiento para los 12 proyectos, incluyen equipo de cómputo, mobiliario, áreas de juego, área de ejercicio, jardinería

* 7 proyectos en iniciaron ejecución en el mes de mayo del año 2023 y 5 proyectos con orden de inicio en ejecución.

**A. COMPONENTE 1 CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA-
AVANCE FISICO**

En Santa Rosa de Copán se están llevando a cabo varios proyectos comunitarios significativos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Uno de ellos es la Plaza Mirador Santa Teresa, diseñada como un espacio público integral que incluirá quioscos de emprendimiento, sanitarios, una gradería techada y una cancha también techada. Además, contará con áreas de juegos infantiles, máquinas de

ejercicios y se destacará por su mirador hacia el municipio, ofreciendo vistas panorámicas que enriquecerán la experiencia de los visitantes y residentes por igual.

Otro proyecto relevante es Plaza Juvenil Brisas de Copán, orientado específicamente a la juventud de Aldea El Derrumbo, sector El Duende. Este proyecto tiene como objetivo crear una plaza juvenil con una cancha multiusos, fomentando así la convivencia comunitaria y promoviendo actividades deportivas y recreativas que ayuden a prevenir la violencia juvenil en la zona.

Además, se está desarrollando la Casa de la Juventud, un espacio social, educativo y laboral destinado a los jóvenes de Santa Rosa y sus alrededores. Este proyecto tiene como misión proporcionar un lugar donde los jóvenes puedan desarrollar y potenciar sus capacidades a través de programas educativos, formación laboral y actividades de emprendimiento. La Casa de la Juventud se posiciona como un centro integral que promueve la participación activa de los jóvenes en la construcción de su propio futuro y el de su comunidad.

**Tabla 1: Proyectos de Infraestructura Seleccionados en el Municipio de Santa Rosa de Copán –
Estado de la Ejecución**

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Plaza Juvenil Brisas de Copán (Obra de Confianza)	Barrio El Duende	4,256,435.99	➤ Proyecto desembolsado en el primer y segundo desembolso, en ejecución
2.	Casa de la Juventud	Barrio El Carmen	13,161,194.90	➤ Proyecto con el primer desembolso a iniciar el 3 abril 2024
3.	Plaza El Mirador – Santa Teresa	Barrio Santa Teresa, sector La Cuchilla	4,803,327.26	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer y segundo desembolso, en ejecución
Monto Total de Inversión Estimado			22,220,958.15	

En el municipio de Intibucá se llevan a cabo varios proyectos como ser “Ruta Lenca de la Juventud” consiste en la rehabilitación de la acera peatonal ubicada en la calle principal en la salida a Siguatepeque, con el objetivo de, entre otros, brindar seguridad y movilidad vial a estudiantes, jóvenes y emprendedores del municipio de Intibucá.

Así también, por medio de esta obra se podrán vincular el Parque La Pirámide (Primer proyecto de Intibucá) con la THAU MISHU/Casa de La Juventud (Segundo Proyecto de Intibucá) de forma ordenada y segura.

Cabe mencionar que el proyecto “Ruta Lenca de la Juventud” del municipio de Intibucá se ubica frente al proyecto de La Esperanza denominado “Paseo Cultural Lenca”, por lo que está previsto realizar un proyecto integral que permita promover el trabajo en conjunto con las dos alcaldías y sus respectivas comunidades.

Tabla 2: Proyectos de Infraestructura Seleccionados en el Municipio de Intibucá – Estado de la Ejecución

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Parque La Pirámide (Obra de Confianza)	Barrio El Way, Sector No. 1	1,720,794.57	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer y segundo desembolso, en ejecución
2.	THAU MISHU (Casa de La Juventud)	Barrio El Way	11,319,038.74	➤ Proyecto aprobado y primer desembolso, se dio orden de inicio el 5 de abril 2024
3.	Ruta Lenca de la Juventud	Barrio El Way	3,477,385.73	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer y segundo desembolso, en ejecución.
Monto Total de Inversión Estimado			16,517,219.04	

El Proyecto de Paseo Cultura Lenca en La Esperanza, Intibucá, representa una significativa operación de regeneración urbana dentro de un enfoque integral y sostenible. Este proyecto transforma gran parte del margen de la calzada principal CA11A en un paseo peatonal a lo largo del margen izquierdo de la carretera.

Además, se han implementado iniciativas como la Plaza de la Juventud en Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá, diseñada para proporcionar espacios seguros y adecuados para los jóvenes. Esta plaza busca promover la convivencia comunitaria y prevenir la violencia juvenil mediante la inclusión de áreas para actividades deportivas y recreativas como gimnasios al aire libre, áreas de juego, salones multiusos y canchas deportivas, dirigidas a todas las edades.

El Proyecto Plaza San Carlos se enfoca en crear un centro deportivo seguro para los jóvenes de San Carlos, La Esperanza, Intibucá, ofreciendo instalaciones como canchas multiusos, pistas de trote y patinaje, así como áreas de gimnasio al aire libre, todo diseñado para promover la participación familiar y comunitaria.

Tabla 3: Proyectos de Infraestructura Seleccionados en el Municipio de La Esperanza – Estado de la Ejecución

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Paseo Cultural Lenca (Obra de Confianza)	Colonia Buenos Aires	4,728,832.16	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer y segundo desembolso, en ejecución.
2.	Plaza de La Juventud Buenos Aires	Colonia Buenos Aires	8,160,161.95	➤ Proyecto aprobado y desembolsado en el primer y segundo desembolso, en ejecución.
3.	Centro Deportivo Integral San Carlos	Colonia San Carlos	6,090,046.99	➤ Proyecto aprobado y desembolsado el primer desembolso, Orden de inicio 4 de abril 2024.
Monto Total de Inversión Estimado			18,979,041.10	

En la Colonia Solidaridad, la iniciativa "Cancha Abe y Ben" se buscó transformar una cancha deteriorada en un espacio seguro y adecuado para actividades físicas y convivencia juvenil, la cancha presentaba problemas de accesibilidad y sin condiciones apropiadas para actividades al aire libre. Con el apoyo del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Cooperación Alemana KfW y el programa CONVIVIR, se remodelo completamente este espacio, proporcionando a los jóvenes un lugar donde puedan participar en actividades deportivas y sociales.

El proyecto "Centro de Formación Integral Juvenil" tiene como objetivo revitalizar un antiguo Centro Penal para convertirlo en un centro educativo, social y laboral para los jóvenes de la zona y sus alrededores. Este centro ofrecerá una variedad de talleres prácticos y educativos como música, arte, informática y técnicos, así como espacios para exhibiciones y usos múltiples.

El proyecto "Parque Recreativo La Juventud" tiene como objetivo remodelar completamente un parque existente para crear un espacio seguro y adecuado donde la comunidad, especialmente los jóvenes, puedan convivir y participar en actividades recreativas y culturales. Se enfoca en mejorar la infraestructura, incluyendo áreas verdes, mobiliario urbano, iluminación y accesibilidad, con la intención de promover el bienestar y la cohesión social en la comunidad.

Tabla 4: Proyectos de Infraestructura Seleccionados en el Municipio de Juticalpa – Estado de la Ejecución

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Cancha ABE y BEN (Obra de Confianza)	Colonia La Solidaridad	4,220,401.03	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer y segundo desembolso, en ejecución.
2.	Centro de Formación Integral Juvenil	Barrio El Centro	13,720,180.88	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer, orden de inicio 9 de mayo 2024.
3.	Parque Recreativo de La Juventud	Aldea La Concepción	4,454,231.38	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer y segundo desembolso, en ejecución.
Monto Total de Inversión Estimado			22,394,813.29	

B. COMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES LABORALES Y SOCIALES DE JOVENES

En la semana del 2 al 6 de mayo 2022, SEDECOAS-FHIS realizó nuevamente una gira por los municipios de incidencia del Proyecto con el propósito de brindar acompañamiento a: (i) ANED Consultores, quienes trabajaron en el estudio de *Línea Base y el Diagnóstico de Necesidades Formativas para los y las Jóvenes* y (ii) Espirállica Research & Consulting, quienes llevaron a cabo la consultoría del *Diagnóstico de Necesidades e Intereses de Fortalecimiento para la Mejora de la Gestión Municipal enfocada en el Desarrollo de la Juventud* en las comunidades seleccionadas.

En esta gira las empresas consultoras socializaron los resultados de los estudios, diagnósticos y planes de formación, con la participación de Jóvenes, Líderes Comunitarios, Sociedad Civil, Entes Gubernamentales y Representantes de las Municipalidades.

El proceso de investigación de “Línea Base, Diagnóstico de Necesidades de Juventud y Propuesta de Plan para el Fortalecimiento de las Necesidades de Formación para Jóvenes” encargado a la empresa de consultoría ANED Consultores ha concluido con la aprobación de sus productos por parte del equipo de La SEDECOAS-FHIS y La Asistencia Técnica. A la fecha de cierre del presente Informe estos documentos se encuentran en proceso de diagramación final para dar por concluido este proceso de consultoría.

Actualmente se han capacitado:

Se firmó un convenio con INFOP para capacitar a 490 jóvenes en el fortalecimiento de habilidades laborales, en el contexto de proyectos para promover el empleo.

Además, se estableció un convenio con FIPADEH, para la ejecución de talleres dirigidos a jóvenes en los municipios de CONVIVIR.

En detalle, se capacitaron:

- 258 jóvenes en Habilidades para la Vida con FIPADEH,
- 196 jóvenes en Arte, Cultura, Deporte y Ambiente con FIPADEH,
- Totalizando 454 jóvenes capacitados.

Para alcanzar la meta de jóvenes, SEDECOAS-FHIS tiene planificado suscribir un Acta de Compromisos con el INJUVE para capacitar a más jóvenes en Habilidades para la Vida, con base en los acuerdos establecidos.

Tabla 6: Procesos de Capacitaciones

	Nombre del Proceso	Institución/Consultor	No. de Jóvenes capacitados	Monto de Contrato/Convenio
1	Fortalecimiento de Habilidades Laborales	INFOP	490	L. 5,000,000.00*
2	Formación de Arte, Cultura, Deporte y Ambiente	FIPADEH	454	L. 1,519,180.00**
3	Emprendimiento	INJUVE	110	Acta de compromiso con INJUVE para capacitar jóvenes EN EL segundo semestre 2024
4	Capacitaciones en Habilidades para la Vida	INJUVE	146	Acta de compromiso con INJUVE en un primer ciclo de formación en Habilidades para la Vida

* Único desembolso el cual se realizó en el mes de octubre del año 2023. Las Capacitaciones aún están en curso, y se está en trámites para una Adenda de Tiempo que finalizara el 30 de noviembre 2024.

** En diciembre de 2023, se realizó el desembolso del 68.5% del monto total del contrato. Actualmente, el proceso ha concluido la etapa de capacitaciones y está a la espera del segundo pago, que corresponde al 31.5% restante.

C. COMPONENTE 3 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES RELEVANTES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (ESPECIALMENTE LA ENTIDAD EJECUTORA, LA ENTIDAD COORDINADORA Y LAS MUNICIPALIDADES Y COMUNIDADES PARTICIPANTES)

Actualmente se tienen contabilizados 214 actores relevantes capacitados en Políticas Públicas de la Juventud y Capacitación de Equidad y Género, Universidad Tecnológica de Honduras impartido en los cuatro municipios y personal técnico SEDECOAS/FHIS, INJUVE.

Tabla 7: Procesos de Capacitaciones Mejoramiento de Capacidades de Actores Relevantes

	Nombre del Proceso	Institución/Consultor	No. De Actores Relevantes capacitados	Monto de Contrato/Convenio
1	Fortalecimiento Municipal	FUNDEMUN	60	L. 695,000.00*
2	Inclusión de Genero	Lic. Milton Meza (Consultor Individual)	72	L. 700,000.00**
3	Formación en Políticas Públicas de Juventud	Fundación Misión Integral	66	L. 700,000.00**
4	Servicios de capacitación, para fortalecer a profesionales de la SEDECOAS/FHIS	UNITEC	76	L.378,000.00***

*Se realizó el pago total de la consultoría del Proceso Fortalecimiento Municipal

** Actualmente, el proceso ha concluido la etapa de capacitaciones y está a la espera del segundo pago, que corresponde al 30% restante.

*** Actualmente se pagó el total de la consultoría se está a la espera del 10% de garantía de cumplimiento.

x. Desafíos de CONVIVIR:

1. Concienciar a la población meta (constituida por la juventud entre 12 y 30 años) para el logro del objetivo general y específico del programa.
2. Falta de participación de algunos miembros de las comunidades en las actividades programadas por miembros del CEP. Esto puede deberse a una variedad de factores, como falta de conciencia, apatía o barreras logísticas. Superar este desafío ha implicado redoblar nuestros esfuerzos de divulgación y compromiso comunitario para fomentar una mayor participación e inclusión.
3. La falta de fondos puede limitar nuestra capacidad para implementar actividades en la parte de capacitaciones a jóvenes y actores relevantes. Para abordar este desafío, hemos buscado formas creativas de maximizar nuestros recursos existentes y hemos explorado oportunidades de colaboración con otras

organizaciones para poder cumplir con el déficit financiero en el componente 1. Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura.

4. En los últimos meses, el Proyecto CONVIVIR ha enfrentado el desafío de renuncias del personal, lo que ha afectado significativamente la continuidad y eficiencia de nuestros programas. La pérdida de talento humano clave ha generado una disrupción en la implementación de nuestras iniciativas y ha aumentado la carga de trabajo para el personal restante. Superar este desafío requerirá medidas para reclutar y capacitar nuevo personal, así como redistribuir responsabilidades de manera efectiva para garantizar la continuidad de nuestras operaciones.
5. Lograr el cumplimiento de los plazos establecidos en el ciclo de proyectos FHIS, para la ejecución de los proyectos según lo programado.
6. La suspensión de proyectos en ejecución debido a la falta de finalización del proceso de órdenes de cambio. Esta situación obstaculiza el avance planificado de las iniciativas, requiriendo una pronta resolución para asegurar la continuidad efectiva de las actividades.

CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)



✓ **Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)**

A. Objetivo General

El propósito de esta Actividad es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

B. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en las cinco municipalidades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Tela y La Ceiba. Las comunidades específicas de intervención serán identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

C. Descripción del Proyecto

Esta Actividad ayudará al GdeH (representado a través de FHIS) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otras partes interesadas. La Actividad

incluye dos resultados complementarios: Resultado 1: Mejora de la infraestructura comunitaria, las actividades responderán a las prioridades de infraestructura comunitaria para abordar la seguridad ciudadana. Resultado 2: Aumento de la cohesión comunitaria, considera que la forma en que las intervenciones de infraestructura son concebidas, diseñadas y ejecutadas pueden desempeñar un papel directo en el aumento de la cohesión social y comunitaria y promover un marco holístico de prevención de la violencia. Los proyectos bajo la Actividad incluirán instalaciones educativas, centros de salud, alumbrado público, espacios comunitarios más seguros, centros de alcance y comunitarios, centros vocacionales, jardines comunitarios, parques, espacios recreativos, paradas de buses, accesos peatonales, mejoras al alumbrado de calles, señalización, instalaciones para el sector seguridad y justicia, así como otros proyectos de infraestructura de pequeña escala que se acuerde entre las Partes.

D. Monto del Convenio

Presupuesto total estimado: \$14,637, 541.74 conforme se establece en la carta de ejecución No 522.0501 – 025 y su plan de trabajo aprobado., de los cuales, fondos de donación de USAID: \$11, 847,015.20; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$ 2, 961,753.80 (efectivo: \$ 2,127,508.35 y especies: \$ 800,000.00).

i. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	23.226.555,00	21.906.553,68	94%
2019	60.781.669,00	60.781.669,00	100%
2020	145.322.291,00	60.678.681,68	42%
2021	67.508.910,00	42.626.620,46	63%
2022	57.711.016,00	55.047.658,54	95%
2023	80.251.050,00	76.368.680,98	95%
2024	41.564.993,00	18.720.254,65	45%

ii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	3	3	5.243.259,18	55	106.320
EDUCACION	1	5	6.589.015,02	59	3.422
TOTAL	4	8	11.832.274,20	114	109.742

iii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
ATLANTIDA	1	2	1.864.691,59	22	1.062
COMAYAGUA	0	1	449.093,36	10	225
CORTES	1	4	6.606.788,29	43	4.310
FRANCISCO MORAZAN	2	1	2.911.700,96	39	104.145
TOTAL	4	8	11.832.274,20	114	109.742

iv. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	5.652.479,17
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	1.235.498,28
TOTAL	6.887.977,45

v. EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE

Durante el periodo comprendido desde el 01 de abril al 30 de junio del 2024, se encuentran en etapa de ejecución un total de 7 proyectos distribuidos entre las categorías de Infraestructura Escolar (3), Proyectos de Salud (1) y Espacios Recuperados (3). De estos, 6 proyectos se encuentran en ejecución bajo la metodología de Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC) y 1 proyecto mediante la metodología de contratista.

Al cierre de II se finalizaron 2 proyectos con una inversión total de L. 9,937,508.08 beneficiando de manera directa a más de 103,880 personas. Estos proyectos no solo han mejorado las infraestructuras educativas y de salud, sino que también han contribuido a la recuperación y mejoramiento de espacios comunitarios, creando entornos más seguros y funcionales para los habitantes.

CUMPLIMIENTO DE ENTREGABLES POR TRIMESTRE, INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA ICS										
Categoría	Programado				Ejecutado				TOTALES	
	I trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Programado	Ejecutado
Infraestructura Escolar	2	1	0	0	1	0	0	0	3	1
Espacios Recuperados	0	3	0	0	0	1	0	0	3	1
Obras Complementarias en los Centros de salud	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2
Total	2	5	0	0	2	2	0	0		
	7				4					

Los 5 proyectos que se encuentran en etapa de ejecución al final del II Trimestre del 2024 bajo el programa ICS, representan un monto total de L. 18,491,866.7 del cual se ha desembolsado un monto promedio del 80.43%.

Matriz de Seguimiento de Proyectos ICS en ejecución

Código	Localización			Proyecto	Status	% Avance Financiero	% Avance físico	Categoría
109104	Cortés	Choloma	Col. Gale	Construcción Área Recreativa en CDA Col. Gale.	Finalizado	100.00%	100.00%	Centro de Alcance
109052	Francisco Morazán	MDC	Col. San Miguel D.C.	Reparación Centro de Salud de la San Miguel, equipamiento y obras varias	Finalizado	55.79%	100.00%	Proyecto Comunitario/Salud
109242	Cortés	San Pedro Sula	Sector Chamelecón	Chamelecón - Oficina Comité Intersectorial	En ejecución	100.00%	99.00%	Proyecto Comunitario
108864	Cortés	San Pedro Sula	Sector Rivera Hdez.	Rivera Hernández - Oficina Comité Intersectorial	En Ejecución	69.00%	70.00%	Proyecto Comunitario
109161	Cortés	San Pedro Sula	Chamelecón	Reparación del Instituto Modesto Rodas Alvarado y construcción de obras varias FASE II	En Ejecución	70.00%	80.00%	Centro Educativo
109079	Atlántida	La Ceiba	Prados de la Misericordia	Reparación del CEB Porfirio Ruiz y construcción de obras varias.	En Ejecución	100.00%	99.00%	Centro Educativo
108942	Atlántida	La Ceiba	Corozal	Reparación del CEB Ramón Rosa y construcción de obras varias	En Ejecución	63.13%	75.00%	Centro Educativo

vi. LOGROS ALCANZADOS EN TRIMESTRE

En este trimestre se gestionó la firma de una nueva carta de ejecución No. 522-0513-01 por parte de la USAID/FHIS/SEFIN donde se sub obligaran \$8,422,674 equivalentes a L. 208,567,337 de aportaciones de la USAID y \$2,105,669 equivalente a L. 52,141,809 de aportaciones del GdH, siendo el nuevo monto de la actividad de \$20,269,689.20 de aportaciones de la USAID y \$5,067,423.00 de aportaciones del GdH. Así mismo, bajo la aprobación de esta nueva carta de ejecución, se extenderá el periodo de implementación de la actividad a 111 meses, desde el mes de octubre del 2017 a diciembre de 2026.

Cartas de Ejecución	Aportaciones USAID		Aportaciones GdH	
	US\$	HNL	US\$	HNL
Convenio 522-0441 Carta de Ejecución 30 y Convenio 522-0501 Carta de Ejecución 4	2,836,304	69,957,309	709,076	17,489,327
Convenio 522-0441 Carta de Ejecución 33 y Convenio 522-0501 Carta de Ejecución 8	Reprogramación Plan de Trabajo y Presupuesto			
Convenio 522-0441 Carta de Ejecución 36 y Convenio 522-0501 Carta de Ejecución 11	3,861,710	95,248,883	965,427	23,812,221
Convenio 522-0501 Carta de Ejecución 22	1,000,000	24,664,951	250,000	6,166,238
Convenio 522-0501 Carta de Ejecución 25	4,149,001	102,334,906	1,037,250	25,583,727
Convenio 522-0513 Carta de Ejecución 01	8,422,674	208,567,337	2,105,669	52,141,809
Total	20,269,689	500,773,386	5,067,423	125,193,322

Para el año 2024, se tiene programada una ejecución financiera total de L. 41,372,993.00, de este monto, L. 2,139,161.00 provienen de fondos nacionales (Fuente 11) y L. 39,233,832.00 corresponden a fondos de donación (Fuente 22).

Al cierre del II Trimestre del 2024, se alcanzado una ejecución financiera de L. 10,216,883.02 obteniendo una ejecución acumulada de L. 18,720,261.65, lo que representa el 45% de la ejecución programada para el año 2024. Este avance indica un progreso significativo en la utilización de los fondos asignados, reflejando un compromiso con la implementación de los proyectos y objetivos establecidos para el período.

EJECUCIÓN FINANCIERA 2024 - ICS							
Presupuesto Aprobado Año 2024	Fondos Nacionales (11)	L 2,139,161.00	Fondos de Donación (22)	L 39,233,832.00	Total Aprobado 2024	L 41,372,993.00	% Ejecución
Mes	Proyectado Fuente 11	Devengado 11	Proyectado Fuente 22	Devengado 22	Total Proyectado	Total Devengado	
Enero	L -	L -	L -	L -	L -	L -	100%
Febrero	L 2,139,161.00	L 1,462,000.00	L 1,975,927.25	L -	L 4,115,088.25	L 1,462,000.00	36%
Marzo		L 677,000.00	L 6,276,160.00	L 6,364,368.63	L 6,276,160.00	L 7,041,368.63	112%
Abril	L -	L -	L 6,509,528.00	L -	L 6,509,528.00	L -	0%
Mayo	L -	L -	L 2,814,920.25	L -	L 2,814,920.25	L -	0%
Junio	L -	L -	L 1,066,800.00	L 10,216,883.02	L 1,066,800.00	L 10,216,883.02	958%
Julio	L -	L -	L 5,429,428.00	L -	L 5,429,428.00	L -	0%
Agosto	L -	L -	L 2,577,499.25	L -	L 2,577,499.25	L -	0%
Septiembre	L -	L -	L 2,384,321.00	L -	L 2,384,321.00	L -	0%
Octubre	L -	L -	L 5,218,630.00	L -	L 5,218,630.00	L -	0%
Noviembre	L -	L -	L 5,172,618.25	L -	L 5,172,618.25	L -	0%
Diciembre	L -	L -	L -	L -	L -	L -	0%
Total		L 2,139,000.00		L 16,581,251.65		L 18,720,251.65	45%
Por Devengar	L	161.00	L	22,652,580.35	L	22,652,741.35	55%

vii. PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCION II TRIMESTRE

- **Contratación de Proyectos:** Durante el período se han desarrollado procesos de contratación de obras mediante la selección de contratistas (1 Proyecto Escolar) y bajo la modalidad PEC (2 proyectos de Caminos Productivos), los cuales, no han podido ser formalizados mediante la emisión de la respectiva notificación de adjudicación /firma de contrato, debido a que sus períodos de ejecución trascenderían el plazo de vigencia de la carta de ejecución PIOH 522-0502-45. El monto de inversión previsto para la ejecución de estos proyectos es de L 21,712,200.
- **Suspensión de proyectos en estado de ejecución:** dado que, las cartas de ejecución vigentes para las actividades ICS No.522-0501-25 y PIOH No.522-0502-45 alcanzaron su fecha de finalización 25 y 28 de junio correspondiente, esto ha generado una consecuencia negativa tanto financiera como físicamente, teniendo un impacto directo en los entregables programados para cada trimestre.

- **Aprobaciones de adendas de tiempo y monto:** en referencia al párrafo anterior, 4 de nuestros proyectos se encuentran en trámite de aprobación de adendas por parte del Comité de Operaciones del FHIS, las cuales no han podido ser gestionadas por la falta de firma por parte de la SEFIN de las nuevas cartas de Ejecución de las actividades ICS-PIOH.
- **Falta de mano de obra calificada en las zonas de intervención:** Se ha observado que en los últimos periodos la contratación de mano de obra calificada representa un enorme reto para la ejecución de los proyectos por temas de inseguridad y migración, lo cual incide directamente en la programación inicial para los proyectos bajo la metodología PEC y por contratista.

✓ **Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)**

i. Objetivo General

El propósito de esta Actividad es mejorar las pobres condiciones sociales y económicas son especialmente pronunciadas en el Occidente de Honduras. Extrema pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático. Bajos niveles educativos, migración, falta de acceso a los servicios básicos y otros retos socioeconómicos son endémicos. La provisión de servicios básicos de educación y nutrición son escasos en la zona de Occidente y es difícil el acceso a los ya existentes, así mismo la gestión de servicios de educación, nutrición y agua y saneamiento son deficientes por lo que los ciudadanos cuentan además con pocos espacios de participación para mejorar sus vidas a nivel de hogar y sus vidas productivas, lo que genera una gran brecha de pobreza.

ii. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en los departamentos de Ocotepeque, la Paz, Copan Intibucá, Santa Bárbara y Lempira y zonas occidente específicas de intervención identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

iii. Descripción del Proyecto

Esta Actividad apoyará al FHIS para construir de al menos 14 proyectos de infraestructura comunitaria que potencien otros esfuerzos de USAID para mejorar los servicios relacionados con nutrición, la educación y el acceso al agua seleccionadas dentro de las municipalidades identificadas bajo el Objetivo de Desarrollo 2 de USAID.

iv. Monto del Convenio

El monto total de la Actividad es de \$ 10,544,130.00 (USAID \$ 8,435,304.00, Gobierno de Honduras \$ 2,108,826.00). Según la carta de ejecución No. 034.

v. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2019	6.190.650,00	5.981.569,54	97%
2020	65.583.096,00	13.336.794,49	20%
2021	58.488.260,00	47.180.270,68	81%
2022	37.504.624,00	35.478.196,70	95%
2023	42.199.428,00	33.390.584,30	79%
2024	56.710.336,00	11.476.246,21	20%

vi. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
INFRAESTRUCTURA VIAL	0	1	250.850,00	1	0
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	0	1	1.728.900,45	18	1.376
EDUCACION	0	3	2.139.645,65	51	324
TOTAL	0	5	4.119.396,10	70	1.700

vii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
FRANCISCO MORAZAN	0	0	606.694,85	0	0
INTIBUCÁ	0	0	319.641,19	0	0
LA PAZ	0	1	556.844,15	13	176
LEMPIRA	0	2	1.173.319,41	19	1.376
OCOTEPEQUE	0	1	746.725,63	24	86
SANTA BARBARA	0	1	716.710,87	14	62
TOTAL	0	5	4.119.936,10	70	1.700

viii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	6.006.287,25
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	1.350.562,86
TOTAL	7.356.850,11

ix. EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE

Durante el periodo correspondiente del 01 de abril al 30 de junio del 2024 bajo el programa PIOH, no se finalizaron proyectos. A continuación, se presenta la tabla de programación de entregables correspondientes a los 4 trimestres del año 2024.

CUMPLIMIENTO DE ENTREGABLES POR TRIMESTRE, PILOTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL OCCIDENTE DE HONDURAS										
Categoría	Programado				Ejecutado				TOTALES	
	I trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Programado	Ejecutado
Infraestructura Escolar	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Infraestructura, Logística y Transporte	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Total	0	0	0	2	0	0	0	0		
	2				0					

Matriz de Seguimiento de Proyectos PIOH en ejecución

Código	Localización			Proyecto	Status	% Avance Financiero	% Avance físico	Categoría
109056	La Paz	La Paz	Barrio San Juan	Reparación del CEB ADELINA MARTÍNEZ AVILA y construcción de obras varias.	En Ejecución	43.60%	77.0%	Centro Educativo
108950	Santa Bárbara	Trinidad	Las Delicias	Reparación del CEB FRANCISCO JAVIER RAPALO y construcción de obras varias.	En Ejecución	45.00%	60.0%	Centro Educativo
109066	Copán	El Paraíso	San Cristóbal	Reparación del Escuela Jonh F. Kennedy y Construcción de obras varias	En Ejecución	40%	11.9%	Centro Educativo
109065	Copán	Santa Rita	El Moscarrón	Reparación del CEB CATALINA M. CAULEY y construcción de obras varias.	En Ejecución	40%	35.0%	Centro Educativo

Para el año 2024, se tiene programada ante la SEFIN una ejecución financiera total de L. 56,710,336.00. De este monto, L. 11,611,250.00 provienen de fondos nacionales (Fuente 11) y L. 45,099,086.00 corresponden a fondos de donación (Fuente 22).

Al cierre del II Trimestre del 2024, se alcanzado una ejecución financiera de L. 5,853,658.00 obteniendo una ejecución financiera acumulada de L. 11,476,246.21, lo que representa el 20% de la ejecución programada para el año 2024. Este bajo porcentaje de ejecución se debe a un desfase provocado por la reprogramación de actividades, resultado de la priorización de proyectos por parte de la USAID. Inicialmente, se había planificado iniciar proyectos de caminos productivos en 2024; sin embargo, la USAID solicitó dar prioridad a proyectos escolares, destinando los fondos correspondientes a esa cartera.

Los 4 proyectos que se encuentran en etapa de ejecución al final del II Trimestre del 2024 bajo el programa PIOH, representan un monto total de L. 15,490,000. del cual se ha desembolsado un monto promedio del 42.15%.

EJECUCIÓN FINANCIERA FINANZAS - PIOH							
Presupuesto Aprobado Año 2024	Fondos Nacionales (11)	L 11,611,250.00	Fondos de Donación (22)	L 45,099,086.00	Total Aprobado 2024	L 56,710,336.00	% Ejecución
Mes	Proyectado Fuente 11	Devengado 11	Proyectado Fuente 22	Devengado 22	Total Proyectado	Total Devengado	
Enero	L 663,000.00	L -	L -	L -	L 663,000.00	L -	0%
Febrero	L 846,249.00	L 663,000.00	L 942,250.00	L -	L 1,788,499.00	L 663,000.00	37%
Marzo	L 733,000.00	L 1,326,000.00	L 10,993,085.00	L 3,633,587.22	L 11,726,085.00	L 4,959,587.22	42%
Abril	L 803,000.00	L 512,900.00	L 701,750.00	L -	L 1,504,750.00	L 512,900.00	100%
Mayo	L 803,000.00	L 627,000.00	L 738,908.00	L -	L 1,541,908.00	L 627,000.00	100%
Junio	L 803,000.00	L 388,266.67	L 10,327,926.00	L 4,162,158.99	L 11,130,926.00	L 4,713,758.99	42%
Julio	L 973,000.00	L -	L 7,323,506.00	L -	L 8,296,506.00	L -	0%
Agosto	L 973,000.00	L -	L 2,713,328.00	L -	L 3,686,328.00	L -	0%
Septiembre	L 973,000.00	L -	L 1,221,750.00	L -	L 2,194,750.00	L -	0%
Octubre	L 973,000.00	L -	L 3,328,250.00	L -	L 4,301,250.00	L -	0%
Noviembre	L 1,534,000.00	L -	L 3,359,049.00	L -	L 4,893,049.00	L -	0%
Diciembre	L 1,534,001.00	L -	L 3,449,284.00	L -	L 4,983,285.00	L -	0%
Total		L 3,517,166.67		L 7,795,746.21		L 11,476,246.21	20%
Por Devengar	L	8,094,083.33	L	37,303,339.79	L	45,234,089.79	80%

x. LOGROS ALCANZADOS EN TRIMESTRE

La USAID, y el GdH han firmado el convenio de donación de objetivo de desarrollo 522-0502 y cuatro (4) cartas de ejecución con un periodo de implementación de 68 meses del de octubre de 2018 a junio de 2024 estableciendo montos Sub – Comprometidos o Sub-Obligados por \$8,831,000 equivalentes a

L.184,522,440 de aportaciones de la USAID y \$1,707,750 equivalente a L.41,178,869 de aportaciones del GdH, conforme se establece en la carta e ejecución No 522.0502 – 034 y su plan de trabajo aprobado.

A través de la firma de una nueva carta de ejecución No. 522-0511-01 por parte de la USAID/FHIS/SEFIN se reprograma el plan de trabajo aprobado bajo la Carta de Ejecución No.522-0502-45 y se extiende el periodo de implementación de la actividad a 84 meses, desde el mes de octubre del 2018 a diciembre de 2025, esta ampliación se realiza para ejecutar fondos de donación de la oficina de Crecimiento Económico (EG).

Cartas de Ejecución	Aportaciones USAID		Aportaciones GdH	
	US\$	HNL	US\$	HNL
Convenio 522-0502 Carta de Ejecución 9	1,004,470	24,107,280	251,117	6,026,820
Convenio 522-0502 Carta de Ejecución 19	2,995,530	71,892,720	748,883	17,973,192
Convenio 522-0502 Carta de Ejecución 25	-1,000,000	-25,000,000	-250,000	-6,250,000
Convenio 522-0502 Carta de Ejecución 37	Reprogramación de Plan de Trabajo y Plazo			
Convenio 522-0502 Carta de Ejecución 34	3,831,000	93,522,440	957,750	23,426,857
Convenio 522-0502 Carta de Ejecución 45	1,504,304	39,980,889	376,076	9,948,963
Convenio 522-0511 Carta de Ejecución 01	Reprogramación de Plan de Trabajo y Plazo			
Total	8,335,304	204,503,329	2,083,826	51,125,832

xi. PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCION II TRIMESTRE

- **Contratación de Proyectos:** Durante el período se han desarrollado procesos de contratación de obras mediante la selección de contratistas (1 Proyecto Escolar) y bajo la modalidad PEC (2 proyectos de Caminos Productivos), los cuales, no han podido ser formalizados mediante la emisión de la respectiva notificación de adjudicación /firma de contrato, debido a que sus períodos de ejecución trascenderían el plazo de vigencia de la carta de ejecución PIOH 522-0502-45. El monto de inversión previsto para la ejecución de estos proyectos es de L 21,712,200.

- **Suspensión de proyectos en estado de ejecución:** dado que, las cartas de ejecución vigentes para las actividades ICS No.522-0501-25 y PIOH No.522-0502-45 alcanzaron su fecha de finalización 25

y 28 de junio correspondiente, esto ha generado una consecuencia negativa tanto financiera como físicamente, teniendo un impacto directo en los entregables programados para cada trimestre.

- **Aprobaciones de adendas de tiempo y monto:** en referencia al párrafo anterior, 4 de nuestros proyectos se encuentran en trámite de aprobación de adendas por parte del Comité de Operaciones del FHIS, las cuales no han podido ser gestionadas por la falta de firma por parte de la SEFIN de las nuevas cartas de Ejecución de las actividades ICS-PIOH.
- **Falta de mano de obra calificada en las zonas de intervención:** Se ha observado que en los últimos periodos la contratación de mano de obra calificada representa un enorme reto para la ejecución de los proyectos por temas de inseguridad y migración, lo cual incide directamente en la programación inicial para los proyectos bajo la metodología PEC y por contratista.
- **Reprogramación de inicio de Proyectos:** existe un impacto negativo en la ejecución financiera de la actividad PIOH, en vista de que se realizaron proyecciones bajo el supuesto de ejecución de nuevos proyectos aprobados en la carta de ejecución No. 522-0502-45. La DIM/FHIS a solicitud de la USAID, priorizo el inicio de los proyectos de la oficina de Crecimiento Económico de la USAID (EG), denominados como “Proyectos de Ejes Carreteros” (Formulación) sustituyendo la cartera de proyectos de Educación (Formulados/Contrato), lo que represento un desfase en la ejecución en al menos 3 meses, lo cual es evidenciado por el porcentaje de ejecución financiera obtenida al cierre del II Trimestre del 2024.

CARTERA DE FONDOS NACIONALES

✓ Gestión de Proyectos Artículo 38 DGP-2024

i. Antecedentes

El informe de ejecución de fondos se elabora en cumplimiento del Artículo 338 de las Disposiciones Generales del presupuesto 2024, que establece lo siguiente:

Se autoriza una asignación presupuestaria de hasta NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L950,000,000.00) para el desarrollo de infraestructura menor y obras sociales a petición y en beneficio de las Comunidades, Patronatos, Asociaciones, Alcaldías, Juntas de Agua, Cajas Rurales, entre otros; así como para el otorgamiento de becas de estudio en todos los niveles educativos. Las obras de infraestructura menor, sociales, becas y canchas deportivas se gestionarán a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), Instituto de Crédito Educativo (EDUCREDITO), Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (FOSODE) y la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR).

A la fecha, se ha asignado un total de L180,659,079.00 de los cuales se han ejecutado L55,249,806.58 en 153 proyectos de infraestructura. Asimismo, en fondos del Tesoro Nacional se cuenta con un presupuesto vigente de L215,577,195.00, de los cuales se han ejecutado L47,976,484.78 en 39 proyectos de inversión, distribuidos en 21 proyectos de anticipos, 17 estimaciones de obras y 1 devolución de retención.

Este informe tiene como propósito evaluar el progreso y la utilización de los fondos asignados, así como analizar el impacto de los proyectos en las comunidades beneficiarias y los desafíos enfrentados en la ejecución de los mismos. Se busca proporcionar una visión clara y detallada del estado actual de los proyectos y ofrecer recomendaciones para mejorar la eficiencia en la gestión y ejecución de los recursos restantes.

ii. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2024	180.659.079,00	49.382.745,30	27%

iii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
AGUA Y SANEAMIENTO	3	785.261,05	107	5.550
ELECTRIFICACION	2	-	7	32.500
INFRAESTRUCTURA VIAL	91	39.799.503,35	1.499	1.331.771
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	15	2.607.092,56	264	225.995
EDUCACION	39	6.190.888,34	671	43.349
TOTAL	150	49.382.745,30	2548	1.639.165

iv. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
ATLANTIDA	6	2.655.761,10	101	15.400
CHOLUTECA	6	1.506.231,00	116	172.781
COMAYAGUA	13	4.269.512,45	226	78.705
COPAN	8	2.799.766,46	170	57.113
CORTES	20	5.356.028,63	311	113.978
COLON	2	-	28	50.573
EL PARAISO	8	4.483.350,55	169	165.929
FRANCISCO MORAZAN	23	4.839.149,32	426	206.790
LA PAZ	8	3.382.309,84	116	76.585
LEMPIRA	5	1.063.235,30	98	7.604
OLANCHO	26	7.496.687,00	420	518.440
SANTA BARBARA	14	6.838.824,39	194	111.591
YORO	6	1.959.083,66	104	46.396
VALLE	5	2.732.805,60	69	17.280
TOTAL	150	49.382.745,30	2548	1.639.165

v. Logros y Avances

Durante el segundo trimestre del 2024, el Programa 19, enfocado en la Infraestructura Rural, ha ejecutado un total de 150 proyectos de inversión distribuidos en diferentes departamentos y sectores. A continuación, se muestra el avance físico por departamento y sector conforme a lo que se ha registrado en el SIAFI con documentos F01, representando una ejecución de L49,382,745.3 representando un 27.3% en relación con el presupuesto vigente (L180,659,079.00).

vi. Problemática

- **Retrasos en la Ejecución:** Aunque se ha logrado un avance significativo, algunos proyectos han experimentado retrasos debido a diversos factores, como problemas logísticos, climáticos y administrativos.
- **Coordinación Interinstitucional:** La gestión de proyectos a través de múltiples entidades, como el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Educación y otras, ha presentado desafíos en términos de coordinación y comunicación, lo que ha afectado la eficiencia en la ejecución de algunos proyectos.
- **Capacidad Técnica:** En ciertas localidades, la capacidad técnica para llevar a cabo los proyectos es limitada, lo que ha requerido capacitación adicional y apoyo técnico, generando demoras y costos adicionales.
- **Control y Seguimiento:** La implementación de un sistema efectivo de seguimiento y monitoreo no ha sido óptimo, lo que ha dificultado la evaluación continua y precisa del progreso y la identificación oportuna de problemas.

✓ **Infraestructura y Otros a Nivel Nacional Programa 11**

i. Logros y Avances

Durante el segundo trimestre del 2024, el Programa 11, enfocado en la Infraestructura Rural, ha ejecutado un total de 35 proyectos de inversión distribuidos en diferentes departamentos y sectores. A continuación, se muestra el avance físico por departamento y sector conforme a lo que se ha registrado en el SIAFI con documentos F01, representando una ejecución de L47,976,484.78 representando un 22.3% en relación con el presupuesto vigente (L215,577,195.00).

Estos proyectos abarcan diversas áreas críticas para el desarrollo rural, incluyendo la mejora de infraestructuras de agua y saneamiento, educación, vialidad y prevención situacional. La ejecución de estos proyectos refleja el compromiso del programa con el desarrollo integral de las comunidades rurales, proporcionando infraestructura esencial que contribuye al bienestar y progreso de sus habitantes.

El avance logrado hasta el segundo trimestre del 2024 demuestra una gestión eficiente y una adecuada asignación de recursos, impactando positivamente en las condiciones de vida de las poblaciones rurales beneficiadas. Este informe continuará siendo actualizado para reflejar los progresos en los siguientes trimestres, asegurando la transparencia y efectividad en la ejecución de los proyectos planificados.

ii. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2024	215.577.195,00	47.976.484,00	22%

iii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiario s Directos 2024
AGUA Y SANEAMIENTO	8	21.307.412,72	32	360.158
INFRAESTRUCTURA VIAL	19	17.881.007,60	296	61.105
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	2	4.557.475,69	167	835.558
EDUCACION	6	4.230.588,77	151	4.431
TOTAL	35	47.976.484,78	646	1.261.252

iv. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
ATLANTIDA	1	467.227,66	16	50
CHOLUTECA	2	871.609,79	42	5.462
COMAYAGUA	4	2.110.640,81	81	12.616
CORTES	9	25.131.966,04	45	1.135.907
FRANCISCO MORAZAN	5	4.358.924,56	59	9.062
INTIBUCÁ	1	595.598,00	11	1.025
LEMPIRA	2	1.532.262,90	67	986
OLANCHO	8	7.177.919,10	236	74.831
SANTA BARBARA	1	2.400.081,91	73	19.593
YORO	1	2.753.794,34	2	720
VALLE	1	576.459,67	14	1.000
TOTAL	35	47.976.484,78	646	1.261.252

v. Problemática

- **Retrasos en la Ejecución:** Aunque se ha logrado un avance significativo, algunos proyectos han experimentado retrasos debido a diversos factores, como problemas logísticos, climáticos y administrativos.
- **Coordinación Interinstitucional:** La gestión de proyectos a través de múltiples entidades, como el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Educación y otras, ha presentado desafíos en términos de coordinación y comunicación, lo que ha afectado la eficiencia en la ejecución de algunos proyectos.
- **Capacidad Técnica:** En ciertas localidades, la capacidad técnica para llevar a cabo los proyectos es limitada, lo que ha requerido capacitación adicional y apoyo técnico, generando demoras y costos adicionales.
- **Control y Seguimiento:** La implementación de un sistema efectivo de seguimiento y monitoreo no ha sido óptimo, lo que ha dificultado la evaluación continua y precisa del progreso y la identificación oportuna de problemas.
