



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan
Operativo Anual POA-Presupuesto

III Trimestre 2024

INDICE

Introducción	2
Antecedentes	2
Resultados Financieros	5
Proyectos FHIS	6
Avance Ejecución Física de Proyectos de Inversión	7
Ejecución Presupuestaria por Programas 2024	0
Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2024	1
Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Tercer Trimestre 2024	2
Resumen de Cuadro por Sector 2024	3
PROCESO DE COMPRAS MENORES 2024 III TRIMESTRE	4
CARTERA BANCO MUNDIAL	8
▪ ✓ Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE 6822-HN)	8
CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	0
▪ ✓ Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)	0
▪ ✓ Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira.	9
CARTERA KfW	22
▪ ✓ Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V 22	
▪ ✓ Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) Fase II y Fase III	35
CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) 60	
▪ ✓ Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)	60
▪ ✓ Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH) 67	
CARTERA DE FONDOS NACIONALES	74
▪ ✓ Gestión de Proyectos Artículo 338 DGP-2024	74
▪ ✓ Infraestructura y Otros a Nivel Nacional Programa 11	77

Introducción

Este informe de ejecución física financiera del plan operativo anual es una herramienta esencial para medir el desempeño de la institución en el logro de sus objetivos. Este tipo de informe permite evaluar la efectividad de los recursos asignados y su uso adecuado en relación con los resultados obtenidos. El análisis de la ejecución física y financiera nos ha permitido identificar las fortalezas y debilidades, así como las áreas de oportunidad para la mejora continua. Al proporcionar información detallada sobre el cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas, este informe es la recopilación de las actividades e inversiones realizadas por el FHIS durante el tercer trimestre del 2023.

Para este Primer Trimestre el FHIS alcanzo una Ejecución Acumulada de L. 109.462.340,17, en los cuales están incluidos los siguientes Programas y Proyectos como ser:

- **(BM)** Proyecto de recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota.
- **(BCIE)** Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE) /Proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira.
- **(USAID)** Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS)/ Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH).
- **(KFW)** Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE Fase IV y V./Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR FASE II).

Antecedentes

De acuerdo al Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-056-2019, se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), la cual debe de promover el Desarrollo Comunitario por medio de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos, en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerables de Honduras quien para el desarrollo de sus funciones debe contar con una Subsecretaría de Estado.

Se adscribe a dicha Secretaría de Estado, El Instituto Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), que fue creado mediante Decreto Ejecutivo PCM-013-2014 publicado el 30 de Mayo del 2014 y tiene como propósito la integración institucional del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y del Servicio Autónomo

Nacional de Acueducto y Alcantarillados (SANAA) y demás afines al sector, Independiente de su integración estas instituciones continuaron cumpliendo los objetivos establecidos en sus leyes constitutivas.

Y en la práctica el SANAA no se adscribió al IDECOAS

En PCM-05-2022 se adscribe el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y a la vez se crea el Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos que se adscribe a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y aglutina todos los entes relacionados al sector.

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es un organismo Desconcentrado de la Presidencia de la República, creado el 22 de febrero de 1990 y extendida su vida legal hasta el año 2026 según decreto No. 118-2022 cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados, en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social y/o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Asimismo, asesorará a los gobiernos locales con respecto a los procesos de captación de recursos de las fuentes de financiamiento nacionales y/o externas y las asiste en la transferencia de las capacidades técnicas y administrativas, para convertir a estos gobiernos locales en administradores eficientes de sus programas y proyectos, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Nación en aplicación del principio de Descentralización.

Misión:

Somos una Institución Estatal, desconcentrada, técnica y captadora de recursos que promueve el desarrollo local sostenible, participativo e incluyente mediante el fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, en municipales y sociedad civil, en alianza con socios estratégicos para desarrollar obras de infraestructura y proyectos de orientación social de acuerdo al plan de nación y visión de país de forma transparente y eficiente, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable de Honduras.

Visión:

Ser para el año 2026, la Institución líder en gestión y fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, para la ejecución de proyectos, que contribuya equitativamente al desarrollo sustentable nacional.

Valores:

- **Ética:** Ejercicio de las funciones con sujeción a las normas morales que promuevan la confianza de la población hondureña.
- **Integridad:** Actuación sustentada en la honradez, prudencia, entereza, rectitud y firmeza.
- **Compromiso:** Ejecución de proyectos que coadyuven al desarrollo local.
- **Transparencia:** Amplia difusión de información sobre nuestras actuaciones. Rendición de cuentas ante la sociedad.
- **Lealtad:** Actuar con fidelidad y rectitud hacia el FHIS y compañeros de trabajo, con el objetivo de identificarse con la institución.
- **Equidad:** El FHIS no hace distinción de credo, raza, de ninguna otra forma de discriminación humana.


Resultados Financieros

SEDECOAS-FHIS, llega hasta los lugares más lejanos del país, para contribuir a mitigar las necesidades de la población más pobre y vulnerable a través de respuestas rápidas y concretas con proyectos de Agua y Saneamiento, Educación, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural.

El presupuesto vigente de SEDECOAS-FHIS para la gestión 2024 al 31 de diciembre asciende a 1.822 mil millones de lempiras y su ejecución acumulada al III trimestre asciende a 754.530 millones de lempiras, financiado tanto por fondos del Tesoro Nacional, como de Créditos y Donaciones de Organismos Internacionales, y cuya distribución, así como su participación porcentual en el presupuesto general de la institución se describe a continuación:

Fuente	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada III Trimestre	% de Participación en el Presupuesto Vigente
BM	L. 298.426.045,00	L. 380.926.045,00	L. 270.021.460,76	21%
BCIE	L. 358.211.977,00	L. 358.211.977,00	L. 101.984.487,76	20%
USAID	L. 98.275.329,00	L. 115.275.329,00	L. 48.504.963,67	6%
GOH*	L. 1.370.965.245,00	L. 586.587.513,00	L. 209.249.060,56	32%
KfW	L. 205.192.188,00	L. 190.483.845,00	L. 15.058.458,98	10%
BCH	L. -	L. 10.706.892,00	L. 647.488,87	1%
TESORO NACIONAL	L. -	L. 180.659.079,00	L. 109.064.760,62	10%
TOTAL	L. 2.331.070.784,00	L. 1.822.850.680,00	L. 754.530.681,22	100%

* Incluye costo operativo y fondos nacionales del FHIS

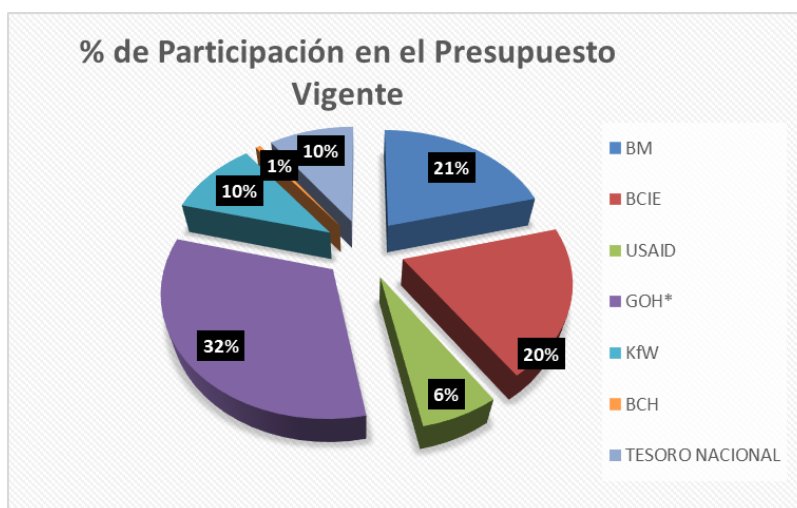

Proyectos FHIS

Fuente	Nombre del Proyecto	Nombre Corto	Sector	Modalidad Ejecución
BM	Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota	PRE 6822-HN	Infraestructura Escolar	Centralizados
BCIE	Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	BCIE No. 2239 MIFE	Infraestructura Escolar	PEC-Descentralizados
	Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira.	BCIE No. 2261	Agua y Saneamiento	Centralizados
KFW	Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar SE-FHIS FASE IV y V	PROMINE	Infraestructura Escolar	PEC-Descentralizados
	Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras	CONVIVIR	Infraestructura Social	Descentralizados
USAID	Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana	ICS	Infraestructura Social y Escolar	PEC/Centralizados
	Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras	PIOH	Infraestructura Escolar	PEC/Centralizados
Fondos Nacionales	Obras Comunitarias Menores a Nivel Nacional	FN	Infraestructura Social y Escolar	Centralizados
	Programa de Gestión de Proyectos Artículo 338 DGP-2024	ARTÍCULO 338	Infraestructura Vial y Escolar	Centralizados


Avance Ejecución Física de Proyectos de Inversión

Avance Ejecución Física de Proyectos de Inversión						
Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Metas			Ubicación y Observaciones
			Programación 2024	Ejecución Física acumulada al III Trimestre 2024		
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	
PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS	Centros educativos rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota en beneficio de la población afectada por los fenómenos naturales. PRE	CENTRO EDUCATIVO	20	12	60%	Los 4 subproyectos terminados en 1er Trimestre son: 108446, 108447, 108452 y 108507. Los 7 subproyectos terminados en 2do trimestre: 108314, 108420, 108449, 108471, 108457, 108614 y 109631. 1 subproyecto finalizado en 3er trimestre: 108350, Productos programados para IV trimestre
	Sistemas de agua rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota. PRE	SISTEMA DE AGUA	3	0	0%	Producto programado para el IV trimestre
	Infraestructura vial rehabilitada y reconstruida afectados por ciclones Eta e Iota. PRE	KILOMETRO	5	3	60%	El subproyecto terminado en el 1er. Trimestre 109225 y los subproyectos terminados en el 2do. Trimestre 109240 y 109239. Productos programados para IV trimestre
	Infraestructura en centros de salud pública rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota en beneficio de la población afectada por los fenómenos naturales. PRE	UNIDAD DE SALUD	1	0	0%	Producto programado para el IV trimestre
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados. MIFE	CENTRO EDUCATIVO	42	25	60%	Productos programados para el IV trimestre
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE IV y V)	Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados. PROMINE	CENTRO EDUCATIVO	7	2	29%	En este trimestre los gastos realizados corresponden al gasto operativo para las visitas a los proyectos en ejecución. Se ha reportado que aproximadamente 40mm no se estarán ejecutando del presupuesto disponible. Se finalizó un proyecto sin embargo los dos proyectos programados finalizarse llegaron a un avance físico del mas del 90% sin embargo hay compras de equipamiento pendiente, por lo cual se reportaran en el próximo trimestre. Productos programados para IV trimestre
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS FASE II	Espacios públicos recuperados y entregados para la seguridad ciudadana a las colonias, alcaldías y patronatos en beneficio de la población hondureña CONVIVIR II	OBRA	7	0	0%	El Programa No proporciono la información de evaluación.
	Jóvenes capacitados en habilidades sociales y laborales para personas jóvenes de entre las edades de 12-30 años en los municipios de Santa Rosa de Copán, Intibucá, La Esperanza y Juticalpa. CONVIVIR Fase II	CAPACITADO	810	0	0%	El Programa No proporciono la información de evaluación, productos programados para el IV trimestre
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	Espacios públicos recuperados y entregados para la seguridad ciudadana a las colonias, alcaldías y patronatos en beneficio de la población hondureña ICS	OBRA	3	1	33%	La ejecución presupuestaria para el III trimestre se vio afectada por L.1.5 MM para la regularización de los fondos externos en vista que no existía asignación presupuestaria en los objetos de gastos correspondientes, para los cuales se realizaron las gestiones de modificación presupuestaria en el mes de Julio 2024 ante el FHIS-SEFIN. La Ejecución de los fondos nacionales se encuentra al 100%, con esta aportación el GdH, ha cumplido con las aportaciones en presupuesto. Productos programados para IV trimestre
	Centros educativos construidos, reparados y/o ampliados ubicados en Choloma, San Pedro Sula, Chamelecón, La Lima, Tela y en Tegucigalpa en beneficio de niños y niñas de las zonas urbana y rural de Honduras. ICS	CENTRO EDUCATIVO	3	1	33%	
	Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud ubicados en La Ceiba, Sps y Tegucigalpa. ICS	OBRA	1	2	200%	
ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	Centros educativos construidos, reparados y/o ampliados en beneficio de niños y niñas de las zonas rural y urbanas en Honduras. PIOH	CENTRO EDUCATIVO	1	1	100%	La ejecución presupuestaria para el III trimestre se vio afectada por L.718,000 para la regularización de los fondos externos, en vista que no existía asignación presupuestaria en los objetos de gastos correspondientes, para los cuales se realizaron las gestiones de modificación presupuestaria en el mes de Julio 2024 ante el FHIS-SEFIN, al mismo tiempo se ha tenido afectaciones en la ejecución en al menos L. 4.0 MM por los atrasos en la firma de la Carta de Ejecución 522-0502/522-0511. Productos programados para IV trimestre
	Infraestructura social (puentes y caja puente), rehabilitada y reconstruida en beneficio de la población a nivel Nacional PIOH	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	1	0	0%	
PROGRAMA DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS	Diseño de los sistemas de agua potable realizado. GRACIAS	DISEÑO	1	0	0%	La ejecución de proyectos se presenta hasta el IV trimestre. Se realizó el 3er desembolso por US \$ 134,514.35 (Lps 3,327,285.35).

Ejecución Presupuestaria por Programas 2024

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Monto Planificado III Trimestre	Devengado al III Trimestre	Devengado Acumulado	Credito Disponible	% Ejecución II Trimestre/ Planificado II Trimestre	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
Programa 1: Actividades Centrales	L 1.145.388.050,00	L 402.798.318,00	L 99.798.911,13	L 47.792.159,40	L 129.546.373,92	L 270.372.255,71	48%	32%
Programa 11: Infraestructura Rural	L 282.287.531,00	L 240.499.531,00	L 65.571.883,00	L 41.166.102,14	L 100.618.833,13	L 96.109.171,75	63%	42%
Programa 12: Infraestructura Escolar	L 441.187.553,00	L 407.292.287,00	L 120.786.906,00	L 42.677.990,03	L 91.176.572,74	L 174.577.400,97	35%	22%
Programa 14: Fomento al Desarrollo Local	L 112.155.540,00	L 148.342.463,00	L 44.891.248,00	L 13.082.049,05	L 37.677.141,00	L 110.462.259,48	29%	25%
Programa 16: Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras	L 298.426.045,00	L 380.926.045,00	L 97.525.042,00	L 113.682.214,80	L 270.021.460,76	L 90.050.766,08	117%	71%
Programa 17: Programa de Agua y Saneamiento	L 51.626.065,00	L 51.626.065,00	L 25.506.555,00	L 5.640.168,32	L 15.778.045,18	L 35.778.019,82	22%	31%
Programa 18: Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras	L -	L 10.706.892,00	L -	L 647.488,87	L 647.488,87	L 489.403,14	0%	6%
Programa 19: Gestión de Proyectos Artículo 338 DGP-2024	L -	L 180.659.079,00	L 54.197.724,00	L 59.682.015,32	L 109.064.760,62	L 55.940.523,41	110%	60%
TOTAL	L 2.331.070.784,00	L 1.822.850.680,00	L 508.278.269,13	L 324.370.187,93	L 754.530.676,22	L 833.779.800,36	64%	41%


Nota: Se considera el credito disponible ya que cuenta con los fondos reservados de cada proyecto, el saldo al III trimestre es de L. 1,068,319,998,78

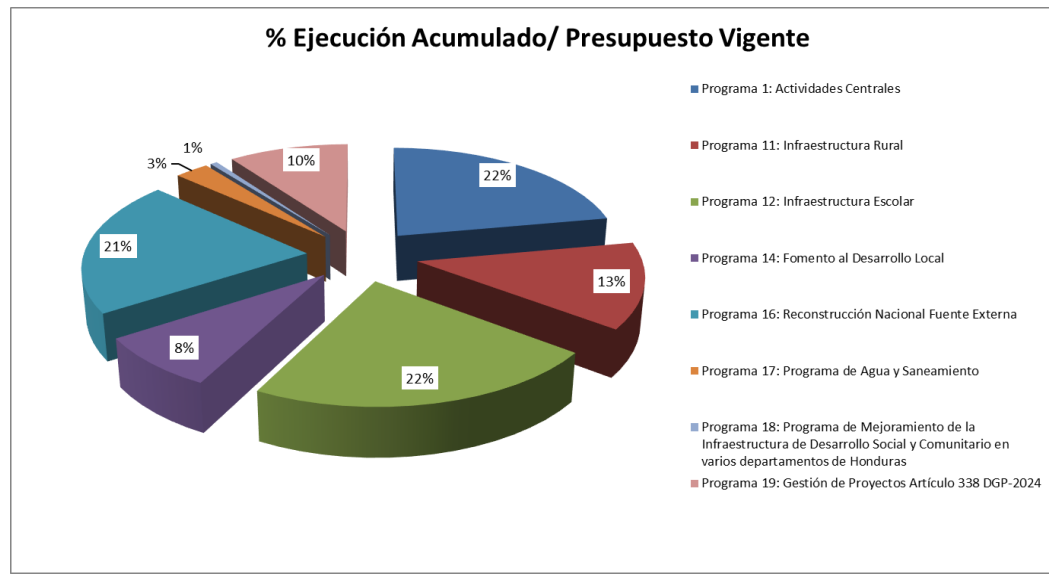

Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2024

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente 2024	Devengado al III Trimestre	Devengado Acumulado 2024	% Ejecución al III Trimestre / Presupuesto Vigente	% Acumulado al III Trimestre
Gasto Operativo/Gobierno	L. 1.145.388.050,00	L. 402.798.318,00	L. 47.792.159,40	L. 129.546.373,92	12%	32%
Obras Comunitarias Menores a Nivel Nacional FN	L. 225.577.195,00	L. 183.789.195,00	L. 31.726.201,86	L. 79.702.686,64	17%	43%
Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras PIOH	L. 56.710.336,00	L. 56.710.336,00	L. 9.439.900,28	L. 20.916.146,49	17%	37%
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE	L. 134.601.641,00	L. 100.706.375,00	L. 548.695,51	L. 4.970.130,16	1%	5%
Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras MIFE	L. 306.585.912,00	L. 306.585.912,00	L. 42.129.294,52	L. 86.206.442,58	14%	28%
Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS	L. 41.564.993,00	L. 58.564.993,00	L. 8.868.565,53	L. 27.588.817,18	15%	47%
Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes CONVIVIR	L. 70.590.547,00	L. 89.777.470,00	L. 4.213.483,52	L. 10.088.328,82	5%	11%
Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales ETA e IOTA PRE	L. 298.426.045,00	L. 380.926.045,00	L. 113.682.214,80	L. 270.021.460,76	30%	71%
Programa de Ampliación del sistema de Abastecimiento de agua Potable en la Ciudad de Gracias	L. 51.626.065,00	L. 51.626.065,00	L. 5.640.168,32	L. 15.778.045,18	11%	31%
Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras	L. -	L. 10.706.892,00	L. 647.488,87	L. 647.488,87	6%	6%
Gestión de Proyectos Artículo 338 DGP-2024	L. -	L. 180.659.079,00	L. 59.682.015,32	L. 109.064.760,62	33%	60%
TOTAL	L. 2.331.070.784,00	L. 1.822.850.680,00	L. 324.370.187,93	L. 754.530.681,22	18%	41%


Nota: Se considera el crédito disponible ya que cuenta con los fondos reservados de cada proyecto, el saldo al III trimestre es de L. 1,068,319,998,78

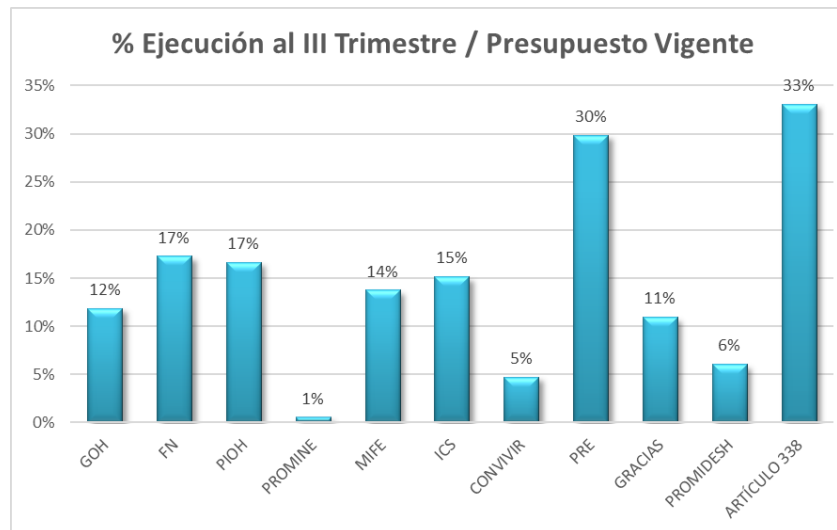

Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Tercer Trimestre 2024

Grupo	Aprobado	Presupuesto Vigente por Grupo	Devengado III Trimestre	Devengado Acumulado al III Trimestre	Disponibles	% Ejecución III Trimestre/ Presupuesto Vigente	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
SERVICIOS PERSONALES	L. 155.497.701,00	L. 156.681.052,00	L. 33.621.449,96	L. 97.786.585,31	L. 58.894.466,69	21%	62%
SERVICIOS NO PERSONALES	L. 211.277.814,00	L. 236.060.385,00	L. 38.435.117,17	L. 129.523.524,35	L. 85.472.622,88	16%	55%
MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 19.478.176,00	L. 17.296.561,00	L. 2.349.857,12	L. 4.742.168,71	L. 12.228.007,52	14%	27%
BIENES CAPITALIZABLES	L. 1.935.611.955,00	L. 1.403.607.544,00	L. 249.408.269,86	L. 521.019.129,78	L. 669.438.838,34	18%	37%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. 9.205.138,00	L. 9.205.138,00	L. 555.493,82	L. 1.459.273,07	L. 7.745.864,93	6%	16%
Total	L. 2.331.070.784,00	L. 1.822.850.680,00	L. 324.370.187,93	L. 754.530.681,22	L. 833.779.800,36	18%	41%

Nota: Se considera el credito disponible ya que cuenta con los fondos reservados de cada proyecto, el saldo al II trimestre es de L. 1,498,480,492,07

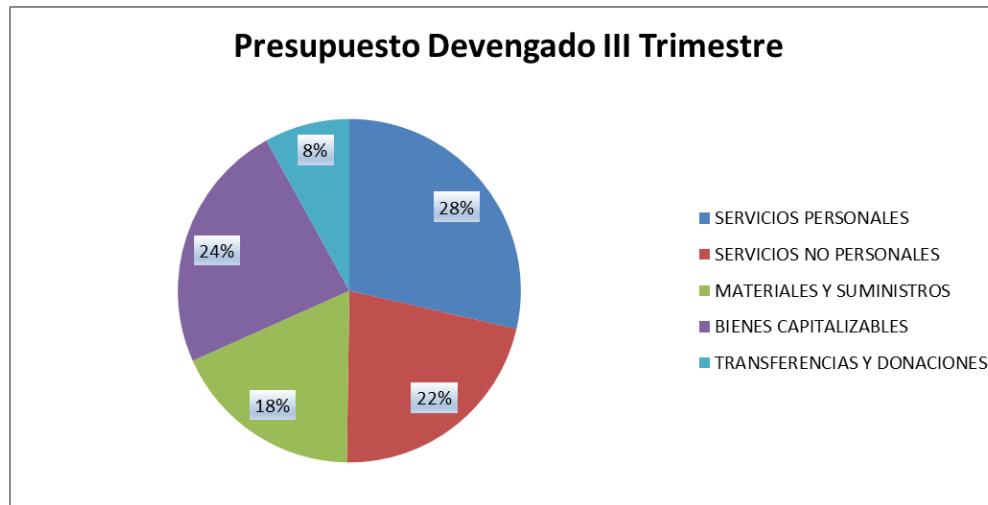

Ejecución por Objeto del Gasto Tercer Trimestre del 2024

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
1100	Sueldos basicos	78.102.779,00	78.102.779,00	50.076.866,05	28.025.912,95
1150	Decimotercer mes	6.515.110,00	6.515.110,00	3.10.970,70	6.204.139,30
11520	Decimocuarto mes	6.515.110,00	6.515.110,00	5.252.832,51	1.262.277,49
11600	Complementos	5.238.328,00	5.238.328,00	4.219.061,17	1.019.266,83
1170	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder	11.313.121,00	11.313.121,00	7.204.533,44	4.108.587,56
11750	Contribuciones para Seguro Social	2.401.600,00	2.401.600,00	2.320.923,57	80.676,43
1200	Sueldos basicos	37.800.475,00	37.800.475,00	25.378.657,94	12.421.817,06
1240	Decimotercer mes	3.150.040,00	3.150.040,00	288.346,00	2.861.694,00
12420	Decimocuarto mes	3.150.040,00	3.150.040,00	1.409.535,13	1.740.504,87
12550	Contribuciones para Seguro Social	1.311.098,00	1.311.098,00	915.476,64	395.621,36
16200	Compensaciones	0,00	1.183.351,00	409.382,16	773.968,84
2110	Suministro de Energia Electrica	300.000,00	400.000,00	269.247,75	130.752,25
21200	Agua	150.000,00	150.000,00	50.424,00	90.024,00
21430	Telefonia Celular	0,00	49.000,00	8.687,11	34.576,21
2200	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	6.000.000,00	10.788.000,00	6.670.873,64	4.117.126,36
2220	Alquiler de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	0,00	8.268,00	8.267,50	0,50
23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	1.574.000,00	2.034.000,00	549.323,35	1.214.383,45
23390	Mantenimiento y Reparacion de Otros Equipos	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
23600	Mantenimiento de Sistemas Informaticos	50.000,00	0,00	0,00	0,00
24200	Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	200.000,00	387.500,00	0,00	387.500,00
24300	Servicios Juridicos	940.000,00	662.000,00	243.000,00	419.000,00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoria	1.315.000,00	1.083.000,00	23.100,00	1.059.900,00
24500	Servicio de Capacitacion	2.251.215,00	2.226.215,00	849.000,00	1.377.215,00
24600	Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
2470	Servicios de Consultoria de Gestion Administrativa y	4.745.216,00	4.143.716,00	2.499.666,67	1.644.049,33
24720	Servicio de Consultoria de Monitoreo y Evaluacion	11.022.946,00	11.042.646,00	5.340.116,66	5.638.529,34
25100	Servicio de Transporte	25.000,00	25.000,00	3.225,00	15.400,00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2.000.000,00	2.133.000,00	2.133.000,00	0,00
25400	Primas y Gastos de Seguro	10.921.429,00	9.944.229,00	5.301.100,14	4.643.128,86
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
25600	Publicidad y Propaganda	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
25700	Servicio de Internet	21.000,00	105.000,00	3.272,14	101.727,86
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	400.000,00	278.900,00	53.816,69	213.348,95
26100	Pasajes Nacionales	240.000,00	273.000,00	108.099,04	164.900,96
2620	Vaticos Nacionales	8.072.168,00	7.674.872,00	5.486.002,95	193.1929,90
2720	Tasas	625.000,00	625.000,00	17.1926,40	453.073,60
29100	Ceremonial y Protocolo	207.142,00	259.142,00	253.037,80	6.104,20
3110	Productos Alimenticios y Bebidas	134.245,00	148.477,00	103.683,00	44.794,00
3230	Prendas de Vestir	130.000,00	130.000,00	29.808,00	100.192,00
33100	Productos de Papel y Carton	520.000,00	257.907,00	172.394,96	63.087,04
33300	Productos de Artes Graficas	95.000,00	95.000,00	26.785,80	68.214,20
33500	Libros, revistas y Periodicos	240.000,00	240.000,00	19.225,00	220.775,00
33700	Especies Timbradas y Valores	30.000,00	30.000,00	1.100,00	28.900,00
34400	Llantas y Camaras de Aire	999.613,00	920.000,00	401.773,20	518.226,80
35100	Productos Quimicos	0,00	25.000,00	7.935,00	17.065,00
3560	Gasolina	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
35620	Diesel	2.125.000,00	1.994.358,00	1.279.851,38	709.511,60
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	700.000,00	400.852,00	852,00	293.894,21
35800	Productos de Material Plastico	7.000,00	41.500,00	0,00	26.500,00
36400	Herramientas Menores	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50.000,00	50.000,00	44.892,73	5.107,27
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	565.000,00	465.000,00	118.541,24	281.698,23
39300	Utiles y Materiales Electricos	50.000,00	50.000,00	2.822,10	47.177,90
39600	Repuestos y Accesorios	1.747.937,00	1.709.178,00	848.174,24	831.003,76
42100	Muebles Varios de Oficina	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
42120	Equipos Varios de Oficina	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
42140	Electrodomesticos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
42280	Maquinaria y Equipo de Mineria y Aparatos Para Exploracion Geofisica	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
4230	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0,00	8.000.000,00	7.974.999,99	35.000,01
42350	Equipo de Transporte Auxiliar	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
42430	Equipo de Laboratorio no Medico	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
4250	Equipo de Comunicacion	0,00	547.000,00	149.682,85	397.317,15
42600	Equipos para Computacion	95.534,00	95.534,00	0,00	95.534,00
4270	Muebles y Equipos Educativos	20.000.000,00	5.212.000,00	0,00	5.212.000,00
45100	Aplicaciones Informaticas	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
47100	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80.000.000,00	104.595.634,00	18.997.635,81	76.935.946,91
47200	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	451.522.944,00	416.927.310,00	171.568.598,72	194.025.612,31
Total		765.707.090,00	755.707.090,00	329.576.628,17	426.130.461,83

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
26210	Viaticos Nacionales	0,00	65.520,00	0,00	65.520,00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0,00	750.000,00	647.488,87	102.511,13
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0,00	9.600.000,00	0,00	30.000,01
42600	Equipos de Computacion	0,00	356.892,00	0,00	356.892,00
21110	Suministro de Energia Electrica	440.000,00	440.000,00	210.784,92	229.215,08
21420	Telefonia Fija	30.000,00	0,00	0,00	0,00
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	3.600.000,00	3.333.188,00	1914.596,78	1.199.062,35
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	2.952.569,00	1.333.822,00	843.134,19	300.000,83
23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales	576.000,00	576.000,00	299.799,57	276.200,43
23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	600.000,00	375.000,00	220.346,34	154.653,66
23360	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles	245.001,00	369.801,00	28.807,50	340.993,50
23390	Mantenimiento y Reparacion de Otros Equipos	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigacion	600.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
24200	Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	44.205.630,00	41.770.187,00	18.138.904,61	12.279.518,37
24300	Servicios Juridicos	0,00	1.000.000,00	733.877,10	266.122,90
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoria	5.749.098,00	4.318.613,00	3.917.906,34	400.706,66
24500	Servicios de Capacitacion	12.985.000,00	12.985.000,00	1.119.605,53	11.865.394,47
24600	Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados	356.000,00	0,00	0,00	0,00
24710	Servicios de Consultoria de Gestion Administrativa y Financiera	41.048.500,00	37.140.531,00	20.929.404,19	9.801.159,91
24720	Servicios de Consultoria de Monitoreo y Evaluacion	3.770.000,00	4.540.023,00	1.483.244,71	2.574.928,49
25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	785.000,00	1.045.000,00	532.645,96	465.525,86
25400	Primas y Gastos de Seguro	550.000,00	3.195.000,00	30.919.000,00	103.1000,00
25700	Servicio de Internet	490.000,00	490.000,00	212.773,74	237.446,76
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	235.000,00	235.000,00	25.274,85	209.725,15
26110	Pasajes Nacionales	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
26210	Viaticos Nacionales	6.203.998,00	3.658.210,00	1.603.058,40	2.000.948,47
27210	Tasas	250.000,00	435.000,00	6.068,56	428.931,44
29100	Ceremonial y Protocolo	200.000,00	405.000,00	57.270,00	347.730,00
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	1.238.875,00	828.875,00	92.444,30	736.430,70
32310	Prendas de Vestir	950.000,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
33100	Productos de Papel y Carton	615.000,00	799.062,00	238.518,28	560.543,72
33300	Productos de Artes Graficas	200.000,00	206.974,00	0,00	206.974,00
34400	Llantas y Camaras de Aire	520.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00
35210	Productos Farmaceuticos y Medicinales Varios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
35620	Diesel	3.185.066,00	1.490.854,00	398.425,47	1.010.224,10
36400	Herramientas Menores	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	350.000,00	69.000,00	15.436,75	53.563,25
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	510.000,00	259.752,00	74.317,58	185.434,42
39300	Utiles y Materiales Electricos	0,00	5.636,00	0,00	5.636,00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
39600	Repuestos y Accesorios	1.507.056,00	1.542.752,00	55.507,93	1.487.244,07
42110	Muebles Varios de Oficina	5.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
42120	Equipos Varios de Oficina	5.100.000,00	1.190.000,00	34.944,05	1.155.055,95
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	5.300.000,00	15.875.000,00	0,00	15.875.000,00
42600	Equipos de Computacion	10.250.000,00	9.163.605,00	5.868.791,92	3.294.813,08
45100	Aplicaciones Informaticas	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	27.489.000,00	27.489.000,00	1.674.031,25	25.814.968,75
47120	Supervision de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	23.286.494,00	25.286.494,00	11.198.384,93	14.088.109,07
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	10.647.883.824,00	549.697.559,00	248.717.372,58	174.606.079,14
47220	Supervision de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	65.518.054,00	63.518.054,00	27.209.086,49	19.098.649,15
54110	Ayuda Social a Personas (Transferencia de Capital)	9.205.138,00	9.205.138,00	1.459.273,07	7.745.864,93
	Total	1.351.560.303,00	868.048.542,00	380.880.526,76	315.136.777,80

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	192.000,00	192.000,00	191999,76	0,24
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de traccion y Elevacion	554.752,00	554.752,00	346.910,74	207.841,26
23600	Mantenimiento de sistemas Informaticos	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
24200	Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoria	484.000,00	484.000,00	0,00	484.000,00
24500	Servicios de Capacitacion	1.419.012,00	1.419.012,00	18.750,00	1.400.262,00
24710	Servicios de consultoria de gestion administrativa y financiera	14.087.221,00	14.087.221,00	10.043.434,35	3.143.786,65
24720	Servicios de consultoria de monitoreo y evaluacion	11.898.000,00	11.898.000,00	2.569.132,29	8.583.867,71
25100	Servicio de transporte	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
25300	Servicio de imprenta, Publicaciones y Reproducciones	431.759,00	431.759,00	50.875,00	380.884,00
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26110	Pasajes Nacionales	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
26210	Viaticos Nacionales	3.096.000,00	2.766.000,00	1.896.000,00	870.000,00
29100	Ceremonial y Protocolo	102.158,00	102.158,00	37.143,21	65.014,79
31110	Productos alimenticios y bebidas	90.000,00	90.000,00	1.639,09	87.466,91
32310	Prendas de vestir	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
33100	Productos de papel y carton	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
34400	Llantas y Camaras de Aire	695.000,00	695.000,00	0,00	695.000,00
35610	Gasolina	868.384,00	868.384,00	699.689,66	168.694,34
35620	Diesel	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
39200	Utiles de escritorio, Oficina y Enseñanza	25.000,00	25.000,00	18.360,00	6.640,00
39600	Repuestos y accesorios	810.000,00	810.000,00	89.991,00	720.009,00
42110	Muebles Varios de Oficina	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
42600	Equipo para Computacion	1.603.200,00	5.048.672,00	22.637,25	5.026.034,75
42710	Muebles y Equipos Educacionales	0,00	5.234.426,00	0,00	5.234.426,00
42900	Equipo para Electrificacion (Medidores, Transformadores y Postes)	750.000,00	0,00	0,00	0,00
45100	Aplicaciones Informaticas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	104.349.347,00	65.623.350,00	1.268.802,08	64.354.547,92
47120	Supervision de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	6.626.355,00	20.994.111,00	0,00	20.994.111,00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	63.537.203,00	63.537.203,00	37.203.041,14	26.334.161,86
Total		2.133.803.391,00	1.999.095.048,00	44.073.526,29	155.021.521,71
Total General		2.331.070.784,00	1.822.850.680,00	754.530.681,22	833.779.800,36

Resumen de Cuadro por Sector 2024

SECTOR	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
AGUA Y SANEAMIENTO	0	5	30.950.218,99	215	15.616
ELECTRIFICACION	0	0	-	7	32.500
INFRAESTRUCTURA VIAL	0	57	125.772.186,99	2.365	1.979.308
EMPRENDIMIENTO Y VALORES	0	1	2.093.243,93	0	0
PREVENCION SITUACIONAL/CONVIVENCIA	3	17	26.416.505,87	603	1.777.884
EDUCACION	31	54	77.377.914,53	1.987	81.444
TOTAL	34	134	262.610.070,31	5.177	3.886.752

Resumen de Cuadro por Departamento 2024

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
ATLANTIDA	0	9	16.793.917,28	217	475.501
CHOLUTECA	0	5	7.969.906,50	200	344.753
COMAYAGUA	1	10	15.983.253,21	461	161.977
COPAN	3	5	5.327.623,44	208	57.351
CORTES	14	17	63.943.374,28	725	963.454
COLON	0	3	1.113.956,52	36	55.064
EL PARAISO	0	4	9.043.107,42	240	282.758
FRANCISCO MORAZAN	1	14	26.820.526,77	711	454.257
GRACIAS A DIOS*	0	1	-	25	369
INTIBUCÁ	0	7	2.141.026,55	31	8.653
LA PAZ	0	6	10.039.453,38	203	133.537
LEMPIRA	0	5	13.727.743,96	225	15.018
OCOTEPEQUE	0	1	-	21	262
OLANCHO	11	26	49.955.331,17	1.023	628.321
SANTA BARBARA	4	16	30.016.539,82	603	231.678
YORO	0	2	3.763.365,15	145	52.092
VALLE	0	3	5.970.944,86	103	21.707
TOTAL	34	134	262.610.070,31	5.177	3.886.752

Nota: El monto total refleja la inversión realizado por los proyectos en Construcción

***El Proyecto en Gracias a Dios se encuentra en resolución en Secretaría General, Dirección Legal y en Control y Seguimiento FHIS**

Resumen de Cuadro por Otras Inversiones 2024

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	36.360.857,46
GASTO OPERATIVO DE PROGRAMAS	14.637.486,12
ACTIVIDADES CENTRALES FHIS	130.193.862,79
TOTAL	181.192.206,37

PROCESO DE COMPRAS MENORES 2024 III TRIMESTRE

No.	PROCESO	UNIDAD SOLICITANTE	NOMBRE DE LA ADQUISICION	EMPRESA GANADORA	MONTO DE ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	PRESUPUESTO
3	CMA-080-FHIS-2024	Transporte	Adquisición de Pintura de serigrafía de logos banderas institucionales y registro vehicular de 10 vehículos NISSAN NP 300	Autos V & R	L 47.150,00	13386	FHIS
4	CMA-081-FHIS-2024	Comité de Probidad y Ética	Adquisición de Buzón de Sugerencias	Distribuidora Universal	L 2.691,00	13381	FHIS
5	CMA-082-FHIS-2024	Dirección de Proyectos	Adquisición Equipo Técnico para Proyectos	En evaluación de ofertas	L -	0	FHIS
6	CMA-083-FHIS-2024	Dirección de Métodos y Sistemas	Adquisición de Cámaras NVR, Cables UTP, Conectores RJ45	Techno Office Supplies	L 149.682,85	13399	FHIS
8	CMA-086-FHIS-2024	UEP-PRE	Adquisición de Servicios de Mantenimiento de vehículos Chevrolet Colorado por garantía: Tipo: PICK-UP, Marca: CHEVROLET, Modelo: Colorado, Color: Plateado Metálico, Placa: GHB0110 Reg.161, 30,000KM recorrido	Grupo Q de Honduras	L 8.787,41	13388	FHIS
9	CMA-087-FHIS-2024	Transporte	Adquisición de servicio de mantenimiento de vehículos 65,000KM reg. 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 por garantía	Lubricentro M.R Clean	L 59.800,00	13383	FHIS
10	CMA-088-FHIS-2024	Transporte	Adquisición de Elaboración de Bitácoras para vehículos	Litografía Shalom	L 15.180,00	13402	FHIS
11	CMA-089-FHIS-2024	Servicios Generales	Adquisición de recargo de extintores Tipo ABC Y CO2	Tecnofuego S. de R.L.	L 7.935,00	13403	FHIS
12	CMA-090-FHIS-2024	Secretaría General	Adquisición de Leyes y Manuales (Insumos Jurídicos)	OIM Editorial S.A.	L 19.225,00	13404	FHIS
13	CMA-091-FHIS-2024	DAF	Adquisición de Servicio de Internet en Plantel Germania	Cable Color	L 130.548,00	13409	FHIS
14	CMA-092-A-FHIS-2024	Proveeduría	Adquisición de Tintas y Toner, mediante Catalogo Electrónico	Acosa S.A de C.V.	L 26.488,04	22-1-28-0091-2024 / 13389	FHIS

15	CMA-092-B-FHIS-2024	Proveeduría	Adquisición de Tintas y Toner, mediante Catalogo Electrónico	Cash Business	L 73.529,64	22-1-28-0092-2024 / 13390	FHIS
16	CMA-092-C-FHIS-2024	Proveeduría	Adquisición de Tintas y Toner, mediante Catalogo Electrónico	Jetstereo S.A de C. V	L 15.121,21	22-1-28-0093-2024 / 13391	FHIS
22	CMA-094-FHIS-2024	Transporte	Adquisición de servicio de mantenimiento 50,000km vehículo Foton con registro N°165 por garantía	Lubricentro M.R Clean	L 6.486,00	13392	FHIS
23	CMA-095-FHIS-2024	Control y Seguimiento	Adquisición de servicio de elaboración de talonarios	Rilmac Impresores S de R.L. de C.V.	L 10.225,80	13406	FHIS
24	CMA-096-FHIS-2024	Secretaría General	Adquisición de cajas de carton, mediante Catalogo Electrónico	Papelería Honduras S de R.L.	L 2.242,50	22-1-28-0100-2024 / 13398	FHIS
25	CMA-097-FHIS-2024	Dim	Adquisición de llantas para vehículo	Chorotega	L 55.800,02	13418	FHIS
28	CMA-100-FHIS-2024	Dirección de Proyectos	Adquisición de Boletos Aéreos	Agencia de Viajes Aguila Tours S de R.L. de C.V.	L 23.861,44	13408	FHIS
30	CMA-102-A-FHIS-2024	Proveeduría	Adquisición de Toner	Jetstereo S.A de C. V	L 140.829,00	13414	FHIS
31	CMA-102-B-FHIS-2024	Proveeduría	Adquisición de Toner	Centromatic S.A.	L 61.801,00	13420	FHIS
32	CMA-102-C-FHIS-2024	Proveeduría	Adquisición de Toner	Distribuidora Universal	L 15.732,00	13421	FHIS
33	CMA-103-A-FHIS-2024	Proveeduría	Adquisición de Papelería y Útiles de Oficina, mediante Catalogo Electronico	Wilman Danilo Morales Zelaya/ Distribuciones Valencia	L 72.578,78	13415	FHIS
34	CMA-103-B-FHIS-2025	Proveeduría	Adquisición de Papelería y Útiles de Oficina, mediante Catalogo Electronico	Disproa	L 32.740,50	13416	FHIS
35	CMA-103-C-FHIS-2026	Proveeduría	Adquisición de Papelería y Útiles de Oficina, mediante Catalogo Electronico	Papelería Honduras S de R.L.	L 23.310,50	13417	FHIS
36	CMA-105-FHIS-2026	UEP-PRE	Adquisición de servicio de mantenimiento por garantía de Chevrolet con Reg. N°155	Grupo Q de Honduras	L 4.138,65	13410	FHIS
37	CMA-106-FHIS-2026	UEP-PRE	Servicio de mantenimiento por garantía para vehículos Chevrolet Reg N°151 y 152	Grupo Q de Honduras	L 20.263,90	13419	FHIS

38	CMA-107-A-FHIS-2026	Transporte	Adquisicion de Aceites	Inversiones Figueroa	L 10.149,79	13439	FHIS
39	CMA-107-B-FHIS-2027	Transporte	Adquisicion de Aceites	Autoservicios San Ignacio	L 90.896,00	13440	FHIS
40	CMA-107-C-FHIS-2028	Transporte	Adquisicion de Aceites	Autorepuestos del Japon	L 5.060,00	13441	FHIS
41	CMA-108-FHIS-2026	UEP-PRE	Adquisición de servicio de mantenimiento de vehiculos Chevrolet colorado por garantia Reg. N° 161	Grupo Q de Honduras	L 15.384,16	13422	FHIS
42	CMA-109-FHIS-2026	UEP-PRE	Adquisicion de servicio de mantenimiento por garantia de vehiculo Chevrolet Reg. N°156 y 154	Grupo Q de Honduras	L 29.579,46	13423	FHIS
43	CMA-112-FHIS-2026	Dim	Adquisición de insumos y materiales de oficina para el desarrollo de capacitaciones	En evaluacion de ofertas	L -	0	FHIS
44	CMA-113-FHIS-2026	Transporte	Adquisición de servicio de mantenimiento de vehiculo por garantia Reg N°168	Lubricentro M.R Clean	L 36.041,00	13424	FHIS
45	CMA-114-FHIS-2026	Transporte	Adquisición de servicio de mantenimiento de vehiculo por garantia Reg N°173	Grupo Q de Honduras	L 4.559,19	13425	FHIS
46	CMA-115-FHIS-2026	Convivir	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparacion (preventivo y correctivo) para los 06 vehiculos del proyecto	En evaluacion de ofertas	L -	0	FHIS
47	CMA-116-A-FHIS-2026	Convivir	Adquisicion de Llantas	Rendillantas	L 63.894,00	13428	FHIS
48	CMA-116-B-FHIS-2026	Convivir	Adquisicion de Llantas	Llanticentro Ferco	L 7.130,00	13427	FHIS
49	CMA-117-FHIS-2026	Transporte	Adquisición de servicio de mantenimiento por garantia de vehiculo Reg. N° 176	Grupo Q de Honduras	L 4.559,19	13426	FHIS
50	CMA-118-FHIS-2026	Transporte	Adquisición de servicio de mantenimiento por garantia de vehiculo Reg. N° 177	Grupo Q de Honduras	L 4.507,28	13429	FHIS
51	CMA-119-FHIS-2026	UEP-PRE	Adquisicion de servicio de alimentación para atender mision de BM	ADJUDICADO	L 64.469,00	13448	FHIS
52	CMA-120-FHIS-2026	Transporte	Adquisición de servicio de mantenimiento de vehiculo Foton 55,000kms por garantia reg. N°165	Lubricentro M.R Clean	L 10.971,00	13430	FHIS

53	CMA-121-FHIS-2026	Transporte	Adquisición de mantenimiento preventivo por garantía del vehículo Nissan Frontier Reg N°183	Grupo Q de Honduras	L 4.507,61	13431	FHIS
54	CMA-122-FHIS-2026	Transporte	Adquisición de servicio de mantenimiento por garantía de vehículo Reg. N°174	Grupo Q de Honduras	L 4.507,43	13432	FHIS
55	CMA-124-FHIS-2026	Transporte	Adquisición de servicio de mantenimiento preventivo por garantía vehículo Nissan Frontier NP300 Reg. N° 178	Grupo Q de Honduras	L 4.507,78	13434	FHIS
56	CMA-125-FHIS-2026	Transporte	Adquisición de servicio de mantenimiento preventivo por garantía vehículo Nissan Frontier NP300 Reg. N° 175	Grupo Q de Honduras	L 4.507,43	13435	FHIS
57	CMA-126-FHIS-2026	Transporte	Adquisición de servicio de mantenimiento preventivo por garantía vehículo Nissan Frontier NP300 Reg. N° 180	Grupo Q de Honduras	L 4.559,19	13436	FHIS
58	CMA-127-FHIS-2026	Transporte	Adquisición de servicio de mantenimiento preventivo por garantía vehículo Nissan Frontier NP300 Reg. N° 182	Grupo Q de Honduras	L 4.507,43	13433	FHIS
					L 1.377.134,68		

CARTERA BANCO MUNDIAL



✓ **Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE 6822-HN)**



i. Antecedentes

Entre los días 1 y 16 de noviembre de 2020, dos tormentas tropicales consecutivas, Eta e Iota, devastaron a Honduras con una magnitud de impacto económico y social comparable a la del huracán Mitch de 1998. En respuesta a la emergencia causada, el Gobierno de Honduras (GdH) solicitó al Banco Mundial (BM) un financiamiento de US\$150 millones para un Proyecto de Recuperación de Emergencia.

El 8 de marzo de 2021 el Gobierno de Honduras suscribió con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) el Convenio de Crédito No. 6822-HN, por un monto de US\$150.000.000.00, aprobado mediante Decreto Legislativo No.10-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 5 de mayo de 2021, fondos que financiaran el Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE), habiéndose cumplido con las condiciones de efectividad el 4 de junio de 2021 y efectuándose el Primer Desembolso el 28 de junio de 2021 por un monto de USD\$ 4.36 Millones.

El Proyecto se enfoca en la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública en salud, educación, agua y saneamiento, vial, comunitaria y vivienda en las zonas geográficas del país afectadas por los ciclones tropicales Eta e Iota.

La implementación, coordinación, planificación y seguimiento general del Proyecto se llevará de manera centralizada en la SEDECOAS, a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), quien contará con personal especializado en diferentes áreas que garanticen el cumplimiento de los estándares del BM.

ii. **Objetivo General**

El PRE tiene por objetivo atender las necesidades identificadas como prioritarias para reactivar la economía y apoyar las más urgentes necesidades de la población afectada por los fenómenos naturales ETA e IOTA, como respuesta de emergencia y recuperación de Honduras, y, en esta perspectiva, fortalecer la capacidad institucional del Estado para gestionar una ejecución eficaz, eficiente y transparente.

iii. **Objetivos Específicos**

- Realizar operaciones de asistencia y respuesta de emergencia, salud y seguridad pública.
- Realizar la rehabilitación y construcción resiliente de la infraestructura pública y Comunitaria y Restablecimiento de los servicios públicos.
- Mejorar la capacidad instalada del Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.

iv. **Descripción**

Componente 1: Operaciones de asistencia y respuesta de emergencia, salud y seguridad pública (US\$ 17.3 MILLONES)

Bajo este componente se financian actividades y acciones de respuesta y seguridad pública como resultado de los daños causados por los ciclones Eta e Iota. Son elegibles actividades de respuesta inmediata realizadas por el Gobierno de Honduras previo a la fecha de efectividad del Crédito.

Componente 2: Rehabilitación y reconstrucción resiliente de la infraestructura pública y comunitaria y restablecimiento de los servicios públicos (US\$121.7 MILLONES)

Este componente se financia la preparación técnica, la implementación de reparaciones urgentes, rehabilitación y reconstrucción resiliente de la infraestructura pública y comunitaria de alta prioridad, incluido el costo de la reubicación temporal y la inspección o actividades de diseño necesarias para instalaciones de alta prioridad que requieran una nueva construcción.

Componente 3: Apoyo institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción (US\$11.0 MILLONES)

El componente se financia la gestión de Proyecto (financiero y fiduciario), la capacidad técnica e institucional, auditorías técnicas, financieras y sociales, monitoreo y seguimiento, cumplimiento social y ambiental, mecanismo de atención y resolución de quejas y denuncias, preparaciones informes, evaluación de medio términos, estudios de línea base.

v. Focalización

Para determinar las zonas y sectores de intervención, el Gobierno de Honduras con la asistencia técnica de organizaciones y agencias internacionales, ha elaborado el documento borrador denominado “Evaluación de daños y pérdidas causadas por las tormentas tropicales Eta e Iota”¹

También se cuenta con la base de datos del estudio levantado por la SEDECOAS denominado “Plataforma de información de incidencias de la infraestructura dañada por las tormentas Eta e Iota”, que consolida los datos de las tres fuentes del Gobierno. De igual manera, se cuenta con listas de infraestructura que fue levantada por las instituciones sectoriales en las oficinas de COPECO Tegucigalpa, en un centro de acopio instalado luego de los eventos de desastre de las tormentas tropicales Eta e Iota.

Las acciones de respuesta de socorro y atención a personas están siendo financiadas bajo el Componente 1 y, las obras de reconstrucción y rehabilitación, elegibles y priorizadas, serán financiadas bajo el Componente 2, estas se ejecutarán en los municipios y sectores afectados por las tormentas tropicales Eta e Iota.

vi. Sector de Intervención

Los sectores por intervenir son:

 *Infraestructura de Salud:* Rehabilitación, reconstrucción, construcción de obras de mitigación de

¹ Dalla_Honduras, 2020

centros de salud, UAPS, CIS, Clínicos y hospitales.

- *Infraestructura Vial:* Habilitación, reposición de carreteras primarias, secundarias, carreteras terciarias (caminos vecinales), habilitación, reposición y reparación de puentes, puentes de doble vía cajas puentes, vados en caminos, construcción de obras de mitigación para proteger estructuras viales, rehabilitación de calles (pavimentadas y no pavimentadas), rehabilitación de caminos rurales de terracería, mantenimiento en los cauces de los ríos (incluye limpieza, dragado, etc.).
- *Infraestructura Escolar:* Rehabilitación, reparación y reposición de Centros de Educación de manera integral incluyendo obras ambientales y de mitigación.
- *Infraestructura Agua y Saneamiento:* Reparación o rehabilitación en estructuras de sistemas de agua potables (obras tomas, desarenadores, pases aéreos, tanques de almacenamiento, cajas de registro, rompe cargas, cajas distribuidoras de caudal, etc.), plantas de tratamiento y sistemas de aguas residuales, construcción de obras de mitigación para la protección de estructuras de los sistemas de agua potable y residuales, equipamiento de agua potable y residuales.
- *Infraestructura Comunitaria:* Rehabilitación de centros comunitarios y servicios públicos básicos (estación de bomberos, estaciones policiales, albergues, alcaldías, etc.), reposición de centros comunitarios, equipamiento para rehabilitación de centros comunitarios y servicios públicos básicos.

vii. Duración del Proyecto:

El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de 5 años y medio incluyendo actividades de gestión, socialización, adquisiciones, etc.

viii. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	175.537.263,00	1.116.987,87	1%
2022	259.608.231,00	53.027.150,75	20%
2023	432.092.852,00	130.271.743,46	30%
2024	380.926.045,00	270.021.460,76	71%

ix. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
AGUA Y SANEAMIENTO	0	5	33.400.899,72	333	119.570
INFRAESTRUCTURA VIAL	3	2	14.408.624,50	157	20.002
EDUCACION	11	17	43.332.836,36	801	7.037
SALUD	0	1	3.539.336,16	44	3.116
TOTAL	14	25	94.681.696,74	1.335	149.725

x. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios directos 2024
ATLANTIDA	-	1	1.678.929,13	37	248
CHOLUTECA	-	1	7.682.968,97	102	1.491
COMAYAGUA	2	4	6.874.163,13	196	73.141
COPAN	-	2	9.478.286,81	85	12.915
CORTES	2	8	15.781.470,84	372	3.817
EL PARAISO	1	-	448.456,00	17	29
FRANCISCO MORAZAN	1	3	10.992.033,54	114	1.405
LA PAZ	3	0	856.486,80	28	82
LEMPIRA	1	1	5.244.598,00	35	133
OCOTEPEQUE	1	0	321.802,70	14	32
SANTA BARBARA	3	0	4.930.337,62	72	7.087
YORO		5	30.392.163,20	263	49.345
TOTAL	14	25	94.681.696,74	1335	149.725

xi. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	27.830.893,10
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	2.907.656,12
SEGURO SOBERANO -CCRIF	30.919.000,00
TOTAL	61.657.549,22

xii. Situación presupuestaria

El monto formulado original para el año 2024 asciende a L 298,426,045.00, sin embargo, después de actualizar los montos comprometidos y ejecutados al cierre del 2023, se presentó para consideración de la SEFIN, un nuevo monto presupuestario por L 349,935,045.00 el cual no fue aceptado.

En mayo, se le ha incorporado al presupuesto L 32,500,000.00 para pagos del seguro soberano. En junio se incorporaron L 50,000,000.00 para pago de estimaciones de subproyectos de inversión. El presupuesto vigente ahora asciende a L 380,926,045.00 ejecutándose al cierre del tercer trimestre el monto de L 270,021,460.76 equivalente al 71 %.

Así mismo, a partir de las revisiones y reprogramaciones de actividades en el Plan Operativo Anual (POA) y en el Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC), se solicitaron modificaciones presupuestarias internas entre actividades y objetos del gasto, sin modificarse el presupuesto global vigente.

El 72% del presupuesto está concentrado en el Componente 2 para ejecución de obras de las cuales a la fecha ascienden a 67 subproyectos. Las primeras 25 obras obedecen a subproyectos de reposición/reparación de centros educativos los cuales iniciaron su ejecución en el IV Trimestre del año 2022. En el III trimestre del 2023 se han iniciado 3 obras de agua y saneamiento y 17 obras de centros educativos. En el IV trimestre del 2023 se han iniciado 4 subproyectos viales y 8 nuevos subproyectos en centros educativos. En el primer trimestre de 2024 iniciaron 2 subproyectos, uno de infraestructura vial y otro de agua potable. En el II trimestre del 2024 se han iniciado 3 obras en centros educativos, 1 sistema de agua potable y 1 reposición de infraestructura de salud. Las formulaciones de nuevas intervenciones se han continuado en todos los sectores.

El monto del financiamiento del Crédito es de US\$ 150,000.00, de los cuales al 30 de septiembre de 2024 se tiene una ejecución financiera acumulada que asciende a L 1,048,394.290 equivalentes a USD 42,787,952 que representa el 28.5% del monto de Convenio; mostrándose a la fecha una disponibilidad por componentes de inversión, así:

Componentes	(a) Asignación Convenio Crédito		(b) = (c + d) Total Comprometido		(c) Ejecutado acumulado		(d) Comprometido por ejecutar **		(e) = (a - b) Disponible
	US\$	* HNL	US\$	HNL	US\$	HNL	US\$	HNL	US\$
1) Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública	17,300,000	420,390,000	16,818,559	407,708,157	16,818,559	407,708,157	-	-	481,441
<i>Categoría: Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, y costos operativos bajo la Parte 1 del Proyecto.</i>	17,300,000	420,390,000	16,818,559	407,708,157	16,818,559	407,708,157	-	-	481,441
2) Rehabilitación y Construcción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos	119,200,000	2,896,560,000	42,879,409	1,057,234,452	19,721,300	486,616,324	23,158,109	570,618,127	76,320,591
<i>Categoría: Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 2 del Proyecto</i>	119,200,000	2,896,560,000	42,879,409	1,057,234,452	19,721,300	486,616,324	23,158,109	570,618,127	76,320,591
3) Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción	11,000,000	267,300,000	4,663,426	114,873,874	3,998,093	98,480,008	665,333	16,393,866	6,336,574
<i>Categoría: Bienes, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 3 del Proyecto</i>	11,000,000	267,300,000	4,663,426	114,873,874	3,998,093	98,480,008	665,333	16,393,866	6,336,574
4) Medidas de Protección Financiera de Emergencia	2,500,000	60,750,000	2,250,000	55,589,800	2,250,000	55,589,800	-	-	250,000
<i>Categoría: Primas anuales en virtud de la Parte 4 del Proyecto</i>	2,500,000	60,750,000	2,250,000	55,589,800	2,250,000	55,589,800	-	-	250,000
Total	\$ 150,000,000	HNL 3,645,000,000	\$ 66,611,394	HNL 1,635,406,283	\$ 42,787,952	HNL 1,048,394,290	\$ 23,823,442	HNL 587,011,994	\$ 83,388,606

* Se aplica la tasa de L 24.3 establecida en el Documento del Proyecto (PAD) y en el presupuesto global en los Sistemas: SNIPH, UEPEX y Sistema Financiero del FHIS.

** Valores comprometidos con contrato

Para fines de control y seguimiento al costo administrativo (10%) del proyecto, el componente 3. se subdividió en el Sistema UEPEX/SIAFI en dos componentes/actividad presupuestaria (3. y 4.) con el nombre “Gestión y Administración del Proyecto”.

xiii. Desembolsos

Al 30 de septiembre del 2024 se ha desembolsado la cantidad de US\$ 45,451,089.38 equivalente a L 1,109,671,274.00; representa el 30.3% del total del Crédito. Del total desembolsado USD\$ 16.8 millones equivalente a L 407,7 millones, corresponde a reembolso bajo el Componente 1 mediante pago directo a

la SEFIN por actividades de respuesta inmediata realizadas por la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS), así mismo, a petición de la SEFIN, se efectuó desembolso mediante pago directo por anticipo/prima de la Póliza de Seguro por exceso de lluvia (XSR) a The Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF-SPC), por US\$ 1 millón.

Desembolso	Dólares	Lempiras
Anticipo Cuenta Designada del Proyecto (Cta. 11101-20-000949-1 BCH) 2	26,382,530.00	646,373,316.58
Reembolso bajo Componente 1, con Pago Directo a la SEFIN. (Cta. 11101-20-000952-1)	16,818,559.38	407,708,157.42
Pago Directo – CCRIF	2,250,000.00	55,589,800.00
Total	45,451,089.38	1,109,671,274.00

xiv. MODIFICACIONES AL CONVENIO

Enmienda No. 1

Mediante Oficio No. SE-SEDECOAS-FHIS-620/2021 se solicita la primera reasignación de fondos entre Categorías de Inversión respaldada en Dictámenes Técnicos Favorables No. 057-2021 (septiembre 2021) y 068-2021 (noviembre 2021) emitidos por la SEFIN y aprobada por el Banco Mundial el 16 de diciembre de 2021.

La reasignación se hace entre el Componente 1. y 2. para cubrir el sobregiro de USD\$ 7,300,000 en el monto original asignado bajo la Categoría 1. del Componente 1.

Enmienda No. 2

En fecha 3 de agosto de 2023 la Secretaría de Finanzas solicita al Banco Mundial aprobación de la segunda enmienda al Convenio de Crédito, para incorporar el financiamiento del pago de la Prima del Fondo de Seguro contra Riesgos Catastróficos en el Caribe (CCRIF) de Honduras. La enmienda al Convenio de Financiamiento fue firmada el 31 de octubre de 2023 con Dictamen Técnico Favorable No.037-2023, que

consiste en disminuir el Componente 2 en US\$ 2,500,000.00 y crear el Componente 4 – Primas anuales en virtud de la Parte 4 del Proyecto (Medidas de protección financiera de emergencia).

Categoría	Descripción de las categorías	Asignado Convenio Original	Enmienda 1	Enmienda 2	Asignación actual
(1)	Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, y costos operativos bajo la Parte 1 del Proyecto.	10,000,000	7,300,000	-	17,300,000
(2)	Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 2 del Proyecto.	129,000,000	(7,300,000)	(2,500,000)	119,200,000
(3)	Bienes, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 3 del Proyecto.	11,000,000	-		11,000,000
(4)	Primas anuales en virtud de la Parte 4 del Proyecto	-	-	2,500,000	2,500,000
Total		\$ 150,000,000	\$0.00	\$0.00	\$150,000,000

xv. Reembolso gastos efectuados bajo el Componente 1- Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia y Salud y Seguridad Pública.

Mediante Memorando 207-2021 SE-SEDECOAS-FHS del 11 de junio de 2021, se nombró Comité Interino para la revisión de documentación para reembolso del Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras, en cumplimiento a esto, al 31 de diciembre de 2021 se revisó documentación de procesos por un monto total de L591,952,044.29, de gastos ejecutados por la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS) y la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), en acciones de respuesta de socorro y atención a personas, así:

Institución	Lempiras
SEDIS	415.939.122,84
COPECO	176,012,921.45
Total	591,952,044.29

SEDIS: Del total de los gastos presentados, al 30 de junio de 2022 se han reembolsado con pago directo a la SEFIN un total de L 407,708,157.42 equivalente a USD 16,818,559.38, a través de Sistema de Desembolso (Client Connection). No se efectuarán más reembolsos.

COPECO: A la fecha ningún gasto se ha sometido a reembolso. Contratos de limpieza de calles están en proceso de revisión, y de ser elegibles, serán sometidos a reembolso con fondos del Contrato de Préstamo 5328 BL-HO, Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

xvi. AVANCE DE ACTIVIDADES

i. Componente 1 - Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia y Salud y Seguridad Pública.

A través de la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS) fueron atendidas 60,000 familias (equivalente a 300,000 personas) con kit de cocina, kit de higiene personal de niños y adultos, kit de limpieza, camas, estufas, filtros de agua, pañales, material de bioseguridad, toallas de baño, baldes plásticos, entre otros).

El componente 1, estuvo vigente del 2 de noviembre de 2020 al 8 marzo de 2021. Por tanto, durante la duración del proyecto no tendrá nuevas actividades a ejecutarse.

ii. Componente 2 - Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos (Obras).

Con el financiamiento de otras fuentes, el FHIS ha identificado zonas y sitios afectados por la tormenta Eta e Iota, con el fin de formular diseños finales para la rehabilitación y/o reconstrucción en infraestructura educativa, infraestructura vial (puentes) y en el sector de agua y saneamiento.

La Unidad Ejecutora del Proyecto a través de su personal técnico y con el apoyo de la Dirección de Proyectos del FHIS-SEDECOAS ha realizado revisiones a la formulación de los subproyectos

priorizados, para verificar que estos estén cumpliendo con los lineamientos técnicos, ambientales, sociales, y otros relevantes que son parte de los compromisos adquiridos con el Banco Mundial.

A continuación, se detalla el estado de los avances y asuntos pendientes por sectores de intervención.

Infraestructura Educativa

Terminados

- Un primer lote de 25 subproyectos de reposición, reparación y ampliación de centros educativos adjudicados por un monto de L 78,619,307.53 el cual ascendió a L.88,265,020.33 y para la supervisión 2 contratos por L 10,004,647.38. que se incrementó a L.12,870,282.09. Las obras dieron inicio en noviembre de 2022. La ejecución al cierre del 3er trimestre del año 2024 es de L. 85,028,647.85 equivalente al 96.33% para obras y de L. 7,215,505.06 equivalente al 56.06% para la supervisión. (Ver Anexo 1: Detalle de Subproyectos PRE).

En Ejecución

- Un segundo paquete consta de 17 subproyectos los cuales iniciaron su ejecución en el II y III trimestre del 2023 por un monto contratado de L. 127,025,993.76 el cual asciende a L.145,410,921.18 por órdenes de cambio y para la supervisión 1 contrato por L 17,661,922.00. A la fecha, existen 10 subproyectos que han finalizado físicamente y 7 en ejecución. La ejecución al cierre del 3er trimestre del año 2024 es de L. 87,619,449.22 equivalente al 60.25% para obras y de L. 14,705,529.85 equivalente al 83.26% para la supervisión. (Ver Anexo 1: Detalle de Subproyectos PRE).
- Un tercer grupo de 8 subproyectos dieron inicio en el último trimestre del año 2023 por un monto contratado de L. 175,302,970.39 el cual ascendió a L. 177,807,158.31 por las ordenes de cambio, y para la supervisión un contrato por L 24,306,748.00 ampliado a L.31,772,954.70. Al cierre del III trimestre han finalizado físicamente 2 subproyectos y 6 se encuentran aún en ejecución. La ejecución al cierre del 3er trimestre del año 2024 es de L. 73,469,476.77 equivalente al 41.32% para obras y de L. 9,426,745.32 equivalente al 29.67% para la supervisión. (Ver Anexo 1: Detalle de Subproyectos PRE).

- Un cuarto grupo de 6 subproyectos de los cuales 3 iniciaron a finales del mes de mayo de 2024 y 3 en el mes de agosto de 2024, por un monto contratado de L. 148,767,589.03. La supervisión será cubierta por la empresa del tercer grupo. La ejecución al cierre del 3er trimestre del año 2024 es de L. 32,552,779.22 equivalente al 21.9% para obras. (Ver Anexo 1: Detalle de Subproyectos PRE).

En Licitación, Aprobación y Formulación

- En Contratación se encuentran 5 subproyectos por un monto estimado de L. 131,149,016.15, los cuales están programados para recepción de ofertas para octubre de 2024. Los subproyectos son los siguientes:

No.	Código	Nombre del Subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	110168	Reposición Escuela. Ramón Villeda Morales y CEPB Lic. Yenny Martínez	Colón	Tocoa	Col. Lempira
2	108483	Reposición CEB Joaquín Reyes Tejeda	Yoro	Olanchito	Colonia Libertad Norte
3	110056	Reposición Instituto Marco Tulio Castillo Santos	Colón	Bonito Oriental	Aldea La Esperanza
4	110130	Reparación Escuela José Cecilio del Valle	Colón	Santa Rosa de Aguán	Las Lomas, Barra de Aguán
5	108020	Reposición de Instituto Gubernamental República Federal de México	Francisco Morazán	Distrito Central	Colonia Iberia

- En el Comité de Operaciones del FHIS, se encuentra un subproyecto en aprobación y 4 subproyectos ya aprobados, todos ellos cuentan con la no objeción del Banco Mundial por un monto estimado de L 155,700,389.65. Los subproyectos son los siguientes:

No.	Código	Nombre del Subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	110177	Reposición CEB Juana Donatila Ruiz y CEPB Julio Arriola Oliva	Colón	Tocoa	Col. Aurora
2	108480	Reposición Escuela María Teresa Aburto	Yoro	Olanchito	Colonia 24 de mayo
3	110053	Reparación CEB Rubén Antúnez	Colón	Bonito Oriental	San José del 5
4	110055	Reparación CEB Rafael Pineda Ponce	Colón	Bonito Oriental	La Esperanza
5	110054	Reparación CEB Augusto C. Coello	Colón	Bonito Oriental	Barrio El Centro

- Un total de 7 subproyectos se encuentra en formulación por los técnicos del proyecto, los que serán agrupados según su ubicación, como parte de la estrategia de contratación por lotes de subproyectos y tener un menor número de procesos. El presupuesto preliminar es de L 216,740,933.76 A continuación, los subproyectos:

No.	Código	Nombre del subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	110184	Reposición Escuela Rosendo Núñez Bonilla, JN República de Venezuela y JN Alba Nora Gúnera de Melgar.	Colón	Trujillo	Barrio Río Negro
2	110181	Reposición CEB / CEPB Esteban Guardiola y CEB / JN José Heriberto Díaz	Atlántida	Tela	Triunfo de la Cruz
3	110740	Reposición CEB Manuel Bonilla y JN Luis Landa	Santa Bárbara	Macuelizo	San Francisco de Asís
4	110176	Reposición CEPB Argelia Barrientos	Colón	Tocoa	Col. 18 de septiembre
5	110182	Reposición CEB Perla del Aguán	Colón	Sabá	Comunidad Ceibita
6	108376	Reparación CEBG Éxitos de ANACH	Cortés	Choloma	Colonia Éxitos De ANACH
7	108238	CEB José Melecio Velásquez	Yoro	El Progreso	Col, Roberto Delgado Mangandi

Sector de Agua y Saneamiento

En Ejecución

- La primera intervención en el Sector de Agua y Saneamiento consta de 3 subproyectos de agua y saneamiento han iniciado ejecución en el tercer trimestre del año 2023. En abril 2024, se ha iniciado un 4to subproyecto de agua potable y en el tercer trimestre 2024, el 5to subproyecto. El monto contratado por los 5 subproyectos es de L.143,435,262.47, ascendiendo a L. 175,619,075.59 por órdenes de cambio y para la supervisión L 38,285,977.75 en dos contratos. La ejecución al cierre del 3er trimestre de 2024 es de L. 94,410,863.15 equivalente al 53.76% para obras y de L. 12,962.598.68 equivalente al 33.86% para la supervisión. (Ver Anexo 1: Detalle de Subproyectos PRE).
- Al tercer trimestre de 2024, está pendiente la firma de 3 contratos de obra por un monto de L. 58,557,524.96, los cuales serán agregados a un contrato existente de supervisión. Los subproyectos son los siguientes (Ver Anexo 1: Detalle de Subproyectos PRE).

No.	Código	Nombre del Subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	108878	Reposición de Sistema de Agua Potable	Cortés	Santa Cruz de Yojoa	Aldea Buena Vista y La Fé
2	108885	Reposición de Sistema de Agua Potable	Cortés	San Antonio	Aldea Planes de Italia y Buena Vista Caleras
3	109074	Reposición de Sistema de Agua Potable	Olancho	Dulce Nombre de Culmí	Aldea La Colonia y Marañones

En Licitación, Aprobación y Formulación

- En evaluación de ofertas se cuenta con 1 subproyecto con el monto estimado de L. 43,617,133.103. Los subproyectos en evaluación son:

No.	Código	Nombre del Subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	108917	Reposición Sistema de Agua Potable	Francisco Morazán	Guaimaca	Varias Aldeas

- Se encuentran aprobados por Comité de Operaciones de FHIS y con No Objeción del Banco Mundial 3 subproyectos por un monto estimado de L. 108,782,698.33. Los subproyectos son los siguientes:

No.	Código	Nombre del Subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	109071	Rehabilitación Sistema de Agua Potable	Olancho	Gualaco	Pacura y Toro Muerto
2	110509	Reposición Sistema de Agua Potable Aldea La Guatilla	Yoro	Yoro	Aldea La Guatilla
3	108919	Reposición Sistema de Agua Potable Ciudad Guaymas	Yoro	El Negrito	Ciudad Guaymas y Centro Poblado

- En formulación se encuentran 15 subproyectos adicionales para la reposición y/o rehabilitación de sistemas de agua potable por un monto estimado de L. 859,406,343.63 siendo los siguientes:

No.	Código	Nombre del Subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	108877	Reposición Sistema de Agua Potable	Cortés	Villanueva	El Marañón
2	110463	Reposición Estación de Bombeo y Línea de Impulsión La Entrada Copan	Copán	Nueva Arcadia	La Entrada

3	108876	Rehabilitación Sistema de Agua Potable Puerto Cortes	Cortés	Puerto Cortés	Casco Urbano
4	109148	Reposición Sistema de Agua Potable Nueva Jalapa	Santa Barbara	Nuevo Celilac	Nueva Jalapa
5	108709	Rehabilitación Planta de Tratamiento Sector Sur Cañeras	Cortés	Villanueva	Sector Sur Cañeras
6	109256	Reposición Sistema de Agua Potable y Saneamiento	Lempira	San Manuel de Colohete	Varias Comunidades
7	109236	Reposición Línea de Impulsión Y Tanque de Distribución Potrerillos	Cortés	Potrerillos	Potrerillos
8	110615	Reposición Sistema Agua Villa Santa	El Paraíso	Danlí	Varias comunidades Villa Santa
9	110472	Reposición Sistema de Agua Potable Subirana	Olancho	Dulce Nombre de Culmí	Aldea Subirana
10	110511	Reposición Estación Elevadora y Planta de Tratamiento De Aguas Residuales I Etapa Potrerillos	Cortés	Potrerillos	Potrerillos
11	108920	Reposición Sistema de Agua Potable San Julián	El Paraíso	Danlí	Comunidad de San Julián
12	110508	Reposición Sistema de Agua Potable 16 Comunidades Comayagua	Comayagua	Esquías, San Luis, San Jerónimo	El Comal, La Florida, El Playón, Las Minitas, Rancho Grande, La Cañada, Guamas, Vallecillos, Agua Dulce, Pocitos, Peladeritos, Coyolitos, Las Majadas, Loma Pelada, Planes y Ceibita Vieja
13	108893	Reposición Sistema Agua Potable Macuelizo	Santa Barbara	Macuelizo	La Flecha, La Piñuela y Ciruelo
14	108874	Reconstrucción de Sistema de Agua Potable Casco Urbano 11 barrios	Cortés	San Antonio	Casco Urbano (11 Comunidades)
15	110680	Prospección y Explotación de Pozo Hospital Santa Rosita	Francisco Morazán	Distrito Central	Amarateca

Infraestructura vial

En Ejecución

- La primera intervención en el Sector Vial consta de 4 subproyectos, han iniciado ejecución en el cuarto trimestre del año 2023. Un 5to subproyecto se agregó en el primer trimestre del año 2024. A la fecha han finalizado físicamente 3 subproyectos. El monto total contratado de los 5 subproyectos es de L 75,108,023.39 y se redujo a L. 74,981,339.67 por órdenes de cambio y para la supervisión un contrato por L 7,802,185.38. La ejecución al cierre del III Trimestre 2024 es de L 43,645,416.66 equivalente al 58.2% para obras y de L. 2,014,016.04 equivalente al 25.81% para la supervisión. (Ver Anexo 1: Detalle de Subproyectos PRE).

En Licitación, Aprobación y Formulación

- En formulación se encuentran 8 subproyectos, de los cuales 5 corresponden a reposición/construcción de puentes y 3 corresponden a construcciones de caja puentes por un monto estimado de L. 37,744,613.05

No.	Código del subproyecto	Nombre del subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	108700	Reposición de Puente Santa Clara Techin	Copán	Florida	Santa Clara, San Lorenzo Techin
2	108785	Reposición de Puente San Lorenzo Techin-Las Palmas Techin	Copán	Florida	San Lorenzo, Techin, Las Palmas
3	110805	Puente Sobre el Rio Aguagua	San Vicente Centenario	Santa Bárbara	-
4	110806	Puente El Bonete	Copán	Copán Ruinas	-
5	110806	Puente Rio Morja	Copán	El Paraíso	-
6	S/C	Construcción Caja Puente	Olancho	Rosario	Tabáco
7	S/C	Construcción Caja Puente	Olancho	Silca	Sábana de López
8	109250	Construcción Caja Puente	Lempira	Gracias	Santa Rosita

- En diseño y formulación se encuentran los tramos de 25 municipios según la priorización realizada en el año 2023.

Infraestructura de salud

En Ejecución

- La primera intervención en el Sector Salud consta de 1 subproyecto, ha iniciado ejecución en el II trimestre del año 2024. El monto total de contrato es de L 17,696,680.82 y la supervisión es realizada por la empresa que supervisa a 11 subproyectos educativos del lote 3 y 4. La ejecución al cierre del III Trimestre de 2024 es de L 3,539,336.16 equivalente al 20% para obras. (Ver Anexo 1: Detalle de Subproyectos PRE).

En Licitación, Aprobación y Formulación

- En formulación se encuentran 2 subproyectos del sector salud por un monto estimado de L. 85,118,000.00

No.	Código del subproyecto	Nombre del subproyecto	Departamento	Municipio	Ubicación
1	110321	Reposición CESAMO Santa Rosa de Aguan	Colón	Santa Rosa de Aguan	La Lomas
2	110510	Reparación Hospital Santa Rosita	Francisco Morazán	Distrito Central	Distrito Central

Resultados

- Un primer lote de 25 subproyectos de infraestructura educativa ha culminado físicamente y 21 ya han sido cerrados financieramente.
- Para el lote 2, 3 y 4 que suman 31 subproyectos de obra de infraestructura educativa junto con la supervisión respectiva, de los cuales 12 subproyectos han finalizado físicamente.
- 5 subproyectos de agua y saneamiento han iniciado ejecución junto a la supervisión respectiva.
- 1 subproyecto de salud ha iniciado ejecución junto con la supervisión respectiva.
- 5 subproyectos viales (puentes) han iniciado ejecución junto a la supervisión respectiva, de los cuales 3 han finalizado físicamente.

iii. **Componente 3 - Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.**

- Seguimiento de inspectoría, ambiental, social y de seguridad social a los 25 subproyectos en ejecución.
- Seguimiento al Mecanismo de Quejas, Marco de Reasentamiento y Plan de Participación de Partes Interesadas.
- En proceso de Evaluación de técnicos para complementar al equipo técnico de la Unidad Ejecutora.

xvii. RETOS

- Llevar una ejecución financiera a la par de la ejecución física, abordando mes a mes a los contratistas para presentar sus estimaciones sin atrasos.
- Acompañamiento quincenal a la supervisión para alcanzar altos niveles de calidad en la ejecución de las obras contratadas.
- Ejecutar el presupuesto 2024 aprobado, obteniendo un avance trimestral significativo.
- Definir con el Banco Mundial estrategias para la simplificación de requisitos y procesos para la eficiente ejecución de subproyectos de emergencia.

xviii. PROBLEMÁTICA

La UEP del proyecto PRE debe cumplir con los requerimientos del Banco Mundial y de la institución FHIS-SEDECOAS. Dicho cumplimiento, conlleva varias sesiones de revisión y subsanación lo que ralentiza el inicio de la ejecución de los subproyectos. Se considera que esto continuará sucediendo en los primeros subproyectos de cada tipología ya que cada uno conlleva sus particularidades que no se han abordado anteriormente.

La mayoría de las formulaciones de los subproyectos efectuadas por formuladores externos y recibidas por el proyecto PRE carecen de análisis de gestión de riesgos: accesibilidad; obras de mitigación; hidrosanitarios; estabilización de taludes; medidas compensatorias, contra incendios, de comunicación y de señalización, y, requieren actualización de costos y cantidades de obra. Por lo que la reformulación toma bastante tiempo para tener los expedientes listos para licitarles.



xix. ANEXO 1 DETALLE DE SUBPROYECTOS PRE

No.	Lote	Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Colonia / Barrio / Aldea	Monto de Proyecto Actual	% Avance Físico	% Avance Financiero
1	1	108417	Reparación CEPB Luis Subilón Ortiz	Santa Bárbara	Ilama	San José de Oriente	L 2,938,231.64	100%	100%
2	1	108374	Reparación Jardín de Niños Rosaura Posas de Navarro	Cortés	Choloma	Col. La Twana, Quebrada Seca	L 1,081,917.96	100%	100%
3	1	108524	Reparación C.E.P.B Miriam J. Gallardo	Francisco Morazán	Distrito Central	Col. Villa Nueva Sector 1	L 1,310,680.88	100%	90%
4	1	108620	Reposición Escuela Republica de Honduras	Francisco Morazán	Ojojona	El Jícaro	L 2,734,227.10	100%	100%
5	1	108509	Reparación Jardín de Niños Humberto Rivera Torres	Francisco Morazán	Cedros	Barrio Arriba	L 1,731,866.68	100%	90%
6	1	108451	Reparación Escuela Juan Lindo	El Paraíso	Danlí	La Redonda	L 3,531,861.71	100%	100%
7	1	108429	Reparación C.E.B.G. Rodolfo Padilla Sunceri	Cortés	San Pedro Sula	Res. Real del Campo 2.	L 2,811,064.51	100%	100%
8	1	108491	Reposición CCEPREB Angelitos Sonrientes	Intibucá	San Francisco de Opalaca	Santa Fe	L 2,272,586.19	100%	100%
9	1	108602	Reposición CEB El Adelanto	Lempira	Lepaera	Aldea Alegrías	L 2,296,570.72	100%	100%
10	1	108393	Reposición CEB Marco Tulio Rodríguez	Lempira	San Sebastián	Comunidad La Chorrera	L 2,102,279.48	100%	100%
11	1	108555	Reposición Jardín Niños Xiomara de Zelaya	Copán	Florida	Buenos Aires	L 2,377,180.95	100%	100%
12	1	108284	Ampliación CEPBG Mercedes Enderson	Cortés	San Pedro Sula	Col. 6 de Mayo	L 2,610,893.18	100%	100%
13	1	108285	Suministro de Mobiliario C.E.B. Alfonso Lacayo	Cortés	San Pedro Sula	Col. Dr. Alfonso Lacayo	L 845,468.41	100%	100%
14	1	108430	Reparación CEBG Republica de Canadá	Cortés	San Pedro Sula	Col. Gracias a Dios	L 3,591,149.65	100%	100%
15	1	108335	Reparación CEG Unidad y Cambio	Cortés	Villanueva	Aldea El Calán	L 7,439,287.04	100%	97%
16	1	108340	Reposición CEPB Mis Primeras Letras	Cortés	Villanueva	Aldea El Coabano	L 2,066,405.55	100%	97%
17	1	108359	Reparación CEB José Trinidad Reyes	Cortés	Villanueva	Vista Hermosa	L 3,789,511.01	100%	97.12%
18	1	108519	Reparación CEB José Cecilio del Valle	Cortés	Villanueva	Santa Eduvigis	L 6,324,309.56	100%	97.12%

No.	Lote	Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Colonia / Barrio / Aldea	Monto de Proyecto Actual	% Avance Físico	% Avance Financiero
19	1	108304	Reparación Jardín de Niños San Francisco de Asís	Yoro	Morazán	Bo. El Jazmín	L 2,663,170.02	100%	100.00%
20	1	108305	Reparación CEB. Pedro Nufio	Yoro	Morazán	El Portillo de Gonzales	L 9,164,738.05	100%	100%
21	1	108504	Ampliación Centro de Educación Básica León Alvarado	Francisco Morazán	Distrito Central	El Tizatillo	L 4,017,845.83	100%	74%
22	1	108505	Reparación C.E.B. Rubén Martínez Rodas	Francisco Morazán	Distrito Central	Germania	L 4,140,483.36	100%	68%
23	1	108443	Reposición CEPB Dr. Andrés Arturo Martínez Guillen	La Paz	San José	Aldea Llano Largo	L 2,556,800.31	100%	100%
24	1	108579	Reparación CEB Marcelino Pineda López	Comayagua	Comayagua	La Independencia	L 6,075,325.78	100%	100%
25	1	108275	Reparación CEBG República de Venezuela	Francisco Morazán	Distrito Central	Col. El Rincón	L 7,791,164.78	100%	100%
26	2	108628	Reparación CEB José Cecilio del Valle	Comayagua	Lejamaní	Barrio Los Dolores	L 19,912,505.28	75%	59%
27	2	108511	Reposición CEB Hibuera	Comayagua	Comayagua	Barrio Los Dolores	L 5,074,724.19	36.7%	10.21%
28	2	108313	Reposición Escuela Luis Alonzo Suazo	Comayagua	San Luis	La Esperanza	L 16,437,390.28	69%	62.99%
29	2	108314	Reparación Jardín de Niños Ricardo Maduro	Comayagua	San Luis	El Picacho	L 6,368,257.47	100%	77.89%
30	2	108507	Reparación CEB Francisco Morazán	Comayagua	Ojos de Agua	El Hielo	L 7,447,764.37	100%	94.29%
31	2	108446	Reposición Escuela Rural Mixta Dr. Doroteo Varela	La Paz	Guajiquire	Guanacaste	L 4,137,298.29	100.0%	87.54%
32	2	108447	Reposición Escuela Fausto Castillo Suazo	La Paz	Santiago Puringla	Orobila	L 4,299,201.74	100%	89.04%
33	2	108449	Reposición Escuela Pompeyo Bonilla	La Paz	Santiago Puringla	Las Quebradas	L 2,811,327.29	100%	86.07%
34	2	108350	Reparación Esc. Prevocacional Raúl Zaldívar	Francisco Morazán	Distrito Central	Col. Venezuela	L 10,438,168.72	100%	52.22%
35	2	108420	Reposición Jardín de Niños Abraham Raudales	Francisco Morazán	Cedros	El Suyatal	L 5,747,800.43	100%	61.45%
36	2	108452	Reposición Escuela Eusebio Fiallos	El Paraíso	Danlí	Aldea El Chaparral	L 3,855,284.29	100%	89.35%
37	2	108478	Reposición Centro de Educación Básica Presentación Centeno	Cortés	San Pedro Sula	Aldea Flor del Valle	L 10,625,822.74	54%	36.97%
38	2	108318	Reposición CEB Gubernamental Ramón Amaya Amador	Cortés	La Lima	Col. San José	L 17,919,382.49	40%	35.90%
39	2	108271	Reparación CEB Real de Suecia	Cortés	San Pedro Sula	Col. Brisas del Valle	L 8,921,094.83	94%	39.34%

No.	Lote	Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Colonia / Barrio / Aldea	Monto de Proyecto Actual	% Avance Físico	% Avance Financiero
40	2	108394	Reposición CEB Ing. Manuel Zelaya Rosales y Jardín de Niños Francisco Morazán	Lempira	San Manuel Colohete	Comunidad Quesuca	L 10,390,938.50	95.6%	74.29%
41	2	108471	Reposición CEB Republica de Perú	Lempira	Gracias	Calle principal del Caserío El Caral	L 6,484,513.88	100.0%	100.00%
42	2	109631	Reposición PCEPB Profesor Manuel Antonio Mejía	Ocotepeque	Belén Gualcho	Barrio San Antonio	L 4,539,446.39	100%	60.04%
43	3	108290	Reposición Instituto Gubernamental José Dolores Gonzales	Cortés	La Lima	Colonia Nuevo San Juan	L 33,062,753.80	45%	29.77%
44	3	108291	Reparación CEPB y CEB Nuevo San Juan	Cortés	La Lima	Col. Nuevo San Juan	L 17,437,999.31	60%	39.76%
45	3	108614	Reparación CEPB República de Honduras	Cortés	La Lima	Oro Verde	L 3,668,594.30	100%	85.72%
46	3	108295	Reposición Instituto Dr. Alfonso Hernández Córdova	Cortés	La Lima	Colonia Planeta	L 43,915,798.28	45.0%	47.94%
47	3	108457	Reposición CEPB Lic. Evaristo Euceda	Cortés	La Lima	Col. Nueva Jerusalén	L 3,934,562.40	100%	43.20%
48	3	108253	Reparación Instituto Oficial José Manuel Díaz Palma	Atlántida	El Porvenir	Aldea La Unión	L 16,609,985.79	87%	48.24%
49	3	108578	Reposición CEB Oswaldo López Arellano	Cortés	La Lima	Col. Flores de Oriente	L 25,970,429.23	43%	38.31%
50	3	108458	Reparación CEPB Gabriela Mistral	Cortés	La Lima	Barrio Centro Norte	L 33,207,035.20	45.0%	38.65%
51	4	108351	Reposición CEPB Roberto Micheletti Bain	Francisco Morazán	Distrito Central	Barrio La Soledad	L 5,058,108.15	28%	27.93%
52	4	108272	Reparación CEBG y CEPBG Cámara Junior No. 1	Francisco Morazán	Distrito Central	Colonia San Luis	L 31,208,184.75	27%	27.68%
53	4	108500	Reparación CB Luis Bográn	Yoro	Morazán	Aldea El Filon	L 20,276,330.81	11%	20.00%
54	4	110028	Reposición CEPB Federico Froebel	Colón	Tocoa	Barrio El Centro	L 19,122,190.86	9%	20.00%
55	4	110030	Reposición CEB Ramon Montoya	Colón	Tocoa	Aldea Prieta	L 22,466,894.28	3%	20.00%
56	4	110031	Reposición Escuela Padre Reyes Y CCEPREB Nilsa Anastasia Solano	Colón	Santa Rosa De Aguan	Aldea La Planada	L 50,635,880.18	6%	20.00%
57	AP	108705	Rehabilitación Sistema de Agua Potable Comayagua	Comayagua	Comayagua	Casco Urbano	L 33,496,613.04	95%	93.89%
58	AP	108702	Rehabilitación Sistema de Agua Potable Ciudad de Yoro, Yoro	Yoro	Yoro	Casco Urbano	L 27,659,459.06	79%	70.23%
59	AP	108703	Rehabilitación Sistema de Agua Potable Morazán Yoro	Yoro	Morazán	Casco Urbano	L 12,490,059.45	71%	64.53%
60	AP	108918	Reconstrucción de Sistema de Agua Potable Casco Urbano	Yoro	El Negrito	Casco Urbano	L 63,558,099.20	31%	43.07%

No.	Lote	Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Colonia / Barrio / Aldea	Monto de Proyecto Actual	% Avance Físico	% Avance Financiero
61	AP	109073	Reposición de Sistema de Agua Potable	Choluteca	Apacilagua	Casco Urbano	L 38,414,844.84	10%	21.08%
62	Vial	109249	Reposición Puente vehicular sobre el Rio Chamelecón	Copán	Nueva Arcadia	Aldea Los Tangos	L 32,855,063.03	41%	53.05%
63	Vial	109240	Reposición Caja puente Pacayal	Santa Bárbara	San Nicolás	El Pacayal	L 5,831,565.77	100%	100.00%
64	Vial	109239	Reposición Caja puente Joconal	Santa Bárbara	San Nicolás	Rio Frio, Joconal	L 5,945,008.14	100.00%	100.00%
65	Vial	109225	Construcción de obras de protección Puente Lindo	Santa Bárbara	Las Vegas	Barrio San Juan	L 1,932,990.05	100.00%	85.95%
66	Vial	108698	Reconstrucción de Puente El Gritadero	Copán	Florida	Aldea Espíritu Santo	L 28,416,712.68	45.00%	44.97%
67	Salud	109916	Rehabilitación Unidad de Atención Primaria en Salud (UAPS)	Yoro	Morazán	Aldea Caridad	L 17,696,680.82	7.00%	20.00%

CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA



✓ **Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)**

i. Antecedentes

El Estado de Honduras ha revalorizado la educación como elemento fundamental para el desarrollo integral de todos los hondureños, mediante la implementación de la Tercera Reforma Educativa, que responde a las expectativas de la sociedad, cuyos alcances se enmarcan en los objetivos No.1 y No.4 de la Visión de País 2010-2038; Plan de Nación 2010-2022; que estipulan: “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidados de previsión social” y “Honduras con un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo. Para la ejecución de esta Tercera Reforma, se aprueba en el año 2012, la Ley Fundamental de Educación y en el año 2014 sus 22 Reglamentos.

-Fortalecimiento de la Secretaría de Educación conforme a la Ley Fundamental de Educación (LFE), principalmente en dos aspectos: i) descentralizar funciones operativas en las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de Educación; y ii) fomentar la participación comunitaria en la gestión educativa, formulación y coordinación de los planes estratégicos, que apunten a mejorar la calidad educativa.

El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Educación, garantiza el derecho fundamental a la educación, el acceso a una educación de calidad en condiciones de equidad, sin discriminación de ninguna naturaleza en todos sus niveles. La Ley Fundamental de Educación recupera el espíritu de garantizar este derecho, estableciendo el compromiso de brindar educación gratuita en todos sus niveles; un año obligatorio en Educación Pre-Básica (tercer grado) y tres ciclos de Educación Básica (I, II y III ciclo).

Con ello, se logra la meta establecida de país, que para el año 2038, Honduras debe elevar la escolaridad promedio a 9 años (1° a 9° grado), reconociendo que es necesario formar educandos para la

convivencia, derechos humanos, responsabilidad social, cuidado de las personas, entendimiento del entorno, protección del medio ambiente y la educación media ha sido considerada, hasta finales del siglo XX, como el período de preparación de los jóvenes para el ingreso a la educación superior y también como la enseñanza que proporciona entrenamiento técnico-vocacional, preparando a los jóvenes para su inserción en la vida productiva. En general, la educación media tiene como propósito ofrecer la experiencia formativa para incorporarse al mundo del trabajo y/o proseguir estudios en el nivel de educación superior.

ii. Objetivo General

Fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros Educativos Media y sean promovidos con la calidad requerida.

iii. Descripción

Consiste en la implementación de metodología de formación permanente de docentes y estudiantes, la mejora de la infraestructura escolar de centros de educación pública en todo el territorio nacional con énfasis en las zonas de mayor pobreza urbana y rural. El mejoramiento de la infraestructura podrá incluir al menos la ampliación y/o reparación de infraestructura educativa, dotación de mobiliario y equipamiento técnico educativo especializado; y el fortalecimiento de habilidades de los docentes de educación sobre metodologías de enseñanza basadas en competencias y las capacidades de los estudiantes y docentes de bachillerato en temas relacionados al emprendedurismo.

iv. Focalización

En las áreas urbanas, periurbanas y rurales en los 18 departamentos, como ser: Colon, Islas de la Bahía, Cortes, Francisco Morazán y Valle son intervenidos con fondos del Programa para la Reducción de la Pobreza y la Exclusión Económica y Social (**PRPEES**).

Para los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Comayagua, Copan, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara y Yoro, son intervenidos con fondos de Recursos Ordinarios (**RO**).

v. **Beneficiarios**

El Programa beneficiará 480 niños de Educación pre-básica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes.

vi. **Duración**

Fecha de inicio de ejecución: 30 de marzo de 2021

Fecha de cierre: 30 de marzo de 2026

vii. **Costo Total del Programa**

Este es un esfuerzo de la Republica de Honduras, a través de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por US\$80,000,000.00 que tiene como meta llegar a la población educativa de los diferentes niveles que atiende el sistema educativo nacional.

Datos del Préstamo

Monto Total de la Operación	\$80,000,000.00
Monto del Préstamo Otorgado por el BCIE	\$80,000,000.00
Solicitud de Financiamiento	06 de agosto del 2018
Fecha de Firma	16 de diciembre del 2019
Fecha de Publicación	19 de junio del 2020
Fecha de Elegibilidad	01 de marzo del 2021
Fecha Base para el inicio del Plazo para Desembolsar	30 de marzo de 2021
Plazo para la Ejecución de los Desembolsos	30 de marzo de 2026
Fecha Máxima para Desembolsar	30 de marzo de 2026

Monto Desembolsado a la Fecha del Informe

\$17,094,400.00 PRPEES

\$9,432,130.00 Recursos Ordinarios

viii. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	507.311.663,00	114.393.414,00	23%
2022	438.079.338,00	860.314,43	0%
2023	297.119.742,00	106.004.347,02	36%
2024	306.585.912,00	86.206.442,58	28%

ix. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
EDUCACION	13	28	30.598.695,89	325	1.912
TOTAL	13	28	30.598.695,89	325	1.912

x. Avance por Departamento



DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
COMAYAGUA	0	1	-	0	0
CORTES	5	9	10.281.197,39	125	626
OLANCHO	4	8	10.120.728,64	100	211
SANTA BARBARA	4	10	10.196.769,86	100	1.075
TOTAL	13	28	30.598.695,89	325	1.912

xi. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	6.408.490,60
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	7.069.961,57
TOTAL	13.478.452,17

xii. Resumen Financiero

En relación con el monto total de la operación de US\$ 80.0 Millones se tiene una ejecución acumulada de US\$ 15.7 Millones, equivalente a HLN 392.5 Millones.

 República de Honduras PROD	ESTADO COMPARATIVO DE INVERSIONES REALIZADAS CON LAS PROGRAMADAS POR ESTRUCTURA DE CONVENIO	 30/09/2024 09:59:41 Gestión: 2024 R_UFX_02_INVEST Página 1 de 1
	DESDE 01/09/24 HASTA 30/09/24	

Organismo: Banco Centroamericano de Integración Económica
Institución: Fondo Hondureño de Inversión Social
Gerencia Administrativa: GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
Numero de Contrato/Convenio: Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras

Tipo de Documento F01:

Expresado en: DOLARES AMERICANOS

ESTRUCTURA DEL CONTRATO/CONVENIO	FINANCIAMIENTO ORIGINAL ACUMULADO			EJECUCION ACUMULADA INICIO EJERCICIO			EJECUCION DEL EJERCICIO			EJECUCION ACUMULADA A LA FECHA			SALDO DISPONIBLE			
	CODIGO	DESCRIPCION	Organismo Fin.	Aporte Local	Total	Organismo Fin.	Aporte Local	Total	Organismo Fin.	Aporte Local	Total	Organismo Fin.	Aporte Local	Total	Organismo Fin.	Aporte Local
01	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	63,553,980.00	0.00	63,553,980.00	8,720,290.49	0.00	8,720,290.49	305,574.44	0.00	305,574.44	9,025,864.93	0.00	9,025,864.93	54,528,115.07	0.00	54,528,115.07
02	FORMACION PERMANENTE	6,563,810.00	0.00	6,563,810.00	4,620,000.00	0.00	4,620,000.00	0.00	0.00	0.00	4,620,000.00	0.00	4,620,000.00	1,943,810.00	0.00	1,943,810.00
03	ADMINISTRACION	1,332,400.00	0.00	1,332,400.00	938,695.54	0.00	938,695.54	42,282.82	0.00	42,282.82	980,978.36	0.00	980,978.36	351,421.64	0.00	351,421.64
04	SUPERVISION Y AUDITORIA	4,934,900.00	0.00	4,934,900.00	863,468.15	0.00	863,468.15	14,670.22	0.00	14,670.22	878,138.37	0.00	878,138.37	4,056,761.63	0.00	4,056,761.63
05	IMPREVISTOS Y ESCALAMIENTO	3,414,910.00	0.00	3,414,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414,910.00	0.00	3,414,910.00
06	COMISION DE SEGUIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR ORGANISMO FINANCIADOR:	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	15,342,454.18	0.00	15,342,454.18	362,527.48	0.00	362,527.48	15,704,981.66	0.00	15,704,981.66	64,295,018.34	0.00	64,295,018.34
	TOTAL CONVENIO:	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	15,342,454.18	0.00	15,342,454.18	362,527.48	0.00	362,527.48	15,704,981.66	0.00	15,704,981.66	64,295,018.34	0.00	64,295,018.34

xiii. Principales Logros III Trimestre

1. Ocho (8) proyectos de supervisión y de obra contratados.
2. Quince (15) proyectos para publicación del proceso de contratación de la supervisión y de obra.
3. Nueve (9) proyectos formulados.
4. Cinco (5) proyectos finalizados.
5. Revisión de los Términos de Referencia de Consultoría y los Contratos de Supervisión y de Obra.

Estatus de Proyectos al III trimestre

ESTATUS DE PROYECTOS	CANTIDAD	INVERSIÓN LPS	INVERSIÓN US\$
Cerrados Físico y Financiera	26	107,572,948.55	4,302,917.94
Cerrados Físico	23	104,101,981.90	4,164,079.28
Sub-total	49	211,674,930.45	8,466,997.22
En Ejecución	22	119,508,045.79	4,780,321.83
Suspendidos	3	23,437,745.26	937,509.81
Sub-total	25	142,945,791.05	5,717,831.64
Total	74	354,620,721.50	14,184,828.86

Estatus de Proyectos Adjudicados

ESTATUS DE PROYECTOS	CANTIDAD	INVERSIÓN LPS	INVERSIÓN US\$
Adjudicados y en firma los Contratos de Supervisión y de Obra	8	105,472,067.55	4,218,882.70
Por Licitar	15	200,542,115.74	8,021,684.63
Formulados	9	34,155,298.37	1,366,211.93
Total	32	340,169,481.66	13,606,779.27

Proyectos en Formulación

Lotes de Proyectos	No de Proy.	Contratados	Por Contratar	Observación
1	15	0	15	Por Licitar
2	16	16	0	ADJUDICADO A VIELCA
3	15	0	15	Por Licitar
4	13	13	0	ADJUDICADO A CONASH
5	14	14	0	ADJUDICADO A VIELCA
6	15	15	0	ADJUDICADO A VIELCA
Total	88	58	30	

Los lotes de Proyectos No. 1 y 3 son procesos declarados desiertos, el plan de acción es publicar en el primer trimestre del 2025 un nuevo proceso de contratación de la consultoría de estos 2 lotes.

Proyectos finalizados en el III Trimestre 2024

Son un total de cinco (5) Centros Educativos intervenidos, a continuación, el detalle de estos.

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) / Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)								
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INGRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN EDUCATIVA EN HONDURAS (MIFE)								
PROYECTOS FINALIZADOS EN EL III TRIMESTRE 2024								
N°	CÓDIGO FHIS	CÓDIGO SACE (Sistema de Administración de Centros Educativos)	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NOMBRE DE CENTRO EDUCATIVO	TIPO DE INTERVENCIÓN	ESTADO GENERAL	AGUA POTABLE
26	108963	050200130B11	Choloma	Cortés	NOHEMI FERRERA DE GARCIA	REPARACIÓN	Ejecutado III Trimestre 2024	si
59	109026	151100004B10	Guayape	Olancho	UNION Y FUERZA	REPARACIÓN	Ejecutado III Trimestre 2024	si
60	109014	152000003B09	Santa María del Real	Olancho	CORONEL HERNAN ACOSTA MEJIA	REPARACIÓN	Ejecutado III Trimestre 2024	si
61	108585	050100692B10	San Pedro Sula	Cortés	ESMERALDA QUIROZ DE MADRID	REPARACIÓN	Ejecutado III Trimestre 2024	si
63	108319	051200041P01	LA LIMA	Cortés	GUBERNAMENTAL MANUEL DE JESUS VALENCIA	REPARACIÓN	Ejecutado III Trimestre 2024	si

xiv. Desembolsos

No.	FONDOS PREEPS	FONDOS ORDINARIO	DESEMBOLSADO	FECHA
1	4.552.920,00	2.180.760,00	6.733.680,00	may-21
2	8.041.480,00	5.751.370,00	13.792.850,00	abr-22
3	4.500.000,00	-	4.500.000,00	nov-23
4	-	1.500.000,00	1.500.000,00	dic-23
Total	17.094.400,00	9.432.130,00	26.526.530,00	

Monto del Prestamo 80.000.000,00

% Desembolsado 33%

xv. Componente Socioambiental

Todos los proyectos actualmente en ejecución en el marco del Programa MIFE cuentan con una “Constancia de no Requerir Licenciamiento Ambiental” debido a su “muy baja magnitud” enfocada en reparaciones y ampliaciones (menores a 1,500 m² de intervención constructiva); y en vista que los mismos comparten similares características en sus actividades técnicas constructivas se implementan medidas de mitigación al impacto ambiental estandarizadas para garantizar el más mínimo cuidado al ambiente y la sociedad involucrada en esta etapa (trabajadores de la construcción, alumnos y maestros, etc.)

A la fecha se han ejecutado todas las actividades relacionadas al cumplimiento de las condicionalidades establecidas en el Plan de Acción del Sistema de Evaluación de Monitoreo Ambiental y Social (SIEMAS) exigido por el Organismo Financiero, destacando la implementación de herramientas de gestión ambiental (PGAS) específicas para cada uno de los proyectos en ejecución; así como, la socialización e implementación del “Mecanismo de Quejas y Reclamos” en los mismo garantizando una intervención amigable con el ambiente y la sociedad beneficiaria. Así mismo, como producto de la gestión ambiental y social desarrollada y la buena coordinación lograda con las empresas constructoras y supervisoras, se cuenta con toda la evidencia o documentación de respaldo (según su aplicabilidad por proyecto) de la buena gestión desempeñada cumpliendo con las condicionalidades del plan de acción SIEMAS.

xvi. Adquisiciones

Reprogramación de actividades programadas en el Plan General de Adquisiciones del Programa para el IV Trimestre de 2024.

1. 1 proceso de Contratación de Supervisión con Consultores Individuales.
2. 1 proceso de Contratación de 15 Proyectos con Firmas Consultoras.
3. 1 proceso de Contratación de Obras de 15 Proyectos con Empresas Constructoras.
4. Adquisición de Seis (6) Vehículos Pick-Up para el Programa
5. Firma de Contratos de Tres (3) Técnicos de Control y Calidad
6. Contratación de una póliza de seguro de Seis (6) vehículos para el Programa
7. Renovación de licencias, compra de equipos de cómputo, escaneo y de medición.

xvii. Actividades Programadas

- Reformulación del programa MIFE
- Actualización del Manual Operativo del Programa
- Evaluar el desempeño de las Firmas Consultoras y Supervisoras.
- Contratación de la Supervisión y Ejecución de 15 Obras o centros educativos.
- Contratación de dos (2) Firmas Consultoras para la Evaluación y Formulación de 30 Centros Educativos, cuyos lotes resultaron desiertos (2 lotes).

xviii. Limitantes

1. Aprobación oportuna de la documentación general de Programa.
2. Establecer procesos de revisión eficiente, medición de tiempo y mecanismos de control de documentos del Programa.
3. Agilizar los cambios de fase entre las diferentes Direcciones en el Sistema FHIS.
4. Agilizar y homologar procedimientos en el Ciclo FHIS para gestiones administrativas.
5. **Solicitar a SEFIN ampliación presupuestaria para cumplir compromisos adquiridos en:** Supervisión, Obra y operatividad de la Unidad Ejecutora del Programa.

✓ **Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira.**

i. Antecedentes.

El Estado de Honduras ha revalorizado la necesidad de mejorar el servicio de suministro de agua potable en la ciudad de Gracias, mediante la implementación de un sistema de abastecimiento de agua potable cuyos alcances se enmarcan en los objetivos No.3 y No.4 de la Visión de País 2010-2038; Plan de Nación 2010-2022; que estipulan: “Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental” y “Honduras con un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo”.

Según la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento, El Estado, como responsable de propiciar el bienestar económico, político, social y cultural de los hondureños, es responsable de cuatro funciones básicas: 1. Garantía de acceso a servicios de Agua Potable y Saneamiento de calidad y con eficiencia a la población. 2. Ampliación de la cobertura del servicio, especialmente en comunidades rurales y en comunidades urbanas de escasos recursos. 3. Garantía, bajo principio de solidaridad, de acceso al agua potable a sectores excluidos del servicio por razones de pobreza. 4. Gestión de recursos para el desarrollo de servicios de agua potable y saneamiento, estableciendo las prioridades, los criterios de recuperación de inversiones, asignación de capital, acorde con capacidades financieras respectivas.

ii. Objetivo

El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los servicios de agua potable para la población del municipio de Gracias, Departamento de Lempira, aumentando la cantidad y la calidad del agua suministrada, a través de la ampliación del sistema de abastecimiento, mediante el desarrollo de la infraestructura hidráulica.

iii. Objetivos específicos:

- a) Ampliar y optimizar el caudal de las líneas de conducción de agua hacia los reservorios y la red de distribución del Sistema existente.
- b) Asistencia técnica al prestador UMASG de forma que puedan asumir la operación y mantenimiento del Sistema o contribuir a la sostenibilidad de este.
- c) Introducción de procedimientos rutinarios de operación y mantenimiento con el fin de asegurar una mayor eficiencia.
- d) Acciones destinadas a la reducción de pérdidas (físicas y contables) de agua que puedan reducir la necesidad de inversiones en nuevas obras.

iv. Localización

El Proyecto estará localizado en la Ciudad de Gracias en el Departamento de Lempira.

v. Beneficiarios

El Proyecto beneficiará 22,681 personas en el año 2022 de los cuales 11,005 son hombres y 11,676 son mujeres y en un periodo de 40 años lo estarían alcanzando un estimado de 76,889 personas.

vi. Duración

La duración del Proyecto es de 4.1 años (49.2 meses) incluyendo actividades de gestión, socialización, adquisiciones, ejecución, etc. Y se estima además 2 años para la operación y mantenimiento antes de hacer el traspaso a la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento de Gracias (UMASG).

vii. Situación Actual del Proyecto

El proyecto ha logrado dar cumplimiento a las condiciones previas al primer desembolso, y el 20 de diciembre se recibió el mismo por US\$1,617,085.33, valor necesario para hacer frente a los compromisos del proyecto en los próximos 6 meses.

Se requiere llevar a cabo la revisión del diseño.

viii. Fuente Financiera

Este es un esfuerzo de la República de Honduras, a través de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por US\$36,000,000.00 que tiene como meta llegar a la población de Gracias, Lempira.

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2022	193.172.460,00	28.412.086,07	15%
2023	57.836.382,00	6.177.646,62	11%
2024	51.626.065,00	15.778.045,18	31%

ix. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	9.971.372,15
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	5.806.673,03
TOTAL	15.778.045,18

x. Logros y avances del trimestre del proyecto

Logros y Avances del Proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”.

En atención al Plan General de adquisiciones del proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira” se tienen en desarrollo los procesos de las siguientes consultorías y adquisiciones:

- En ejecución la consultoría CPIR-FHIS-01-2023 “Revisión, Ajuste y Supervisión del Proyecto de Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”, con los siguientes hitos:
 - La firma contratada fue el consorcio coreano-hondureño SAMAN-ASP, conforme a las políticas del BCIE y lo establecido en el contrato de préstamo No. BCIE 2261.
 - El contrato se firmó el 24 de octubre del 2023.

Monto de la consultoría: US \$ 1,472,164.24

Plazo de la consultoría: 16.5 meses, con las siguientes etapas:

- Etapa de Revisión y Ajuste al Diseño: 5 meses, el 1er informe se recibió el 01 de febrero y luego de subsanar observaciones se aceptó su recepción oficial en fecha 15 de marzo.

El Informe Final de Carpeta de Diseño que estaba previsto para el 01 de abril del 2024, se recibió el 30 de abril en atención a un requerimiento de ampliación en las condiciones contractuales de dicha consultoría y con un costo adicional de US \$ 84,136.87 para el diseño de dos nuevas obras de toma y nuevos análisis técnicos requeridos para la construcción del reservorio que se requiere para garantizar el agua potable para la población de la ciudad de Gracias, departamento de Lempira. Entre los meses de mayo y junio se llevaron a cabo reuniones de revisión y de acuerdos de criterios entre personal de la UEP, asesores del FHIS (ing. Lenin Delgado e ing. Gunter Von Wiese) y personal técnico de SAMAN-ASP, en donde se conciliaron diferentes aspectos técnicos, ambientales y sociales. Su aprobación está pendiente de darse en el mes de julio.

Como unidad ejecutora se da seguimiento a la revisión de la carpeta de diseño a nivel técnico conceptual, presupuestario, especificaciones técnicas, planos, memorias de cálculo, cantidades de obra para corroborar que cumpla con los términos pactados. Todo lo anterior se hace para cumplir con el control de calidad y el ingreso del presupuesto según el ciclo FHIS para lo cual se cuenta también con apoyo adicional de la Dirección de Proyectos y Unidad de Costos del FHIS.

Etapas de respuestas de preguntas de los oferentes: 4 meses (aproximadamente)

- Etapa de Supervisión en la ejecución de las obras: 7.5 meses
- La orden de Inicio correspondiente fue dada para el 01 de noviembre del 2023.
- Se realizó el pago del 1er producto llamado “Informe Preliminar Revisión al Diseño” por un monto de US\$ 269,029.50 en fecha 16 de mayo del 2024.
- Se realizó el pago del 2do producto llamado “Informe Carpeta Técnica de Diseño Final” por un monto de US\$ 134,514.75 en fecha 02 de agosto del 2024.

- Se ha elaborado el borrador del documento base de la Licitación Pública Internacional Restringida del proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, en el departamento de Lempira”. Luego de realizar las gestiones correspondientes ya se tiene el visto bueno por parte de las direcciones de Contrataciones y Legal del FHIS. De igual manera se tiene revisión y observaciones a dicho documento de parte de la especialista de adquisiciones del BCIE. Está pendiente de completar los datos de especificaciones técnicas al tener los datos del diseño a satisfacción por parte del consultor.
- En ejecución el contrato de consultoría de Auditoría Externa adjudicado a la empresa “Horwarth Central América” que fue contratada por el Tiempo de Ejecución del Proyecto "Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en La Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira". Para dicho contrato, en vista que no se lograron iniciar los trámites del proceso de licitación de obras de Gracias, no se podrá hacer la ejecución planificada, por lo tanto, es importante considerar conciliar con la firma auditora contratada para traspasar una parte del pago correspondiente al año 2024 para el momento en que se inicie la ejecución de las obras, lo anterior correspondería a un proceso de negociación con dicha empresa auditora.
- Se debe actualizar el Plan General de Adquisiciones en relación con las recientes renunciaciones interpuestas, como ser la de la Especialista de Adquisiciones como también de la Asistente Administrativa, para volver a realizar la contratación de dicho personal.
- En lo que respecta a aspectos financieros es preciso destacar que a la fecha el proyecto refleja una ejecución financiera de julio-septiembre 2024 de USD 228,281.93 y una ejecución acumulada de USD 2,036,276.54 (5.66% del total de la operación).
- Para este año 2024 ha sido asignado un presupuesto de L. 51,626,065.00 de los cuales se han ejecutado L. 15,778,045.18 hasta la fecha.
- La Unidad Ejecutora recibió el día 23 de septiembre del 2024 Memorándum DP-FHIS-422/2024 por parte de la Dirección de proyectos adjuntando la Constancia emitida por la Secretaría del Comité de Operaciones de FHIS acreditando que el 26 de agosto del 2024 se dio la aprobación de la Enmienda

No. 1 de Ampliación de plazo por Un (1) mes y ampliación de monto por \$84,136.87 (L.2,103,421.75) del Contrato de Consultoría suscrito con el CONSORCIO SAMAN-ASP, solicitada desde el 28 de mayo de 2024. Actualmente está pendiente de ser firmada por las partes.

- Se ha elaborado un primer borrador de Manual Operativo del Proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira” Préstamo BCIE No.2261, pero debe definirse previo a su versión final, si incluirá el proyecto de Tegucigalpa Código 110359, de acuerdo con las decisiones de las máximas autoridades del FHIS, SEFIN, BCIE Y Congreso Nacional definan, antes de que se inicien las obras de Gracias, Lempira.

Logros y Avances del Proyecto “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sureste de Tegucigalpa”.

- En ejecución la consultoría CPN-FHIS-20-2023, financiada con fondos nacionales, llamada “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sureste de Tegucigalpa”, con los siguientes hitos:
 - La empresa contratada para ejecutar el diseño del proyecto es Gabinete Técnico S.A. (GATESA).
 - El contrato se firmó el 21 de noviembre del 2023.

Monto de la consultoría: L. 13,225,678.13

Plazo de la consultoría: 9 meses

Etapas de Diseño: 5 meses, el 1er informe se recibió el 21 de febrero y el Informe Final de Carpeta de Diseño continúa previsto para el 21 de abril del 2024 pero debido a que se presentó una ampliación de tiempo de 26 días, la fecha de entrega final correspondió al 17 de mayo del 2024, diseño que actualmente sigue siendo revisado por parte de la UEP y mejorado por parte de la empresa consultora GATESA.

Etapas de respuesta de preguntas de los oferentes: 4 meses (aproximadamente)

- La orden de Inicio correspondiente fue dada para el 21 de noviembre del 2023.
- Recibido y aprobado el primer producto llamado “Informe Inicial del proyecto de Consultoría”.
- Recibido y aprobado el segundo producto “Informe de avance intermedio de las mejoras a implementar”.
- Recibido el borrador del informe de la Carpeta Final de la Cuenca y Planta de Tratamiento que le corresponde de San José de la Vega, quedando pendiente la parte de Agua Salada y Río Choluteca

que desembocan en la Planta de PRRAC-ASAN, el plantel de San José de la Vega, para lo cual FHIS debe instruir a la Dirección de Proyecto para que haga el seguimiento respectivo y cierre del contrato.

Cabe señalar que la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) se ha encargado de realizar la revisión de los aspectos técnicos y socio ambientales de ambos informes, asegurándose que cumplan los términos fijados en el contrato suscrito entre FHIS y GATESA, sin embargo, la gestión de aprobación y pago corresponde a las instancias administrativas y financieras del ciclo FHIS.

xi. Problemática presentada en el III trimestre 2024

Proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”.

- No se podrá cumplir con las metas financieras propuestas para el año 2024 y posiblemente para las del 2025, ya que se nos informó verbalmente por parte del BCIE, que no se pueden iniciar el proceso de licitación de las obras del proyecto de Gracias, Lempira, mientras no sea aprobada la Modificación N°1 al contrato de Préstamo BCIE N° 2261, además de que no se cuenta, por parte de la alcaldía de Gracias, con el requerimiento de las Escrituras de predios y servidumbres de paso.
- Se mantienen como riesgos en el caso del proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”:
- Que las empresas coreanas no tengan interés en participar en la ejecución de obras por ser un monto aproximado de \$ 7,600,000.00, valor que puede no ser atractivo para las empresas constructoras de ese país.
 - a) Que no exista tampoco interés de hacer consorcio las empresas constructoras hondureñas con las coreanas para participación para la licitación de obras.
 - b) Que los tramites a lo interno del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) no se puedan realizar en los tiempos esperados.
- c) Que el sistema FHIS no permita hacer los pagos en dólares tanto de Supervisión, como de ejecución de obras, condiciones que deben quedar claras en la base de la licitación de obras.

- d) Que los costos de las ofertas para las obras sean mayores a los que se han estimado.
- e) Que la Alcaldía Municipal de Gracias, departamento de Lempira, no tenga un esquema de regulación del uso racional del Agua potable como norma y no cumpla con la operación y mantenimiento que se requiere al concluirse las obras.
- f) Que la alcaldía de Gracias no presente las escrituras requeridas en tiempo y forma.
- g) Que la Alcaldía de Gracias, al instalar la micro medición para cada uno de los abonados, provoque un rechazo y problemas sociales en la zona, proyecto que se ha programado ejecutar con fondos del Banco Mundial por medio de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
- h) Que la alcaldía autorice proyectos de urbanización sin considerar la capacidad de diseño con la fuente del río Arcagual, con la que se ha planificado ejecutar este proyecto, dando como resultado la disminución en la vida útil del mismo y no poder abastecer en épocas de sequía a toda la población que está creciendo en forma desordenada.
- i) Que la Alcaldía de Gracias no tenga definido en legal y en debida forma el predio destinado para el otro reservorio a ser requerido posteriormente para que se cumplan los 20 años de vida útil de diseño.
- j) Que la empresa SAMAN-ASP, como firma consultora del proyecto en Revisión, ajuste al diseño y supervisión solicite incremento en tiempo y costos por consideraciones adicionales a lo establecido en el contrato, común en los proyectos de ampliación, mejoras o reparación.

Proyecto “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sureste de Tegucigalpa”.

- Por parte de la firma GATESA, se ha recibido el borrador del informe de la Carpeta Final de la Cuenca y Planta de Tratamiento que le corresponde de San José de la Vega, quedando pendiente la parte de Agua Salada y Río Choluteca que desembocan en la Planta de PRRAC-ASAN, el plantel de San José de la Vega, para lo cual FHIS debe instruir a la Dirección de Proyecto para que haga el seguimiento respectivo y cierre del contrato.
- Se tiene pendiente solicitud de 26 días para trámite de ampliación de plazo por parte de GATESA, en el proyecto Contrato de Consultoría de diseño “Mejoramiento de la Red de Colectores y Planta de Tratamiento Aguas Residuales del Sureste de Tegucigalpa”

- Para el producto “Informe Carpeta Técnica de Diseño Final”, la UEP ha apoyado con la revisión técnica y correcciones entregados por la firma consultora contratada GATESA para el proyecto “Mejoramiento de la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sureste de Tegucigalpa” (ejecutado con fondos nacionales), en proceso de revisión y aprobación del producto, pero es necesario se defina el cierre administrativo y financiero de los pagos del diseño.
- El proyecto de Tegucigalpa requiere de disponibilidad de vehículo, por lo que es recomendable disponer de parqueo en el Centro Cívico Gubernamental.
- En vista que no se define si el proyecto de Tegucigalpa entra en el financiamiento del contrato de préstamo, no se ha podido realizar un Convenio de Colaboración entre SEDECOAS-FHIS e INFOP que permita capacitar en albañilería y fontanería a jóvenes en riesgo social, tomando en cuenta las zonas de intervención del proyecto.
- En el proyecto “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sureste de Tegucigalpa”, se consideran los siguientes riesgos:
 - a) Que la UMAPS de Tegucigalpa, no logre agrupar el personal calificado para participar en este tipo de procesos, necesarios para el Fortalecimiento institucional de la UMAPS, quien debe garantizar alcanzar la operatividad y mantenimiento que requiere este tipo de proyectos.
 - b) Que no se puedan conseguir los fondos para la ejecución del 100% del proyecto diseñado.
 - c) En el caso que el proyecto sea financiado con fondos del Contrato de Préstamo BCIE N°2261, las empresas coreanas no quieran participar en los procesos de contratación.
 - d) Que los costos del proyecto de diseño de Tegucigalpa sean mayores a lo planificado, debido a que lo que se está solicitando como ampliación de PTAR y Colectores va más allá de los fondos disponibles de BCIE para su construcción.

- e) Que con el diseño se den soluciones para mejorar las plantas de tratamiento con datos de población proyectada a futuro, incluyendo lugares que están sin habitar, obligando a coordinar una construcción de una planta de tratamiento en el plantel de la Vega, sin que se tenga fortalecida las capacidades institucionales de UMAPS para que haga los trámites para obtener los fondos y hacer los procesos de adquisición.
 - f) Que por razones de poca disponibilidad financiera debamos decidir rehabilitar la planta y colectores con los diseños existentes, sin ningún tipo de ampliación de colectores, ni unificación de las dos plantas de depuración existente.
 - g) Que la inseguridad de las zonas afecte la construcción de las obras o la pérdida de bienes y/o personas que intervendrán en el proyecto.
 - h) Que no se pueda coordinar en tiempo y forma con Planificación Estratégica, SEFIN, con BCIE y el Congreso Nacional la modificación N°1 del Contrato de Préstamos N° 2261, para que la construcción de los dos proyectos sea ejecutada, ya que a pesar de que el contrato de préstamo era para Gracias-Lempira, las modificaciones de contrato del préstamo, según BCIE, requiere de este trámite obligatorio antes de que se inicien las obras.
- En vista de los riesgos analizados se recomienda el trámite adicional de contratación de un seguro médico y de vida para el personal de la Unidad Ejecutora, por los riesgos sociales que involucran las maras y pandillas que hay en las zonas a ser intervenidas, así como las posibles afecciones en la salud que este proyecto implica.

Modificación al Contrato de Préstamo No. BCIE 2261

Es necesario que se defina a esta Unidad Ejecutora, si proceden las acciones a seguir:

Procedimiento para efectuar la modificación del contrato de préstamo No.2261-BCIE, según SEFIN:

- a) Se requiere decidir que solamente se utilicen los fondos para el proyecto de Gracias y que el remanente no sea utilizado por el gobierno de Honduras.

b) Se requiere decidir si se hace la FASE I: incluir en el contrato de préstamo el proyecto de Tegucigalpa, específicamente las obras de la cuenca de San José y la rehabilitación de la PTAR correspondiente, para lo que se requerirá preparar la Enmienda N°1 a la Nota de Prioridad del Contrato de Préstamo N° 2261, así como preparar una Nueva Nota de Prioridad que incluya el remanente de los fondos que queden del proyecto de aguas de Gracias en el Proyecto de “Mejoramiento de la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la Cuenca San José”, y así ejecutar los \$36,000,000,00 de este contrato de préstamo.

c) Se requiere decidir si se hace la FASE II: para la cual se requiere el acercamiento entre el Ministro del FHIS y el Ministro de Finanzas en la que se den los lineamientos para establecer la fuente de financiamiento que se debe gestionar para completar el proyecto de “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sureste de Tegucigalpa”, que puede andar por el rango de \$80,000,000.00.

xii. Recomendaciones

1. Es necesario nos instruya el enfoque que como Gobierno se seguirá para obtener el financiamiento que se quiere para para ejecutar las obras del proyecto de Tegucigalpa. (Para definir si solo se harán las obras de Gracias o si se deben incluir las obras totales establecidas en Fase I y II indicadas anteriormente).
2. Establecer que el Proyecto de Gracias Lempira se puede licitar como normalmente se ha hecho, dejando que la Alcaldía haga el proceso de escrituración cuando los propietarios tengan certeza de la ejecución del proyecto.
3. Establecer procesos claros y definitivos por parte del ciclo FHIS, para lograr que los pagos en dólares del consorcio SAMAN-ASP no sufran problemas y retrasos por

generar errores en el sistema de FHIS, condición que, si no se resuelve, será más grave en la ejecución de las obras con el retraso de pagos, lo cual podría ser un riesgo que implique el pago de intereses a ambas empresas, montos que pueden ser reparables para los responsables del retraso.

4. Que se haga lo antes posible el trámite de aprobación oficial en Comité de Operaciones de enmienda al contrato de GATESA, encargado del diseño del proyecto de Tegucigalpa por ampliación de 26 días de plazo.
5. Que se instruya por parte de las autoridades de FHIS sobre el trámite administrativo y financiero a seguir con los productos que se encuentran pendientes de aprobación a favor de GATESA, ya que se ejecuta con fondos nacionales, y por tanto esta Unidad Ejecutora no es responsable de dicho contrato, pero en vista que no se define si será incluido dentro del contrato de préstamo BCIE N°2261, se informa que la revisión del producto de la Carpeta Final de diseño deberá estar a cargo de la Dirección de Proyectos del FHIS, por ser un contrato de Fondos Nacionales, concluyendo el apoyo técnico solicitado a esta Unidad por el Ex Ministro del FHIS Octavio Pineda el 25 de abril de 2023.
6. Se solicita instrucción para confirmar nuestra participación en el conversatorio llamado “El futuro del agua en Tegucigalpa”, donde entre otros temas, se socializará el proyecto en mención, el 11 de octubre del 2024.
7. Que se instruya por parte de las autoridades de Gobierno si el Proyecto de Tegucigalpa, de la Planta de Tratamiento y Colectores de San José de La Vega será ejecutado con fondos del Contrato de Préstamo BCIE N°221 y además definir si el contrato de las firmas consultoras SAMAN-ASP (incluye diseño y supervisión) y GATESA (incluye solo diseño) deben ser rescindidos o suspendidos por un año o menos si así lo estiman conveniente, mientras se obtiene el financiamiento de las obras, para la supervisión y los gastos operativos correspondientes a la Enmienda del Contrato de Préstamo en mención, situación que conlleva la eventual indemnización a favor de ambas empresas.

8. Es necesario poder socializar ante BCIE el inicio de la licitación de obras del proyecto de Gracias, Lempira en el 2024, sin que se haya concluido la aprobación a la modificación del Contrato de Préstamo, para alcanzar las metas establecidas en el año 2025, ya que se requiere la aprobación del Congreso Nacional para la Modificación al Contrato de Préstamo BCIE N°2261 y representa un alto riesgo que los proyectos de Gracias, Lempira y Tegucigalpa, cuyos diseños ya se tienen, no se ejecuten las obras en los tiempos programados.
9. Asimismo, para cumplir las metas del inciso anterior, es conveniente que el proceso de Escrituración de los predios a favor de la municipalidad de Gracias, Lempira y Tegucigalpa se gestione en forma simultánea durante la ejecución de las obras.
10. La incertidumbre que durante el año 2024 ha enfrentado la Unidad Ejecutora en cuanto si procede o no, la ejecución de los proyectos de Gracias-Lempira y Tegucigalpa, ha derivado en el retiro de la Especialista de Adquisiciones y la Asistente Administrativa, quienes de acuerdo a su capacidad técnica optan por buscar nuevas oportunidades.- Esto ocasiona mayores efectos negativos en el trabajo requerido por la Unidad Ejecutora, pues en tanto se mantiene la incertidumbre, no es posible determinar si se inicia o no el proceso de concurso para cubrir ambos cargos.
11. Es necesario establecer una Comisión conformada por personal de la Dirección de Administración y Finanzas, UPEG y la Unidad Ejecutora para negociar la disminución del pago de la Auditoría Externa del Contrato de Préstamo para el año 2024, el cual puede ser compensado en los siguientes años que se ejecute el Contrato de Préstamo. - Al mismo tiempo se debe contemplar la posibilidad de suspender o rescindir el contrato, mientras se concluye la modificación del Contrato de Préstamo.

CARTERA KfW



✓ Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V



I. Objetivo General

Consiste en la utilización de centros educativos mejorados, ampliados o nuevos y equipados bajo conceptos pedagógicos que operan de manera sostenible por la comunidad educativa. De esta manera se pretende contribuir a que niños/as y jóvenes de regiones pobres utilicen una oferta de alta calidad educativa, tanto formal como de educación vocacional.

II. Focalización

Fase IV: El Área de intervención abarcará los departamentos que están siendo intervenidos en las fases anteriores (Zona de Occidente): 1) Copán, 2) Santa Bárbara, 3) Intibucá, 4) Lempira, 5) La Paz, 6) Ocotepeque. 7) Centros a nivel nacional en casos de emergencia (catástrofes naturales). La información de estos centros deberá ser actualizada en el plan maestro y sólo si se determina su precariedad, podrán ser intervenidos previo a No Objeción del KfW. 8) Adicionalmente se extenderá el área de intervención a los departamentos adyacentes a la zona de occidente, delimitando el área de intervención a través de la Carretera Panamericana. Los municipios a ser beneficiados se encuentran al oeste de la misma en los siguientes departamentos: 1) Choluteca, 2) Valle, 3) Francisco Morazán (exceptuando el núcleo urbano de Tegucigalpa), 4) Comayagua y adicionalmente 5) Gracias a Dios.

Fase V: El Área de intervención abarcará los departamentos de: Ocotepeque, Lempira y Copan, en la zona de Occidente. Además, los departamentos al oeste de la carretera CA-5 de los departamentos de Francisco Morazán (exceptuando el Distrito Central), Valle, Choluteca, Comayagua. También seguirá formando parte del Programa el Departamento de Gracias a Dios (siempre y cuando no se alcance un mínimo de infraestructura en este departamento y según las experiencias de la fase IV del PROMINE).

III. Priorización de los Centros Educativos

Esta es realizada por la Secretaría de Educación apoyados en la herramienta del Plan Maestro de Infraestructura Educativa.

IV. Descripción del Proyecto

Fase IV: El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y en la planificación estratégica para los años 2014 - 2018 de la Secretaría de Educación (SE). El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las tres fases previas PROMINE I, II y III. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

Fase V: El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y el Plan Estratégico del Sector de Educación para los años 2017 - 2030 de la Republica de Honduras. El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las cuatro fases previas PROMINE I, II, III y IV. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

V. Modalidad de Ejecución

Fase IV: La Modalidad de Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC), se refiere a donde los recursos son transferidos de la SEDECOAS-FHIS a las Municipalidades y está a las comunidades debidamente organizadas, capacitadas y asesoradas, para que realicen las actividades requeridas para la realización de su proyecto, asumiendo ambos la responsabilidad de una ejecución eficiente, y el manejo transparente de los recursos financieros. Estos procesos son debidamente acompañados por profesionales técnicos y sociales contratados por las Comunidades, Municipalidades, Mancomunidades o el SEDECOAS-FHIS.

En el caso de los proyectos en Gracias a Dios este varía dada una coadministración Municipalidad-Comunidad.

VI. Actores Claves

La ejecución del Programa será responsabilidad de la Secretaría de Educación (SE) como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS) como Entidad Ejecutora.

Considerando la modalidad de ejecución descentralizada de Proyectos Ejecutados por la Comunidad de manera local son actores importantes las Municipalidades y la Comunidades beneficiadas.

VII. Monto del Proyecto Fase IV:

Componente	KfW	FHIS	SE	Municipalidades	Comunidades	Total
Infraestructura	13,420,685.00	0	0	257,000.00	514,000.00	14,191,685.00
Fortalecimiento FHIS	400,000.00	0	88,000.00	0	0	488,000.00
Asistencia Técnica	779,315.00	0	0	0	0	779,315.00
Fortalecimiento SE	400,000.00	0	0	0	0	400,000.00
Gastos Operativos	0.00	424,000.00	130,000.00	257,000.00	0	811,000.00
Total	15,000,000.00	424,000.00	218,000.00	514,000.00	514,000.00	16,670,000.00

Fondos de Donación por un monto de EUR 15,000,000.00, Contrapartida Nacional para SEDECOAS/FHIS de EUR 424,000, Contrapartida Nacional para SE de EUR 218,000, Contrapartida Municipal de EUR 515,000 y Contrapartida Comunitaria de EUR 514,000.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 03/12/2015

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 17/02/2017

Fecha de Inicio: 02 de abril 2018 (Se considera la fecha de inicio de la Consultoría)

Fecha de Finalización de convenio: 31/07/2024, **se ha solicitado una ampliación hasta el 31 de diciembre 2024.**

VIII. Monto Desembolsado

CONVENIO	ORGANISMO	Financiamiento			Por Desembolsar
		Moneda	Monto Total del Convenio	Desembolsado al 30/09/2024	
2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE - Cooperación Financiera Oficial entre Alemania y Honduras Programa de Mejora de La Infraestructura Escolar PROMINE IV	KFW	EUR€	€ 14,600,000.00	€ 14,600,000.00	0.00

IX. Modalidad de Ejecución

Fase V: Modalidad de Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC), se refiere a donde los recursos son transferidos de la SEDECOAS-FHIS a las Municipalidades y está a las comunidades debidamente organizadas, capacitadas y asesoradas, para que realicen las actividades requeridas para la realización de su proyecto, asumiendo ambos la responsabilidad de una ejecución eficiente, y el manejo transparente de los recursos financieros. Estos procesos son debidamente acompañados por profesionales técnicos y sociales contratados por las Comunidades, Municipalidades, Mancomunidades o el SEDECOAS-FHIS. En el caso de los proyectos en Gracias a Dios este varia dada una coadministración Municipalidad-Comunidad. Los proyectos de Infraestructura ejecutados bajo esta modalidad se enmarcan en el financiamiento de cuatro componentes para el desarrollo de los mismos: 1) I Bloque de Capacitación. 2) Inversión 3) Supervisión de Inversión y 4) II Bloque de Capacitación denominado Capacitación, o descentralizada.

X. Actores Claves Fase V

La ejecución del Programa será responsabilidad de la Secretaria de Educación (SE) como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS) como Entidad Ejecutora.

En la modalidad de ejecución descentralizada de Proyectos Ejecutados por la Comunidad de manera local son actores las Municipalidades y la Comunidades beneficiadas y en la modalidad centralizada las empresas constructoras, consultores o firmas consultoras.

- **Monto del Proyecto Fase V:**

Componente	KfW	FHIS	SE	Municipalidades	Comunidades	Total
Infraestructura	8,145,409.57	0	0	300,000.00	600,000.00	9,045,409.57
Fortalecimiento FHIS	400,000.00	0	100,000.00	0	0	500,000.00
Asistencia Técnica	854,590.43	0	0	0	0	854,590.43
Calidad Educativa	200,000.00	0	0	0	0	200,000.00
Fortalecimiento SE	400,000.00	0	0	0	0	400,000.00
Gastos Operativos	0	495,000.00	150,000.00	300,000.00	0	945,000.00
Total	10,000,000.00	495,000.00	250,000.00	600,000.00	600,000.00	11,945,000.00

Fondos de Donación por un monto de EUR 10,000,000.00, Contrapartida Nacional para IDECOAS/FHIS de EUR 495,000, Contrapartida Nacional para SE de EUR 250,000, Contrapartida Municipal de EUR 600,000 Contrapartida Comunitaria de EUR 600,000.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 06/07/2018

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 21/03/2019

Fecha de Inicio: Inicio de la Consultoría 18 de marzo

Fecha de Finalización de convenio: 18 de abril 2024, **solicitada la ampliación hasta el 31 de marzo del 2026 sin embargo el Dictamen de la SEFIN otorgo el plazo hasta 18 de abril del 2025.**

- **Monto Desembolsado**

CONVENIO	ORGANISMO	Financiamiento			Por Desembolsar
		Moneda	Monto Total del Convenio	Desembolsado al 30/09/2024	
BMZ 2016 68 763 - Mejora de la Infraestructura Escolar, PROMINE V	KFW	EUR€	€ 9,400,000.00	€ 3,814,722.37	€ 5,585,277.63

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2016	145.687.475,00	142.916.817,45	98%
2017	107.279.375,00	96.731.967,93	90%
2018	53.035.502,00	50.951.601,81	96%
2019	81.069.633,00	79.762.875,76	98%
2020	134.608.478,00	123.221.616,32	92%
2021	139.936.980,00	119.695.679,72	86%
2022	102.757.410,00	66.787.201,74	65%
2023	126.728.365,00	112.691.821,90	89%
2024	100.706.375,00	4.970.130,16	5%

- Avance Físico por Sector PROMINE FASE IV y V

i. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
EDUCACION	2	7	1.268.802,08	153	2.592
TOTAL	2	7	1.268.802,08	153	2.592

ii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
COMAYAGUA	0	1	-	33	439
COPAN	2	1	-	23	200
FRANCISCO MORAZAN	0	1	-	20	954
GRACIAS A DIOS	0	1	-	25	369
LA PAZ	0	0	795.805,73	0	0
LEMPIRA	0	1	472.996,35	16	214
OCOTEPEQUE	0	1	-	21	262
OLANCHO	0	1	-	15	154
TOTAL	2	7	1.268.802,08	153	2.592

iii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	2.402.070,71
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA*	1.299.257,37
TOTAL	3.701.328,08

*Viaticos, pasajes y Combustible

- **AVANCE GENERALES**

El estatus físico para los 33 proyectos considerados en Fase IV se detalla a continuación:

Estatus	No. Proyectos
Finalizado	20
En ejecución	3
Suspendido, en proceso de compras de equipamiento	5
Rescindido y recuperado fondos	5
Total General	33

El detalle de cada uno de los proyectos se presenta en el anexo 1, sin embargo, a continuación, se detallan proyectos que requieren atención especial que son los que se encuentran suspendidos:

1. **107571, Reparación CEB Francisco Morazán y Jardín de Niños Carlos Emérito Portillo NO1 Y NO2.** Se revisó la propuesta presentada por el contratista sin embargo es muy elevada con respecto a lo disponible para la finalización del proyecto, por lo cual se ha solicitado a la comunidad considere contratar únicamente la mano de obra y que realicen la compra de los insumos. Su estatus es suspendido administrativamente.
2. **107732, Ampliación CEB La Fraternidad y CEPB Mi Esperanza.** En este mes se han definido en conjunto con Auditoría Interna el listado y cantidades de obras que comprenden la orden de cambio final, a su vez se están pendientes la compra de los últimos insumos que no han encontrado. Su estatus es suspendido administrativamente.
3. **107735, Reposición CEB Francisco Morazán y JN Francisco Filiberto Isaula.** Durante este mes se dio No Objeción a la compra de ciertos insumos y en la semana del 07 de octubre se realizará el

levantamiento por parte de inspección de las actividades e insumos pendientes para su finalización. Su estatus es suspendido administrativamente.

4. **107884, Ampliación Instituto Jenrry Santos Padilla.** Se ha definido la orden de cambio del proyecto dando paso a su finalización, se estima que en la semana del 07 de octubre esta sea presentada por el Supervisor Docente. Su estatus es suspendido administrativamente.
5. **107912, Construcción Instituto El Progreso.** Actualmente está suspendido, en fecha 03 de septiembre la empresa AGROPEC realizará entrega de marmita en el proyecto. Adicionalmente se ha comenzado con el proceso de compra para Laboratorio de Control y Calidad y se está analizando el ingreso de una Cláusula por Incremento en concepto de Insumos.

Estatus Físico de las obras FASE V.

Estatus	No. Proyectos
En reformulación	2
En contrataciones	1
En ejecución	4
Suspendido	1
Finalizado	1
Total General	9

El detalle de cada uno de los proyectos se presenta en el anexo 2, pero a continuación se presentan detalles de proyectos que requieren atención especial

1. **109112, Ampliación CEB SAT América y CEPB Rosa Canelo.** La orden de cambio por un monto de 5,188,182.12 lempiras que representa un 24.33 % con respecto al monto original, se encuentra en revisión de la Unidad de Costos, sin embargo, a nivel de autoridades de la Dirección de Control y Seguimiento y Asesoría del Despacho se han realizado varias reuniones para discusión de la situación y el estatus de la empresa constructora en la institución, manifestando la posibilidad de un análisis legal y/o técnico para rescindir el contrato. De parte de esta Coordinación se ha manifestado que, si es lo procedente y con el sustento legal y técnico, se deberá notificar al KfW, informar a la comunidad e **iniciar** el proceso de rescisión prontamente, así como la formulación, aprobación y contratación del nuevo proyecto para lograr cumplir los tiempos de cierre de la fase V.

En el caso de la Supervisión se le ha solicitado un informe donde presente las actividades de ordenes de cambio que considera necesarias para la funcionalidad del centro educativo, así como las pruebas técnicas que fundamenten esta propuesta, la cual deberá ser presentada a la SEDUC. Con respeto a la habilitación del consultor, esta está en proceso ya que ha realizado el pago del monto adeudado al FHIS.

- 109483, Ampliación Instituto Gubernamental Técnico Francisco Morazán.** El proyecto inicio actividades en fecha 24 de septiembre, sin embargo, se ha detectado que pronto será necesario reestructurar el CEP, dadas varias situaciones en la comunidad.

Es importante indicar que este proyecto se encuentra en el límite de la ampliación del programa por lo cual su ejecución debe impulsarse no tenga demora, adicionalmente se ha contemplado el segundo desembolso para este año.

- 109243, Reposición CEB Cerro Grande Zona 2,** Se ha formalizado la negociación con la empresa constructora y supervisora para la reducción de tiempo de ejecución considerando la ampliación del programa, con una duración para la obra 12 meses y la supervisión 13 meses. Se ha estado dando seguimiento a la Dirección de Contrataciones para el envío del borrador de contrato de supervisión a No Objeción del KfW y la modificación al contrato de obra.
- 109111, Reposición Escuela y Jardín De Niños Jesús Mejía Paz y 109113, Reposición CEB Republica de Costa Rica y JN Stanley Goff,** las bases de licitación de obra se cuenta con visto bueno de la Dirección de Legal y Contrataciones y se estará enviando a revisión a KfW previo a su No Objeción y la supervisión cuenta con visto bueno de Contrataciones sin embargo la Dirección de Legal sugirió realizar un cambio en los contratos modificación que está en proceso.

El Proyecto 109113 se encuentra en revisión de la Unidad de Control de Calidad y el 109111 en conformación de expediente.

Avance de Ejecución Física 2024

Programa	Anual			Al III Trimestre			Comentarios
	Programación	Ejecución	%	Programación	Ejecución	%	
Mejora de la Infraestructura Escolar	7	2	28.6%	4	2	50%	En lo referente a la ejecución física, se finalizó un proyecto sin embargo los dos proyectos programados finalizarse llegaron a un avance físico del más del 90% sin embargo hay compras de equipamiento pendiente, por lo cual se reportarán en el próximo trimestre.

Proyectos finalizados 2024

Código De Proyecto	Descripción Proyecto	Departamento	Municipio	Aldea	Beneficiario Directos	Empleos Generado
107750	Reparación CEB Profa. Olga Ondina López	Copan	La Unión	La Unión	352	21
109116	Reparación CEB Francisco Morazán	Copan	San Antonio	La Zumbadora	188	22

Ejecución Presupuestaria 2024

Programa	Anual			Al III Trimestre			Comentarios
	programación	Ejecución	%	programación	Ejecución	%	
Mejora de la Infraestructura Escolar	100,706,375.00	4,997,723.92	5.0%	9,977,154.00	548,695.51	5.5%	<p>En este trimestre los gastos realizados corresponden al gasto operativo para las visitas a los proyectos en ejecución. Se ha reportado que aproximadamente 40mm no se estarán ejecutando del presupuesto vigente.</p> <p>La diferencia en lo ejecutado financieramente con lo planificado corresponde a: al pago del anticipo del proyecto 109243; Reposición CEB Cerro Grande Zona 2, ubicado Col. Cerro Grande, Municipio Distrito Central, Departamento Francisco Morazán, sin embargo, al no contar con la ampliación este no se adjudicó; la No Objeción de la ampliación del PROMINE fase V se recibió el 16 de septiembre por lo cual no se ha realizado la adenda al contrato de la Asistencia Técnica acumulando y por ende sus pagos. A la fecha se acumula el I y II trimestre</p>

Proyección de Ejecución Presupuestaria 2024

Fuente	Presupuesto Vigente	Devengado Aprobado Al 31 De Agosto 2024	% De Ejec. Al 31 De septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Proyección Octubre A Diciembre	Total Proyección 2024	% De Ejec. Final Proyectada
11 - Tesoro Nacional	5,323,168.00	1,616,711.30	30%	616,315.40	1,085,067.30	489,533.10	2,190,915.80	3,807,627.10	71.53%
22 - Donaciones Externas	95,383,207.00	3,381,012.60	3.50%	9,239,353.80	11,383,496.00	33,305,800.00	53,928,649.80	57,309,662.50	60.10%

El desfase con respecto al presupuesto vigente se debe en su mayoría a que cuando se formuló el presupuesto 2024 en mayo 2023 se consideró proyectos que estarían en plena ejecución en el 2024 sin embargo alguno de ellos se han visto afectados por: cambios en la modalidad de contratación, reformulaciones, ordenes de inicio, ampliación de la vigencia de la fase V, entre otros. También se consideró la ejecución del componente de Fortalecimiento Institucional sin embargo este se ha considerado apoye la operatividad del Programa considerando la ampliación hasta el 31 de marzo del 2026 por lo cual su uso ha sido limitado.

A continuación, se detallan los desfases por componentes en la ejecución del 2024:

Componente de Infraestructura

Código de Proyecto	Descripción Proyecto	Tipo de Contrato	Departamento	Municipio	Ejecución Estimada en 2023 para 2024	Ejecución Estimada Actual	Observaciones
109111	Reposición Escuela Y Jardín De Niños Jesús Mejía Paz	Inversión	Gracias A Dios	Wampusirpi	8,523,057.95	0.00	En reformulación
109111	reposición Escuela Y Jardín De Niños Jesús Mejía Paz	Supervisión De Inversión	Gracias A Dios	Wampusirpi	852,305.80	0.00	En reformulación
109112	Ampliación CEB SAT América Y CEPB Rosa Canelo	Inversión	Gracias A Dios	Juan Fco. Bulnes	20,467,112.60	6,927,441.78	Suspendido. Esta estimación actual dependerá si se continua con la ejecución del proyecto.
109112	ampliación CEB SAT América Y CEPB Rosa Canelo	Supervisión De Inversión	Gracias A Dios	Juan Fco. Bulnes	1,943,700.00	378,262.11	Suspendido
109113	reposición CEB Republica De Costa Rica Y JN Stanley Goff	Inversión	Gracias A Dios	Brus Laguna	9,010,128.79	0.00	En reformulación
109113	Reposición CEB Republica De Costa Rica Y JN Stanley Goff	Supervisión De Inversión	Gracias A Dios	Brus Laguna	901,012.88	0.00	En reformulación
109243	Reposición CEB Cerro Grande Zona 2	Inversión	Francisco Morazán	Distrito Central	27,664,982.54	5,532,996.51	En adjudicación
109243	Reposición CEB Cerro Grande Zona 2	Supervisión De Inversión	Francisco Morazán	Distrito Central	3,252,665.75	325,266.58	En adjudicación
Total					72,614,966.30	13,163,966.98	

Componente de Fortalecimiento FHIS

Ejecución Estimada en 2023 para 2024	Ejecución Estimada Actual	Observaciones
6,403,012.00	324,150.00	Se está estimando su uso para Gasto Operativo

Componente de Gasto Operativo

Objeto de Gasto	Descripción Objeto de Gasto	Disponibilidad	Acciones
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	60,000.00	No se requieren en vista que la Gerencia 1 asumió su contratación temporalmente
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	1,238,200.00	No se requieren en vista que la Gerencia 1 asumió su contratación temporalmente
27210	Tasas	10,000.00	No se requiere estimando el costo del año anterior
33100	Producto de papel y cartón	20,000.00	No se realizarán compras
34400	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	No se realizarán compras
35620	Diesel	48,169.00	Remanente analizando con lo gastado mensualmente
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	remanente analizando con lo requerido
Total		1,526,369.00	

• LOGROS AL III TRIMESTRE

- 1) Se han finalizado dos proyectos ejecutados bajo modalidad PEC: 107750 “Reparación CEB Olga Ondina López”, ubicado en Barrio La Cruz, Municipio de La Unión, Departamento de Copán, según lo programado y el 109116 “Reparación CEB Francisco Morazán”, ubicado en Aldea La Zumbadora, Municipio de San Antonio, Departamento de Copán.
- 2) Se ha otorgado la No Objeción a la Ampliación de la fase IV hasta el 31 de diciembre del 2024
- 3) Se ha otorgado la No Objeción a la Ampliación de la fase V hasta el 31 de marzo del 2026.
- 4) Se han recuperado la totalidad de los fondos de los cinco proyectos rescindidos por incumplimiento al Gracias a Dios.

- **RETOS**

- 1) Contratación del personal de inspectoría social, ya que el personal que actualmente apoya al Programa no está a tiempo completo dificultando el seguimiento de los proyectos.
- 2) Contratación del asistente financiero y contable, de suma importancia para la operatividad del programa.
- 3) Formalización de la priorización de los proyectos de mobiliario por la Secretaria de Educación para comprometer los remantes del componente de Infraestructura de la fase IV. Los proyectos deberán ser formulados en la Dirección de Proyectos, contratados y ejecutados en un corto plazo. Por lo cual se requiere de un fuerte apoyo de la Direcciones de Línea.
- 4) Atención de la Dirección de Control y Seguimiento a los proyectos que se encuentran suspendidos y pendientes de orden de inicio, detallados para la fase V y IV anteriormente.
- 5) Atención de la Dirección de Control y Seguimiento a los proyectos que se encuentran pendientes los ingresos de cierre y que tienen un tiempo transcurrido considerable desde su finalización.
- 6) Presentación al KfW de informe Final Auditoria, dicha auditoria se inició el 24 de junio del presente.
- 7) Adenda de tiempo y monto del Contrato de la Asistencia Técnica, la cual está elaborada y en revisión de la Dirección de Legal y Contratación ya que se han confirmado los monto, adicionalmente para su firma se requiere el un Dictamen de la SEFIN para el traslado entre componentes el cual será remitido a la UPEG el día 07 de octubre.
- 8) Aprobación de la modificación presupuestaria solicitada el 06 de septiembre para iniciar los procesos de compra financiados con el Componente de Fortalecimiento FHIS fase IV.
- 9) Reformular, Contratar e Iniciar de los proyectos 109111, Reposición Escuela y Jardín de Niños Jesús Mejía Paz Y 109113, Reposición CEB Republica De Costa Rica y JN Stanley Goff.

✓ **Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) Fase II y Fase III**



i. Objetivo General

Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).

ii. Focalización Fase II

A través de un proceso de concurso con criterios de selección predefinidos en el acuerdo separado y evaluación de propuestas técnicas alineadas a los componentes del programa fueron seleccionados 4 municipios en donde se está realizando la intervención del CONVIVIR a través de obras de infraestructura y medidas de alcance social para beneficio enfocado en la juventud. Así mismo se definieron los barrios, colonias o comunidades urbanas en donde se focaliza las acciones y en donde ya se ha realizado una labor de socialización de los alcances, compromisos y beneficios para la población. Los municipios seleccionados son:

- Municipio de Juticalpa, departamento de Olancho
- Municipio de Intibucá, departamento de Intibucá
- Municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá
- Municipio de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán

Departamento	Fase I	Fase II	Fase III
	Municipio	Municipio	Municipio
Comayagua	Siguatepeque		
Cortes	La Lima		
Lempira	Gracias		
Olancho		Juticalpa	
Intibucá		Intibucá	
		La Esperanza	

Copán		Santa Rosa de Copán	
Yoro			El Progreso
Yoro			Yoro
El Paraíso			Danlí
La Paz			La Paz

iii. Descripción del Proyecto

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

iv. Modalidad de Ejecución

El programa CONVIVIR tiene por brazo ejecutor al SEDECOAS-FHIS, concebido de tal forma que se apoya en el ciclo de proyectos de la institución para desarrollar cada una de sus acciones en el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el Acuerdo Separado. Para tal efecto interactúan coordinadamente 2 equipos de trabajo siendo la Unidad Administradora del Programa (UAP) y la Asesoría Técnica del CONVIVIR.

v. Financiamiento

FASE	No. CONVENIO	MONTO (MILLONES DE EUROS)	TIPO DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
I	BMZ-No. 2011-65-364	10.0	Préstamo	Kridistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)
II	BMZ-No. 2016-65-348	6.0	Préstamo	
III	BMZ-No. 2018-67-563	10.0	Donación	-KFW-

vi. Monto del Proyecto:

Los fondos destinados para la ejecución de este Programa para la Fase II es de EUR 6,000,000.00 Contrapartida Nacional para IDECOAS/FHIS de EUR 600,000.00, Contrapartida Municipal de EUR 300,000.00 Contrapartida Comunitaria de EUR 300,000.00.

Fecha de Inicio del Programa de convenio Fase II: 14/07/2021

Fecha de Finalización del Programa Fase II: 13/07/2025

vii. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	19.897.004,00	8.372.701,20	42%
2022	44.370.387,00	26.573.808,83	60%
2023	74.083.192,00	72.701.682,29	98%
2024	89.777.470,00	10.088.328,82	11%

viii. Avance Físico por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024
EMPREDIMIENTO Y VALORES		1	2.093.243,93	0
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	0	6	2.603.666,74	12
TOTAL	0	7	4.696.910,67	12

ix. Avance Físico por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024
COPAN	0	3	688.972,24	3
INTIBUCÁ	0	6	966.722,25	6
OLANCHO	0	3	3.041.216,18	3
TOTAL	0	12	4.696.910,67	12

x. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	2.170.260,03
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	3.221.158,12
TOTAL	5.391.418,15

xi. Estado Contractual y Ejecución por Fases

FASE	ESTADO ACTUAL	Ejecución
I	Finalizado el 31 de julio del año 2021.	Monto ejecutado de L.263,470,445.13
II	Inició el 14 de julio del año 2021 Finaliza el 13 de julio del año 2025	12 proyectos de Construcción en ejecución se están realizando capacitaciones a los jóvenes de las distintas Municipalidades y Actores Relevantes SEDECOAS/FHIS, Municipalidades, INJUVE

FASE	COMPONENTES			
	Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura	Fortalecimiento de Habilidades de jóvenes para el trabajo habilidades Sociales	Mejoramiento de Capacidades de Actores Relevantes	Materiales y Equipos de Capacitación
II*	7 proyectos en ejecución y con el primer 80% desembolsados, 5 proyectos en ejecución con su primer desembolso.	454 jóvenes Fortalecidos en Habilidades Sociales 490 Jóvenes que serán capacitado por INFOP	214 actores Relevantes capacitados	Equipamiento para los 12 proyectos, incluyen equipo de cómputo, mobiliario, áreas de juego, área de ejercicio, jardinería

* 7 proyectos en iniciaron ejecución en el mes de mayo del año 2023 y 5 proyectos con orden de inicio en ejecución.

** Orden de inicio Programa CONVIVIR Fase III 15 de abril del 2024, en proceso preparativos administrativos

xii. LOGROS Y AVANCES

CONTROL Y SEGUIMIENTO PROYECTOS CONVIVIR FASE II

No.	Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Colonia / Barrio / Aldea	Monto de Proyecto Actual	% Avance Físico	Avance Financiero	Estado Actual	Fecha de Finalización Prevista
1	109190	Plaza Juvenil Brisas de Copan	COPÁN	SANTA ROSA DE COPÁN	EL DUENDE	L 4,256,435.99	100.00%	94.43%	Finalizado	17/6/2024
2	109191	Plaza el Mirador Santa Teresa	COPÁN	SANTA ROSA DE COPÁN	BO. SANTA TERESA	L 4,803,327.26	93.00%	92.88%	En ejecución	31/10/2024
3	109192	Paseo Cultural Lenca	INTIBUCÁ	LA ESPERANZA	COL. BUENOS AIRES	L 4,728,832.16	100.00%	96.77%	En ejecución	11/10/2024
4	109193	Parque la Piramide	INTIBUCÁ	INTIBUCÁ	BO. EL WAY	L 1,548,715.11	100.00%	94.62%	En ejecución	11/10/2024
5	109194	Cancha ABE y BEN	OLANCHO	JUTICALPA	SOLIDARIDAD	L 3,798,360.93	99.00%	94.46%	En ejecución	11/10/2024
6	109195	Parque Recreativo de la Juventud	OLANCHO	JUTICALPA	LA CONCEPCION	L 4,008,808.24	99.00%	93.32%	En ejecución	11/10/2024
7	109232	Ruta Lenca de la Juventud	INTIBUCÁ	INTIBUCÁ	BARIO EL WAY	L 3,129,647.16	100.00%	96.35%	En ejecución	11/10/2024
8	109611	Casa de la Juventud	COPÁN	SANTA ROSA DE COPÁN	BARRIO EL CARMEN	L 13,138,262.90	28.24%	25.49%	En ejecución	11/5/2025
9	109612	Plaza de la Juventud	INTIBUCÁ	LA ESPERANZA	COL. BUENOS AIRES	L 8,160,161.95	28.12%	27.80%	En ejecución	15/12/2024
10	109613	Centro Deportivo Integral San Carlos	INTIBUCÁ	LA ESPERANZA	COL. SAN CARLOS	L 6,090,046.99	49.00%	52.36%	En ejecución	30/11/2024
11	109614	Thau Mishu Casa de la Juventud	INTIBUCÁ	INTIBUCÁ	BO. EL WAY	L 11,319,038.74	44.00%	27.15%	En ejecución	5/4/2025
12	109615	Centro de Formacion Integral Juvenil	OLANCHO	JUTICALPA	BARRIO EL CENTRO	L 13,720,180.88	31.84%	21.08%	En ejecución	9/5/2025

A. COMPONENTE 1 CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA- AVANCE FISICO

En Santa Rosa de Copán se están llevando a cabo varios proyectos comunitarios significativos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Uno de ellos es la Plaza Mirador Santa Teresa, diseñada como un espacio público integral que incluirá quioscos de emprendimiento, sanitarios, una gradería techada y una cancha también techada. Además, contará con áreas de juegos infantiles, máquinas de ejercicios y se destacará por su mirador hacia el municipio, ofreciendo vistas panorámicas que enriquecerán la experiencia de los visitantes y residentes por igual.

Otro proyecto relevante es Plaza Juvenil Brisas de Copán, orientado específicamente a la juventud de Aldea El Derrumbo, sector El Duende. Este proyecto tiene como objetivo crear una plaza juvenil con una cancha multiusos, fomentando así la convivencia comunitaria y promoviendo actividades deportivas y recreativas que ayuden a prevenir la violencia juvenil en la zona.

Además, se está desarrollando la Casa de la Juventud, un espacio social, educativo y laboral destinado a los jóvenes de Santa Rosa y sus alrededores. Este proyecto tiene como misión proporcionar un lugar donde los jóvenes puedan desarrollar y potenciar sus capacidades a través de programas educativos, formación laboral y actividades de emprendimiento. La Casa de la Juventud se posiciona como un centro integral que promueve la participación activa de los jóvenes en la construcción de su propio futuro y el de su comunidad.

Tabla 1: Proyectos de Infraestructura Seleccionados en el Municipio de Santa Rosa de Copán – Estado de la Ejecución

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Plaza Juvenil Brisas de Copán (Obra de Confianza)	Barrio El Duende	4,256,435.99	➤ Proyecto desembolsado en el primer y segundo desembolso, en ejecución
2.	Casa de la Juventud	Barrio El Carmen	13,161,194.90	➤ Proyecto con el primer desembolso a iniciar el 3 abril 2024
3.	Plaza El Mirador – Santa Teresa	Barrio Santa Teresa, sector La Cuchilla	4,803,327.26	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer y segundo desembolso, en ejecución
Monto Total de Inversión Estimado			22,220,958.15	

PROYECTO PLAZA BRISAS DE COPÁN



PROYECTO CASA DE LA JUVENTUD

Actualmente, se está a la espera de alcanzar el 40% de ejecución para proceder con el segundo desembolso. Mientras tanto, se ha logrado avanzar en el levantamiento de paredes, lo que ha permitido mantener el progreso constante del proyecto. Gracias a la contrapartida comunitaria y municipal, se ha conseguido mantener las obras activas, garantizando el cumplimiento de los plazos y metas establecidos.



PROYECTO PLAZA MIRADOR SANTA TERESA

Gracias a los desembolsos transferidos por órdenes de cambio y al aporte de la contraparte municipal, se logró reactivar la ejecución del proyecto, permitiendo avanzar significativamente en las áreas que estaban pendientes. Esta inyección de recursos no solo facilitó la continuación de las obras, sino que también

optimizó los tiempos y mejoró la coordinación entre las partes involucradas, asegurando un progreso sostenido hacia el cumplimiento de los objetivos previstos.

Se llevaron a cabo diversos trabajos, entre los que destacan la pintura, la instalación de adoquinado, la finalización de gradas y rampas, así como la limpieza y retiro de materiales de desecho. Además, se realizó el acondicionamiento y mejora de los servicios sanitarios, garantizando que estos espacios queden completamente funcionales y adecuados para su uso.



INTIBUCA

En el municipio de Intibucá se llevan a cabo varios proyectos como ser “Ruta Lenca de la Juventud” consiste en la rehabilitación de la acera peatonal ubicada en la calle principal en la salida a Siguatepeque, con el objetivo de, entre otros, brindar seguridad y movilidad vial a estudiantes, jóvenes y emprendedores del municipio de Intibucá.

Así también, por medio de esta obra se podrán vincular el Parque La Pirámide (Primer proyecto de Intibucá) con la THAU MISHU/Casa de La Juventud (Segundo Proyecto de Intibucá) de forma ordenada y segura.

Cabe mencionar que el proyecto “Ruta Lenca de la Juventud” del municipio de Intibucá se ubica frente al proyecto de La Esperanza denominado “Paseo Cultural Lenca”, por lo que está previsto realizar un



proyecto integral que permita promover el trabajo en conjunto con las dos alcaldías y sus respectivas comunidades.

Tabla 2: Proyectos de Infraestructura Seleccionados en el Municipio de Intibucá – Estado de la Ejecución

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Parque La Pirámide (Obra de Confianza)	Barrio El Way, Sector No. 1	1,720,794.57	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer y segundo desembolso, en ejecución
2.	THAU MISHU (Casa de La Juventud)	Barrio El Way	11,319,038.74	➤ Proyecto aprobado y primer desembolso, se dio orden de inicio el 5 de abril 2024
3.	Ruta Lenca de la Juventud	Barrio El Way	3,477,385.73	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer y segundo desembolso, en ejecución.
Monto Total de Inversión Estimado			16,517,219.04	

PROYECTO PARQUE LA PIRAMIDE

Con el desembolso de las ordenes de cambio se logró retomar en el trabajo de subsanaciones pendientes.



PROYECTO RUTA LENCA DE LA JUVENTUD

El proyecto Ruta Lenca de la Juventud no avanzó en la fase de construcción debido a que no se realizaron los desembolsos correspondientes a las órdenes de cambio.



PROYECTO THAU MISHU CASA DE LA JUVENTUD





LA ESPERANZA

El Proyecto de Paseo Cultura Lenca en La Esperanza, Intibucá, representa una significativa operación de regeneración urbana dentro de un enfoque integral y sostenible. Este proyecto transforma gran parte del margen de la calzada principal CA11A en un paseo peatonal a lo largo del margen izquierdo de la carretera.

Además, se han implementado iniciativas como la Plaza de la Juventud en Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá, diseñada para proporcionar espacios seguros y adecuados para los jóvenes. Esta plaza busca promover la convivencia comunitaria y prevenir la violencia juvenil mediante la inclusión de áreas para actividades deportivas y recreativas como gimnasios al aire libre, áreas de juego, salones multiusos y canchas deportivas, dirigidas a todas las edades.

El Proyecto Plaza San Carlos se enfoca en crear un centro deportivo seguro para los jóvenes de San Carlos, La Esperanza, Intibucá, ofreciendo instalaciones como canchas multiusos, pistas de trote y patinaje, así como áreas de gimnasio al aire libre, todo diseñado para promover la participación familiar y comunitaria.

Tabla 3: Proyectos de Infraestructura Seleccionados en el Municipio de La Esperanza – Estado de la Ejecución

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Paseo Cultural Lenca (Obra de Confianza)	Colonia Buenos Aires	4,728,832.16	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer y segundo desembolso, en ejecución.
2.	Plaza de La Juventud Buenos Aires	Colonia Buenos Aires	8,160,161.95	➤ Proyecto aprobado y desembolsado en el primer desembolso, Orden de inicio 4 de abril 2024.
3.	Centro Deportivo Integral San Carlos	Colonia San Carlos	6,090,046.99	➤ Proyecto aprobado y desembolsado el primer desembolso, Orden de inicio 4 de abril 2024.
Monto Total de Inversión Estimado			18,979,041.10	

PROYECTO PASEO CULTURAL LENCA

Se realizaron los desembolsos correspondientes a las órdenes de cambio, lo que permitió avanzar en las subsanaciones pendientes, especialmente en los trabajos de acabado. Estos incluyeron la mejora de pisos, la instalación de barandales y la aplicación de pintura.



PROYECTO PLAZA DE LA JUVENTUD

El proyecto aun cuenta con fondos y se está a la espera de llegar al 40% de ejecución para hacer el segundo desembolso, pero se han logrado avances significativos en la ejecución.



PROYECTO CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL SAN CARLOS

Con el desembolso de la segunda transferencia, que ha alcanzado el 40%, y el aporte de la comunidad junto con la municipalidad, se retomó la ejecución del proyecto. Actualmente, se está trabajando en la construcción de jardineras y senderos, así como en el avance significativo del módulo de baños.



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-81311

JUTICALPA

En la Colonia Solidaridad, la iniciativa "Cancha Abe y Ben" se buscó transformar una cancha deteriorada en un espacio seguro y adecuado para actividades físicas y convivencia juvenil, la cancha presentaba problemas de accesibilidad y sin condiciones apropiadas para actividades al aire libre. Con el apoyo del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Cooperación Alemana KfW y el programa CONVIVIR, se remodelo completamente este espacio, proporcionando a los jóvenes un lugar donde puedan participar en actividades deportivas y sociales.

El proyecto "Centro de Formación Integral Juvenil" tiene como objetivo revitalizar un antiguo Centro Penal para convertirlo en un centro educativo, social y laboral para los jóvenes de la zona y sus alrededores. Este centro ofrecerá una variedad de talleres prácticos y educativos como música, arte, informática y técnicos, así como espacios para exhibiciones y usos múltiples. Además, albergará oficinas administrativas para facilitar la gestión y operación del centro. Se espera que este espacio se convierta en un punto de referencia para el desarrollo personal y profesional de los jóvenes, fomentando sus habilidades y promoviendo la integración comunitaria.

El proyecto "Parque Recreativo La Juventud" tiene como objetivo remodelar completamente un parque existente para crear un espacio seguro y adecuado donde la comunidad, especialmente los jóvenes, puedan convivir y participar en actividades recreativas y culturales. Se enfoca en mejorar la infraestructura, incluyendo áreas verdes, mobiliario urbano, iluminación y accesibilidad, con la intención de promover el bienestar y la cohesión social en la comunidad.

Tabla 4: Proyectos de Infraestructura Seleccionados en el Municipio de Juticalpa – Estado de la Ejecución

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Cancha ABE y BEN (Obra de Confianza)	Colonia La Solidaridad	4,220,401.03	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer y segundo desembolso, en ejecución.
2.	Centro de Formación Integral Juvenil	Barrio El Centro	13,720,180.88	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer, orden de inicio 9 de mayo 2024.

3.	Parque Recreativo de La Juventud	Aldea La Concepción	4,454,231.38	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer y segundo desembolso, en ejecución.
Monto Total de Inversión Estimado			22,394,813.29	

CANCHA ABE Y BEN

Con el desembolso proveniente de las órdenes de cambio, se retomó la ejecución del proyecto, avanzando en la corrección de diversos aspectos constructivos.



PROYECTO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENIL

Los avances en la ejecución del proyecto continúan de manera significativa, logrando importantes progresos en la construcción de las paredes intervenidas en los módulos 3 y 4. Además, se ha trabajado en el módulo 1, un área de especial relevancia debido a su intervención por parte de

antropología, lo que requiere un enfoque más cuidadoso y especializado para respetar y preservar su valor histórico y cultural.



PROYECTO PARQUE RECREATIVO LA JUVENTUD

Gracias al desembolso proveniente de las órdenes de cambio, se ha logrado avanzar en la corrección de trabajos pendientes, como la instalación del adoquinado y la construcción de bancas circulares. Además, se ha iniciado la instalación del equipamiento pendiente para las canchas deportivas, lo que representa un progreso clave en la finalización del proyecto y la adecuación de los espacios destinados a actividades recreativas.



B. COMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES LABORALES Y SOCIALES DE JOVENES

Este componente se financian las siguientes actividades:

- Capacitación de jóvenes en competencias sociales, mediación y resolución pacífica de conflictos, ciudadanía, organización comunitaria, convivencia, seguridad ciudadana y gestión de proyectos comunitarios, así como en habilidades para la vida, de equidad de género e igualdad de oportunidades.
- Capacitación de jóvenes en competencias laborales, talleres técnico-vocacionales, formación de facilitadores bajo la metodología aprender haciendo en coordinación con otras instituciones y programas.
- Capacitación de jóvenes en talleres de arte y deporte con enfoque de cultura de paz y prevención de violencia.
- Estudios de análisis del mercado laboral de regiones determinadas para identificar necesidades de formación y perfiles laborales.
- Materiales y equipo para actividades de deporte, arte y cultura, el manejo de conflictos y la operación de infraestructura social para jóvenes.
- Materiales y equipo para la aplicación de metodologías de orientación laboral, emprendimiento social, la formación técnica en oficios y habilidades laborales orientadas por las demandas según el análisis del mercado laboral.
- Equipamiento de centros de formación y bolsas de empleo local en coordinación con otras instituciones.
- Coordinación con instituciones nacionales y locales, ONG, iglesias y la empresa privada para determinar oportunidades de empleo.
- Coordinación con centros educativos y/o institutos de formación profesional, para facilitar la participación de jóvenes en cursos de formación.

- Consultorías especializadas a través de enlaces in situ para monitorear los procesos sociales y laborales, enfocadas a la juventud y actores relevantes, los cuales son implementados por las oficinas municipales de juventud y los enlaces sociales municipales en los municipios de injerencia del Proyecto verificando el cumplimiento de las contrapartes con las cuales la Entidad Ejecutora ha establecido convenios de colaboración o contratos.

Tabla 6: Procesos de Capacitaciones

	Nombre del Proceso	Institución/Consultor	No. de Jóvenes capacitados	Monto de Contrato/Convenio
1	Fortalecimiento de Habilidades Laborales	INFOP	490	L. 5,000,000.00*
2	Formación de Arte, Cultura, Deporte y Ambiente	FIPADEH	454	L. 1,519,180.00**
3	Capacitaciones en Habilidades para la Vida	INJUVE	514	Acta de compromiso con INJUVE en un primer ciclo de formación en Habilidades para la Vida

* Único desembolso el cual se realizó en el mes de octubre del año 2023. Las Capacitaciones aún están en curso, y se está en trámites para una Adenda de Tiempo que finalizara el 30 de noviembre 2024.

** Se realizó el último pago pendiente de la contratación de servicios de capacitación con FIPADEH

C. COMPONENTE 3 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES RELEVANTES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (ESPECIALMENTE LA ENTIDAD EJECUTORA, LA ENTIDAD COORDINADORA Y LAS MUNICIPALIDADES Y COMUNIDADES PARTICIPANTES)

Este componente financia las siguientes actividades:

- Capacitación de organizaciones comunitarias en gestión, ejecución, operación y mantenimiento de la infraestructura comunal, en temas relacionados a la prevención de violencia y la

recuperación de espacios públicos aplicando la metodología CPTED (Prevención de Delitos mediante el Diseño del Ambiente).

- Capacitación de los actores relevantes en temas de “espacios seguros para jóvenes”, la metodología CPTED, el desarrollo juvenil, la mediación y resolución de conflictos, la creación de una cultura de paz, la operación y el mantenimiento participativo, la seguridad comunitaria (enfoque preventivo con la policía municipal) y en la elaboración, la gestión y el monitoreo de los planes municipales para el desarrollo comunitario y para la prevención de violencia.
- Fortalecer la participación comunitaria y la promoción de la convivencia a través de la metodología Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC).
- Fortalecer la participación comunitaria en la sostenibilidad, revitalización y mantenimiento de los proyectos CONVIVIR a través de la metodología de Organización, Mantenimiento y Gestión (ORMAG).
- Estudios y documentación de buenas prácticas de prevención de violencia.
- Incorporar metodologías y buenas prácticas exitosas institucionalizadas en la Entidad Coordinadora.

Actualmente se tienen contabilizados 214 actores relevantes capacitados en Políticas Públicas de la Juventud y Capacitación de Equidad y Género, Universidad Tecnológica de Honduras impartido en los cuatro municipios y personal técnico SEDECOAS/FHIS, INJUVE.

Tabla 7: Procesos de Capacitaciones Mejoramiento de Capacidades de Actores Relevantes

	Nombre del Proceso	Institución/Consultor	No. De Actores Relevantes capacitados	Monto de Contrato/Convenio
1	Fortalecimiento Municipal	FUNDEMUN	60	L. 695,000.00*
2	Inclusión de Genero	Lic. Milton Meza (Consultor Individual)	72	L. 700,000.00**
3	Formación en Políticas Públicas de Juventud	Fundación Misión Integral	66	L. 700,000.00**
4	Servicios de capacitación, para fortalecer a	UNITEC	76	L.378,000.00***

profesionales de la SEDECOAS/FHIS			
-----------------------------------	--	--	--

*Se realizó el pago total de la consultoría del Proceso Fortalecimiento Municipal

** Actualmente, el proceso ha concluido la etapa de capacitaciones y está a la espera del segundo pago, que corresponde al 30% restante.

*** Actualmente se pagó el total de la consultoría se está a la espera del 10% de garantía de cumplimiento.

xiii. INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO

Se ha realizado una revisión detallada del presupuesto, detectándose un déficit que afecta la proyección financiera tanto para el resto del año en curso como para el siguiente. Ante esta situación, se llevó a cabo un proceso de Redistribución de los recursos, con el fin de cubrir dicho déficit y asegurar el cumplimiento de los compromisos financieros sin comprometer el desarrollo de los proyectos previstos. Esta redistribución permitirá equilibrar las cuentas y mantener la sostenibilidad de las operaciones.

PROYECTO (Datos SIAFI)	Organismo financiador	Año 2024 (Millones HNL)			% AVANCE	Proyección fina HNL 2024	PROYECCION 2024 FINAL EUROS
		Vigente	Redistribución	Ejecutado			
Gatos Operativos	Contraparte Nacional	L 8,111,994.00	L 6,184,348.16	L 1,864,296.97	30%	L 4,385,503.57	165,241.28 €
Construcción y/ o Mejoramiento de Infraestructura Fase II	Cooperación Alemana KfW	L 31,679,403.00	L 29,982,034.42	L 3,070,031.25	10%	L 26,912,003.17	1,014,016.70 €
Fortalecimiento de Habilidades para Jóvenes	Cooperación Alemana KfW	L 7,575,280.00	L 2,428,772.27	L 1,933,772.27	80%	L 495,000.00	18,651.09 €
Fortalecimiento de Actores Relevantes	Cooperación Alemana KfW	L 8,369,776.00	L 1,633,800.00	L 537,000.00	33%	L 1,096,800.00	41,326.30 €
Materiales y Equipo de Capacitación	Cooperación Alemana KfW	L 9,005,138.00	L 2,488,016.32	L 1,459,273.07	59%	L 1,028,743.25	38,761.99 €
Asistencia Técnica	Cooperación Alemana KfW	L 5,848,956.00	L 7,764,696.97	L 1,227,012.78	16%	L 6,537,684.19	246,333.24 €
TOTAL		L 70,590,547.00	L 50,481,668.14	L 10,091,386.34	14%	L 40,455,734.18	L 1,524,330.60

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS CONVIVIR FASE II

DESCRIPCIÓN	CUENTA BANCARIA	FECHA	MONTO DE TRANSFERENCIA	MTO ACREDITADO BCH	MONTO ACREDITADO BCH HNL	N/D COMISION BANCARIA	N/D	TASA DE CAMBIO	MONTO DE LA TRANSFERENCIA HNL
DOTACION INICIAL	11101220000447	03.11.2021	77,914.72 €	77,839.72 €	L 2,172,634.24	75.00 €	L 2,093.37	27.9116	L 2,174,727.61
TRANFERENCIA 1	11101220000447	23.05.2022	231,076.31 €	231,001.31 €	L 6,004,530.24	75.00 €	L 1,949.51	25.9935	L 6,006,479.75
TRANFERENCIA 2	11101220000447	02.12.2022	772,806.12 €	772,731.12 €	L 20,048,331.18	75.00 €	L 1,945.86	25.9448	L 20,050,277.04
TRANFERENCIA 3	11101220000447	10.08.2023	452,781.85 €	452,706.85 €	L 12,277,871.53	75.00 €	L 2,034.08	27.121	L 12,279,905.61
TRANFERENCIA 4	11101220000447	06.11.2023	2,114,888.40 €	2,114,813.40 €	L 56,081,573.41	75.00 €	L 1,988.88	26.5185	L 56,083,562.29
TOTAL			3,649,467.40 €	3,649,092.40 €	L 96,584,940.60	375.00 €	L 10,011.70	133.4894	L 96,594,952.30

En el año 2024 los primeros 3 trimestres no se han realizado transferencias por parte de KfW.

xiv. LISTADO DE PRINCIPALES CONTRATO DE BIENES, SERVICIOS, SUMINISTROS, OBRAS Y SUPERVISION FIRMADOS EN EL TROMESTRE

DESCRIPCION	PROVEEDOR	Tipo de Contrato/ Procesos de compra menor	FACTURA	PROCESO DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	MONTO PENDIENTE DE PAGO	Nº	MONTO TRAMITE DE PAGO	FECHA DE ELABORACION DE ORDEN DE COMPRA	FECHA REVISION PARA TRAMITE DE PAGO	Observación
ADQUISICION DE DIAGNOSTICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR CONVIVIR	TALLER CARRASCO	Servicios	000-001-01-00002916	CMA-070-FHIS-2024	13378	*	1	17940	25/06/2024	23/08/2024	Finalizado
ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	TALLER CARRASCO	Servicios	Pendiente	CMA-115-FHIS-2024	13447	639,620.80	1	*	23/09/2024	*	En proceso de relación de los vehículos por parte del proveedor
ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO CONVIVIR	RENDILLANTAS S.A. de CV	Bienes	006-001-01-00026350	CM-116-A-FHIS-2024	13428	*	2	63,894.00	*	27/09/2024	Pendiente de Pago
ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO CONVIVIR	LLANTICENTRO FECRO S.A. de CV	Bienes	Pendiente de entrega	CM-116-A-FHIS-2024	13427	7,130.00	3	*	06/09/2024		Pendiente de Pago
Adquisición de Servicios de Alimentación para los Talleres de Capacitación a Jóvenes en los Municipios La Esperanza y Intibucá en el Marco del Proyecto CONVIVIR Fase II. La Capacitación será impartida por INJUVE	IPSAN-NAH	Servicios	000-001-01-00003637	CMA-104-A-FHIS-2024	13411	*	4	19,665.00	*	27/09/2024	Pendiente de Pago

DESCRIPCION	PROVEEDOR	Tipo de Contrato/ Procesos de compra menor	FACTURA	PROCESO DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	MONTO PENDIENTE DE PAGO	Nº	MONTO TRAMITE DE PAGO	FECHA DE ELABORACION DE ORDEN DE COMPRA	FECHA REVISION PARA TRAMITE DE PAGO	Observación
Adquisición de Servicios de Alimentación para los Talleres de Capacitación a Jóvenes en los Municipios de Santa Rosa de Copán, en el Marco del Proyecto CONVIVIR Fase II, La Capacitación será impartida por INJUVE	HOTEL INTERNACIONAL/RESTAURANTE	Servicios	000-001-01-00041573	CMA-104-B-FHIS-2024	13412	*	5	23,141.34	*	27/09/2024	Pendiente de Pago
Adquisición de Servicios de Alimentación para los Talleres de Capacitación a Jóvenes en los Municipios de Juticalpa, Olancho, en el Marco del Proyecto CONVIVIR Fase II, La Capacitación será impartida por INJUVE	FRESA & CHOCOLATE	Servicios	Pendiente	CMA-104-C-FHIS-2024	13413	17,779.00	6	*	16/08/2024	*	Pendiente de reprogramación de las fechas de realización de los talleres con INJUVE
Adquisición de Equipo de Computación para la Escuela Republica de Honduras, ubicada en Juticalpa, Olancho	CASH BUSINESS	Bienes	Pendiente de entrega	CMA-138-FHIS-2024	13451	240,051.00	7	*	26/09/2024	*	Pendiente de Entrega
Adquisición de Material de Oficina	DISPROA	Suministros	Pendiente de entrega	CMA-143-B-FHIS-2024	13461	6,927.83	8	*	10/10/2024	*	Pendiente de Entrega
Adquisición de Material de Oficina	REDIPO	Suministros	Pendiente de entrega	CMA-143-C-FHIS-2024	13462	2,001.00	9	*	10/10/2024	*	Pendiente de Entrega
Adquisición de Material de Oficina	COMPUSER	Suministros	Pendiente de entrega	CMA-143-D-FHIS-2024	13463	4,112.40	10	*	10/10/2024	*	Pendiente de Entrega
Adquisición de Material de Oficina	PAPELERIA DE HONDURAS	Suministros	Pendiente de entrega	CMA-143-E-FHIS-2024	13464	781.43	11	*	10/10/2024	*	Pendiente de Entrega
					TOTAL	918,403.46		106,700.34			

xv. Desafíos de CONVIVIR Fase II:

- 1) Se menciona que no se ha recibido desembolso de KfW en todo el año, lo que ha causado una acumulación de pagos listos para ser ejecutados.

- 2) El pago del segundo desembolso de los últimos 5 proyectos está pendiente hasta alcancen un 40% de avance físico, lo que provoca retrasos en la ejecución cuando los proyectos no avanzan al ritmo esperado.
- 3) La solicitud de devolución de fondos no ejecutados y los trámites administrativos lentos, KfW aún no ha efectuado la transacción de fondos. Esto se debe a que se estaba a la espera de que el Banco Central realizará la devolución de 128,000.00 euros al Banco Alemán.
- 4) El progreso del proyecto depende de la asignación de fondos por parte de KfW, lo que implica una gran dependencia de agilizar los procesos externos para continuar con la ejecución de los pagos.
- 5) Los proyectos están sujetos a procesos administrativos que pueden sufrir retrasos o cambios, lo que afecta la planificación y ejecución oportuna, especialmente en fases críticas como las ordenes de inicio y desembolsos programados.

xvi. Desafíos de CONVIVIR Fase III

- 1) Contratación de nuevo personal para asegurar el desarrollo exitoso del programa. Es crucial seleccionar candidatos que no solo posean las habilidades técnicas necesarias, sino también el compromiso y la capacidad para integrarse eficazmente en el equipo existente. Esto garantizará que el programa se ejecute de manera eficiente y se alcancen los objetivos establecidos.
- 2) La integración del POA al sistema financiero SIAFI ha presentado un desafío notable, generando retrasos significativos que han obstaculizado la disponibilidad y el uso eficiente de los recursos financieros. Esta situación ha resaltado la necesidad de optimizar los procesos de implementación y coordinación entre los diferentes sistemas para evitar futuros contratiempos.
- 3) La creación de la estructura programática y presupuestaria ha sido un proceso engorroso, debido a los trámites complejos que deben gestionarse ante la Secretaría de Finanzas. Además, se ha presentado un problema técnico por parte de la Unidad de Modernización (UDEM), lo cual ha generado un retraso aproximado de tres meses. Esta situación ha impedido la correcta ejecución de los fondos correspondientes a la Fase III del proyecto, afectando significativamente el avance planeado.

xvii. LOGROS CONVIVIR FASE II

- 1) Se ha gestionado con éxito el avance de las órdenes de cambio, lo que ha permitido completar los trámites necesarios para proceder con los desembolsos en tres proyectos específicos: Parque La Pirámide, Parque Recreativo La Juventud y Cancha Abe y Ben. Esta gestión ha sido crucial para evitar que los proyectos se detengan por falta de fondos, asegurando así su continuidad y progreso.
- 2) Se establecieron alianzas con organizaciones como SEDECOAS-FHIS, INFOP, INJUVE, permitiendo una implementación más efectiva de los programas de capacitación y el aprovechamiento de recursos y conocimientos para el beneficio de los jóvenes y las comunidades.
- 3) Se realizaron visitas de supervisión y monitoreo en los proyectos en ejecución para evaluar el avance físico y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos, lo que ha permitido ajustar estrategias y mantener el ritmo de avance de las obras.
- 4) Se finalizó el Proyecto Plaza Juvenil brisas de Copán ubicado en Santa Rosa de Copán. El día 29 de agosto se llevo a cabo los actos de inauguración donde participaron autoridades municipales, miembros del CEP y la comunidad.
- 5) Se logró el desembolso de las órdenes de cambio, lo que permitió retomar de manera efectiva la ejecución de los proyectos. Este avance financiero no solo revitaliza las actividades planificadas, sino que también garantiza el cumplimiento de los plazos establecidos y la calidad de los resultados esperados. Con la reactivación de estos proyectos, se espera un impacto positivo en la ejecución.

xviii. LOGROS CONVIVIR FASE III

- 1) Al inicio del Proyecto CONVIVIR III, se presentaron desafíos para lograr las transferencias a la cuenta especial por parte de la Secretaría de Finanzas (SEFIN). Un problema en el sistema informático impidió realizar las transferencias de fondos a la cuenta especial de CONVIVIR III durante varios meses, afectando también la transferencia de fondos para los gastos operativos. Sin embargo, a la fecha del presente informe, el problema ha sido resuelto y se cuenta con un espacio fiscal para el Fondo de Disposición con un monto de aproximadamente 19 millones de Lempiras.
- 2) Se pueden utilizar los fondos destinados a la ejecución de los planes propuestos, lo que permitirá avanzar en las actividades programadas y garantizar la implementación efectiva del proyecto.

- 3) Se logró la apertura de sobres para la contratación del nuevo personal, lo que representa un paso crucial para fortalecer el equipo de trabajo y asegurar que se cuente con los recursos humanos necesarios para llevar a cabo las tareas planificadas.
- 4) Se está trabajando en la preparación de los procesos de compra de equipamiento y mobiliario para las obras de confianza. Asimismo, se están gestionando los procesos de adquisición de capacitaciones, asegurando que tanto los recursos materiales como la formación del personal estén alineados con los objetivos del proyecto.

CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)



✓ **Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)**


A. Objetivo General

El propósito de esta Actividad es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

B. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en las cinco municipalidades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Tela y La Ceiba. Las comunidades específicas de intervención serán identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

C. Descripción del Proyecto

 Esta Actividad ayudará al GdeH (representado a través de FHIS) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otras partes interesadas. La Actividad

incluye dos resultados complementarios: Resultado 1: Mejora de la infraestructura comunitaria, las actividades responderán a las prioridades de infraestructura comunitaria para abordar la seguridad ciudadana. Resultado 2: Aumento de la cohesión comunitaria, considera que la forma en que las intervenciones de infraestructura son concebidas, diseñadas y ejecutadas pueden desempeñar un papel directo en el aumento de la cohesión social y comunitaria y promover un marco holístico de prevención de la violencia. Los proyectos bajo la Actividad incluirán instalaciones educativas, centros de salud, alumbrado público, espacios comunitarios más seguros, centros de alcance y comunitarios, centros vocacionales, jardines comunitarios, parques, espacios recreativos, paradas de buses, accesos peatonales, mejoras al alumbrado de calles, señalización, instalaciones para el sector seguridad y justicia, así como otros proyectos de infraestructura de pequeña escala que se acuerde entre las Partes.

D. Monto del Convenio

Presupuesto total estimado: \$14,637, 541.74 conforme se establece en la carta de ejecución No 522.0501 – 025 y su plan de trabajo aprobado., de los cuales, fondos de donación de USAID: \$11, 847,015.20; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$ 2, 961,753.80 (efectivo: \$ 2,127,508.35 y especies: \$ 800,000.00).

i. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	23.226.555,00	21.906.553,68	94%
2019	60.781.669,00	60.781.669,00	100%
2020	145.322.291,00	60.678.681,68	42%
2021	67.508.910,00	42.626.620,46	63%
2022	57.711.016,00	55.047.658,54	95%
2023	80.251.050,00	76.368.680,98	95%
2024	58.564.993,00	27.588.817,18	47%

ii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	3	3	8.181.245,41	55	553.710
EDUCACION	0	5	9.451.725,30	93	3.163
TOTAL	3	8	17.632.970,71	148	556.873

iii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
ATLANTIDA	0	3	6.338.875,54	37	450.351
CORTES	2	4	6.824.236,76	77	3.157
FRANCISCO MORAZAN	1	1	4.469.858,41	34	103.365
TOTAL	3	8	17.632.970,71	148	556.873

iv. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	8.613.481,84
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	1.342.364,63
TOTAL	9.955.846,47

v. LOGROS ALCANZADOS EN TRIMESTRE

En este trimestre se gestionó la firma de una nueva carta de ejecución No. 522-0513-01 por parte de la USAID/FHIS/SEFIN donde se sub obligaran \$8,422,674 equivalentes a L. 208,567,337 de aportaciones de la USAID y \$2,105,669 equivalente a L. 52,141,809 de aportaciones del GdH, siendo el nuevo monto de la actividad de \$20,269,689.20 de aportaciones de la USAID y \$5,067,423.00 de aportaciones del GdH. Así mismo, bajo la aprobación de esta nueva carta de ejecución, se extenderá el periodo de implementación de la actividad a 111 meses, desde el mes de octubre del 2017 a diciembre de 2026.

Cartas de Ejecución	Aportaciones USAID		Aportaciones GdH	
	US\$	HNL	US\$	HNL
Convenio 522-0441 Carta de Ejecución 30 y Convenio 522-0501 Carta de Ejecución 4	2,836,304	69,957,309	709,076	17,489,327
Convenio 522-0441 Carta de Ejecución 33 y Convenio 522-0501 Carta de Ejecución 8	Reprogramación Plan de Trabajo y Presupuesto			
Convenio 522-0441 Carta de Ejecución 36 y Convenio 522-0501 Carta de Ejecución 11	3,861,710	95,248,883	965,427	23,812,221
Convenio 522-0501 Carta de Ejecución 22	1,000,000	24,664,951	250,000	6,166,238
Convenio 522-0501 Carta de Ejecucion25	4,149,001	102,334,906	1,037,250	25,583,727
Convenio 522-0513 Carta de Ejecución 01	8,422,674	208,567,337	2,105,669	52,141,809
Total	20,269,689	500,773,386	5,067,423	125,193,322

vi. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA AL III TRIMESTRE

Durante el periodo comprendido desde el 01 de julio al 30 de septiembre del 2024, se encuentran en etapa de ejecución un total de 4 proyectos distribuidos entre las categorías de Infraestructura Escolar (3) y un Espacio Recuperado (1). Los 4 proyectos se encuentran en ejecución bajo la metodología de Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC).

Al cierre de III se finalizó 1 proyecto con una inversión total de L. 3,815,837 beneficiando de manera directa a más de 2,000 personas y generando 21 empleos, se encuentran 4 proyectos en ejecución, presentando un avance promedio de 88.25%.

Durante el periodo, 2 proyectos se encontraron en etapa de ejecución y 2 proyectos en estado de “Suspendidos”, estos proyectos distribuidos entre las categorías de Infraestructura Escolar y Espacios Recuperados los cuales se vienen ejecutado bajo la metodología de Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC).

CUMPLIMIENTO DE ENTREGABLES POR TRIMESTRE, INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA ICS										
Categoría	Programado				Ejecutado				TOTALES	
	I trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Programado	Ejecutado
Infraestructura Escolar	2	1	0	0	1	0	0	2	3	3
Espacios Recuperados	0	3	0	0	0	1	1	0	3	2
Obras Complementarias en los Centros de salud	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2
Total	2	5	0	0	2	2	1	2		
			7			7				

Tomando en cuenta el mecanismo financiero establecido en los convenios de donación de cada programa donde se establece lo siguiente: “Se utilizará el método de reembolso de costos para implementar y financiar la Actividad. Bajo este método, el Donatario deberá hacer los pagos con sus propios fondos para cubrir costos de la Actividad según el cuadro de Presupuesto del Plan de Trabajo pertinente aprobado por la USAID (El Presupuesto de la Actividad). La USAID reembolsara al Donatario por los costos incurridos en esta Actividad y que se han presentado a la USAID para reembolso sobre una base periódica.”

Los 4 proyectos que se encuentran en etapa de ejecución al final del III Trimestre del 2024 bajo el programa ICS, representan un monto total de L. 18,862,556.26 del cual se ha desembolsado un monto promedio del 84.93%.

Matriz de Seguimiento de Proyectos ICS en ejecución

Código	Localización			Proyecto	Estatus	% Avance Financiero	% Avance físico	Categoría
108864	Cortés	San Pedro Sula	Sector Rivera Hdez.	Rivera Hernández - Oficina Comité Intersectorial	Ejecución	84.72%	80.00%	Proyecto Comunitario
109161	Cortés	San Pedro Sula	Chamelecón	Reparación del Instituto Modesto Rodas Alvarado y construcción de obras varias FASE II	Suspendido Firma de Adenda	70.00%	80.00%	Centro Educativo

109079	Atlántida	La Ceiba	Prados de la Misericordia	Reparación del CEB Porfirio Ruiz y construcción de obras varias.	Suspendido Firma de Adenda	85.00%	94.00%	Centro Educativo
108942	Atlántida	La Ceiba	Corozal	Reparación del CEB Ramón Rosa y construcción de obras varias	Ejecución	100.00%	99.00%	Centro Educativo

Para el año 2024, se tiene programada una ejecución financiera total de L. 41,372,993.00. De este monto, L. 2,139,161.00 provienen de fondos nacionales (Fuente 11) y L. 39,233,832.00 corresponden a fondos de donación (Fuente 22).

Dada a una nueva incorporación de Fondos Nacionales (11) de L 17,000,000, provenientes del presupuesto del año 2024 del grupo de gasto 4000, el nuevo presupuesto asciende a L58,564,993.00. De este monto, L. 17,139,161.00 provienen de fondos nacionales (Fuente 11) y L. 39,233,832.00 corresponden a fondos de donación (Fuente 22).

Al cierre del III Trimestre del 2024, se ha comprometido un monto de fondos de la USAID de L 19,162,556.26 para los 4 proyectos en etapa de ejecución. Al 30 de septiembre de 2024, se ha alcanzado una ejecución presupuestaria acumulada de L. 27,588,817.18 (L. 8,868,565.63 en el III trimestre), lo que representa el 47% del nuevo presupuesto programado para el año 2024.

Este avance indica un progreso significativo en la utilización de los fondos asignados, reflejando un compromiso con la implementación de los proyectos y objetivos establecidos para el período.

EJECUCIÓN FINANCIERA 2024 - ICS							
Presupuesto Aprobado Año 2024	Fondos Nacionales (11)	L 19,139,161.00	Fondos de Donación (22)	L 39,425,832.00	Total Aprobado 2024	L 58,564,993.00	% Ejecución
Mes	Proyectado Fuente 11	Devengado 11	Proyectado Fuente 22	Devengado 22	Total Proyectado	Total Devengado	
Enero	L -	L -	L -	L -	L -	L -	100%
Febrero	L 2,139,161.00	L 1,462,000.00	L 1,975,927.25	L -	L 4,115,088.25	L 1,462,000.00	36%
Marzo		L 677,000.00	L 6,276,160.00	L 6,364,368.63	L 6,276,160.00	L 7,041,368.63	112%
Abril	L -	L -	L 6,509,528.00	L -	L 6,509,528.00	L -	0%
Mayo	L -	L -	L 2,814,920.25	L -	L 2,814,920.25	L -	0%
Junio	L -	L -	L 1,066,800.00	L 10,216,883.02	L 1,066,800.00	L 10,216,883.02	958%
Julio	L -	L -	L 5,429,428.00	L -	L 5,429,428.00	L -	0%
Agosto	L -	L -	L 2,577,499.25	L -	L 2,577,499.25	L -	0%
Septiembre	L -		L 2,384,321.00	L 8,868,565.53	L 2,384,321.00	L 8,868,565.53	372%
Octubre	L 3,251,200.00		L 5,218,630.00		L 8,469,830.00	L -	0%
Noviembre	L 13,748,800.00		L 5,172,618.25		L 18,921,418.25	L -	0%
Diciembre	L -	L -	L -		L -	L -	0%
Total		L 2,139,000.00		L 25,449,817.18		L 27,588,817.18	47%

vii. LISTADOS DE PRINCIPALES CONTRATOS DE BIENES, SERVICIOS, SUMINISTROS, OBRAS Y SUPERVISIÓN FIRMADOS EN EL TERCER TRIMESTRE 2024.

Código	Fuente	No. de contrato	Modalidad de contratación	Nombre	Ubicación	Monto	Fecha de firma consignada en contrato
110244	ICS	005-PEC-FHIS-ICS-2024	PEC	Reparación de CEBG Tiburcio Carias Andino y Obras Varias, Col. Flor N°1, Comayagüela M.D.C.	Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán	L7,415,000.00	3/9/2024
110248	ICS	004-PEC-FHIS-ICS-2024	PEC	Reparación de CEB Augusto C. Coello y Obras Varias, Col. Gracias a Dios, Villanueva, Cortés	Villanueva, Departamento de Cortés	L5,965,000.00	12/8/2024
110094	ICS	003-PEC-FHIS-ICS-2024	PEC	Reparación del Instituto Dr. Doroteo Varela Mejía y Obras Varias, Barrio La Independencia, Yarumela, La Paz, La Paz.	Municipio de La Paz, La Paz	L6,531,000.00	12/8/2024
108952	PIOH	CC-001-DIM-FHIS-2024	Contratista	Reparación del CEB República de Brasil y Construcción de Obras Varias.	Municipio de Azacualpa, Santa Bárbara	L2,004,082.33	30/8/2024
						L21,915,082.33	

✓ **Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras
(USAID/PIOH)**

i. Objetivo General

El propósito de esta Actividad es mejorar las pobres condiciones sociales y económicas son especialmente pronunciadas en el Occidente de Honduras. Extrema pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático. Bajos niveles educativos, migración, falta de acceso a los servicios básicos y otros retos socioeconómicos son endémicos. La provisión de servicios básicos de educación y nutrición son escasos en la zona de Occidente y es difícil el acceso a los ya existentes, así mismo la gestión de servicios de educación, nutrición y agua y saneamiento son deficientes por lo que los ciudadanos cuentan además con pocos espacios de participación para mejorar sus vidas a nivel de hogar y sus vidas productivas, lo que genera una gran brecha de pobreza.

ii. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en los departamento de Ocotepeque, la Paz, Copan Intibucá, Santa Bárbara y Lempira y zonas occidente específicas de intervención identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

iii. Descripción del Proyecto

Esta Actividad apoyará al FHIS para construir de al menos 14 proyectos de infraestructura comunitaria que potencien otros esfuerzos de USAID para mejorar los servicios relacionados con nutrición, la educación y el acceso al agua seleccionadas dentro de las municipalidades identificadas bajo el Objetivo de Desarrollo 2 de USAID.

iv. Monto del Convenio

El monto total de la Actividad es de \$ 10,544,130.00 (USAID \$ 8,435,304.00, Gobierno de Honduras \$ 2,108,826.00). Según la carta de ejecución No. 034.

v. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2019	6.190.650,00	5.981.569,54	97%
2020	65.583.096,00	13.336.794,49	20%
2021	58.488.260,00	47.180.270,68	81%
2022	37.504.624,00	35.478.196,70	95%
2023	42.199.428,00	33.390.584,30	79%
2024	56.710.336,00	20.916.146,49	37%

vi. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
INFRAESTRUCTURA VIAL	0	1	2.159.598,05	1	0
EDUCACION	1	3	6.541.593,10	39	276
TOTAL	1	4	8.701.191,15	40	276

vii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
COPAN	1	1	1.838.884,74	12	38
LA PAZ	0	1	3.182.734,12	13	176
LEMPIRA	0	1	1.129.749,03	1	0
SANTA BARBARA	0	1	2.549.823,26	14	62
TOTAL	1	4	8.701.191,15	40	276

viii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	10.315.185,60
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	1.899.769,74
TOTAL	12.214.955,34

ix. EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE

Durante el periodo comprendido desde el 01 de julio al 30 de septiembre del 2024, se encuentran en etapa de ejecución un total de 7 de la categoría de Infraestructura Escolar.

Al cierre del III Trimestre se finalizó 1 proyecto con una inversión total de L. 4,746,316.93 beneficiando de manera directa a más de 177 personas y generando 34 empleos.

CUMPLIMIENTO DE ENTREGABLES POR TRIMESTRE, PILOTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL OCCIDENTE DE HONDURAS										
Categoría	Programado				Ejecutado				TOTALES	
	I trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Programado	Ejecutado
Infraestructura Escolar	0	0	0	1	0	0	1	3	1	4
Infraestructura, Logística y Transporte	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Total	0	0	0	2	0	0	1	3		
	2				4					

Matriz de Seguimiento de Proyectos PIOH en ejecución

Código	Localización		Proyecto	Estatus	% Avance Financiero	% Avance físico
109055	La Paz	Yarula	Reparación del CEB PEDRO H. BONILLA y construcción de obras varias.	En Ejecución	30.00%	15.00%
109204	La Paz	La Paz	Reparación CEB Dionisio de Herrera y Construcción de obras varias.	En Ejecución	40.00%	15.00%
108950	Santa Bárbara	Trinidad	Reparación del CEB FRANCISCO JAVIER RAPALO y construcción de obras varias.	En Ejecución	68.05%	81.00%
108952	Santa Bárbara	Azacualpa	Reparación del CEB REPUBLICA DE BRASIL y construcción de obras varias	En Ejecución	0%	0.00%

109205	Santa Bárbara	Las Vegas	CEB Lesly Argentina Rodríguez, Colonia Orellana, Las Vegas, Santa Bárbara	En Ejecución	40.00%	12.00%
109066	Copán	El Paraiso	Reparación del Escuela Jonh F. Kennedy y Construcción de obras varias	En Ejecución	70.00%	45.40%
109063	Lempira	San Sebastián	Reparación del CEB JOSE TRINIDAD REYES y construcción de obras varias.	En Ejecución	40.00%	12.00%

Para el año 2024, se tiene programada ante la SEFIN una ejecución financiera total de L. 56,710,336.00. De este monto, L. 11,611,250.00 provienen de fondos nacionales (Fuente 11) y L. 45,099,086.00 corresponden a fondos de donación (Fuente 22).

Al 30 de septiembre del 2024, se ha comprometido un monto de fondos de USAID de L. 22,410,000.00 para los 7 proyectos que se encontraron en etapa de ejecución. De este total, se ha realizado una ejecución financiera, es decir, desembolsos, por un valor de L.11,429,100.00 lo que representa el 51.125% de los fondos comprometidos correspondiente a los proyectos en ejecución.

Al 30 de septiembre de 2024, se ha alcanzado una ejecución presupuestaria acumulada de L. 21,264,813.49 (L. 9,439,900 en el III Trimestre), lo que representa el 37% de la ejecución programada para el año 2024. Este bajo porcentaje de ejecución se debe a un desfase provocado por la reprogramación de actividades, resultado de la priorización de proyectos por parte de la USAID y por el proceso de firma de la Carta de implementación. Inicialmente, se había planificado iniciar proyectos de caminos productivos en 2024; sin embargo, la USAID solicitó dar prioridad a proyectos escolares, destinando los fondos correspondientes a esa cartera.

Adicionalmente, la ejecución de la actividad de PIOH durante el mes de julio-agosto se vio afectada debido a la firma tardía de la carta de implementación No. 522-0511-01, dado que la carta de implementación No.45 venció el 28 de junio, los proyectos tuvieron que suspenderse hasta la firma del nuevo instrumento No.47.

EJECUCIÓN FINANCIERA FINANZAS - PIOH							
Presupuesto Aprobado Año 2024	Fondos Nacionales (11)		Fondos de Donación (22)		Total Aprobado 2024	% Ejecución	
Mes	Proyectado Fuente 11	Devengado 11	Proyectado Fuente 22	Devengado 22	Total Proyectado	Total Devengado	
Enero	L 663,000.00	L -	L -	L -	L 663,000.00	L -	0%
Febrero	L 846,249.00	L 663,000.00	L 942,250.00	L -	L 1,788,499.00	L 663,000.00	37%
Marzo	L 733,000.00	L 1,326,000.00	L 10,993,085.00	L 3,633,587.22	L 11,726,085.00	L 4,959,587.22	42%
Abril	L 803,000.00	L 512,900.00	L 701,750.00	L -	L 1,504,750.00	L 512,900.00	34%
Mayo	L 803,000.00	L 627,000.00	L 738,908.00	L -	L 1,541,908.00	L 627,000.00	41%
Junio	L 803,000.00	L 388,266.67	L 10,327,926.00	L 4,162,158.99	L 11,130,926.00	L 4,713,758.99	42%
Julio	L 973,000.00	L -	L 7,323,506.00	L -	L 8,296,506.00	L -	0%
Agosto	L 973,000.00	L 1,446,344.00	L 2,713,328.00	L -	L 3,686,328.00	L 1,446,344.00	39%
Septiembre	L 973,000.00	L 895,273.00	L 1,221,750.00	L 7,446,950.28	L 2,194,750.00	L 8,342,223.28	380%
Octubre	L 973,000.00		L 3,328,250.00		L 4,301,250.00	L -	0%
Noviembre	L 1,534,000.00		L 3,359,049.00		L 4,893,049.00	L -	0%
Diciembre	L 1,534,001.00		L 3,449,284.00		L 4,983,285.00	L -	0%
Total		L 5,858,783.67		L 15,242,696.49		L 21,264,813.49	37%

x. LOGROS ALCANZADOS EN TRIMESTRE

La USAID, y el GdH han firmado el convenio de donación de objetivo de desarrollo 522-0502 y cuatro (4) cartas de ejecución con un periodo de implementación de 68 meses del de octubre de 2018 a junio de 2024 estableciendo montos Sub – Comprometidos o Sub-Obligados por \$8,831,000 equivalentes a L.184,522,440 de aportaciones de la USAID y \$1,707,750 equivalente a L.41,178,869 de aportaciones del GdH, conforme se establece en la carta e ejecución No 522.0502 – 034 y su plan de trabajo aprobado.

A través de la firma de una nueva carta de ejecución No. 522-0511-01 por parte de la USAID/FHIS/SEFIN se reprograma el plan de trabajo aprobado bajo la Carta de Ejecución No.522-0502-45 y se extiende el periodo de implementación de la actividad a 84 meses, desde el mes de octubre del 2018 a diciembre de 2025, esta ampliación se realiza para ejecutar fondos de donación de la oficina de Crecimiento Económico (EG).

Cartas de Ejecución	Aportaciones USAID		Aportaciones GdH	
	US\$	HNL	US\$	HNL
Convenio 522-0502 Carta de Ejecución 9	1,004,470	24,107,280	251,117	6,026,820
Convenio 522-0502 Carta de Ejecución 19	2,995,530	71,892,720	748,883	17,973,192
Convenio 522-0502 Carta de Ejecución 25	-1,000,000	-25,000,000	-250,000	-6,250,000

Convenio 522-0502 Carta de Ejecución 37	Reprogramación de Plan de Trabajo y Plazo			
Convenio 522-0502 Carta de Ejecución 34	3,831,000	93,522,440	957,750	23,426,857
Convenio 522-0502 Carta de Ejecución 45	1,504,304	39,980,889	376,076	9,948,963
Convenio 522-0511 Carta de Ejecución 01	Reprogramación de Plan de Trabajo y Plazo			
Total	8,335,304	204,503,329	2,083,826	51,125,832

xi. LISTADOS DE PRINCIPALES CONTRATOS DE BIENES, SERVICIOS, SUMINISTROS, OBRAS Y SUPERVISIÓN FIRMADOS EN EL TERCER TRIMESTRE 2024.

Código	Fuente	No. de contrato	Modalidad de contratación	Nombre	Ubicación	Monto	Fecha de firma consignada en contrato
110244	ICS	005-PEC-FHIS-ICS-2024	PEC	Reparación de CEBG Tiburcio Carias Andino y Obras Varias, Col. Flor N°1, Comayagüela M.D.C.	Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán	L7,415,000.00	3/9/2024
110248	ICS	004-PEC-FHIS-ICS-2024	PEC	Reparación de CEB Augusto C. Coello y Obras Varias, Col. Gracias a Dios, Villanueva, Cortés	Villanueva, Departamento de Cortés	L5,965,000.00	12/8/2024
110094	ICS	003-PEC-FHIS-ICS-2024	PEC	Reparación del Instituto Dr. Doroteo Varela Mejía y Obras Varias, Barrio La Independencia, Yarumela, La Paz, La Paz.	Municipio de La Paz, La Paz	L6,531,000.00	12/8/2024
108952	PIOH	CC-001-DIM-FHIS-2024	Contratista	Reparación del CEB República de Brasil y Construcción de Obras Varias.	Municipio de Azacualpa, Santa Bárbara	L2,004,082.33	30/8/2024
						L21,915,082.33	

xii. PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCION III TRIMESTRE

- **Contratación de Proyectos:** Durante el período se han desarrollado procesos de contratación de obras mediante la selección de contratistas (1 Proyecto Escolar) y bajo la modalidad PEC (2 proyectos de Caminos Productivos), los cuales, no han podido ser formalizados mediante la emisión de la respectiva notificación de adjudicación /firma de contrato, debido a que sus períodos de ejecución trascenderían el plazo de vigencia de la carta de ejecución PIOH 522-0502-45. El monto de inversión previsto para la ejecución de estos proyectos es de L 21,712,200.
- **Contratación de Consultorías Individuales:** En similar situación se encuentran los procesos de contratación de las consultorías individuales “Asistente Técnico de Control de Calidad en Diseños y Formulación de Proyectos”, “Dibujante, Evaluador y Formulador de Proyectos” y “Capacitador Social Básico”, cuyos procesos de selección de igual manera están concluidos, pero pendientes de ser adjudicados por las razones ya citadas.
- **Suspensión de proyectos en estado de ejecución:** dado que, las cartas de ejecución vigentes para las actividades ICS No.522-0501-25 y PIOH No.522-0502-45 alcanzaron su fecha de finalización 25 y 28 de junio correspondiente, esto ha generado una consecuencia negativa tanto financiera como físicamente, teniendo un impacto directo en los entregables programados para cada trimestre.
- **Incremento de los costos de contratación de mano de obra calificada en las zonas de intervención:** Se ha observado que en los últimos periodos la contratación de mano de obra calificada representa un enorme reto para la ejecución de los proyectos en materia de costo, lo cual incide directamente en el presupuesto de los proyectos y afectación de alcances.

CARTERA DE FONDOS NACIONALES

✓ **Gestión de Proyectos Artículo 338 DGP-2024**

i. Antecedentes

El informe de ejecución de fondos se elabora en cumplimiento del Artículo 338 de las Disposiciones Generales del presupuesto 2024, que establece lo siguiente:

Se autoriza una asignación presupuestaria de hasta NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L950,000,000.00) para el desarrollo de infraestructura menor y obras sociales a petición y en beneficio de las Comunidades, Patronatos, Asociaciones, Alcaldías, Juntas de Agua, Cajas Rurales, entre otros; así como para el otorgamiento de becas de estudio en todos los niveles educativos. Las obras de infraestructura menor, sociales, becas y canchas deportivas se gestionarán a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), Instituto de Crédito Educativo (EDUCREDITO), Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (FOSODE) y la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR).

A la fecha, se ha asignado un total de L180,659,079.00 de los cuales se han ejecutado L55,249,806.58 en 153 proyectos de infraestructura. Asimismo, en fondos del Tesoro Nacional se cuenta con un presupuesto vigente de L215,577,195.00, de los cuales se han ejecutado L47,976,484.78 en 39 proyectos de inversión, distribuidos en 21 proyectos de anticipos, 17 estimaciones de obras y 1 devolución de retención.

Este informe tiene como propósito evaluar el progreso y la utilización de los fondos asignados, así como analizar el impacto de los proyectos en las comunidades beneficiarias y los desafíos enfrentados en la ejecución de los mismos. Se busca proporcionar una visión clara y detallada del estado actual de los proyectos y ofrecer recomendaciones para mejorar la eficiencia en la gestión y ejecución de los recursos restantes.

ii. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2024	180.659.079,00	109.064.760,62	60%

iii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
AGUA Y SANEAMIENTO		785.261,05	106	5.550
ELECTRIFICACION		-	7	32.500
INFRAESTRUCTURA VIAL	41	91.441.341,46	2.099	1.897.052
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	6	5.691.645,88	369	388.616
EDUCACION	10	11.146.512,23	827	66.866
TOTAL	57	109.064.760,62	3.408	2.390.584

iv. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
ATLANTIDA	4	8.447.587,12	164	25.100
CHOLUTECA	2	2.419.057,66	137	337.764
COMAYAGUA	7	11.281.929,52	337	128.966
COPAN		2.799.766,46	170	57.113
CORTES	4	8.174.800,80	364	176.082
COLON	2	611.512,61	28	50.573
EL PARAISO	4	9.043.107,42	240	282.758
FRANCISCO MORAZAN	7	16.179.900,06	562	339.308
LA PAZ	5	6.060.913,53	190	133.361
LEMPIRA	2	7.021.079,50	123	12.404
OLANCHO	7	11.937.934,15	541	545.987
SANTA BARBARA	8	18.329.405,76	304	227.369
YORO	2	1.363.233,84	145	52.092
VALLE	3	5.394.532,19	103	21.707
TOTAL	57	109.064.760,62	3.408	2.390.584

v. Logros y Avances

Durante el tercer trimestre del 2024, el Programa 19, enfocado en la Infraestructura Rural, ha ejecutado un total de 57 proyectos de inversión distribuidos en diferentes departamentos y sectores. A continuación, se muestra el avance físico por departamento y sector conforme a lo que se ha registrado en el SIAFI con documentos F01, representando una ejecución de L59,682,015.32 representando un 20.1% en relación con el presupuesto vigente (L295,800,925.00).

vi. Problemática

- ✓ **Retrasos en la Ejecución:** Aunque se ha logrado un avance significativo, algunos proyectos han experimentado retrasos debido a diversos factores, como problemas logísticos, climáticos y administrativos.
- ✓ **Coordinación Interinstitucional:** La gestión de proyectos a través de múltiples entidades, como el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Educación y otras, ha presentado desafíos en términos de coordinación y comunicación, lo que ha afectado la eficiencia en la ejecución de algunos proyectos.
- ✓ **Capacidad Técnica:** En ciertas localidades, la capacidad técnica para llevar a cabo los proyectos es limitada, lo que ha requerido capacitación adicional y apoyo técnico, generando demoras y costos adicionales.
- ✓ **Control y Seguimiento:** La implementación de un sistema efectivo de seguimiento y monitoreo no ha sido óptimo, lo que ha dificultado la evaluación continua y precisa del progreso y la identificación oportuna de problemas.

✓ **Infraestructura y Otros a Nivel Nacional Programa 11**

i. Logros y Avances

Durante el tercer trimestre del 2024, el Programa 11, enfocado en la Infraestructura Rural, ha ejecutado un total de 103 proyectos de inversión distribuidos en diferentes departamentos y sectores. A continuación, se muestra el avance físico por departamento y sector conforme a lo que se ha registrado en el SIAFI con documentos F01, representando una ejecución de L31,726,201.86 representando un 61.7% en relación con el presupuesto vigente (L51,394,299.00).

ii. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2024	183.789.195,00	79.702.686,64	43%

iii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
AGUA Y SANEAMIENTO	5	30.164.957,94	109	10.066
INFRAESTRUCTURA VIAL	15	32.171.247,48	265	82.256
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	2	9.939.947,84	167	835.558
EDUCACION	6	7.426.533,38	118	2.930
TOTAL	28	79.702.686,64	659	930.810

iv. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos en Ejecucion 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024	Beneficiarios Directos 2024
ATLANTIDA	1	2.007.454,62	16	50
CHOLUTECA	3	5.550.848,84	63	6.989
COMAYAGUA	2	3.217.654,10	59	32.444
CORTES	3	31.140.301,67	27	781.330
COLON	1	502.443,91	8	4.491
FRANCISCO MORAZAN	5	6.170.768,30	95	10.630
INTIBUCÁ	1	1.174.304,30	25	8.653
LEMPIRA	1	5.103.919,08	85	2.400
OLANCHO	9	18.655.818,39	258	80.588
SANTA BARBARA	2	3.202.632,45	23	3.235
YORO	0	2.400.131,31	0	0
VALLE	0	576.409,67	0	0
TOTAL	28	79.702.686,64	659	930.810

v. Problemática

- ✓ **Retrasos en la Ejecución:** Aunque se ha logrado un avance significativo, algunos proyectos han experimentado retrasos debido a diversos factores, como problemas logísticos, climáticos y administrativos.
- ✓ **Coordinación Interinstitucional:** La gestión de proyectos a través de múltiples entidades, como el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Educación y otras, ha presentado desafíos en términos de coordinación y comunicación, lo que ha afectado la eficiencia en la ejecución de algunos proyectos.
- ✓ **Capacidad Técnica:** En ciertas localidades, la capacidad técnica para llevar a cabo los proyectos es limitada, lo que ha requerido capacitación adicional y apoyo técnico, generando demoras y costos adicionales.
- ✓ **Control y Seguimiento:** La implementación de un sistema efectivo de seguimiento y monitoreo no ha sido óptimo, lo que ha dificultado la evaluación continua y precisa del progreso y la identificación oportuna de problemas.
