



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729




INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A MAYO 2017

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Reparacion de cerca perimetral de escuela Manuel Luna Castillo, barrio El Progreso	•Se pagó planilla de jornales para la instalacion la cerca de alambre de puas en el perimetro del campo de futbol de la escuela Manuel Luna Castillo	40,000.00	960.00	15,840.00	24,160.00
2	Construccion y mejoramiento de vivienda solidaria adecuada para mujeres madres solteras en area rural y urbano	•Se procedio a realizar la compra demateriales para construccion de vivienda de la Sra. Melida Diaz Fuentes la cual es madre soltera y de escasos recursos economicos	300,000.00	17,247.00	17,247.00	282,753.00
3	Mejoramiento de viviendas populares, (Pisos y Techos) Urbano y Rural	•Se realizaron las inspecciones a viviendas en proceso de construccion y mejoramiento, la municipalidad apoyara con laminas de zin y cemento a familias de escasos recursos	250,000.00	166,944.93	352,604.93	(102,604.93)
4	Construccion de viviendas solidarias	•Actualmente se ha iniciado la construccion de una vivienda a la Sra Isabel Portillo pues su vivienda se derrumbo debido a las constantes lluvias pues se encontraba en muy mal estado. Se inicio la construccion de la vivienda, la etapa de cimentacion ya se encuentra finalizado y se inicio la etapa de construccion de paredes. •Se estima un avance aproximado de 10%	250,000.00	29,120.00	72,822.00	177,178.00
5	Mejoramiento de viviendas populares, (Letrinizacion) Urbano y Rural	•Se realizó la compra de letrinas con el cual se beneficiaran 10 familias de escasos recursos economicos de aldea El Porvenir	50,000.00	12,435.00	12,435.00	37,565.00
6	Mantenimiento de sistema de agua por bombeo en sector Estadio de Futbol Las Ranas, Barrio San Nicolas y El Escondido	•Se realizó la reparacion de la bomba sumergible de caserio El Escondido ya que los vecinos de ese lugar tenian casi un año que se les habia dañado el sistema de bombeo.	150,000.00	37,031.77	82,513.69	67,486.31

7	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	•Se esta excavando para la nueva instalacion de tuberia de agua potable en calle barrio San Sebastian que se esta pedrimentando	300,000.00	69,194.00	119,908.59	180,091.41
8	Ampliacion alcantarillado sanitario, Urbano	•Se realizo la compra de materiales para ampliacion al sistema de alcantarillado sanitario en sector El Mirador El Pico, en la cual los beneficiarios estan aportando mano de obra calificada y no calificada	140,000.00	3,185.00	33,535.00	106,465.00
9	Mejoramiento de calles, casco urbano	•Compra de alcantarillas de concreto para reparacion de tramos de calles en mal estado	448,255.61	1,700.00	125,299.00	322,956.61
10	Pavimentacion o pedrimentado de calle que conduce de propiedad del Sr. Ramon Garcia hasta propiedad del Sr. Isidro Licona, Barrio San Sebastian	•Se realizaron las actividades de excavacion y nivelacion de la calle. Finalizo la construccion de muro de contencion de mamposteria en forma de L al lado norte y este de la casa del señor Marco Antonio Miranda y el muro en forma de L al sur y al este de la casa del Sr Isabel Hercules. •Se estima un avance de 10% del proyecto.	350,000.00	29,550.00	154,371.00	195,629.00
11	Construccion de gradas de acceso a Mirador El Pico, Barrio San Francisco	•Se finalizo la pintura de bases y gradas, aun esta pendiente la instalacion electrica	150,000.00	1,725.00	108,574.50	41,425.50
12	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural	•Reparacion e instalacion de lamparas del alumbrado publico	130,000.00	4,650.00	9,550.00	120,450.00
13	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	•Compra de alcantarillas de concreto para reparacion de tramos carreteros	816,865.97	9,350.00	285,700.00	531,165.97
TOTAL					1895,106.38	3133,452.67

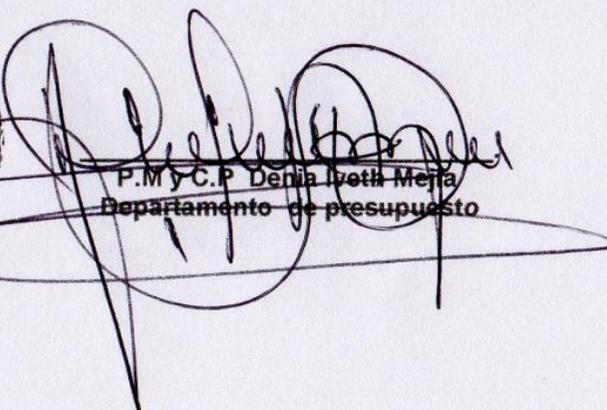


 P.M y C.P. Denia Iveth Mejia
 Departamento de presupuesto
